


Proyectos de Rehabilitación de Redes Edenorte Dominicana

Informe de Seguimiento Trimestre Enero-Marzo 2019


Proyecto CHIV105

LOTE 8 CHIV-105										
AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-105										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,877.00	4,178.00	2,536.00	1,208.00	111.764	1,970.00	215.00	167.00	1,573.00	1,135.60
Ejecutado	1,695.00	1,373.00	1,570.00	703.00	28.100	82.00	23.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-105										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,201.00	1,671.00	761.00	483.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	1,695.00	1,373.00	1,570.00	703.00	28.10	82.00	23.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-105										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	90%	33%	62%	58%	25%	4%	11%	0%	0%	0%

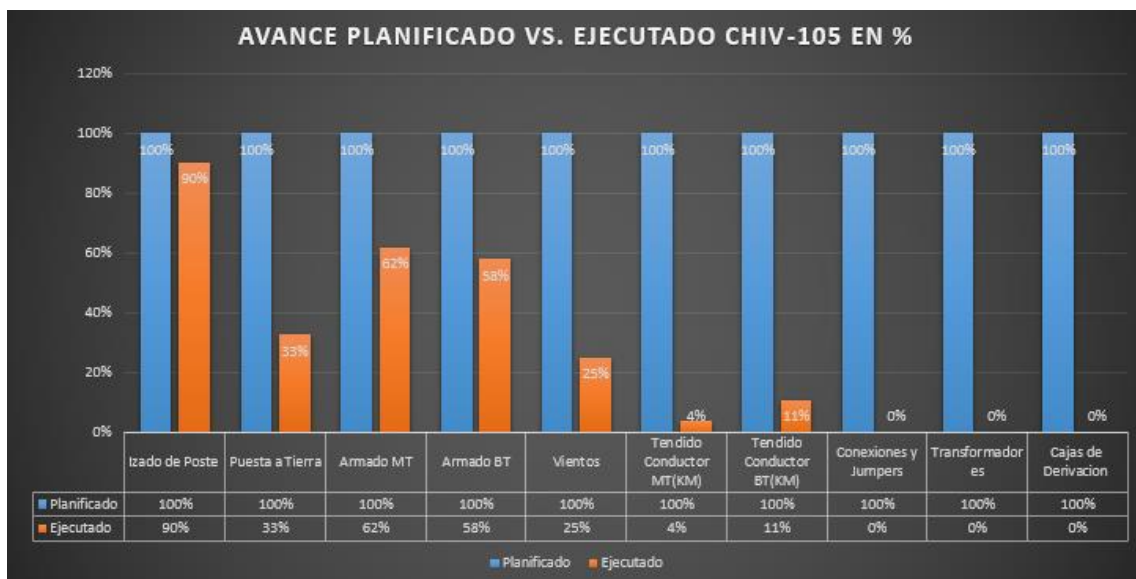


Proyecto CHIV106

LOTE 9 CHIV-106										
AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-106										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	990.00	1,669.00	1,159.00	398.00	73.50	743.000	117.000	4.00	942.00	279.10
Ejecutado	937.00	525.00	676.00	351.00	4.80	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-106										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	634.00	668.00	348.00	159.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	937.00	525.00	676.00	351.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-106										
	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT	Armado BT	Vientos	Tendido Conductor MT(KM)	Tendido Conductor BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Cajas de Derivacion
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	95%	31%	58%	88%	7%	0%	0%	0%	0%	0%

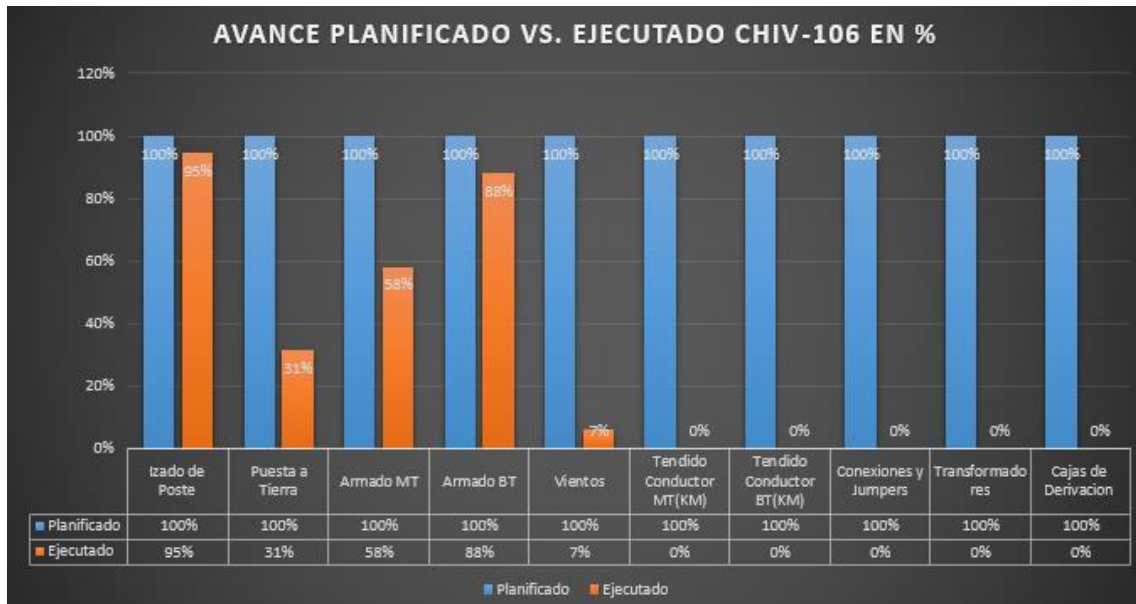


Proyecto ZFPP402

LOTE 10 ZFPP-402										
AVANCE TOTAL DE OBRA ZFPP-402										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	968.00	1,582.00	1,193.00	251.00	66.000	344.00	203.00	0.00	878.00	425.00
Ejecutado	826.00	0.00	658.00	86.00	17.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ZF-402										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	620.00	633.00	358.00	100.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	826.00	0.00	658.00	86.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ZFPP-402										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	85%	0%	55%	34%	26%	0%	0%	0%	0%	0%

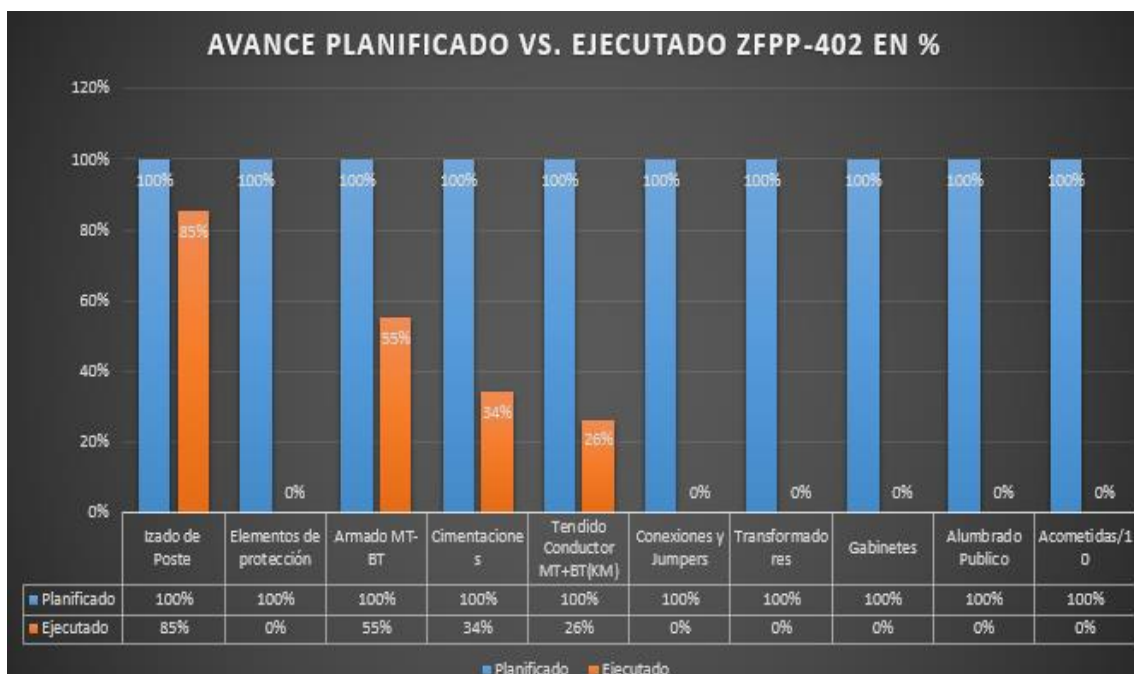

Proyecto CANA102

LOTE 11 CANA-102										
AVANCE TOTAL DE OBRA CANA-102										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,885.00	6,955.00	2,905.00	856.00	140.000	1,574.00	210.00	0.00	2,175.00	750.20
Ejecutado	813.00	142.00	139.00	2.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CANA-102										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,206.00	2,782.00	872.00	342.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	813.00	142.00	139.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CANA-102										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	43%	2%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

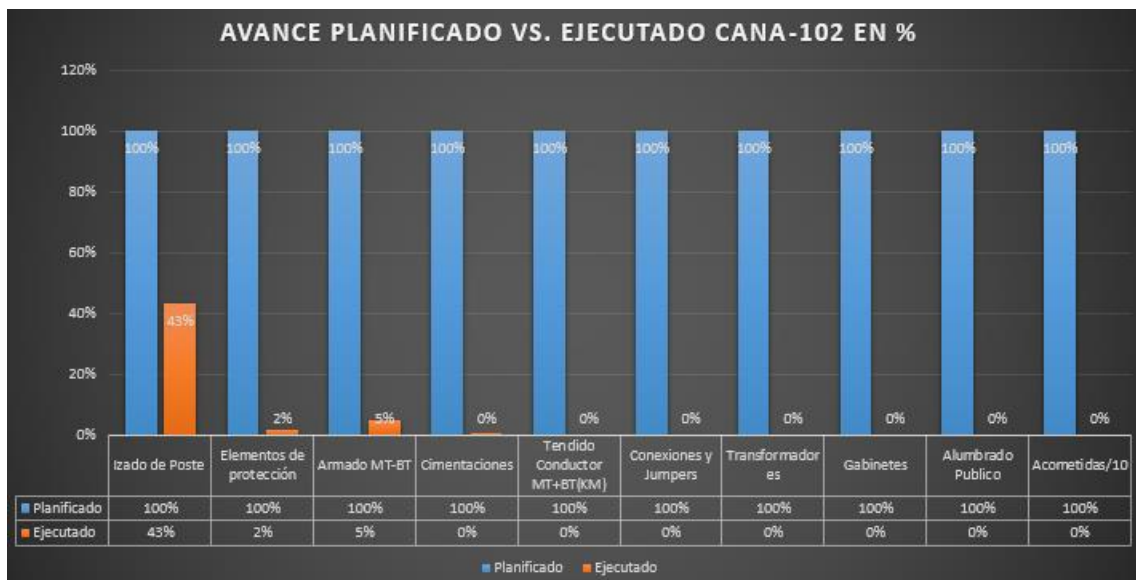


Proyecto GALL103

LOTE 12 GALL-103										
AVANCE TOTAL DE OBRA GALL-103										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,602.00	4,061.00	2,656.00	193.00	62.300	1,751.00	366.00	201.00	1,342.00	1,170.00
Ejecutado	590.00	472.00	0.00	148.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO GALL-103										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,025.00	1,624.00	797.00	77.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	590.00	472.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL GALL-103										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	37%	12%	0%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

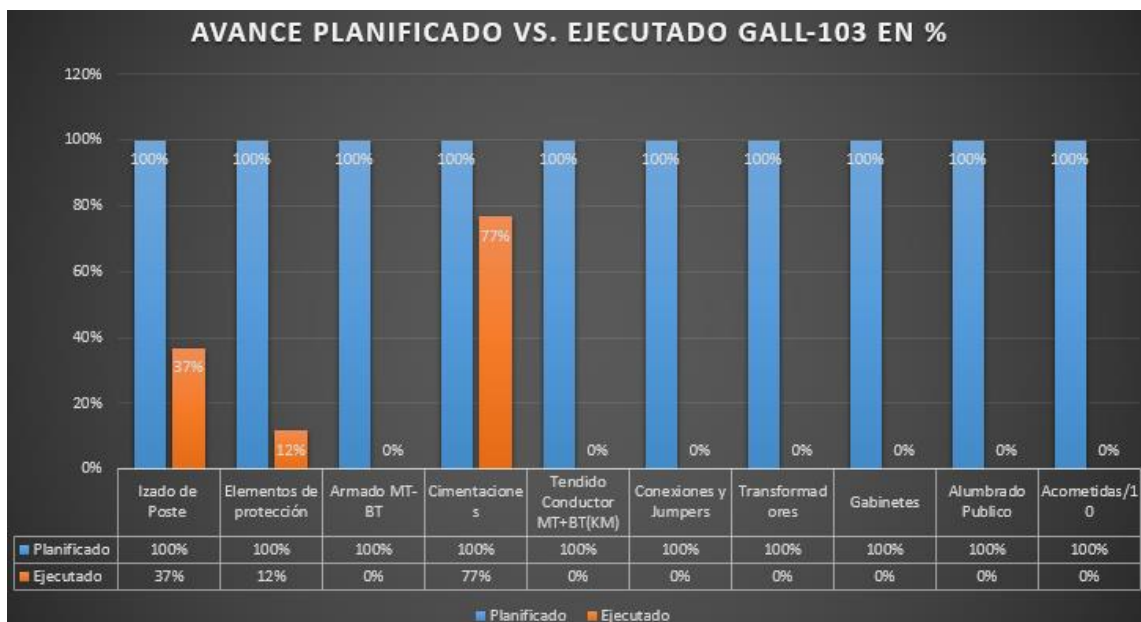

Proyecto ABAP101

LOTE 13 ABAP-101										
AVANCE TOTAL DE OBRA ABAP-101										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,094.00	5,458.00	1,982.00	794.00	150.000	1,343.00	164.00	0.00	1,686.00	551.40
Ejecutado	931.00	307.00	0.00	145.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.64	0.4	0.3	0.4	0.2					
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ABAP-101										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado										
Ejecutado	931.00	307.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ABAP-101										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	44%	6%	0%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

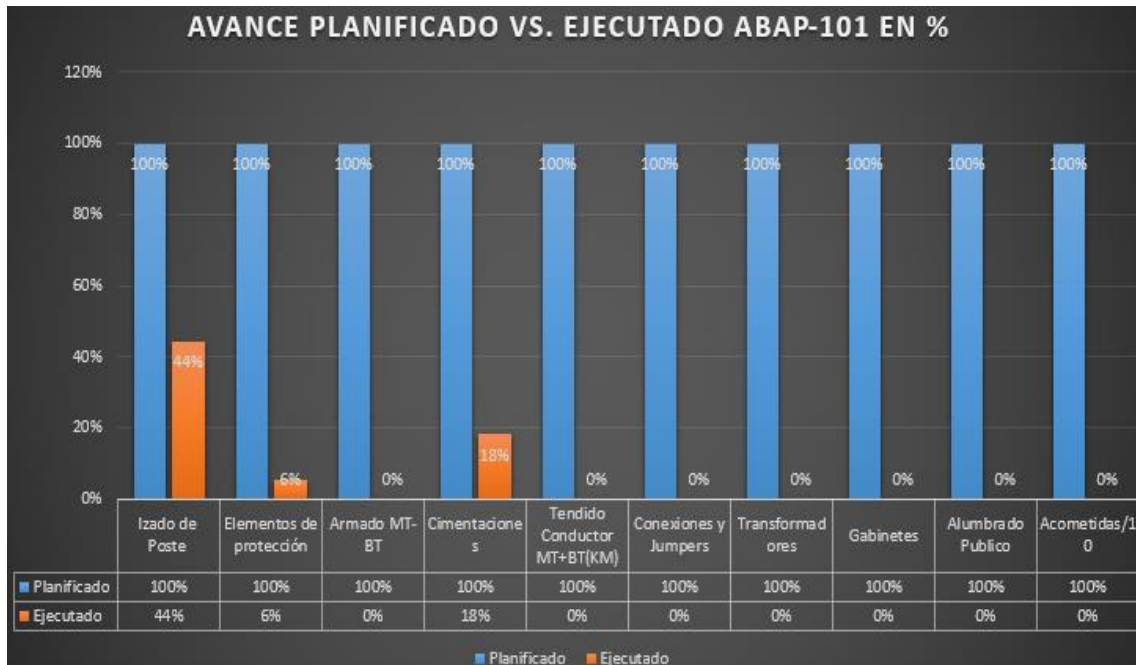


Proyecto BPER104

LOTE 14 BPER-104										
AVANCE TOTAL DE OBRA BPER-104										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,103.00	2,556.00	1,311.00	747.00	82.200	931.00	141.00	46.00	1,041.00	675.10
Ejecutado	1,051.00	695.00	961.00	673.00	19.900	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO BPER-104										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	706.00	1,022.00	393.00	299.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	1,051.00	695.00	961.00	673.00	19.90	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL BPER-104										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	95%	27%	73%	90%	24%	0%	3%	0%	0%	0%

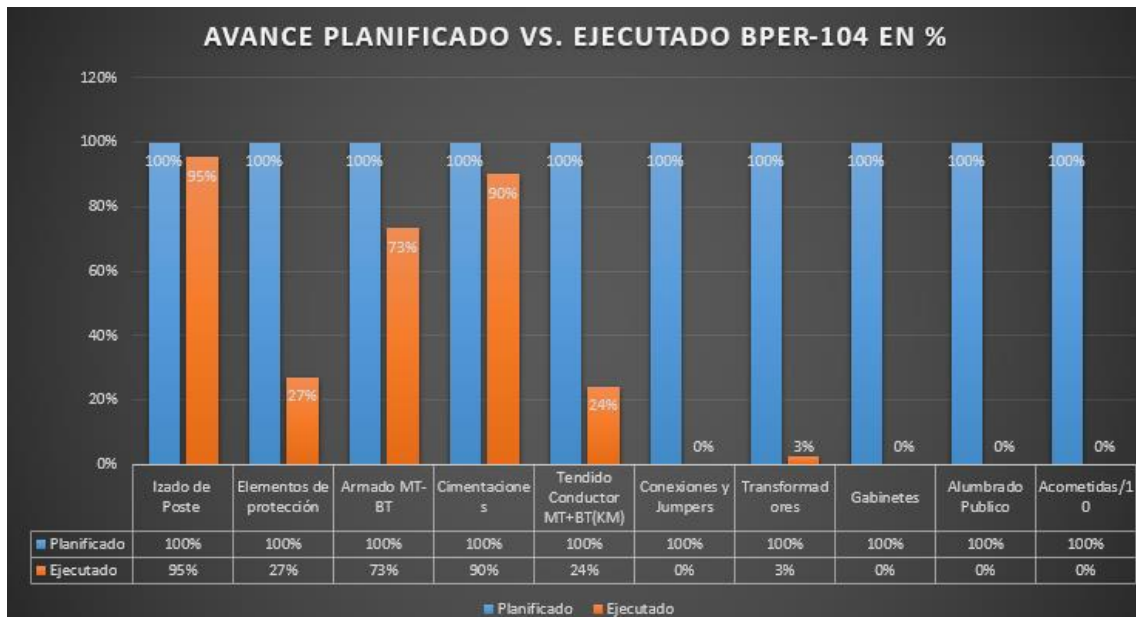

Ing. Deivy Rodríguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorste Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorste.com.do P: www.edenorste.com.do

Síguenos en:

