

Proyectos de Rehabilitacion de Redes Edenorte Dominicana


Informe de Seguimiento Trimestre Abril-Junio 2019

Proyecto CHIV105

LOTE 8 CHIV-105										
AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-105										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,877.00	4,178.00	2,536.00	1,208.00	111.764	1,970.00	215.00	167.00	1,573.00	1,135.60
Ejecutado	1,876.00	3,102.00	2,032.00	1,205.00	73.783	780.00	145.00	0.00	688.00	179.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-105										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,201.00	1,671.00	761.00	483.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	1,876.00	3,102.00	2,032.00	1,205.00	73.78	780.00	145.00	0.00	688.00	179.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-105										
	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	100%	74%	80%	100%	66%	40%	67%	0%	44%	16%

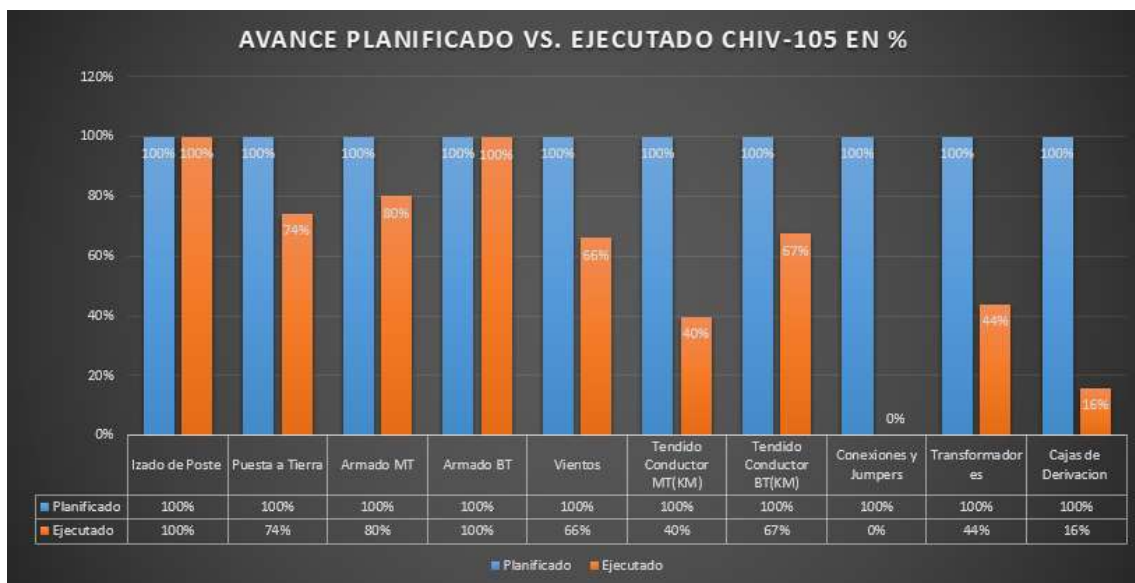

Proyecto CHIV106

LOTE 9 CHIV-106

AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-106

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	990.00	1,669.00	1,159.00	398.00	73.50	743.000	117.000	4.00	942.00	279.10
Ejecutado	985.00	1,370.00	1,075.00	503.00	65.26	505.000	72.000	0.00	550.00	82.40


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-106

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	634.00	668.00	348.00	159.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	985.00	1,370.00	1,075.00	503.00	65.26	505.00	72.00	0.00	550.00	82.40

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-106

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT	Armado BT	Vientos	Tendido Conductor MT(KM)	Tendido Conductor BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Cajas de Derivacion
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	99%	82%	93%	126%	89%	68%	62%	0%	58%	30%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO CHIV-106 EN %

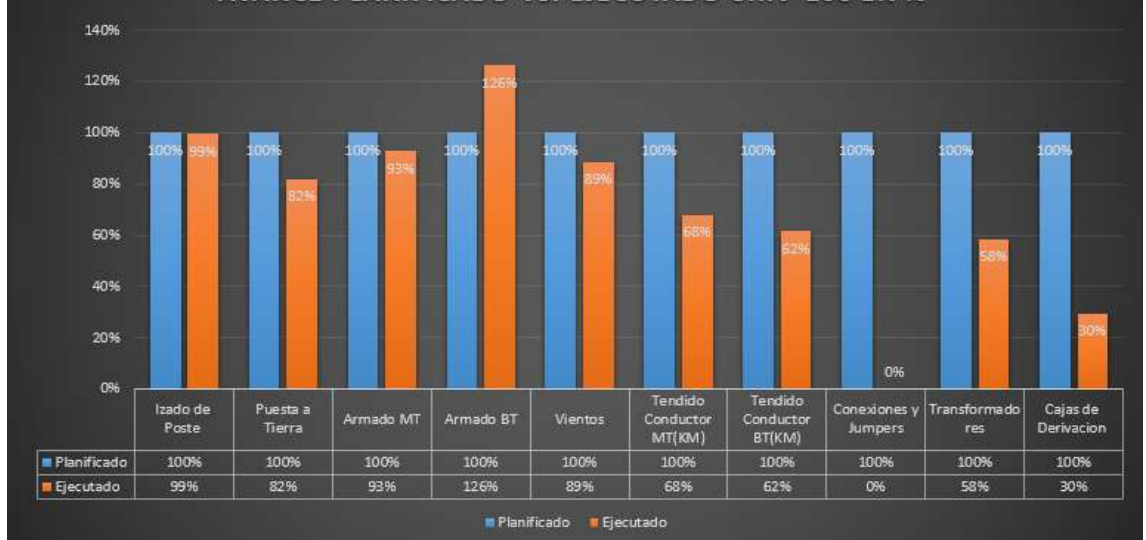

Proyecto ZFPP402

LOTE 10 ZFPP-402

AVANCE TOTAL DE OBRA ZFPP-402


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	968.00	1,582.00	1,193.00	251.00	66.000	344.00	203.00	0.00	878.00	425.00
Ejecutado	920.00	1,823.00	1,278.00	313.00	52.276	502.00	197.00	0.00	886.00	132.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ZF-402

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	620.00	633.00	358.00	100.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	920.00	1,823.00	1,278.00	313.00	52.28	502.00	197.00	0.00	886.00	132.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ZFPP-402

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	95%	115%	107%	125%	79%	146%	97%	0%	101%	31%

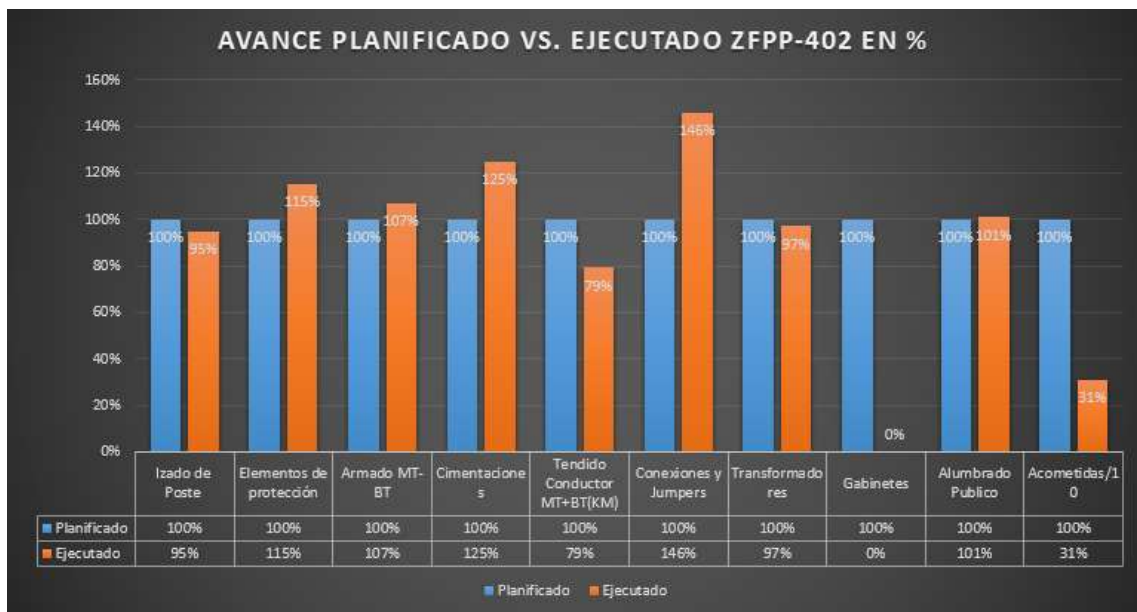

Proyecto CANA102

LOTE 11 CANA-102

AVANCE TOTAL DE OBRA CANA-102


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,885.00	6,955.00	2,905.00	856.00	140.000	1,574.00	210.00	0.00	2,175.00	750.20
Ejecutado	1,197.00	525.00	2,509.00	84.00	35.532	672.00	50.00	0.00	58.00	0.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CANA-102

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,206.00	2,782.00	872.00	342.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	1,197.00	525.00	2,509.00	84.00	35.53	672.00	50.00	0.00	58.00	0.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CANA-102

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	64%	8%	86%	10%	25%	43%	24%	0%	3%	0%

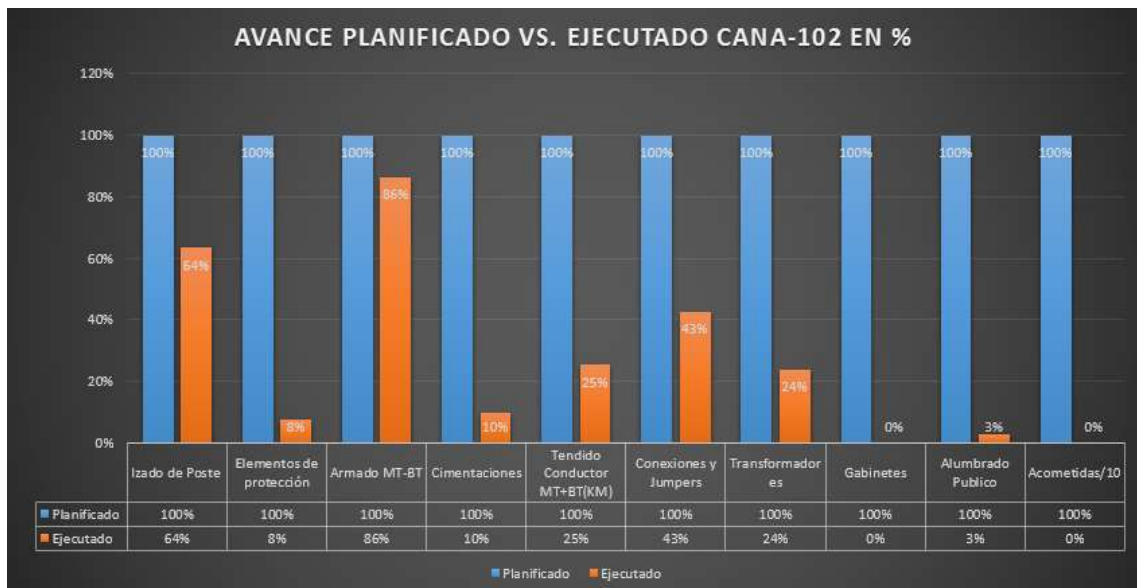

Proyecto GALL103

LOTE 12 GALL-103

AVANCE TOTAL DE OBRA GALL-103


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,602.00	4,061.00	2,656.00	193.00	62.300	1,751.00	366.00	201.00	1,342.00	1,170.00
Ejecutado	1,463.00	1,199.00	984.00	540.00	19.703	106.00	101.00	0.00	338.00	0.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO GALL-103

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,025.00	1,624.00	797.00	77.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	1,463.00	1,199.00	984.00	540.00	19.70	106.00	101.00	0.00	338.00	0.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL GALL-103

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	91%	30%	37%	280%	32%	6%	28%	0%	25%	0%

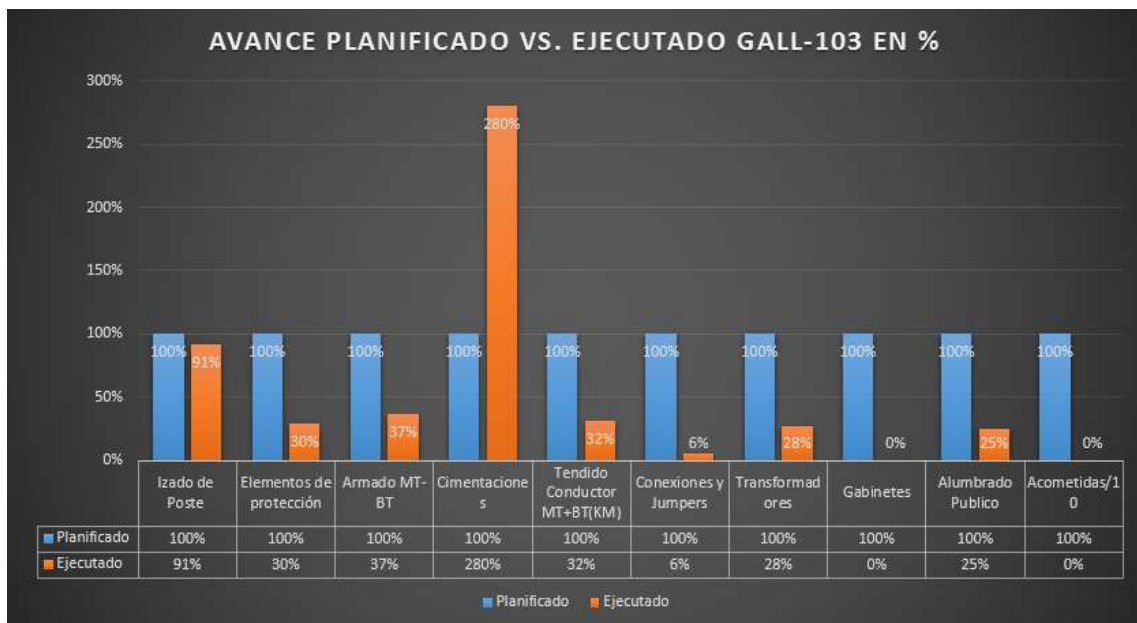

Proyecto ABAP101

LOTE 13 ABAP-101

AVANCE TOTAL DE OBRA ABAP-101


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	2,094.00	5,458.00	1,982.00	794.00	150.000	1,343.00	164.00	0.00	1,686.00	551.40
Ejecutado	1,224.00	1,196.00	734.00	218.00	43.442	68.00	46.00	0.00	268.00	0.00
	0.64	0.4	0.3	0.4	0.2					

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ABAP-101

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado										
Ejecutado	1,224.00	1,196.00	734.00	218.00	43.44	68.00	46.00	0.00	268.00	0.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ABAP-101

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	58%	22%	37%	27%	29%	5%	28%	0%	16%	0%

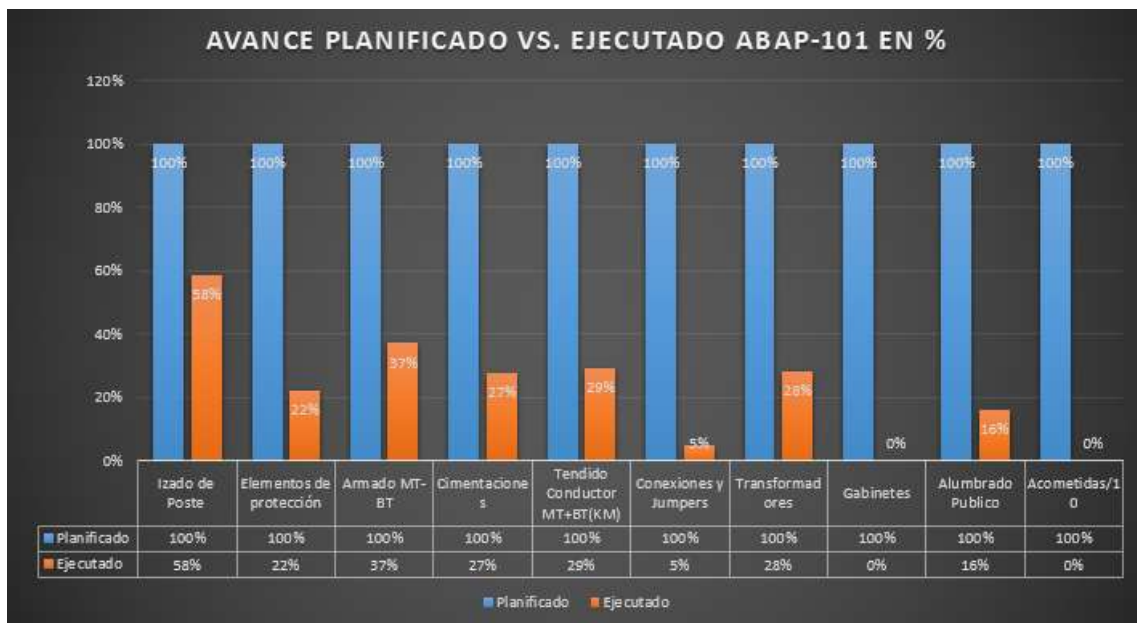

Proyecto BPER104

LOTE 14 BPER-104

AVANCE TOTAL DE OBRA BPER-104


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,103.00	2,556.00	1,311.00	747.00	82.200	931.00	141.00	46.00	1,041.00	675.10
Ejecutado	1,087.00	2,120.00	1,215.00	721.00	73.664	662.00	121.00	0.00	577.00	103.50

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO BPER-104

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	706.00	1,022.00	393.00	299.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecutado	1,087.00	2,120.00	1,215.00	721.00	73.66	662.00	121.00	0.00	577.00	103.50

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL BPER-104

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	99%	83%	93%	97%	90%	71%	86%	0%	55%	15%

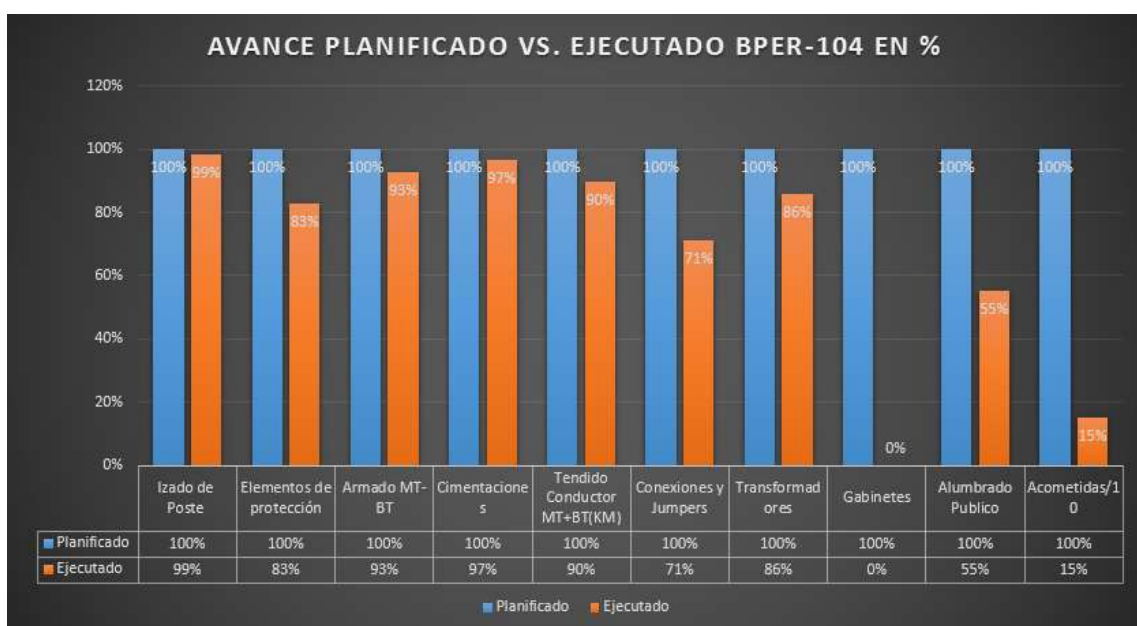

Ing. Deivy Rodriguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en: 
