

Proyectos de Rehabilitacion de Redes Edenorte Dominicana Informe de Seguimiento Trimestre Octubre-Diciembre 2020

Proyecto CHIV105

LOTE 8 CHIV-105

AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-105


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,877.00	4,178.00	2,536.00	1,208.00	111.764	1,970.00	215.00	167.00	1,573.00	9,673.00
Ejecutado	1,876.00	4,014.00	2,486.00	1,214.00	105.600	1,452.00	197.00	281.00	1,677.00	7,772.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-105

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,877.00	4,178.00	2,536.00	1,208.00	111.76	1,970.00	215.00	167.00	1,573.00	9,673.00
Ejecutado	1,876.00	4,014.00	2,486.00	1,214.00	105.60	1,452.00	197.00	281.00	1,677.00	7,772.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-105

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	100%	96%	98%	100%	94%	74%	92%	168%	107%	80%

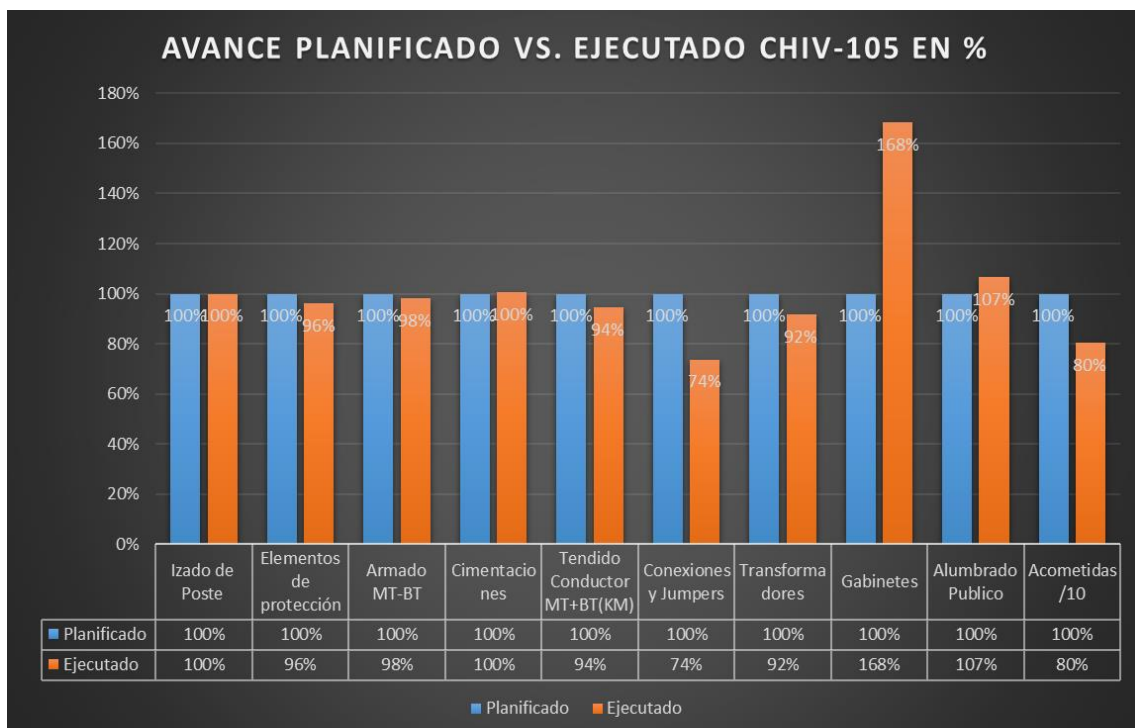

Proyecto CHIV106

LOTE 9 CHIV-106

AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-106


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	990.00	1,669.00	1,159.00	398.00	73.50	743	117	4.00	942.00	3,382.00
Ejecutado	1,034.00	1,874.00	1,257.00	542.00	70.90	505	119	126.00	835.00	2,753.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-106

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	990.00	1,669.00	1,159.00	398.00	73.50	743.00	117.00	4.00	942.00	3,382.00
Ejecutado	1,034.00	1,874.00	1,257.00	542.00	70.90	505.00	119.00	126.00	835.00	2,753.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-106

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	104%	112%	108%	136%	96%	68%	102%	3150%	89%	81%

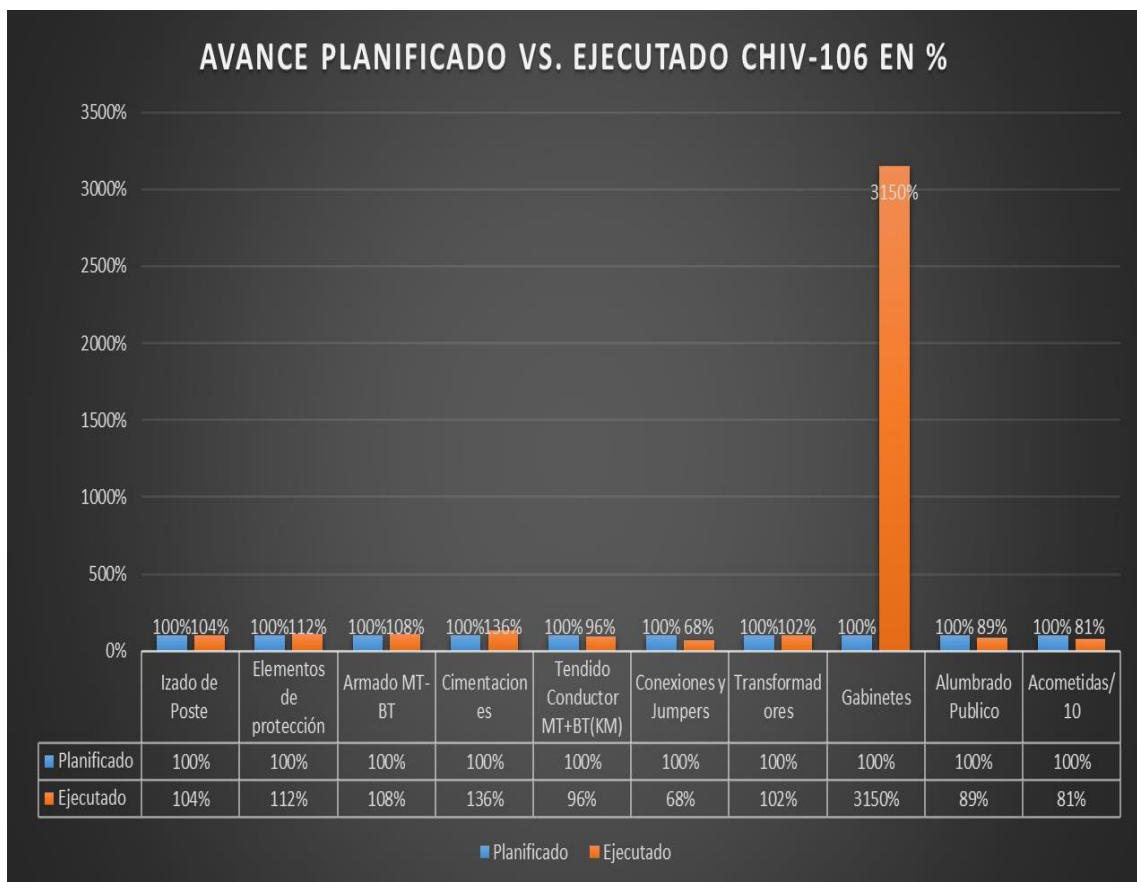

Proyecto ZFPP402

LOTE 10 ZFPP-402

AVANCE TOTAL DE OBRA ZFPP-402

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	923.00	1,608.00	1,246.00	284.00	66.000	344.00	201.00	0.00	877.00	4,895.00
Ejecutado	1,091.00	2,697.00	1,083.00	367.00	60.500	502.00	180.00	78.00	850.00	3,857.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ZF-402

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	923.00	1,608.00	1,246.00	284.00	66.00	344.00	201.00	0.00	877.00	4,895.00
Ejecutado	1,091.00	2,697.00	1,083.00	367.00	60.50	502.00	180.00	78.00	850.00	3,857.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ZFPP-402

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	118%	168%	87%	129%	92%	146%	90%	0%	97%	79%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO ZFPP-402 EN %

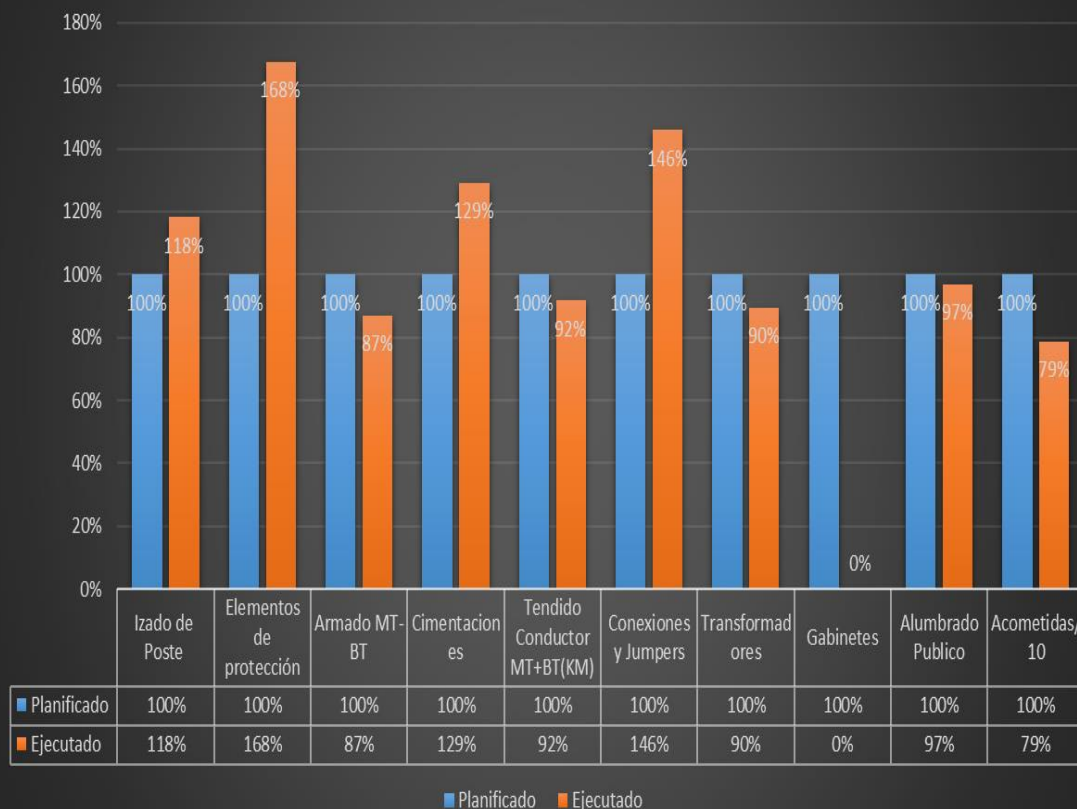

Proyecto CANA102

LOTE 11 CANA-102

AVANCE TOTAL DE OBRA CANA-102

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,885.00	6,955.00	2,905.00	856.00	140.000	1,574.00	210.00	0.00	2,175.00	11,039.00
Ejecutado	1,852.00	3,483.00	3,810.00	171.00	151.847	1,232.00	222.00	8.00	1,895.00	2,671.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CANA-102

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	1,885.00	6,955.00	2,905.00	856.00	140.00	1,574.00	210.00	0.00	2,175.00	11,039.00
Ejecutado	1,852.00	3,483.00	3,810.00	171.00	151.85	1,232.00	222.00	8.00	1,895.00	2,671.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CANA-102

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	98%	50%	131%	20%	108%	78%	106%	0%	87%	24%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO CANA-102 EN %

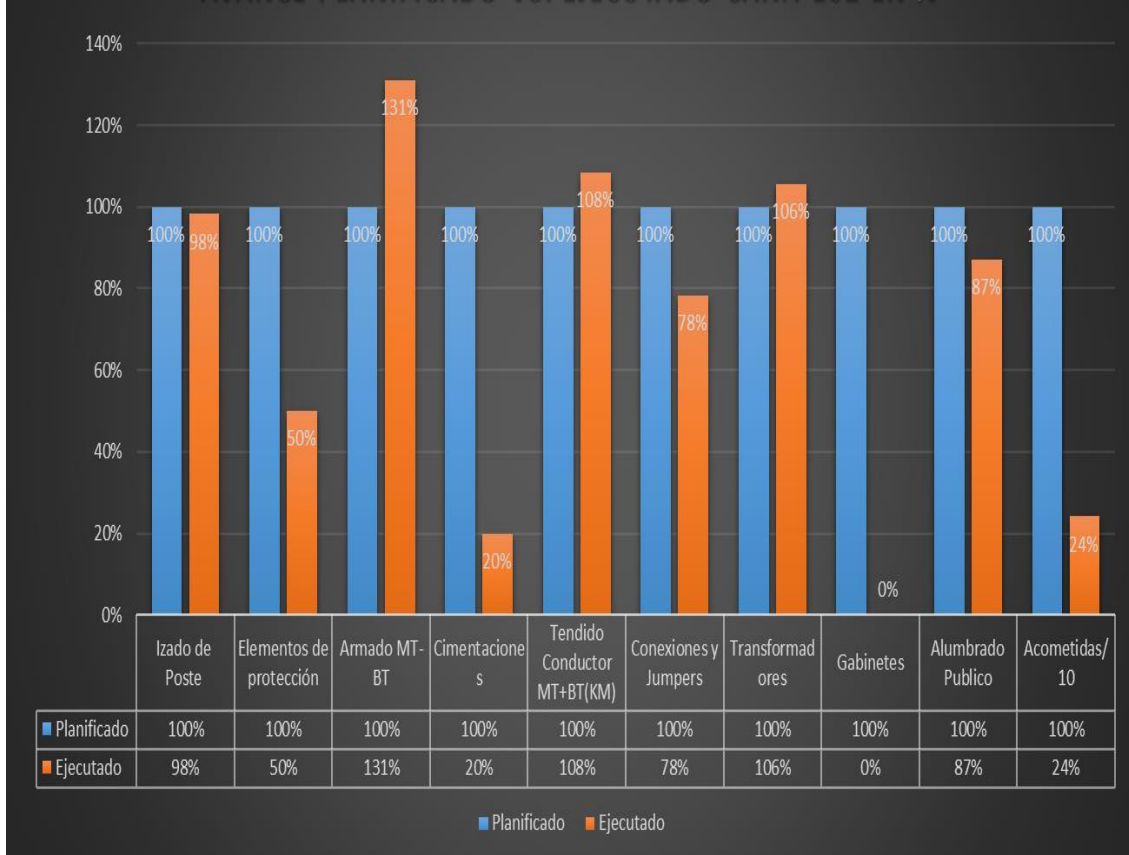

Proyecto GALL103

LOTE 12 GALL-103

AVANCE TOTAL DE OBRA GALL-103

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,155.00	5,461.00	2,902.00	470.00	62.300	1,751.00	360.00	201.00	1,308.00	15,192.00
Ejecutado	1,365.00	4,022.00	2,902.00	642.00	91.854	1,307.00	360.00	235.00	1,277.00	8,078.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO GALL-103

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,155.00	5,461.00	2,902.00	470.00	62.30	1,751.00	360.00	201.00	1,308.00	15,192.00
Ejecutado	1,365.00	4,022.00	2,902.00	642.00	91.85	1,307.00	360.00	235.00	1,277.00	8,078.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL GALL-103

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	118%	74%	100%	137%	147%	75%	100%	117%	98%	53%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO GALL-103 EN %

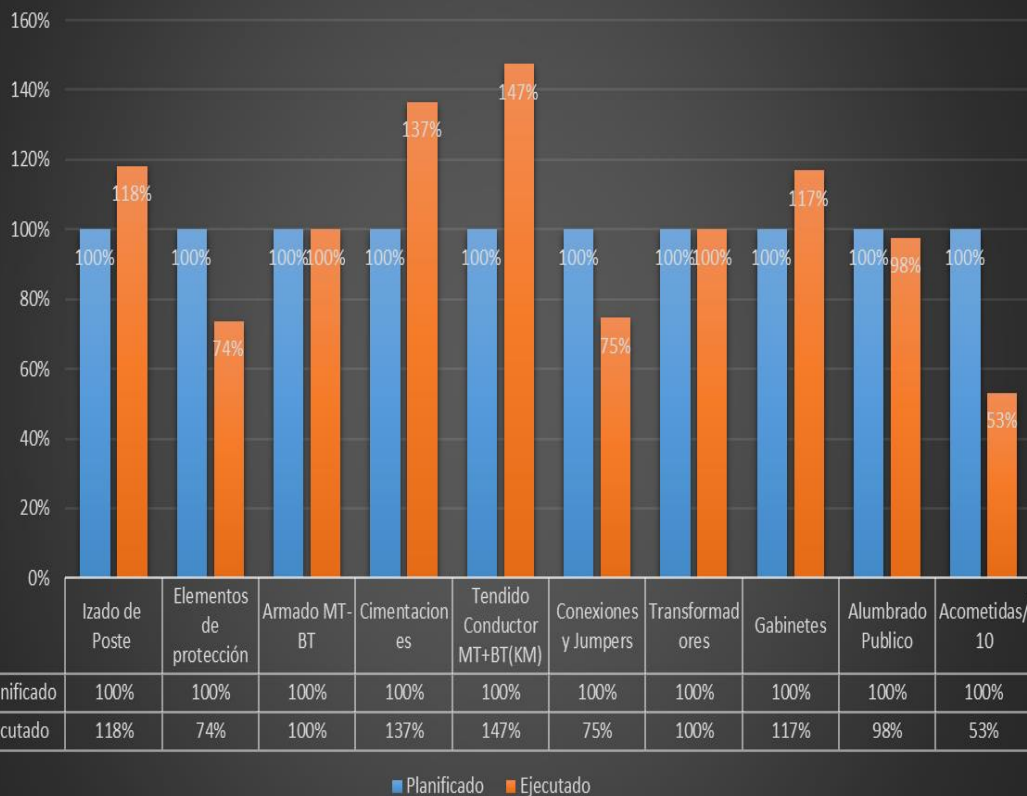

Proyecto ABAP101

LOTE 13 ABAP-101

AVANCE TOTAL DE OBRA ABAP-101

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,851.00	6,284.00	2,111.00	794.00	150.000	1,343.00	164.00	0.00	1,751.00	6,068.00
Ejecutado	1,843.00	2,797.00	2,054.00	727.00	133.088	750.00	116.00	43.00	1,291.00	5,171.00


AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ABAP-101

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,851.00	6,284.00	2,111.00	794.00	150.00	1,343.00	164.00	0.00	1,751.00	6,068.00
Ejecutado	1,843.00	2,797.00	2,054.00	727.00	133.09	750.00	116.00	43.00	1,291.00	5,171.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ABAP-101

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	100%	45%	97%	92%	89%	56%	71%	0%	74%	85%

AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO ABAP-101 EN %

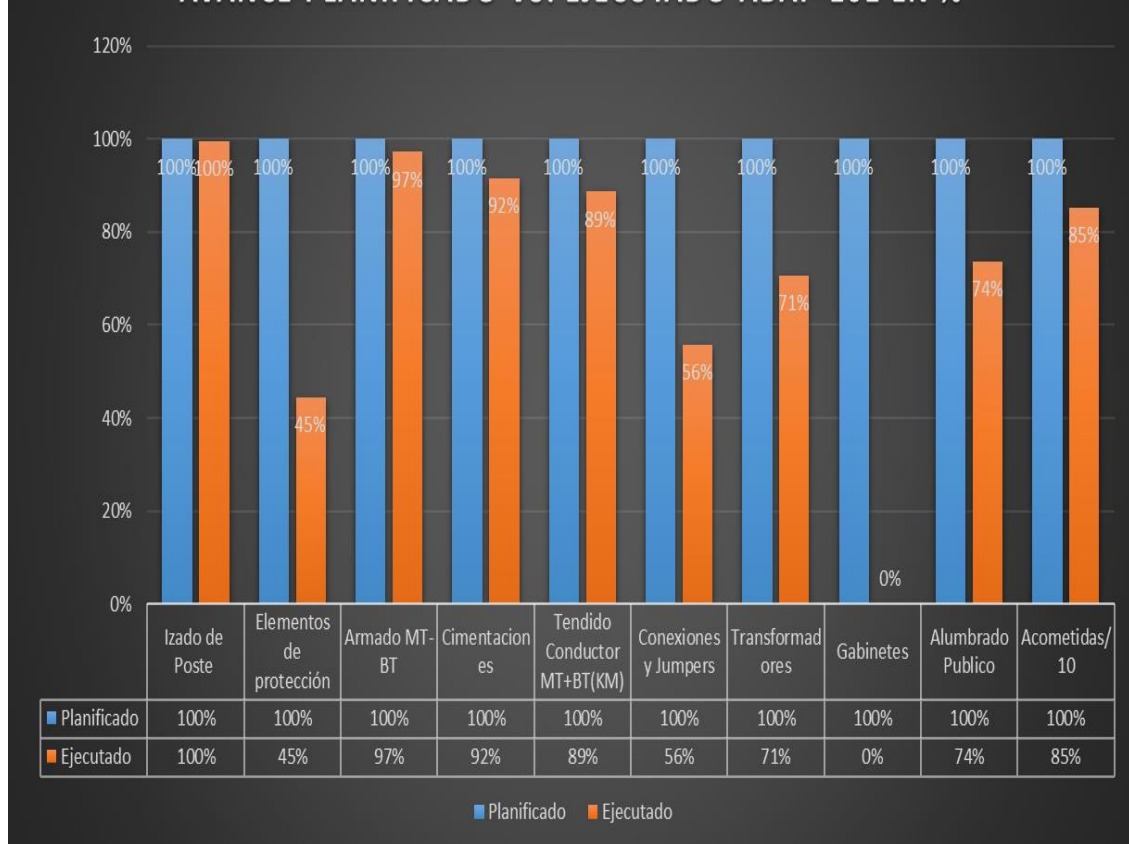

Proyecto BPER104

LOTE 14 BPER-104

AVANCE TOTAL DE OBRA BPER-104


	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,092.00	2,674.00	1,296.00	721.00	82.200	931.00	130.00	46.00	988.00	4,663.00
Ejecutado	1,094.00	2,701.00	1,365.00	728.00	82.000	931.00	141.00	82.00	1,010.00	4,089.00

AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO BPER-104

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,092.00	2,674.00	1,296.00	721.00	82.20	931.00	130.00	46.00	988.00	4,663.00
Ejecutado	1,094.00	2,701.00	1,365.00	728.00	82.00	931.00	141.00	82.00	1,010.00	4,089.00

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL BPER-104

	Izado de Poste	Elementos de protección	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	100%	101%	105%	101%	100%	100%	108%	178%	102%	88%

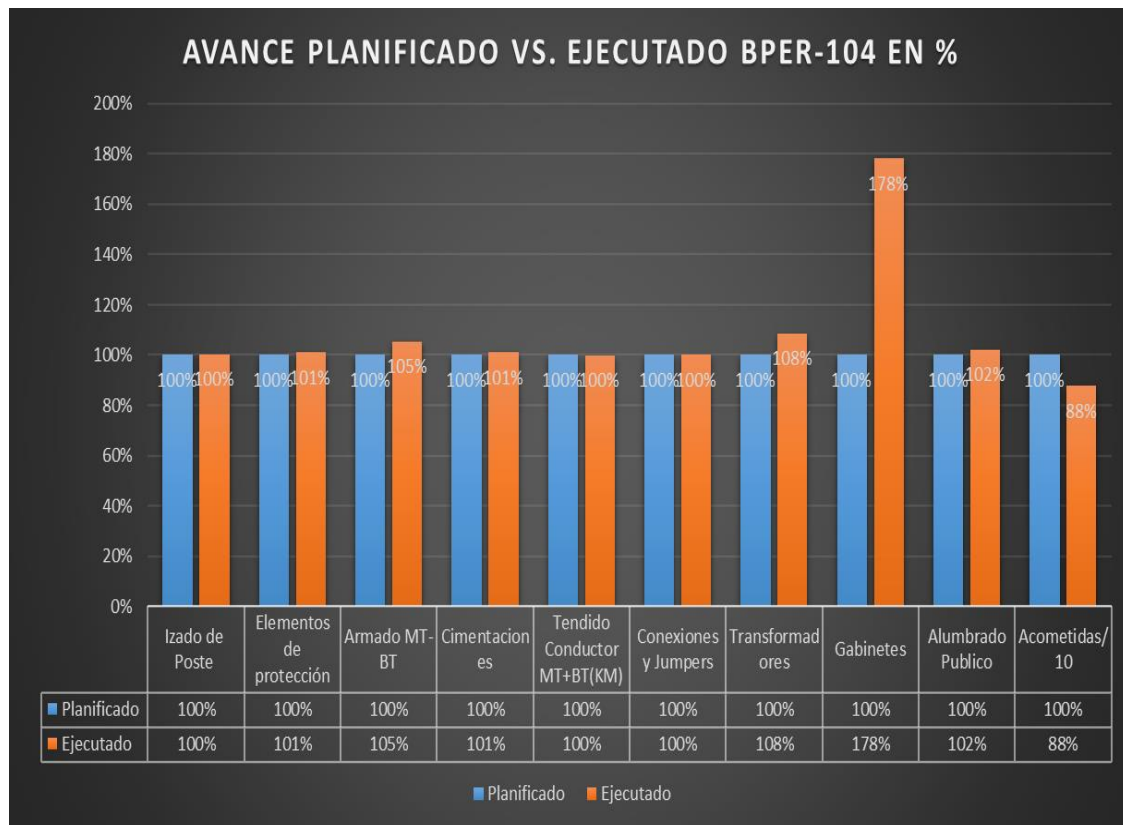

Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana
 F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:

