

## Proyectos de Rehabilitacion de Redes Edenorte Dominicana

### Informe de Seguimiento Trimestre Enero-Marzo 2021

#### Proyecto NAGU101

##### LOTE 6 NAGU-101

###### AVANCE TOTAL DE OBRA NAGU-101


	lzado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
<b>Planificado</b>	1,448.00	2,453.00	1,926.00	638.00	95,755.000	3,366.00	466.00	243.00	1,392.00	7,244.00
<b>Ejecutado</b>	1,301.00	763.00	1,249.00	78.00	62,480.000	881.00	48.00	0.00	251.00	0.00

###### AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO NAGU-101

	lzado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
<b>Planificado</b>	1,448.00	1,920.00	1,845.00	638.00	79,439.00	2,269.00	415.00	0.00	1,153.00	2,115.00
<b>Ejecutado</b>	1,301.00	763.00	1,249.00	78.00	62,480.00	881.00	48.00	0.00	251.00	0.00

###### PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL NAGU-101

	lzado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
<b>Planificado</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Ejecutado</b>	90%	31%	65%	12%	65%	26%	10%	0%	18%	0%

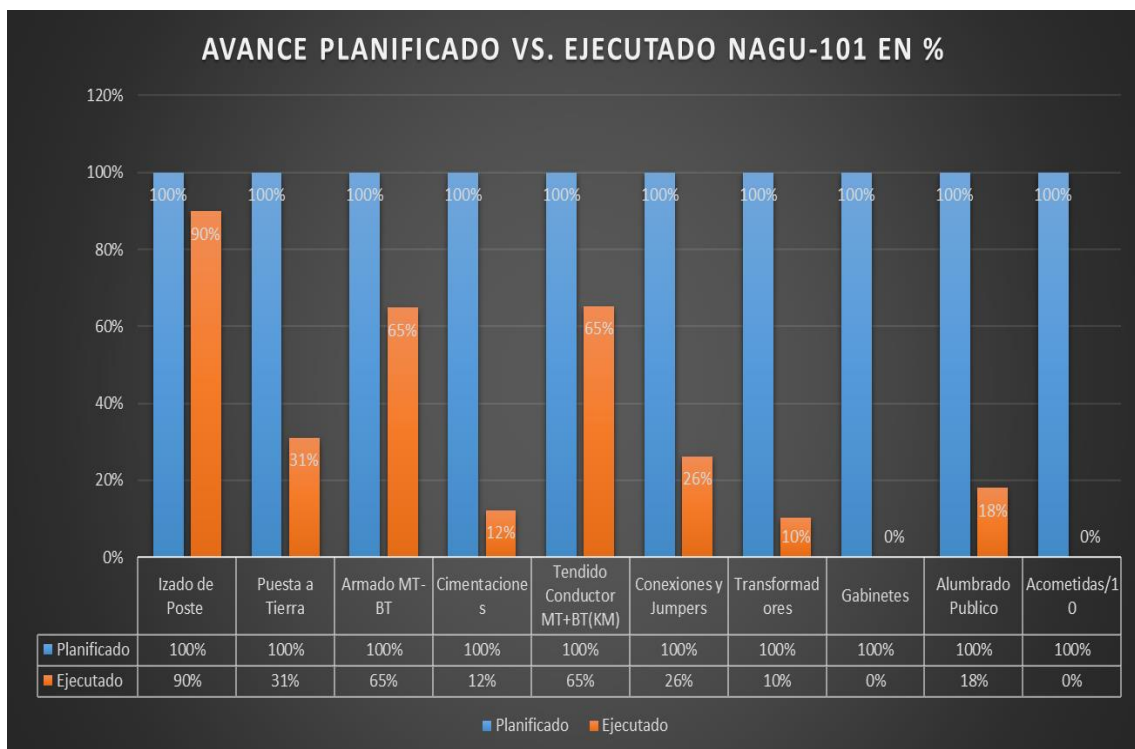

## Proyecto NAGU102

### LOTE 7 NAGU-102

#### AVANCE TOTAL DE OBRA NAGU-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,615.00	1,954.00	3,243.00	1,127.00	191,306.000	5,318.00	313.00	231.00	2,555.00	7,998.00
Ejecutado	2,361.00	1,397.00	2,051.00	0.00	91,210.000	657.00	68.00	0.00	444.00	0.00


#### AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO NAGU-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,615.00	1,630.00	2,863.00	1,107.13	128,741.00	2,680.00	174.00	0.00	1,154.00	2,651.00
Ejecutado	2,361.00	1,397.00	2,051.00	0.00	91,210.00	657.00	68.00	0.00	444.00	0.00

#### PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL NAGU-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	90%	71%	63%	0%	48%	12%	22%	0%	17%	0%

### AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO NAGU-102 EN %

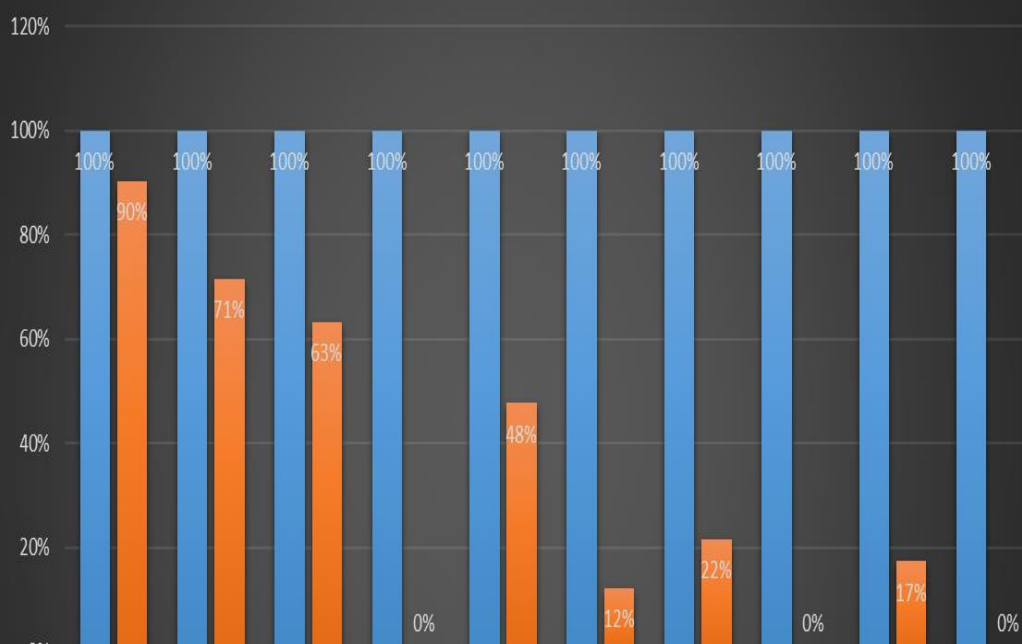

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas/10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	90%	71%	63%	0%	48%	12%	22%	0%	17%	0%

■ Planificado ■ Ejecutado

## Proyecto MOCA103

### LOTE 8 MOCA-103

#### AVANCE TOTAL DE OBRA MOCA-103

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	3,269.00	2,542.00	4,273.00	350.00	257,343.000	7,064.00	401.00	242.00	3,272.00	12,501.00
Ejecutado	2,677.00	1,542.00	1,842.00	262.00	59,630.000	1,162.00	197.00	0.00	446.00	0.00


#### AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO MOCA-103

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,912.00	1,479.00	2,658.00	305.00	158,463.00	3,125.00	243.00	0.00	1,863.00	3,549.00
Ejecutado	2,677.00	1,542.00	1,842.00	262.00	59,630.00	1,162.00	197.00	0.00	446.00	0.00

#### PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL MOCA-103

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	82%	61%	43%	75%	23%	16%	49%	0%	14%	0%

### AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO MOCA-103 EN %

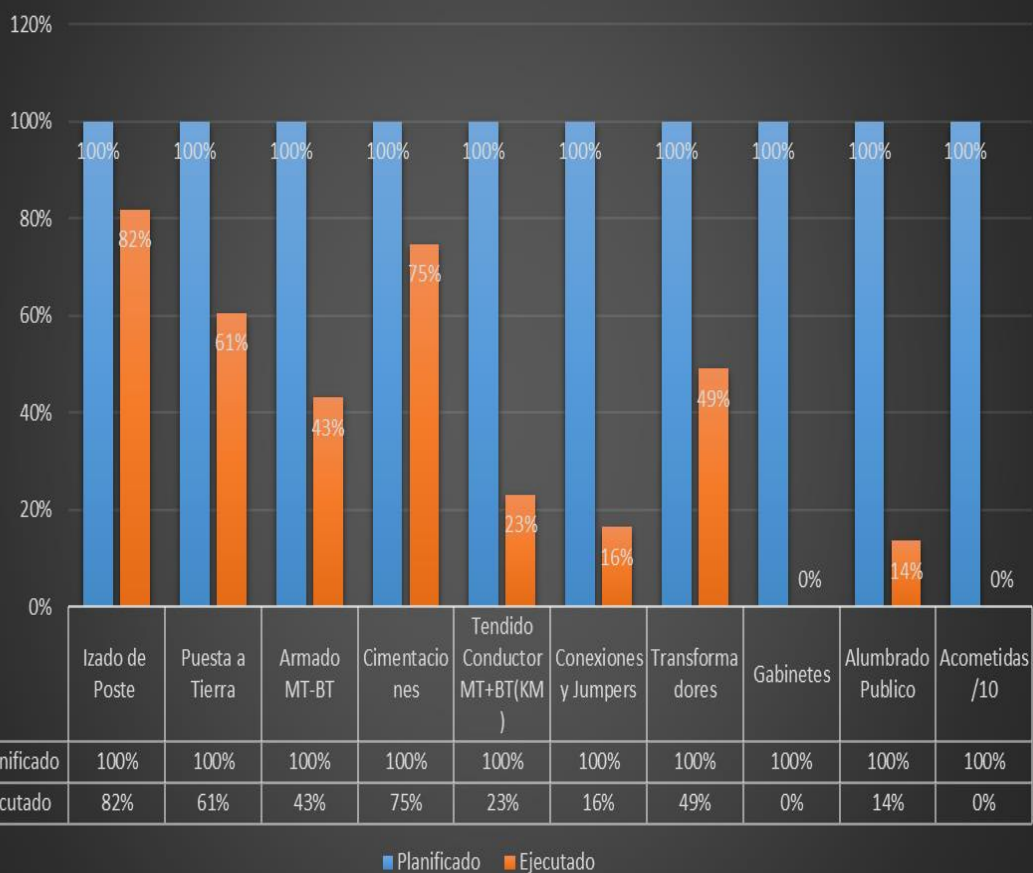

## Proyecto SABY102

### LOTE 9 SABY-102

#### AVANCE TOTAL DE OBRA SABY-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	667.00	436.00	808.00	125.00	50,143.00	1,424	82	681.00	2,555.00
Ejecutado	652.00	342.00	760.00	71.00	50,210.00	1,261	77	620.00	1,595.00


#### AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO SABY-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	667.00	436.00	808.00	125.00	50,143.00	1,424.00	82.00	681.00	2,555.00
Ejecutado	652.00	342.00	760.00	71.00	50,210.00	1,261.00	77.00	620.00	1,595.00

#### PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL SABY-102

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Cimentaciones	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	98%	78%	94%	57%	100%	89%	94%	91%	62%

### AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO SABY-102 EN %

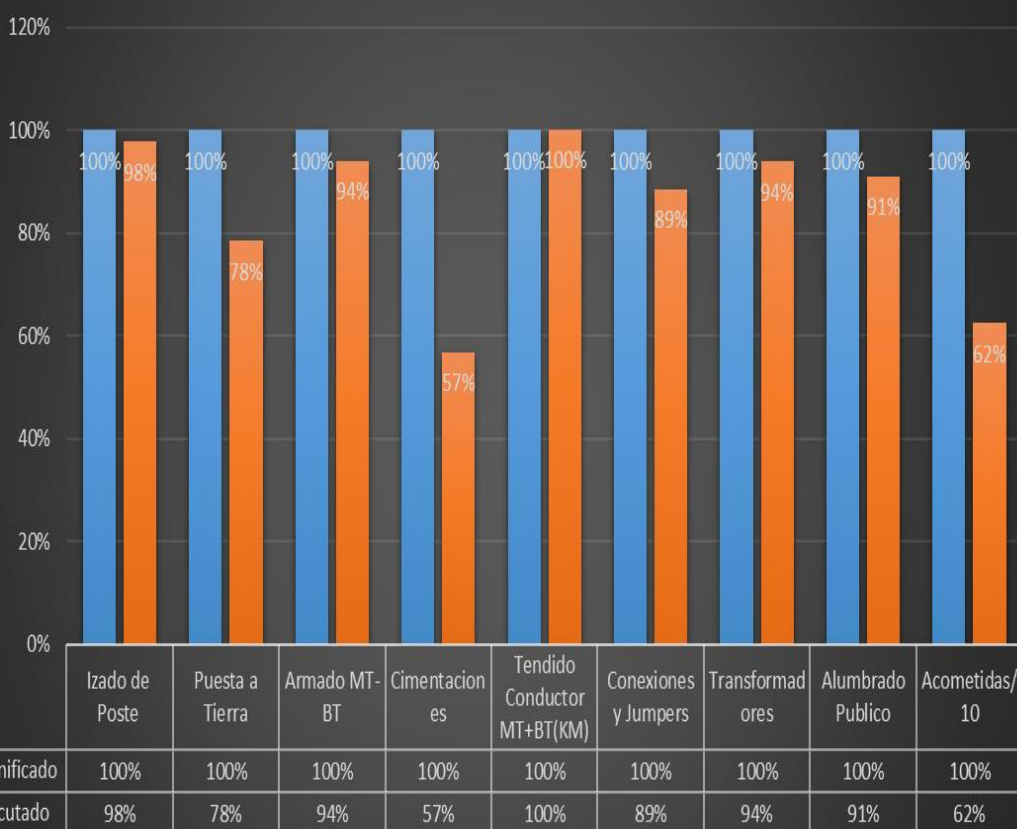

■ Planificado ■ Ejecutado

## Proyecto LOTE10

### LOTE 10 LOTE-10

#### AVANCE TOTAL DE OBRA LOTE-10

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	2,106.00	1,374.00	2,580.00	157,330.000	4,505.00	356.00	288.00	1,938.00	8,000.00
Ejecutado	1,604.00	780.00	1,287.00	82,780.000	206.00	39.00	0.00	465.00	0.00


#### AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO LOTE-10

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	1,955.00	1,150.00	1,429.00	113,520.00	2,416.00	95.00	0.00	873.00	461.00
Ejecutado	1,604.00	780.00	1,287.00	82,780.00	206.00	39.00	0.00	465.00	0.00

#### PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL LOTE-10

	Izado de Poste	Puesta a Tierra	Armado MT-BT	Tendido Conductor MT+BT(KM)	Conexiones y Jumpers	Transformadores	Gabinetes	Alumbrado Publico	Acometidas /10
Planificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	76%	57%	50%	53%	5%	11%	0%	24%	0%

### AVANCE PLANIFICADO VS. EJECUTADO LOTE-10 EN %

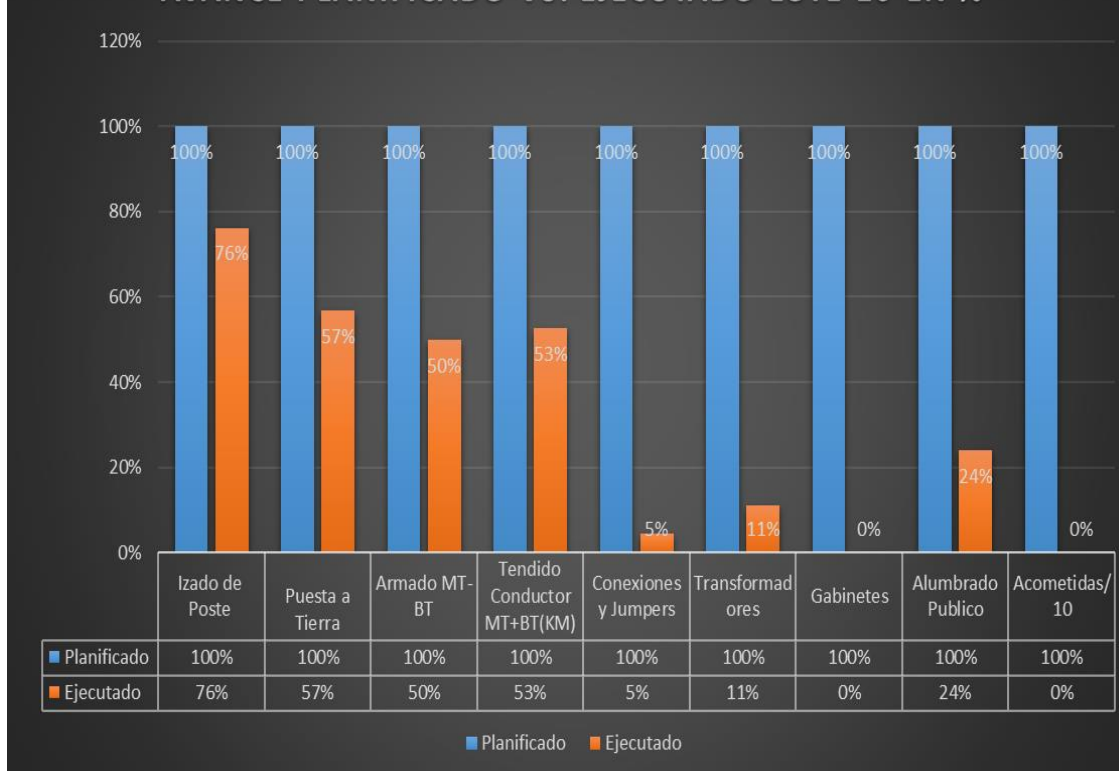

**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:

