

















































# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2018												S
							18	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
0			<b>Calendario de Ejecución NAGU102</b>	<b>387 días</b>	<b>mié 1/7/20</b>	<b>jue 23/12/21</b>													
1			<b>Rehabilitación de Redes NAGU102</b>	<b>387 días</b>	<b>mié 1/7/20</b>	<b>jue 23/12/21</b>													
2			<b>Ejecución</b>	<b>367 días</b>	<b>mié 1/7/20</b>	<b>jue 25/11/21</b>													
3			<b>Polígono 1</b>	<b>169 días</b>	<b>mié 1/7/20</b>	<b>lun 22/2/21</b>													
4			<b>Instalación</b>	<b>169 días</b>	<b>mié 1/7/20</b>	<b>lun 22/2/21</b>													
5			Excavaciones	26 días	mié 1/7/20	mié 5/8/20													
6			Izado de postes	22 días	vie 3/7/20	lun 3/8/20													
7			Cimentaciones	27 días	jue 2/7/20	vie 7/8/20													
8			Retenidas	21 días	vie 24/7/20	vie 21/8/20													
9			Armados MT y BT	40 días	vie 24/7/20	jue 17/9/20													
10			Tendido de Conductor MT y BT	34 días	vie 7/8/20	mié 23/9/20													
11			Conexiones y Jumpers	40 días	mar 11/8/20	lun 5/10/20													
12			Puesta a Tierra	40 días	mar 11/8/20	lun 5/10/20													
13			Transformadores	19 días	vie 21/8/20	mié 16/9/20													
14			Alumbrado Público	53 días	vie 21/8/20	mar 3/11/20													
15			Acometida	70 días	lun 16/11/20	vie 19/2/21													
16			Finalizacion del Poligono 1	1 día	lun 22/2/21	lun 22/2/21													
17			<b>Remoción</b>	<b>70 días</b>	<b>vie 13/11/20</b>	<b>vie 19/2/21</b>													
18			Tendido de Media y Baja Tensión	70 días	vie 13/11/20	vie 19/2/21													
19			Armados de Media y Baja Tensión	70 días	vie 13/11/20	vie 19/2/21													
20			Transformadores	70 días	vie 13/11/20	vie 19/2/21													





























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018							S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21			Remocion de postes	70 días	vie 13/11/20	vie 19/2/21												
22			<b>Polígono 2</b>	<b>164 días</b>	<b>mar 4/8/20</b>	<b>vie 19/3/21</b>												
23			<b>Instalación</b>	<b>164 días</b>	<b>mar 4/8/20</b>	<b>vie 19/3/21</b>												
24			Excavaciones	14 días	jue 6/8/20	mar 25/8/20												
25			Izado de postes	12 días	mar 4/8/20	mié 19/8/20												
26			Cimentaciones	17 días	mié 5/8/20	jue 27/8/20												
27			Retenidas	12 días	lun 24/8/20	mar 8/9/20												
28			Armados MT y BT	19 días	vie 18/9/20	mié 14/10/20												
29			Tendido de Conductor MT y BT	18 días	jue 24/9/20	lun 19/10/20												
30			Conexiones y Jumpers	20 días	mar 13/10/20	lun 9/11/20												
31			Puesta a Tierra	20 días	mar 13/10/20	lun 9/11/20												
32			Transformadores	9 días	vie 23/10/20	mié 4/11/20												
33			Alumbrado Público	20 días	mié 18/11/20	mar 15/12/20												
34			Acometida	19 días	lun 22/2/21	jue 18/3/21												
35			Finalizacion del Poligono 2	1 día	vie 19/3/21	vie 19/3/21												
36			<b>Remoción</b>	<b>19 días</b>	<b>lun 22/2/21</b>	<b>jue 18/3/21</b>												
37			Tendido de Media y Baja Tensión	19 días	lun 22/2/21	jue 18/3/21												
38			Armados de Media y Baja Tensión	19 días	lun 22/2/21	jue 18/3/21												
39			Transformadores	19 días	lun 22/2/21	jue 18/3/21												
40			Remocion de postes	19 días	lun 22/2/21	jue 18/3/21												
41			<b>Polígono 3</b>	<b>192 días</b>	<b>mar 25/8/20</b>	<b>mié 19/5/21</b>												






























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018						S			
							A	M	J	J	A	S	O	N	D				
42			Instalación	192 días	mar 25/8/20	mié 19/5/21													
43			Excavaciones	22 días	mié 26/8/20	jue 24/9/20													
44			Izado de postes	21 días	mar 25/8/20	mar 22/9/20													
45			Cimentaciones	24 días	jue 27/8/20	mar 29/9/20													
46			Retenidas	15 días	mié 9/9/20	mar 29/9/20													
47			Armados MT y BT	19 días	jue 15/10/20	mar 10/11/20													
48			Tendido de Conductor MT y BT	27 días	mar 20/10/20	mié 25/11/20													
49			Conexiones y Jumpers	34 días	mar 24/11/20	vie 8/1/21													
50			Puesta a Tierra	40 días	mar 24/11/20	lun 18/1/21													
51			Transformadores	18 días	jue 26/11/20	lun 21/12/20													
52			Alumbrado Público	35 días	mié 30/12/20	mar 16/2/21													
53			Acometida	43 días	vie 19/3/21	mar 18/5/21													
54			Finalizacion del Poligono 3	1 día	mié 19/5/21	mié 19/5/21													
55			Remoción	43 días	jue 18/3/21	mar 18/5/21													
56			Tendido de Media y Baja Tensión	43 días	jue 18/3/21	mar 18/5/21													
57			Armados de Media y Baja Tensión	43 días	jue 18/3/21	mar 18/5/21													
58			Transformadores	43 días	jue 18/3/21	mar 18/5/21													
59			Remocion de postes	43 días	jue 18/3/21	mar 18/5/21													
60			Polígono 4	207 días	mié 23/9/20	jue 8/7/21													
61			Instalación	207 días	mié 23/9/20	jue 8/7/21													
62			Excavaciones	28 días	vie 25/9/20	mar 3/11/20													

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018							S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D			
63			Izado de postes	26 días	mié 23/9/20	mié 28/10/20												
64			Cimentaciones	18 días	mié 7/10/20	vie 30/10/20												
65			Retenidas	22 días	mié 28/10/20	jue 26/11/20												
66			Armados MT y BT	40 días	mié 11/11/20	mar 5/1/21												
67			Tendido de Conductor MT y BT	37 días	jue 3/12/20	vie 22/1/21												
68			Conexiones y Jumpers	40 días	lun 11/1/21	vie 5/3/21												
69			Puesta a Tierra	40 días	mar 19/1/21	lun 15/3/21												
70			Transformadores	22 días	mié 27/1/21	jue 25/2/21												
71			Alumbrado Público	43 días	mié 17/2/21	vie 16/4/21												
72			Totalizadores	8 días	vie 26/2/21	mar 9/3/21												
73			Acometida	35 días	mié 19/5/21	mar 6/7/21												
74			Finalizacion del Poligono 4	2 días	mié 7/7/21	jue 8/7/21												
75			<b>Remoción</b>	<b>35 días</b>	<b>mar 18/5/21</b>	<b>mar 6/7/21</b>												
76			Tendido de Media y Baja Tensión	35 días	mar 18/5/21	mar 6/7/21												
77			Armados de Media y Baja Tensión	35 días	mar 18/5/21	mar 6/7/21												
78			Transformadores	35 días	mar 18/5/21	mar 6/7/21												
79			Remocion de postes	35 días	mar 18/5/21	mar 6/7/21												
80			<b>Polígono 5</b>	<b>277 días</b>	<b>mié 4/11/20</b>	<b>jue 25/11/21</b>												
81			<b>Instalación</b>	<b>277 días</b>	<b>mié 4/11/20</b>	<b>jue 25/11/21</b>												
82			Excavaciones	45 días	mié 4/11/20	mar 5/1/21												
83			Izado de postes	45 días	jue 5/11/20	mié 6/1/21												


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18	Semestre 2, 2018				S					
							A	M	J	J	A	S	O	N	D		
84			Cimentaciones	45 días	lun 9/11/20	vie 8/1/21											
85			Retenidas	31 días	vie 18/12/20	vie 29/1/21											
86			Armados MT y BT	70 días	mié 6/1/21	mar 13/4/21											
87			Tendido de Conductor MT y BT	62 días	lun 1/2/21	mar 27/4/21											
88			Conexiones y Jumpers	60 días	mar 13/4/21	lun 5/7/21											
89			Puesta a Tierra	60 días	mié 21/4/21	mar 13/7/21											
90			Transformadores	36 días	lun 5/4/21	lun 24/5/21											
91			Alumbrado Público	70 días	lun 10/5/21	vie 13/8/21											
92			Acometida	100 días	mié 7/7/21	mar 23/11/21											
93			Finalizacion del Poligono 5	2 días	mié 24/11/21	jue 25/11/21											
94			<b>Remoción</b>	<b>100 días</b>	<b>mar 6/7/21</b>	<b>mar 23/11/21</b>											
95			Tendido de Media y Baja Tensión	100 días	mar 6/7/21	mar 23/11/21											
96			Armados de Media y Baja Tensión	100 días	mar 6/7/21	mar 23/11/21											
97			Transformadores	100 días	mar 6/7/21	mar 23/11/21											
98			Remocion de postes	100 días	mar 6/7/21	mar 23/11/21											
99			<b>Cierre de Obras</b>	<b>20 días</b>	<b>vie 26/11/21</b>	<b>jue 23/12/21</b>											
100			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicio	0.77 mss	vie 26/11/21	jue 23/12/21											
101			Presentación de Cierre de Obras	0 días	jue 23/12/21	jue 23/12/21											


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

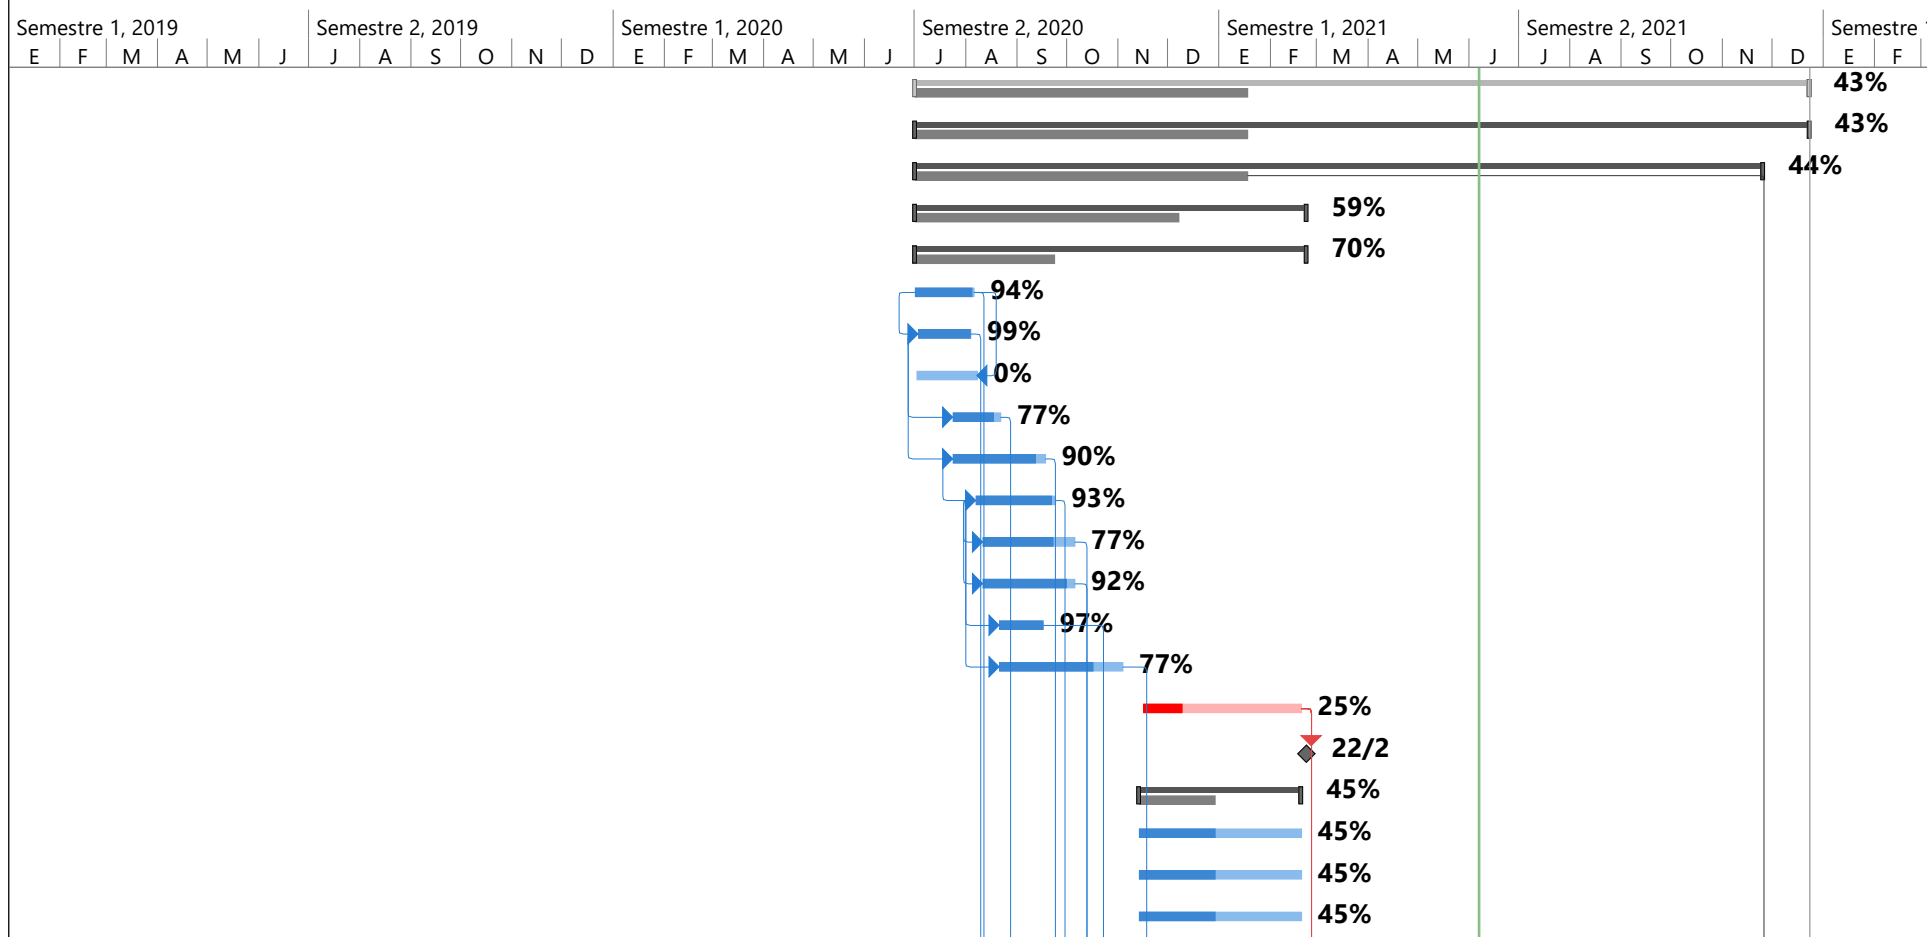


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

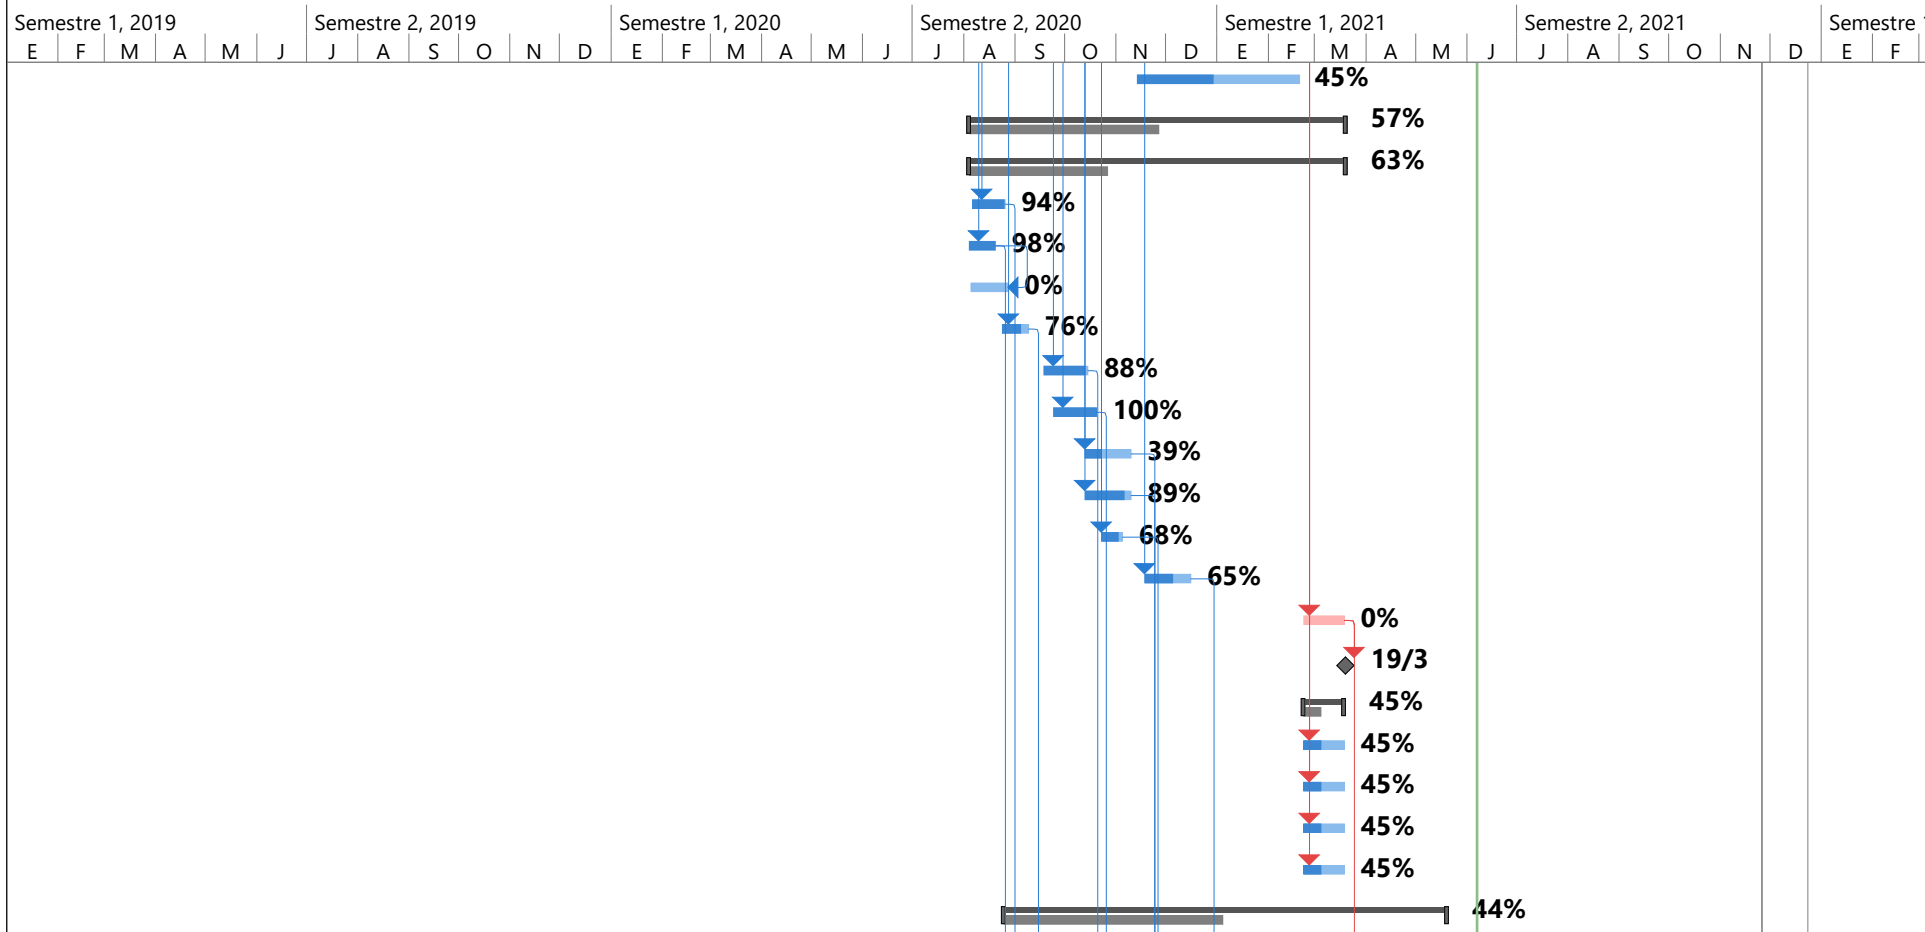

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021

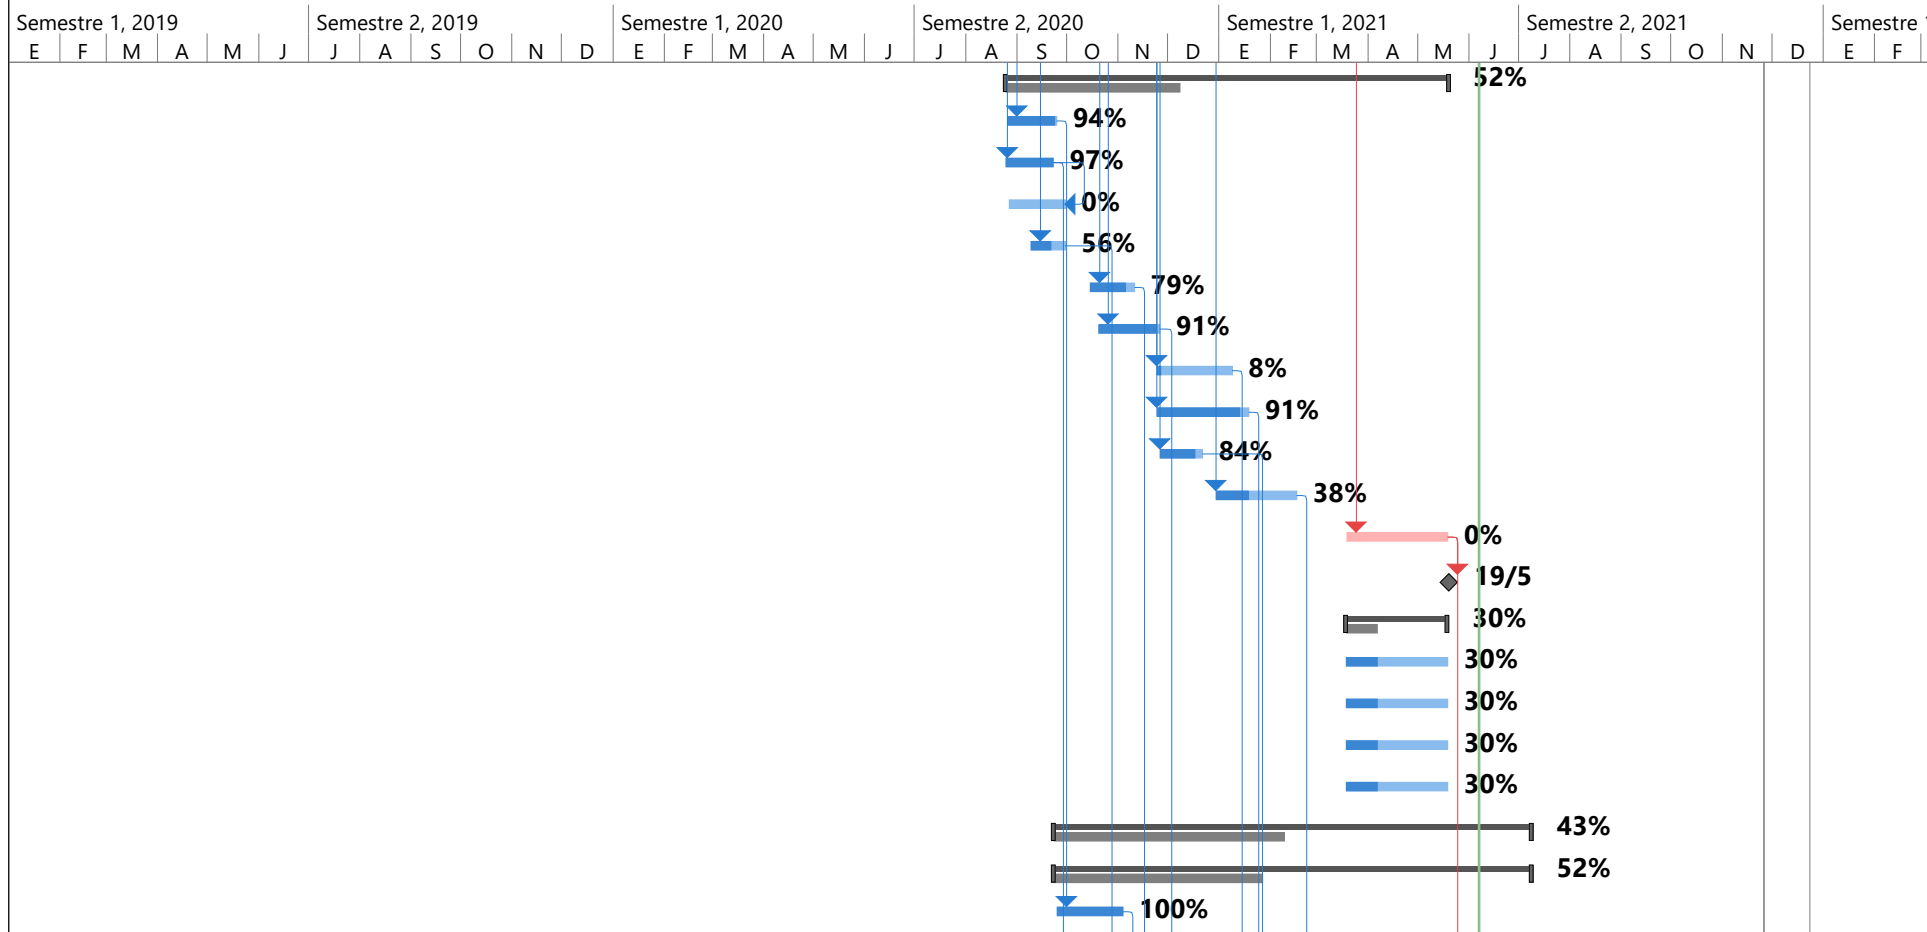

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	





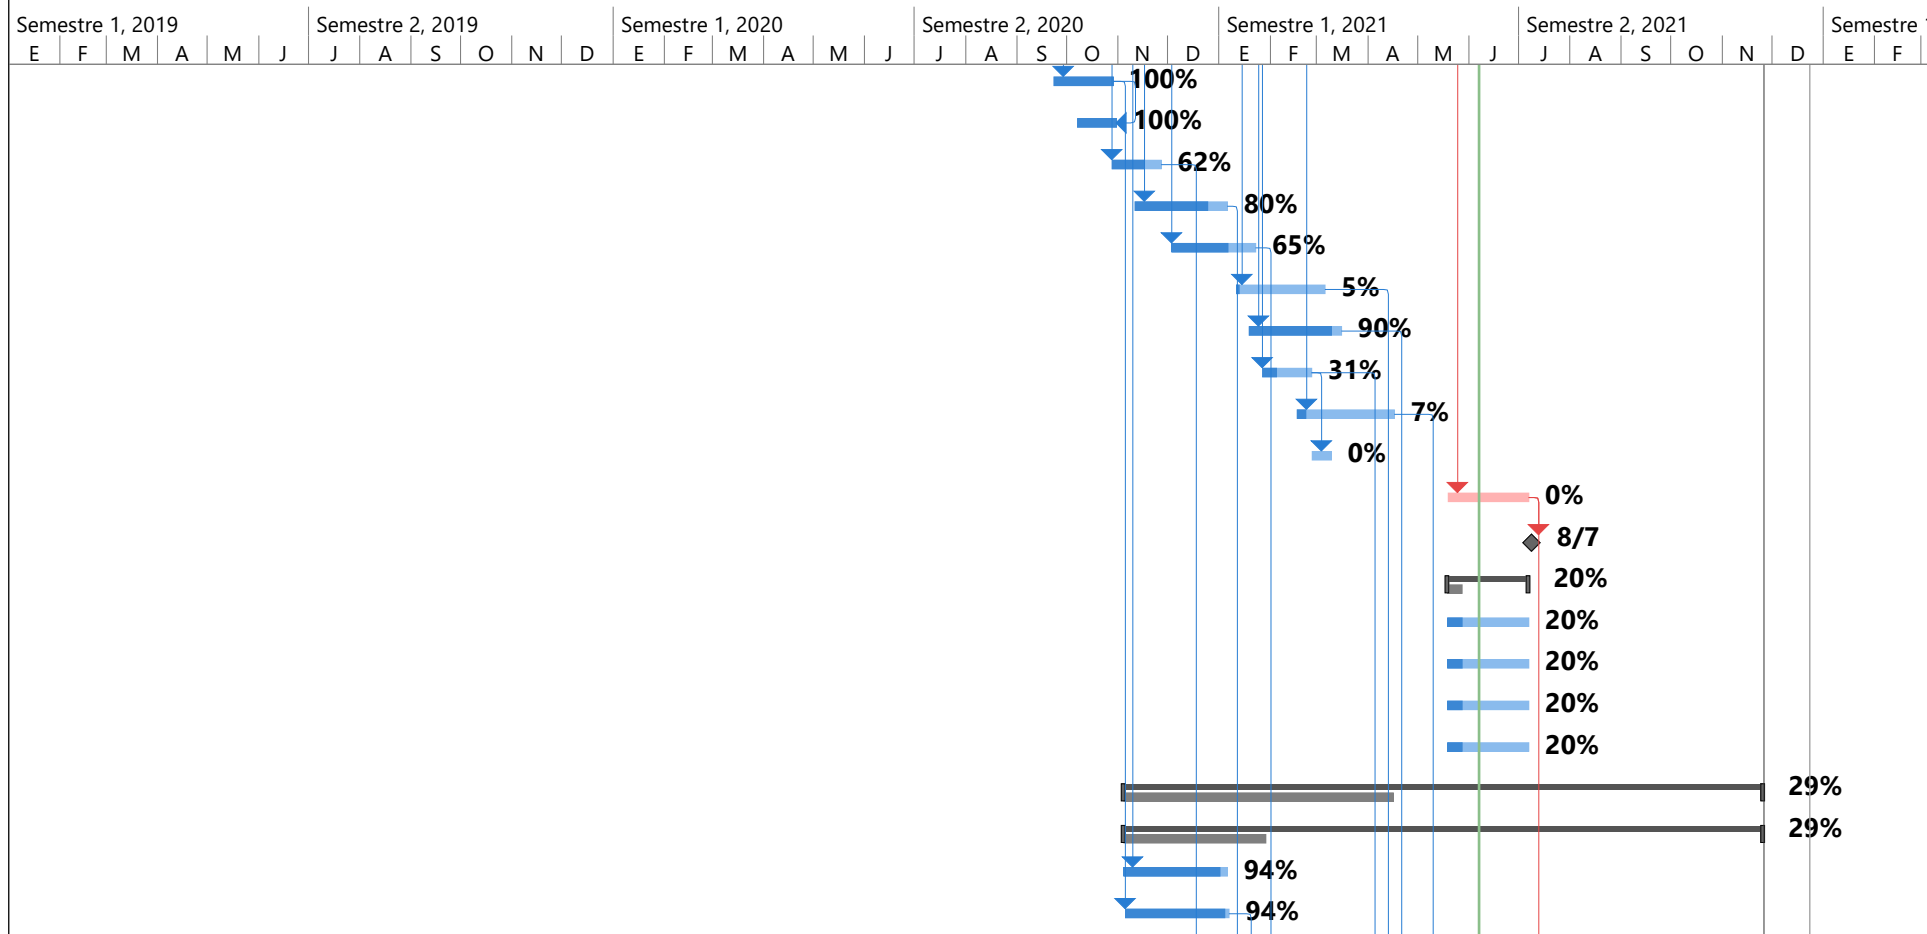




















# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución NAGU102 Mayo2021



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
