

























Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18	Semestre 2, 2018												S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D						
0			Calendario de Ejecución MOCA103	378 días	mié 1/7/20	vie 10/12/21															
1			Rehabilitación de Redes MOCA103	378 días	mié 1/7/20	vie 10/12/21															
2			Ejecución	378 días	mié 1/7/20	vie 10/12/21															
3			Polígono 1	147 días	mié 1/7/20	jue 21/1/21															
4			Instalación	147 días	mié 1/7/20	jue 21/1/21															
5			Excavaciones	36 días	mié 1/7/20	mié 19/8/20															
6			Izado de postes	31 días	vie 3/7/20	vie 14/8/20															
7			Cimentaciones	35 días	lun 6/7/20	vie 21/8/20															
8			Retenidas	31 días	lun 10/8/20	lun 21/9/20															
9			Armados MT y BT	51 días	lun 10/8/20	lun 19/10/20															
10			Tendido de Conductor MT y BT	50 días	lun 24/8/20	vie 30/10/20															
11			Conexiones y Jumpers	54 días	lun 7/9/20	jue 19/11/20															
12			Puesta a Tierra	36 días	lun 7/9/20	lun 26/10/20															
13			Transformadores	25 días	mar 29/9/20	lun 2/11/20															
14			Alumbrado Público	24 días	mar 29/9/20	vie 30/10/20															
15			Acometida	47 días	lun 16/11/20	mar 19/1/21															
16			Finalizacion del Poligono 1	2 días	mié 20/1/21	jue 21/1/21															
17			Remoción	35 días	vie 13/11/20	vie 1/1/21															
18			Tendido de Media y Baja Tensión	35 días	vie 13/11/20	vie 1/1/21															
19			Armados de Media y Baja Tensión	35 días	vie 13/11/20	vie 1/1/21															
20			Transformadores	35 días	vie 13/11/20	vie 1/1/21															



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018							S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21			Remocion de postes	35 días	vie 13/11/20	vie 1/1/21												
22			Polígono 2	142 días	lun 17/8/20	mar 2/3/21												
23			Instalación	142 días	lun 17/8/20	mar 2/3/21												
24			Excavaciones	20 días	jue 20/8/20	mié 16/9/20												
25			Izado de postes	17 días	lun 17/8/20	mar 8/9/20												
26			Cimentaciones	26 días	lun 24/8/20	lun 28/9/20												
27			Retenidas	16 días	mar 22/9/20	mar 13/10/20												
28			Armados MT y BT	26 días	mar 20/10/20	mar 24/11/20												
29			Tendido de Conductor MT y BT	22 días	lun 2/11/20	mar 1/12/20												
30			Conexiones y Jumpers	25 días	vie 20/11/20	jue 24/12/20												
31			Puesta a Tierra	25 días	mar 3/11/20	lun 7/12/20												
32			Transformadores	13 días	mar 24/11/20	jue 10/12/20												
33			Alumbrado Público	17 días	lun 23/11/20	mar 15/12/20												
34			Acometida	29 días	mié 20/1/21	lun 1/3/21												
35			Finalizacion del Poligono 2	1 día	mar 2/3/21	mar 2/3/21												
36			Remoción	22 días	mié 20/1/21	jue 18/2/21												
37			Tendido de Media y Baja Tensión	22 días	mié 20/1/21	jue 18/2/21												
38			Armados de Media y Baja Tensión	22 días	mié 20/1/21	jue 18/2/21												
39			Transformadores	22 días	mié 20/1/21	jue 18/2/21												
40			Remocion de postes	22 días	mié 20/1/21	jue 18/2/21												
41			Polígono 3	183 días	mié 16/9/20	vie 28/5/21												
























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018							S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D			
42			Instalación	183 días	mié 16/9/20	vie 28/5/21												
43			Excavaciones	38 días	jue 17/9/20	lun 9/11/20												
44			Izado de postes	36 días	mié 16/9/20	mié 4/11/20												
45			Cimentaciones	37 días	mar 29/9/20	mié 18/11/20												
46			Retenidas	29 días	mié 14/10/20	lun 23/11/20												
47			Armados MT y BT	57 días	mié 25/11/20	jue 11/2/21												
48			Tendido de Conductor MT y BT	56 días	mié 2/12/20	mié 17/2/21												
49			Conexiones y Jumpers	37 días	vie 8/1/21	lun 1/3/21												
50			Puesta a Tierra	37 días	mar 5/1/21	mié 24/2/21												
51			Transformadores	34 días	vie 8/1/21	mié 24/2/21												
52			Alumbrado Público	31 días	mié 30/12/20	mié 10/2/21												
53			Acometida	63 días	mar 2/3/21	jue 27/5/21												
54			Finalizacion del Poligono 3	1 día	vie 28/5/21	vie 28/5/21												
55			Remoción	47 días	mar 2/3/21	mié 5/5/21												
56			Tendido de Media y Baja Tensión	47 días	mar 2/3/21	mié 5/5/21												
57			Armados de Media y Baja Tensión	47 días	mar 2/3/21	mié 5/5/21												
58			Transformadores	47 días	mar 2/3/21	mié 5/5/21												
59			Remocion de postes	47 días	mar 2/3/21	mié 5/5/21												
60			Polígono 4	184 días	mar 10/11/20	vie 23/7/21												
61			Instalación	184 días	mar 10/11/20	vie 23/7/21												
62			Excavaciones	22 días	mar 10/11/20	mié 9/12/20												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018							S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D			
63			Izado de postes	20 días	jue 19/11/20	mié 16/12/20												
64			Cimentaciones	25 días	jue 19/11/20	mié 23/12/20												
65			Retenidas	15 días	mar 22/12/20	lun 11/1/21												
66			Armados MT y BT	31 días	vie 12/2/21	vie 26/3/21												
67			Tendido de Conductor MT y BT	32 días	jue 25/2/21	vie 9/4/21												
68			Conexiones y Jumpers	32 días	mar 9/3/21	mié 21/4/21												
69			Puesta a Tierra	22 días	jue 18/3/21	vie 16/4/21												
70			Transformadores	20 días	jue 18/3/21	mié 14/4/21												
71			Alumbrado Público	22 días	vie 19/3/21	lun 19/4/21												
72			Totalizadores	4 días	jue 15/4/21	mar 20/4/21												
73			Acometida	40 días	vie 28/5/21	jue 22/7/21												
74			Finalizacion del Poligono 4	1 día	vie 23/7/21	vie 23/7/21												
75			Remoción	40 días	vie 28/5/21	jue 22/7/21												
76			Tendido de Media y Baja Tensión	40 días	vie 28/5/21	jue 22/7/21												
77			Armados de Media y Baja Tensión	40 días	vie 28/5/21	jue 22/7/21												
78			Transformadores	40 días	vie 28/5/21	jue 22/7/21												
79			Remocion de postes	40 días	vie 28/5/21	jue 22/7/21												
80			Polígono 5	227 días	jue 10/12/20	vie 22/10/21												
81			Instalación	227 días	jue 10/12/20	vie 22/10/21												
82			Excavaciones	35 días	jue 10/12/20	mié 27/1/21												
83			Izado de postes	31 días	jue 17/12/20	jue 28/1/21												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18	Semestre 2, 2018												S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D						
84			Cimentaciones	31 días	jue 24/12/20	jue 4/2/21															
85			Retenidas	25 días	mar 12/1/21	lun 15/2/21															
86			Armados MT y BT	47 días	lun 29/3/21	mar 1/6/21															
87			Tendido de Conductor MT y BT	47 días	lun 12/4/21	mar 15/6/21															
88			Conexiones y Jumpers	30 días	jue 6/5/21	mié 16/6/21															
89			Puesta a Tierra	30 días	mar 25/5/21	lun 5/7/21															
90			Transformadores	29 días	vie 21/5/21	mié 30/6/21															
91			Alumbrado Público	32 días	mié 26/5/21	jue 8/7/21															
92			Acometida	64 días	vie 23/7/21	mié 20/10/21															
93			Finalizacion del Poligono 5	2 días	jue 21/10/21	vie 22/10/21															
94			Remoción	64 días	jue 22/7/21	mié 20/10/21															
95			Tendido de Media y Baja Tensión	64 días	jue 22/7/21	mié 20/10/21															
96			Armados de Media y Baja Tensión	64 días	jue 22/7/21	mié 20/10/21															
97			Transformadores	64 días	jue 22/7/21	mié 20/10/21															
98			Remocion de postes	64 días	jue 22/7/21	mié 20/10/21															
99			Polígono 6	226 días	jue 28/1/21	jue 9/12/21															
100			Instalación	226 días	jue 28/1/21	jue 9/12/21															
101			Excavaciones	23 días	jue 28/1/21	lun 1/3/21															
102			Izado de postes	21 días	vie 19/2/21	vie 19/3/21															
103			Cimentaciones	12 días	lun 8/3/21	mar 23/3/21															
104			Retenidas	17 días	mar 9/3/21	mié 31/3/21															


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	18			Semestre 2, 2018							S	
							A	M	J	J	A	S	O	N	D			
105			Armados MT y BT	55 días	mié 2/6/21	mar 17/8/21												
106			Tendido de Conductor MT y BT	35 días	mié 7/7/21	mar 24/8/21												
107			Conexiones y Jumpers	25 días	vie 23/7/21	jue 26/8/21												
108			Puesta a Tierra	15 días	mié 11/8/21	mar 31/8/21												
109			Transformadores	11 días	vie 6/8/21	vie 20/8/21												
110			Alumbrado Público	21 días	lun 16/8/21	lun 13/9/21												
111			Acometida	35 días	jue 21/10/21	mié 8/12/21												
112			Finalizacion del Poligono 5	1 día	jue 9/12/21	jue 9/12/21												
113			Remoción	35.88 días	mié 20/10/21	mié 8/12/21												
114			Tendido de Media y Baja Tensión	35 días	mié 20/10/21	mié 8/12/21												
115			Armados de Media y Baja Tensión	35 días	mié 20/10/21	mié 8/12/21												
116			Transformadores	35 días	mié 20/10/21	mié 8/12/21												
117			Remocion de postes	35 días	mié 20/10/21	mar 7/12/21												
118			Cierre Proyecto	2 días	jue 9/12/21	vie 10/12/21												


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

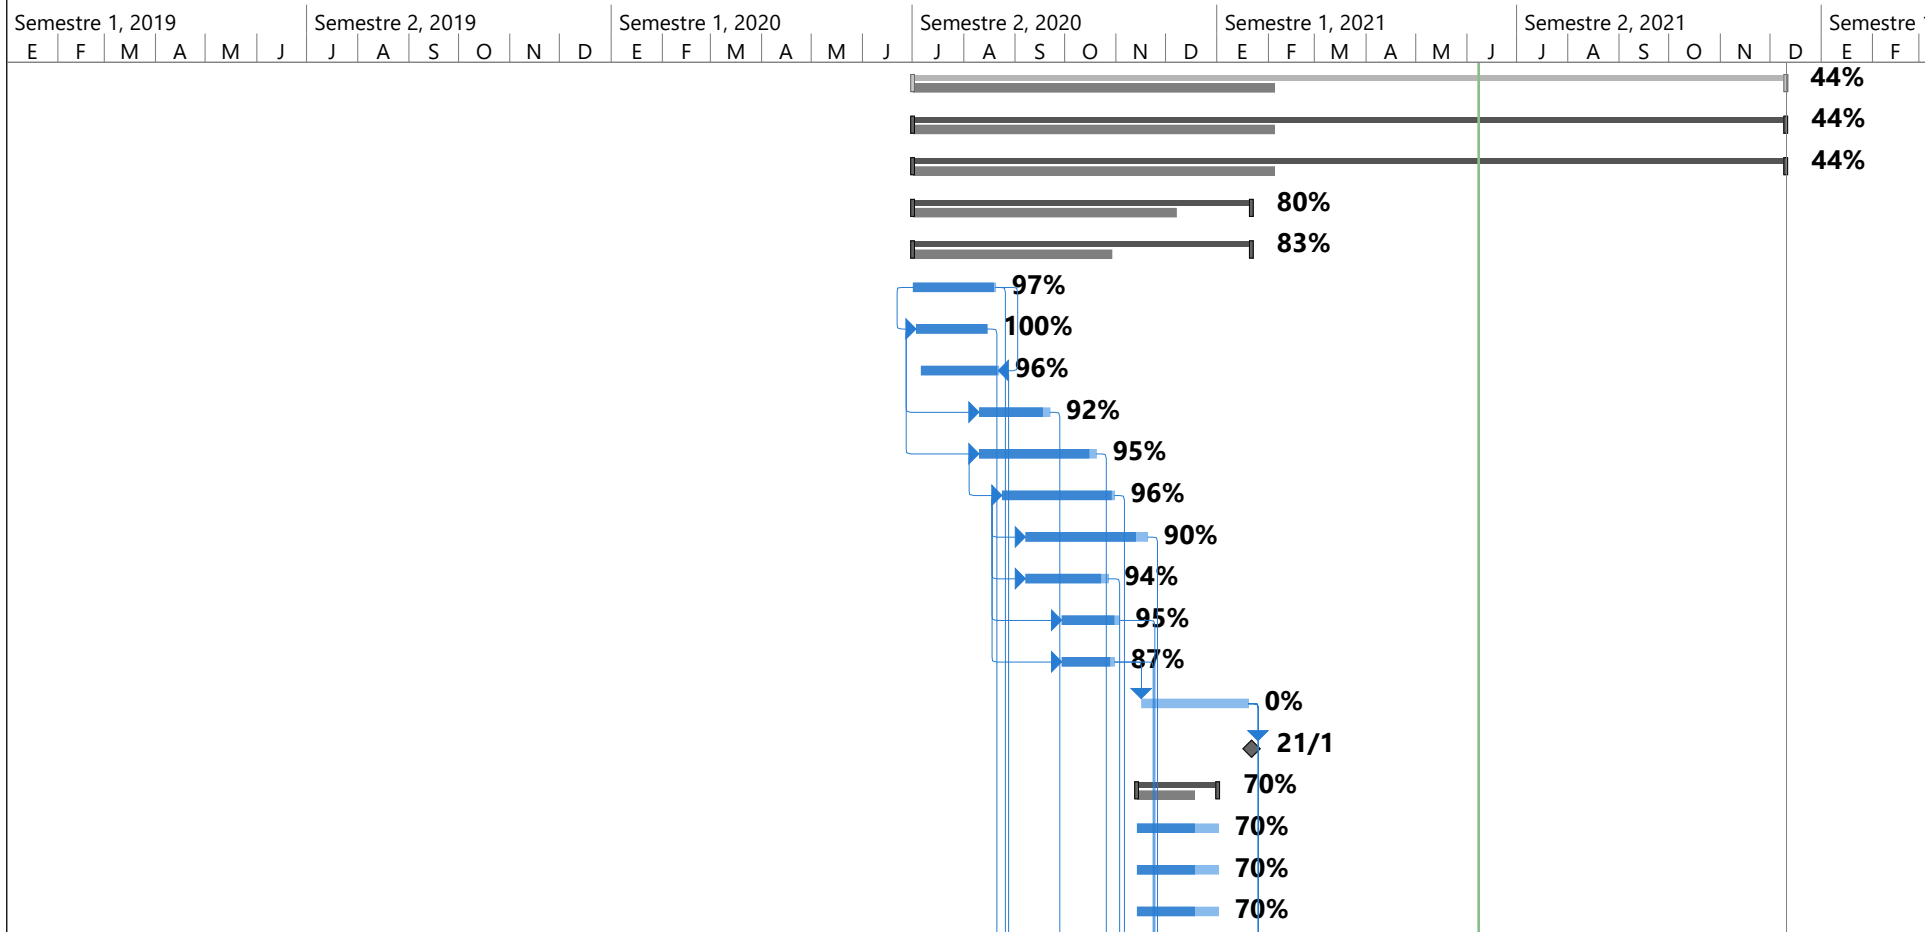


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

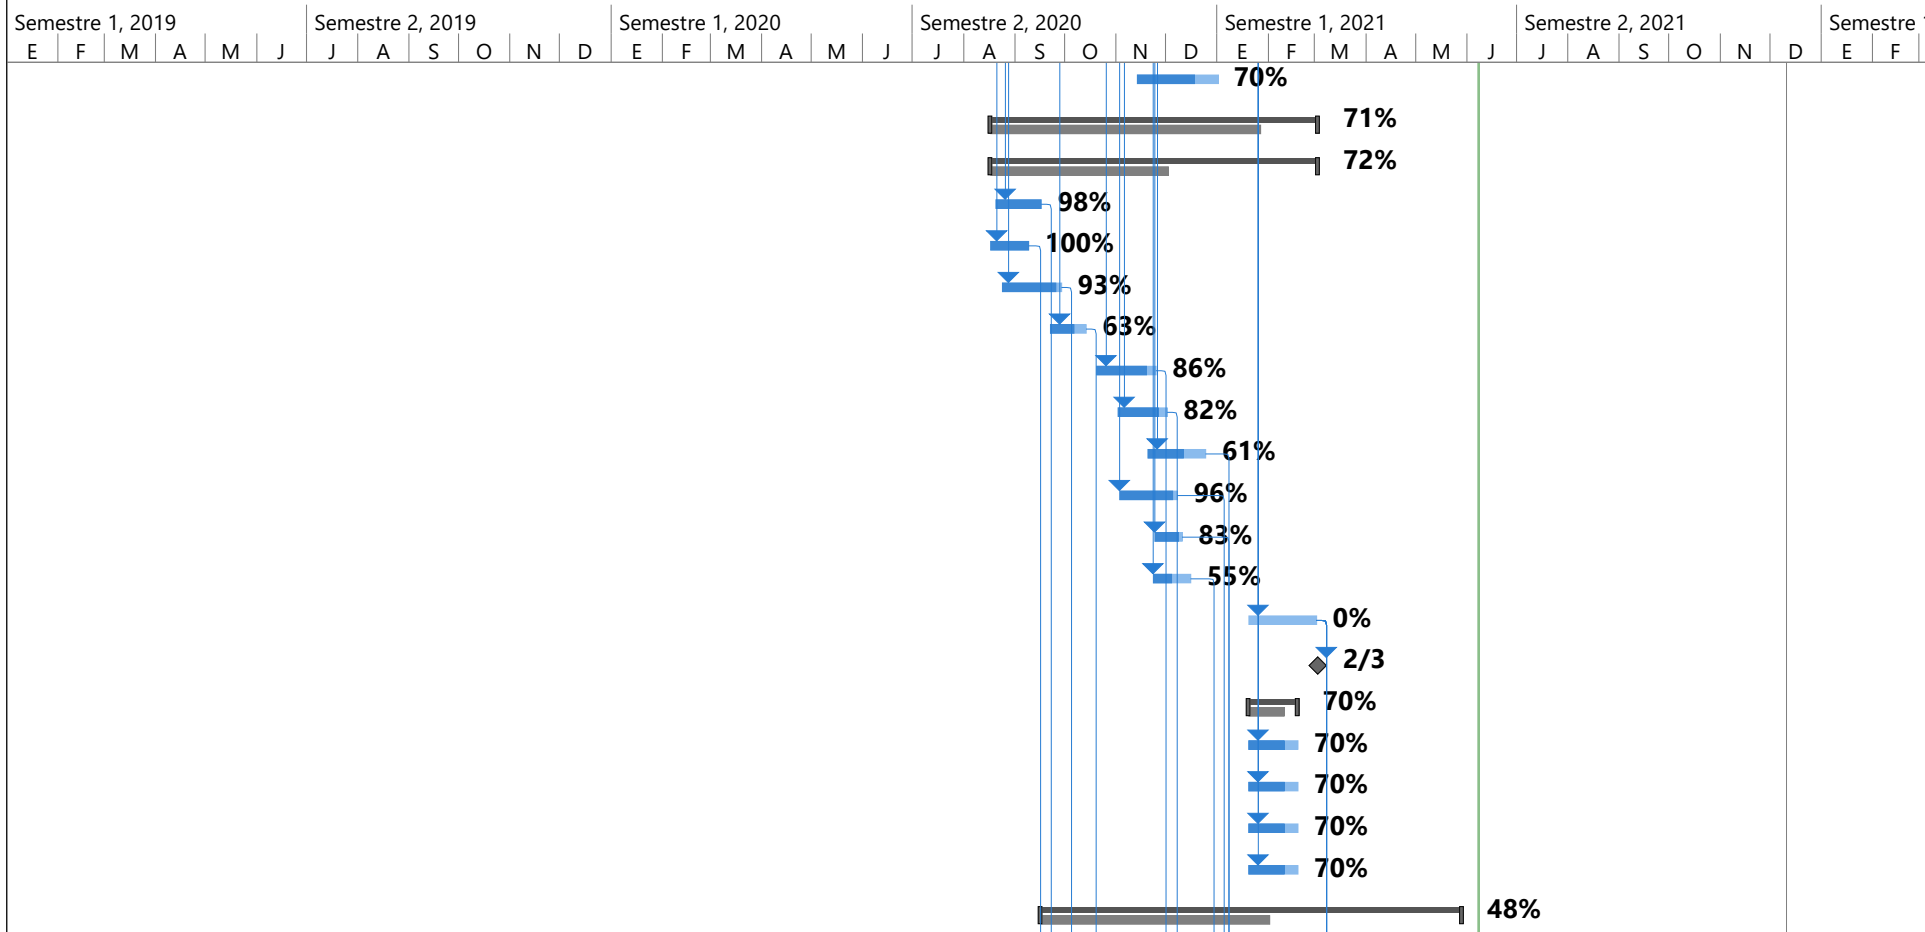


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

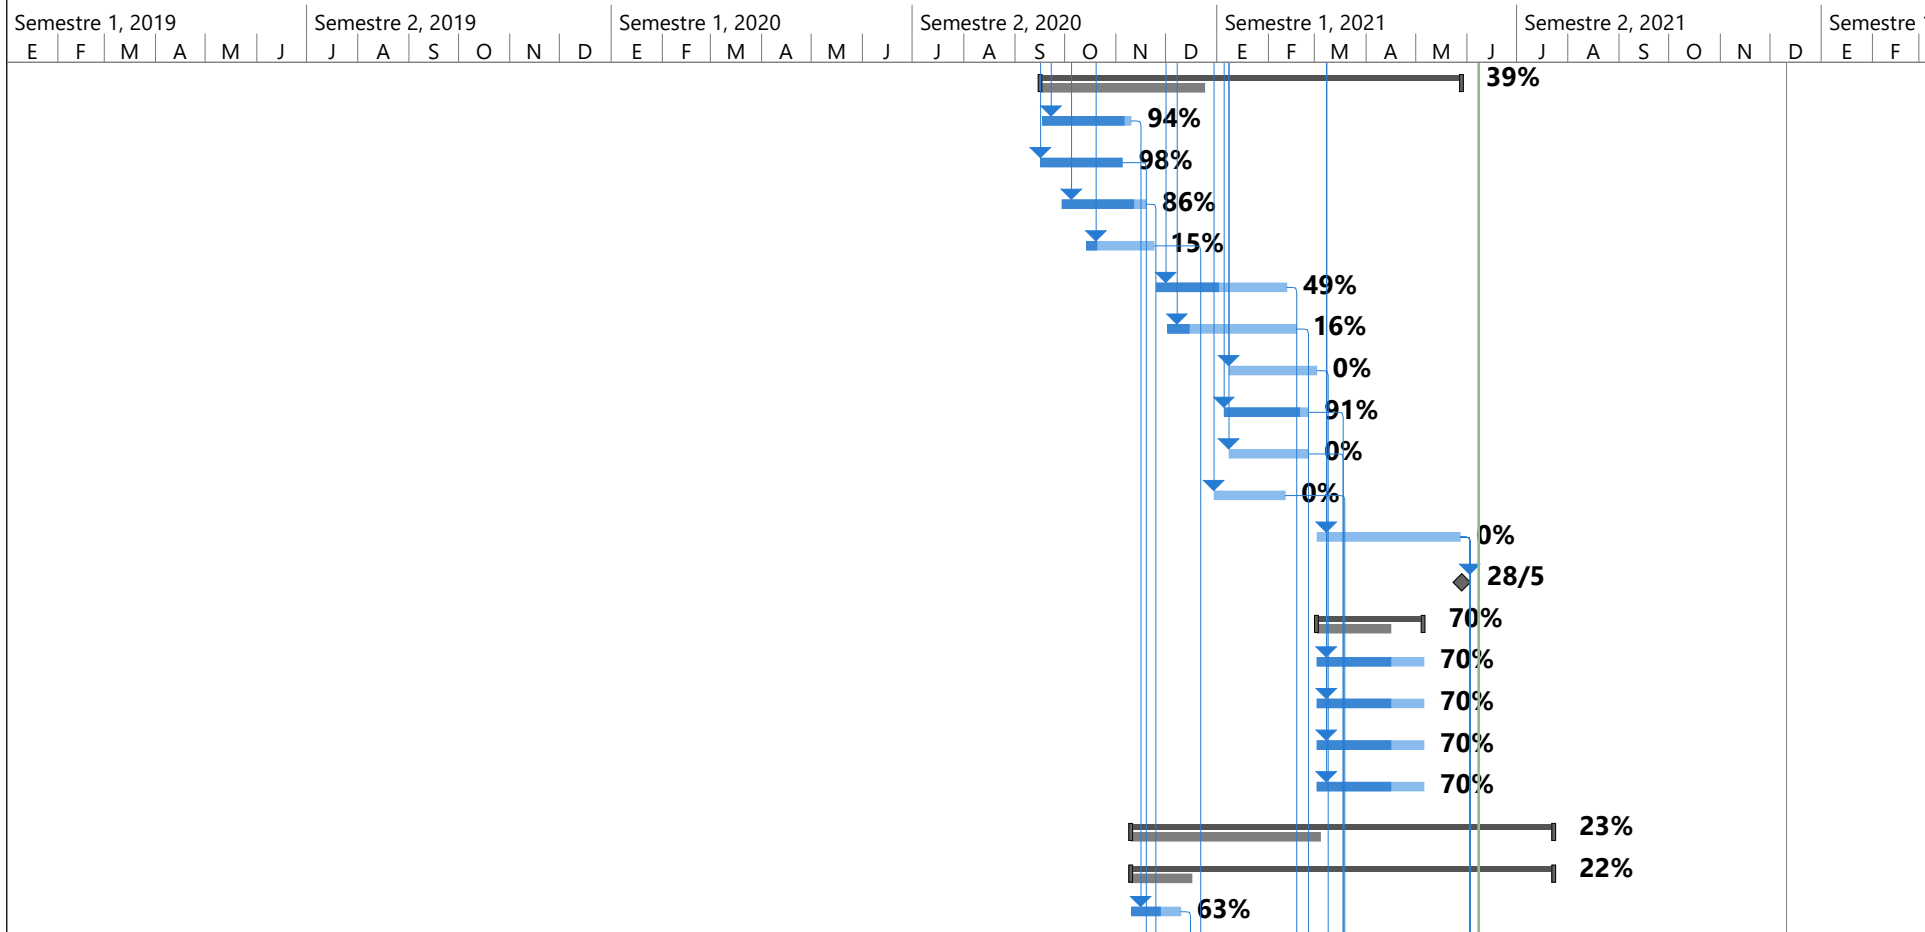


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

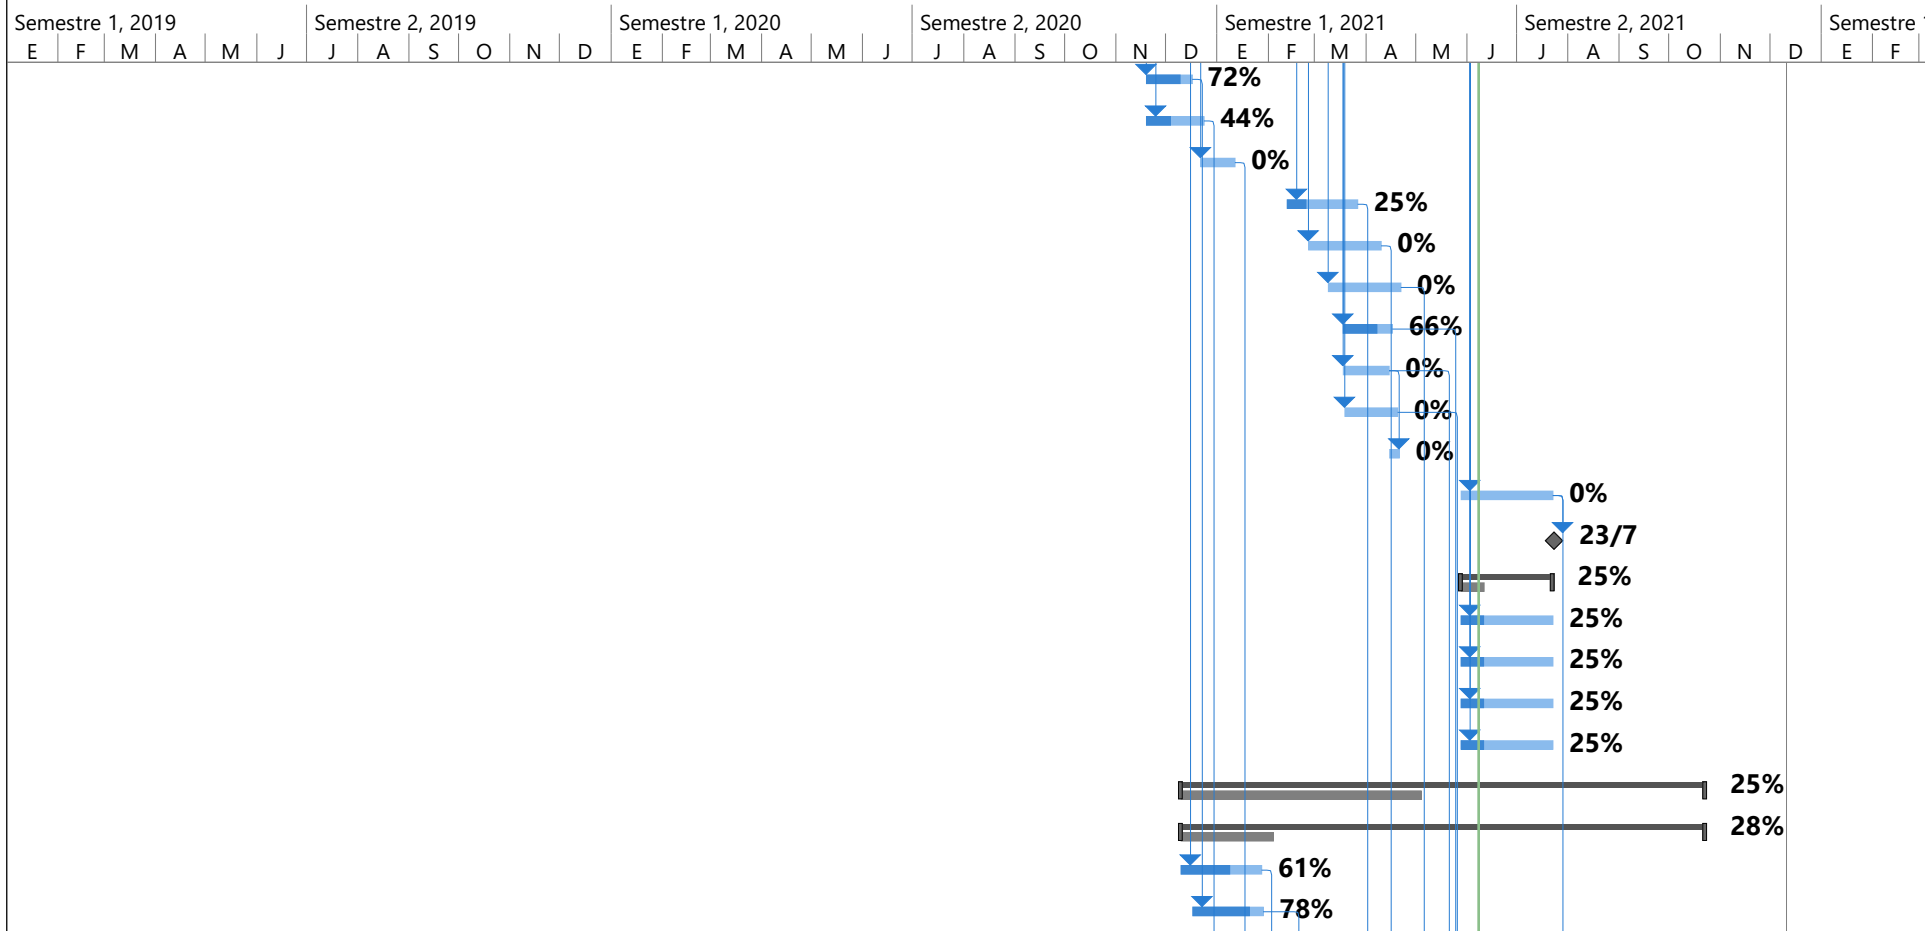

Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

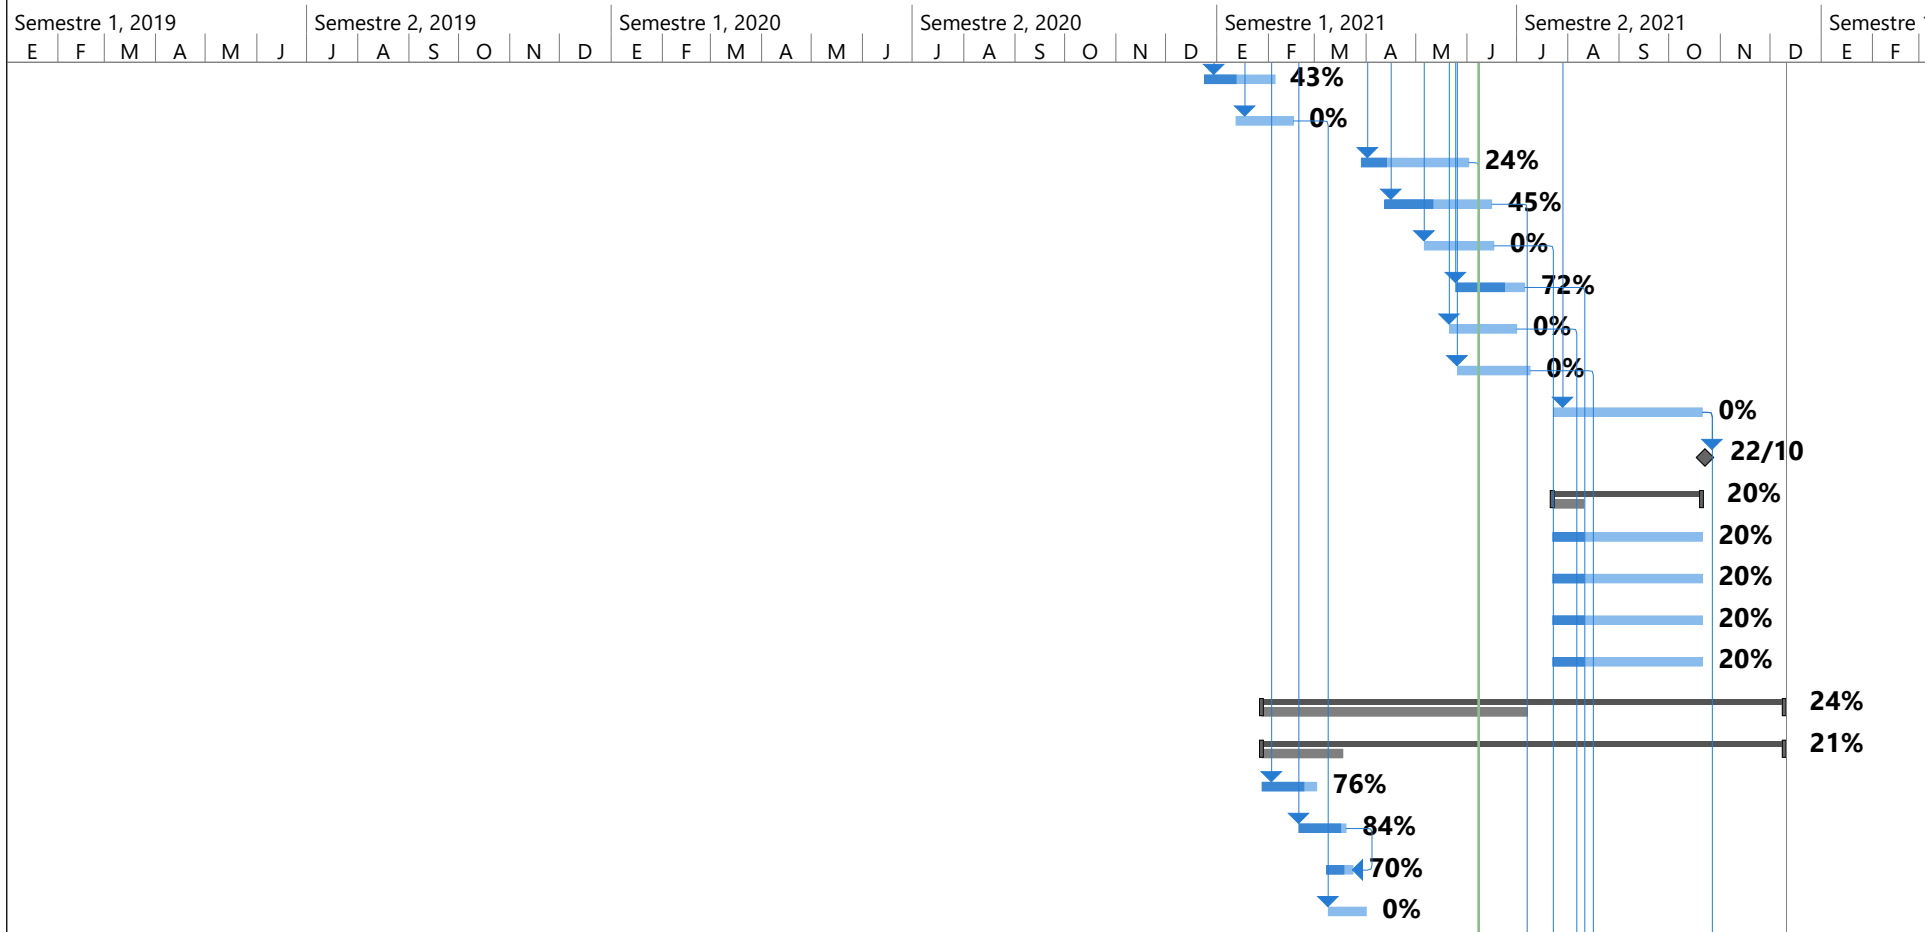

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MOCA103 Mayo2021

Semestre 1, 2019						Semestre 2, 2019						Semestre 1, 2020						Semestre 2, 2020						Semestre 1, 2021						Semestre 2, 2021						Semestre	
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F

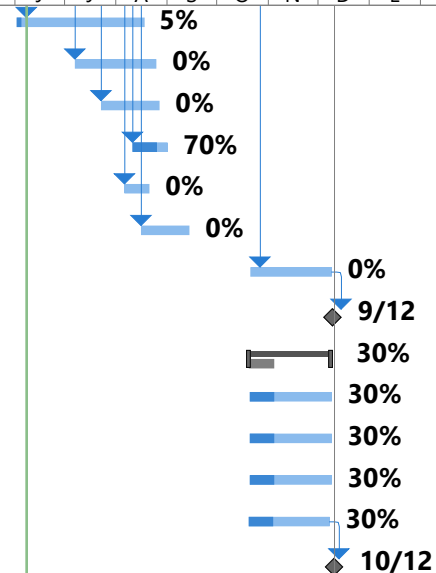

Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana


F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen



Fecha límite

