

























Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo				Semestre 2, 2018						Semestre 1,		
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	
0			Calendario de Ejecución NAGU101	289 días	mié 1/7/20												
1			Rehabilitación de Redes NAGU101	289 días	mié 1/7/20												
2			Ejecución	269 días	mié 1/7/20												
3			Polígono 1	122 días	mié 1/7/20												
4			Instalación	122 días	mié 1/7/20												
5			Excavaciones	18 días	mié 1/7/20												
6			Izado de postes	14 días	vie 3/7/20												
7			Cimentaciones	10 días	lun 13/7/20												
8			Retenidas	11 días	lun 10/8/20												
9			Armados MT y BT	15 días	lun 10/8/20												
10			Tendido de Conductor MT y BT	12 días	lun 24/8/20												
11			Conexiones y Jumpers	10 días	lun 7/9/20												
12			Puesta a Tierra	17 días	mié 26/8/20												
13			Transformadores	8 días	lun 7/9/20												
14			Alumbrado Público	9 días	lun 7/9/20												
15			Acometida	22 días	lun 16/11/20												
16			Finalizacion del Poligono 1	2 días	mié 16/12/20												
17			Remoción	22 días	vie 13/11/20												
18			Tendido de Media y Baja Tensión	22 días	vie 13/11/20												
19			Armados de Media y Baja Tensión	22 días	vie 13/11/20												
20			Transformadores	22 días	vie 13/11/20												





























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo				Semestre 2, 2018						Semestre 1,		
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	
21			Remocion de postes	22 días	vie 13/11/20												
22			Polígono 2	138 días	jue 23/7/20												
23			Instalación	138 días	jue 23/7/20												
24			Excavaciones	23 días	lun 27/7/20												
25			Izado de postes	19 días	jue 23/7/20												
26			Cimentaciones	12 días	mié 5/8/20												
27			Retenidas	14 días	mar 25/8/20												
28			Armados MT y BT	20 días	lun 31/8/20												
29			Tendido de Conductor MT y BT	16 días	mié 9/9/20												
30			Conexiones y Jumpers	20 días	vie 25/9/20												
31			Puesta a Tierra	20 días	jue 24/9/20												
32			Transformadores	11 días	jue 17/9/20												
33			Alumbrado Público	12 días	vie 18/9/20												
34	 		Acometida	24 días	mar 29/12/20												
35			Finalizacion del Poligono 2	1 día	lun 1/2/21												
36			Remoción	24 días	lun 28/12/20												
37			Tendido de Media y Baja Tensión	24 días	lun 28/12/20												
38			Armados de Media y Baja Tensión	24 días	lun 28/12/20												
39			Transformadores	24 días	lun 28/12/20												
40			Remocion de postes	24 días	lun 28/12/20												
41			Polígono 3	175 días	lun 24/8/20												




























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo				Semestre 2, 2018						Semestre 1,			
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F		
42			Instalación	175 días	lun 24/8/20													
43			Excavaciones	31 días	jue 27/8/20													
44			Izado de postes	24 días	lun 24/8/20													
45			Cimentaciones	20 días	mar 1/9/20													
46			Retenidas	20 días	lun 14/9/20													
47			Armados MT y BT	27 días	lun 28/9/20													
48			Tendido de Conductor MT y BT	29 días	jue 8/10/20													
49			Conexiones y Jumpers	20 días	vie 23/10/20													
50			Puesta a Tierra	20 días	jue 22/10/20													
51			Transformadores	15 días	vie 30/10/20													
52			Alumbrado Público	16 días	mar 3/11/20													
53			Acometida	59 días	lun 1/2/21													
54			Finalizacion del Poligono 3	1 día	vie 23/4/21													
55			Remoción	59 días	vie 29/1/21													
56			Tendido de Media y Baja Tensión	59 días	vie 29/1/21													
57			Armados de Media y Baja Tensión	59 días	vie 29/1/21													
58			Transformadores	59 días	vie 29/1/21													
59			Remocion de postes	59 días	vie 29/1/21													
60			Polígono 4	165 días	vie 25/9/20													
61			Instalación	165 días	vie 25/9/20													
62			Excavaciones	22 días	vie 9/10/20													






















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo				Semestre 2, 2018						Semestre 1,		
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	
63			Izado de postes	18 días	vie 25/9/20												
64			Cimentaciones	9 días	lun 12/10/20												
65			Retenidas	14 días	lun 2/11/20												
66			Armados MT y BT	24 días	mié 4/11/20												
67			Tendido de Conductor MT y BT	17 días	mié 25/11/20												
68			Conexiones y Jumpers	15 días	vie 4/12/20												
69			Puesta a Tierra	21 días	jue 3/12/20												
70			Transformadores	10 días	vie 11/12/20												
71			Alumbrado Público	13 días	mié 16/12/20												
72			Totalizadores	9 días	vie 25/12/20												
73			Acometida	13 días	vie 23/4/21												
74			Finalizacion del Poligono 4	2 días	mié 12/5/21												
75			Remoción	13 días	jue 22/4/21												
76			Tendido de Media y Baja Tensión	13 días	jue 22/4/21												
77			Armados de Media y Baja Tensión	13 días	jue 22/4/21												
78			Transformadores	13 días	jue 22/4/21												
79			Remocion de postes	13 días	jue 22/4/21												
80			Polígono 5	189 días	mié 21/10/20												
81			Instalación	189 días	mié 21/10/20												
82			Excavaciones	31 días	mar 10/11/20												
83			Izado de postes	28 días	mié 21/10/20												


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo				Semestre 2, 2018						Semestre 1,			
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F		
84			Cimentaciones	13 días	vie 13/11/20													
85			Retenidas	16 días	vie 11/12/20													
86			Armados MT y BT	34 días	mar 8/12/20													
87			Tendido de Conductor MT y BT	27 días	vie 25/12/20													
88			Conexiones y Jumpers	20 días	mar 12/1/21													
89			Puesta a Tierra	20 días	mar 19/1/21													
90			Transformadores	23 días	vie 15/1/21													
91			Alumbrado Público	20 días	lun 25/1/21													
92			Acometida	42 días	mié 12/5/21													
93			Finalizacion del Poligono 5	2 días	vie 9/7/21													
94			Remoción	42 días	mié 12/5/21													
95			Tendido de Media y Baja Tensión	42 días	mié 12/5/21													
96			Armados de Media y Baja Tensión	42 días	mié 12/5/21													
97			Transformadores	42 días	mié 12/5/21													
98			Remocion de postes	42 días	mié 12/5/21													
99			Cierre de Obras	20 días	mar 13/7/21													


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

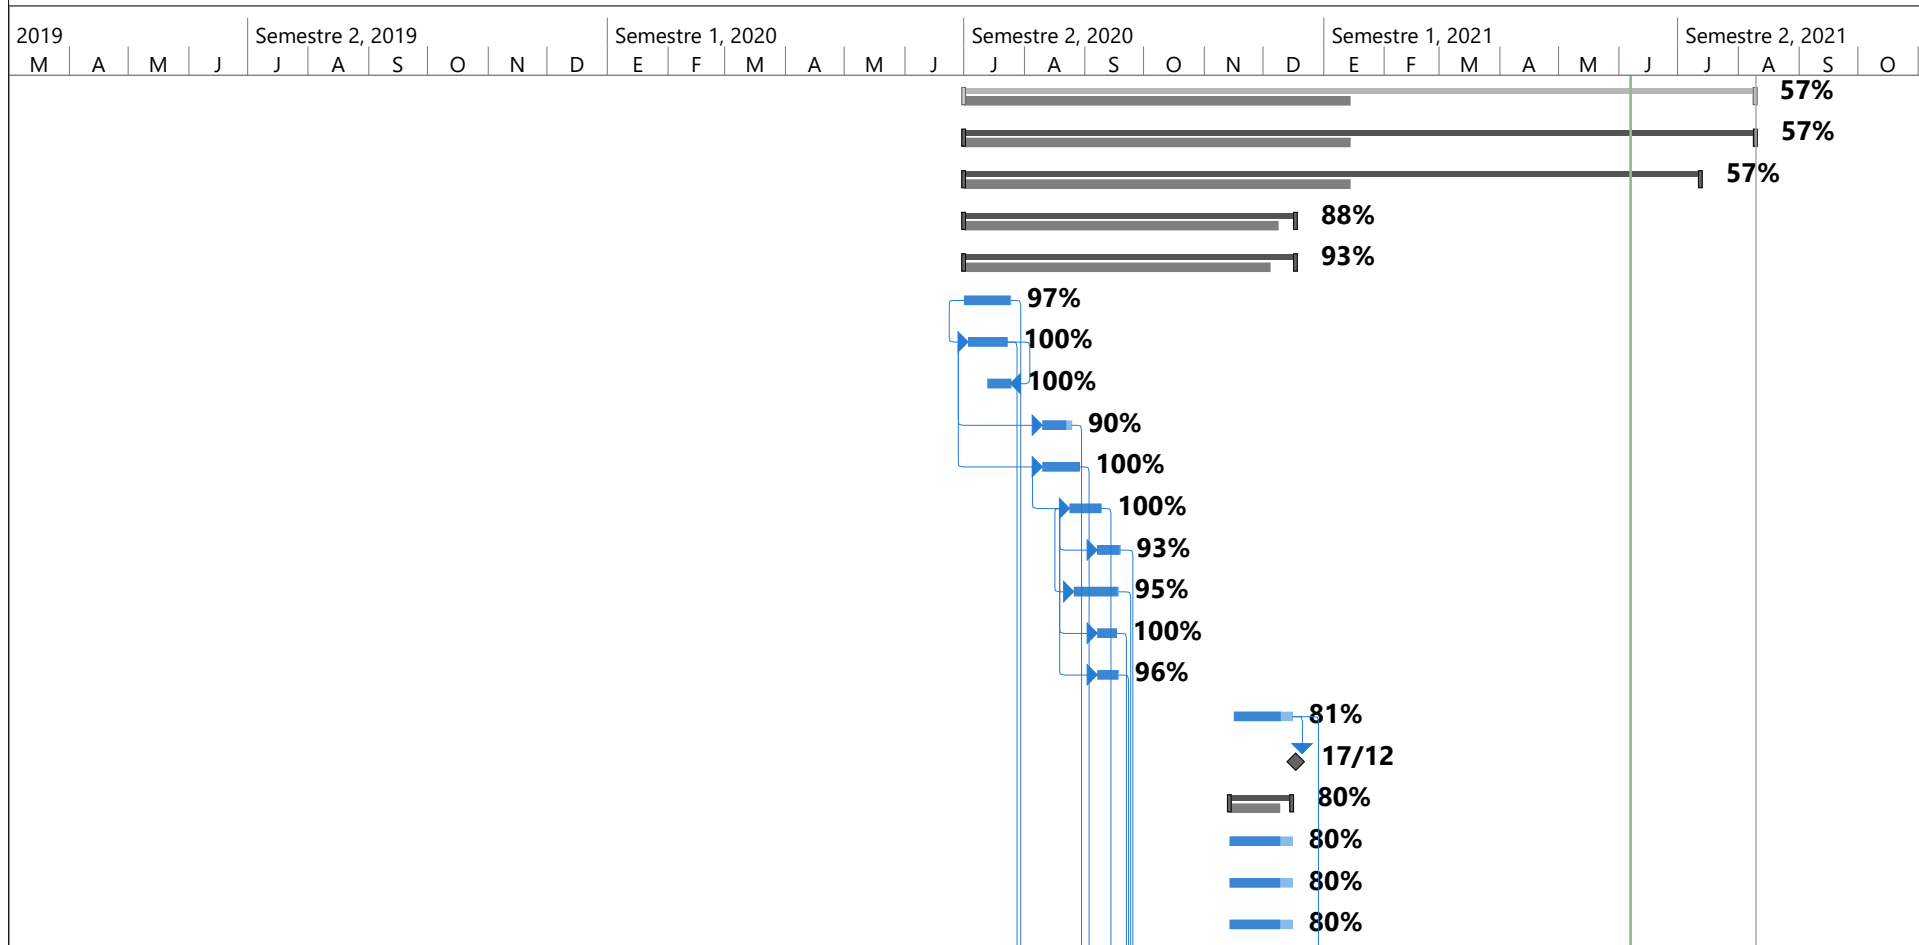


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

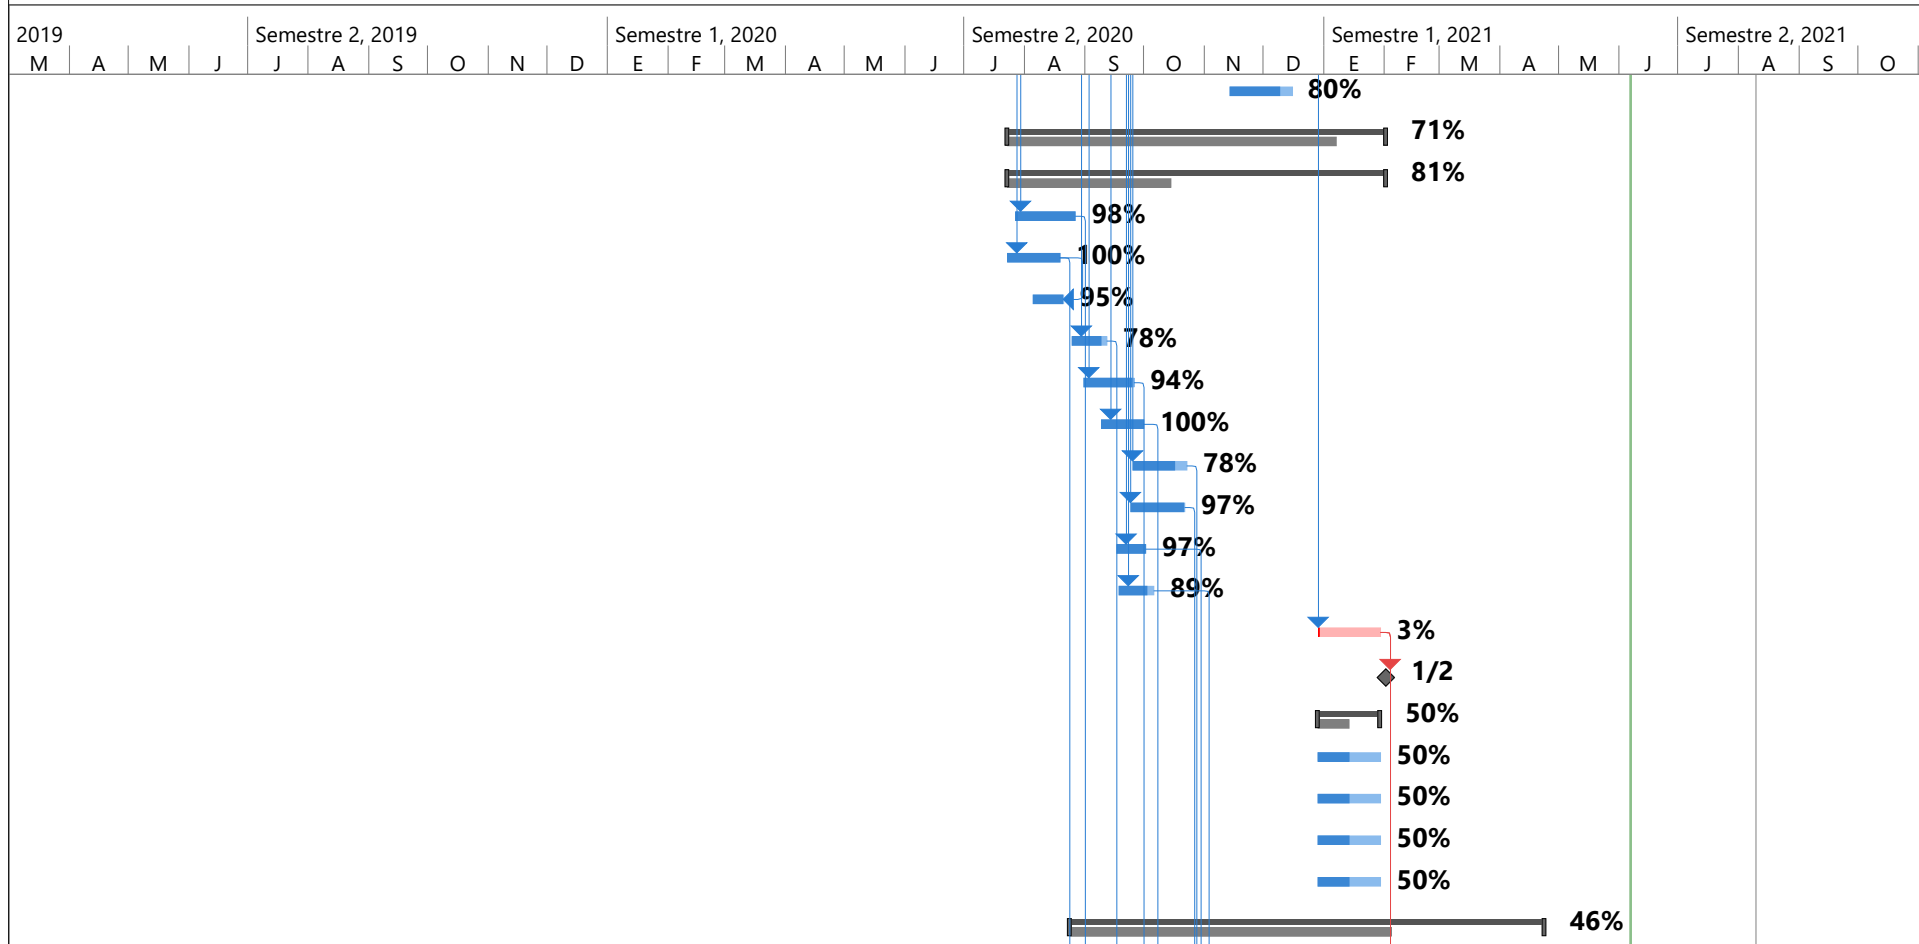


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

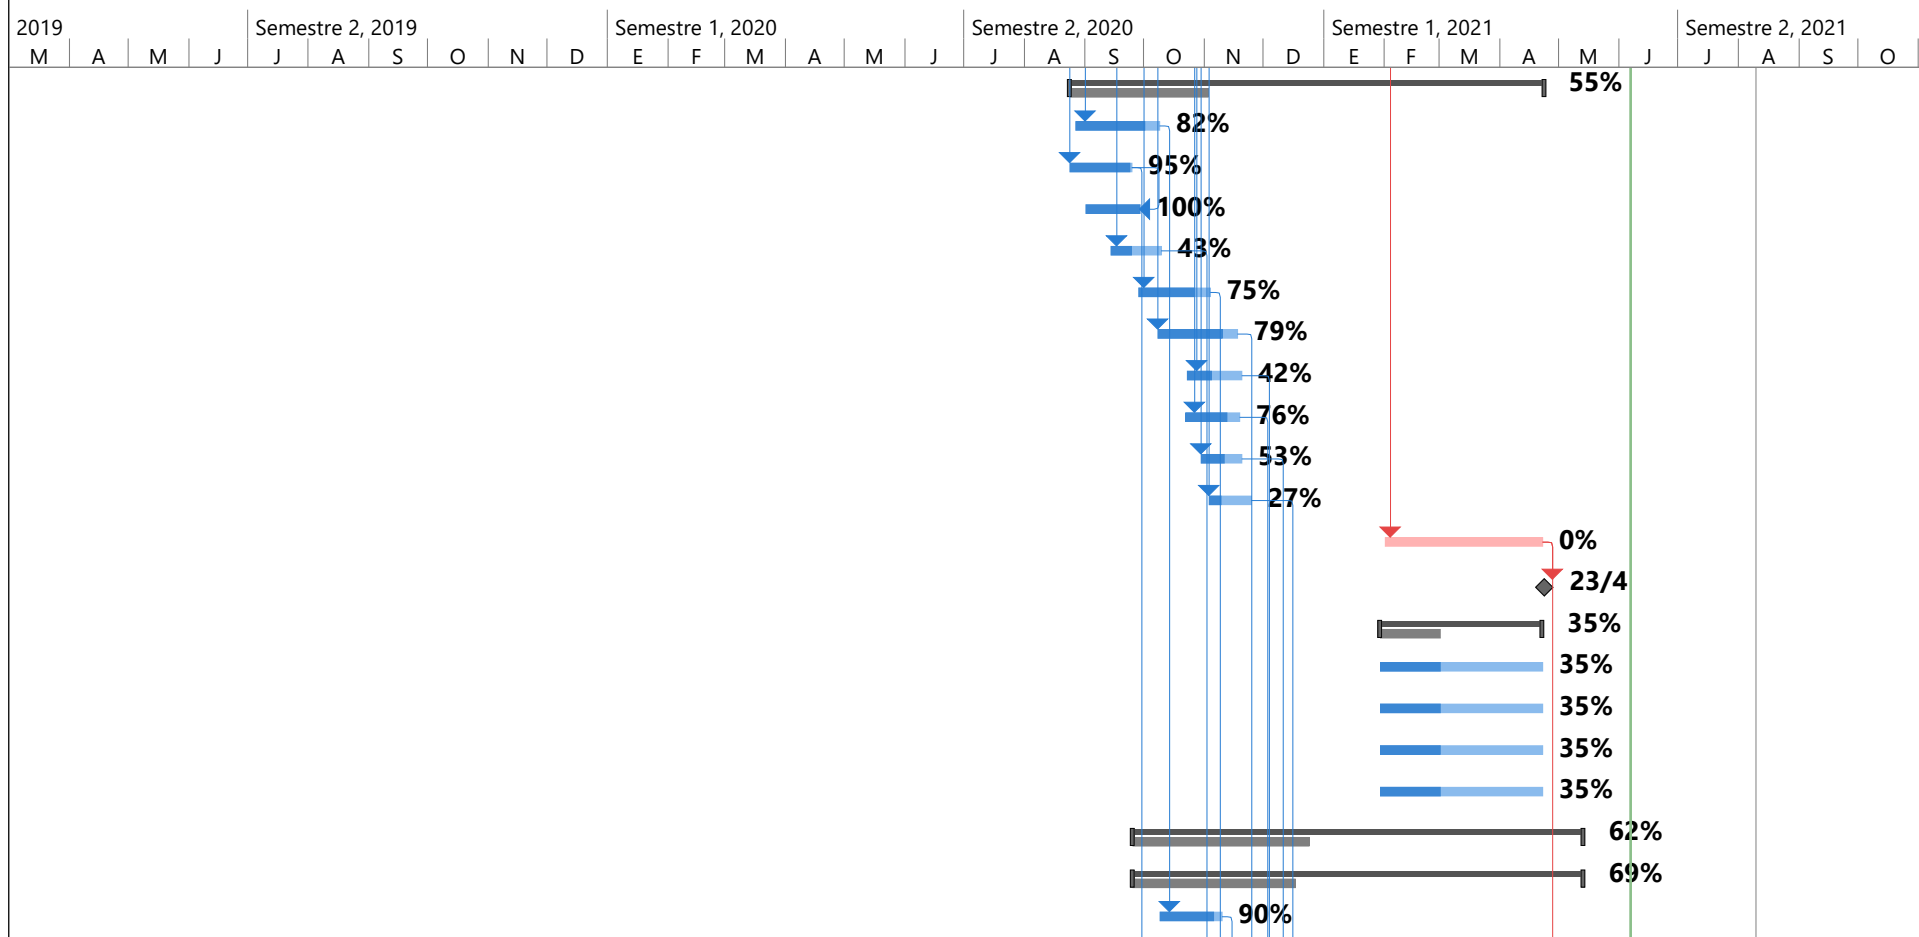

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

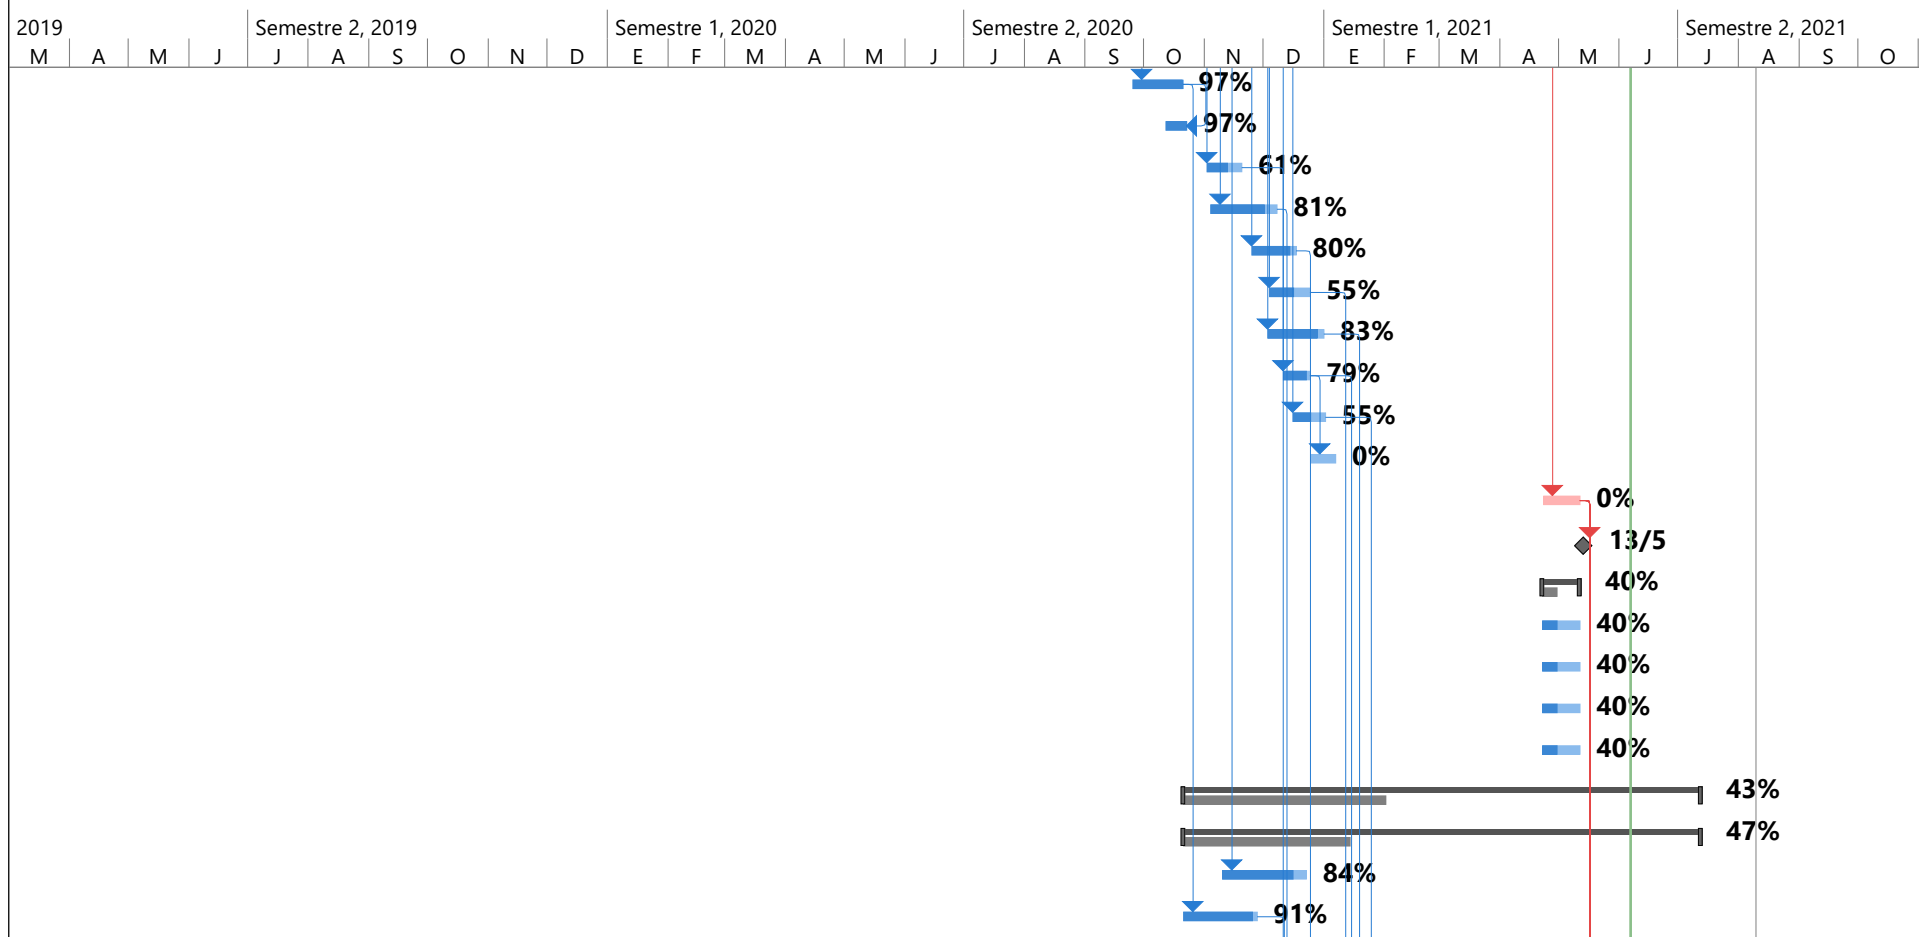

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución NAGU101 Mayo2021

2019				Semestre 2, 2019						Semestre 1, 2020						Semestre 2, 2020						Semestre 1, 2021						Semestre 2, 2021			
M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O

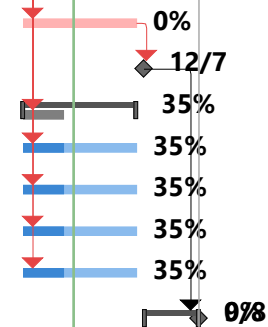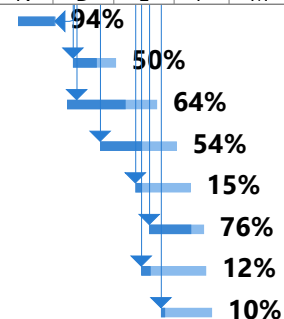


























Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
Dirección de Proyectos Financiados
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
Edenorte Dominicana
F: 809-747-9346



E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
