






































Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018 abr may jun tri 3, 2018 jul ago sep					
1	✓	✚	Rehabilitación de Redes CHIVO105	272.5 días	jue 15/11/18	jue 31/10/19						
2	✓	✚	Adjudicación	0 días	lun 1/10/18	lun 1/10/18						
3	✓	✚	Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18	jue 28/2/19						
28	✓	✚	Ejecución	242.5 días	lun 10/12/18	vie 18/10/19						
29	✓	✚	Polígono 1	145.88 días	lun 10/12/18	mar 18/6/19						
30	✓	✚	Instalación	135 días	lun 10/12/18	mié 5/6/19						
31	✓	✚	lizado de postes	14 días	lun 10/12/18	vie 28/12/18						
32	✓	✚	Cimentaciones	12 días	mié 12/12/18	vie 28/12/18						
33	✓	✚	Retenidas	6 días	jue 28/2/19	vie 29/3/19						
34	✓	✚	Armados de Media y Baja Tensión	17 días	jue 28/2/19	jue 21/3/19						
35	✓	✚	Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	22 días	lun 4/3/19	mar 2/4/19						
36	✓	✚	Elementos de Protección y Maniobra	10 días	jue 7/3/19	mié 5/6/19						
37	✓	✚	Conexiones y Jumpers	5 días	jue 21/3/19	mar 30/4/19						
38	✓	✚	Transformadores	12 días	mié 20/3/19	mié 3/4/19						
39	✓	✚	Alumbrado Publico	20 días	jue 21/3/19	mié 17/4/19						
40	✓	✚	Normalización Suministros	34 días	lun 25/3/19	mié 8/5/19						
41	✓	✚	Remoción	69.75 días	jue 21/3/19	mar 18/6/19						




































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018						tri 3, 2018		
							abr	may	jun	jul	ago	sep			
42	✓		Tendido de Conductor Media Tensión	16 días	jue 21/3/19	vie 12/4/19									
43	✓		Tendido de Conductor Baja Tensión	22 días	jue 28/3/19	jue 25/4/19									
44	✓		Armados de Media Tensión	44 días	lun 25/3/19	mar 18/6/19									
45	✓		Armados de Baja Tensión	14 días	jue 11/4/19	jue 2/5/19									
46	✓		Transformadores	25.25 días	jue 25/4/19	lun 17/6/19									
47	✓		Izado de postes	14 días	mar 14/5/19	jue 30/5/19									
48	✓		Cierre de Polígono 1	0 días	jue 30/5/19	jue 30/5/19									
49	✓		Polígono 2	175.5 días	vie 28/12/18	mar 13/8/19									
50	✓		Instalación	175.5 días	vie 28/12/18	mar 13/8/19									
51	✓		Izado de postes	20 días	vie 28/12/18	jue 24/1/19									
52	✓		Cimentaciones	19 días	mié 2/1/19	vie 25/1/19									
53	✓		Retenidas	9 días	vie 29/3/19	mié 10/4/19									
54	✓		Armados de Media y Baja Tensión	18 días	jue 21/3/19	vie 12/4/19									
55	✓		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	11 días	vie 29/3/19	vie 12/4/19									
56	✓		Elementos de Protección y Maniobra	14.75 días	mié 17/4/19	mié 5/6/19									










Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018			tri 3, 2018		
							abr	may	jun	jul	ago	sep
57			Conexiones y Jumpers	11 días	lun 22/4/19	vie 24/5/19						
58			Transformadores	13 días	mar 2/4/19	jue 18/4/19						
59			Alumbrado Publico	16 días	lun 13/5/19	mié 5/6/19						
60			Normalización Suministros	70 días	jue 16/5/19	mar 13/8/19						
61			Remoción	71.63 días	lun 15/4/19	mié 17/7/19						
62			Tendido de Conductor Media Tensión	6 días	lun 15/4/19	mar 23/4/19						
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	13 días	mar 4/6/19	vie 21/6/19						
64			Armados de Media Tensión	12 días	vie 21/6/19	lun 8/7/19						
65			Armados de Baja Tensión	8 días	mié 19/6/19	lun 1/7/19						
66			Transformadores	5 días	jue 4/7/19	mié 10/7/19						
67			Izado de postes	13 días	lun 1/7/19	mié 17/7/19						
68			Cierre de Polígono 2	0 días	mié 17/7/19	mié 17/7/19						
69			Polígono 3	208.5 días	jue 24/1/19	vie 18/10/19						
70			Instalación	198.5 días	jue 24/1/19	lun 7/10/19						
71			Izado de postes	14 días	jue 24/1/19	mar 12/2/19						
72			Cimentaciones	10 días	jue 7/2/19	mié 20/2/19						
73			Retenidas	7 días	mié 10/4/19	jue 18/4/19						




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018						tri 3, 2018		
							abr	may	jun	jul	ago	sep			
74	✓		Armados de Media y Baja Tensión	47 días	lun 15/4/19	jue 13/6/19									
75	✓		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	56 días	lun 22/4/19	jue 4/7/19									
76	✓		Elementos de Protección y Maniobra	19 días	mié 29/5/19	vie 21/6/19									
77	✓		Conexiones y Jumpers	8 días	mar 7/5/19	jue 16/5/19									
78	✓		Transformadores	39 días	lun 6/5/19	lun 24/6/19									
79	✓		Alumbrado Publico	35 días	vie 10/5/19	jue 1/8/19									
80	✓		Normalización Suministros	43 días	mar 13/8/19	lun 7/10/19									
81	✓		Remoción	107.25 días	mié 5/6/19	vie 18/10/19									
82	✓		Tendido de Conductor Media Tensión	9 días	mié 5/6/19	lun 17/6/19									
83	✓		Tendido de Conductor Baja Tensión	20 días	jue 12/9/19	lun 7/10/19									
84	✓		Armados de Media Tensión	18 días	lun 22/7/19	mar 13/8/19									
85	✓		Armados de Baja Tensión	16 días	mar 17/9/19	mié 9/10/19									
86	✓		Transformadores	9 días	jue 26/9/19	lun 7/10/19									
87	✓		Izado de postes	14 días	mié 2/10/19	vie 18/10/19									
88	✓		Cierre de Polígono 3	0 días	vie 18/10/19	vie 18/10/19									


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	









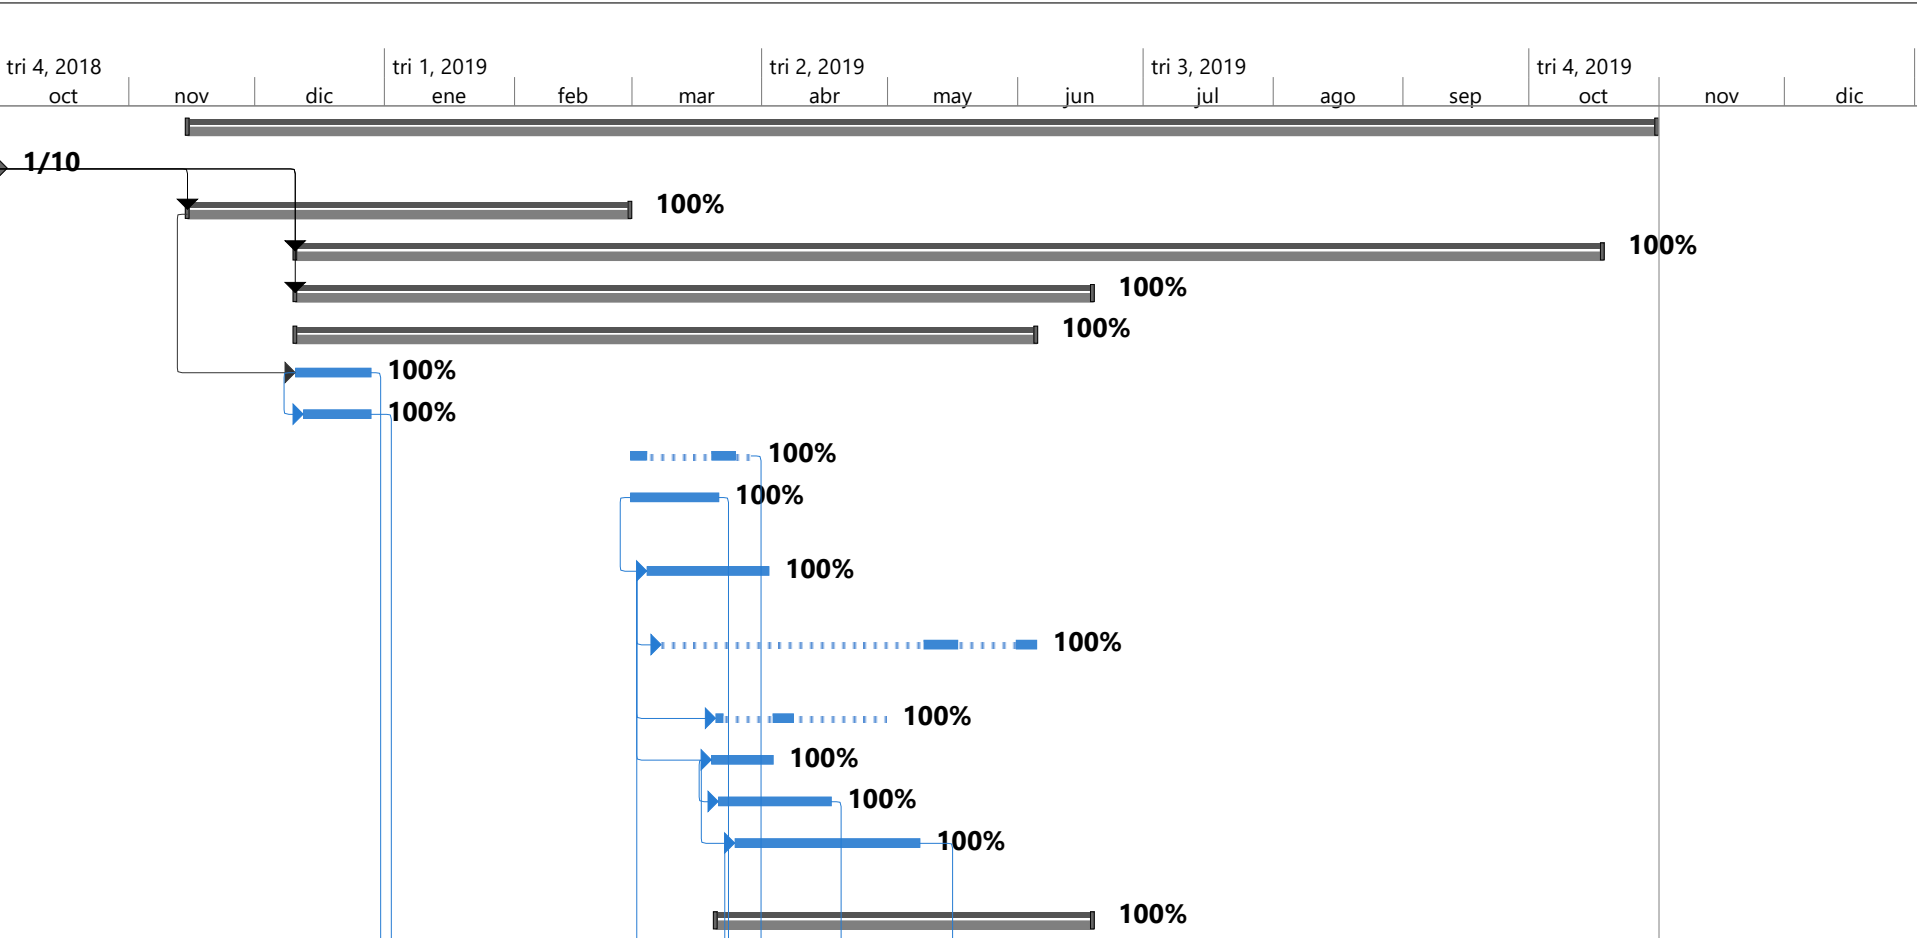















Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>tri 2, 2018</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2018</div> <div>jul</div> <div>ago</div> <div>sep</div> </div>					
89	 		Cierre de Obras	20 días	mar 8/10/19	jue 31/10/19						


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

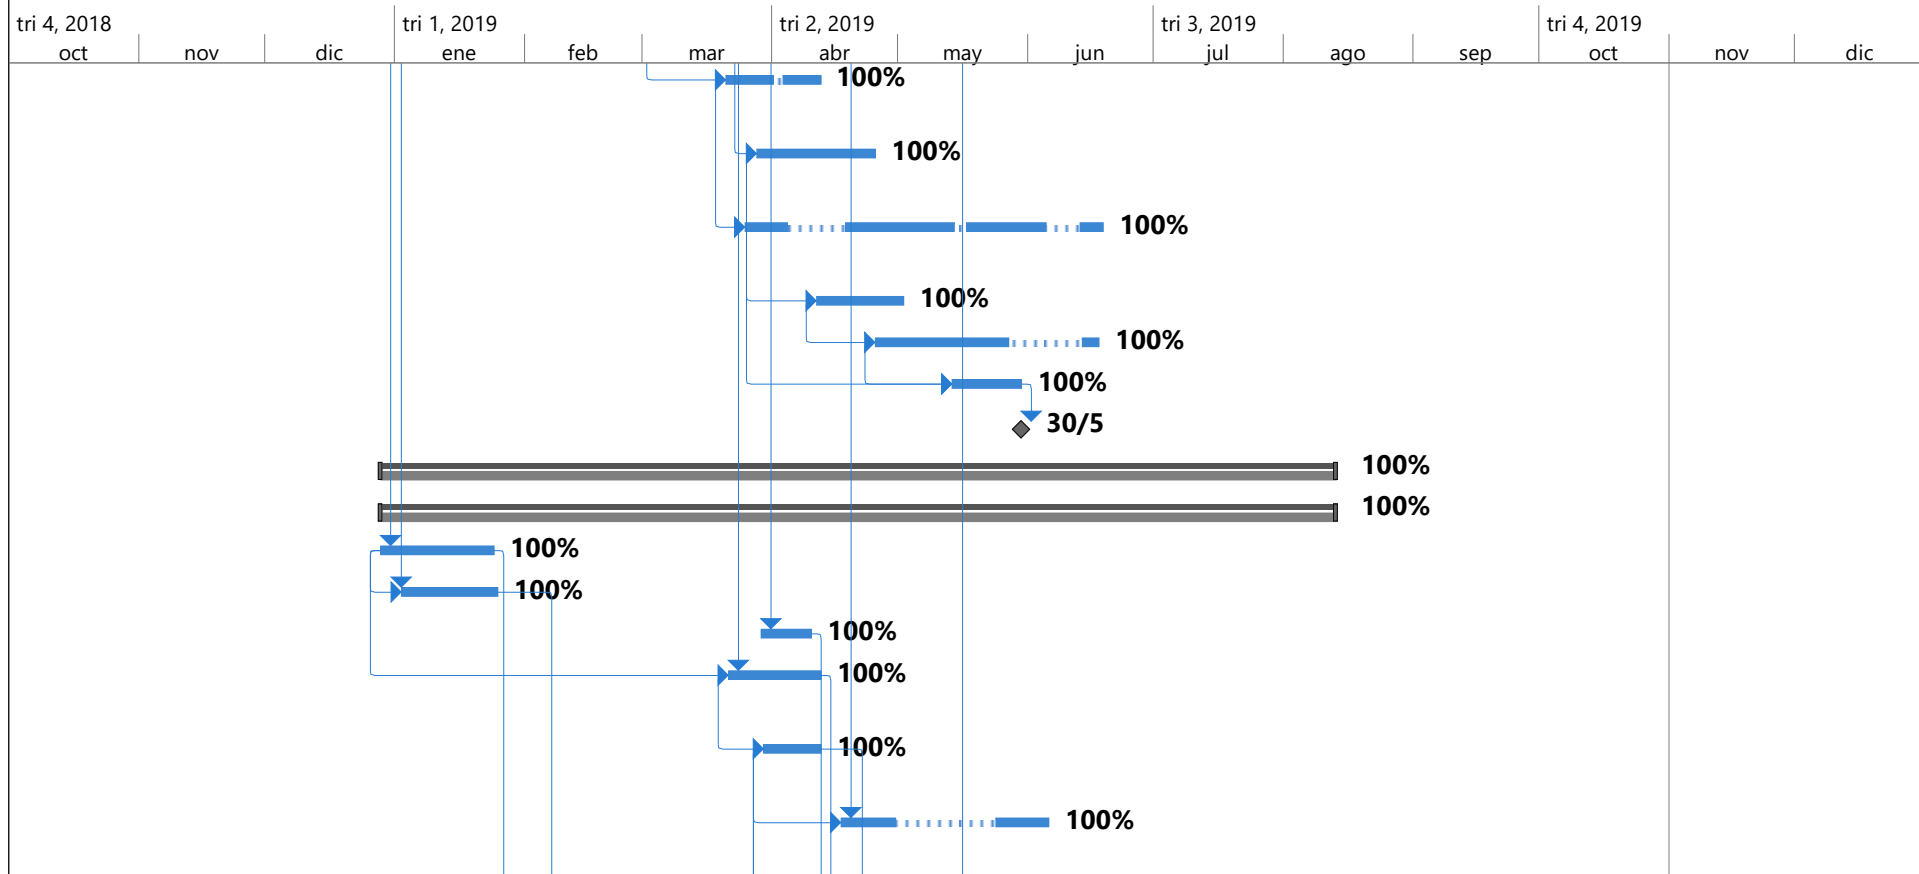


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

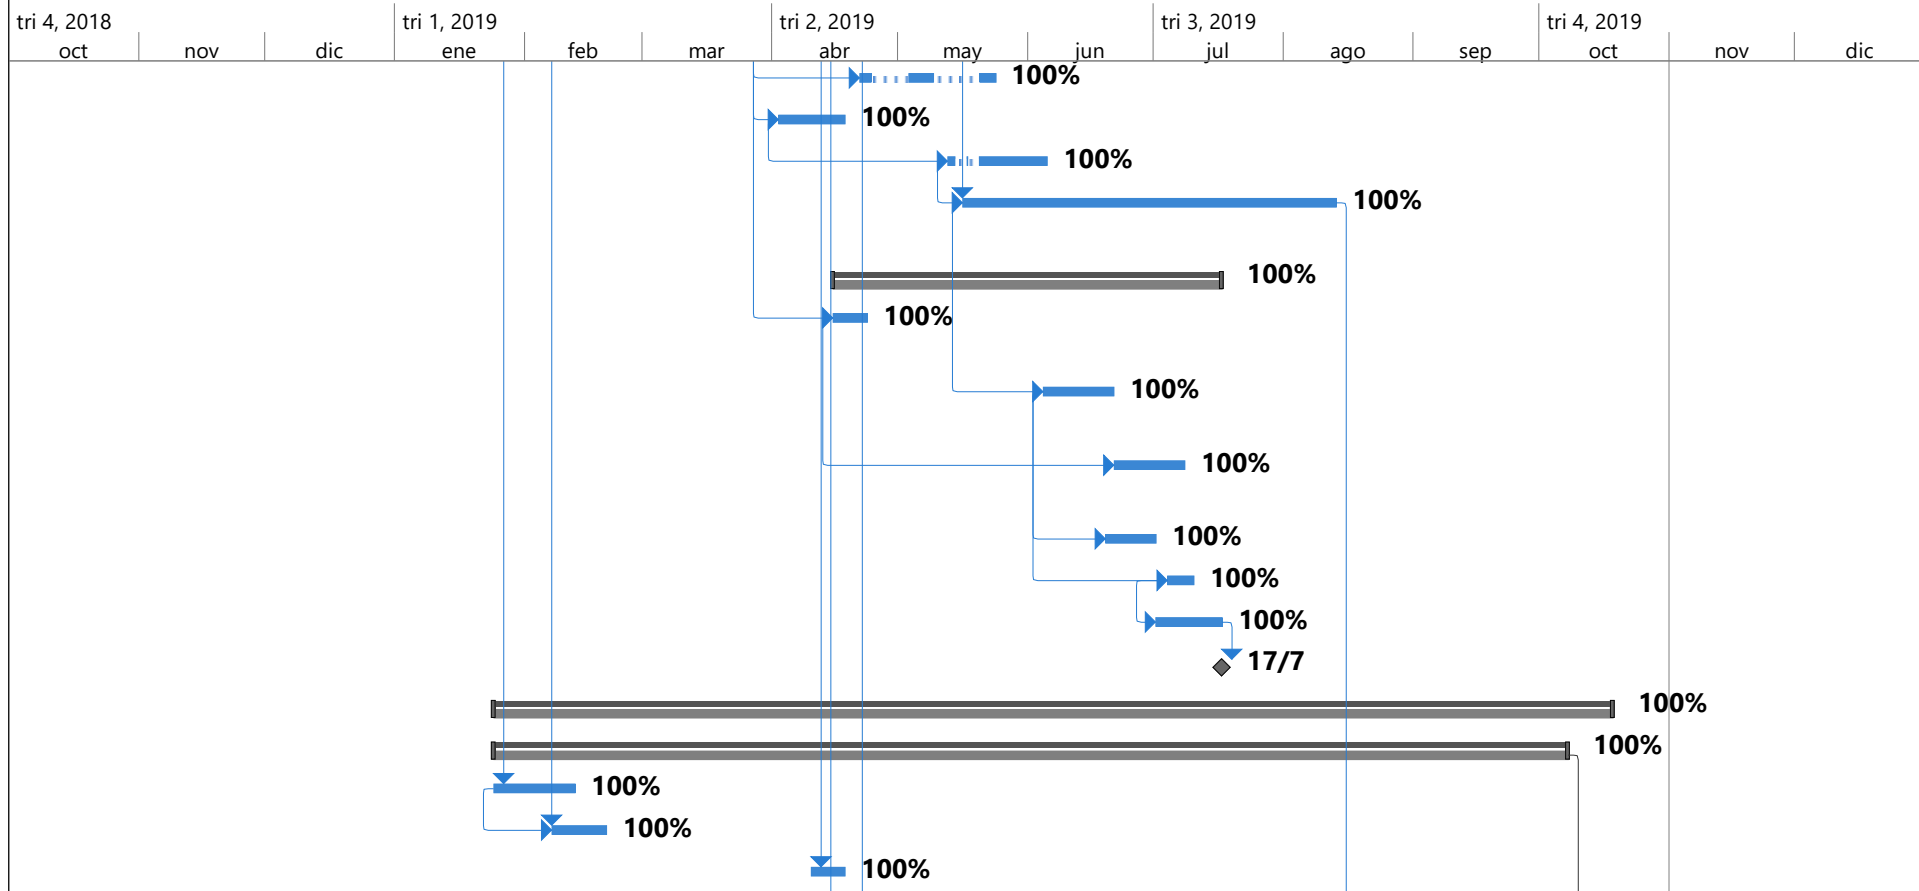


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

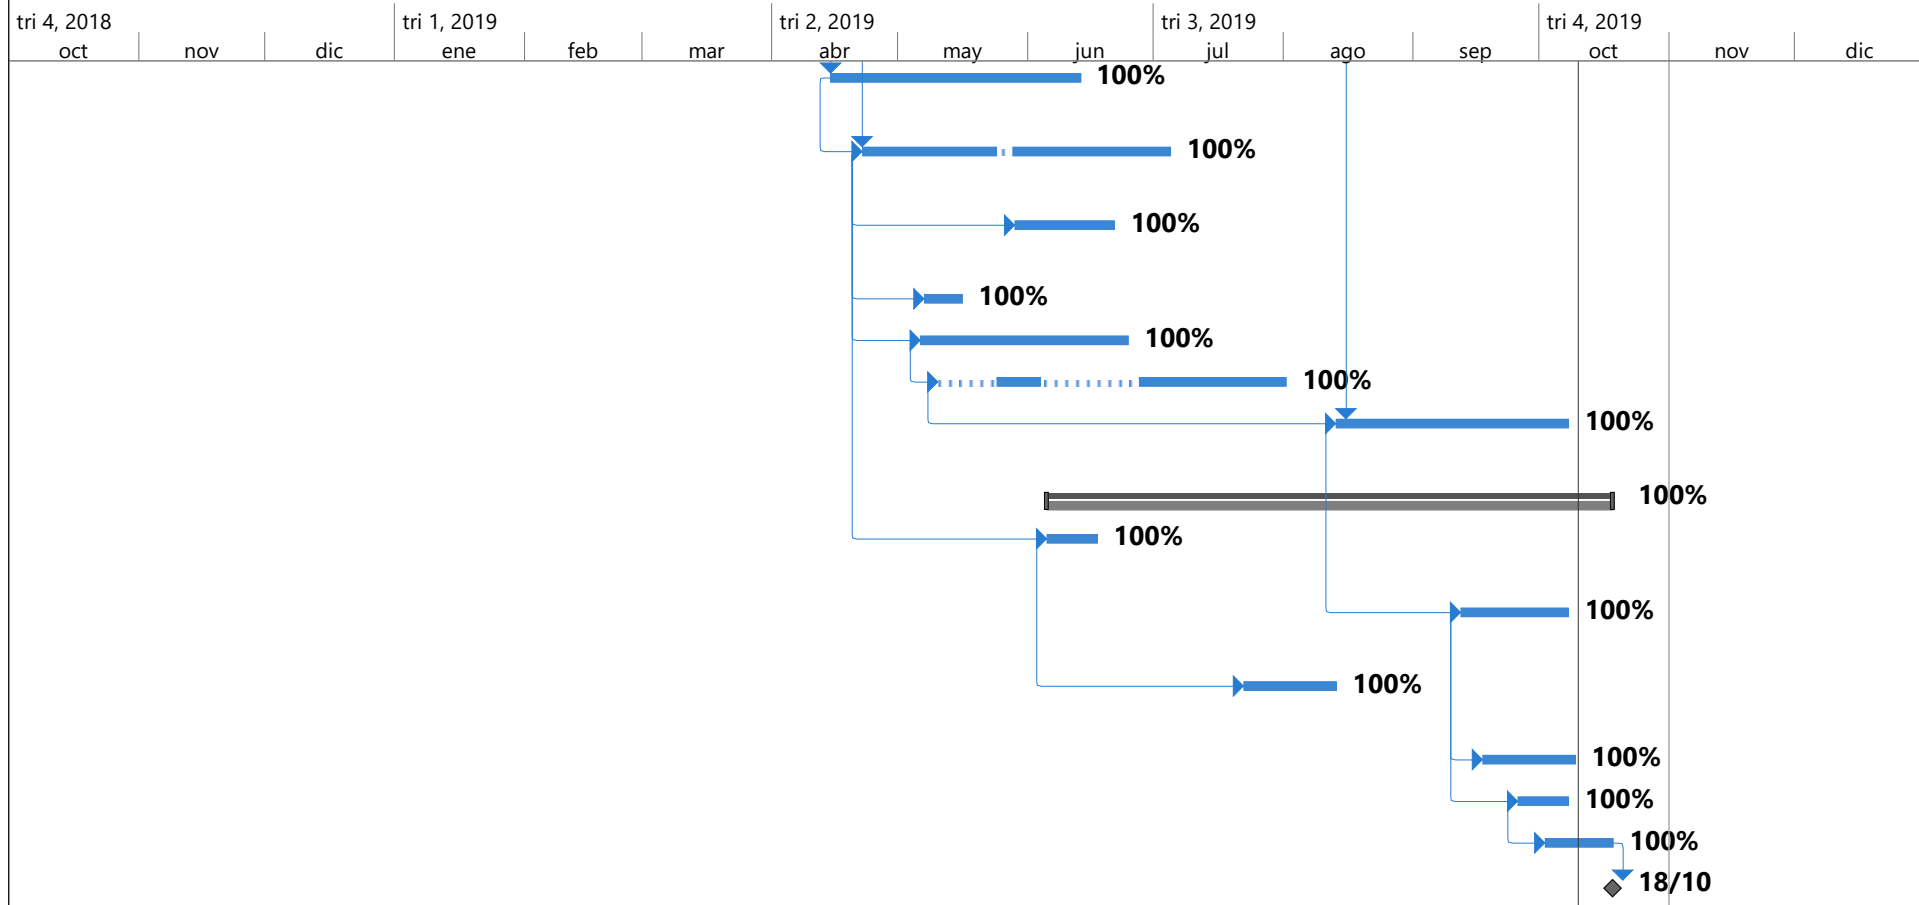

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105 Mayo2021

tri 4, 2018			tri 1, 2019				tri 2, 2019			tri 3, 2019			tri 4, 2019		
oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
														100%	





100%


























Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
Dirección de Proyectos Financiados
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
Edenorte Dominicana
F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
