

















































Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018				
							abr	may	jun	jul	ago					
1	✓	📌	Rehabilitación de Redes CANA102	245.13 días	jue 15/11/18	lun 4/11/19										
2	✓	📌	Adjudicación	0 días	lun 15/10/18	lun 15/10/18										
3	✓	📌	Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18	lun 11/3/19										
28	✓	📌	Ejecución	221 días	jue 13/12/18	mar 29/10/19										
29	✓	📌	Polígono 1	99 días	jue 13/12/18	mar 7/5/19										
30	✓	📌	Instalación	99 días	jue 13/12/18	mar 7/5/19										
31	✓	📌	lizado de postes	3 días	jue 13/12/18	lun 17/12/18										
32	✓	📌	Cimentaciones	4 días	lun 17/12/18	jue 20/12/18										
33	✓	📌	Retenidas	4 días	mar 12/3/19	vie 15/3/19										
34	✓	📌	Armados de Media y Baja Tensión	11 días	mar 12/3/19	mar 26/3/19										
35	✓	📌	Tendido de Conductor Media y Baja Ten	5 días	mié 20/3/19	mar 26/3/19										
36	✓	📌	Elementos de Protección y Maniobra	4.95 días	mié 20/3/19	mié 10/4/19										
37	✓	📌	Conexiones y Jumpers	4 días	jue 2/5/19	mar 7/5/19										
38	✓	📌	Transformadores	4 días	jue 21/3/19	mar 26/3/19										
39	✓	📌	Alumbrado Publico	7 días	mié 27/3/19	vie 5/4/19										
40	✓	📌	Normalización Suministros	9 días	lun 1/4/19	jue 11/4/19										
41	✓	📌	Remoción	26 días	mié 27/3/19	vie 3/5/19										
42	✓	📌	Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	mié 27/3/19	jue 11/4/19										
43	✓	📌	Tendido de Conductor Baja Tensión	5 días	mié 3/4/19	mar 16/4/19										
44	✓	📌	Armados de Media Tensión	4 días	lun 29/4/19	vie 3/5/19										
45	✓	📌	Armados de Baja Tensión	6 días	mié 3/4/19	mié 10/4/19										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018	
							abr	may	jun	jul	ago		
46			Transformadores	8 días	jue 4/4/19	lun 22/4/19							
47			Izado de postes	7 días	mar 9/4/19	mié 17/4/19							
48			Cierre de Polígono 1	0 días	mié 17/4/19	mié 17/4/19							
49			Polígono 2	100 días	mar 18/12/18	lun 13/5/19							
50			Instalación	94 días	mar 18/12/18	vie 3/5/19							
51			Izado de postes	5 días	mar 18/12/18	lun 24/12/18							
52			Cimentaciones	6 días	vie 21/12/18	vie 28/12/18							
53			Retenidas	6 días	lun 18/3/19	lun 25/3/19							
54			Armados de Media y Baja Tensión	11 días	lun 18/3/19	mar 2/4/19							
55			Tendido de Conductor Media y Baja Ter	9 días	vie 5/4/19	mié 17/4/19							
56			Elementos de Protección y Maniobra	10 días	vie 19/4/19	vie 3/5/19							
57			Conexiones y Jumpers	5 días	vie 12/4/19	jue 18/4/19							
58			Transformadores	6 días	jue 11/4/19	jue 18/4/19							
59			Alumbrado Publico	14 días	vie 12/4/19	jue 2/5/19							
60			Normalización Suministros	7 días	vie 12/4/19	lun 22/4/19							
61			Remoción	16 días	vie 19/4/19	lun 13/5/19							
62			Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	vie 19/4/19	mar 7/5/19							
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	11 días	vie 19/4/19	lun 6/5/19							
64			Armados de Media Tensión	3 días	jue 9/5/19	lun 13/5/19							
65			Armados de Baja Tensión	4 días	mar 30/4/19	lun 6/5/19							
66			Transformadores	6 días	jue 25/4/19	vie 3/5/19							

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018	
							abr	may	jun	jul	ago		
67			Izado de postes	6 días	lun 6/5/19	lun 13/5/19							
68			Cierre de Polígono 2	0 días	lun 13/5/19	lun 13/5/19							
69			Polígono 3	142 días	mar 25/12/18	jue 18/7/19							
70			Instalación	142 días	mar 25/12/18	jue 18/7/19							
71			Izado de postes	5 días	mar 25/12/18	lun 31/12/18							
72			Cimentaciones	6 días	lun 31/12/18	mar 8/1/19							
73			Retenidas	6 días	mar 26/3/19	mié 3/4/19							
74			Armados de Media y Baja Tensión	9 días	mié 27/3/19	mar 9/4/19							
75			Tendido de Conductor Media y Baja Te	10 días	mié 3/4/19	mar 16/4/19							
76			Elementos de Protección y Maniobra	6 días	lun 17/6/19	lun 8/7/19							
77			Conexiones y Jumpers	5 días	mié 26/6/19	jue 11/7/19							
78			Transformadores	4 días	vie 19/4/19	mié 24/4/19							
79			Alumbrado Publico	8 días	mar 9/7/19	jue 18/7/19							
80			Normalización Suministros	15 días	mar 23/4/19	mar 14/5/19							
81			Remoción	44 días	mar 23/4/19	mar 25/6/19							
82			Tendido de Conductor Media Tensión	13 días	mié 24/4/19	jue 6/6/19							
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	12 días	mar 23/4/19	vie 24/5/19							
84			Armados de Media Tensión	8 días	vie 26/4/19	mié 8/5/19							
85			Armados de Baja Tensión	11 días	mar 11/6/19	mar 25/6/19							
86			Transformadores	11 días	mié 15/5/19	lun 17/6/19							
87			Izado de postes	14 días	vie 17/5/19	jue 6/6/19							


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018	
							abr	may	jun	jul	ago		
88			Cierre de Polígono 3	0 días	jue 6/6/19	jue 6/6/19							
89			Polígono 4	128 días	mié 2/1/19	vie 5/7/19							
90			Instalación	128 días	mié 2/1/19	vie 5/7/19							
91			Izado de postes	7 días	mié 2/1/19	jue 10/1/19							
92			Cimentaciones	9 días	mié 2/1/19	lun 14/1/19							
93			Retenidas	7 días	jue 4/4/19	vie 12/4/19							
94			Armados de Media y Baja Tensión	15 días	mar 12/3/19	jue 25/4/19							
95			Tendido de Conductor Media y Baja Te	59 días	mié 3/4/19	vie 5/7/19							
96			Elementos de Protección y Maniobra	6 días	vie 14/6/19	mié 3/7/19							
97			Conexiones y Jumpers	9 días	mié 22/5/19	vie 7/6/19							
98			Transformadores	9 días	mié 24/4/19	mié 15/5/19							
99			Alumbrado Publico	13 días	lun 6/5/19	mié 22/5/19							
100			Normalización Suministros	11 días	mié 15/5/19	mié 29/5/19							
101			Remoción	47 días	lun 29/4/19	jue 4/7/19							
102			Tendido de Conductor Media Tensión	24.7 días	lun 29/4/19	mié 19/6/19							
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	14 días	lun 27/5/19	lun 24/6/19							
104			Armados de Media Tensión	3 días	mar 18/6/19	jue 4/7/19							
105			Armados de Baja Tensión	4 días	vie 21/6/19	mié 26/6/19							
106			Transformadores	4.75 días	mar 28/5/19	vie 7/6/19							
107			Izado de postes	6 días	jue 13/6/19	jue 20/6/19							
108			Cierre de Polígono 4	0 días	vie 21/6/19	vie 21/6/19							

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018			tri 3, 2018	
							abr	may	jun	jul	ago
109			Polígono 5	171 días	vie 11/1/19	lun 16/9/19					
110			Instalación	130 días	vie 11/1/19	jue 18/7/19					
111			lizado de postes	3 días	vie 11/1/19	mar 15/1/19					
112			Cimentaciones	5 días	mar 15/1/19	mar 22/1/19					
113			Retenidas	3 días	lun 15/4/19	mié 17/4/19					
114			Armados de Media y Baja Tensión	12 días	mié 27/3/19	mié 22/5/19					
115			Tendido de Conductor Media y Baja Te	6 días	jue 2/5/19	jue 9/5/19					
116			Elementos de Protección y Maniobra	4 días	jue 13/6/19	jue 18/7/19					
117			Conexiones y Jumpers	4 días	lun 10/6/19	jue 13/6/19					
118			Transformadores	5 días	mar 14/5/19	lun 20/5/19					
119			Alumbrado Publico	5 días	lun 20/5/19	vie 24/5/19					
120			Normalización Suministros	20 días	jue 30/5/19	jue 27/6/19					
121			Remoción	69 días	mar 11/6/19	lun 16/9/19					
122			Tendido de Conductor Media Tensión	8 días	mar 11/6/19	jue 4/7/19					
123			Tendido de Conductor Baja Tensión	8 días	jue 27/6/19	lun 12/8/19					
124			Armados de Media Tensión	5 días	mar 6/8/19	lun 16/9/19					
125			Armados de Baja Tensión	7 días	mié 7/8/19	lun 16/9/19					
126			Transformadores	10 días	vie 28/6/19	jue 1/8/19					
127			lizado de postes	9 días	vie 2/8/19	mié 14/8/19					
128			Cierre de Polígono 5	0 días	mié 14/8/19	mié 14/8/19					
129			Polígono 6	159 días	mié 16/1/19	mar 3/9/19					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018			tri 3, 2018	
							abr	may	jun	jul	ago
130			Instalación	152 días	mié 16/1/19	vie 23/8/19					
131			Izado de postes	5 días	mié 16/1/19	mié 23/1/19					
132			Cimentaciones	5 días	mié 16/1/19	mié 23/1/19					
133			Retenidas	5 días	lun 18/3/19	vie 22/3/19					
134			Armados de Media y Baja Tensión	15 días	jue 2/5/19	lun 27/5/19					
135			Tendido de Conductor Media y Baja Te	12 días	jue 23/5/19	lun 10/6/19					
136			Elementos de Protección y Maniobra	6 días	jue 6/6/19	vie 12/7/19					
137			Conexiones y Jumpers	6 días	lun 27/5/19	mar 4/6/19					
138			Transformadores	6 días	jue 30/5/19	vie 7/6/19					
139			Alumbrado Publico	8 días	mar 13/8/19	vie 23/8/19					
140			Normalización Suministros	8 días	vie 28/6/19	mar 9/7/19					
141			Remoción	61 días	lun 10/6/19	mar 3/9/19					
142			Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	lun 10/6/19	lun 1/7/19					
143			Tendido de Conductor Baja Tensión	5 días	mar 2/7/19	mié 24/7/19					
144			Armados de Media Tensión	10 días	mar 6/8/19	vie 23/8/19					
145			Armados de Baja Tensión	14 días	lun 12/8/19	mar 3/9/19					
146			Transformadores	10 días	mar 2/7/19	jue 25/7/19					
147			Izado de postes	18 días	vie 26/7/19	mié 21/8/19					
148			Cierre de Polígono 6	0 días	mié 21/8/19	mié 21/8/19					
149			Polígono 7	162 días	jue 24/1/19	vie 13/9/19					
150			Instalación	162 días	jue 24/1/19	vie 13/9/19					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018				
							abr	may	jun	jul	ago	abr	may	jun	jul	ago
151			Izado de postes	8 días	jue 24/1/19	lun 4/2/19										
152			Cimentaciones	9 días	jue 24/1/19	mar 5/2/19										
153			Retenidas	9 días	mar 26/3/19	lun 8/4/19										
154			Armados de Media y Baja Tensión	27.34 días	mar 12/3/19	jue 11/7/19										
155			Tendido de Conductor Media y Baja Ten	16 días	lun 10/6/19	lun 1/7/19										
156			Elementos de Protección y Maniobra	12 días	mié 19/6/19	mar 27/8/19										
157			Conexiones y Jumpers	9 días	mar 20/8/19	lun 9/9/19										
158			Transformadores	6 días	mié 3/7/19	mié 10/7/19										
159			Alumbrado Publico	16 días	vie 23/8/19	vie 13/9/19										
160			Normalización Suministros	8 días	mié 10/7/19	vie 19/7/19										
161			Remoción	32 días	vie 26/7/19	mar 10/9/19										
162			Tendido de Conductor Media Tensión	17 días	mié 31/7/19	jue 29/8/19										
163			Tendido de Conductor Baja Tensión	7 días	vie 26/7/19	lun 5/8/19										
164			Armados de Media Tensión	1 día	vie 30/8/19	vie 30/8/19										
165			Armados de Baja Tensión	2 días	lun 19/8/19	mié 28/8/19										
166			Transformadores	1 día	mar 6/8/19	mar 6/8/19										
167			Izado de postes	2 días	lun 9/9/19	mar 10/9/19										
168			Cierre de Polígono 7	0 días	mar 10/9/19	mar 10/9/19										
169			Polígono 8	185 días	mar 5/2/19	mar 29/10/19										
170			Instalación	185 días	mar 5/2/19	mar 29/10/19										
171			Izado de postes	4 días	mar 5/2/19	vie 8/2/19										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018	
							abr	may	jun	jul	ago		
172			Cimentaciones	4 días	mar 5/2/19	vie 8/2/19							
173			Retenidas	3 días	jue 18/4/19	lun 22/4/19							
174			Armados de Media y Baja Tensión	20 días	lun 1/7/19	vie 26/7/19							
175			Tendido de Conductor Media y Baja Ten	20 días	lun 1/7/19	vie 26/7/19							
176			Elementos de Protección y Maniobra	6 días	vie 20/9/19	mar 29/10/19							
177			Conexiones y Jumpers	5 días	vie 30/8/19	jue 10/10/19							
178			Transformadores	5 días	lun 15/7/19	vie 19/7/19							
179			Alumbrado Publico	7 días	mié 17/7/19	jue 25/7/19							
180			Normalización Suministros	17 días	lun 22/7/19	mar 13/8/19							
181			Remoción	40 días	vie 9/8/19	lun 7/10/19							
182			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días	vie 9/8/19	vie 13/9/19							
183			Tendido de Conductor Baja Tensión	6 días	mar 3/9/19	mar 10/9/19							
184			Armados de Media Tensión	4 días	lun 16/9/19	jue 19/9/19							
185			Armados de Baja Tensión	5 días	mar 17/9/19	lun 23/9/19							
186			Transformadores	3 días	lun 23/9/19	jue 26/9/19							
187			Izado de postes	6 días	vie 27/9/19	lun 7/10/19							
188			Cierre de Polígono 8	0 días	lun 7/10/19	lun 7/10/19							
189			Polígono 9	173 días	lun 11/2/19	jue 17/10/19							
190			Instalación	173 días	lun 11/2/19	jue 17/10/19							
191			Izado de postes	4 días	lun 11/2/19	jue 14/2/19							
192			Cimentaciones	5 días	lun 11/2/19	vie 15/2/19							

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	






















Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018				
							abr	may	jun	jul	ago					
193	✓		Retenidas	4 días	lun 25/3/19	jue 28/3/19										
194	✓		Armados de Media y Baja Tensión	16.08 días	mar 12/3/19	vie 5/4/19										
195	✓		Tendido de Conductor Media y Baja Ten	13 días	lun 1/7/19	mié 21/8/19										
196	✓		Elementos de Protección y Maniobra	6 días	jue 8/8/19	vie 27/9/19										
197	✓		Conexiones y Jumpers	3 días	mar 8/10/19	jue 17/10/19										
198	✓		Transformadores	5 días	mar 30/7/19	lun 5/8/19										
199	✓		Alumbrado Publico	8 días	lun 2/9/19	lun 7/10/19										
200	✓		Normalización Suministros	11 días	mié 14/8/19	jue 29/8/19										
201	✓		Remoción	26 días	mar 20/8/19	mié 25/9/19										
202	✓		Tendido de Conductor Media Tensión	6 días	mié 28/8/19	jue 12/9/19										
203	✓		Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	mar 20/8/19	lun 26/8/19										
204	✓		Armados de Media Tensión	6 días	vie 13/9/19	vie 20/9/19										
205	✓		Armados de Baja Tensión	9 días	lun 2/9/19	jue 12/9/19										
206	✓		Transformadores	6 días	mar 27/8/19	mar 3/9/19										
207	✓		Izado de postes	12 días	mié 4/9/19	mié 25/9/19										
208	✓		Cierre de Polígono 9	0 días	mié 25/9/19	mié 25/9/19										
209	✓		Polígono 10	162 días	vie 15/2/19	mar 8/10/19										
210	✓		Instalación	145 días	vie 15/2/19	jue 12/9/19										
211	✓		Izado de postes	7 días	vie 15/2/19	lun 25/2/19										
212	✓		Cimentaciones	9 días	vie 15/2/19	jue 28/2/19										
213	✓		Retenidas	7 días	mar 9/4/19	mié 17/4/19										


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018					tri 3, 2018				
							abr	may	jun	jul	ago					
214			Armados de Media y Baja Tensión	14 días	mar 12/3/19	mié 26/6/19										
215			Tendido de Conductor Media y Baja Ten	16 días	lun 10/6/19	lun 1/7/19										
216			Elementos de Protección y Maniobra	6 días	lun 5/8/19	mar 3/9/19										
217			Conexiones y Jumpers	4 días	lun 19/8/19	vie 30/8/19										
218			Transformadores	3 días	jue 1/8/19	lun 5/8/19										
219			Alumbrado Publico	8 días	lun 5/8/19	mié 14/8/19										
220			Normalización Suministros	10 días	vie 30/8/19	jue 12/9/19										
221			Remoción	50 días	lun 29/7/19	mar 8/10/19										
222			Tendido de Conductor Media Tensión	18 días	lun 29/7/19	lun 26/8/19										
223			Tendido de Conductor Baja Tensión	10 días	lun 2/9/19	vie 13/9/19										
224			Armados de Media Tensión	5 días	mar 27/8/19	lun 2/9/19										
225			Armados de Baja Tensión	8 días	mié 25/9/19	mar 8/10/19										
226			Transformadores	5 días	lun 16/9/19	vie 20/9/19										
227			Izado de postes	10 días	lun 23/9/19	lun 7/10/19										
228			Cierre de Polígono 10	0 días	lun 7/10/19	lun 7/10/19										
229			Cierre de Obras	20 días	mar 8/10/19	lun 4/11/19										


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

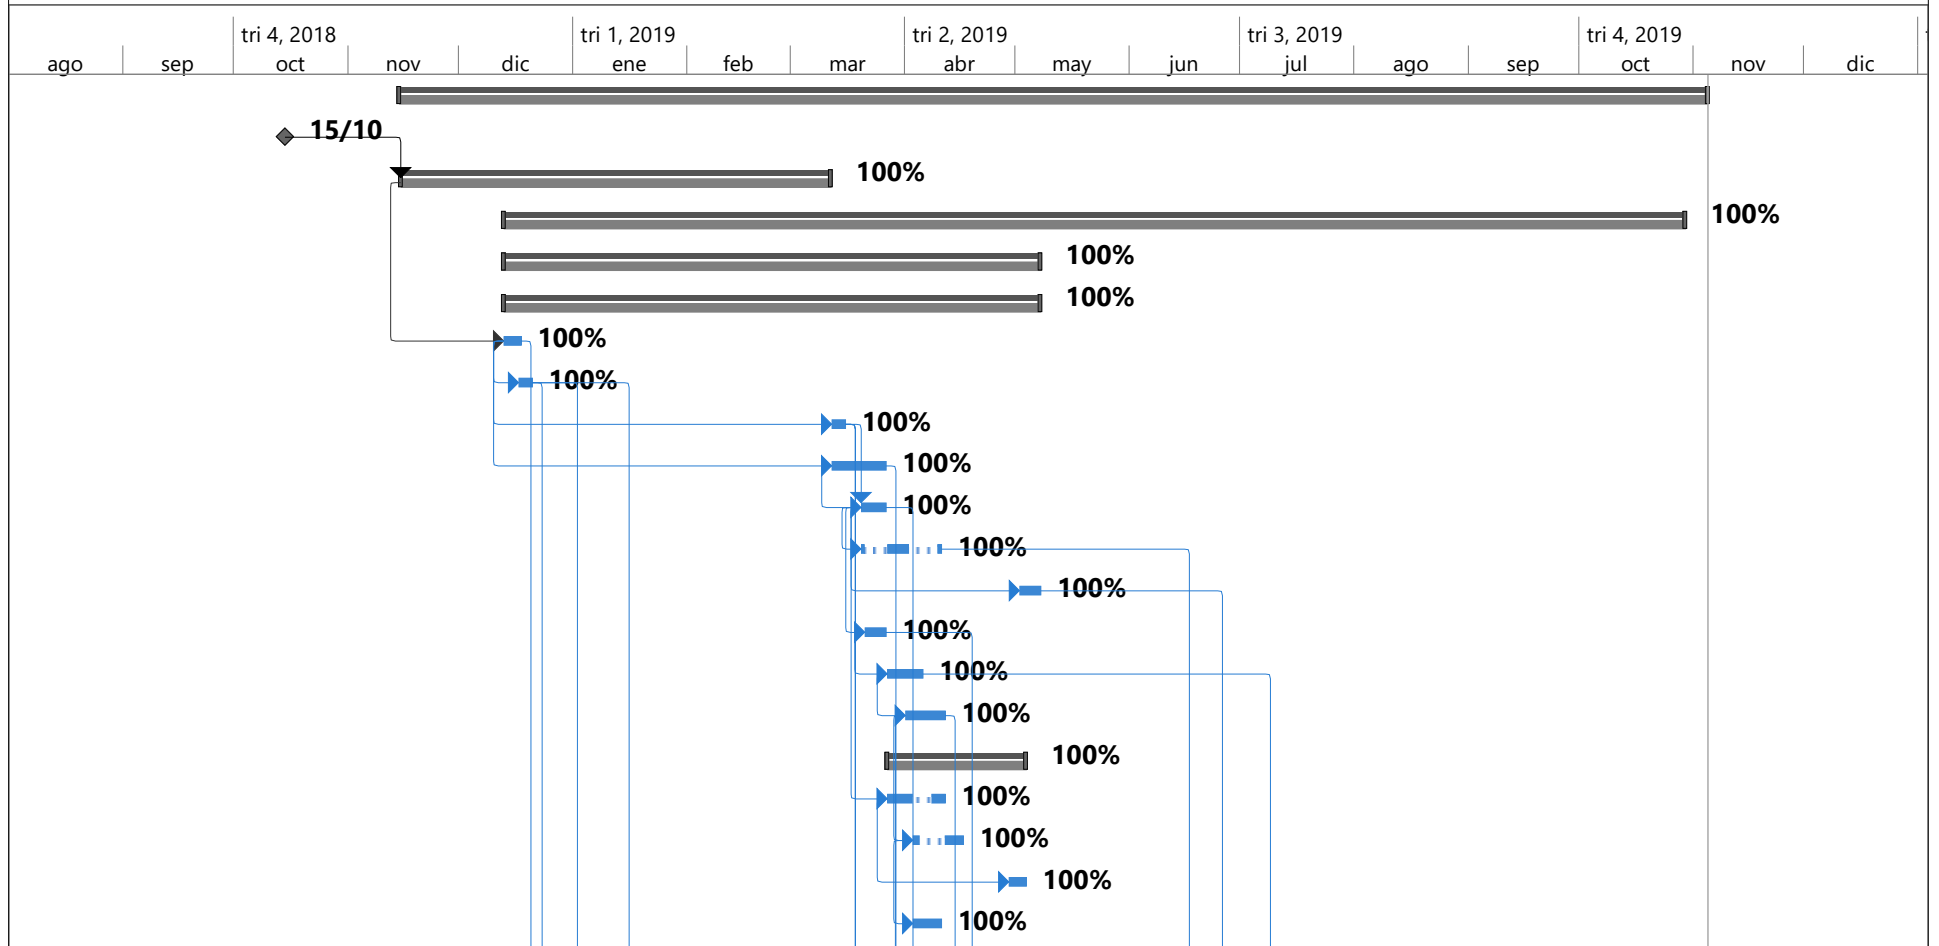


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

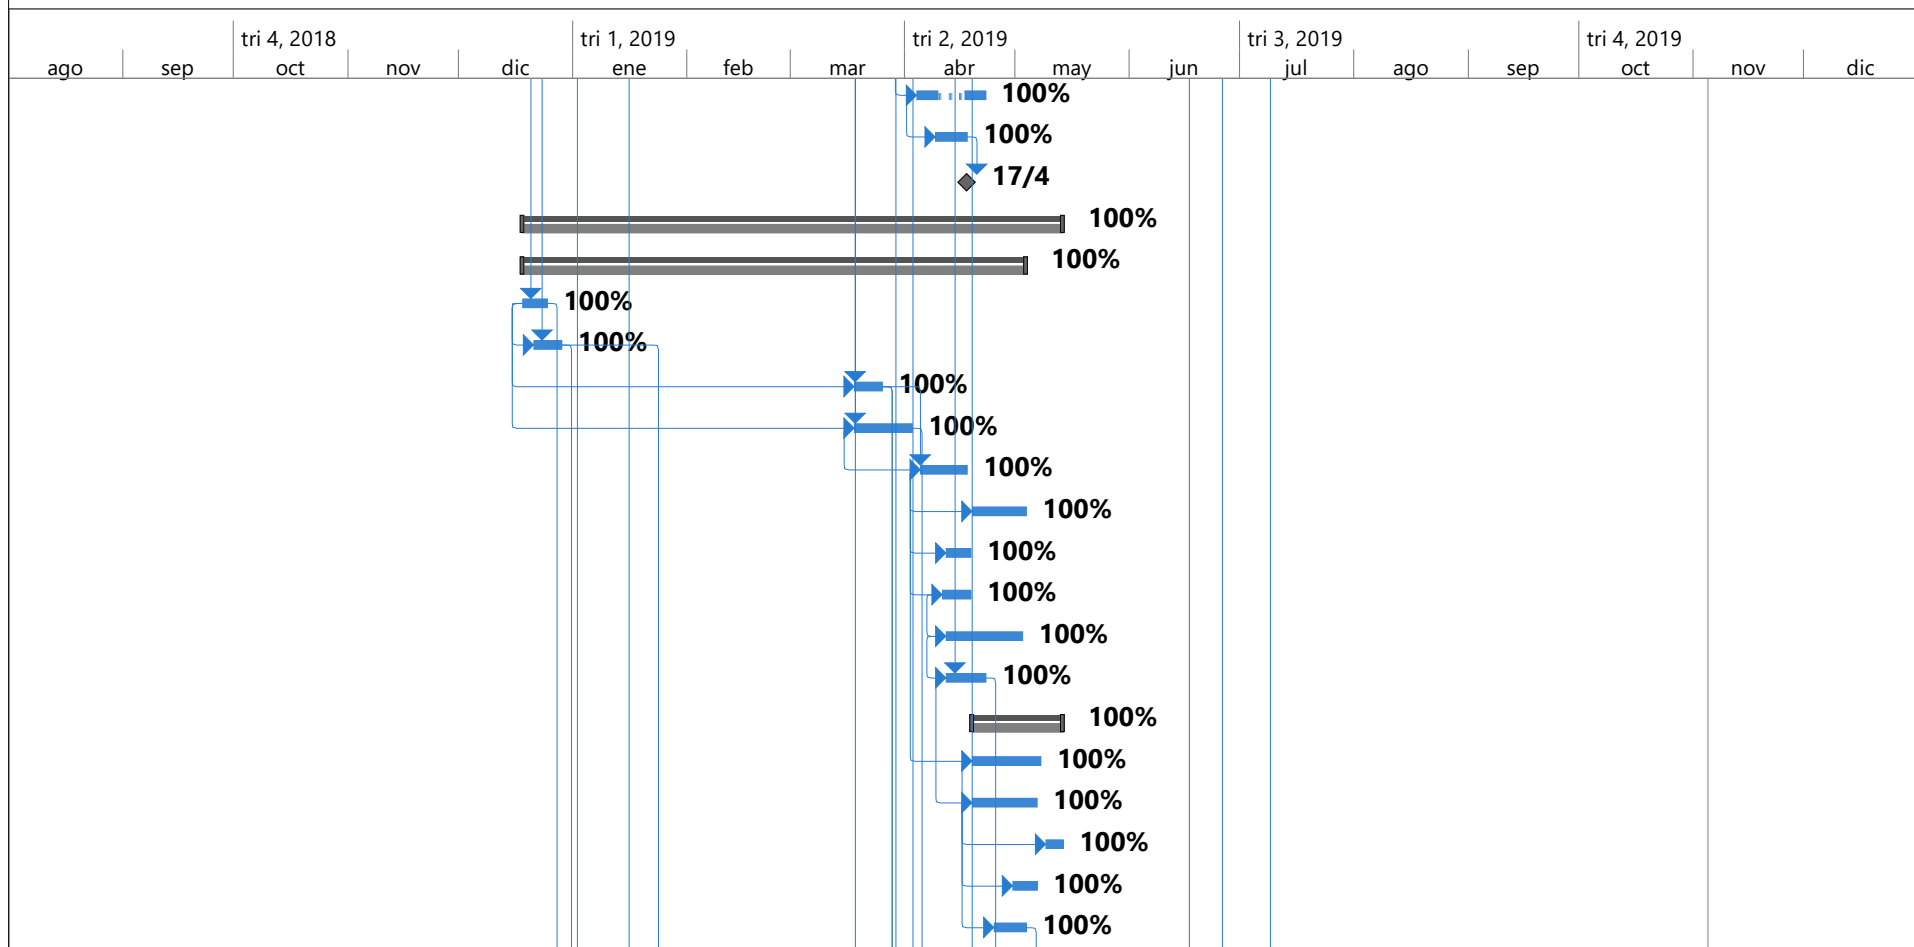


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

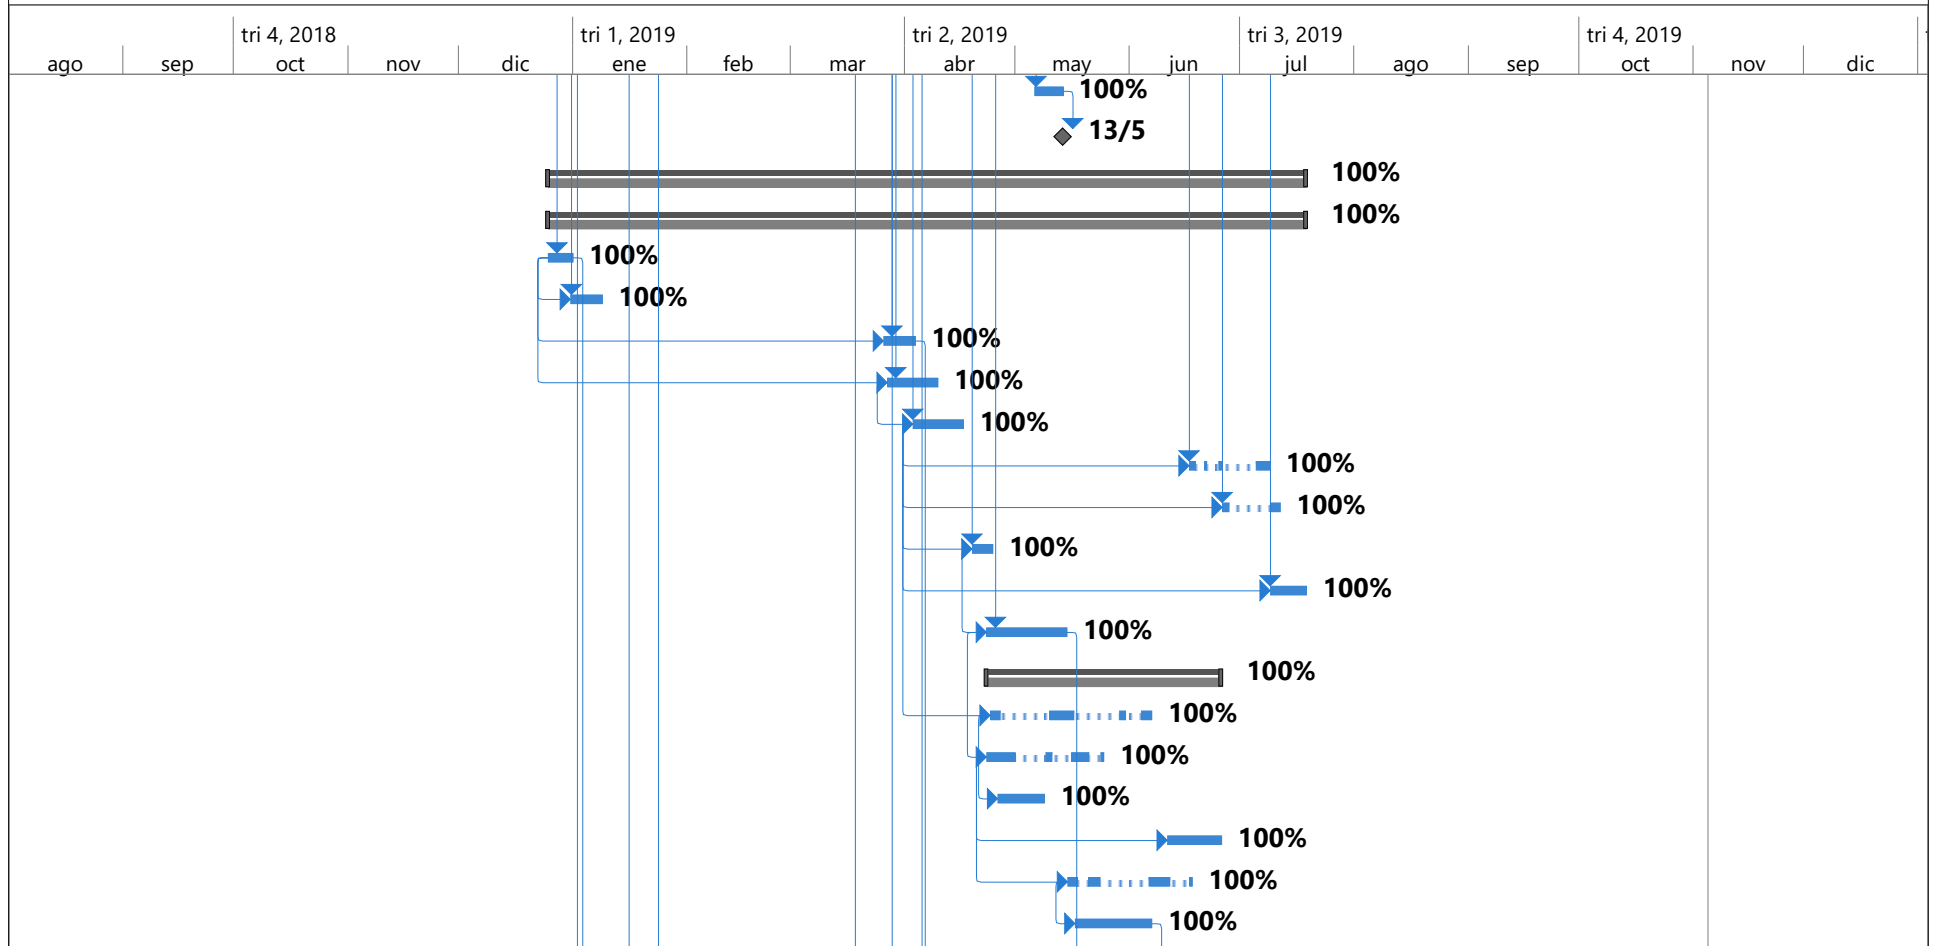


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

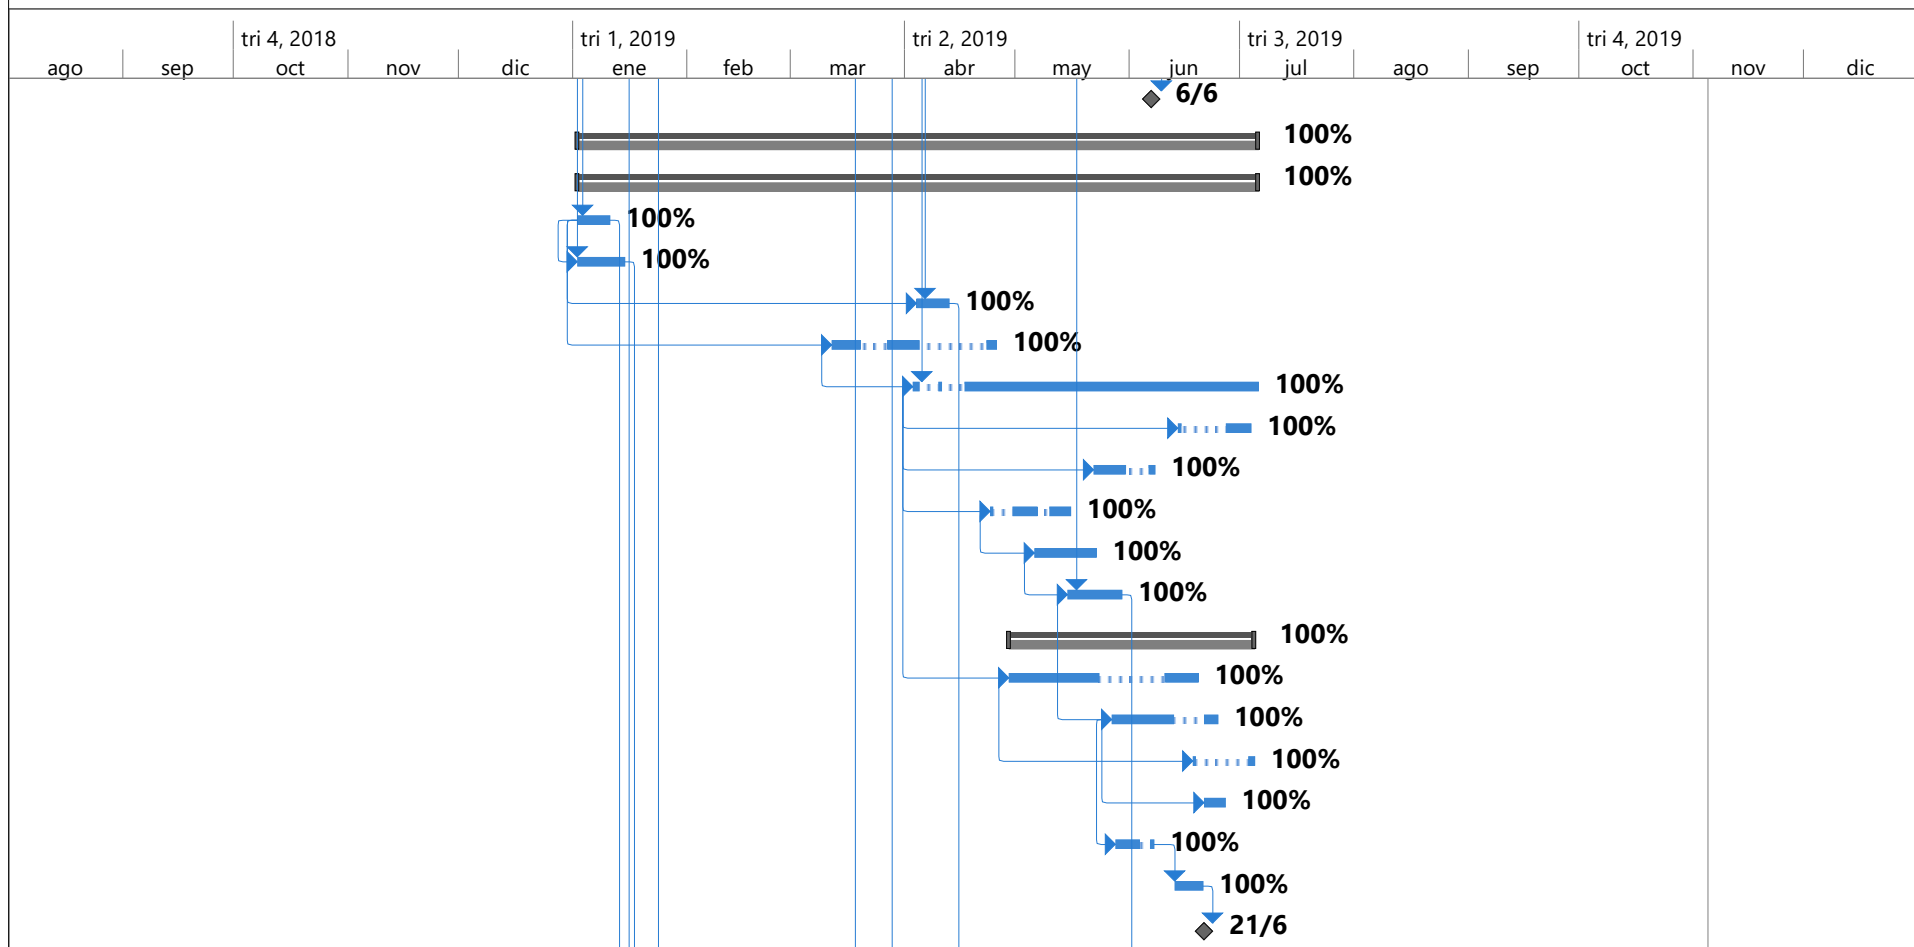


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

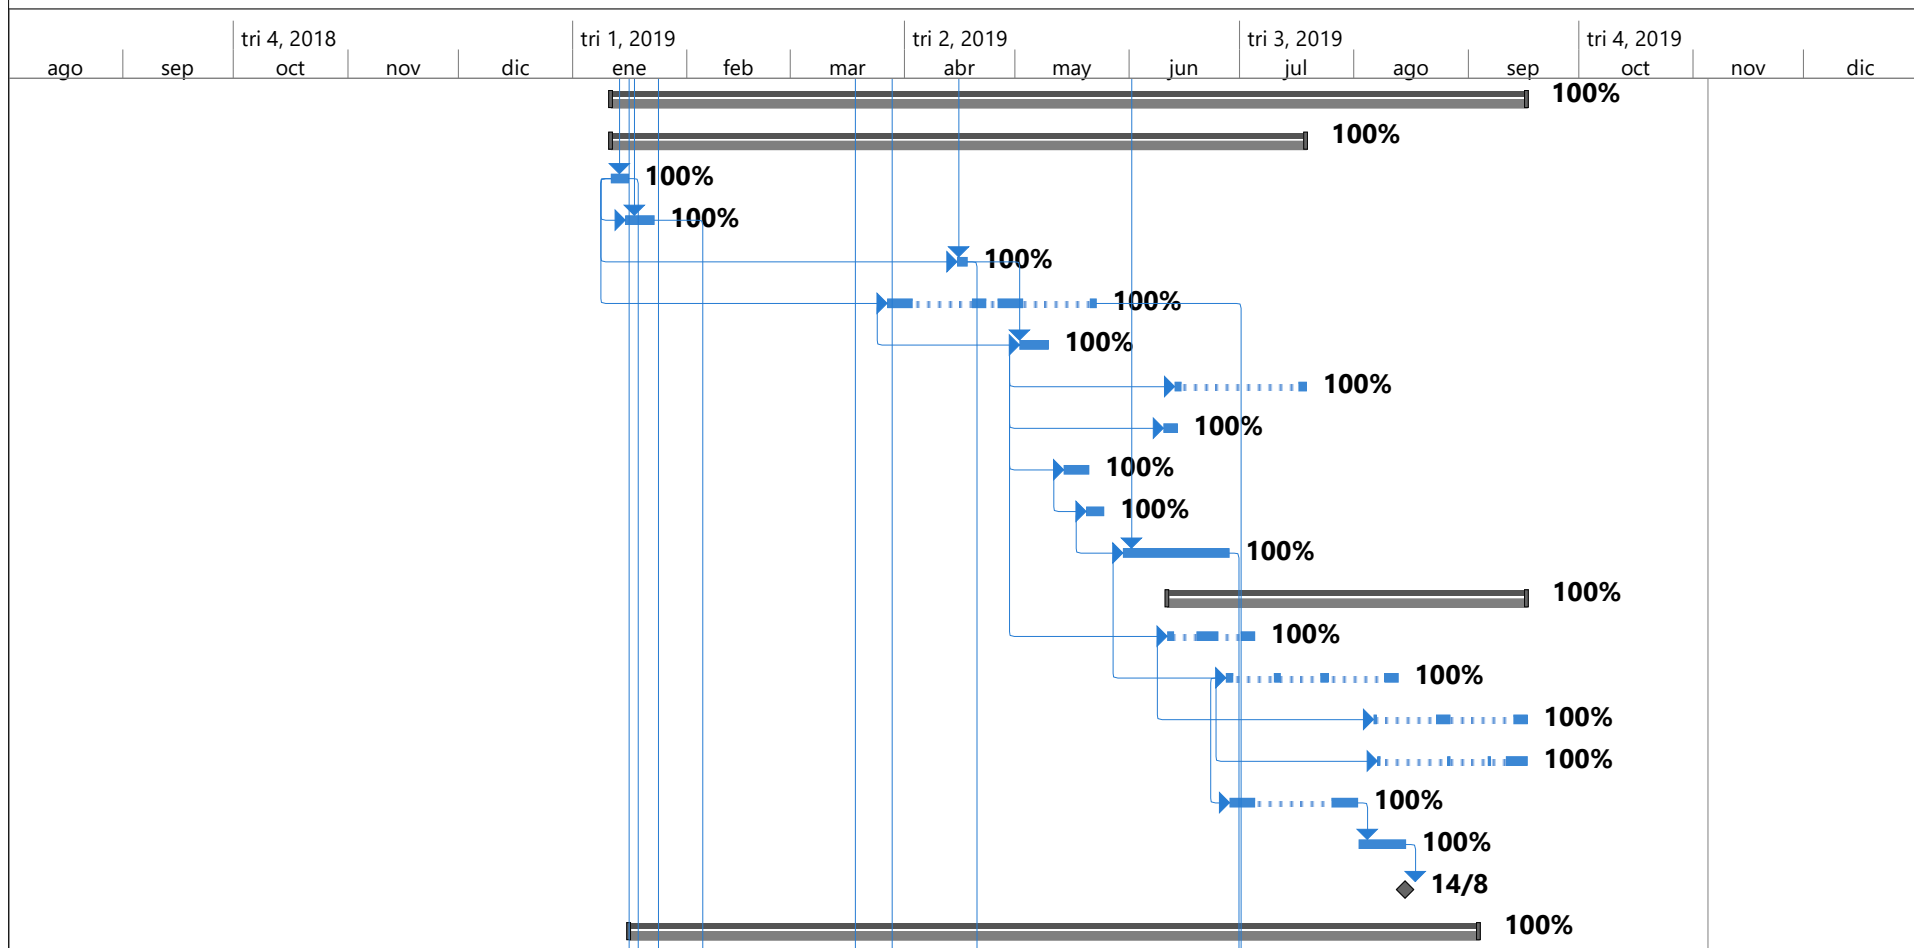


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

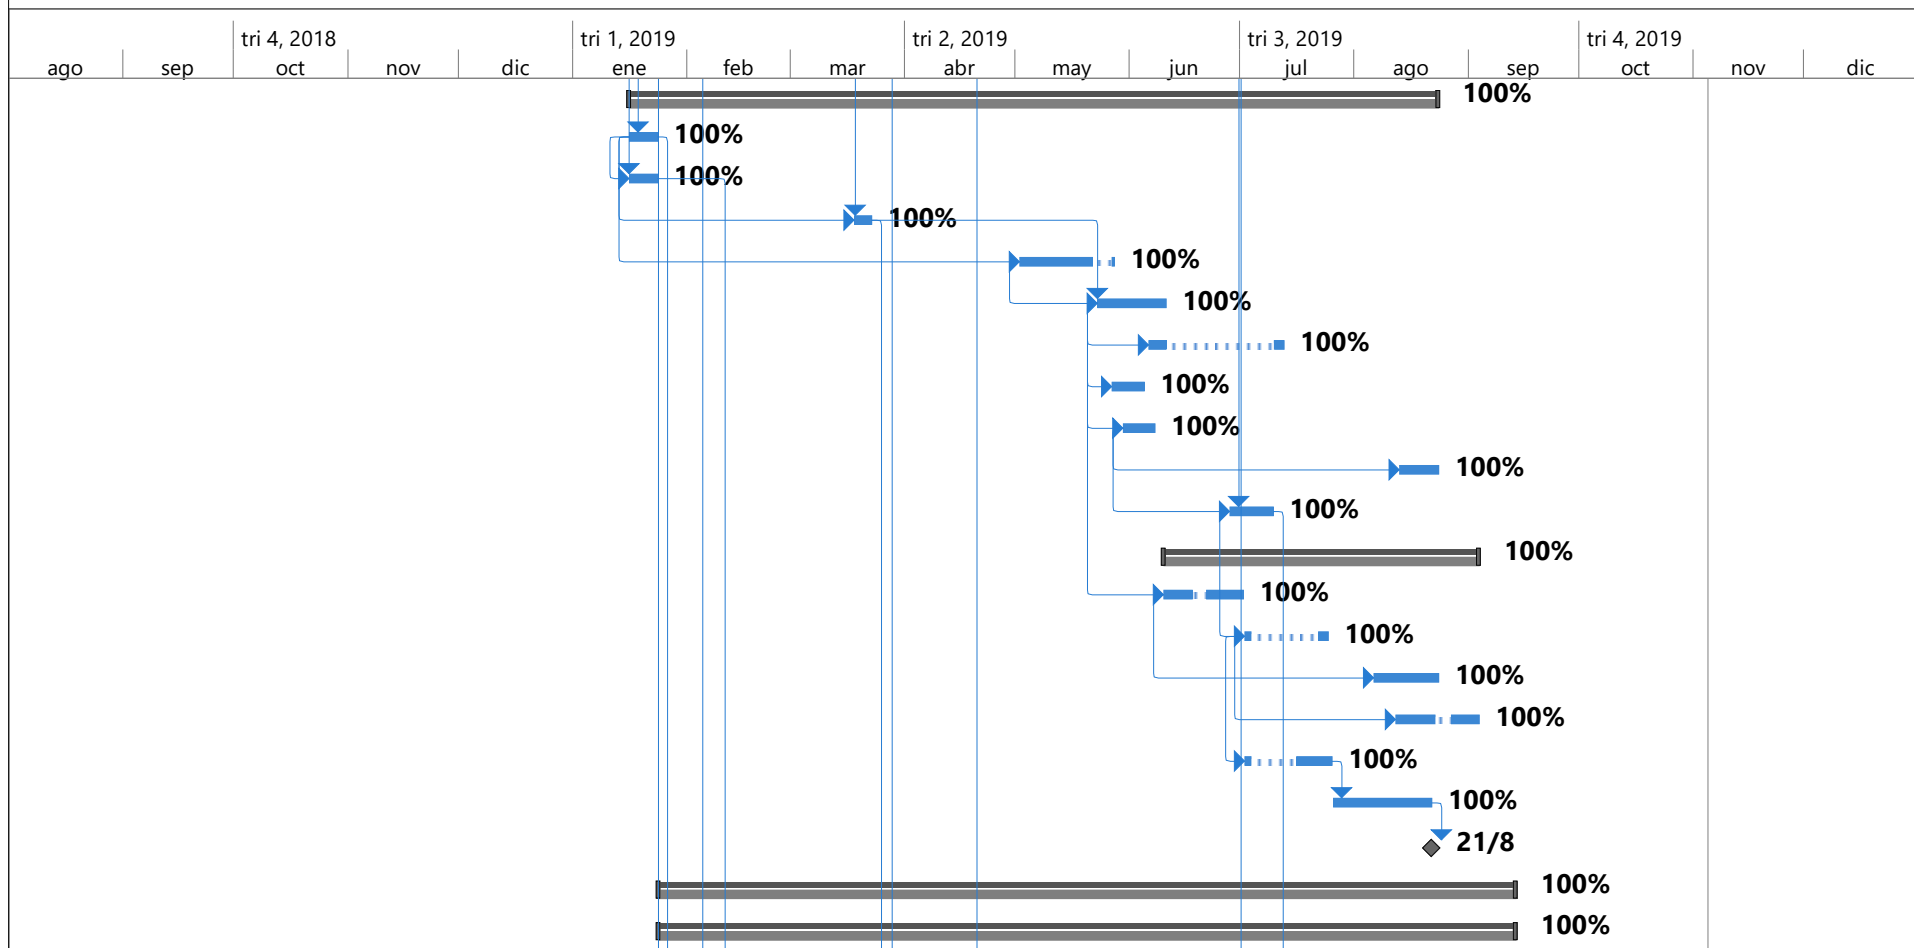


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

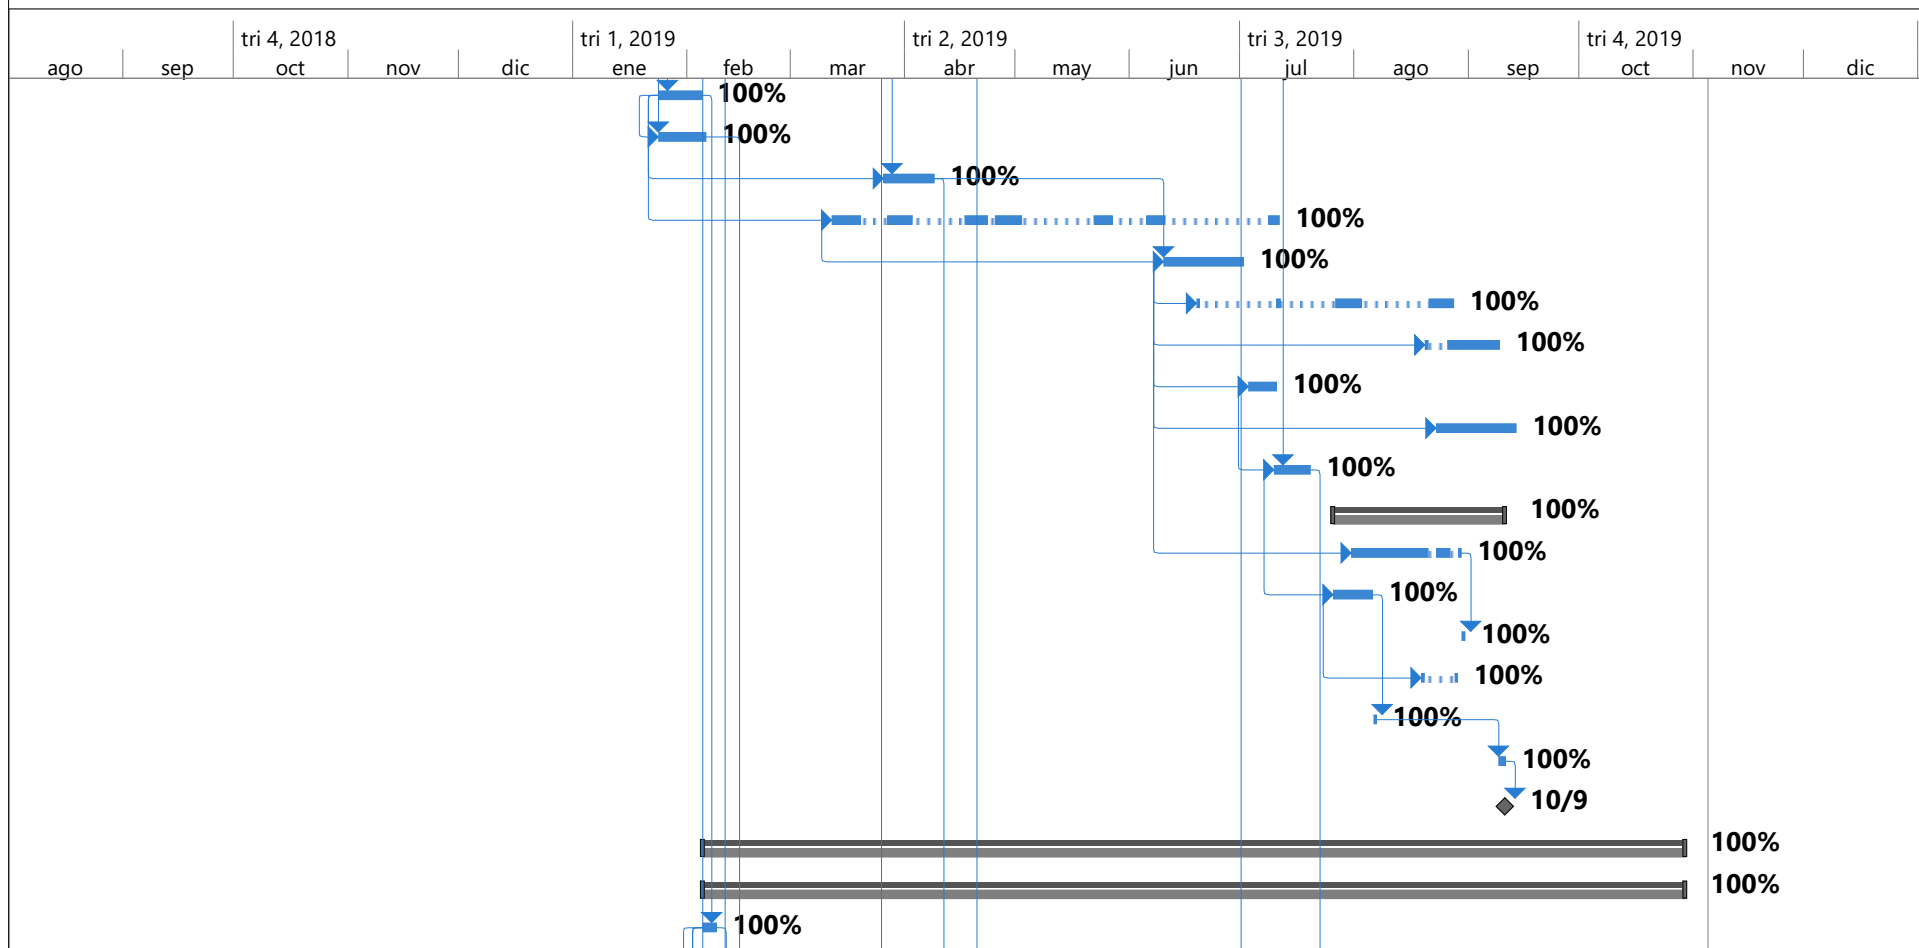


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

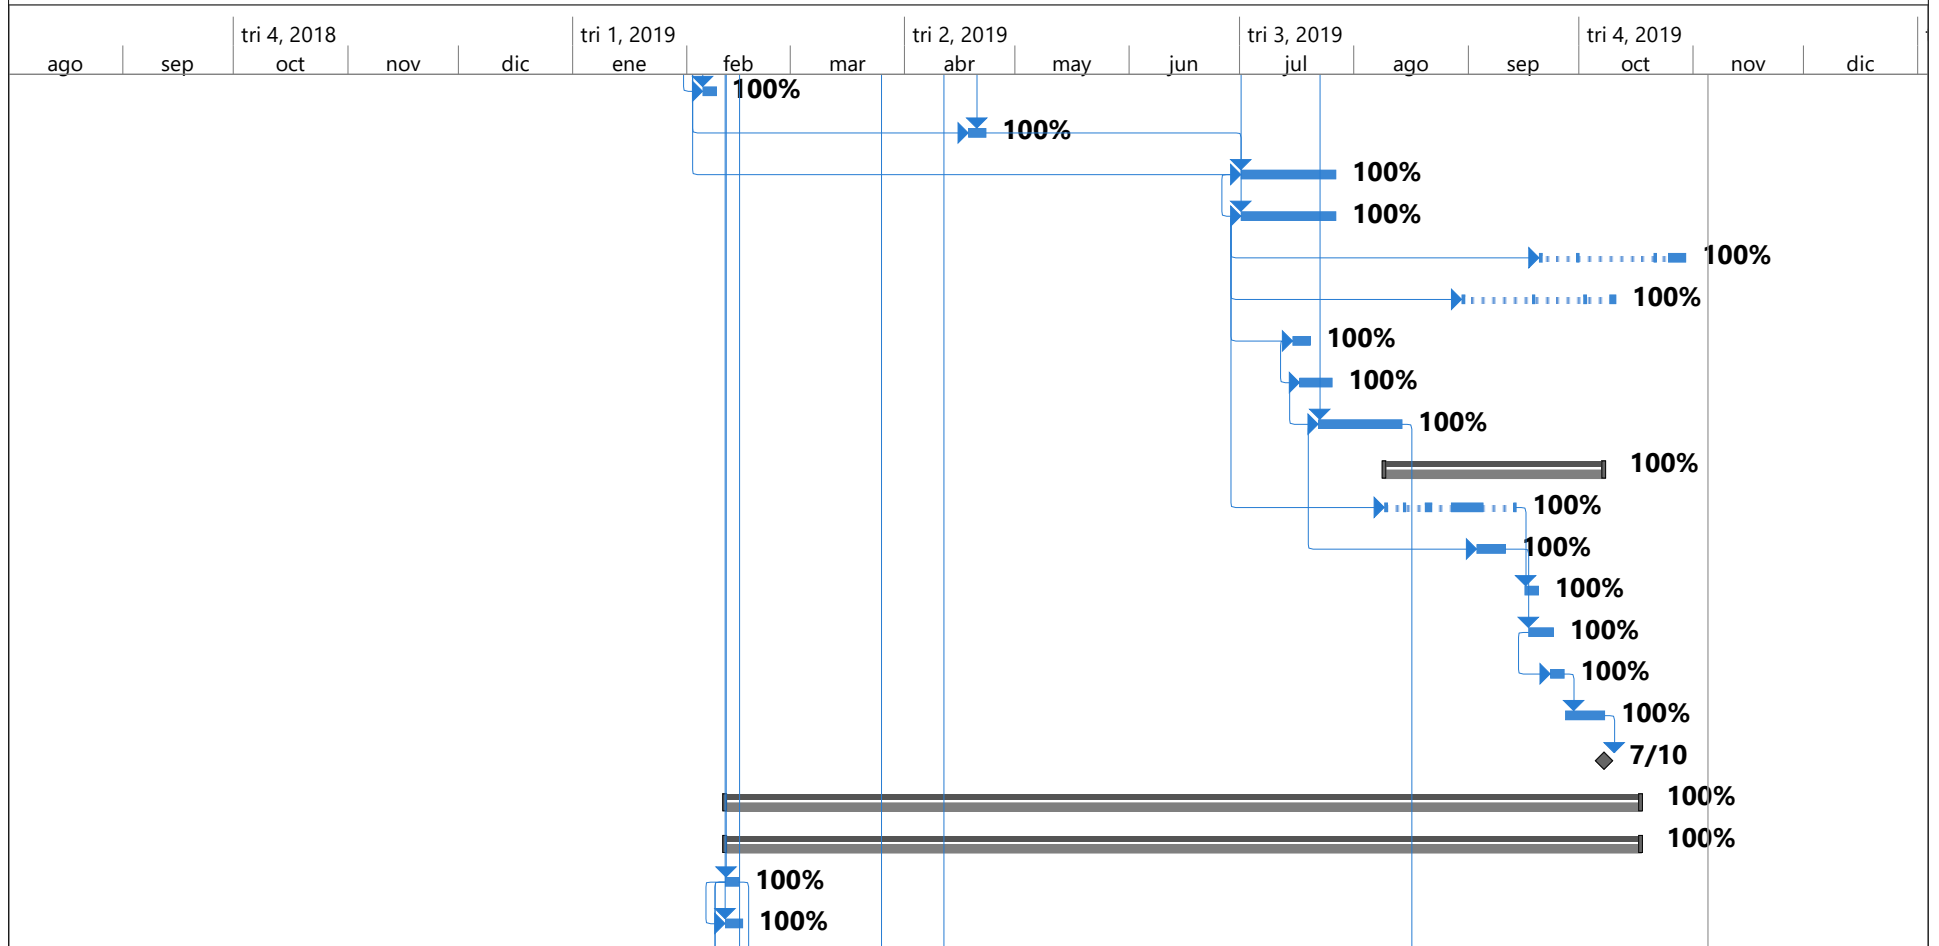

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

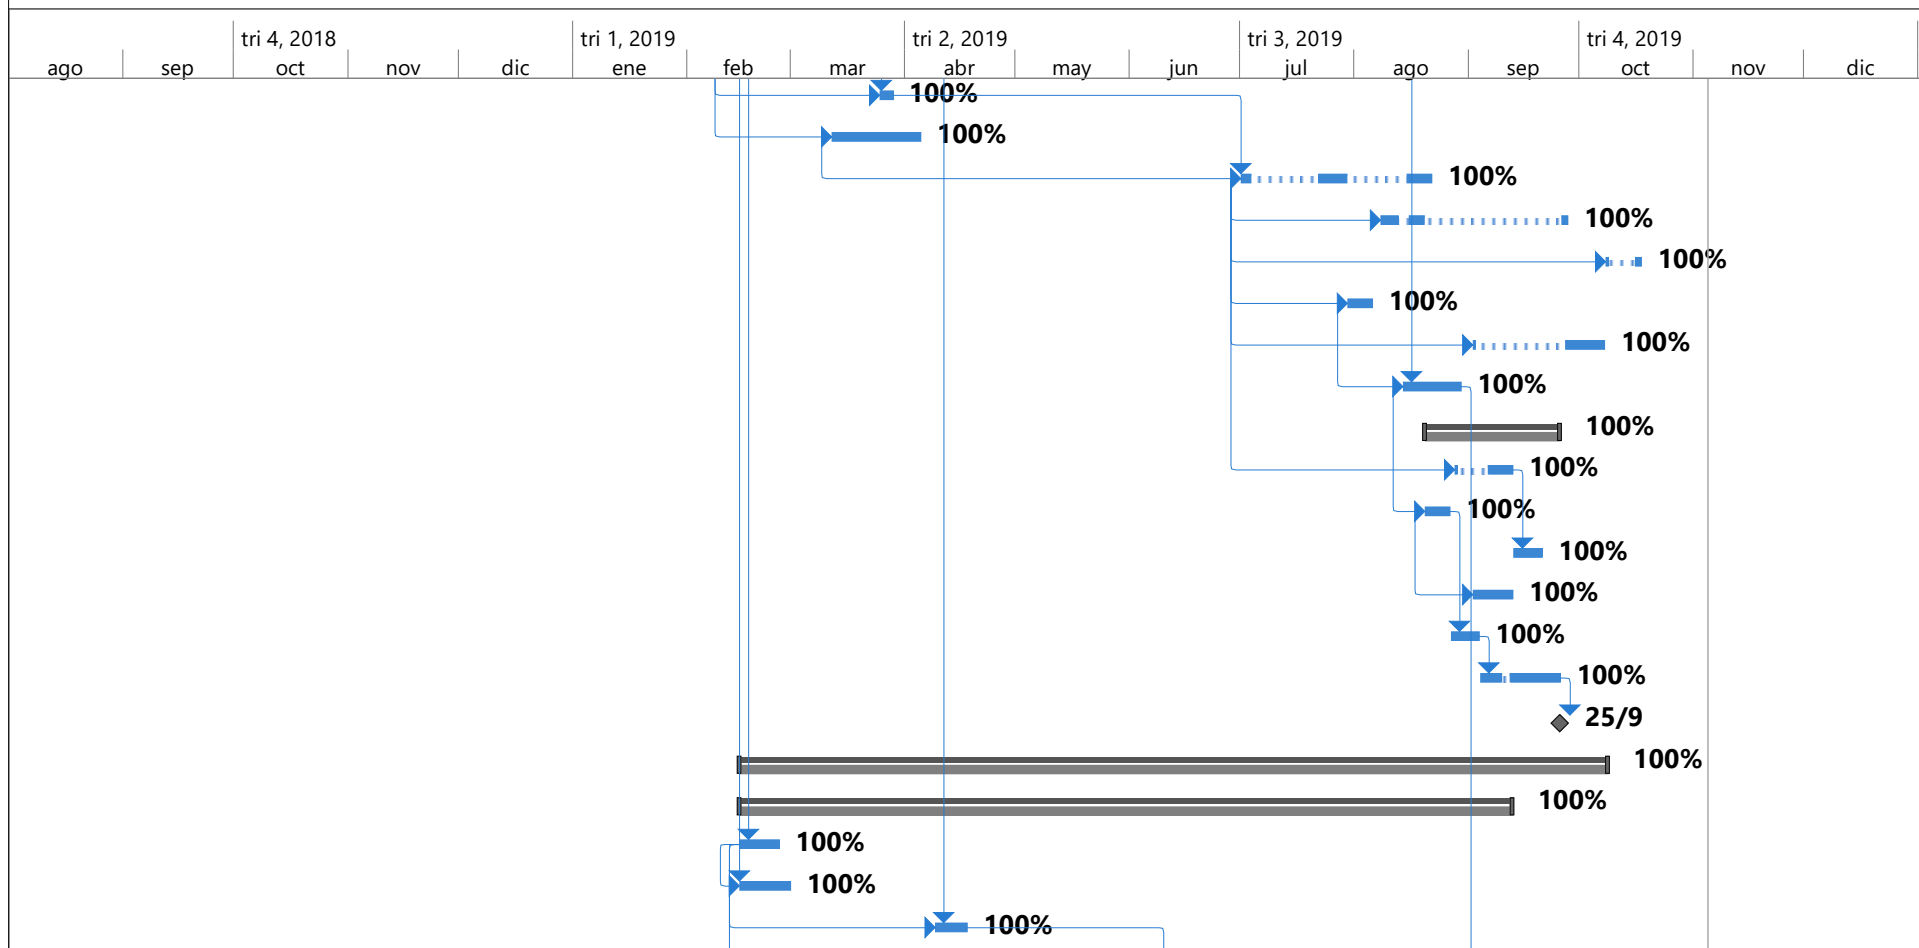

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CANA102 Mayo2021

