




















































































Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2			
						A	M	J	J
1			Rehabilitación de Redes CHIV106	257.13 días	jue 15/11/18				
2			Adjudicación	0 días	lun 1/10/18				
3			Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18				
28			Ejecución	217 días	jue 13/12/18				
29			Polígono 1	100 días	jue 13/12/18				
30			Instalación	94 días	jue 13/12/18				
31			lizado de postes	4 días	jue 13/12/18				
32			Cimentaciones	5 días	jue 13/12/18				
33			Retenidas	4 días	jue 7/3/19				
34			Armados de Media y Baja Tensión	10 días	jue 7/3/19				
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días	jue 21/3/19				
36			Elementos de Protección y Maniobra	3 días	jue 21/3/19				
37			Conexiones y Jumpers	6 días	lun 1/4/19				
38			Transformadores	5 días	jue 21/3/19				
39			Alumbrado Publico	4 días	lun 1/4/19				
40			Normalización Suministros	12 días	jue 21/3/19				
41			Remoción	40 días	jue 7/3/19				
42			Tendido de Conductor Media Tensión	0 días	mié 3/4/19				
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días	mar 26/3/19				
44			Armados de Media Tensión	5 días	jue 7/3/19				
45			Armados de Baja Tensión	8 días	lun 1/4/19				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2				
						A	M	J	J	
46			Transformadores	3 días	mié 10/4/19					
47			lizado de postes	13 días	lun 15/4/19					
48			Cierre de Polígono 1	0 días	mié 1/5/19					
49			Polígono 2	145 días	mié 19/12/18					
50			Instalación	145 días	mié 19/12/18					
51			lizado de postes	22 días	mié 19/12/18					
52			Cimentaciones	19 días	lun 24/12/18					
53			Retenidas	14 días	lun 31/12/18					
54			Armados de Media y Baja Tensión	19 días	jue 21/3/19					
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días	jue 4/4/19					
56			Elementos de Protección y Maniobra	15 días	jue 16/5/19					
57			Conexiones y Jumpers	15 días	vie 14/6/19					
58			Transformadores	25 días	jue 11/4/19					
59			Alumbrado Publico	10 días	jue 2/5/19					
60			Normalización Suministros	41 días	mié 17/4/19					
61			Remoción	41 días	vie 19/4/19					
62			Tendido de Conductor Media Tensión	14 días	vie 19/4/19					
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	lun 29/4/19					
64			Armados de Media Tensión	7 días	jue 30/5/19					
65			Armados de Baja Tensión	11 días	jue 2/5/19					
66			Transformadores	16 días	lun 6/5/19					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2				
						A	M	J	J	
67			Izado de postes	17 días	mié 8/5/19					
68			Cierre de Polígono 2	0 días	jue 30/5/19					
69			Polígono 3	172 días	vie 18/1/19					
70			Instalación	140 días	vie 18/1/19					
71			Izado de postes	12 días	vie 18/1/19					
72			Cimentaciones	8 días	jue 24/1/19					
73			Retenidas	7 días	vie 25/1/19					
74			Armados de Media y Baja Tensión	40 días	vie 19/4/19					
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días	vie 26/4/19					
76			Elementos de Protección y Maniobra	7 días	lun 24/6/19					
77			Conexiones y Jumpers	8 días	vie 3/5/19					
78			Transformadores	10 días	vie 7/6/19					
79			Alumbrado Publico	7 días	vie 14/6/19					
80			Normalización Suministros	16 días	mar 25/6/19					
81			Remoción	81 días	lun 27/5/19					
82			Tendido de Conductor Media Tensión	21 días	lun 27/5/19					
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días	mié 31/7/19					
84			Armados de Media Tensión	10 días	jue 6/6/19					
85			Armados de Baja Tensión	16 días	lun 5/8/19					
86			Transformadores	6 días	lun 5/8/19					
87			Izado de postes	25 días	mar 13/8/19					








Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2				
						A	M	J	J	
88			Cierre de Polígono 3	0 días	lun 16/9/19					
89			Polígono 4	179 días	mar 5/2/19					
90			Instalación	169 días	mar 5/2/19					
91			Izado de postes	6 días	mar 5/2/19					
92			Cimentaciones	5 días	mié 6/2/19					
93			Retenidas	4 días	jue 7/2/19					
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días	vie 2/8/19					
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días	lun 5/8/19					
96			Elementos de Protección y Maniobra	7 días	lun 26/8/19					
97			Conexiones y Jumpers	8 días	lun 2/9/19					
98			Transformadores	14 días	vie 16/8/19					
99			Alumbrado Publico	6 días	mié 28/8/19					
100			Normalización Suministros	18 días	mié 4/9/19					
101			Remoción	29 días	mar 3/9/19					
102			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días	mar 3/9/19					
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	mié 11/9/19					
104			Armados de Media Tensión	12 días	mar 10/9/19					
105			Armados de Baja Tensión	10 días	jue 26/9/19					
106			Transformadores	9 días	vie 13/9/19					
107			Izado de postes	15 días	mar 17/9/19					
108			Cierre de Polígono 4	0 días	lun 7/10/19					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	A	M	J	Semestre 2, 2
109			Cierre de Obras	20 días	lun 14/10/19				
110			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms	lun 14/10/19				
111			Presentación de Cierre de Obras	0 días	vie 8/11/19				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

2018 A S O N D Semestre 1, 2019 E F M A M J Semestre 2, 2019 J A S O N D

The Gantt chart displays the execution schedule for CHIV106 in June 2021. The timeline spans from December 2018 to December 2019, divided into Semestre 1, 2019 (January to June) and Semestre 2, 2019 (July to December). The chart shows a series of tasks, each represented by a horizontal bar. The first task, labeled '1/10', starts in December 2018 and ends in January 2019. Subsequent tasks are shown in a cascading manner, with some labeled '100%' and others '3/4'. The tasks are connected by arrows, indicating a sequential flow. The final task, labeled '3/4', ends in June 2019.


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

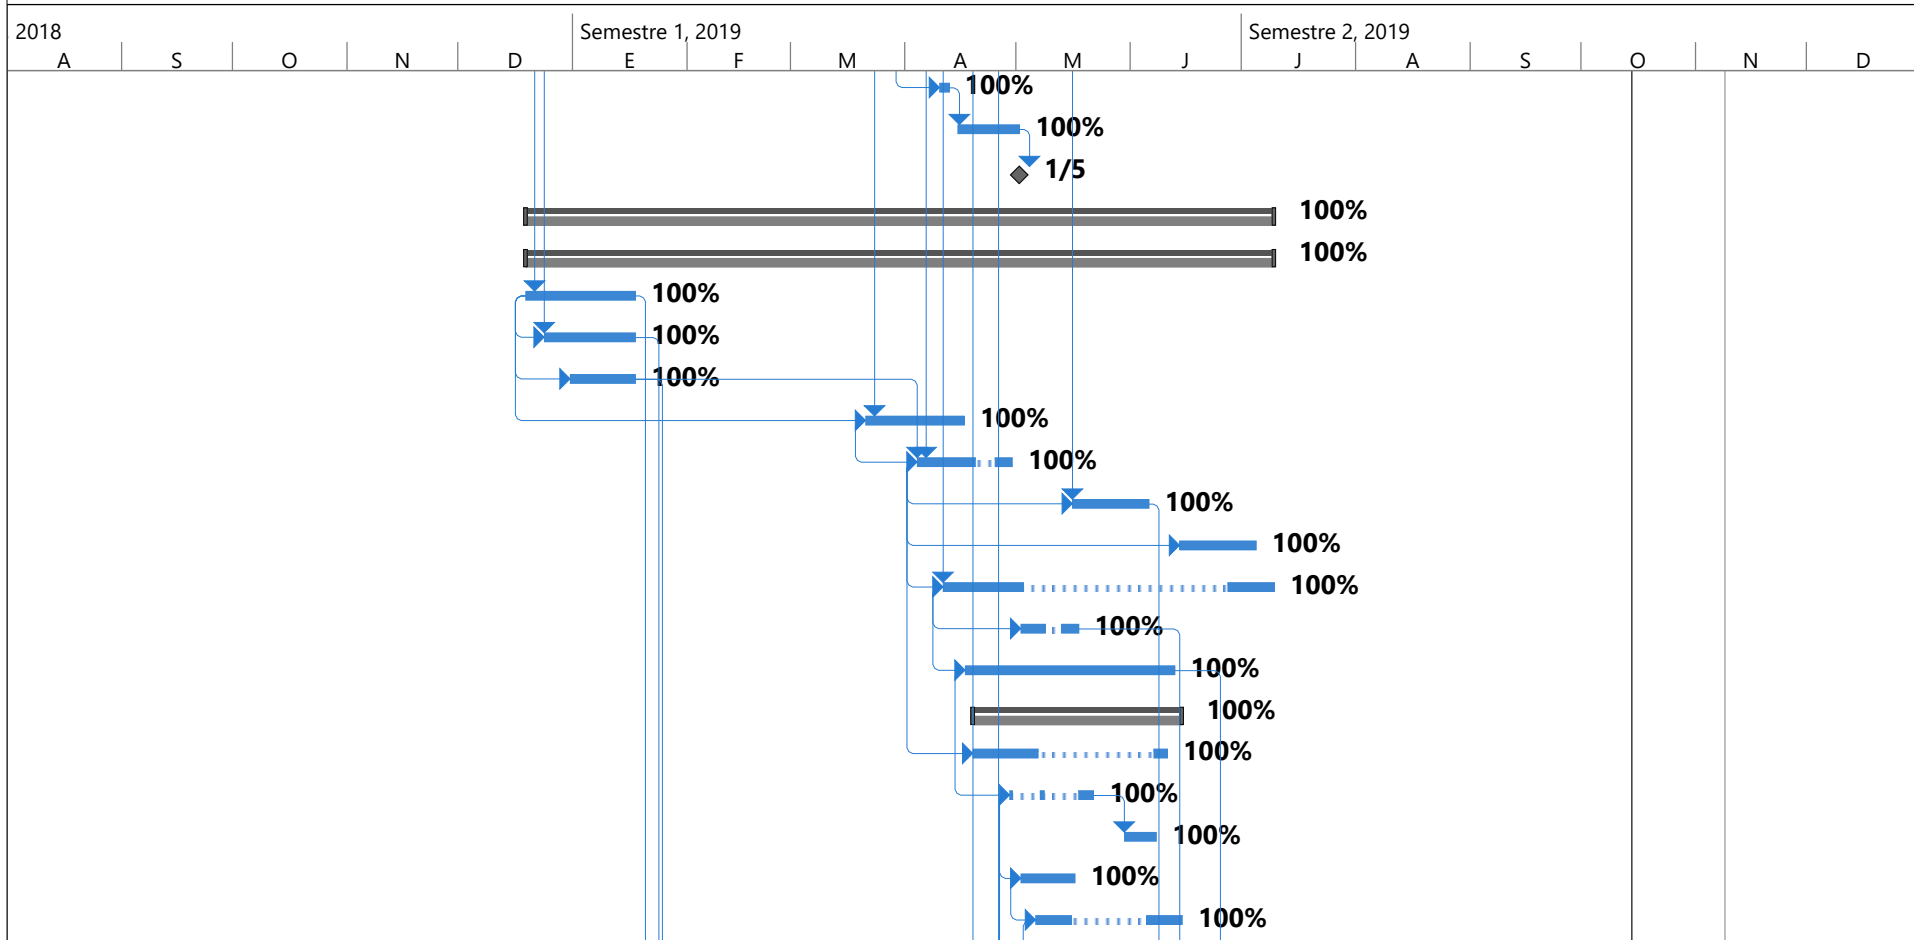


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

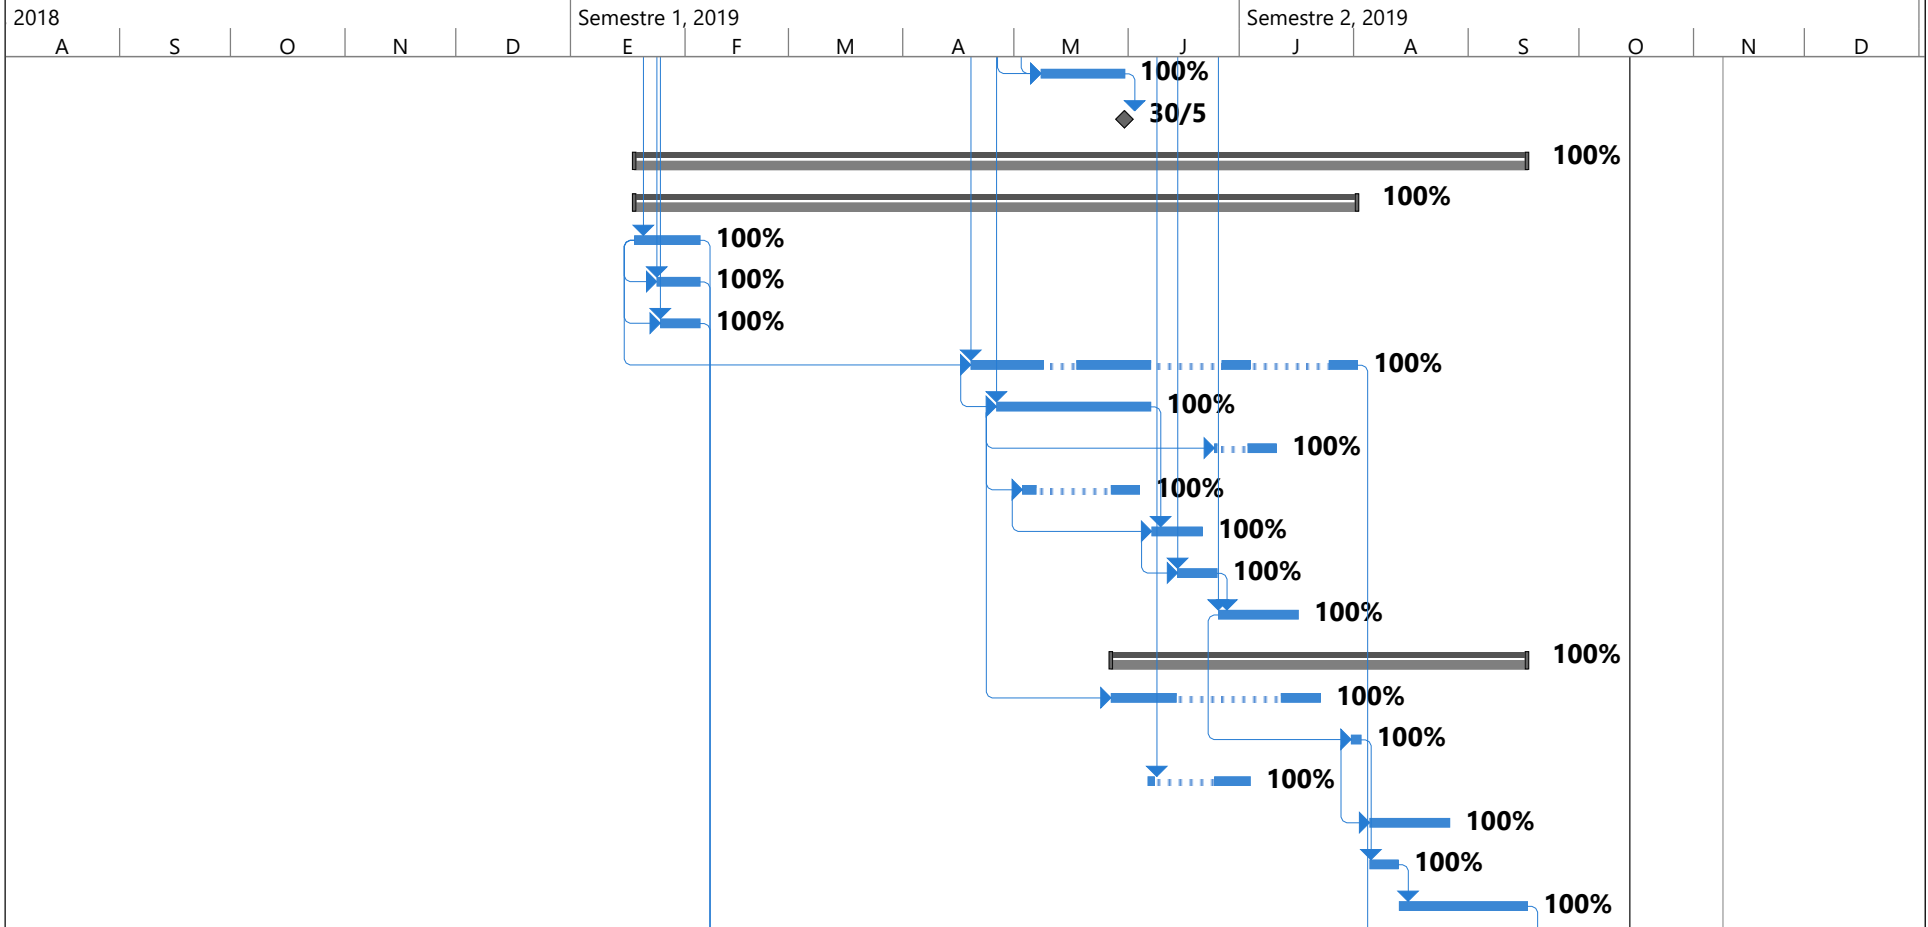


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021

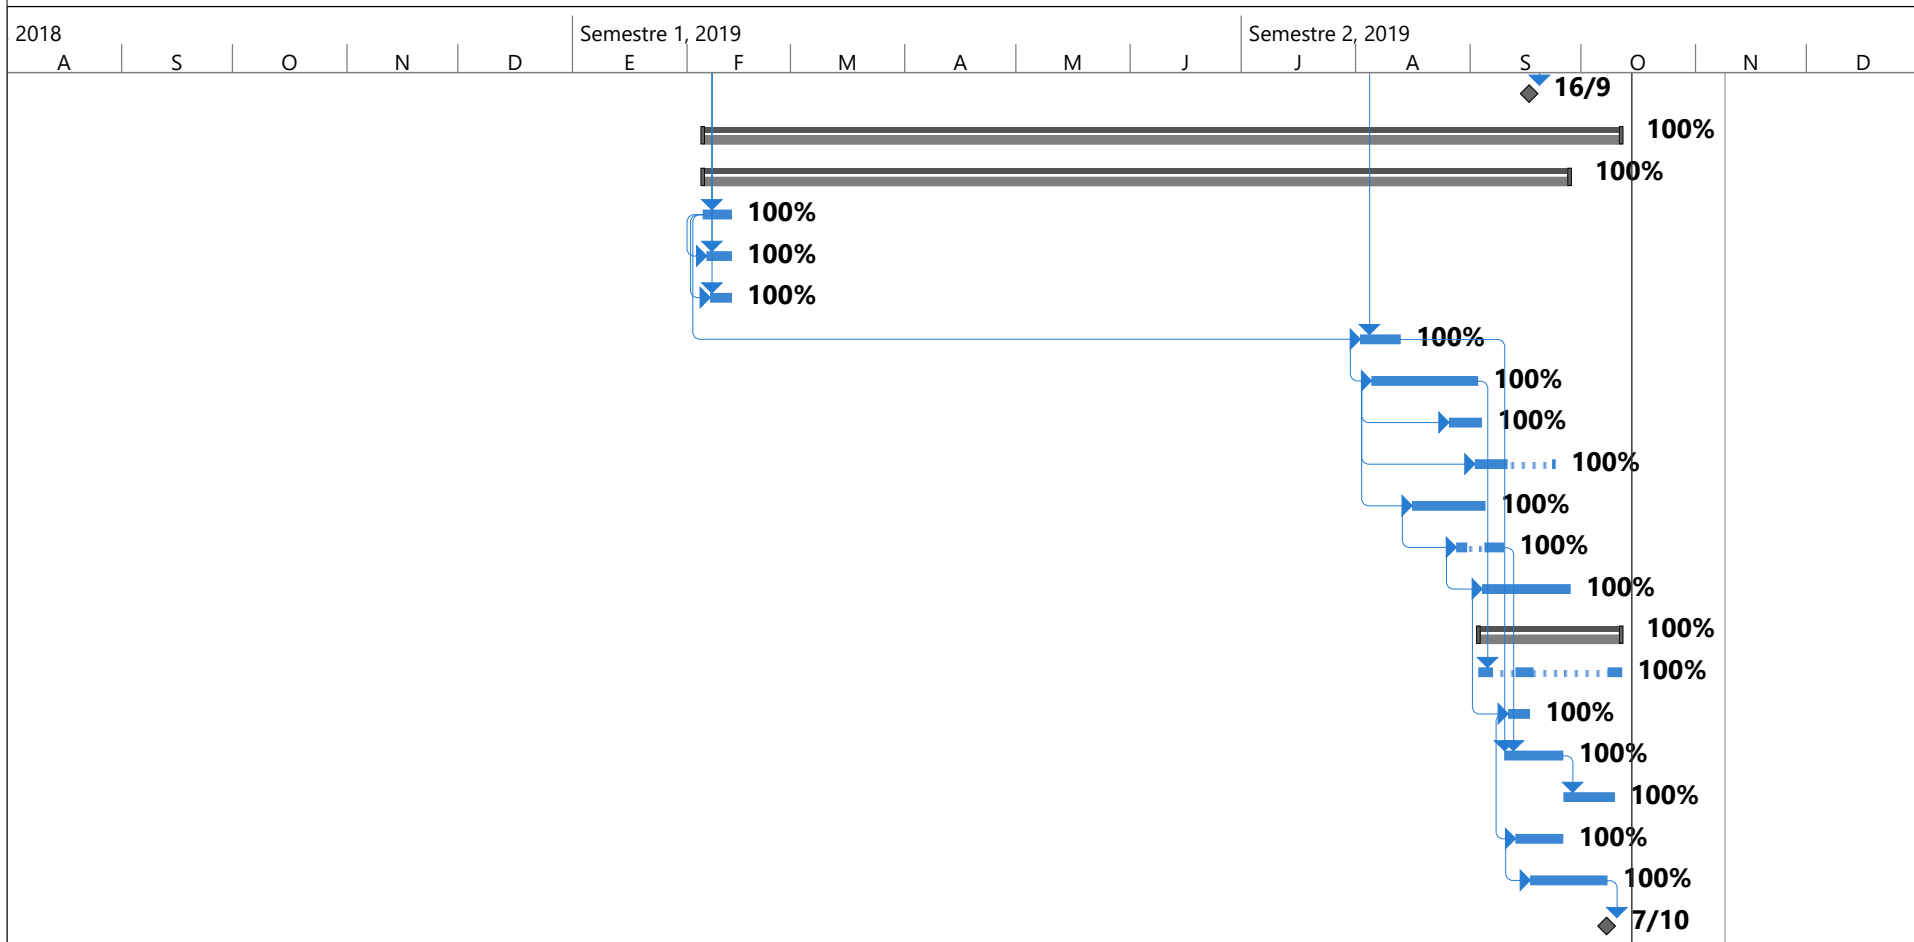

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Junio 2021



Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana
 F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
