




























































































Calendario de Ejecución Lote 09-SABY102

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo
1			Rehabilitación de Redes SABY102	191.88 días	mar 7/7/20	mié 31/3/21	100%	\$0.00
2			Ejecución	171.88 días	mar 7/7/20	mié 3/3/21	100%	\$0.00
3			Polígono 1	118.88 días	mar 7/7/20	vie 18/12/20	100%	\$0.00
4			Instalación	118.88 días	mar 7/7/20	vie 18/12/20	100%	\$0.00
5			Excavaciones	24 días	mar 7/7/20	vie 7/8/20	100%	\$0.00
6			Izado de postes	28 días	jue 9/7/20	lun 17/8/20	100%	\$0.00
7			Cimentaciones	6 días	mié 12/8/20	mié 19/8/20	100%	\$0.00
8			Retenidas	25 días	jue 30/7/20	mié 2/9/20	100%	\$0.00
9			Armados MT y BT	29 días	jue 6/8/20	mar 15/9/20	100%	\$0.00
10			Tendido de Conductor MT y BT	24 días	jue 20/8/20	mié 23/9/20	100%	\$0.00
11			Conexiones y Jumpers	36 días	jue 3/9/20	vie 23/10/20	100%	\$0.00
12			Puesta a Tierra	36 días	jue 3/9/20	vie 23/10/20	100%	\$0.00
13			Transformadores	28 días	jue 17/9/20	mar 27/10/20	100%	\$0.00
14			Alumbrado Público	28 días	lun 21/9/20	jue 29/10/20	100%	\$0.00
15			Totalizadores	1 día	jue 1/10/20	vie 2/10/20	100%	\$0.00
16			Acometida	35 días	jue 29/10/20	jue 17/12/20	100%	\$0.00
17			Finalizacion del Poligono 1	1 día	jue 17/12/20	vie 18/12/20	100%	\$0.00
18			Remoción	30 días	jue 29/10/20	jue 10/12/20	100%	\$0.00
19			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días	jue 29/10/20	jue 10/12/20	100%	\$0.00
20			Armados de Media y Baja Tensión	30 días	jue 29/10/20	jue 10/12/20	100%	\$0.00
21			Transformadores	30 días	jue 29/10/20	jue 10/12/20	100%	\$0.00






Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución Lote 09-SABY102

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo
22			Remocion de postes	30 días	jue 29/10/20	jue 10/12/20	100%	\$0.00
23			Polígono 2	147.88 días	lun 10/8/20	mié 3/3/21	100%	\$0.00
24			Instalación	143 días	lun 10/8/20	mié 24/2/21	100%	\$0.00
25			Excavaciones	46 días	lun 10/8/20	lun 12/10/20	100%	\$0.00
26			Izado de postes	55 días	mar 18/8/20	lun 2/11/20	100%	\$0.00
27			Cimentaciones	10 días	jue 22/10/20	mié 4/11/20	100%	\$0.00
28			Retenidas	49 días	jue 3/9/20	mar 10/11/20	100%	\$0.00
29			Armados MT y BT	54 días	mié 16/9/20	lun 30/11/20	100%	\$0.00
30			Tendido de Conductor MT y BT	48 días	vie 9/10/20	mié 16/12/20	100%	\$0.00
31			Conexiones y Jumpers	43 días	vie 23/10/20	mié 23/12/20	100%	\$0.00
32			Puesta a Tierra	43 días	vie 23/10/20	mié 23/12/20	100%	\$0.00
33			Transformadores	13 días	vie 4/12/20	mié 23/12/20	100%	\$0.00
34			Alumbrado Público	34 días	jue 5/11/20	mié 23/12/20	100%	\$0.00
35			Totalizadores	1 día	jue 24/12/20	jue 24/12/20	100%	\$0.00
36			Acometida	45 días	jue 24/12/20	mié 24/2/21	100%	\$0.00
37			Remoción	50 días	mié 23/12/20	mié 3/3/21	100%	\$0.00
38			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	45 días	mié 23/12/20	mié 24/2/21	100%	\$0.00
39			Armados de Media y Baja Tensión	45 días	mié 23/12/20	mié 24/2/21	100%	\$0.00
40			Transformadores	45 días	mié 23/12/20	mié 24/2/21	100%	\$0.00
41			Remocion de postes	45 días	mié 23/12/20	mié 24/2/21	100%	\$0.00
42			Cierre de Obras	20 días	mié 3/3/21	mié 31/3/21	100%	\$0.00


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución Lote 09-SABY102

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo
43			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms	mié 3/3/21	mié 31/3/21	100%	\$0.00
44			Presentación de Cierre de Obras	0 días	mié 31/3/21	mié 31/3/21	100%	\$0.00





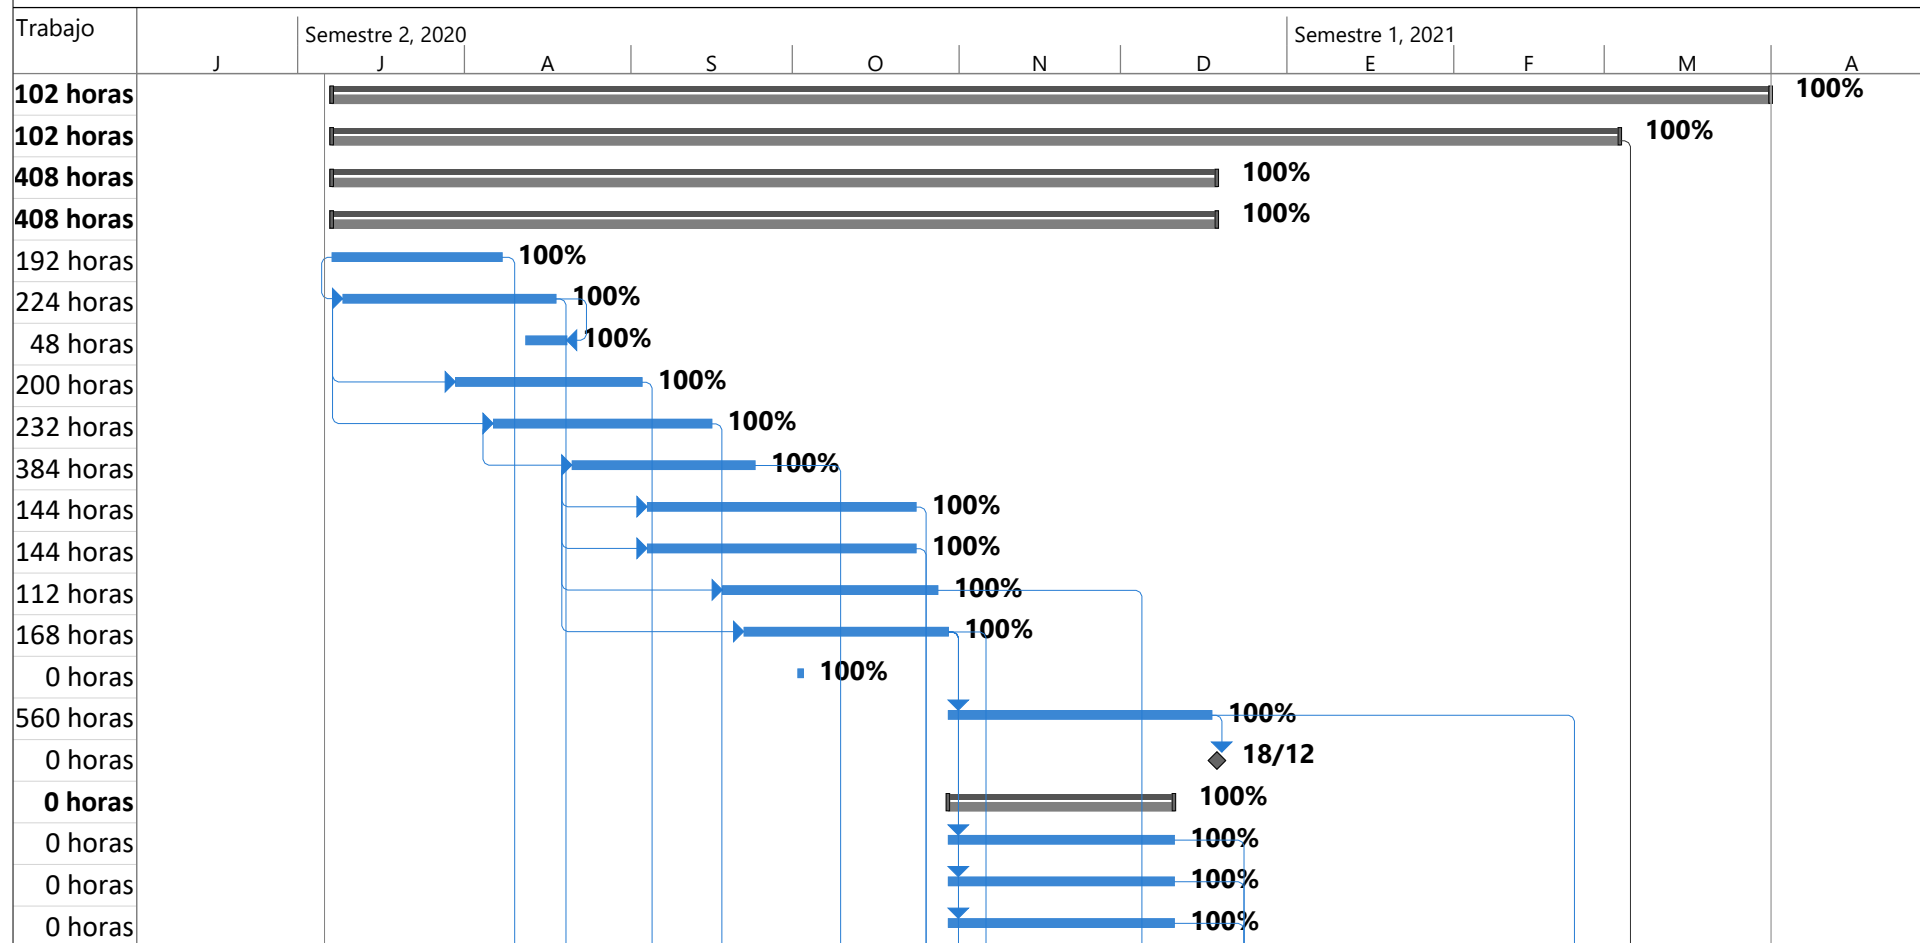


















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución Lote 09-SABY102



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución Lote 09-SABY102

Trabajo	Semestre 2, 2020							Semestre 1, 2021			
	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
0 horas											100%
0 horas											31/3



Ing. Alberto Rafael Rosario Cabral
























Gerente de Ingeniería y Planificación
Dirección de Proyectos Financiados
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
Edenorte Dominicana

T: 809-241-9090 Ext. 4821 F: 809-747-5912

E: arosarioc@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
