














































































Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Semestre 2, 2018 | | | | | | | | | | | | Semestre 1 | |
|----|--|--|--|-----------------|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|--|
| | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | | | |
| 0 | |  | Calendario de Ejecución NAGU101 | 289 días | mié 1/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | |  | Rehabilitación de Redes NAGU101 | 289 días | mié 1/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |  | Ejecución | 269 días | mié 1/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |  | Polígono 1 | 122 días | mié 1/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | Instalación | 122 días | mié 1/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  |  | Excavaciones | 18 días | mié 1/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  |  | Izado de postes | 14 días | vie 3/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  |  | Cimentaciones | 10 días | lun 13/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | |  | Retenidas | 11 días | lun 10/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  |  | Armados MT y BT | 15 días | lun 10/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 |  |  | Tendido de Conductor MT y BT | 12 días | lun 24/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 |  |  | Conexiones y Jumpers | 10 días | lun 7/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | |  | Puesta a Tierra | 17 días | mié 26/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  |  | Transformadores | 8 días | lun 7/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 |  |  | Alumbrado Público | 9 días | lun 7/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 |  |  | Acometida | 22 días | lun 16/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | |  | Finalizacion del Poligono 1 | 2 días | mié 16/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | |  | Remoción | 22 días | vie 13/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 22 días | vie 13/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 22 días | vie 13/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 |  |  | Transformadores | 22 días | vie 13/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Semestre 2, 2018 | | | | | | | | | | | | Semestre 1 | |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|--|
| | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | | | |
| 21 |  |  | Remocion de postes | 22 días | vie 13/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | |  | Polígono 2 | 138 días | jue 23/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | |  | Instalación | 138 días | jue 23/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 |  |  | Excavaciones | 23 días | lun 27/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 |  |  | Izado de postes | 19 días | jue 23/7/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | |  | Cimentaciones | 12 días | mié 5/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | |  | Retenidas | 14 días | mar 25/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | |  | Armados MT y BT | 20 días | lun 31/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 |  |  | Tendido de Conductor MT y BT | 16 días | mié 9/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | |  | Conexiones y Jumpers | 20 días | vie 25/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | |  | Puesta a Tierra | 20 días | jue 24/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | |  | Transformadores | 11 días | jue 17/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | |  | Alumbrado Público | 12 días | vie 18/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 |   |  | Acometida | 24 días | mar 29/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | |  | Finalizacion del Poligono 2 | 1 día | lun 1/2/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | |  | Remoción | 24 días | lun 28/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 24 días | lun 28/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 24 días | lun 28/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 |  |  | Transformadores | 24 días | lun 28/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 |  |  | Remocion de postes | 24 días | lun 28/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | |  | Polígono 3 | 175 días | lun 24/8/20 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Semestre 2, 2018 | | | | | | | | | | | | Semestre 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | |  | Instalación | 175 días | lun 24/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Semestre 2, 2018 | | | | | | | | | | | | Semestre 1 | |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|--|
| | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | | | |
| 63 |  |  | Izado de postes | 18 días | vie 25/9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 |  |  | Cimentaciones | 9 días | lun 12/10/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | |  | Retenidas | 14 días | lun 2/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | |  | Armados MT y BT | 24 días | mié 4/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 17 días | mié 25/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | |  | Conexiones y Jumpers | 15 días | vie 4/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | |  | Puesta a Tierra | 21 días | jue 3/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 |  |  | Transformadores | 10 días | vie 11/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | |  | Alumbrado Público | 13 días | mié 16/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 |  |  | Totalizadores | 9 días | vie 25/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | |  | Acometida | 13 días | vie 23/4/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | |  | Finalizacion del Poligono 4 | 2 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | |  | Remoción | 13 días | jue 22/4/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 13 días | jue 22/4/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 13 días | jue 22/4/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 |  |  | Transformadores | 13 días | jue 22/4/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 |  |  | Remocion de postes | 13 días | jue 22/4/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | |  | Polígono 5 | 189 días | mié 21/10/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | |  | Instalación | 189 días | mié 21/10/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 |  |  | Excavaciones | 31 días | mar 10/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 |  |  | Izado de postes | 28 días | mié 21/10/20 | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Semestre 2, 2018 | | | | | | | | | | | | Semestre 1 | |
|----|---|---|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|--|
| | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | | | |
| 84 | |  | Cimentaciones | 13 días | vie 13/11/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | |  | Retenidas | 16 días | vie 11/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | |  | Armados MT y BT | 34 días | mar 8/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 27 días | vie 25/12/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | |  | Conexiones y Jumpers | 20 días | mar 12/1/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | |  | Puesta a Tierra | 20 días | mar 19/1/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | |  | Transformadores | 23 días | vie 15/1/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | |  | Alumbrado Público | 20 días | lun 25/1/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | |  | Acometida | 42 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | |  | Finalizacion del Poligono 5 | 2 días | vie 9/7/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | |  | Remoción | 42 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 42 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 42 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 |  |  | Transformadores | 42 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 |  |  | Remocion de postes | 42 días | mié 12/5/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | |  | Cierre de Obras | 20 días | mar 13/7/21 | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

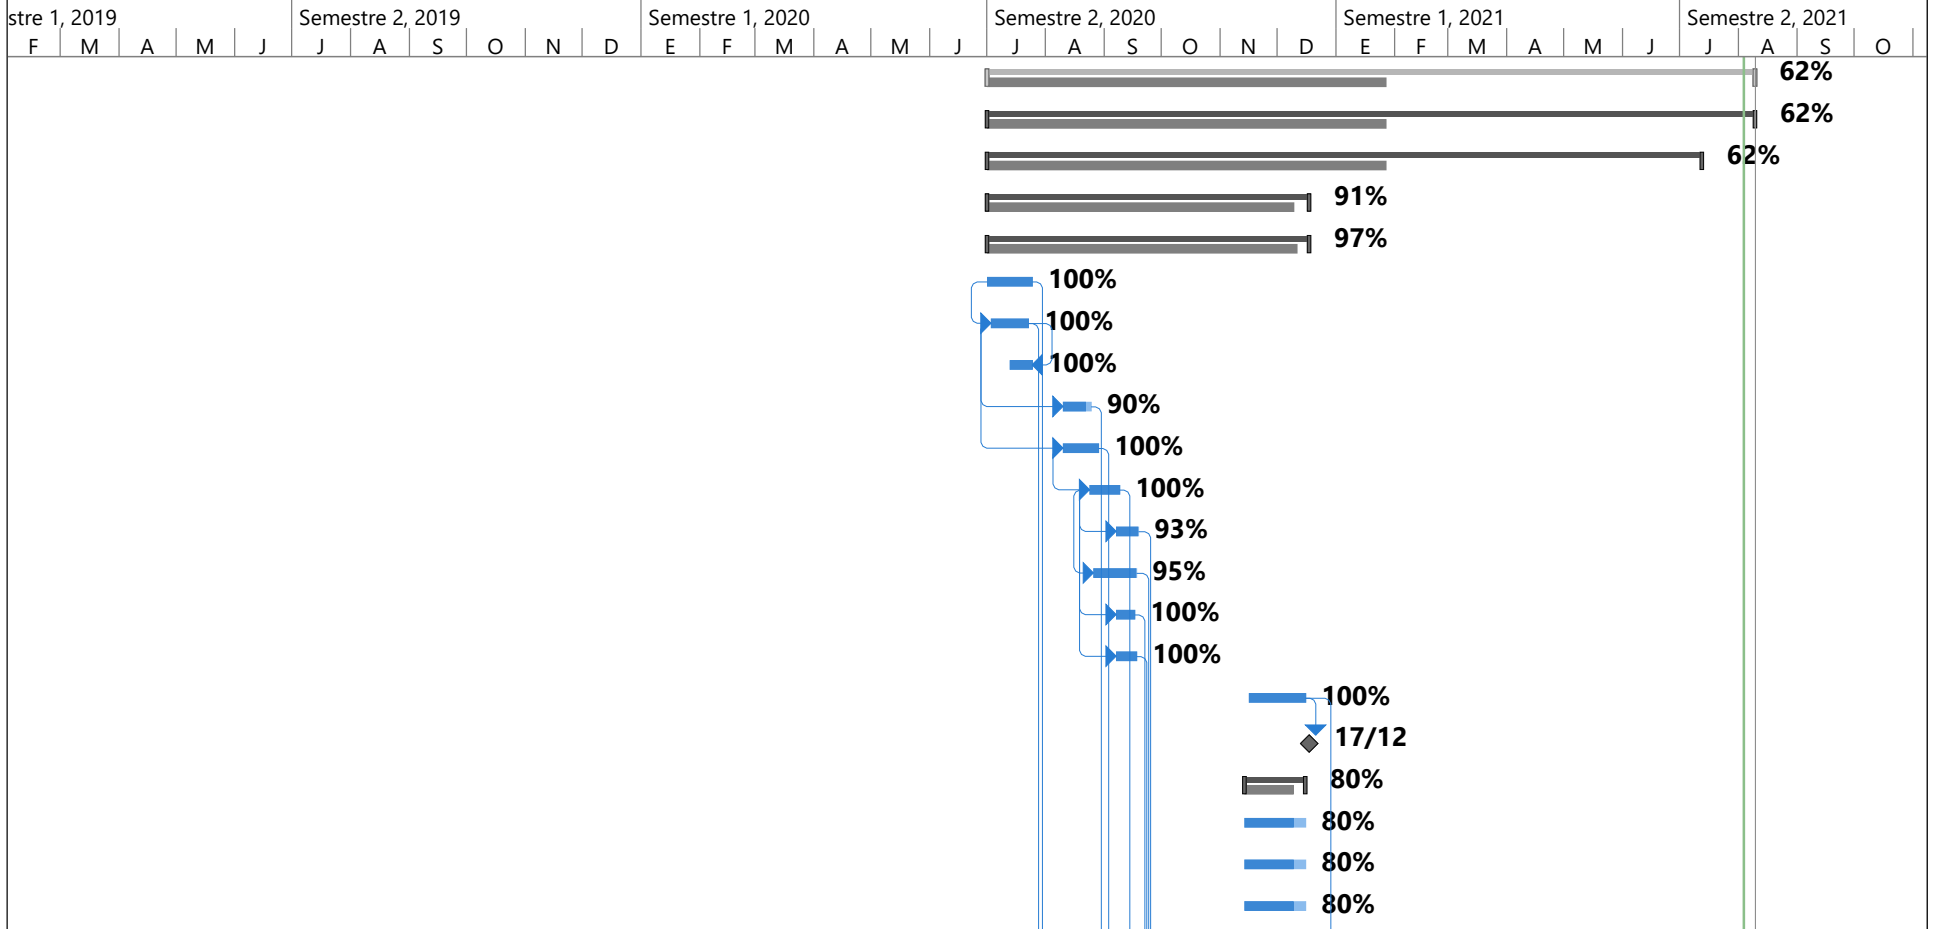


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

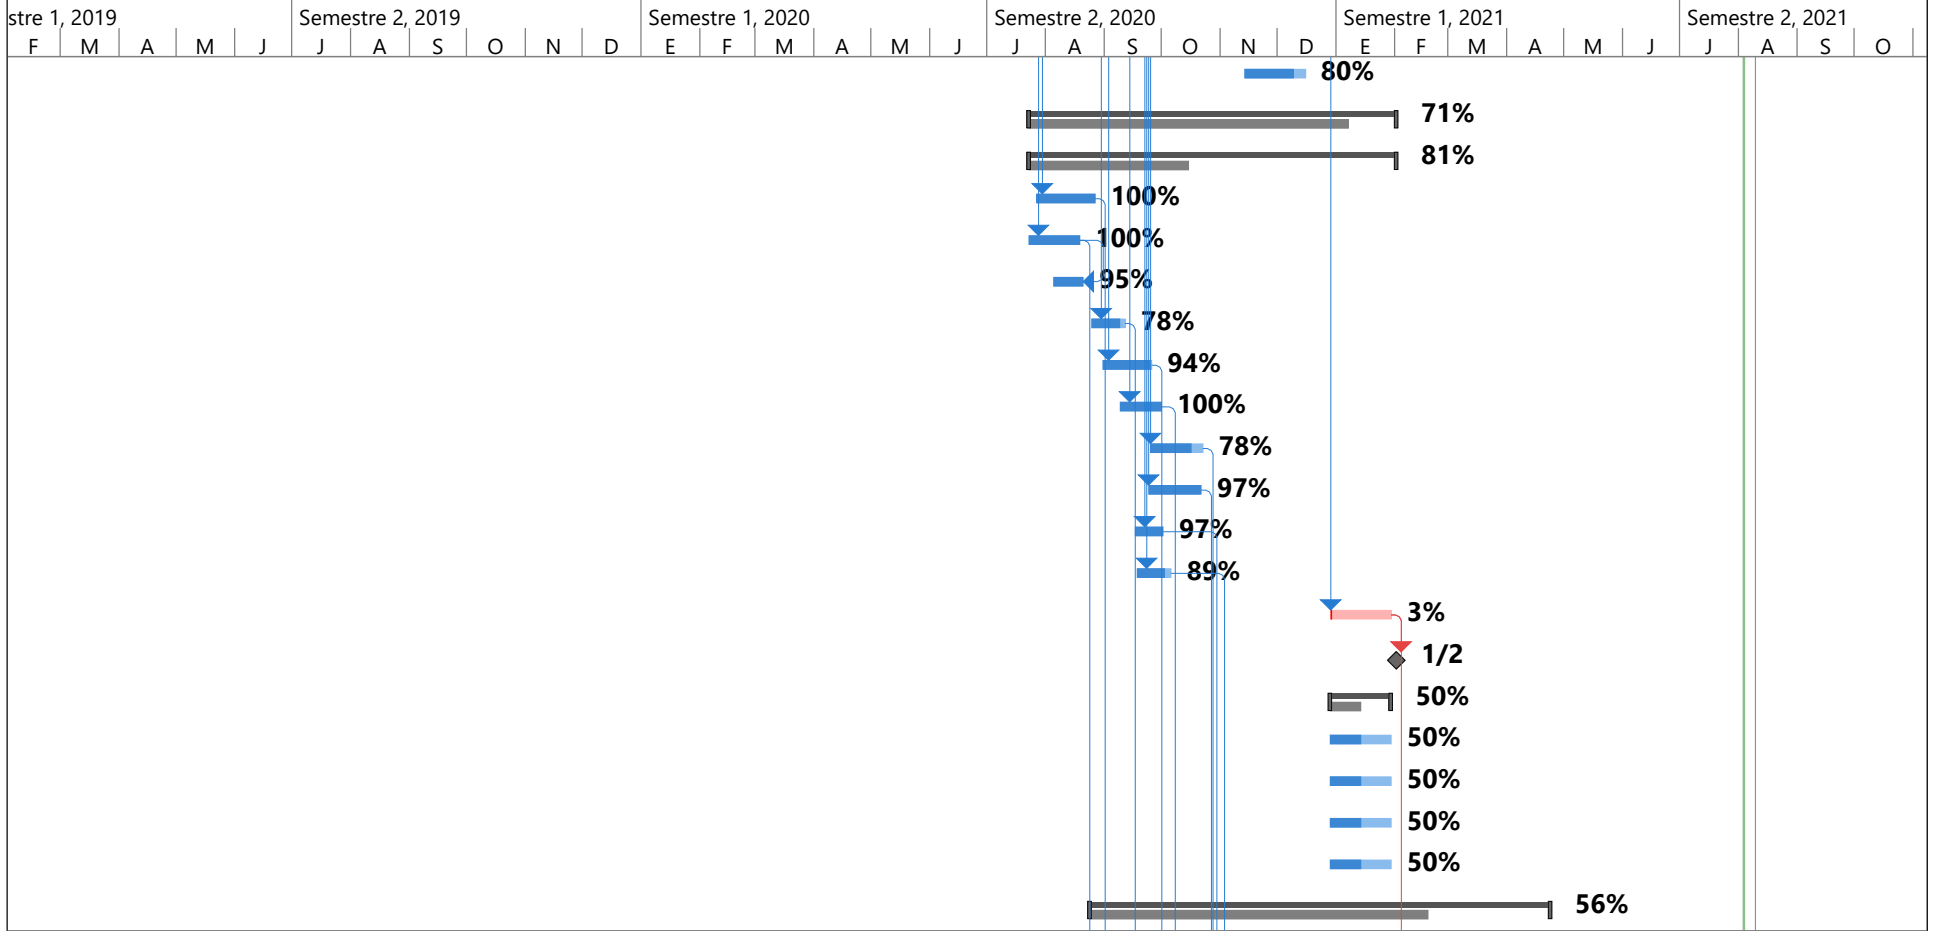


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

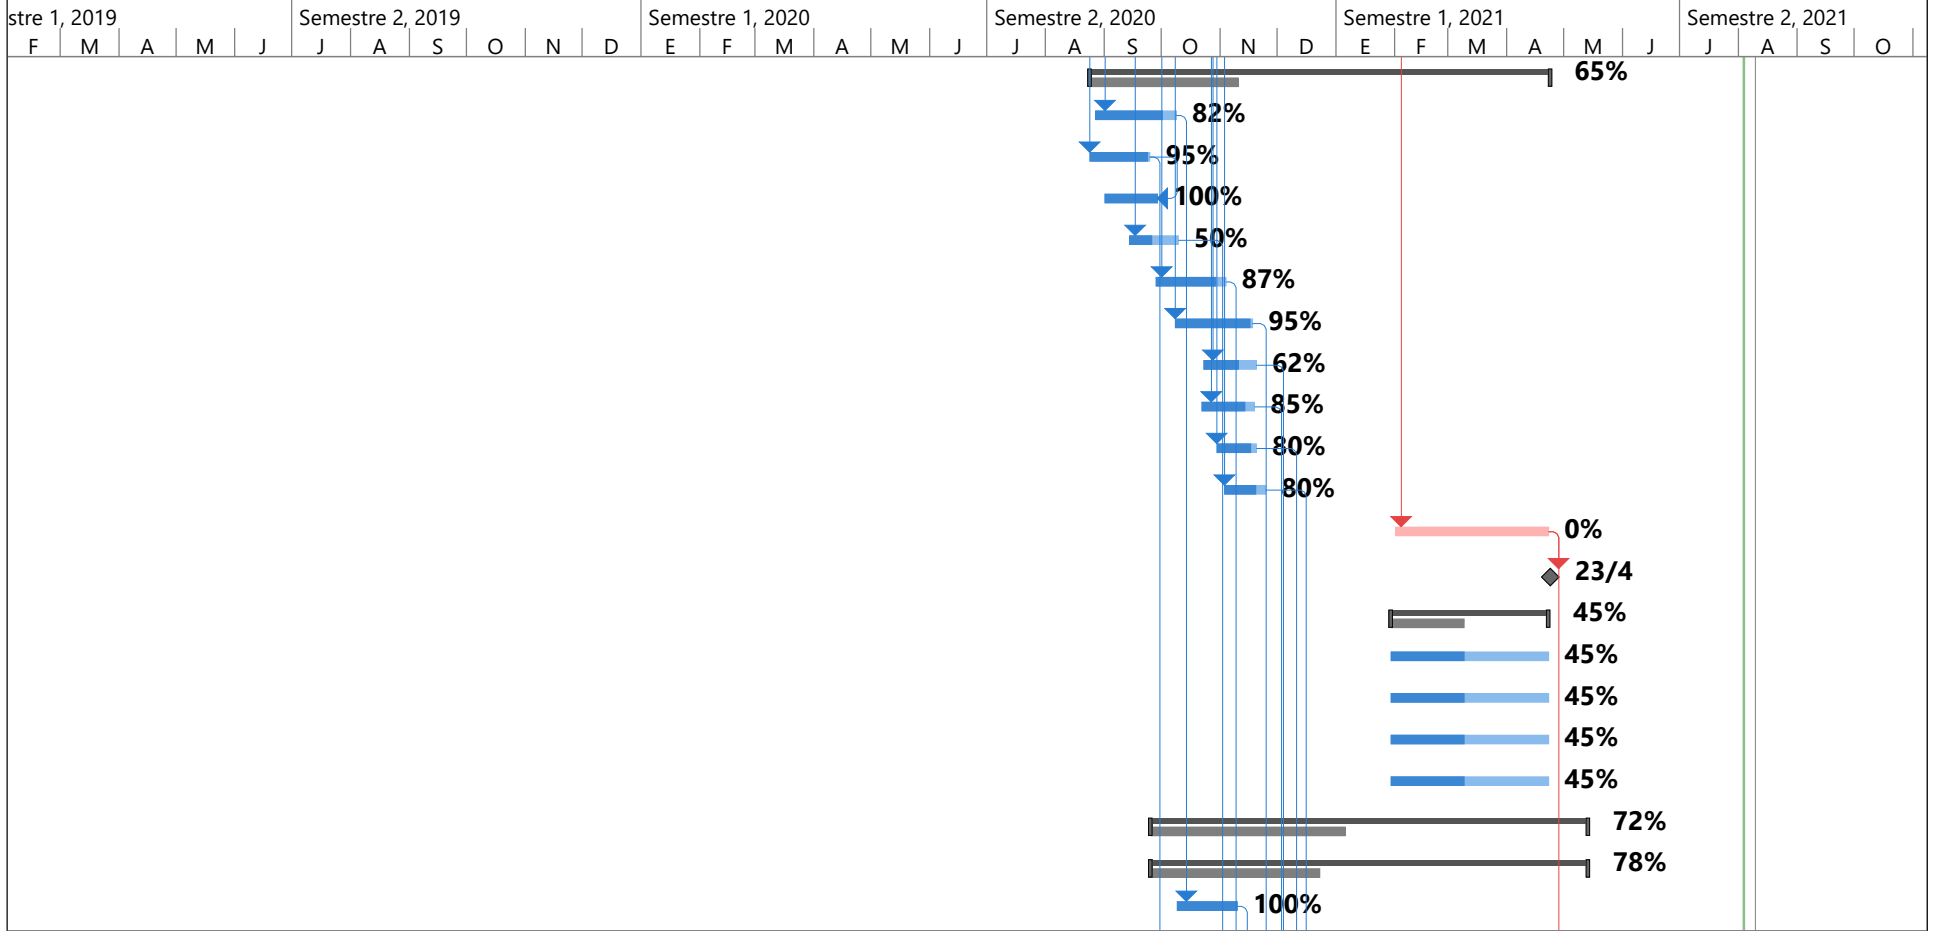

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

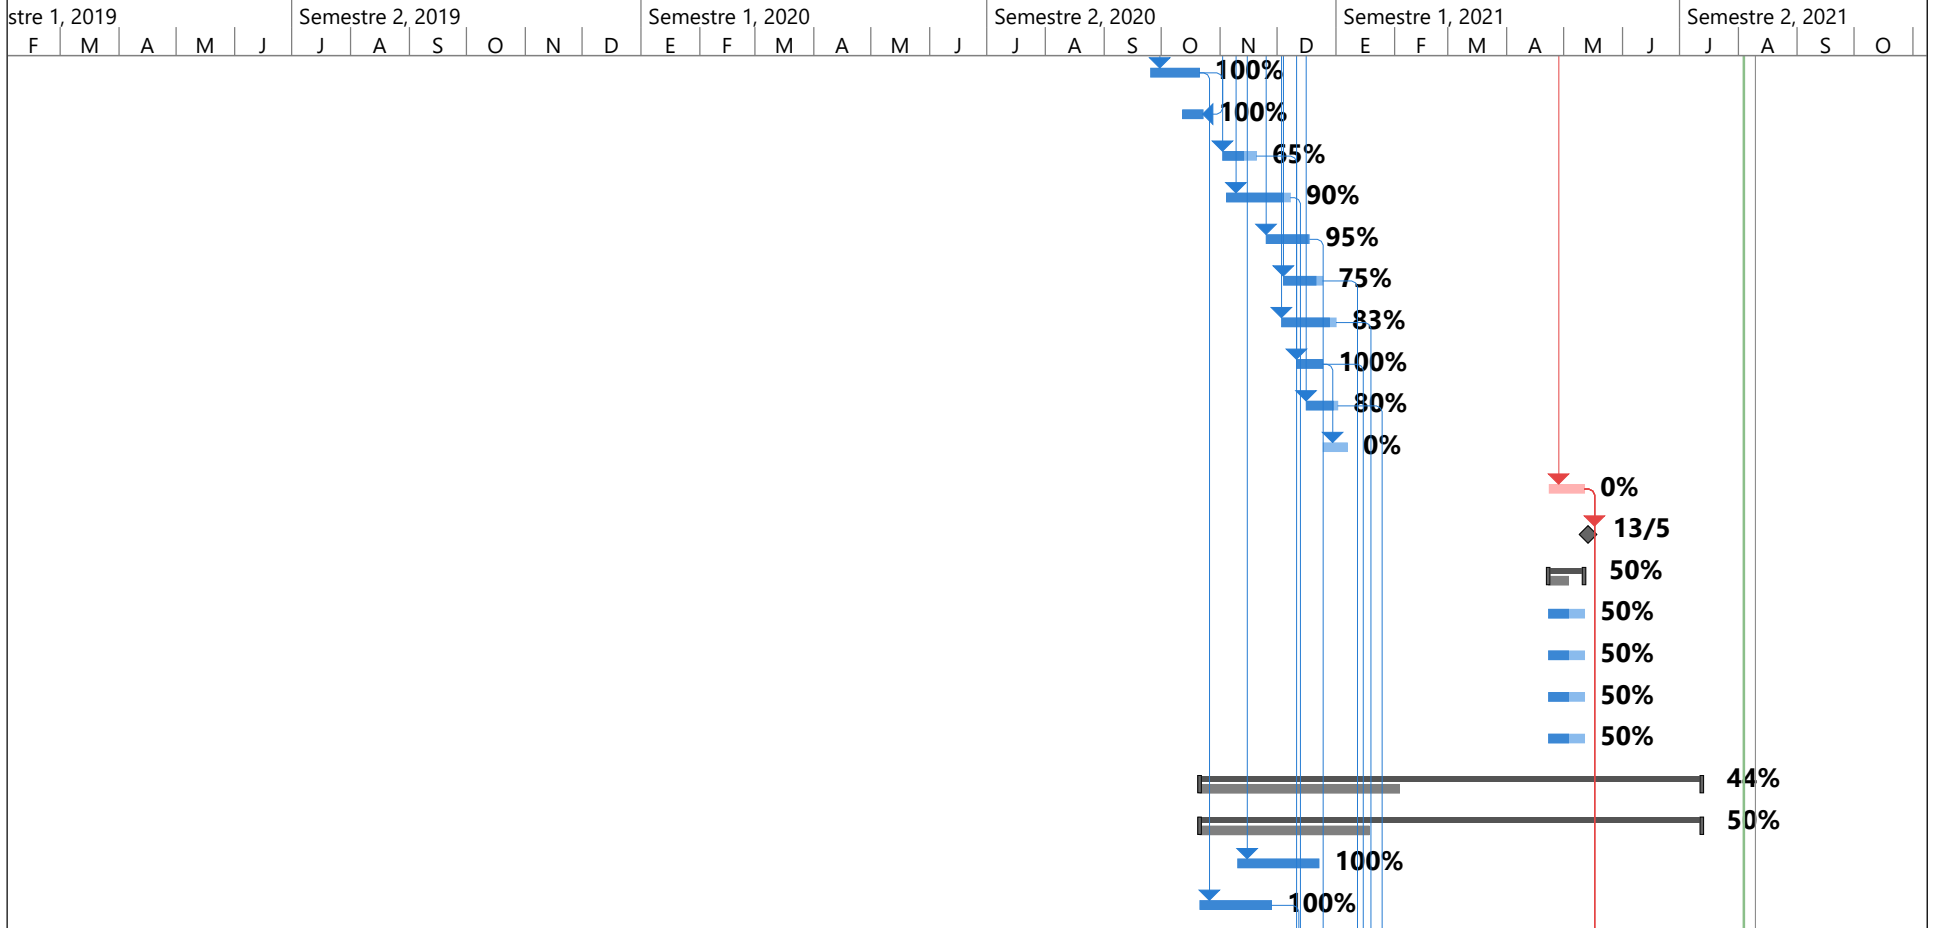

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución Lote 06-NAGU101

Semestre 1, 2019: F, M, A, M, J
 Semestre 2, 2019: J, A, S, O, N, D
 Semestre 1, 2020: E, F, M, A, M, J
 Semestre 2, 2020: J, A, S, O, N, D
 Semestre 1, 2021: E, F, M, A, M, J
 Semestre 2, 2021: J, A, S, O

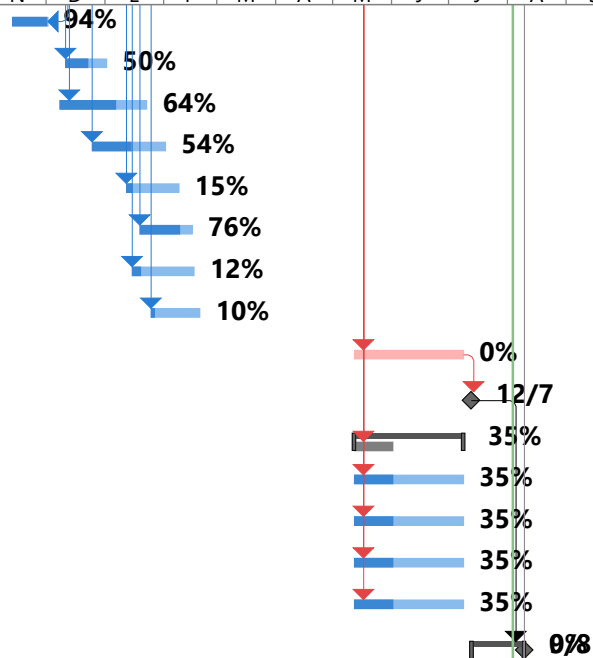

Ing. Alberto Rafael Rosario Cabral

Gerente de Ingeniería y Planificación
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana
 T: 809-241-9090 Ext. 4821 F: 809-747-5912
 E: arosarioc@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do
 Síguenos en:



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |
