
























































Calendario de Ejecución CHIV105

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	<div> <div>tri 2, 2018</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2018</div> <div>jul</div> <div>ago</div> <div>sep</div> <div>tri 4, 2018</div> <div>oct</div> </div>									
1			Rehabilitación de Redes CHIVO105	272.5 días	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>									
2			Adjudicación	0 días										
3			Periodo de Adquisiciones	80 días										
28			Ejecución	242.5 días										
29			Polígono 1	145.88 días										
30			Instalación	135 días										
31			lizado de postes	14 días										
32			Cimentaciones	12 días										
33			Retenidas	6 días										
34			Armados de Media y Baja Tensión	17 días										
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	22 días										
36			Elementos de Protección y Maniobra	10 días										
37			Conexiones y Jumpers	5 días										
38			Transformadores	12 días										
39			Alumbrado Publico	20 días										
40			Normalización Suministros	34 días										
41			Remoción	69.75 días										





















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV105

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	<div> <div>tri 2, 2018</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2018</div> <div>jul</div> <div>ago</div> <div>sep</div> <div>tri 4, 2018</div> <div>oct</div> </div>							
42			Tendido de Conductor Media Tensión	16 días								
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	22 días								
44			Armados de Media Tensión	44 días								
45			Armados de Baja Tensión	14 días								
46			Transformadores	25.25 días								
47			Izado de postes	14 días								
48			Cierre de Polígono 1	0 días								
49			Polígono 2	175.5 días								
50			Instalación	175.5 días								
51			Izado de postes	20 días								
52			Cimentaciones	19 días								
53			Retenidas	9 días								
54			Armados de Media y Baja Tensión	18 días								
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	11 días								
56			Elementos de Protección y Maniobra	14.75 días								


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV105

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	<div> <div>tri 2, 2018</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2018</div> <div>jul</div> <div>ago</div> <div>sep</div> <div>tri 4, 2018</div> <div>oct</div> </div>											
57			Conexiones y Jumpers	11 días												
58			Transformadores	13 días												
59			Alumbrado Publico	16 días												
60			Normalización Suministros	70 días												
61			Remoción	71.63 días												
62			Tendido de Conductor Media Tensión	6 días												
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	13 días												
64			Armados de Media Tensión	12 días												
65			Armados de Baja Tensión	8 días												
66			Transformadores	5 días												
67			Izado de postes	13 días												
68			Cierre de Polígono 2	0 días												
69			Polígono 3	208.5 días												
70			Instalación	198.5 días												
71			Izado de postes	14 días												
72			Cimentaciones	10 días												
73			Retenidas	7 días												



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV105

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	<div> <div>tri 2, 2018</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2018</div> <div>jul</div> <div>ago</div> <div>sep</div> <div>tri 4, 2018</div> <div>oct</div> </div>							
74			Armados de Media y Baja Tensión	47 días								
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	56 días								
76			Elementos de Protección y Maniobra	19 días								
77			Conexiones y Jumpers	8 días								
78			Transformadores	39 días								
79			Alumbrado Publico	35 días								
80			Normalización Suministros	43 días								
81			Remoción	107.25 días								
82			Tendido de Conductor Media Tensión	9 días								
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	20 días								
84			Armados de Media Tensión	18 días								
85			Armados de Baja Tensión	16 días								
86			Transformadores	9 días								
87			lizado de postes	14 días								
88			Cierre de Polígono 3	0 días								


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	tri 2, 2018 abr	may	jun	tri 3, 2018 jul	ago	sep	tri 4, 2018 oct
89	 		Cierre de Obras	20 días							


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105

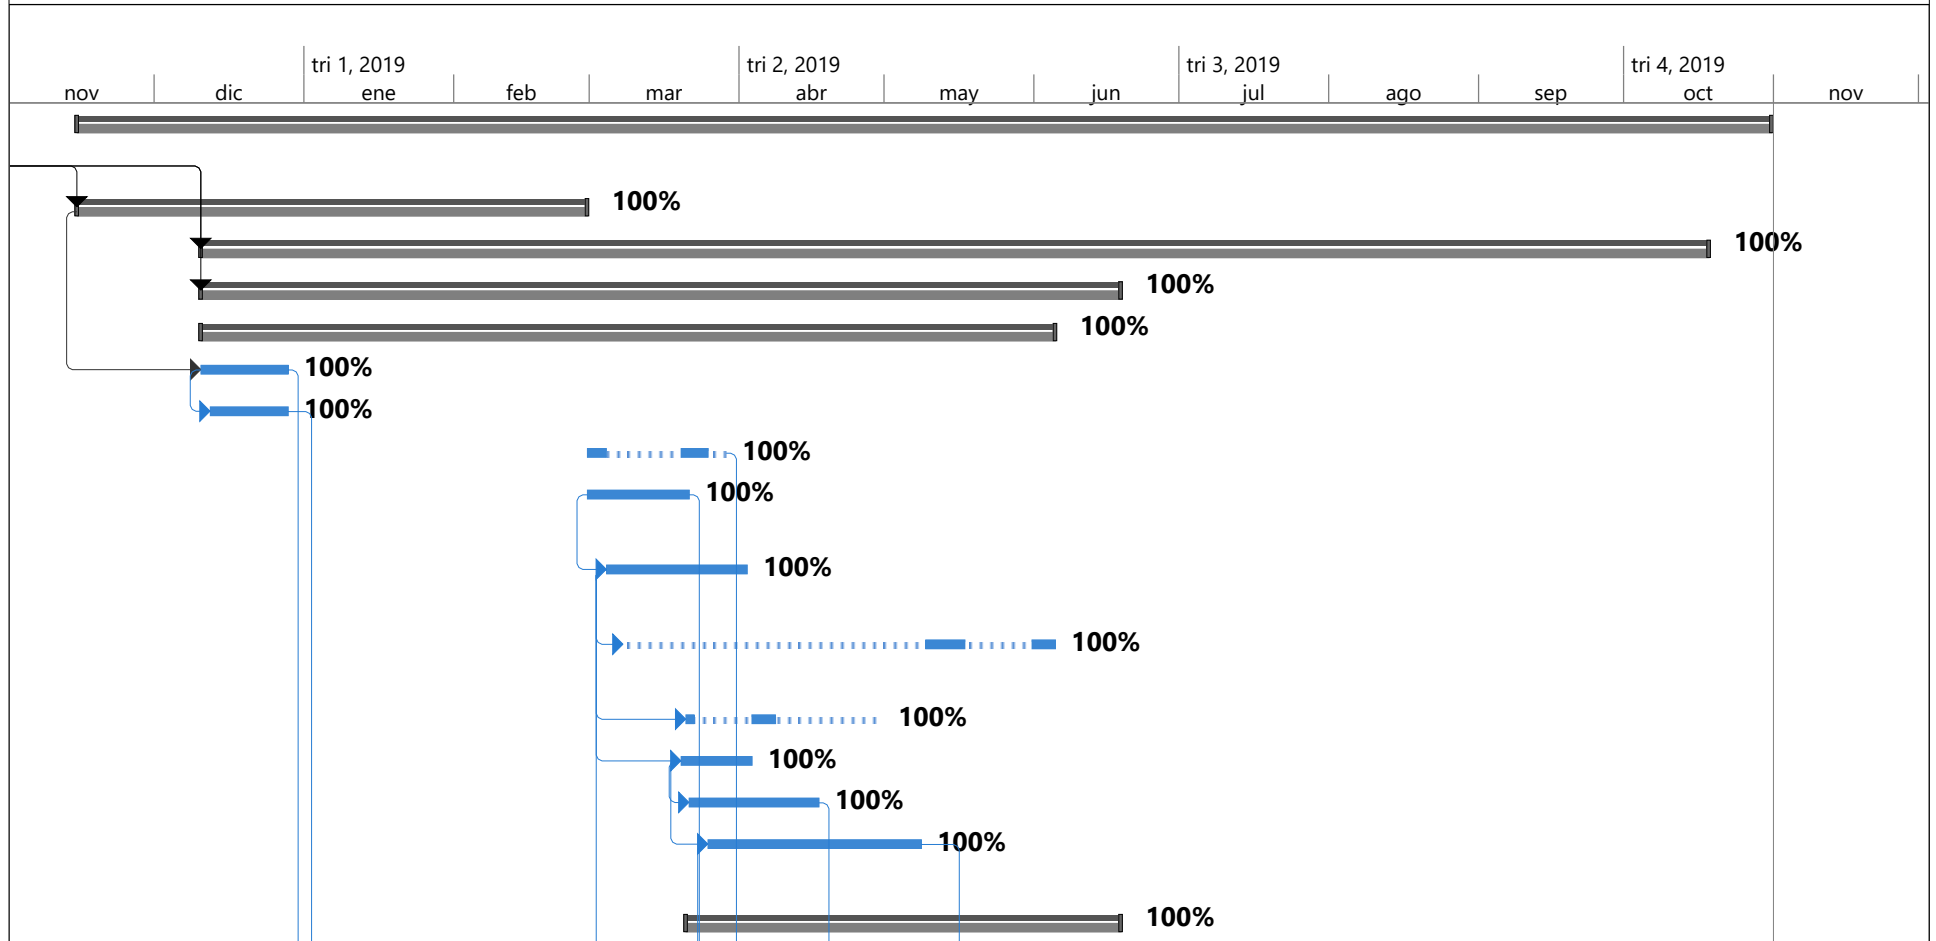


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105

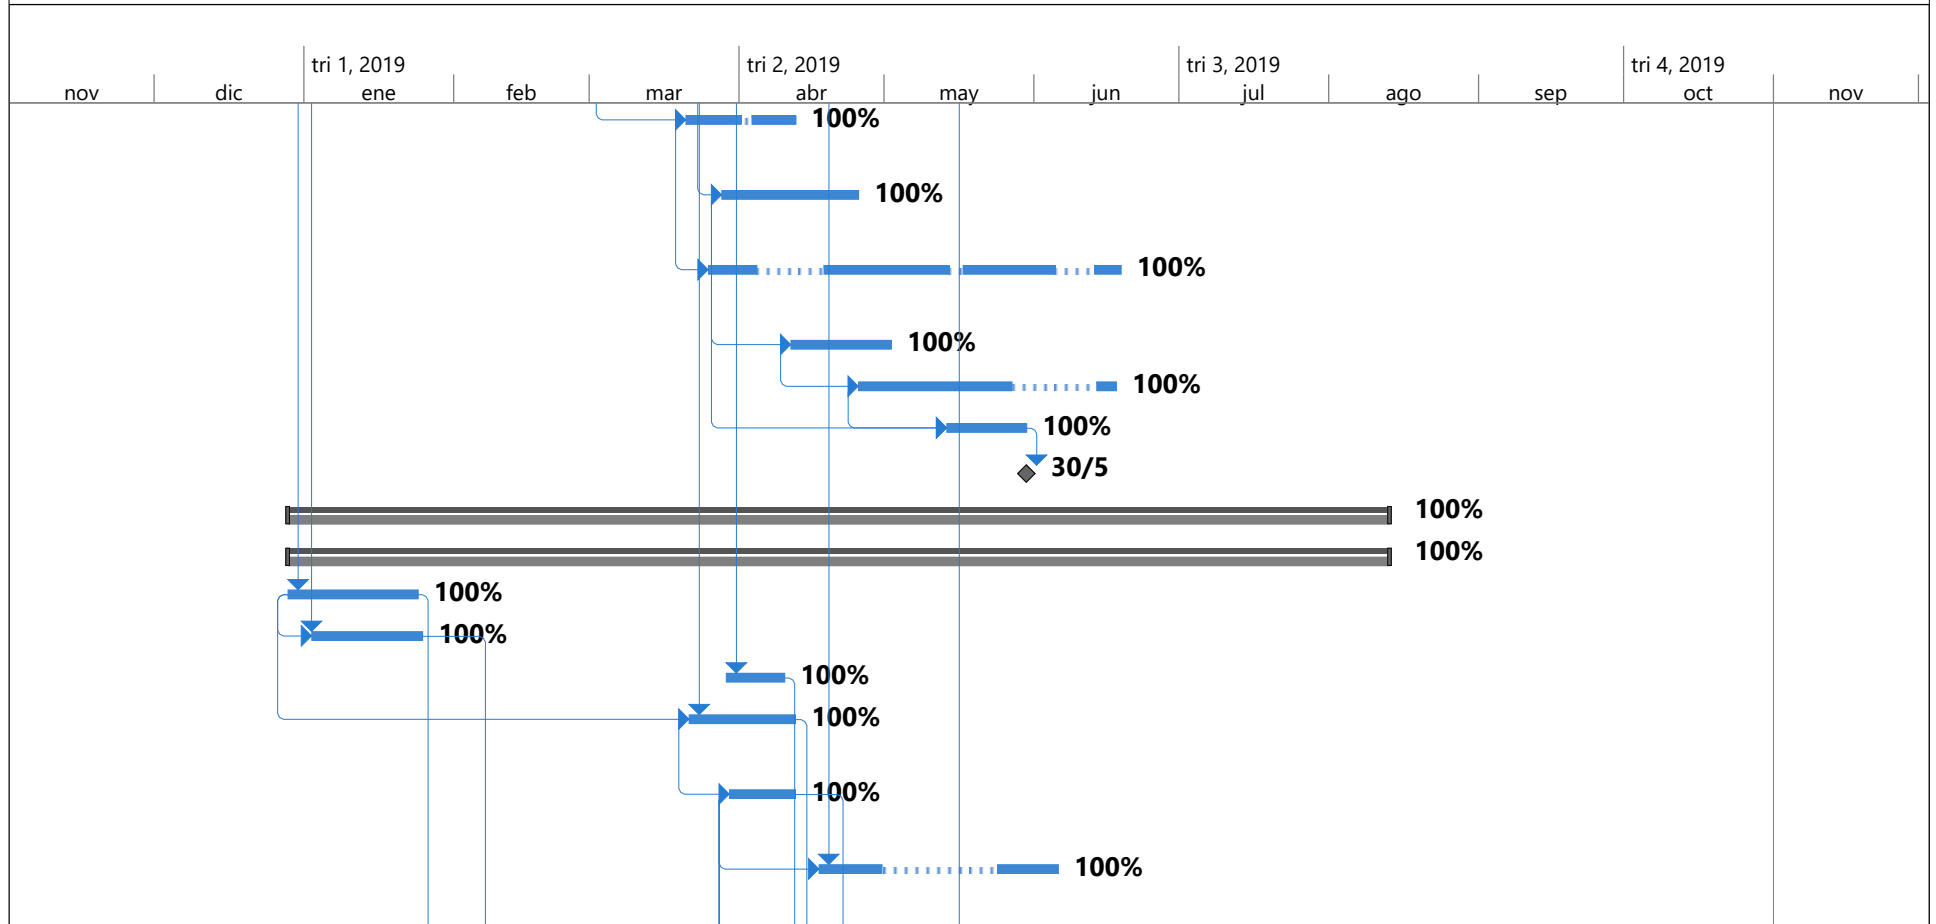


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105

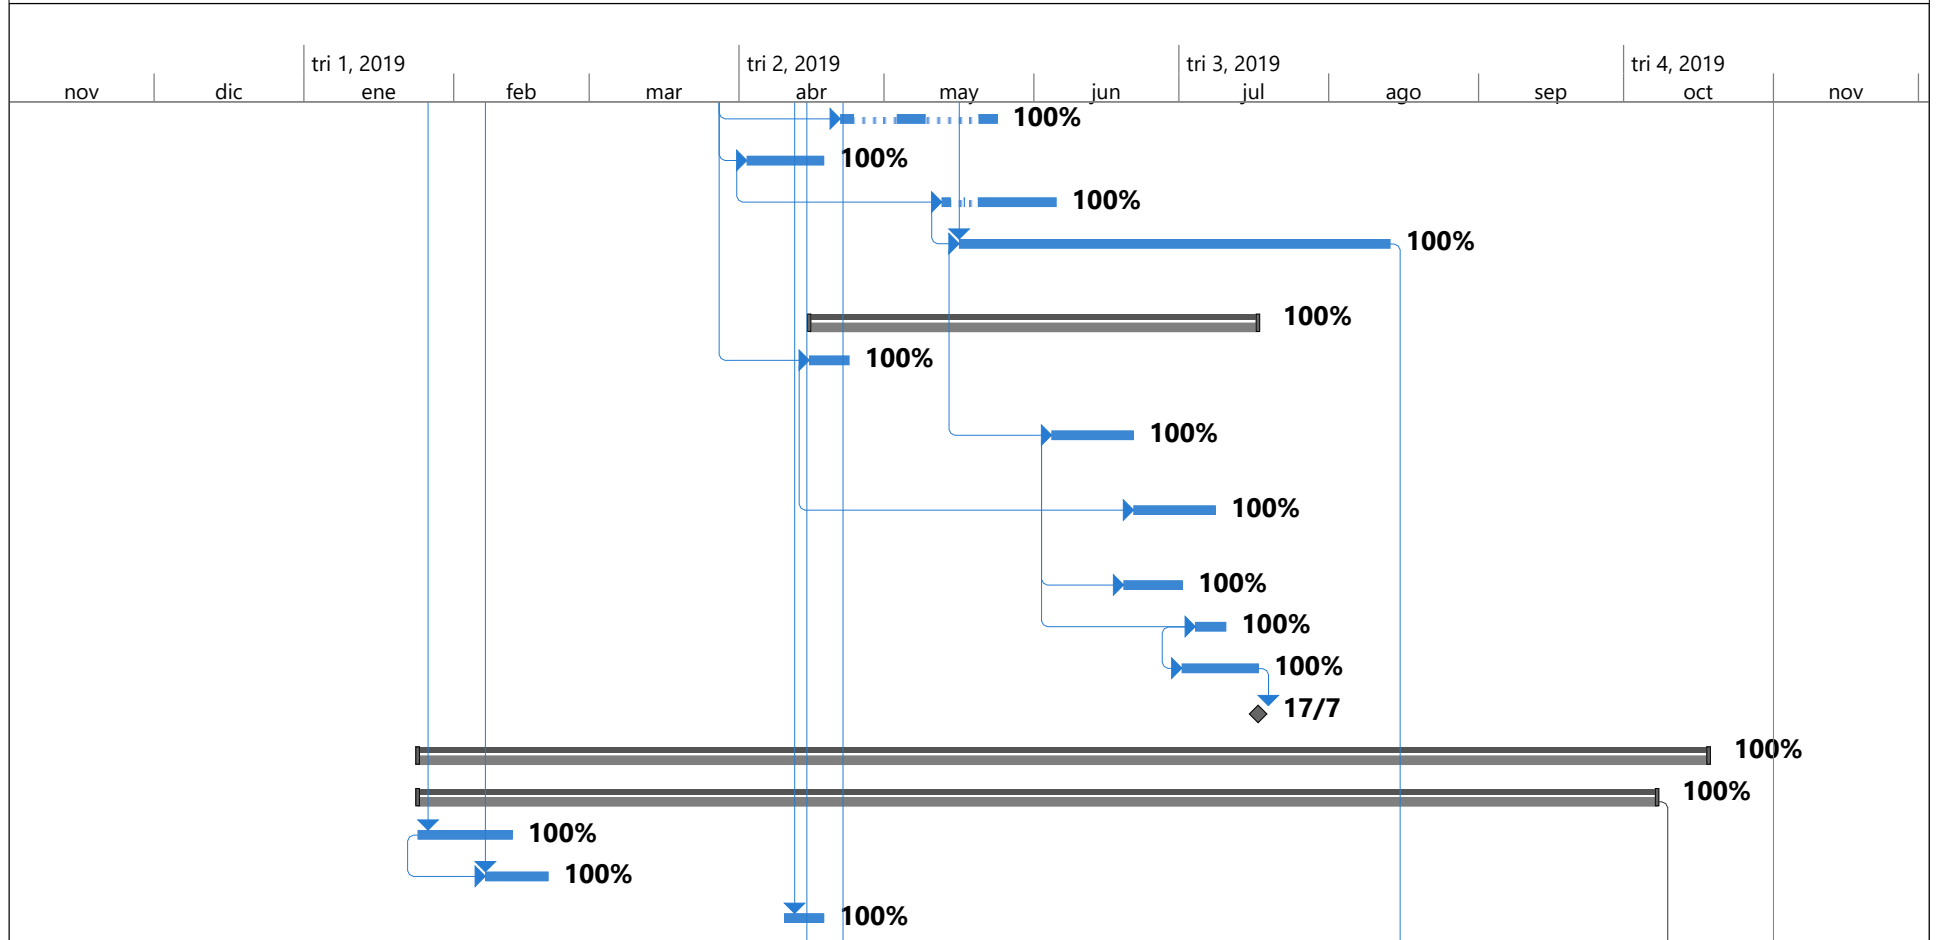


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105

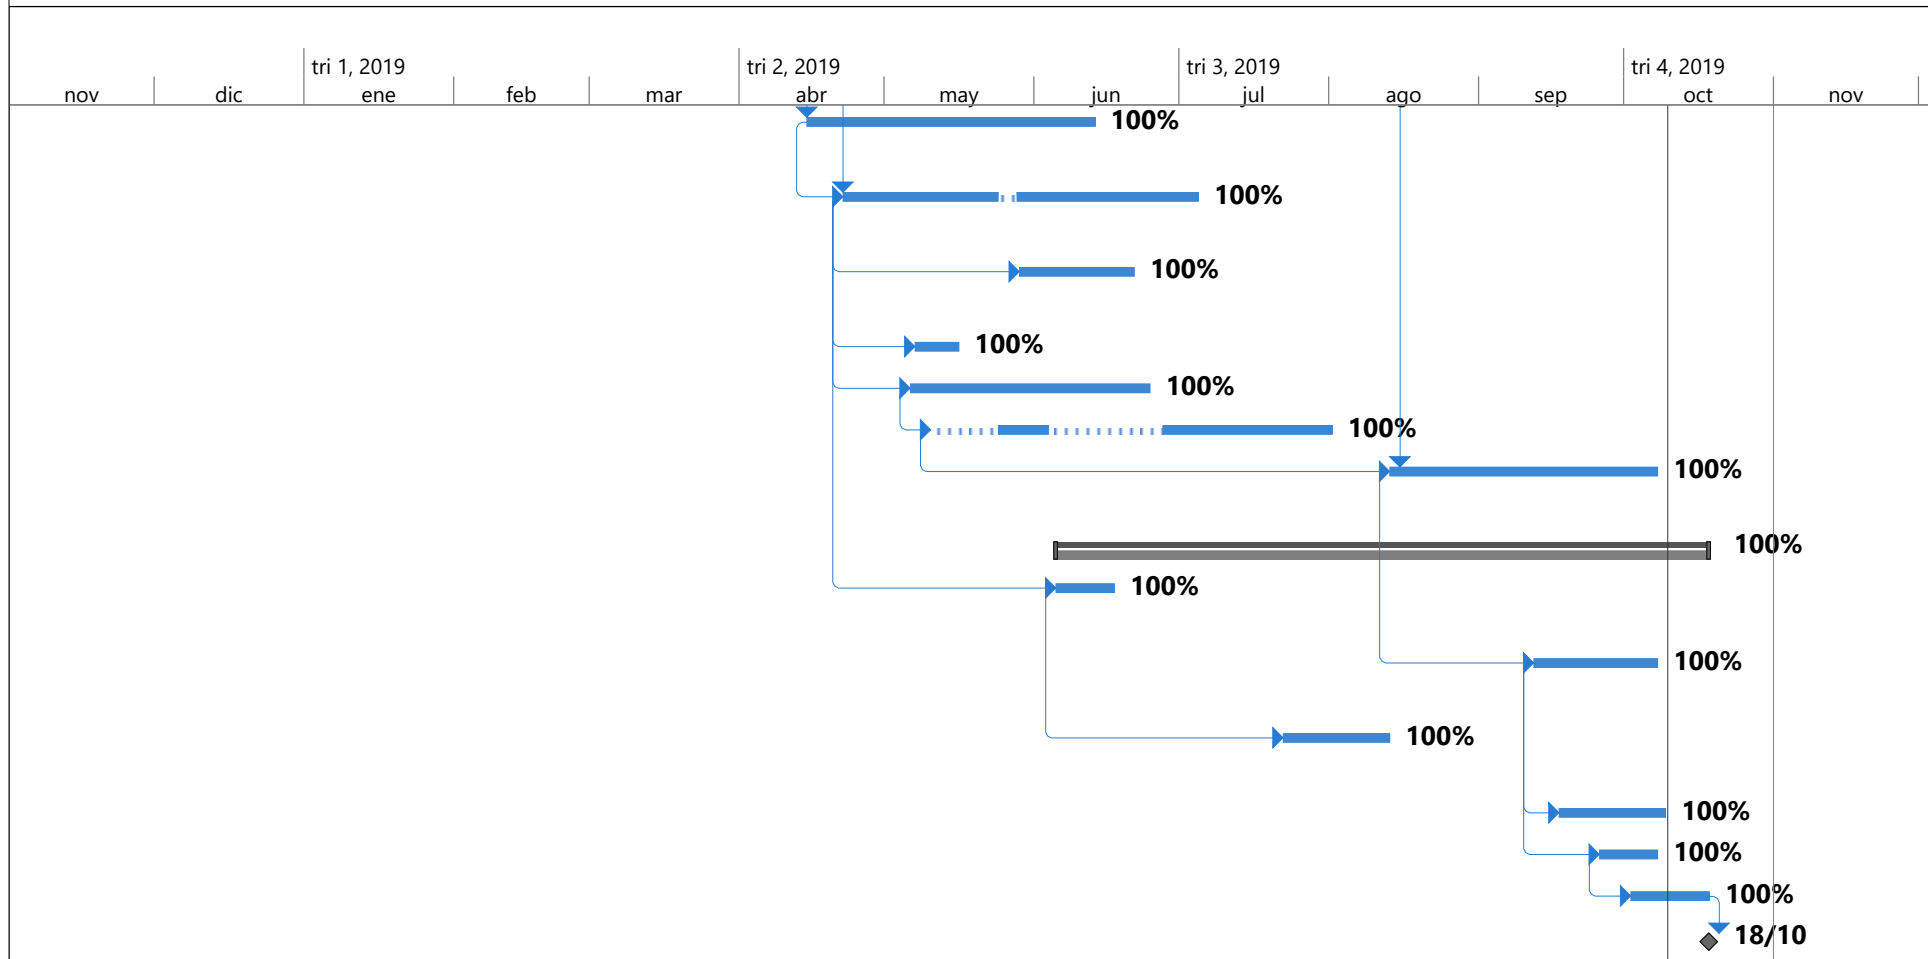

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV105



Ing. Alberto Rafael Rosario Cabral
























Gerente de Ingeniería y Planificación
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana

T: 809-241-9090 Ext. 4821 F: 809-747-5912

E: arosarioc@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
