




































































































































# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2018							Semestre 1, 2019				
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
0			<b>Calendario de Ejecución MOCA103</b>	<b>378 días</b>												
1			<b>Rehabilitación de Redes MOCA103</b>	<b>378 días</b>												
2			<b>Ejecución</b>	<b>378 días</b>												
3			<b>Polígono 1</b>	<b>147 días</b>												
4			<b>Instalación</b>	<b>147 días</b>												
5			Excavaciones	36 días												
6			Izado de postes	31 días												
7			Cimentaciones	35 días												
8			Retenidas	31 días												
9			Armados MT y BT	51 días												
10			Tendido de Conductor MT y BT	50 días												
11			Conexiones y Jumpers	54 días												
12			Puesta a Tierra	36 días												
13			Transformadores	25 días												
14			Alumbrado Público	24 días												
15			Acometida	47 días												
16			Finalizacion del Poligono 1	2 días												
17			<b>Remoción</b>	<b>35 días</b>												
18			Tendido de Media y Baja Tensión	35 días												
19			Armados de Media y Baja Tensión	35 días												
20			Transformadores	35 días												












































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2018							Semestre 1, 2019				
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
21			Remocion de postes	35 días												
22			<b>Polígono 2</b>	<b>142 días</b>												
23			<b>Instalación</b>	<b>142 días</b>												
24			Excavaciones	20 días												
25			Izado de postes	17 días												
26			Cimentaciones	26 días												
27			Retenidas	16 días												
28			Armados MT y BT	26 días												
29			Tendido de Conductor MT y BT	22 días												
30			Conexiones y Jumpers	25 días												
31			Puesta a Tierra	25 días												
32			Transformadores	13 días												
33			Alumbrado Público	17 días												
34			Acometida	29 días												
35			Finalizacion del Poligono 2	1 día												
36			<b>Remoción</b>	<b>22 días</b>												
37			Tendido de Media y Baja Tensión	22 días												
38			Armados de Media y Baja Tensión	22 días												
39			Transformadores	22 días												
40			Remocion de postes	22 días												
41			<b>Polígono 3</b>	<b>183 días</b>												











Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2018							Semestre 1, 2019				
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
42			<b>Instalación</b>	<b>183 días</b>												
43			Excavaciones	38 días												
44			Izado de postes	36 días												
45			Cimentaciones	37 días												
46			Retenidas	29 días												
47			Armados MT y BT	57 días												
48			Tendido de Conductor MT y BT	56 días												
49			Conexiones y Jumpers	37 días												
50			Puesta a Tierra	37 días												
51			Transformadores	34 días												
52			Alumbrado Público	31 días												
53			Acometida	63 días												
54			Finalizacion del Poligono 3	1 día												
55			<b>Remoción</b>	<b>47 días</b>												
56			Tendido de Media y Baja Tensión	47 días												
57			Armados de Media y Baja Tensión	47 días												
58			Transformadores	47 días												
59			Remocion de postes	47 días												
60			<b>Polígono 4</b>	<b>184 días</b>												
61			<b>Instalación</b>	<b>184 días</b>												
62			Excavaciones	22 días												







































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2018							Semestre 1, 2019				
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
63	✓		Izado de postes	20 días												
64	✓		Cimentaciones	25 días												
65	✓		Retenidas	15 días												
66	✓		Armados MT y BT	31 días												
67	✓		Tendido de Conductor MT y BT	32 días												
68	✓		Conexiones y Jumpers	32 días												
69	✓		Puesta a Tierra	22 días												
70	✓		Transformadores	20 días												
71	✓		Alumbrado Público	22 días												
72	✓		Totalizadores	4 días												
73	✓		Acometida	40 días												
74	✓		Finalizacion del Poligono 4	1 día												
75	✓		<b>Remoción</b>	<b>40 días</b>												
76	✓		Tendido de Media y Baja Tensión	40 días												
77	✓		Armados de Media y Baja Tensión	40 días												
78	✓		Transformadores	40 días												
79	✓		Remocion de postes	40 días												
80			<b>Polígono 5</b>	<b>227 días</b>												
81			<b>Instalación</b>	<b>227 días</b>												
82	✓		Excavaciones	35 días												
83	✓		Izado de postes	31 días												
























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2018							Semestre 1, 2019				
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
84			Cimentaciones	31 días												
85			Retenidas	25 días												
86			Armados MT y BT	47 días												
87			Tendido de Conductor MT y BT	47 días												
88			Conexiones y Jumpers	30 días												
89			Puesta a Tierra	30 días												
90			Transformadores	29 días												
91			Alumbrado Público	32 días												
92			Acometida	64 días												
93			Finalizacion del Poligono 5	2 días												
94			<b>Remoción</b>	<b>64 días</b>												
95			Tendido de Media y Baja Tensión	64 días												
96			Armados de Media y Baja Tensión	64 días												
97			Transformadores	64 días												
98			Remocion de postes	64 días												
99			<b>Polígono 6</b>	<b>226 días</b>												
100			<b>Instalación</b>	<b>226 días</b>												
101			Excavaciones	23 días												
102			Izado de postes	21 días												
103			Cimentaciones	12 días												
104			Retenidas	17 días												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Semestre 2, 2018							Semestre 1, 2019				
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
105			Armados MT y BT	55 días												
106			Tendido de Conductor MT y BT	35 días												
107			Conexiones y Jumpers	25 días												
108			Puesta a Tierra	15 días												
109			Transformadores	11 días												
110			Alumbrado Público	21 días												
111			Acometida	35 días												
112			Finalizacion del Poligono 5	1 día												
113			<b>Remoción</b>	<b>35.88 días</b>												
114			Tendido de Media y Baja Tensión	35 días												
115			Armados de Media y Baja Tensión	35 días												
116			Transformadores	35 días												
117			Remocion de postes	35 días												
118			Cierre Proyecto	2 días												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]


# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

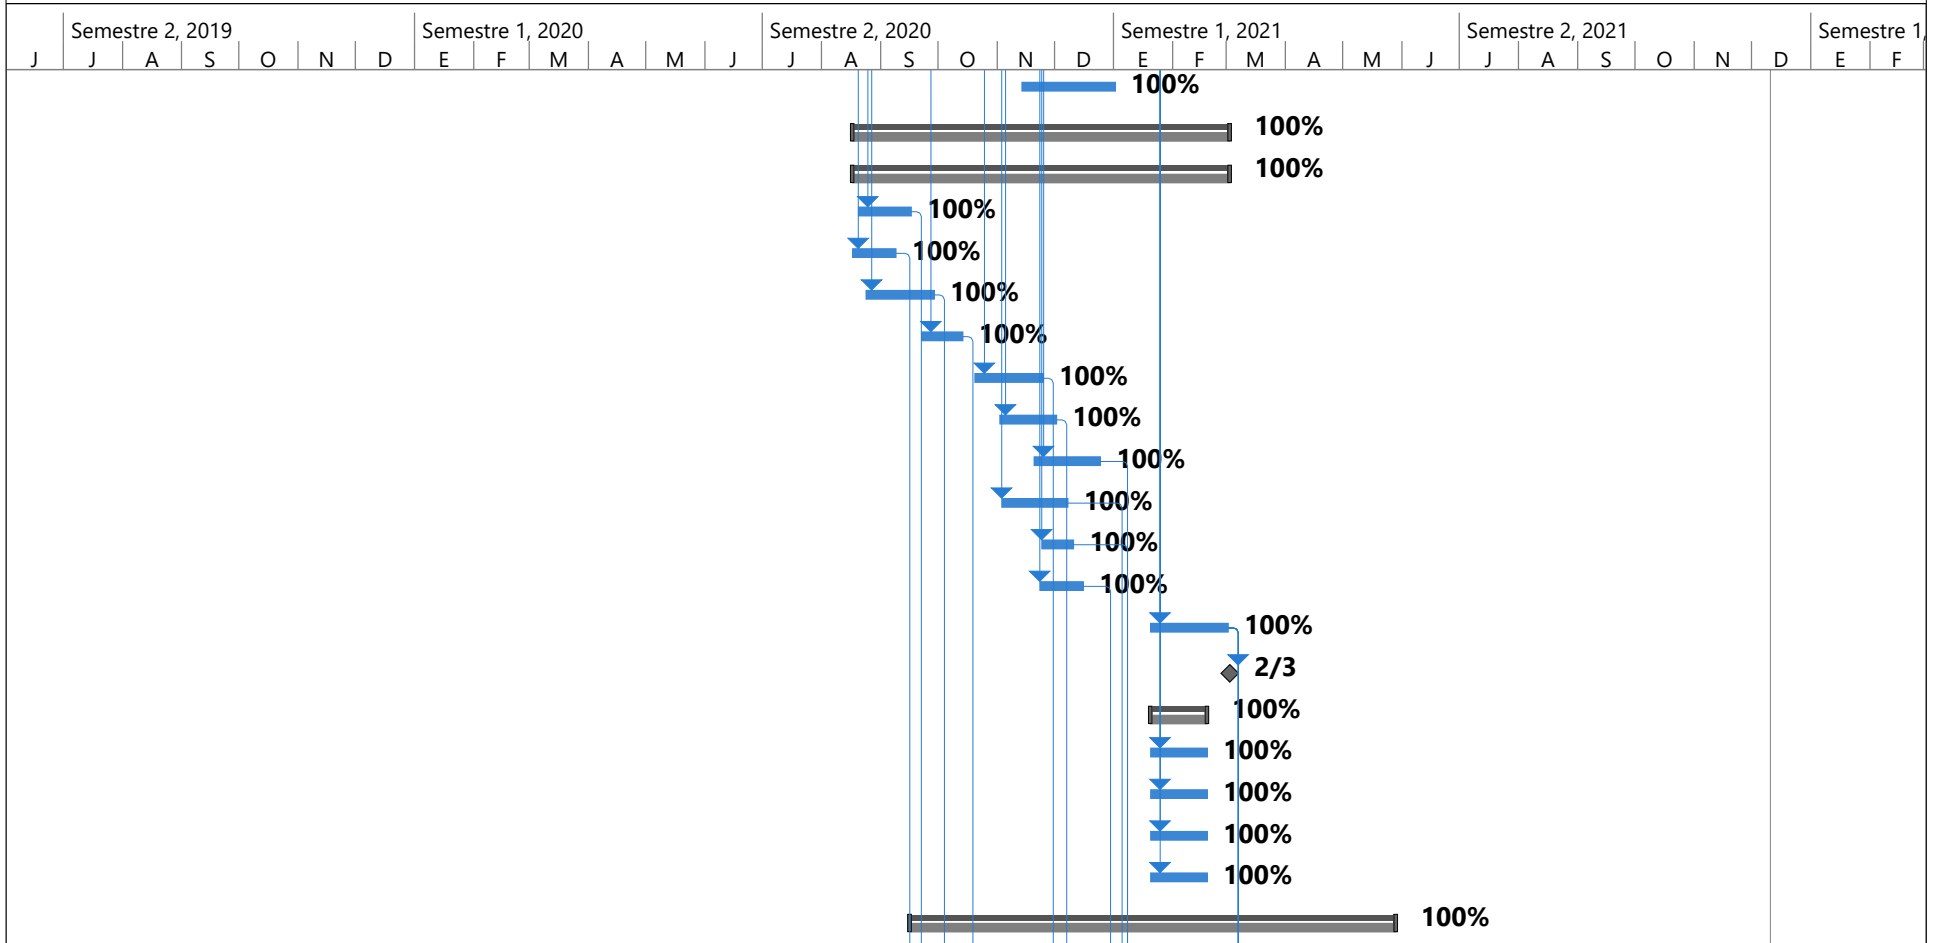

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

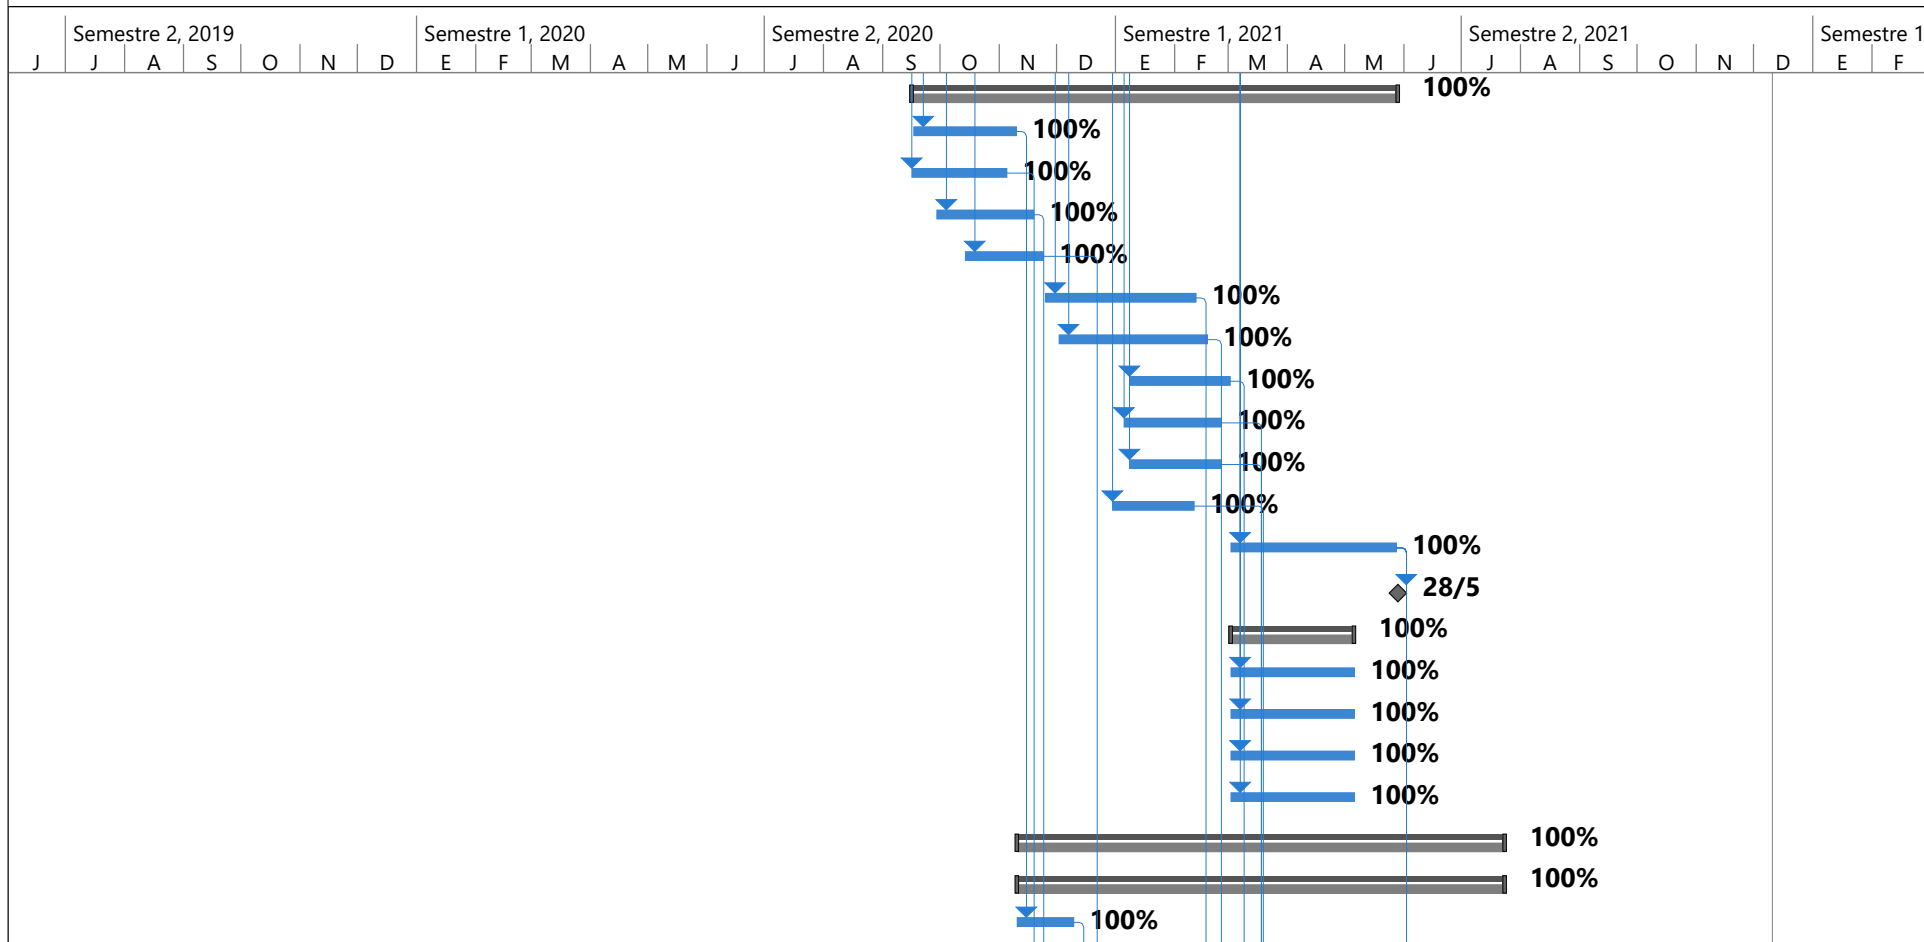


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

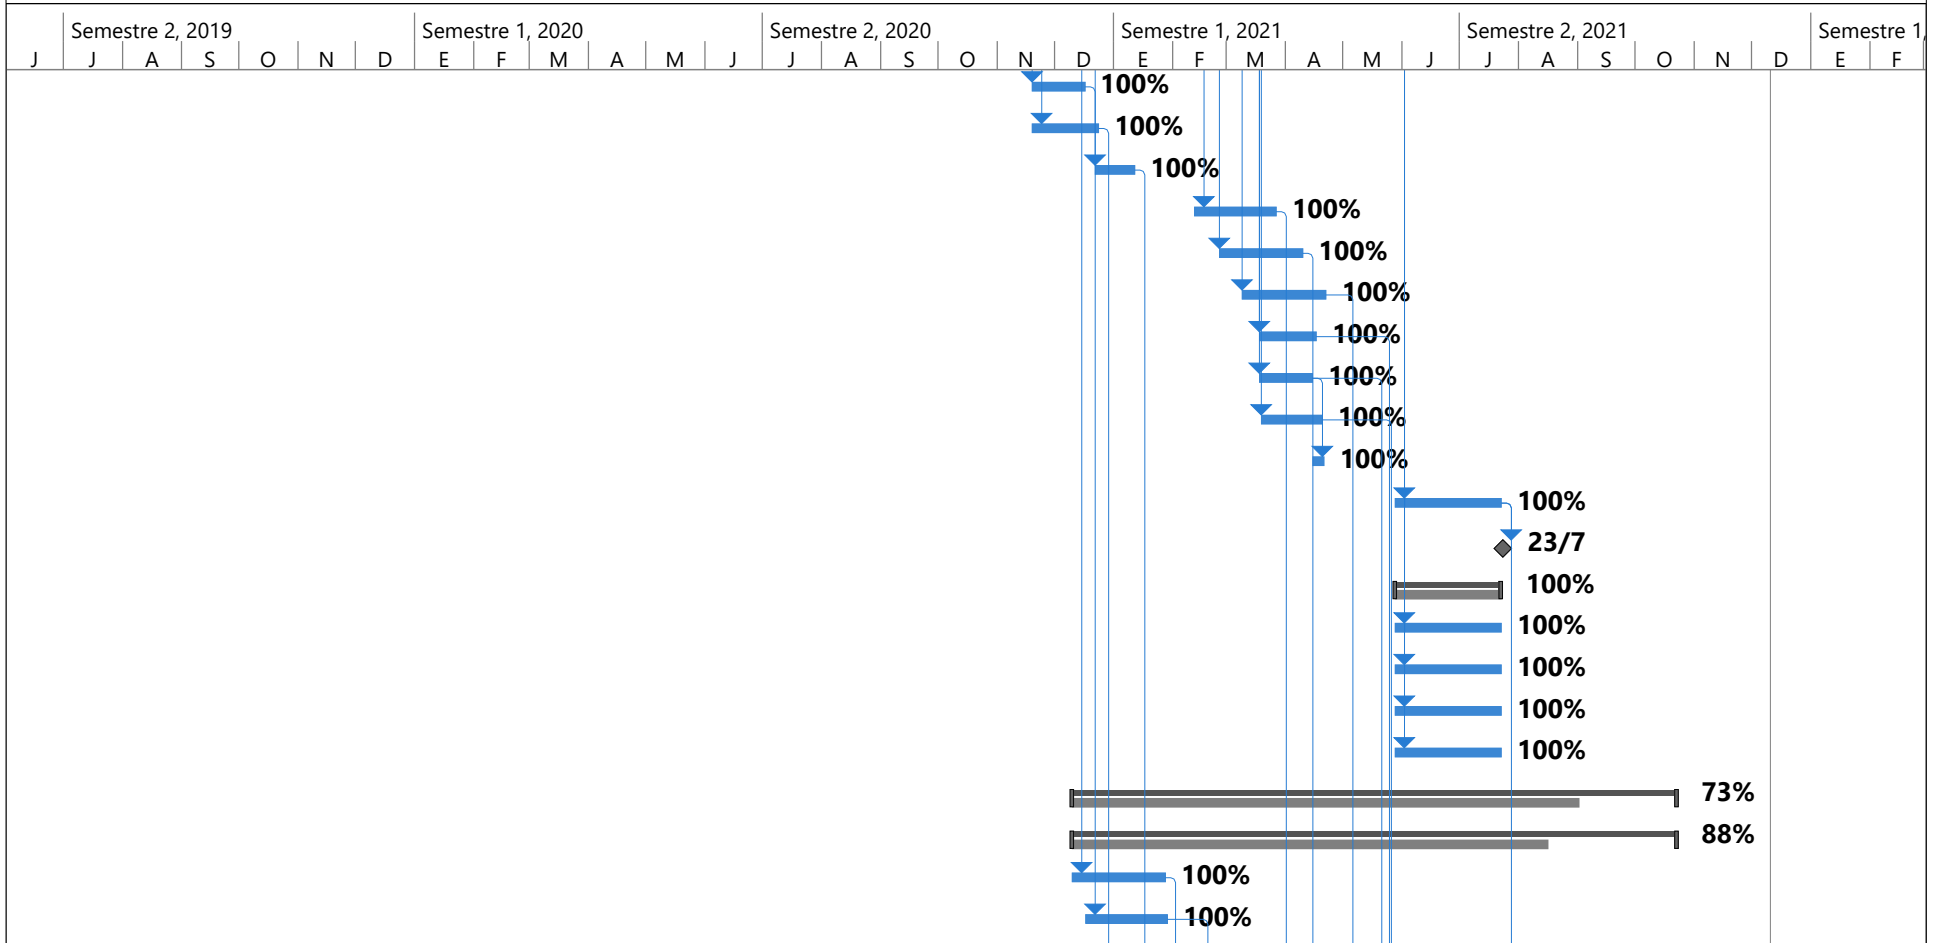


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

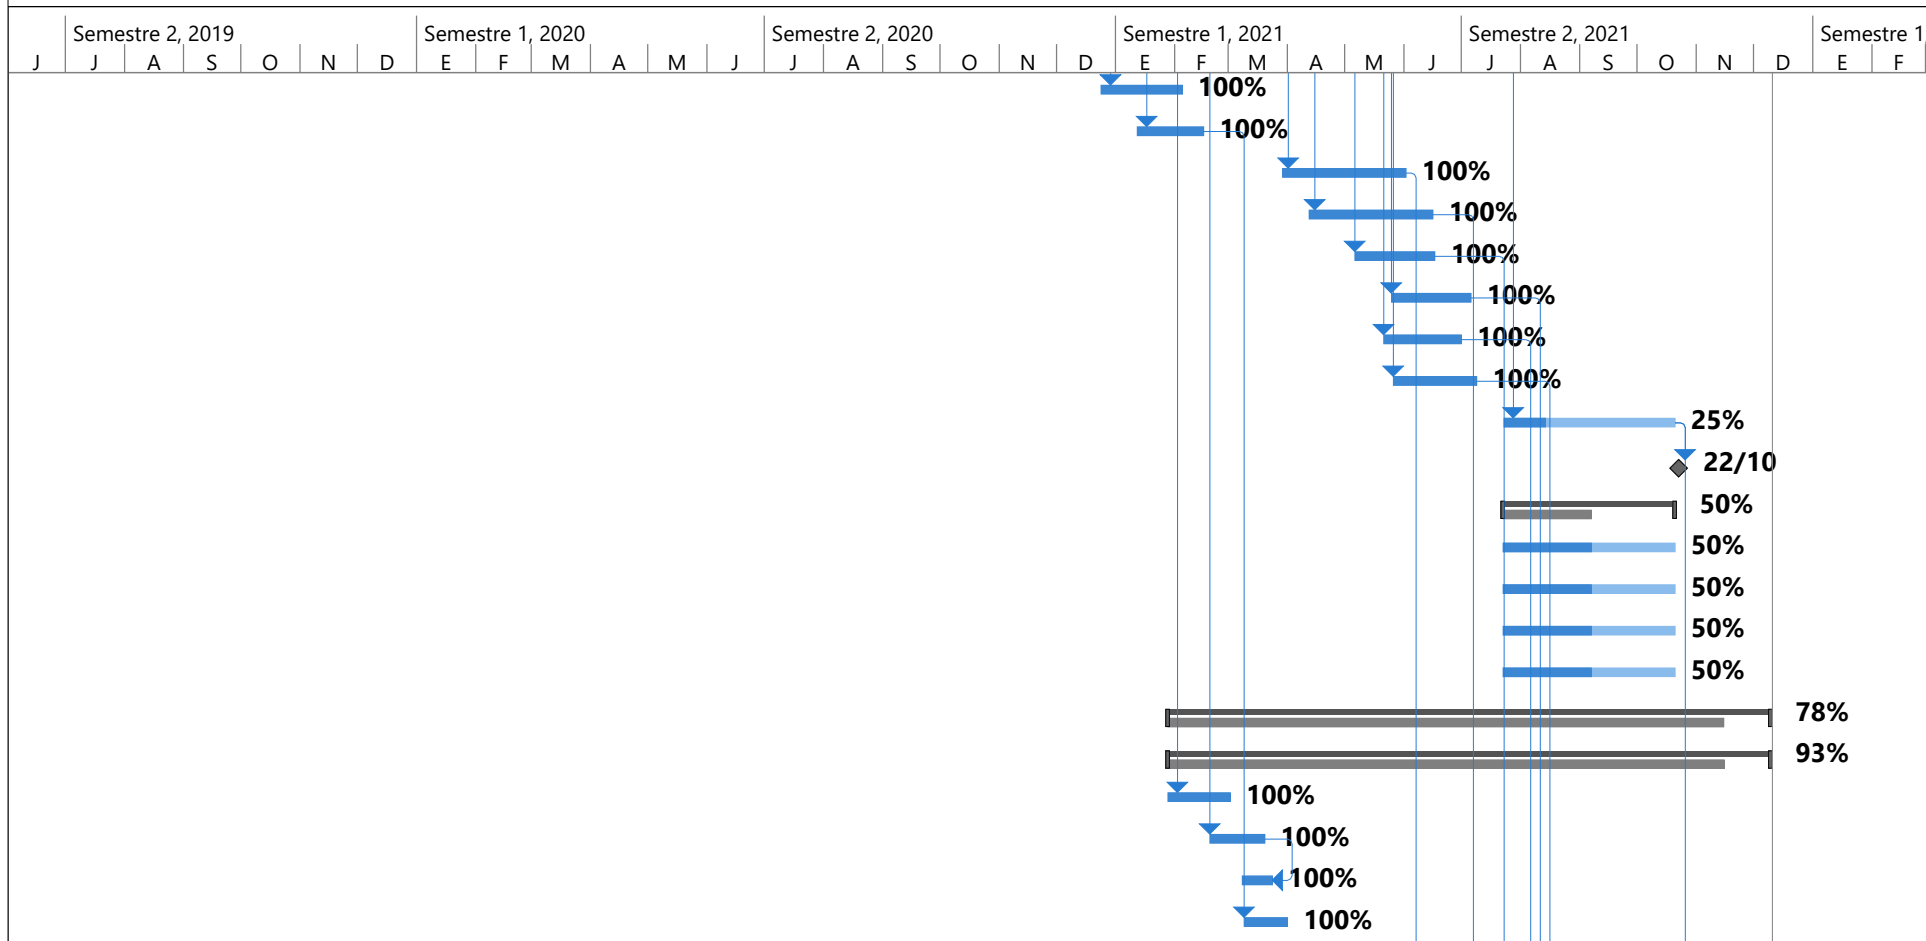

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución Lote 08-MOCA103.mpp

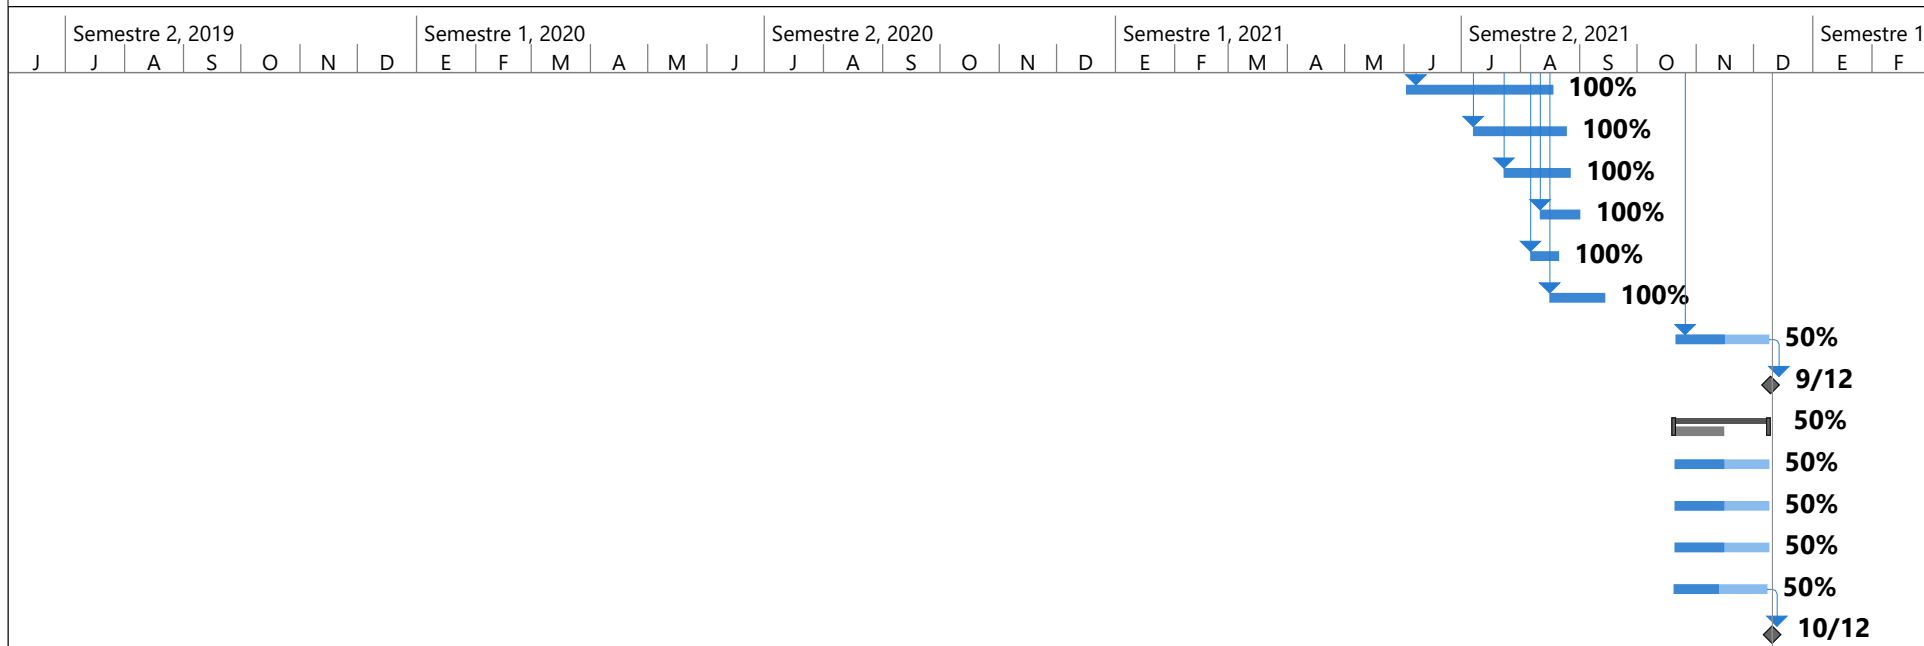

**Ing. Alberto Rafael Rosario Cabral**

Gerente de Ingeniería y Planificación  
 Dirección de Proyectos Financiados  
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas  
 Edenorte Dominicana  
 T: 809-241-9090 Ext. 4821 F: 809-747-5912  
 E: arosarioc@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
