

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may '16			19 jun '16			7 ago '16			2
						J	S	L	X	V	D	M			
1		Circuito NIBA101	285 días	lun 27/6/16	vie 28/7/17										
2		Adquisiciones	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16										
3		Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16										
4		Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16										
5		Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16										
6		Transformadores y Eq. Protección	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16										
7		Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16										
8		Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16										
9		Etapa 1	51.21 días	jue 27/10/16	vie 6/1/17										
10		Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16										
11		Armado de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16										
12		Tendido de Conducto	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16										
13		Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16										
14		Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16										
15		Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16										
16		Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16										

Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may '16			19 jun '16			7 ago '16			2
						J	S	L	X	V	D	M			
17		Normalización de Suministros	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17										
18		Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17										
19		Etapa 2	93 días	jue 1/12/16	lun 10/4/17										
20		Izaje de Postes	10 días	jue 1/12/16	mié 14/12/16										
21		Armado de Estructura	10 días	jue 15/12/16	mié 28/12/16										
22		Tendido de Conductores	13 días	jue 29/12/16	lun 16/1/17										
23		Montaje de Transformadores	10 días	mar 17/1/17	lun 30/1/17										
24		Instalación de Luminarias	10 días	mar 31/1/17	lun 13/2/17										
25		Correcciones	10 días	mar 14/2/17	lun 27/2/17										
26		Remociones	10 días	mar 28/2/17	lun 13/3/17										
27		Normalización de Suministros	20 días	mar 14/3/17	lun 10/4/17										
28		Evaluación	0 días	lun 10/4/17	lun 10/4/17										
29		Etapa 3	68 días	mié 22/2/17	vie 26/5/17										
30		Izaje de Postes	7 días	mié 22/2/17	jue 2/3/17										
31		Armado de Estructura	7 días	vie 3/3/17	lun 13/3/17										
32		Tendido de Conductor	10 días	mar 14/3/17	lun 27/3/17										


Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may '16			19 jun '16			7 ago '16			2
						J	S	L	X	V	D	M			
33		Montaje de Transformadores	6 días	mar 28/3/17	mar 4/4/17										
34		Instalación de Luminarias	7 días	mié 5/4/17	jue 13/4/17										
35		Correcciones	8 días	vie 14/4/17	mar 25/4/17										
36		Remociones	8 días	mié 26/4/17	vie 5/5/17										
37		Normalización de Suministros	15 días	lun 8/5/17	vie 26/5/17										
38		Evaluación	0 días	vie 26/5/17	vie 26/5/17										
39		Cierres Técnico y Administrativo	46 días	vie 26/5/17	vie 28/7/17										
40		Cierre Técnico	23 días	vie 26/5/17	mar 27/6/17										
41		Cierre Administrativo	22 días	mié 28/6/17	jue 27/7/17										
42		Evaluación	0 días	jue 27/7/17	jue 27/7/17										

Proyecto: Cronograma Modelo NI
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

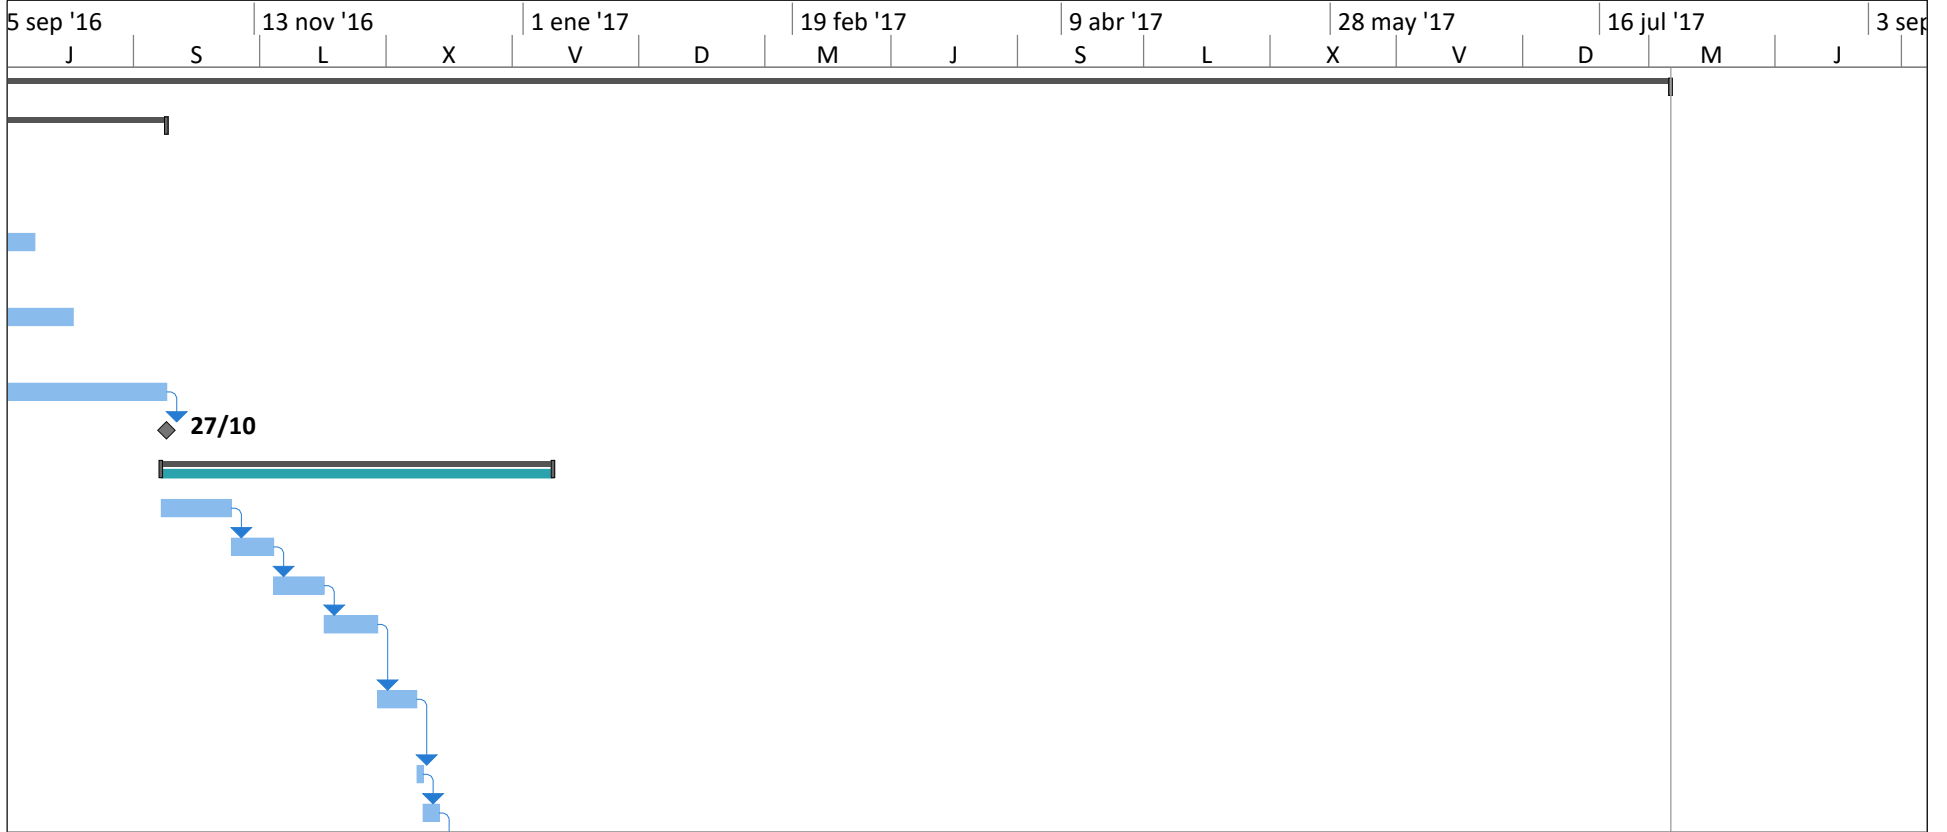


Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

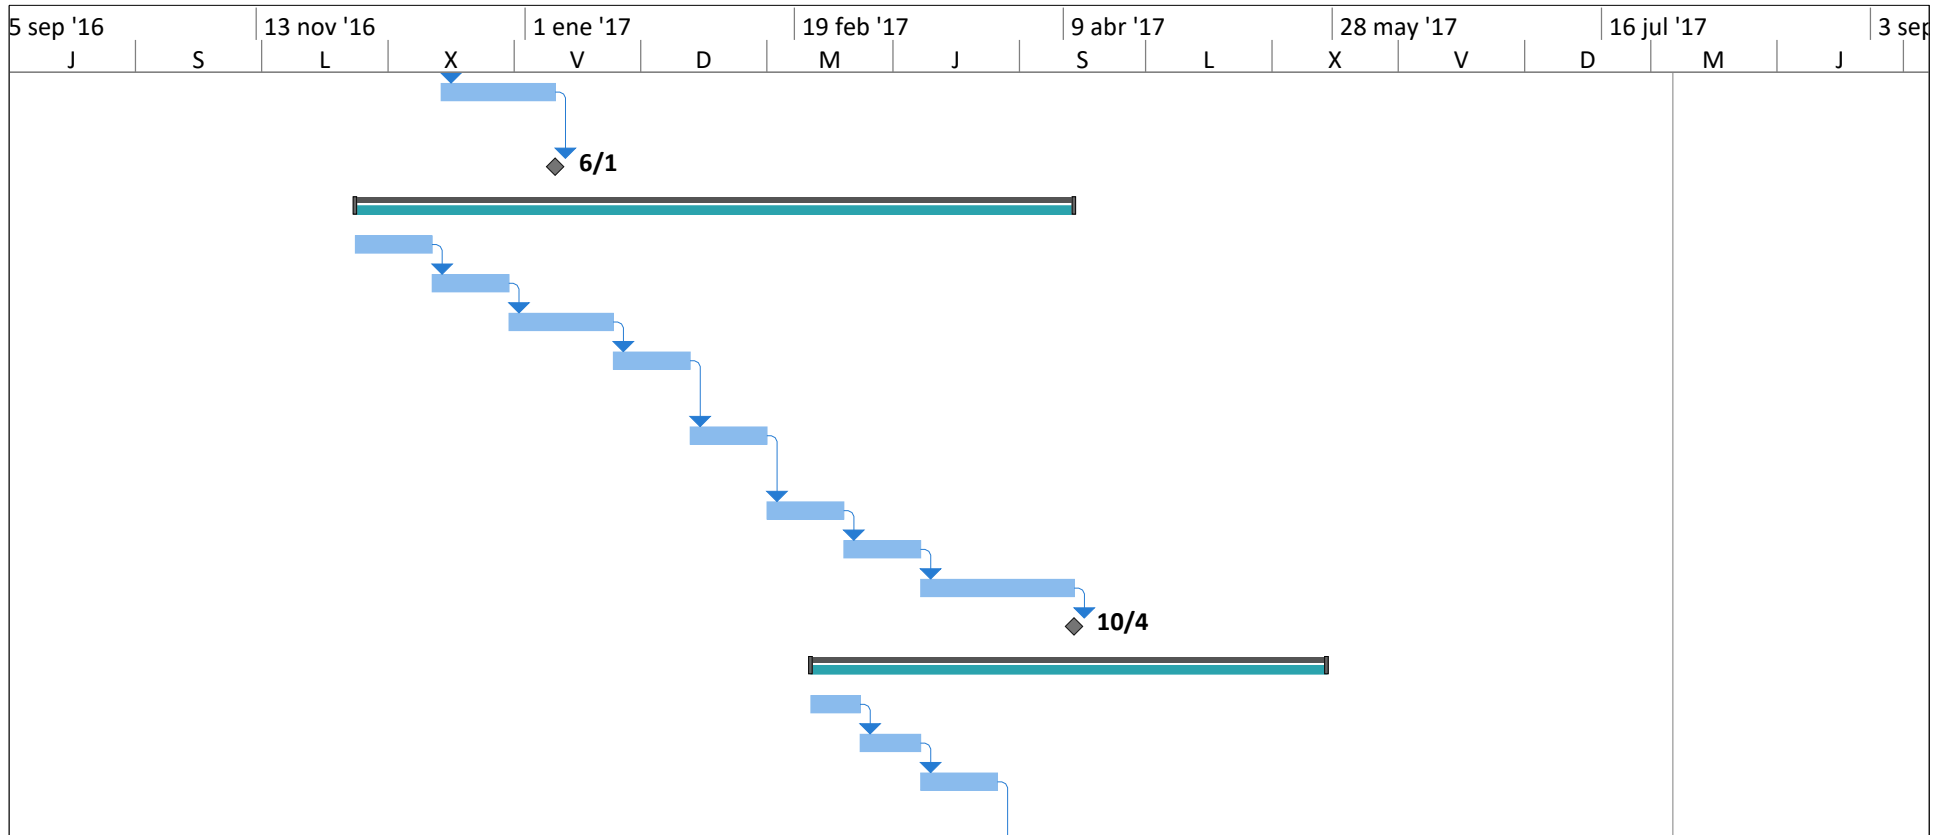

Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

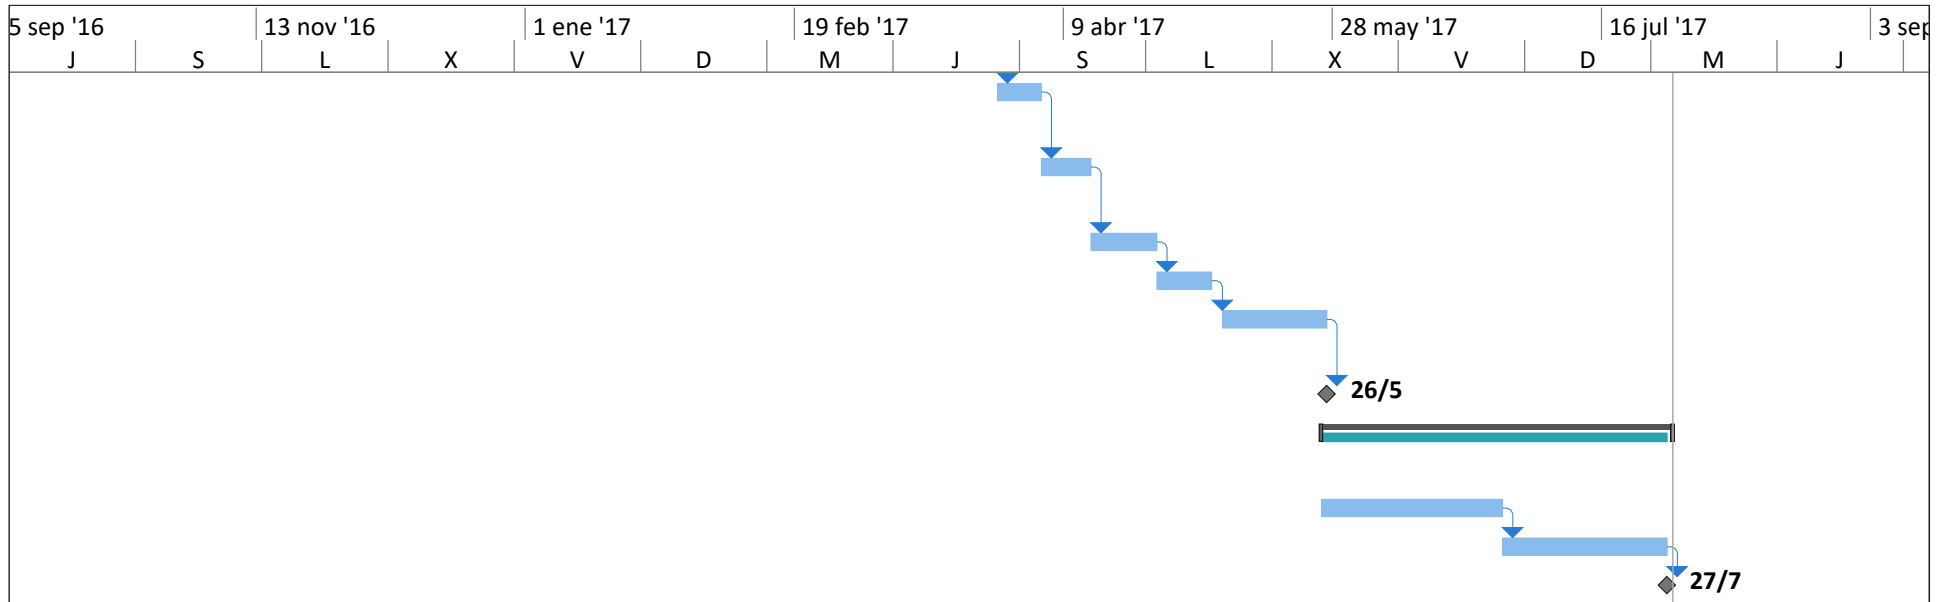

Proyecto: Cronograma Modelo NI
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			
