

Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	A	M	J	J	Semestre 2, 2018
1	✓	🔧	<b>Rehabilitación de Redes CHIV106</b>	<b>257.13 día</b>	<b>jue 15/11/18</b>					
2	✓	🔧	Adjudicación	0 días	lun 1/10/18					
3	✓	🔧	<b>Periodo de Adquisiciones</b>	<b>80 días</b>	<b>jue 15/11/18</b>					
28	✓	🔧	<b>Ejecución</b>	<b>217 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>					
29	✓	🔧	<b>Polígono 1</b>	<b>100 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>					
30	✓	🔧	<b>Instalación</b>	<b>94 días</b>	<b>jue 13/12/18</b>					
31	✓	🔧	Izado de postes	4 días	jue 13/12/18					
32	✓	🔧	Cimentaciones	5 días	jue 13/12/18					
33	✓	🔧	Retenidas	4 días	jue 7/3/19					
34	✓	🔧	Armados de Media y Baja Tensión	10 días	jue 7/3/19					
35	✓	🔧	Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días	jue 21/3/19					
36	✓	🔧	Elementos de Protección y Maniobra	3 días	jue 21/3/19					
37	✓	🔧	Conexiones y Jumpers	6 días	lun 1/4/19					
38	✓	🔧	Transformadores	5 días	jue 21/3/19					
39	✓	🔧	Alumbrado Publico	4 días	lun 1/4/19					
40	✓	🔧	Normalización Suministros	12 días	jue 21/3/19					
41	✓	🔧	<b>Remoción</b>	<b>40 días</b>	<b>jue 7/3/19</b>					
42	✓	🔧	Tendido de Conductor Media Tensión	0 días	mié 3/4/19					
43	✓	🔧	Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días	mar 26/3/19					
44	✓	🔧	Armados de Media Tensión	5 días	jue 7/3/19					
45	✓	🔧	Armados de Baja Tensión	8 días	lun 1/4/19					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2018				
						A	M	J	J	J
46	✓		Transformadores	3 días	mié 10/4/19					
47	✓		Izado de postes	13 días	lun 15/4/19					
48	✓		Cierre de Polígono 1	0 días	mié 1/5/19					
49	✓		<b>Polígono 2</b>	<b>145 días</b>	<b>mié 19/12/18</b>					
50	✓		<b>Instalación</b>	<b>145 días</b>	<b>mié 19/12/18</b>					
51	✓		Izado de postes	22 días	mié 19/12/18					
52	✓		Cimentaciones	19 días	lun 24/12/18					
53	✓		Retenidas	14 días	lun 31/12/18					
54	✓		Armados de Media y Baja Tensión	19 días	jue 21/3/19					
55	✓		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días	jue 4/4/19					
56	✓		Elementos de Protección y Maniobra	15 días	jue 16/5/19					
57	✓		Conexiones y Jumpers	15 días	vie 14/6/19					
58	✓		Transformadores	25 días	jue 11/4/19					
59	✓		Alumbrado Publico	10 días	jue 2/5/19					
60	✓		Normalización Suministros	41 días	mié 17/4/19					
61	✓		<b>Remoción</b>	<b>41 días</b>	<b>vie 19/4/19</b>					
62	✓		Tendido de Conductor Media Tensión	14 días	vie 19/4/19					
63	✓		Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	lun 29/4/19					
64	✓		Armados de Media Tensión	7 días	jue 30/5/19					
65	✓		Armados de Baja Tensión	11 días	jue 2/5/19					
66	✓		Transformadores	16 días	lun 6/5/19					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2018				
						A	M	J	J	J
67	✓		Izado de postes	17 días	mié 8/5/19					
68	✓		Cierre de Polígono 2	0 días	jue 30/5/19					
69	✓		<b>Polígono 3</b>	<b>172 días</b>	<b>vie 18/1/19</b>					
70	✓		<b>Instalación</b>	<b>140 días</b>	<b>vie 18/1/19</b>					
71	✓		Izado de postes	12 días	vie 18/1/19					
72	✓		Cimentaciones	8 días	jue 24/1/19					
73	✓		Retenidas	7 días	vie 25/1/19					
74	✓		Armados de Media y Baja Tensión	40 días	vie 19/4/19					
75	✓		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días	vie 26/4/19					
76	✓		Elementos de Protección y Maniobra	7 días	lun 24/6/19					
77	✓		Conexiones y Jumpers	8 días	vie 3/5/19					
78	✓		Transformadores	10 días	vie 7/6/19					
79	✓		Alumbrado Publico	7 días	vie 14/6/19					
80	✓		Normalización Suministros	16 días	mar 25/6/19					
81	✓		<b>Remoción</b>	<b>81 días</b>	<b>lun 27/5/19</b>					
82	✓		Tendido de Conductor Media Tensión	21 días	lun 27/5/19					
83	✓		Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días	mié 31/7/19					
84	✓		Armados de Media Tensión	10 días	jue 6/6/19					
85	✓		Armados de Baja Tensión	16 días	lun 5/8/19					
86	✓		Transformadores	6 días	lun 5/8/19					
87	✓		Izado de postes	25 días	mar 13/8/19					








Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2018				
						A	M	J	J	J
88			Cierre de Polígono 3	0 días	lun 16/9/19					
89			<b>Polígono 4</b>	<b>179 días</b>	<b>mar 5/2/19</b>					
90			<b>Instalación</b>	<b>169 días</b>	<b>mar 5/2/19</b>					
91			Izado de postes	6 días	mar 5/2/19					
92			Cimentaciones	5 días	mié 6/2/19					
93			Retenidas	4 días	jue 7/2/19					
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días	vie 2/8/19					
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días	lun 5/8/19					
96			Elementos de Protección y Maniobra	7 días	lun 26/8/19					
97			Conexiones y Jumpers	8 días	lun 2/9/19					
98			Transformadores	14 días	vie 16/8/19					
99			Alumbrado Publico	6 días	mié 28/8/19					
100			Normalización Suministros	18 días	mié 4/9/19					
101			<b>Remoción</b>	<b>29 días</b>	<b>mar 3/9/19</b>					
102			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días	mar 3/9/19					
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	mié 11/9/19					
104			Armados de Media Tensión	12 días	mar 10/9/19					
105			Armados de Baja Tensión	10 días	jue 26/9/19					
106			Transformadores	9 días	vie 13/9/19					
107			Izado de postes	15 días	mar 17/9/19					
108			Cierre de Polígono 4	0 días	lun 7/10/19					


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Semestre 2, 2018				
						A	M	J	J	J
109			<b>Cierre de Obras</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 14/10/19</b>					
110			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms	lun 14/10/19					
111			Presentación de Cierre de Obras	0 días	vie 8/11/19					


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

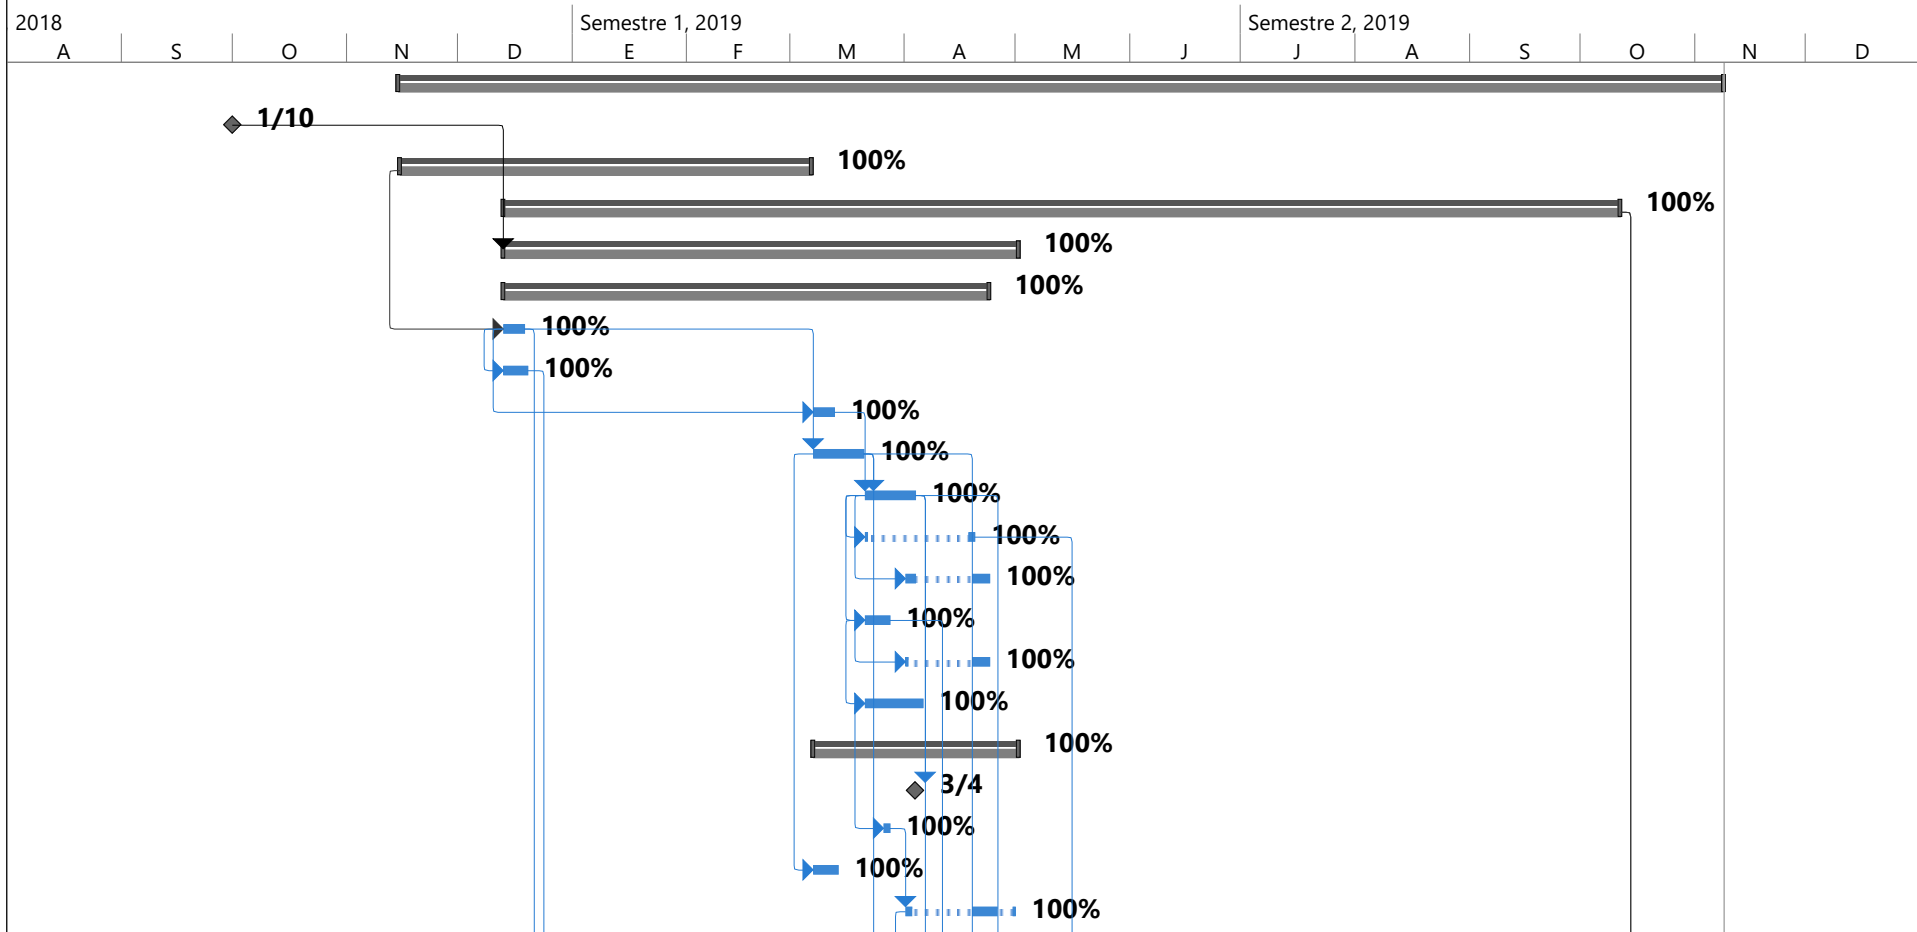


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

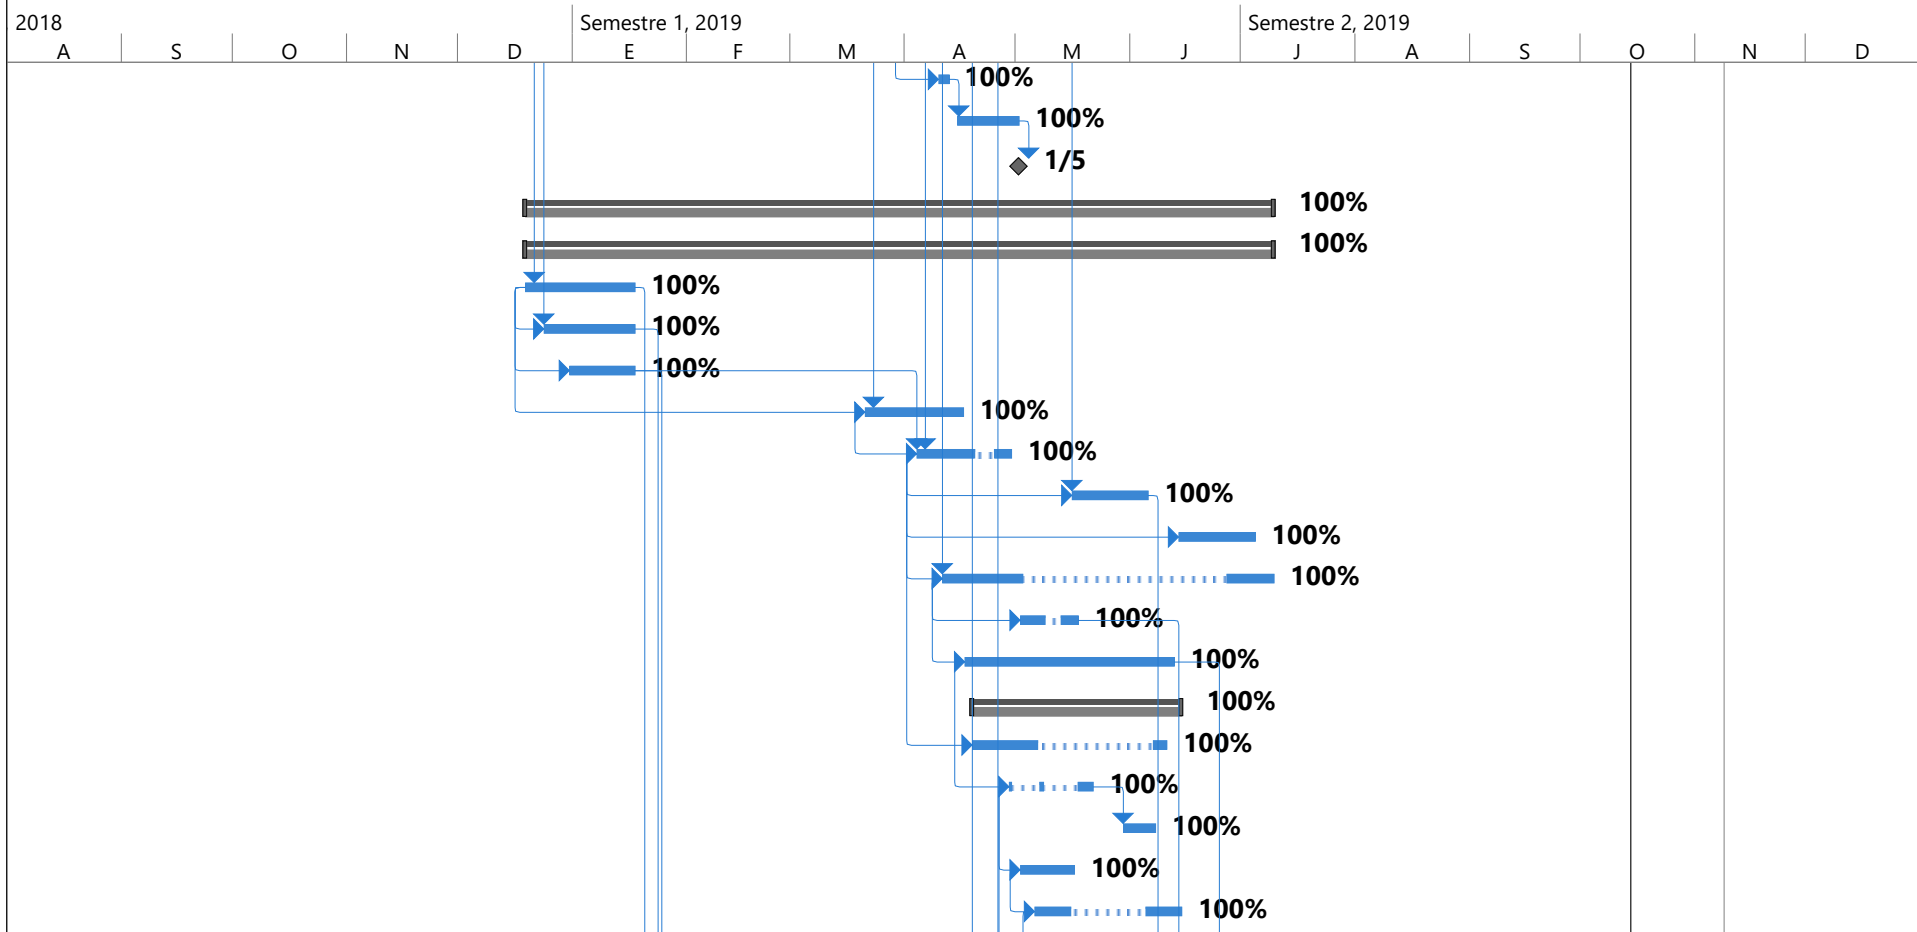

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021

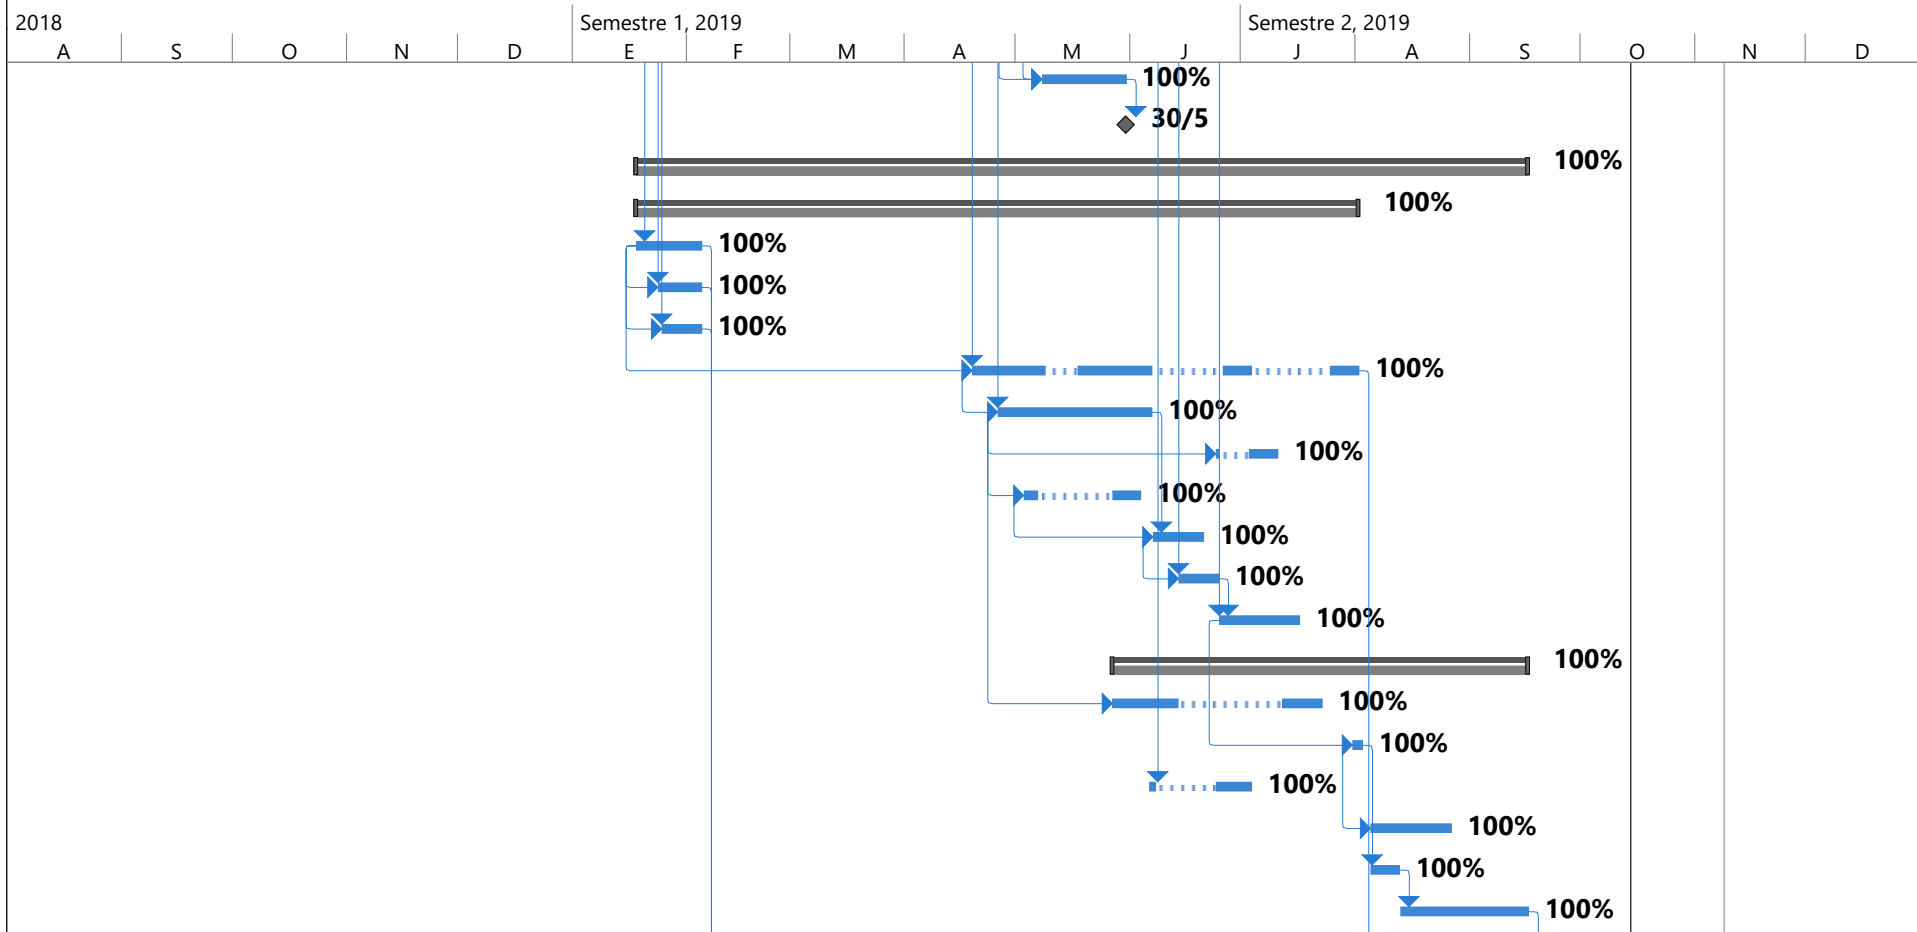







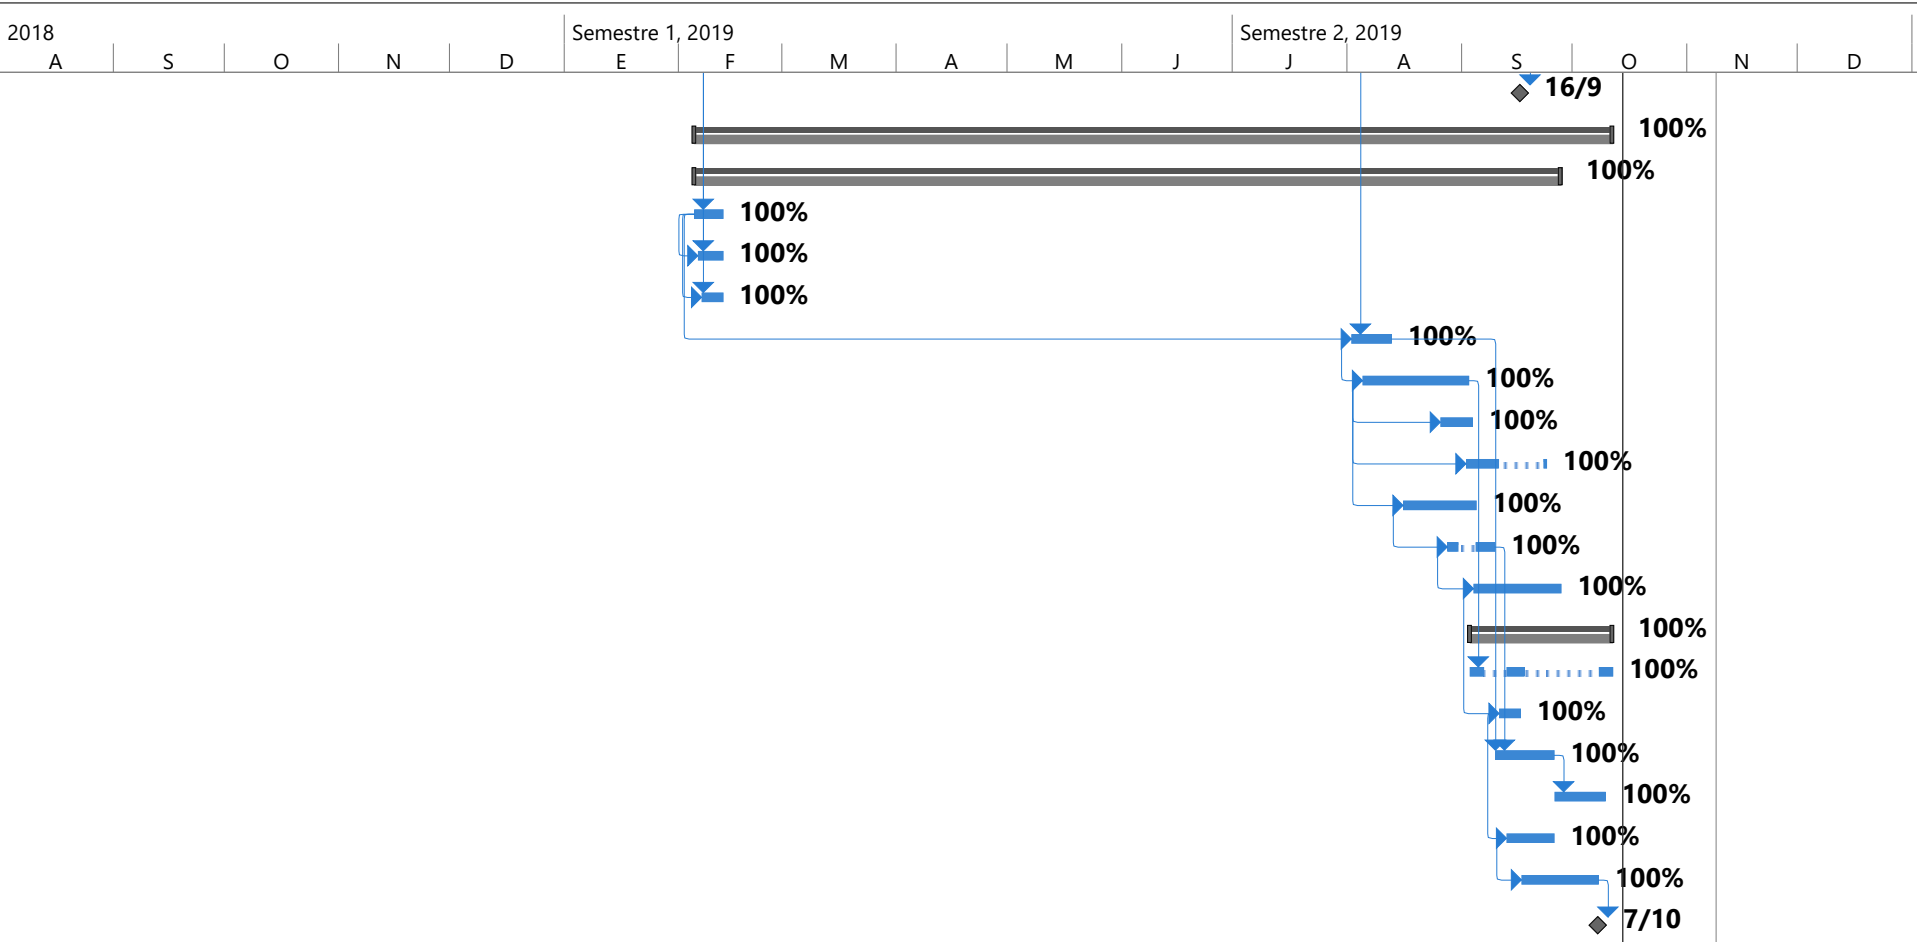

















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución CHIV106 Mayo2021



**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión  
Dirección de Proyectos Financiados  
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas  
Edenorte Dominicana  
F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
