
























































































Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

























Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018 abr	may	jun	tri 3, 2018 jul	ago	sep	tri 4, 2018 oct
1			Rehabilitación de Redes ZFPP402							
2			Adjudicación							
3			Periodo de Adquisiciones							
28			Ejecución							
29			Polígono 1							
30			Instalación							
31			lizado de postes							
32			Cimentaciones							
33			Retenidas							
34			Armados de Media y Baja Tensión							
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión							
36			Elementos de Protección y Maniobra							
37			Conexiones y Jumpers							
38			Transformadores							
39			Alumbrado Publico							
40			Normalización Suministros							
41			Remoción							
42			Tendido de Conductor Media Tensión							
43			Tendido de Conductor Baja Tensión							
44			Armados de Media Tensión							
45			Armados de Baja Tensión							

◆ 1/10























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018 abr	may	jun	tri 3, 2018 jul	ago	sep	tri 4, 2018 oct
46			Transformadores							
47			Izado de postes							
48			Cierre de Polígono 1							
49			Polígono 2							
50			Instalación							
51			Izado de postes							
52			Cimentaciones							
53			Retenidas							
54			Armados de Media y Baja Tensión							
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión							
56			Elementos de Protección y Maniobra							
57			Conexiones y Jumpers							
58			Transformadores							
59			Alumbrado Publico							
60			Normalización Suministros							
61			Remoción							
62			Tendido de Conductor Media Tensión							
63			Tendido de Conductor Baja Tensión							
64			Armados de Media Tensión							
65			Armados de Baja Tensión							
66			Transformadores							

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018	
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	
67			Izado de postes								
68			Cierre de Polígono 2								
69			Polígono 3								
70			Instalación								
71			Izado de postes								
72			Cimentaciones								
73			Retenidas								
74			Armados de Media y Baja Tensión								
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión								
76			Elementos de Protección y Maniobra								
77			Conexiones y Jumpers								
78			Transformadores								
79			Alumbrado Publico								
80			Normalización Suministros								
81			Remoción								
82			Tendido de Conductor Media Tensión								
83			Tendido de Conductor Baja Tensión								
84			Armados de Media Tensión								
85			Armados de Baja Tensión								
86			Transformadores								
87			Izado de postes								



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018	
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	
88			Cierre de Polígono 3								
89			Polígono 4								
90			Instalación								
91			Izado de postes								
92			Cimentaciones								
93			Retenidas								
94			Armados de Media y Baja Tensión								
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión								
96			Elementos de Protección y Maniobra								
97			Conexiones y Jumpers								
98			Transformadores								
99			Alumbrado Publico								
100			Normalización Suministros								
101			Remoción								
102			Tendido de Conductor Media Tensión								
103			Tendido de Conductor Baja Tensión								
104			Armados de Media Tensión								
105			Armados de Baja Tensión								
106			Transformadores								
107			Izado de postes								
108			Cierre de Polígono 4								




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018 abr	may	jun	tri 3, 2018 jul	ago	sep	tri 4, 2018 oct
109			Polígono 5							
110			Instalación							
111			Izado de postes							
112			Cimentaciones							
113			Retenidas							
114			Armados de Media y Baja Tensión							
115			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión							
116			Elementos de Protección y Maniobra							
117			Conexiones y Jumpers							
118			Transformadores							
119			Alumbrado Publico							
120			Normalización Suministros							
121			Remoción							
122			Tendido de Conductor Media Tensión							
123			Tendido de Conductor Baja Tensión							
124			Armados de Media Tensión							
125			Armados de Baja Tensión							
126			Transformadores							
127			Izado de postes							
128			Cierre de Polígono 5							
129			Polígono 6							




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

























Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018	
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	
130			Instalación								
131			Izado de postes								
132			Cimentaciones								
133			Retenidas								
134			Armados de Media y Baja Tensión								
135			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión								
136			Elementos de Protección y Maniobra								
137			Conexiones y Jumpers								
138			Transformadores								
139			Alumbrado Publico								
140			Normalización Suministros								
141			Remoción								
142			Tendido de Conductor Media Tensión								
143			Tendido de Conductor Baja Tensión								
144			Armados de Media Tensión								
145			Armados de Baja Tensión								
146			Transformadores								
147			Izado de postes								
148			Cierre de Polígono 6								
149			Cierre de Obras								
150			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actua								

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	tri 2, 2018 abr	may	jun	tri 3, 2018 jul	ago	sep	tri 4, 2018 oct
151			Presentación de Cierre de Obras							




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

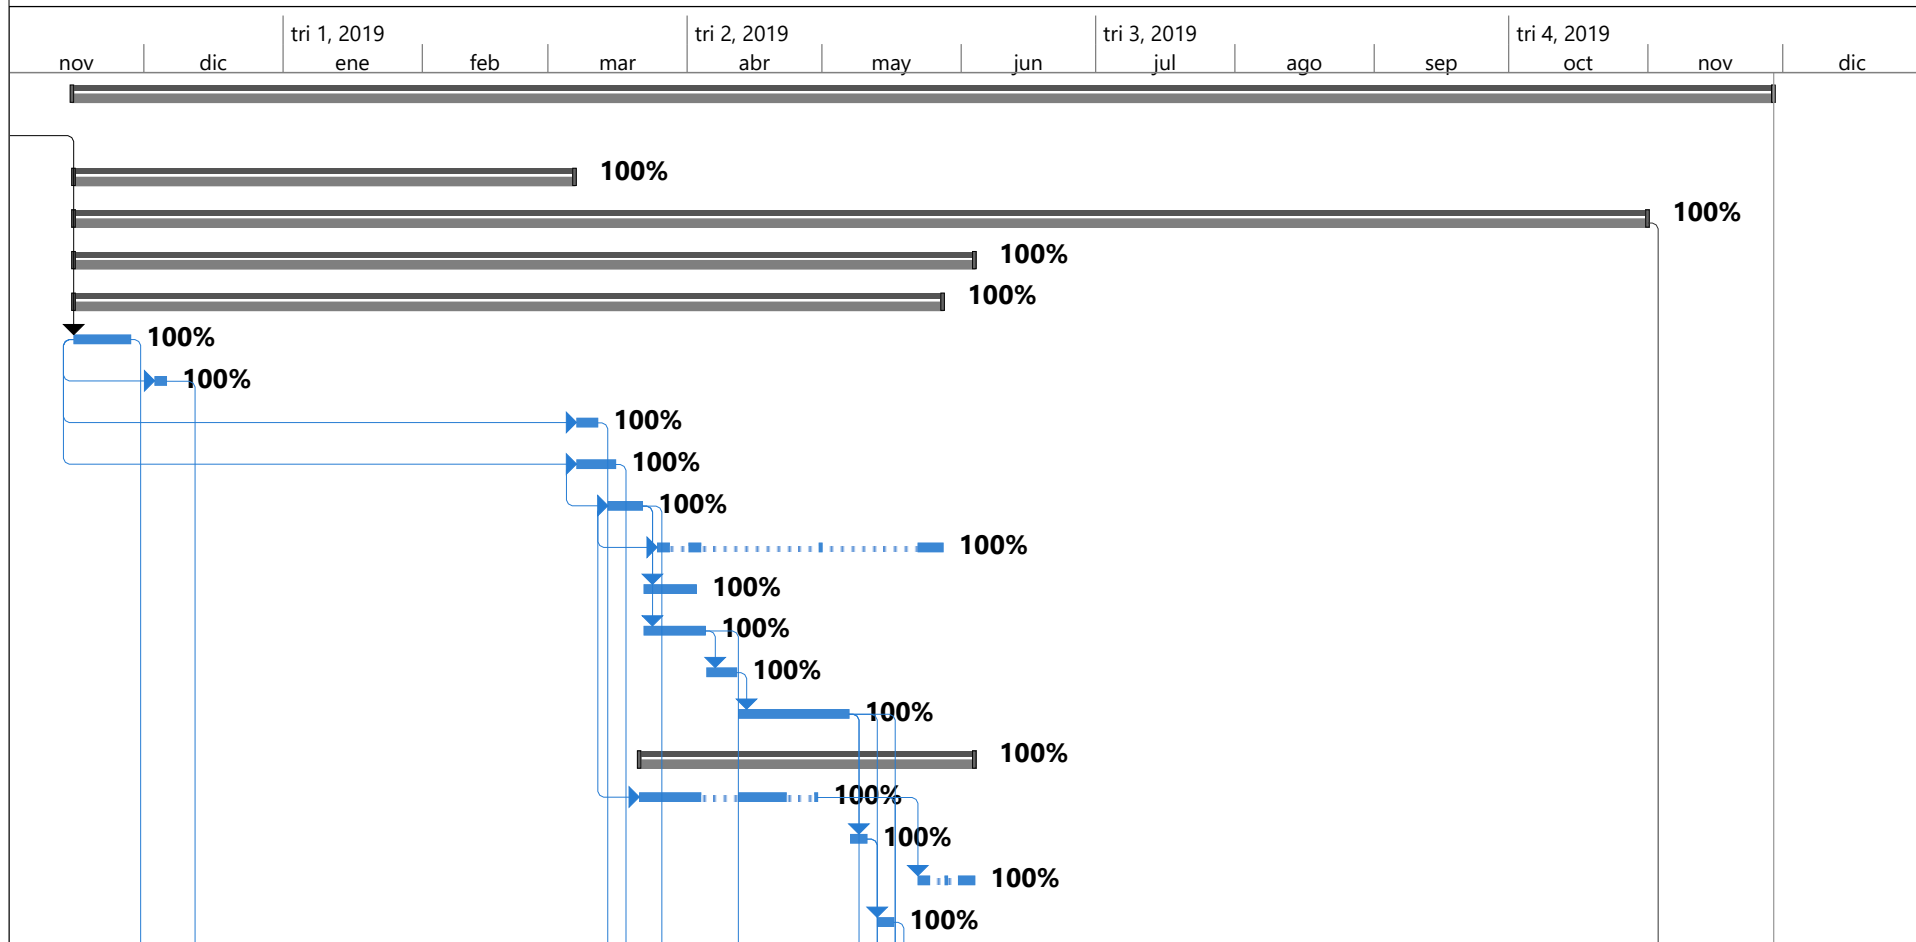


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

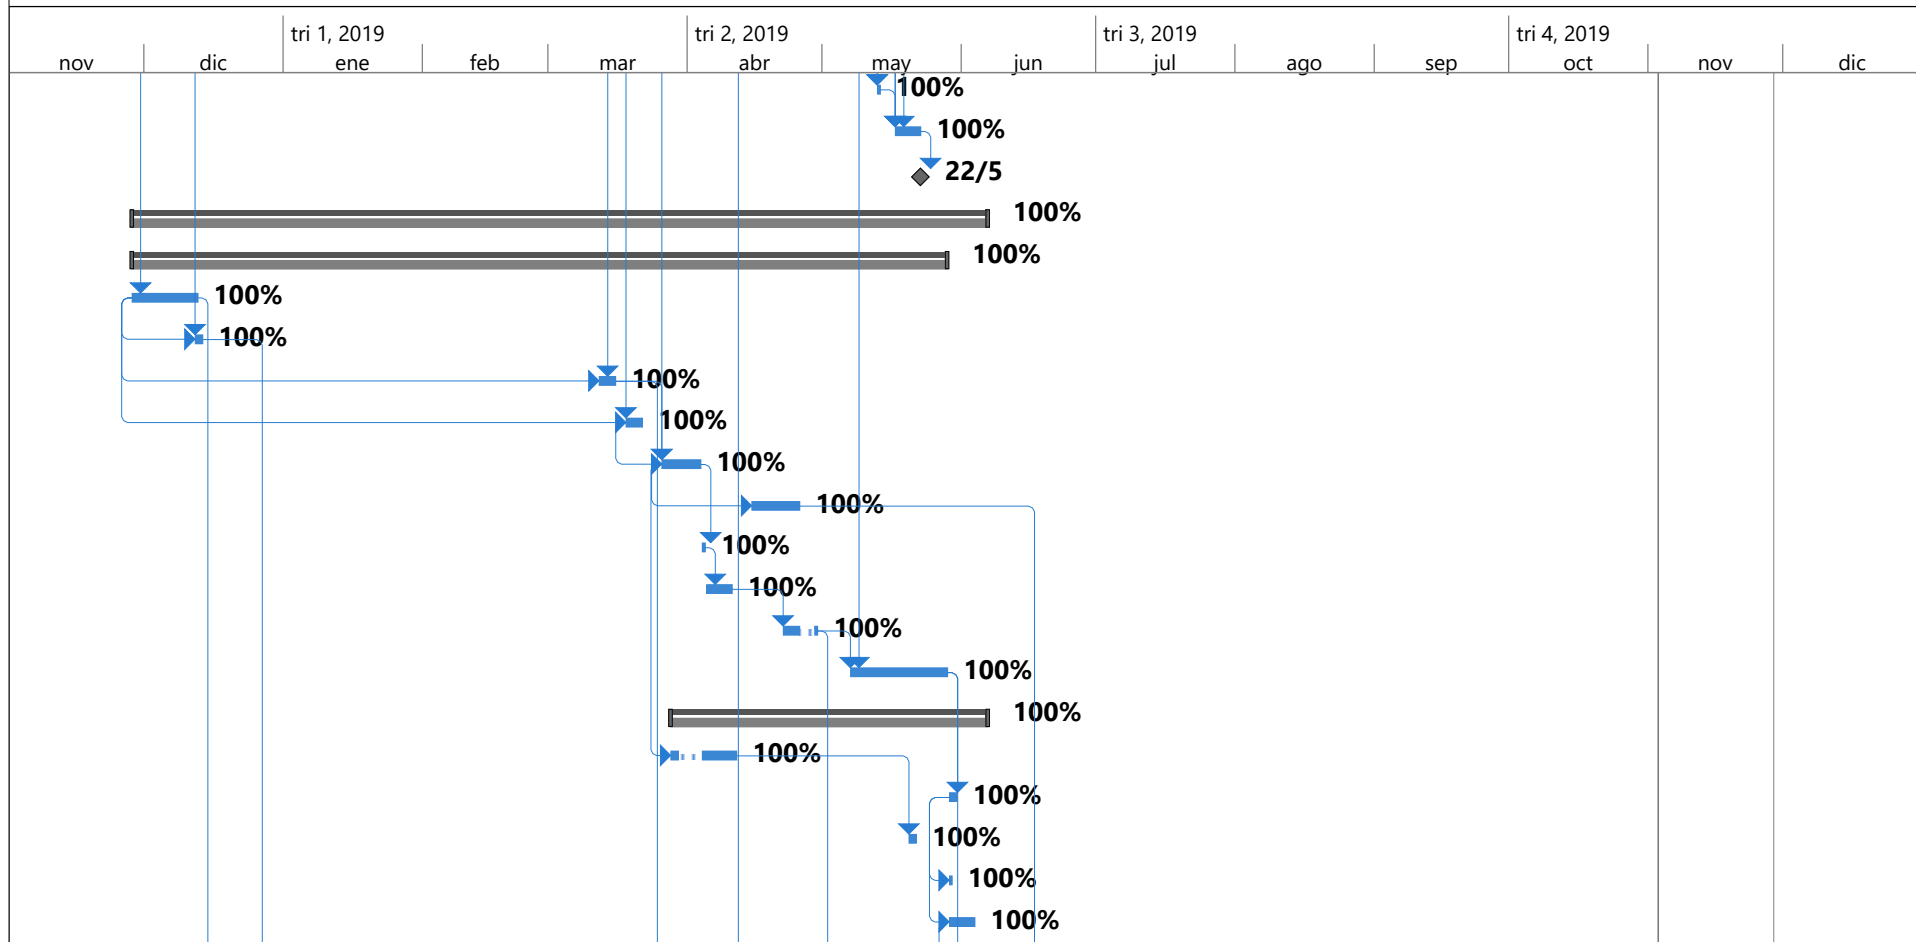


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

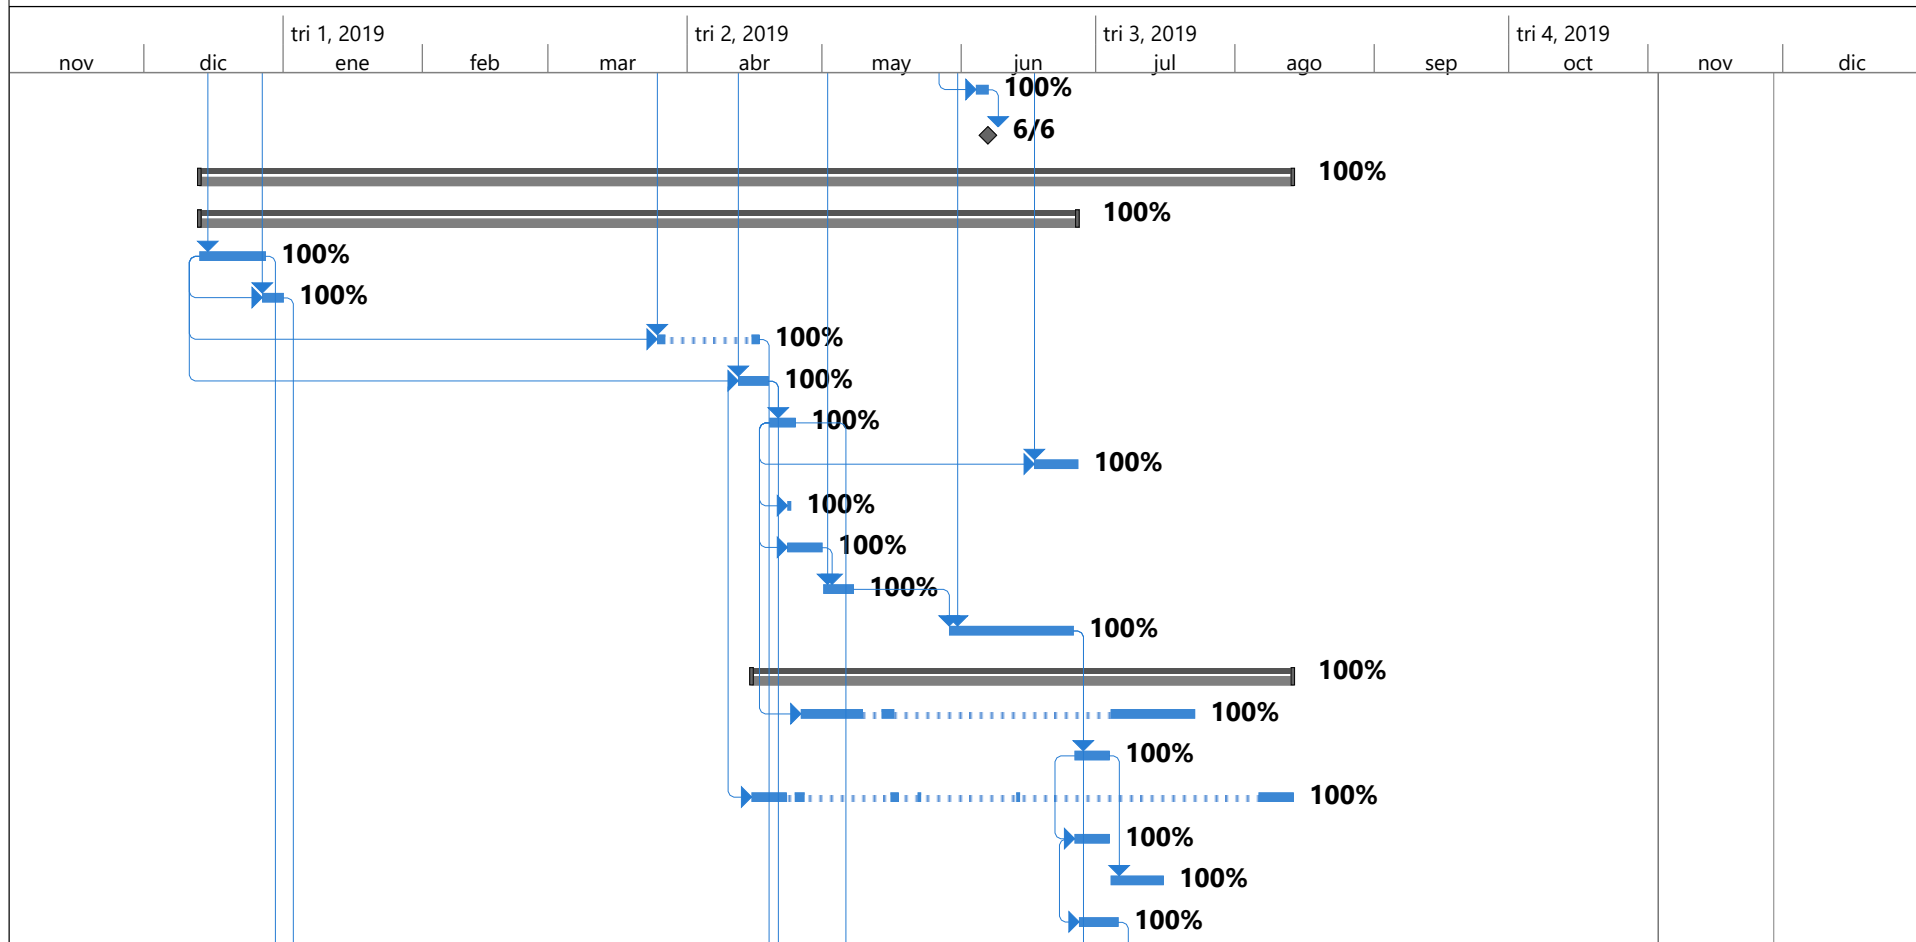


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

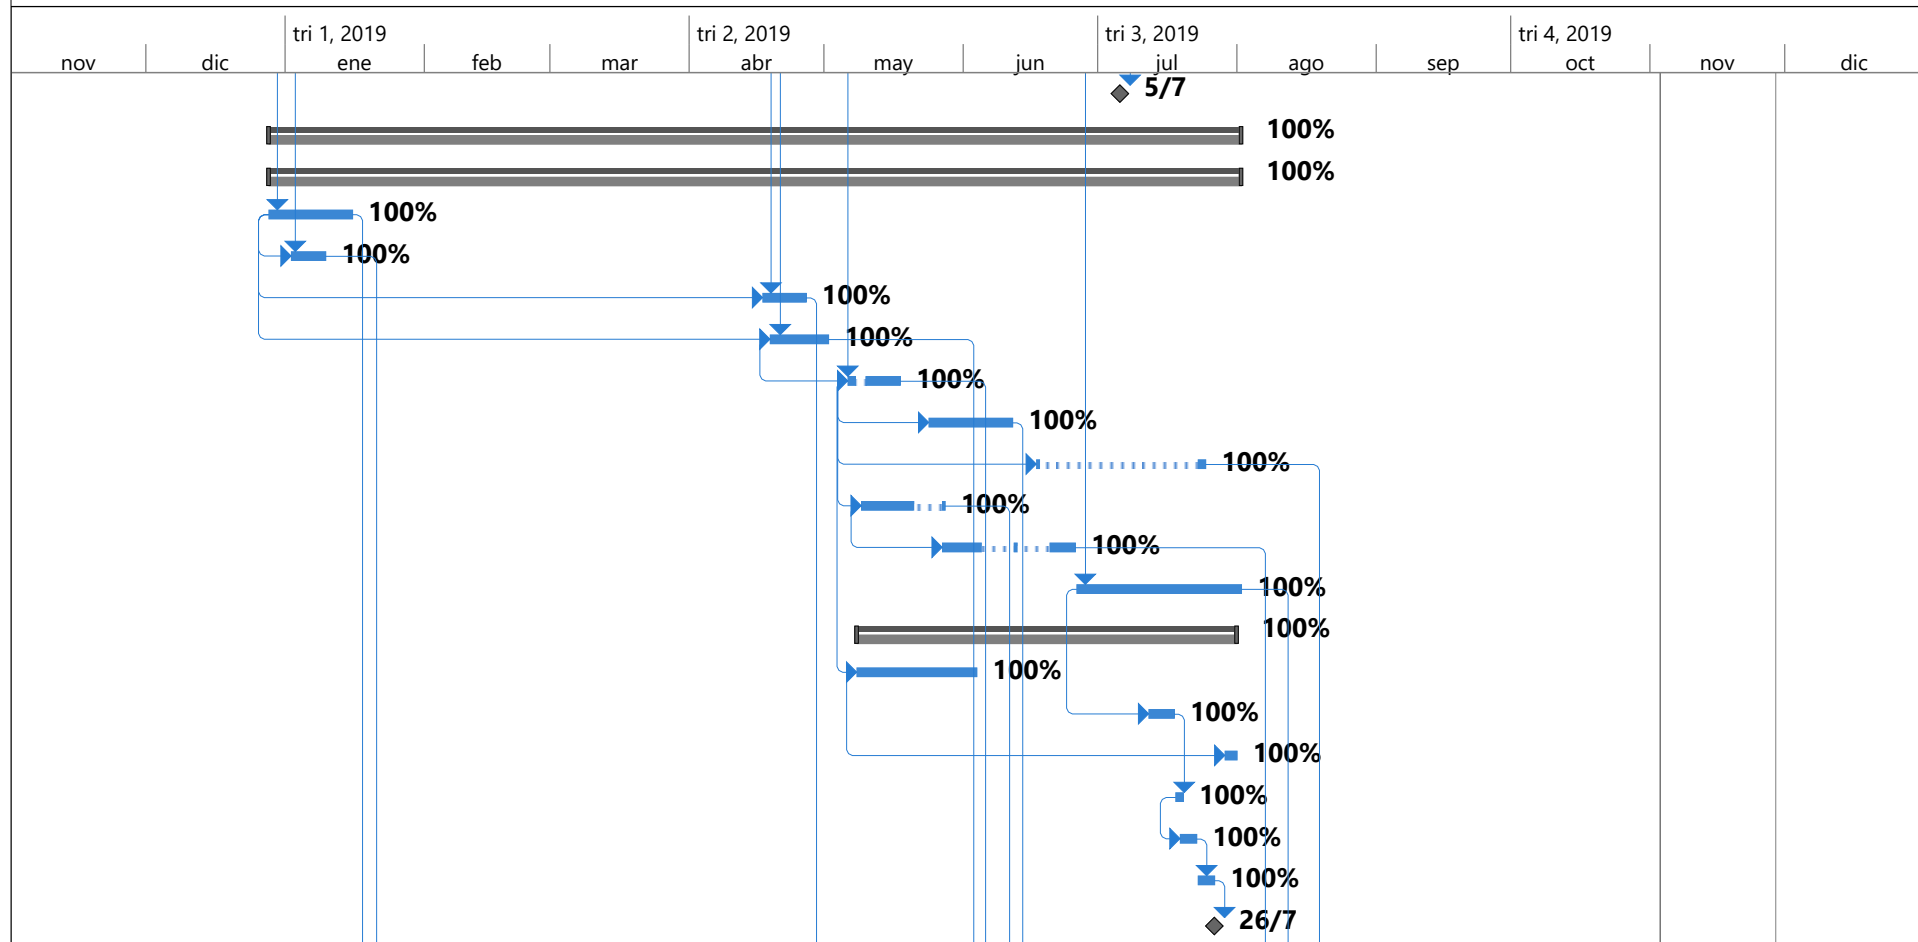


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

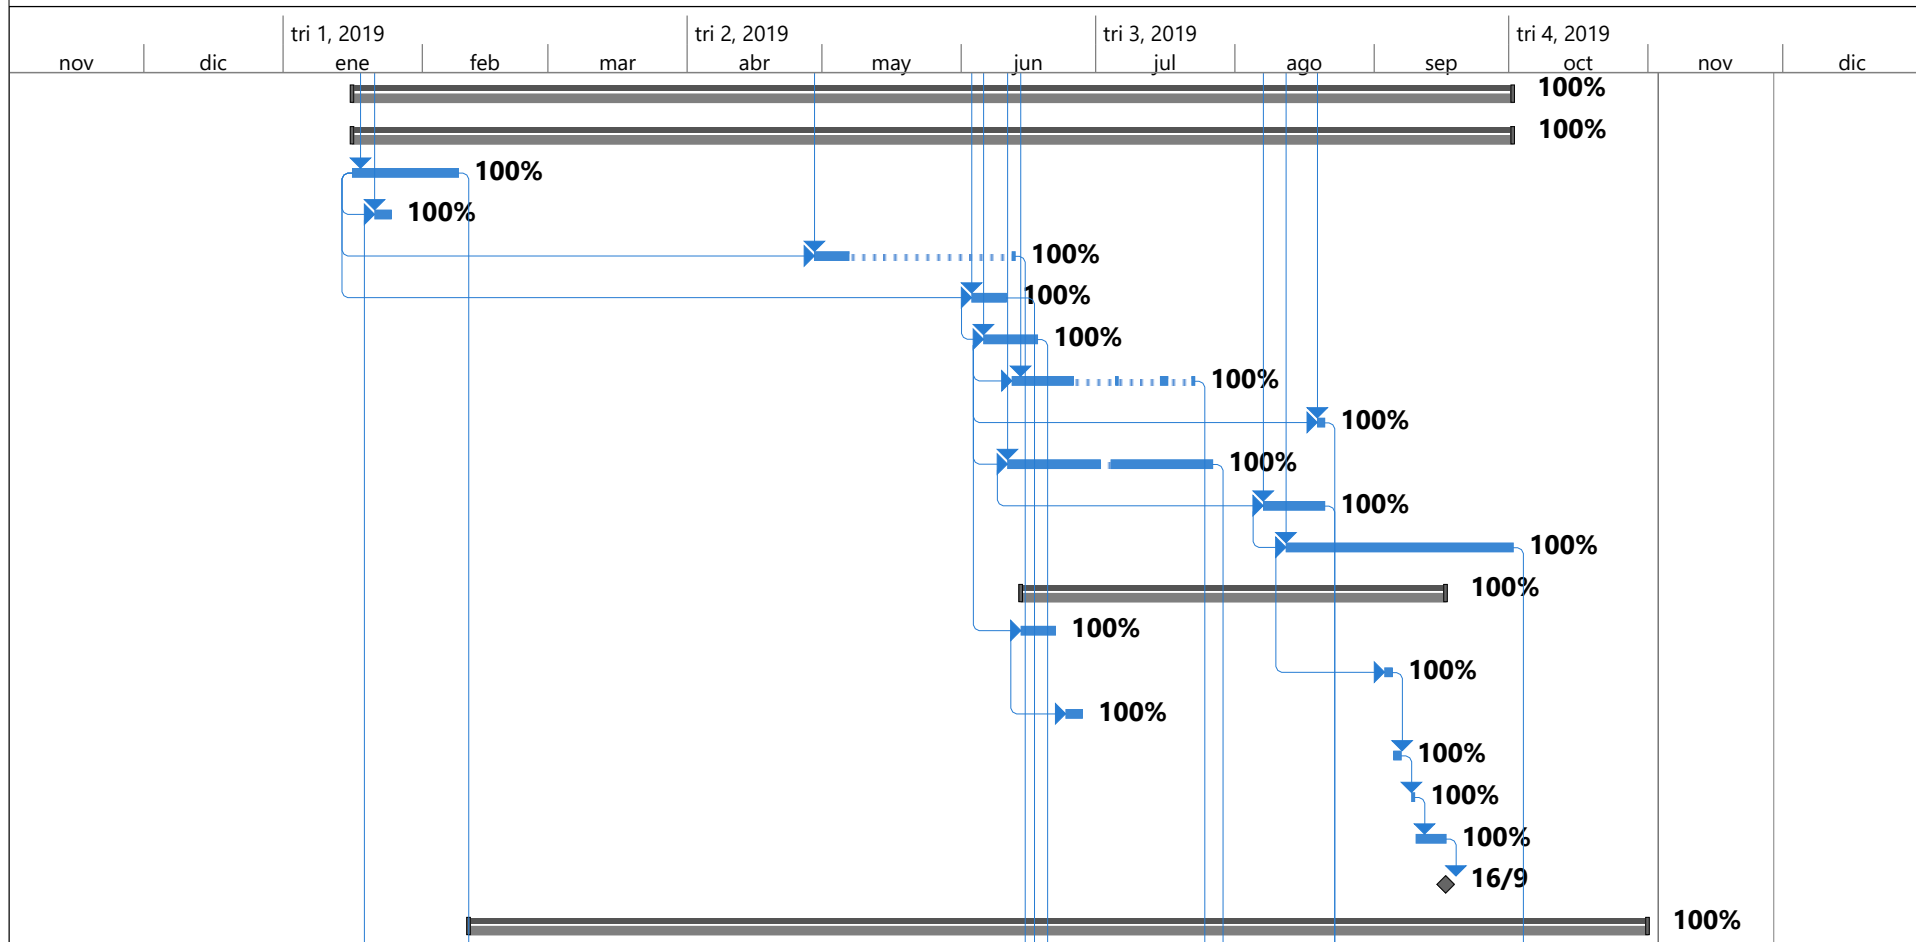

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

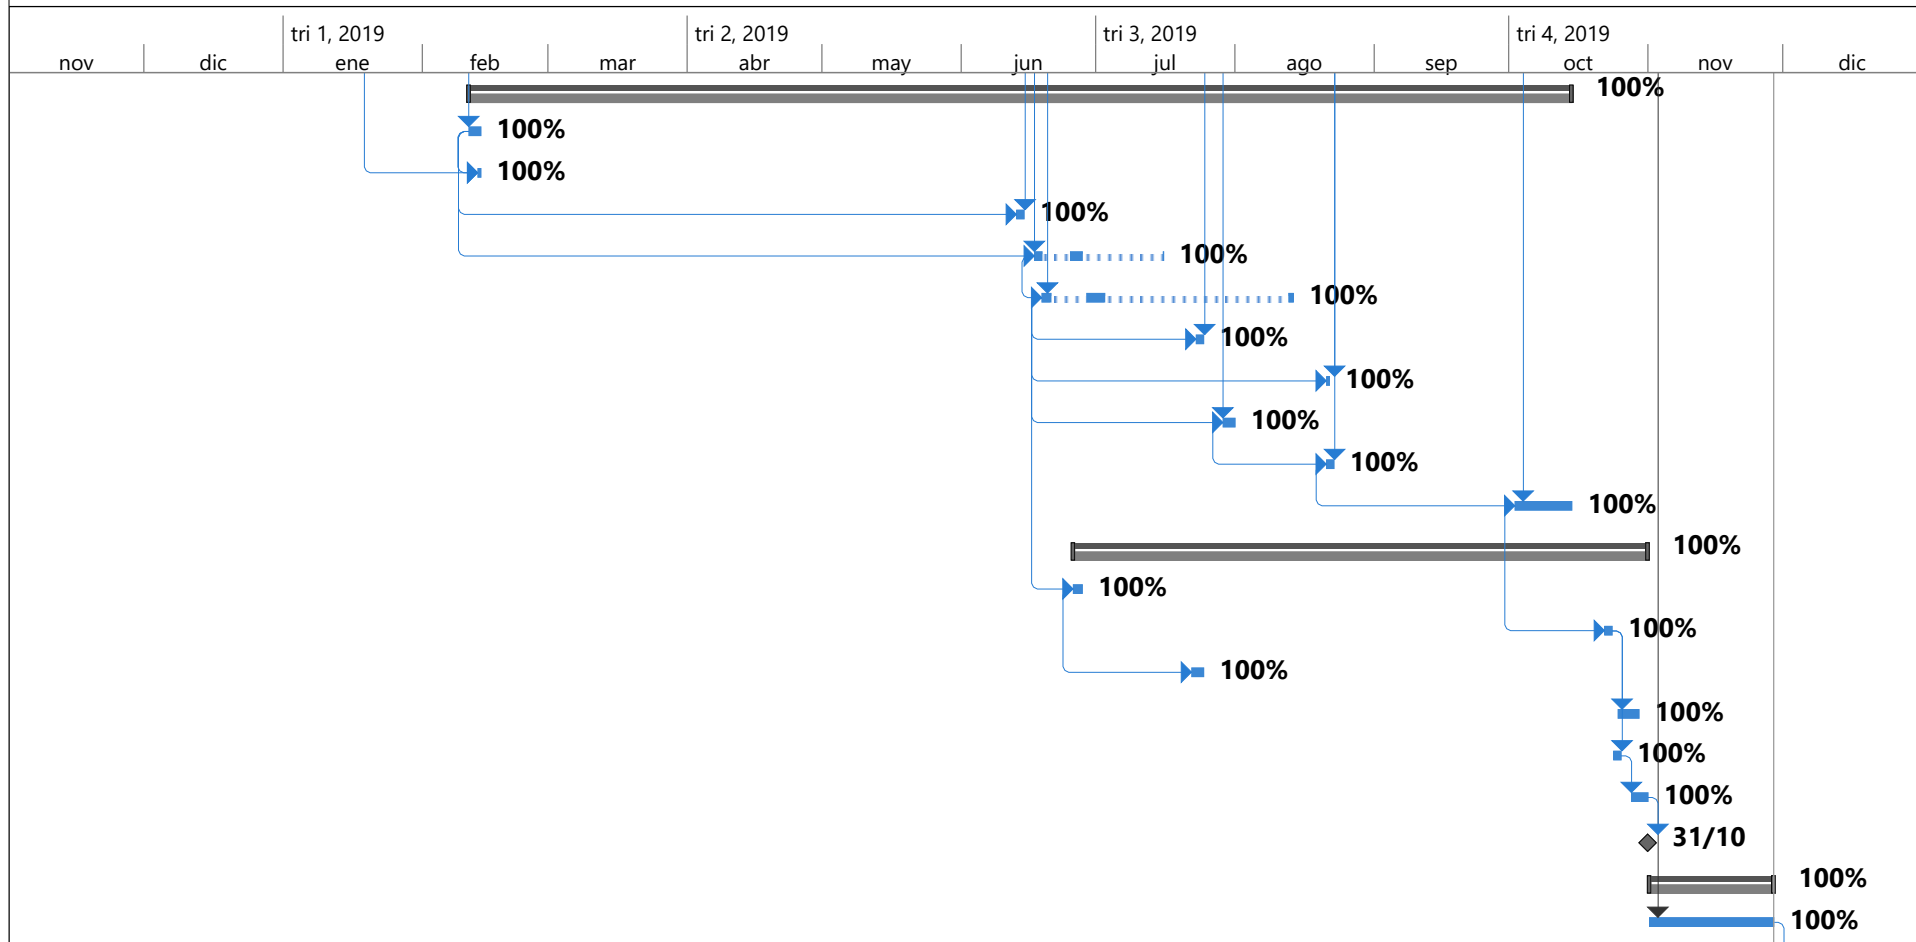

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ZFPP402 Junio 2021

nov	dic	tri 1, 2019 ene	feb	mar	tri 2, 2019 abr	may	jun	tri 3, 2019 jul	ago	sep	tri 4, 2019 oct	nov	dic
													28/11



Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión


Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
























Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
