


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración    | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                         |             | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |  |
| 1  |                                                                                   |  | Rehabilitación de Redes CANA102         | 245.13 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 2  |  |  | Adjudicación                            | 0 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 3  |                                                                                   |  | Periodo de Adquisiciones                | 80 días     |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 28 |                                                                                   |  | Ejecución                               | 221 días    |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 29 |                                                                                   |  | Polígono 1                              | 99 días     |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 30 |                                                                                   |  | Instalación                             | 99 días     |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 31 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 3 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 32 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 4 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 33 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 4 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 34 |                                                                                   |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 11 días     |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 35 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 5 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 36 |                                                                                   |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 5 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 37 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 4 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 38 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 4 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 39 |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                       | 7 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 40 |  |  | Normalización Suministros               | 9 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 41 |                                                                                   |  | Remoción                                | 26 días     |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 42 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 8 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 43 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 6 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 44 |  |  | Armados de Media Tensión                | 4 días      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Duración | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                        |          |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J |  |  |
| 45 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 46 |                                                                                   |  | Transformadores                        | 8 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 47 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 7 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 48 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 1                   | 0 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 49 |                                                                                   |  | Polígono 2                             | 100 días |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 50 |                                                                                   |  | Instalación                            | 94 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 51 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 5 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 52 |                                                                                   |  | Cimentaciones                          | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 53 |                                                                                   |  | Retenidas                              | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 54 |                                                                                   |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 11 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 55 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tens | 9 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 56 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 10 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 57 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                   | 5 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 58 |                                                                                   |  | Transformadores                        | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 59 |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                      | 14 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 60 |                                                                                   |  | Normalización Suministros              | 7 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 61 |                                                                                   |  | Remoción                               | 16 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 62 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 12 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 63 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 11 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 64 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión               | 3 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Duración | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                        |          | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |  |
| 65 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 4 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 66 |                                                                                   |  | Transformadores                        | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 67 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 68 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 2                   | 0 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 69 |                                                                                   |  | Polígono 3                             | 142 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 70 |                                                                                   |  | Instalación                            | 142 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 71 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 5 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 72 |                                                                                   |  | Cimentaciones                          | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 73 |                                                                                   |  | Retenidas                              | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 74 |                                                                                   |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 9 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 75 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten: | 10 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 76 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 77 |  |  | Conexiones y Jumpers                   | 5 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 78 |  |  | Transformadores                        | 4 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 79 |  |  | Alumbrado Publico                      | 8 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 80 |                                                                                   |  | Normalización Suministros              | 15 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 81 |                                                                                   |  | Remoción                               | 44 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 82 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 13 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 83 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 12 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 84 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión               | 8 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Duración | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                        |          | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |  |
| 85  |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                | 11 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 86  |  |  | Transformadores                        | 11 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 87  |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 14 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 88  |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 3                   | 0 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 89  |                                                                                   |  | Polígono 4                             | 128 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 90  |                                                                                   |  | Instalación                            | 128 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 91  |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 7 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 92  |                                                                                   |  | Cimentaciones                          | 9 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 93  |                                                                                   |  | Retenidas                              | 7 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 94  |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 15 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 95  |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten: | 59 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 96  |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 97  |  |  | Conexiones y Jumpers                   | 9 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 98  |  |  | Transformadores                        | 9 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 99  |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                      | 13 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 100 |                                                                                   |  | Normalización Suministros              | 11 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 101 |                                                                                   |  | Remoción                               | 47 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 102 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 26 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 103 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 14 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 104 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión               | 3 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Duración        | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                        |                 | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |
| 105 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 4 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 106 |  |  | Transformadores                        | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 107 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 6 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 108 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 4                   | 0 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 109 |                                                                                   |  | <b>Polígono 5</b>                      | <b>171 días</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 110 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                     | <b>130 días</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 111 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 3 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 112 |                                                                                   |  | Cimentaciones                          | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 113 |                                                                                   |  | Retenidas                              | 3 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 114 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 12 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 115 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten: | 6 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 116 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 4 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 117 |  |  | Conexiones y Jumpers                   | 4 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 118 |  |  | Transformadores                        | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 119 |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                      | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 120 |                                                                                   |  | Normalización Suministros              | 20 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 121 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                        | <b>69 días</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 122 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 8 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 123 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 8 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 124 |  |  | Armados de Media Tensión               | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Duración        | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                        |                 | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |
| 125 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 7 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 126 |  |  | Transformadores                        | 10 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 127 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 9 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 128 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 5                   | 0 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 129 |                                                                                   |  | <b>Polígono 6</b>                      | <b>159 días</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 130 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                     | <b>152 días</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 131 |                                                                                   |  | Izado de postes                        | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 132 |                                                                                   |  | Cimentaciones                          | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 133 |                                                                                   |  | Retenidas                              | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 134 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 15 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 135 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten: | 12 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 136 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 6 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 137 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                   | 6 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 138 |  |  | Transformadores                        | 6 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 139 |  |  | Alumbrado Publico                      | 8 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 140 |                                                                                   |  | Normalización Suministros              | 8 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 141 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                        | <b>61 días</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 142 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 12 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 143 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 5 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 144 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión               | 10 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración        | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |
| 145 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 14 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 146 |  |  | Transformadores                         | 10 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 147 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 18 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 148 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 6                    | 0 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 149 |                                                                                   |  | <b>Polígono 7</b>                       | <b>162 días</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 150 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                      | <b>162 días</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 151 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 8 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 152 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 9 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 153 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 9 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 154 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 27 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 155 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 16 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 156 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 12 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 157 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                    | 9 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 158 |  |  | Transformadores                         | 6 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 159 |  |  | Alumbrado Publico                       | 16 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 160 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 8 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 161 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                         | <b>32 días</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 162 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 17 días         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 163 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 7 días          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |
| 164 |  |  | Armados de Media Tensión                | 1 día           |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración        | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J |  |  |
| 165 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                 | 2 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 166 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 1 día           |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 167 |  |  | Izado de postes                         | 2 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 168 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 7                    | 0 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 169 |                                                                                   |  | <b>Polígono 8</b>                       | <b>185 días</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 170 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                      | <b>185 días</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 171 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 4 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 172 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 4 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 173 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 3 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 174 |                                                                                   |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 20 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 175 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 20 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 176 |                                                                                   |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 177 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 5 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 178 |  |  | Transformadores                         | 5 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 179 |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                       | 7 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 180 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 17 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 181 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                         | <b>40 días</b>  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 182 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 11 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 183 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 6 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 184 |  |  | Armados de Media Tensión                | 4 días          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |          |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J |  |  |
| 185 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                 | 5 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 186 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 3 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 187 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 188 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 8                    | 0 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 189 |                                                                                   |  | Polígono 9                              | 173 días |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 190 |                                                                                   |  | Instalación                             | 173 días |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 191 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 4 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 192 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 5 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 193 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 4 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 194 |                                                                                   |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 15 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 195 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 13 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 196 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 197 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                    | 3 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 198 |  |  | Transformadores                         | 5 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 199 |  |  | Alumbrado Publico                       | 8 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 200 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 11 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 201 |                                                                                   |  | Remoción                                | 26 días  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 202 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 203 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 4 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 204 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión                | 6 días   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |          | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J |  |
| 205 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 9 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 206 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 207 |  |  | Izado de postes                         | 12 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 208 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 9                    | 0 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 209 |  |  | Polígono 10                             | 162 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 210 |                                                                                   |  | Instalación                             | 145 días |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 211 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 7 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 212 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 9 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 213 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 7 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 214 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 14 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 215 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 16 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 216 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 217 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 4 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 218 |  |  | Transformadores                         | 3 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 219 |  |  | Alumbrado Publico                       | 8 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 220 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 10 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 221 |                                                                                   |  | Remoción                                | 50 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 222 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 18 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 223 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 10 días  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |
| 224 |  |  | Armados de Media Tensión                | 5 días   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea         | Duración       | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                         |                |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J |
| 225 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión | 8 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 226 |                                                                                   |  | Transformadores         | 5 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 227 |                                                                                   |  | Izado de postes         | 10 días        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 228 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 10   | 0 días         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 229 |  |  | <b>Cierre de Obras</b>  | <b>20 días</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

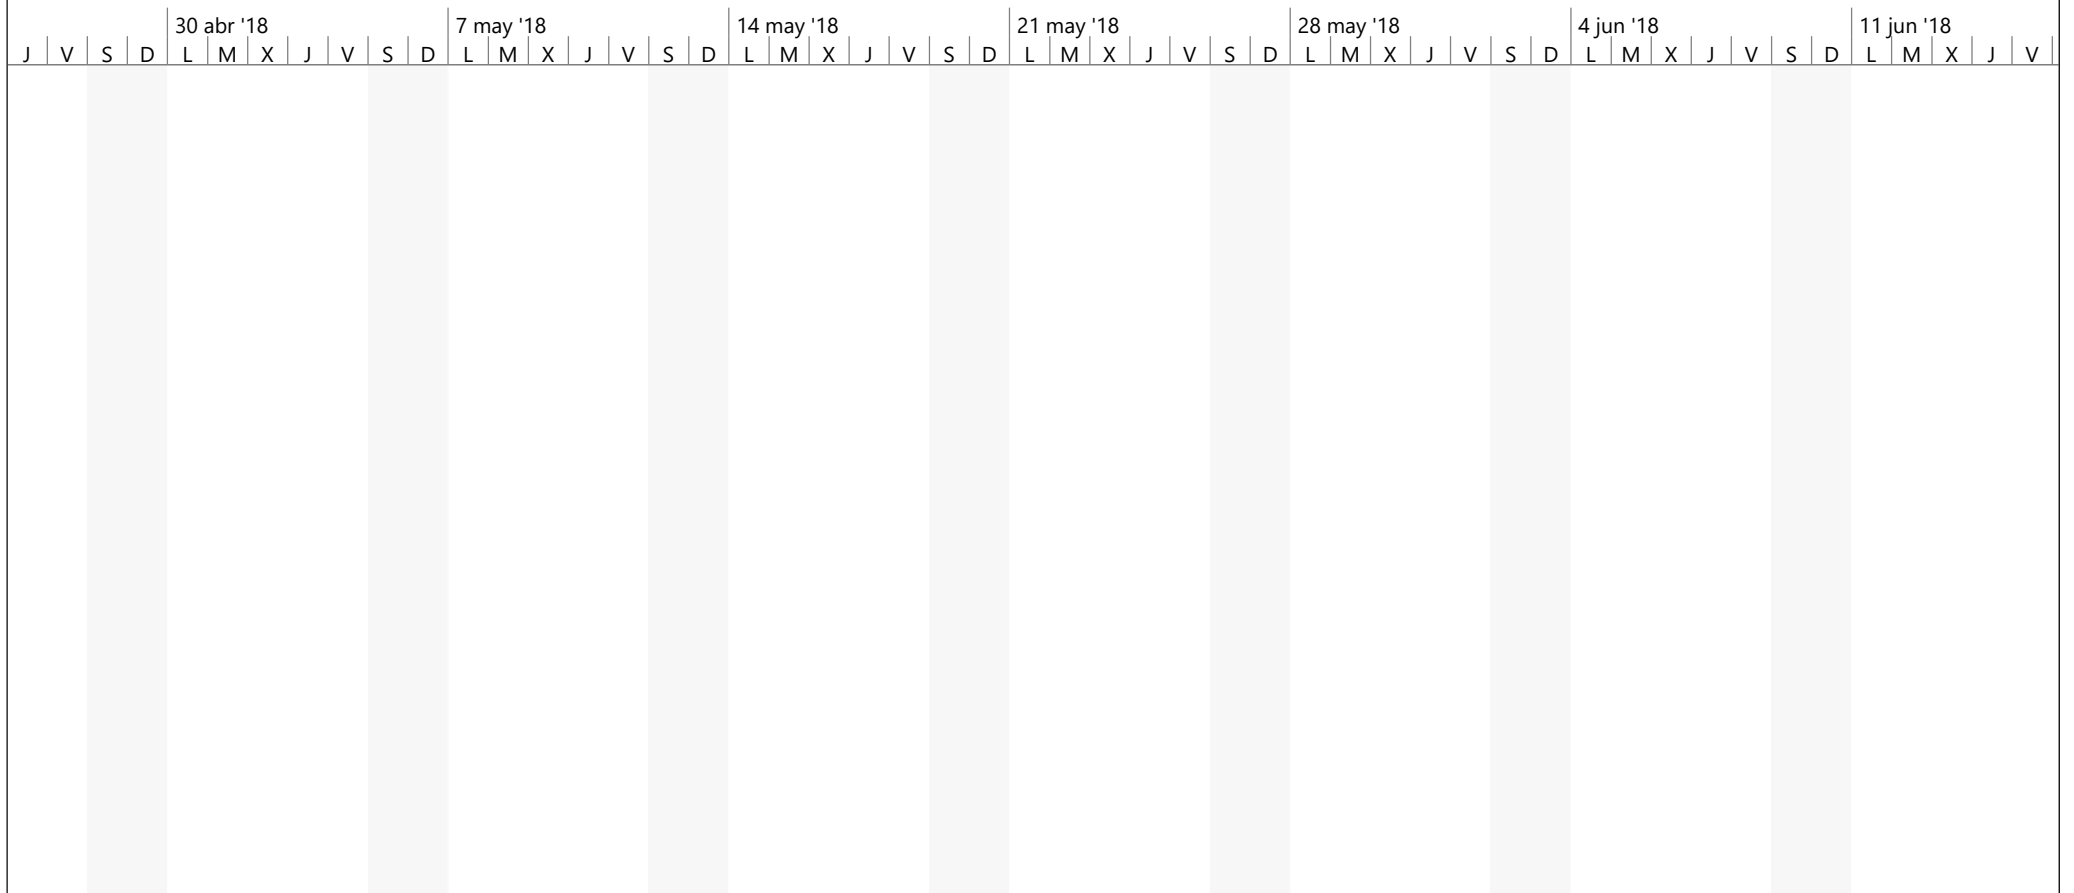


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

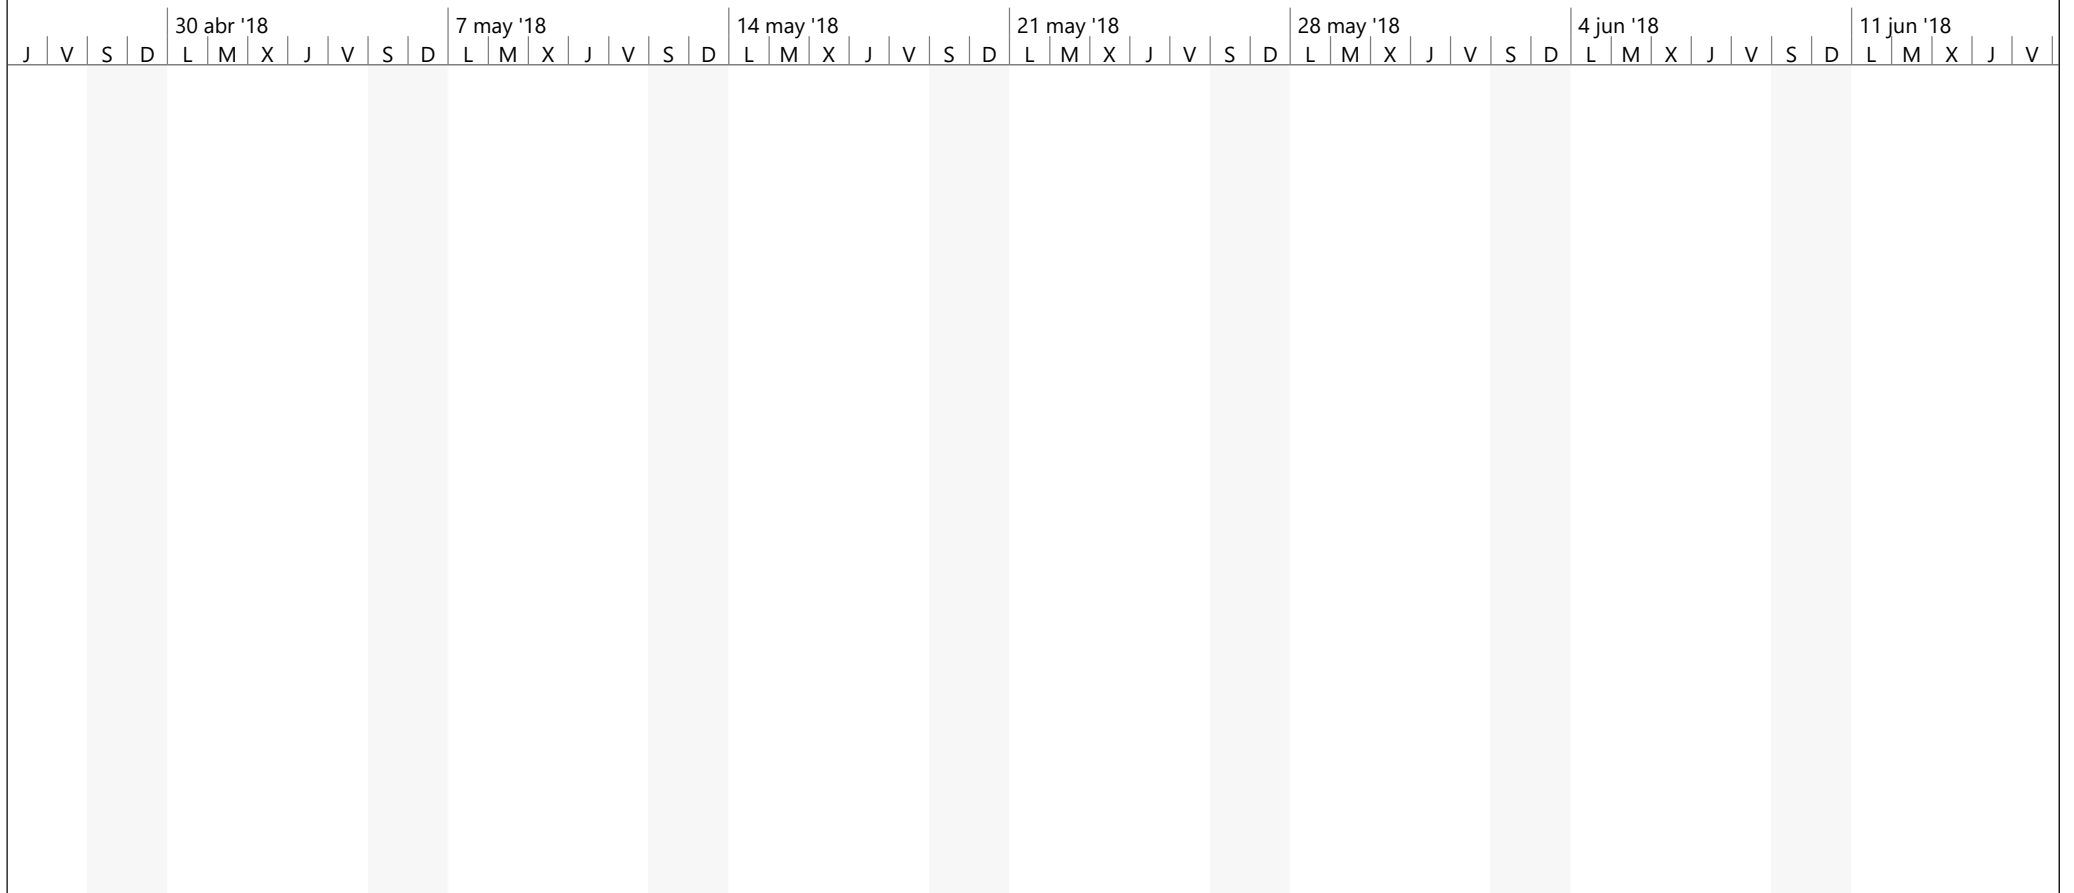


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

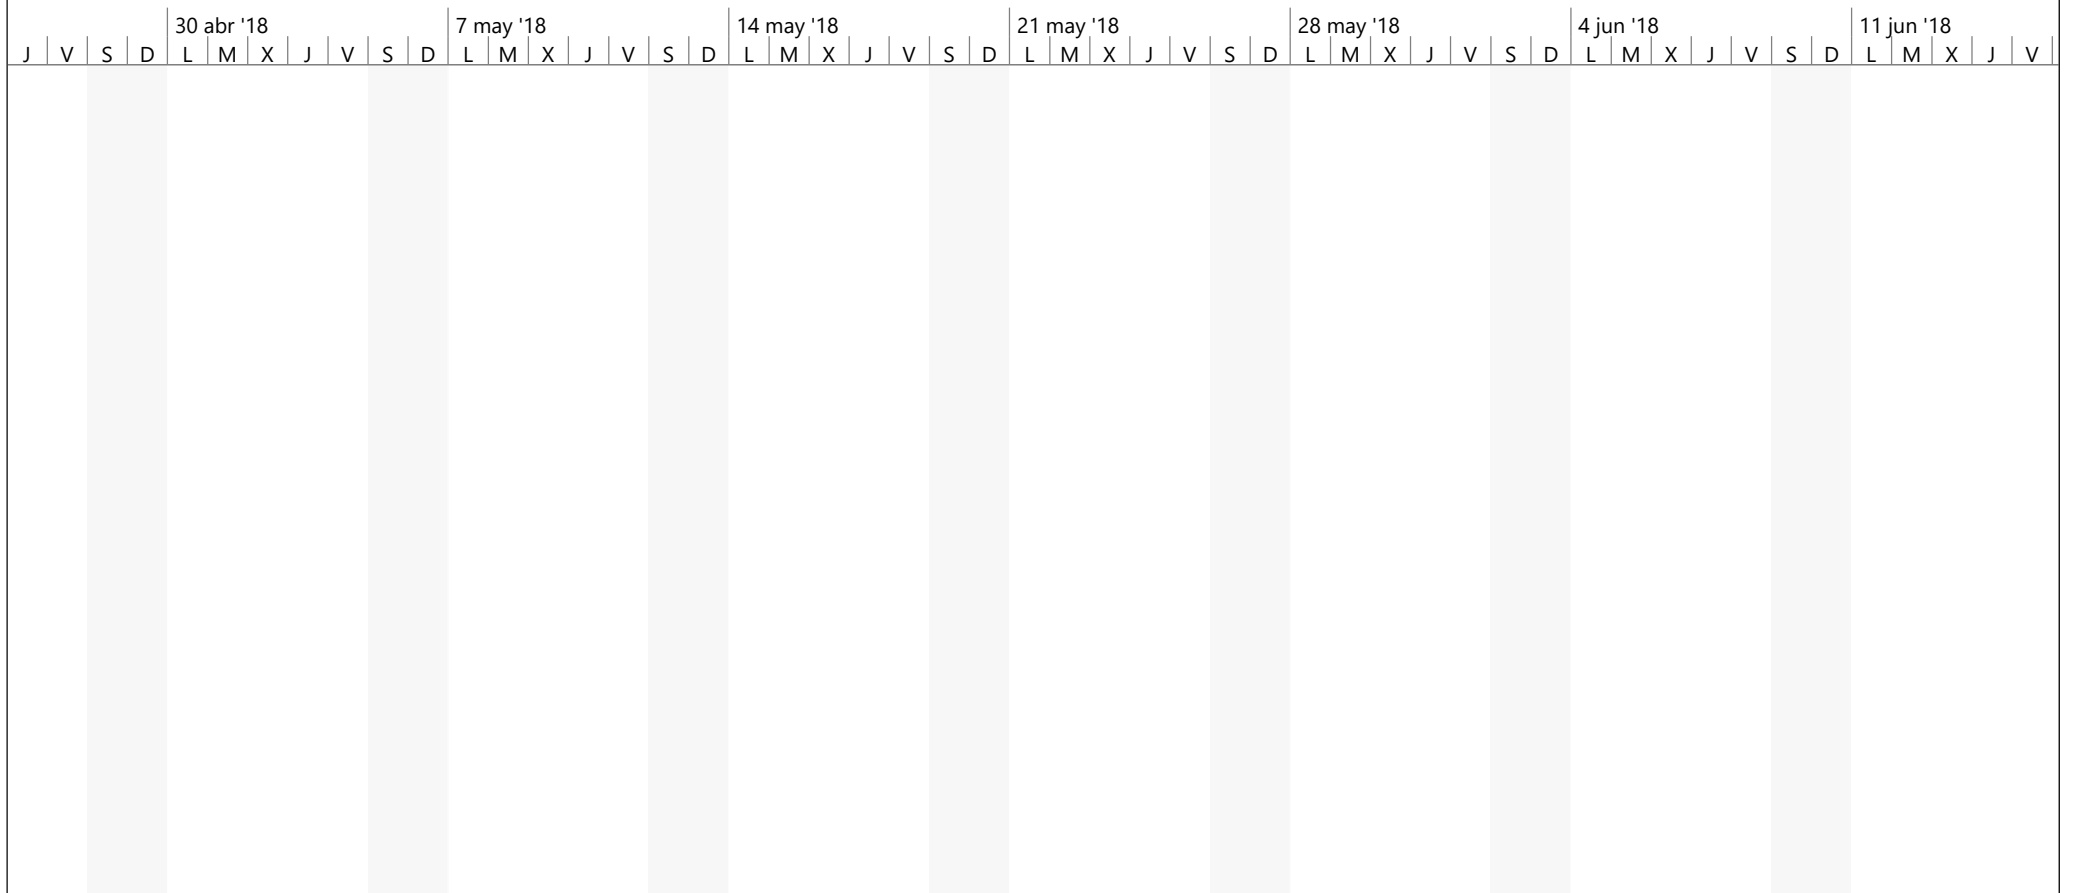


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

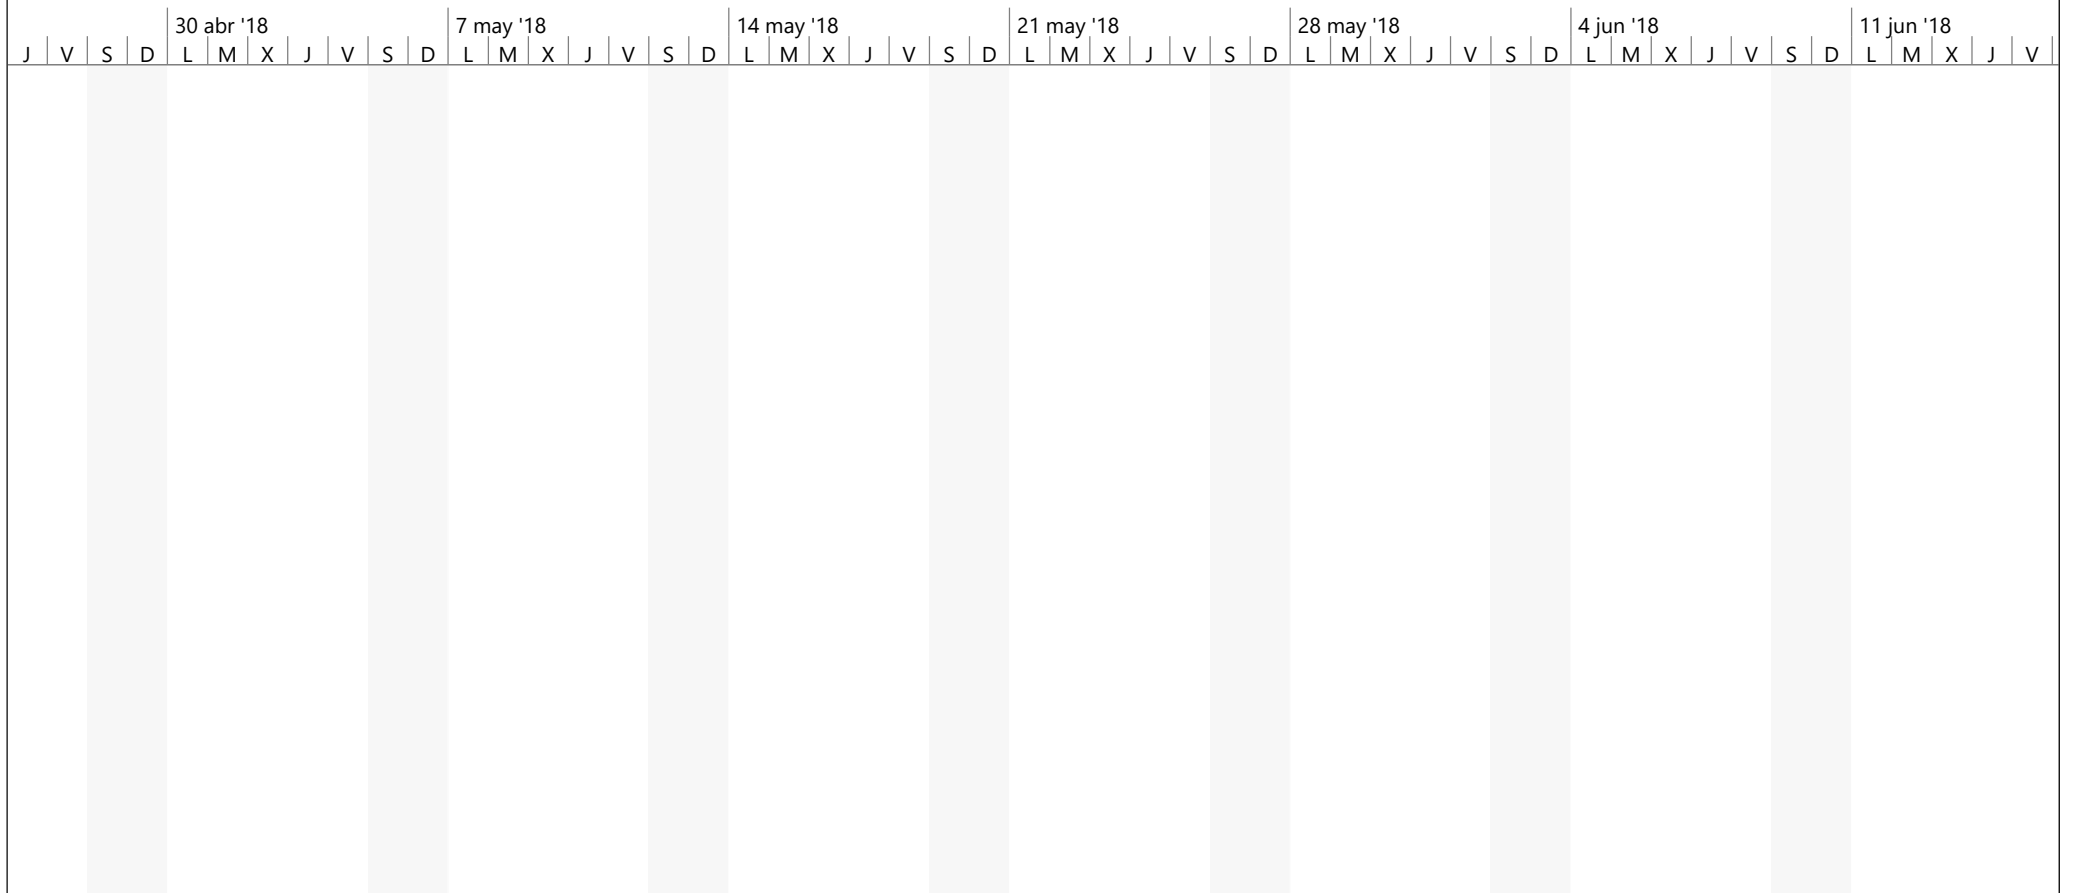

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

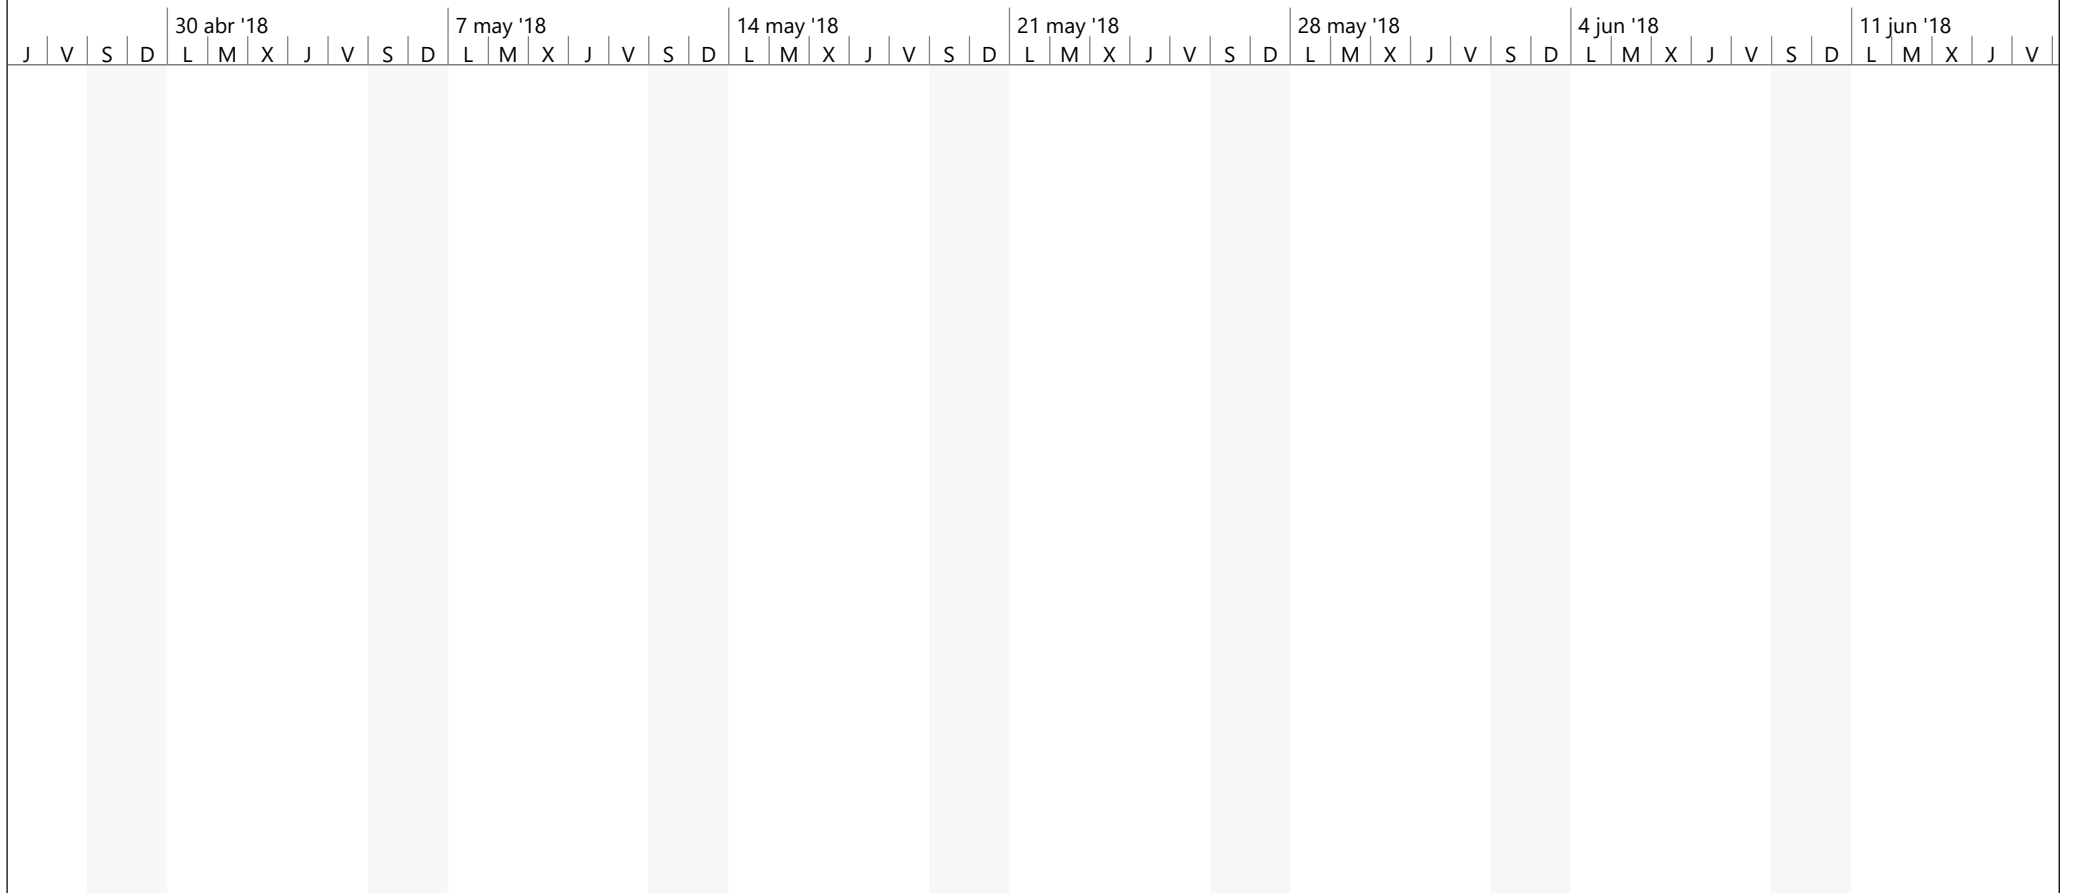

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

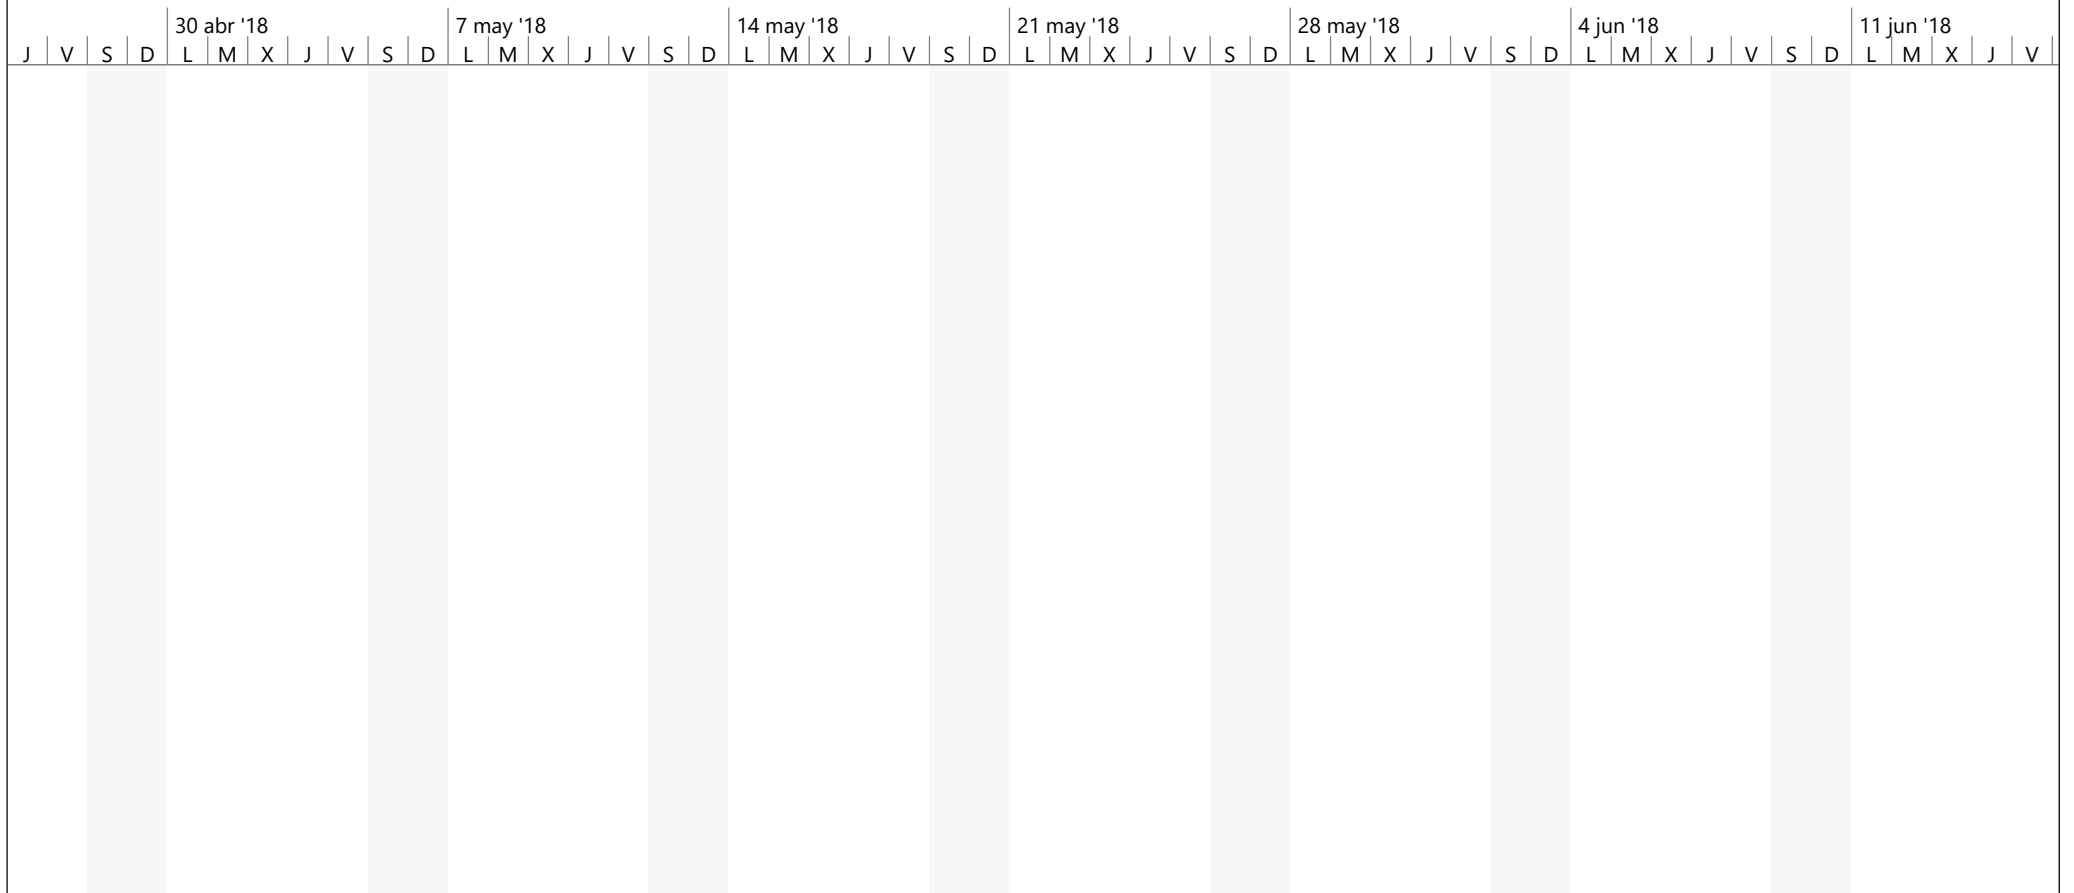


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

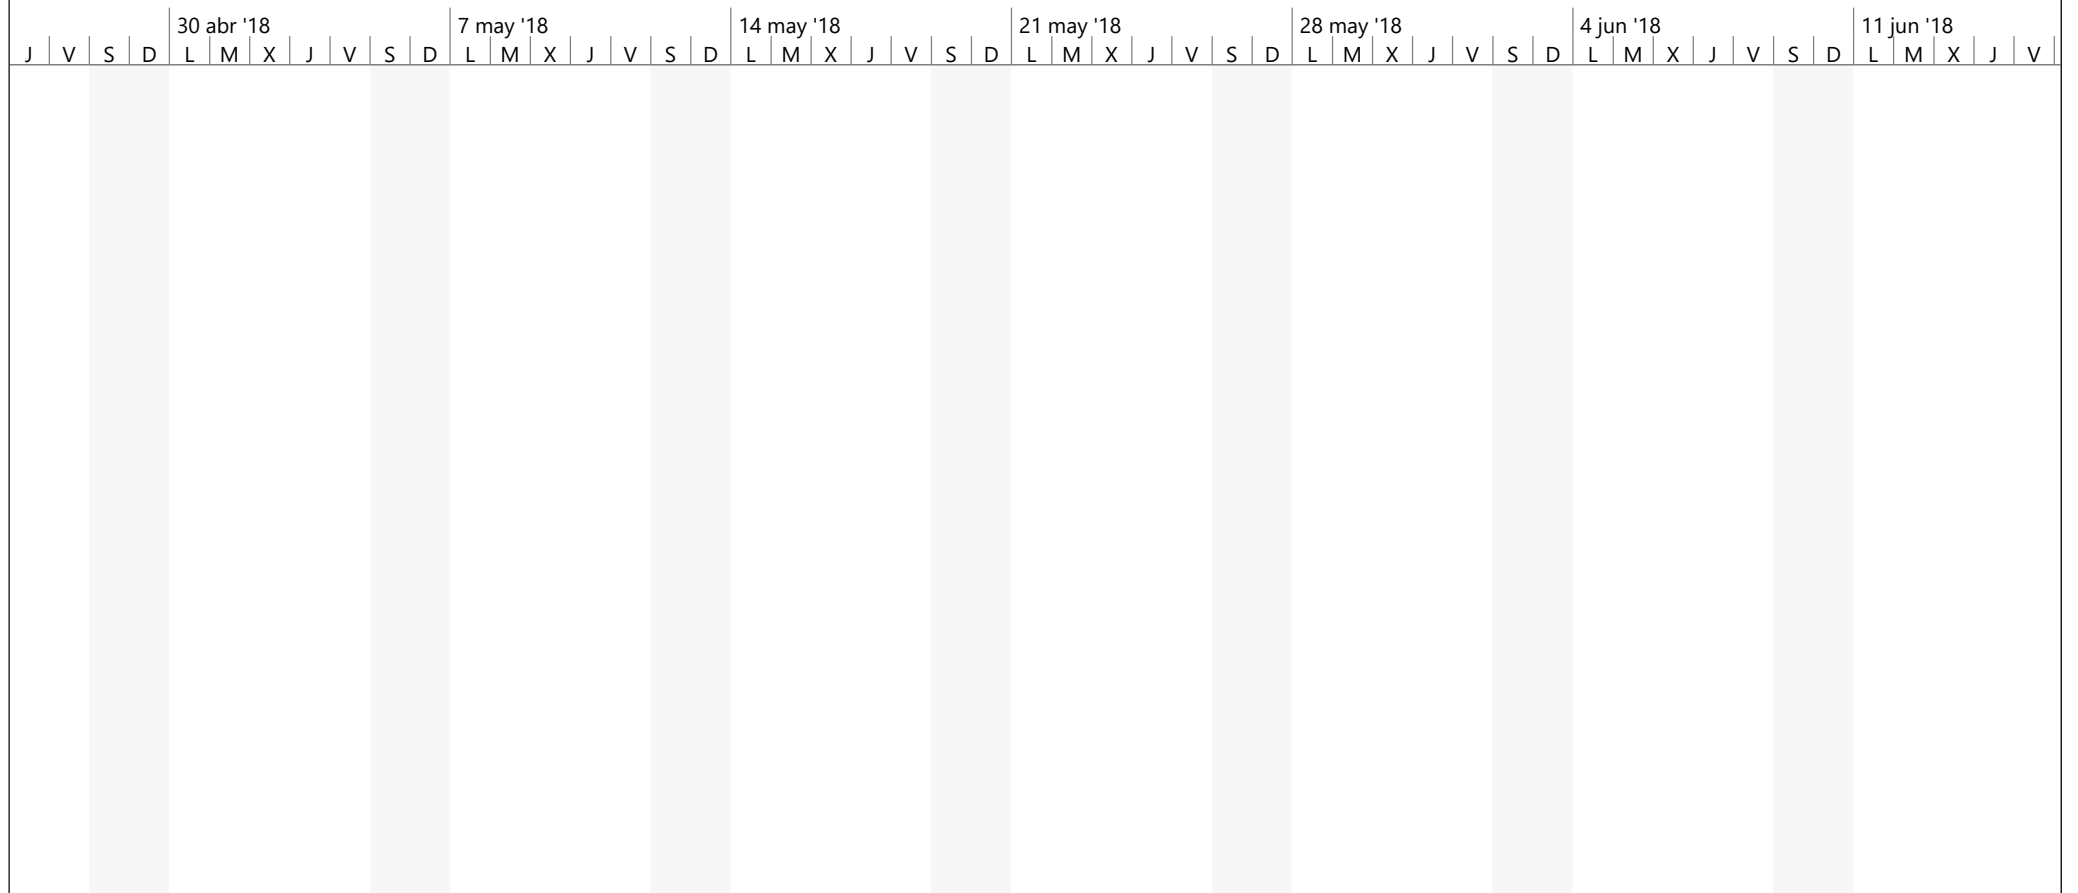


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

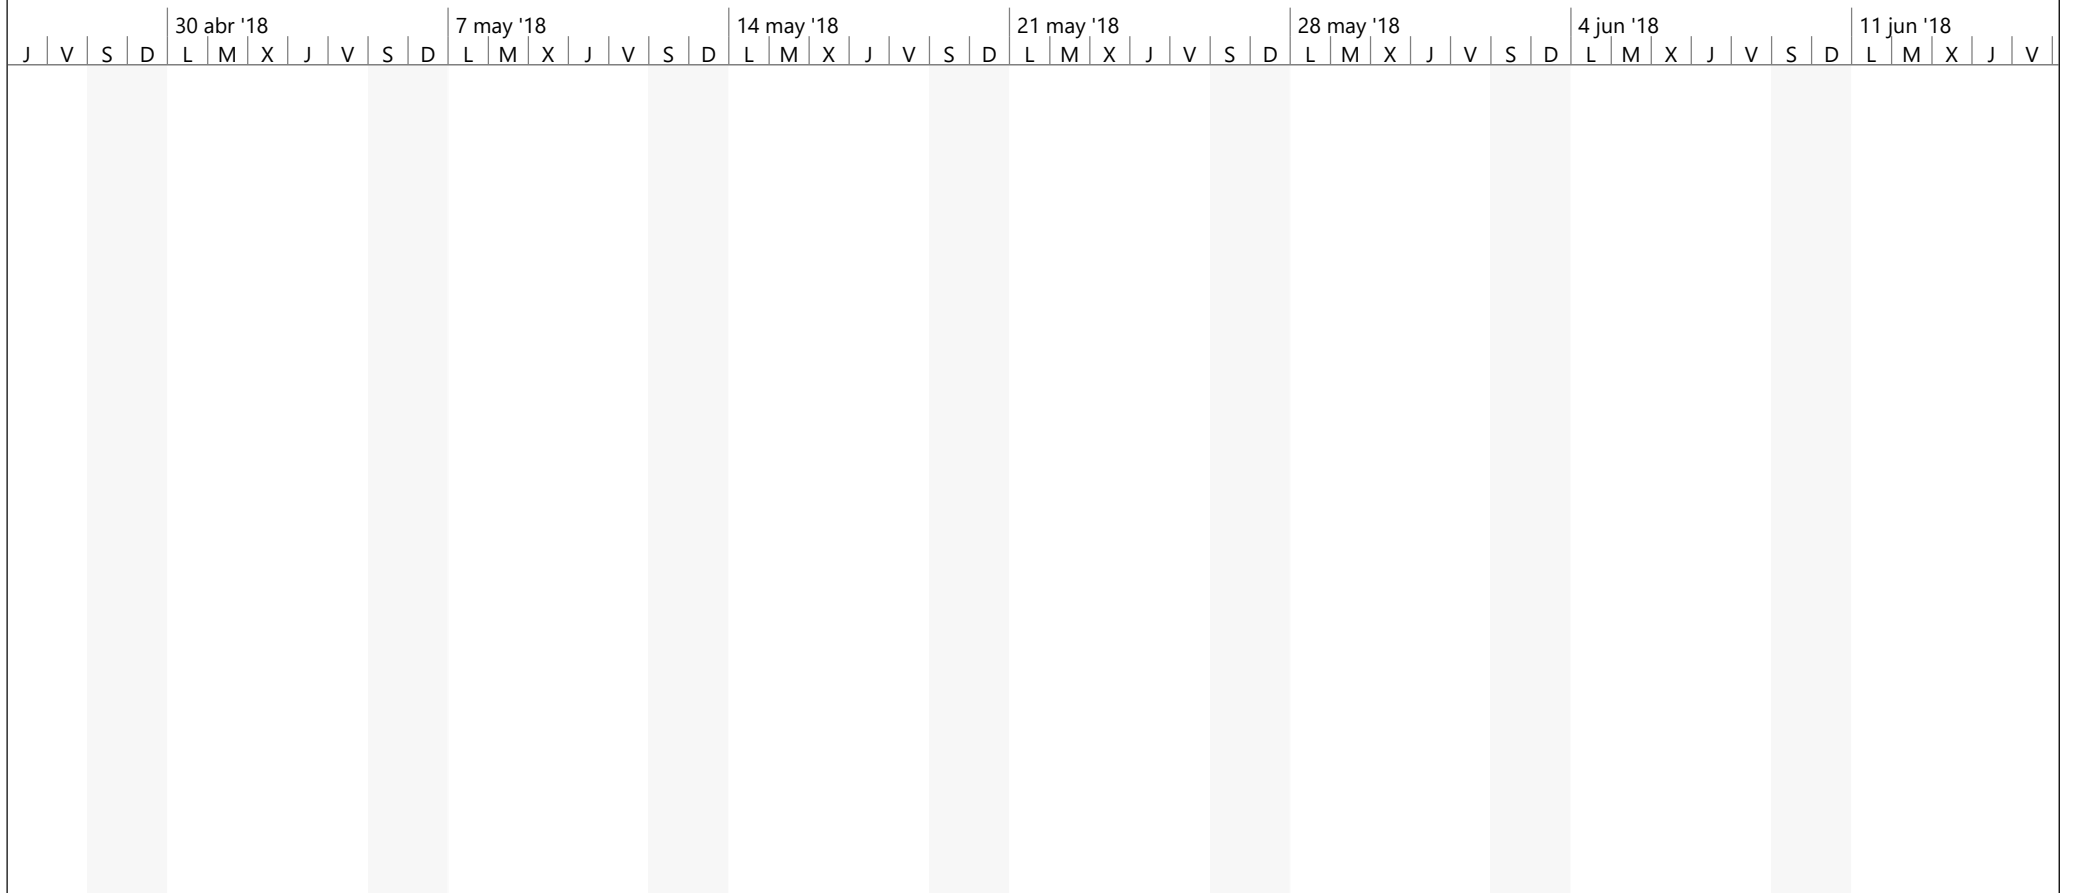


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

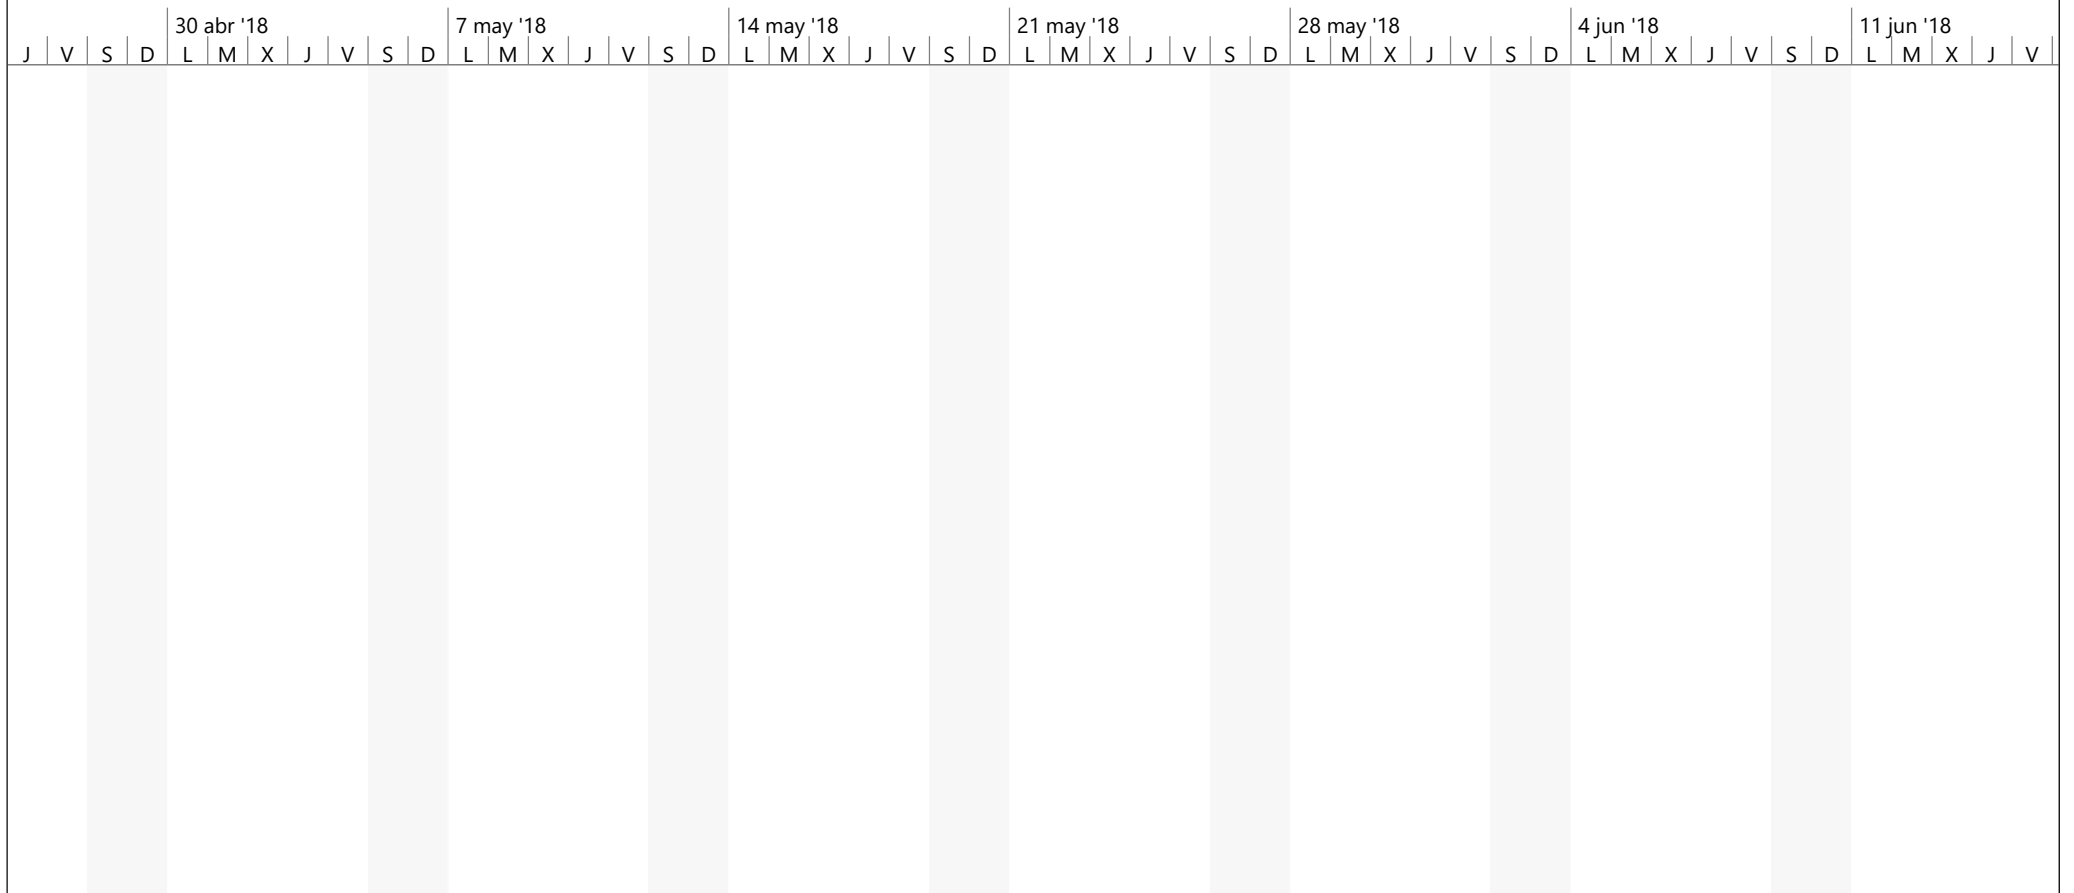

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

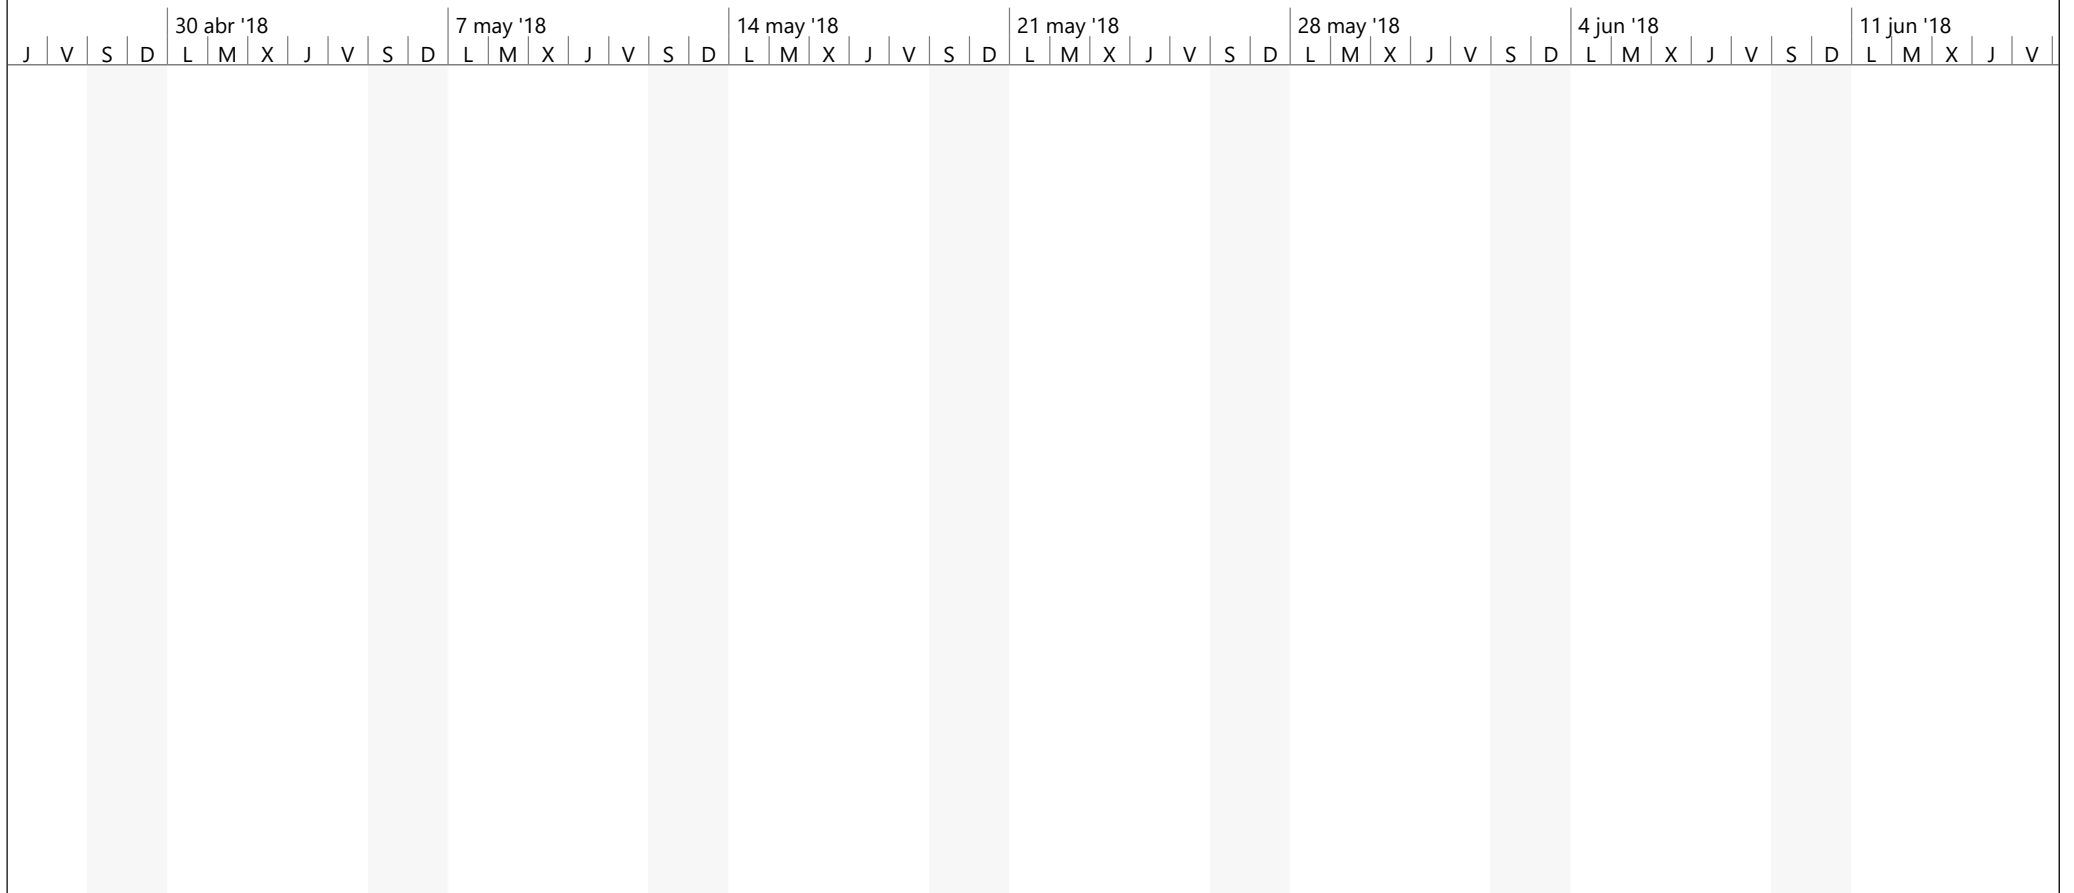

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|   |   |   |   | 30 abr '18 |   |   |   | 7 may '18 |   |   |   | 14 may '18 |   |   |   | 21 may '18 |   |   |   | 28 may '18 |   |   |   | 4 jun '18 |   |   |   | 11 jun '18 |   |   |   |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V         | S | D | L | M          | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D         | L | M | X | J          | V | S | D |
|   |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|   |   | 18 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 25 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 2 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 9 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 16 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 23 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 30 jul '18 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |
|   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

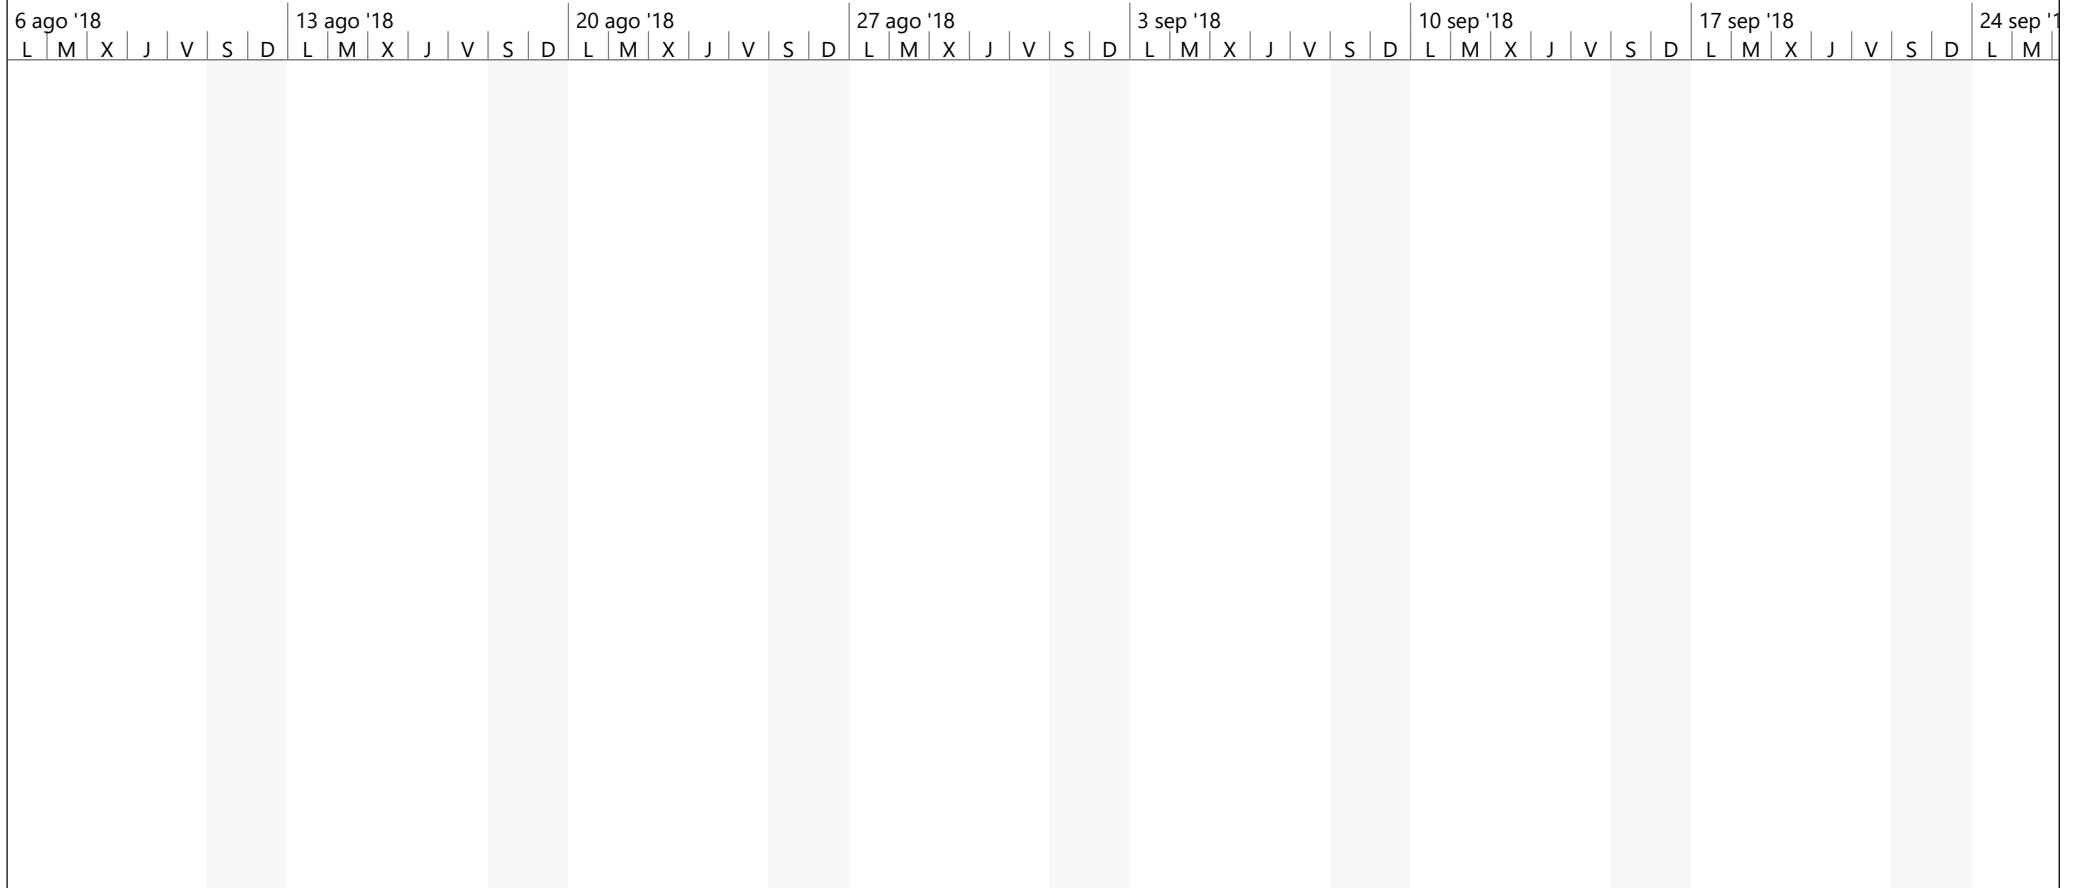

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

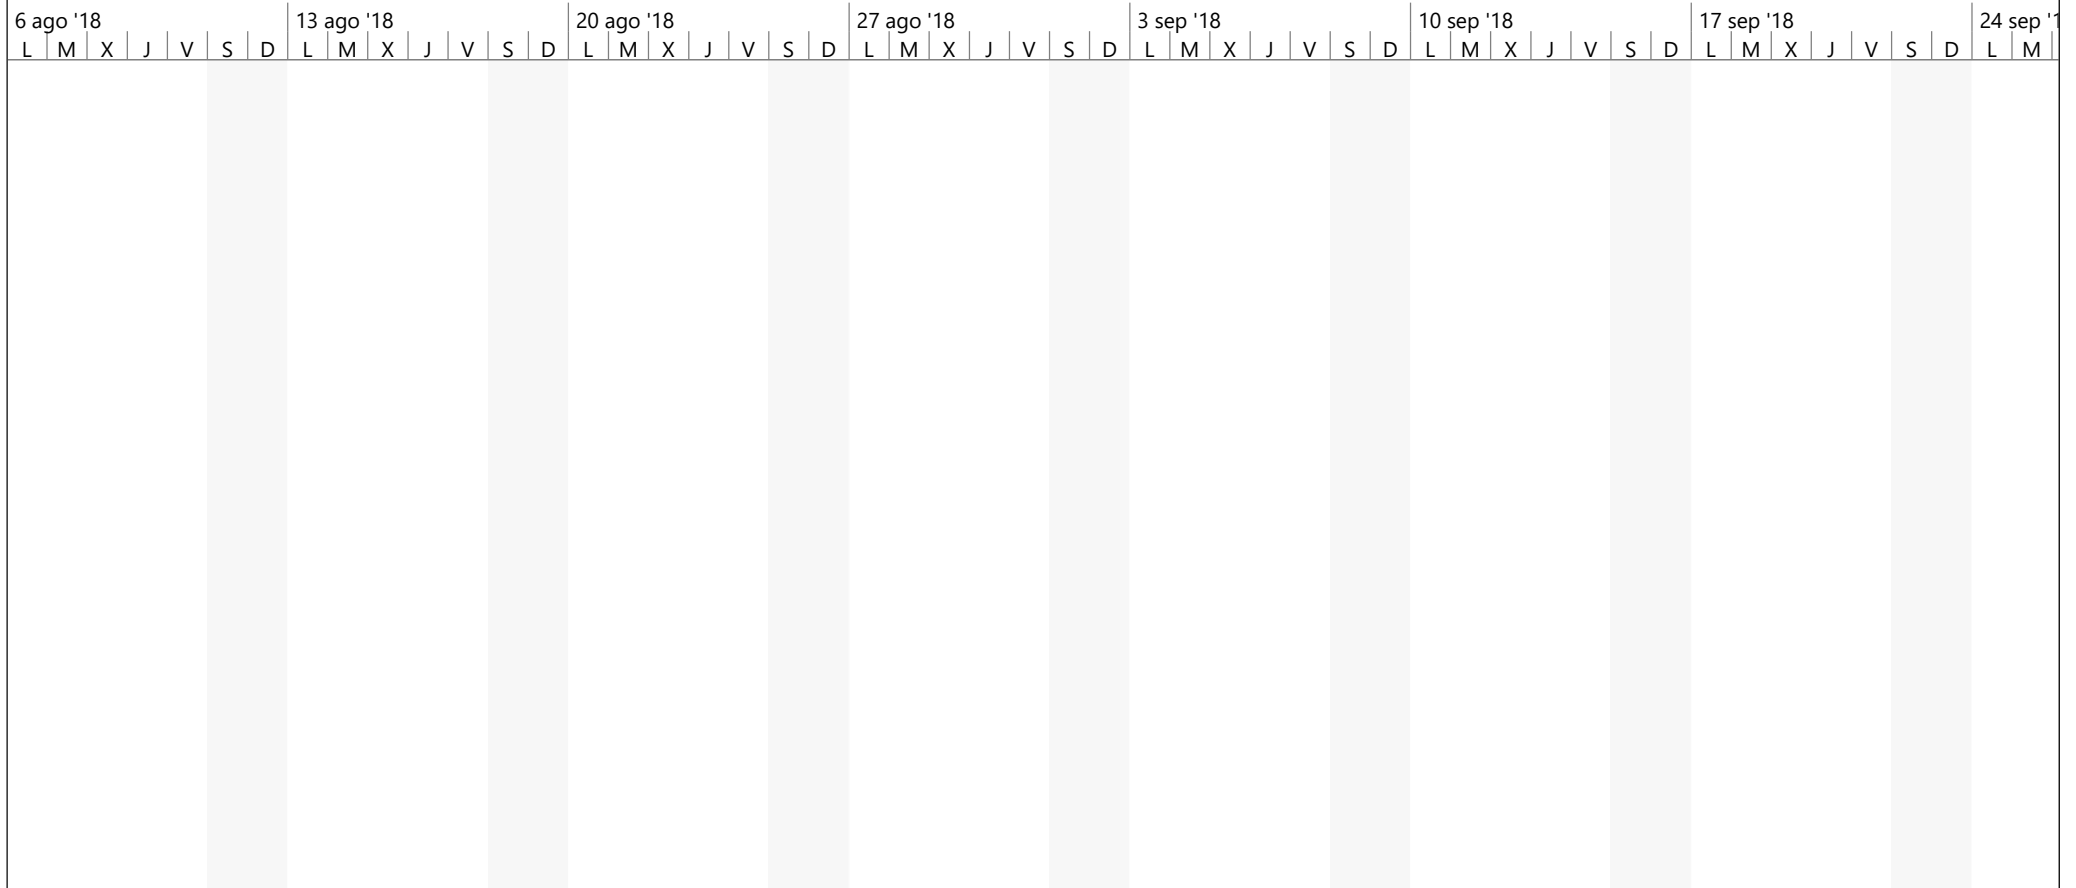

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

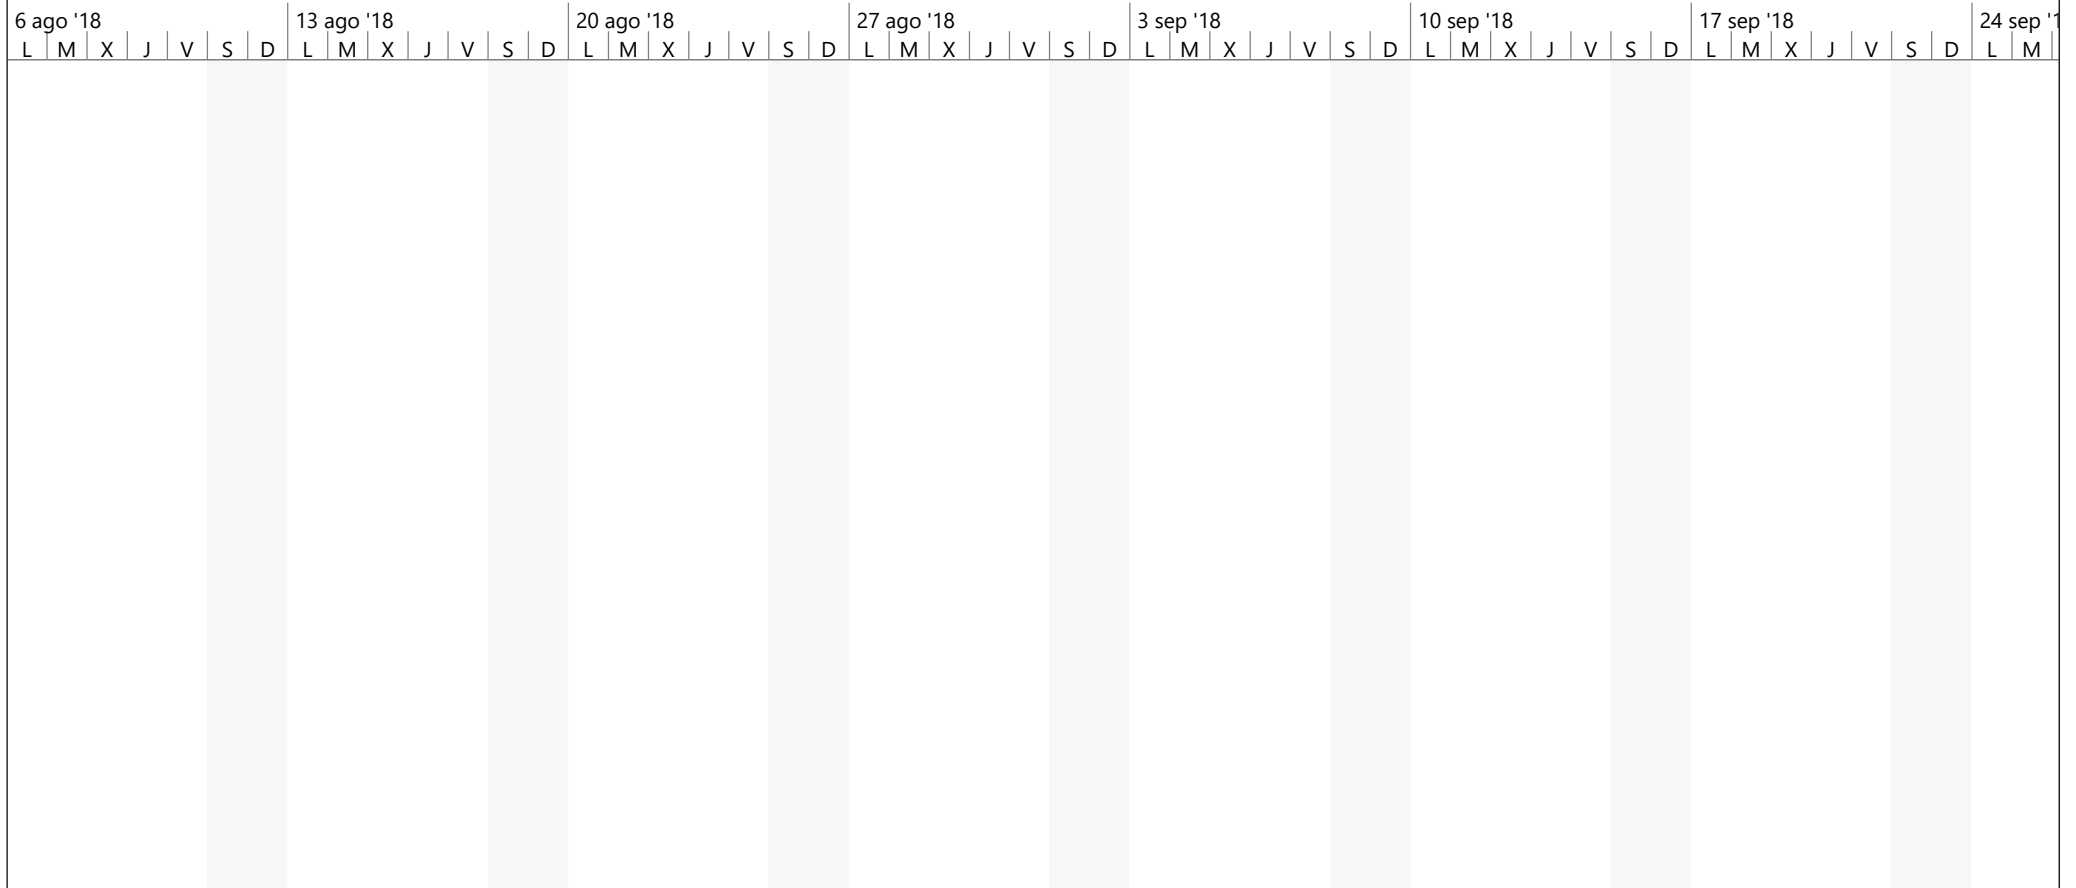

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

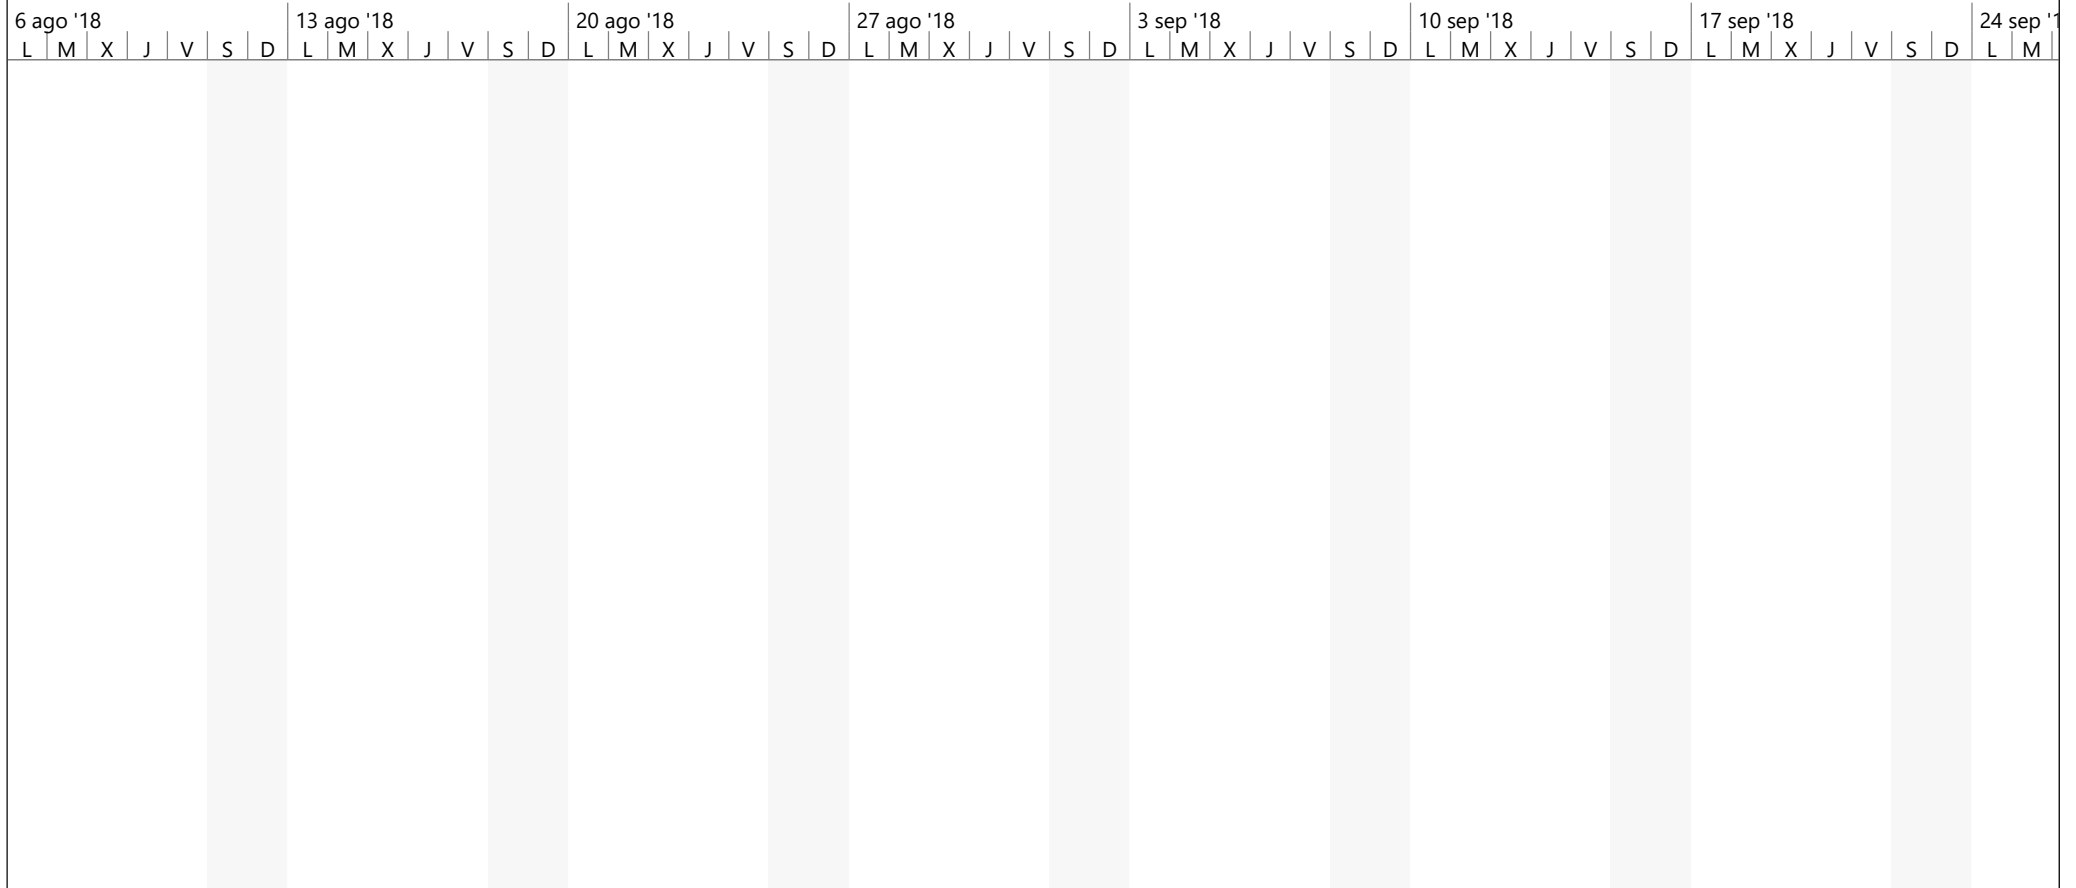


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

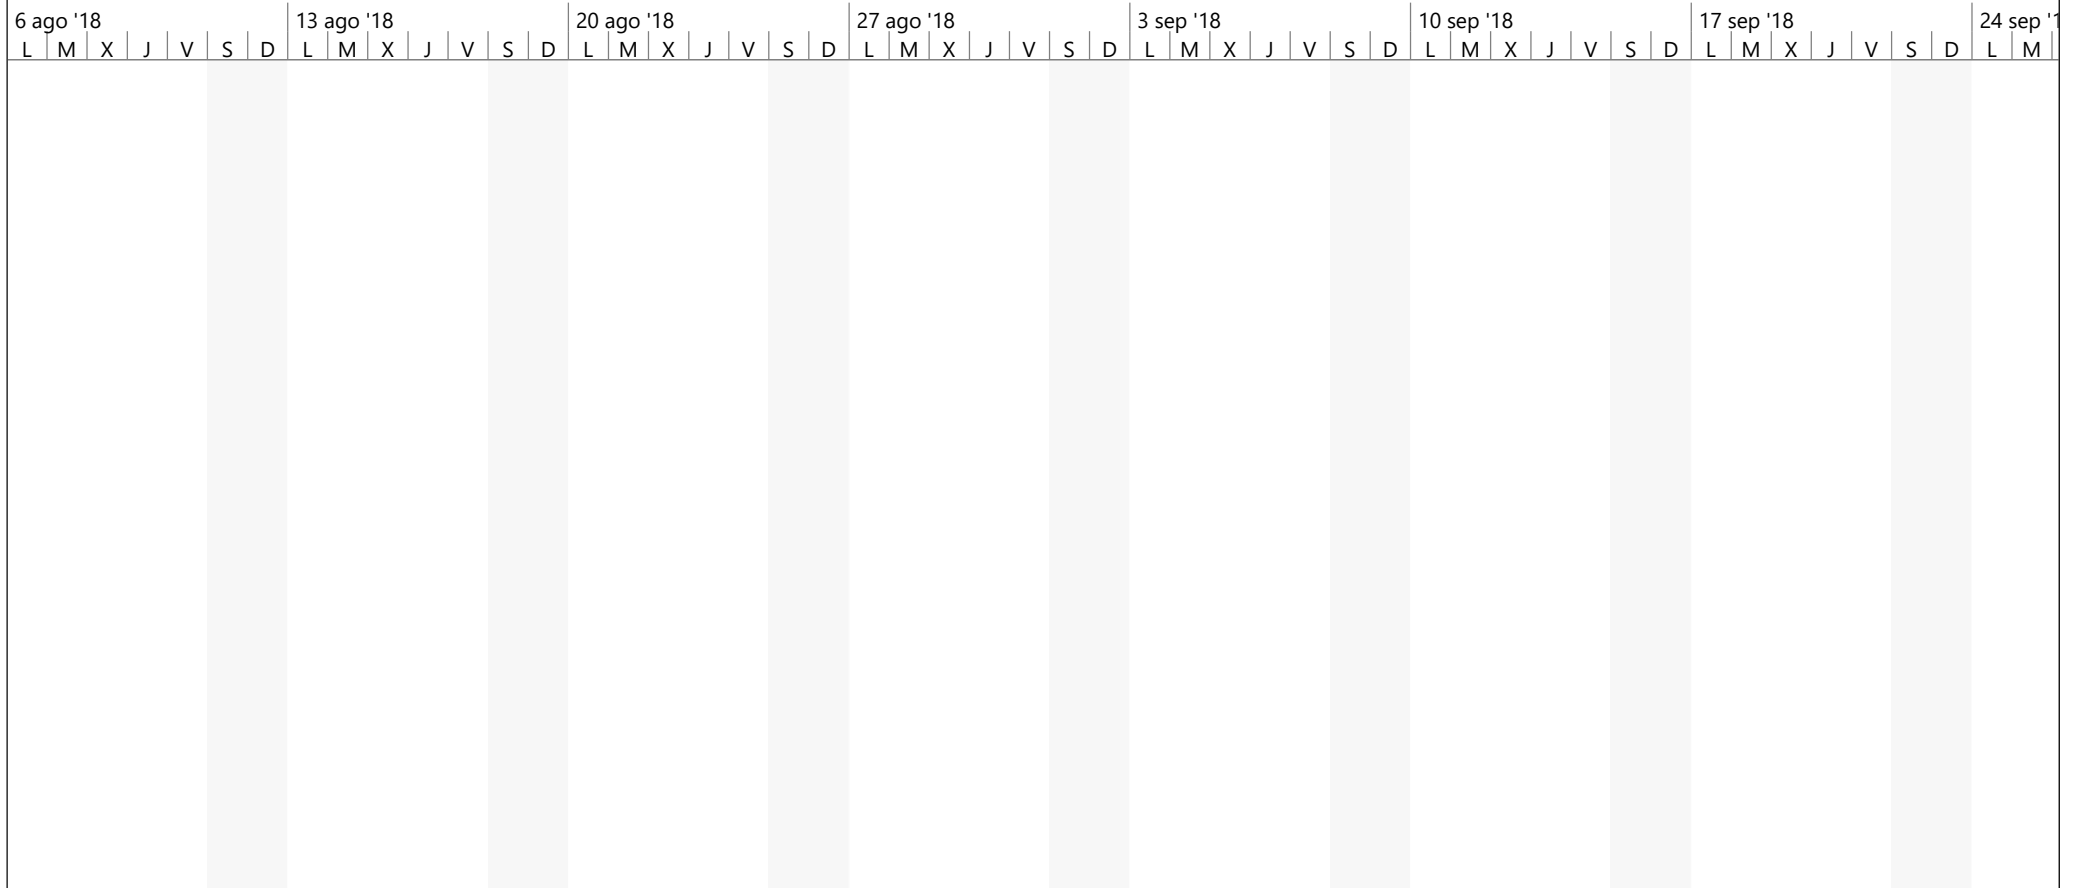

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

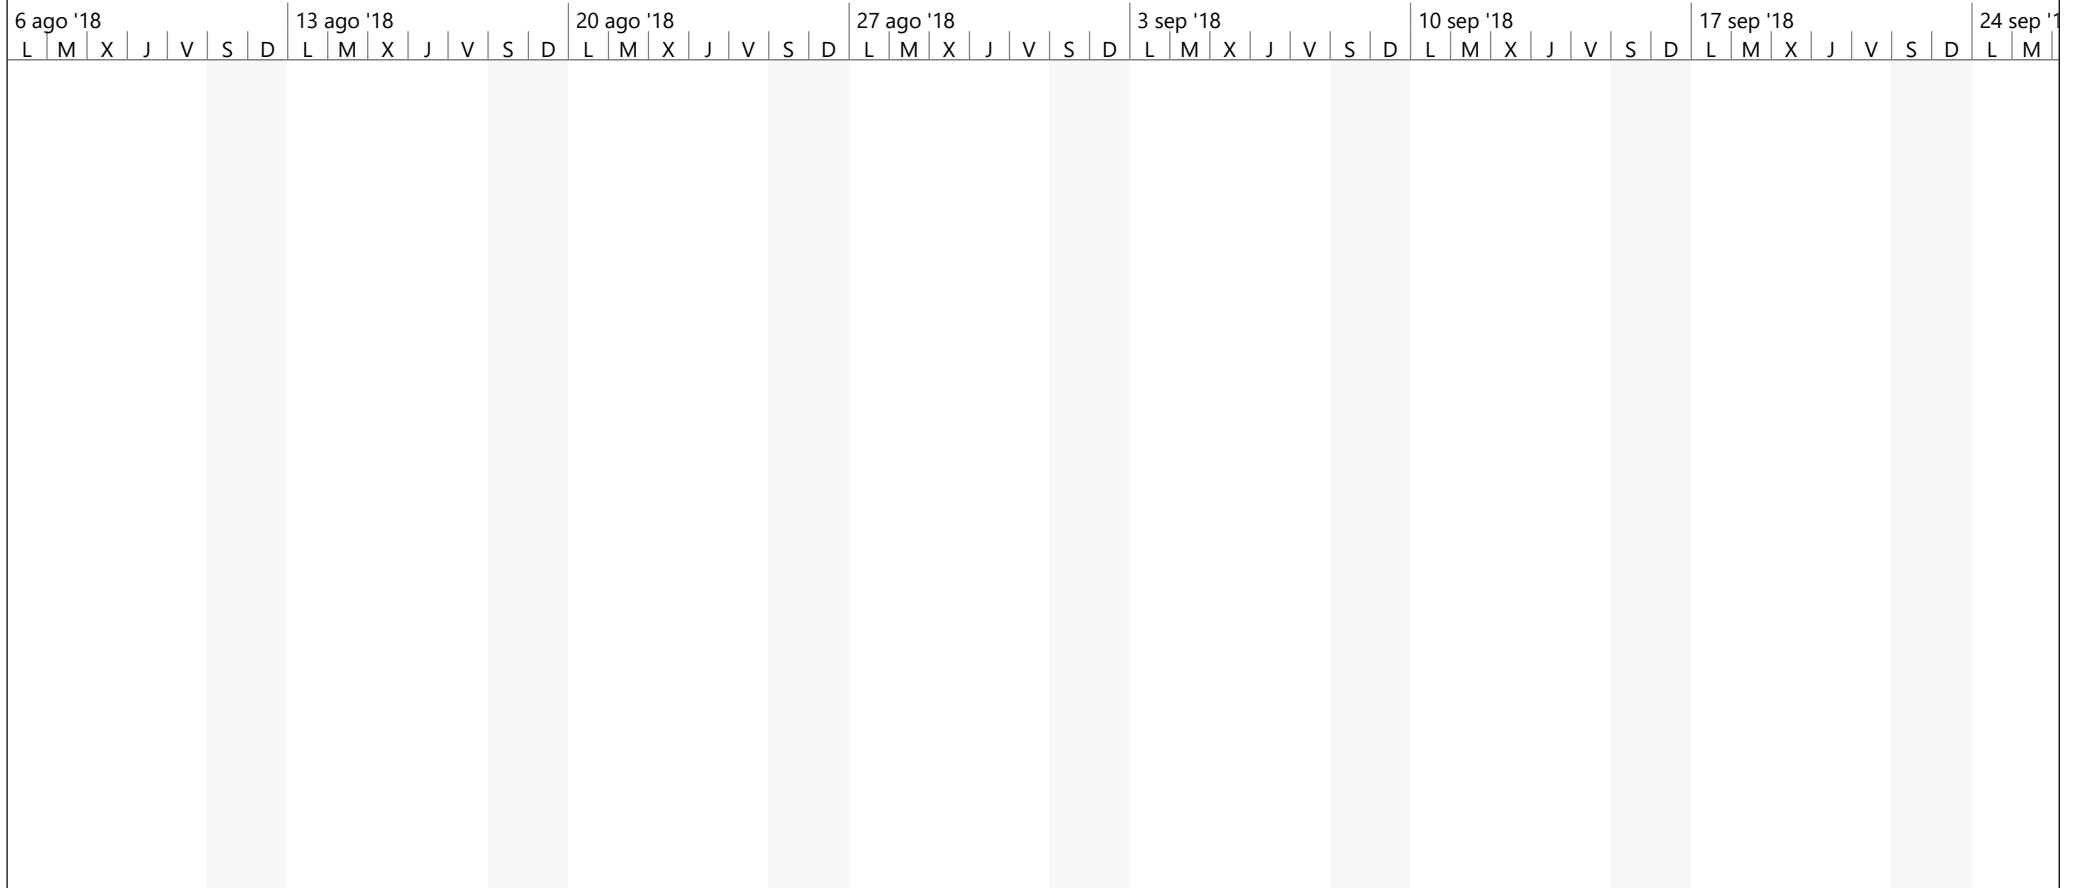

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

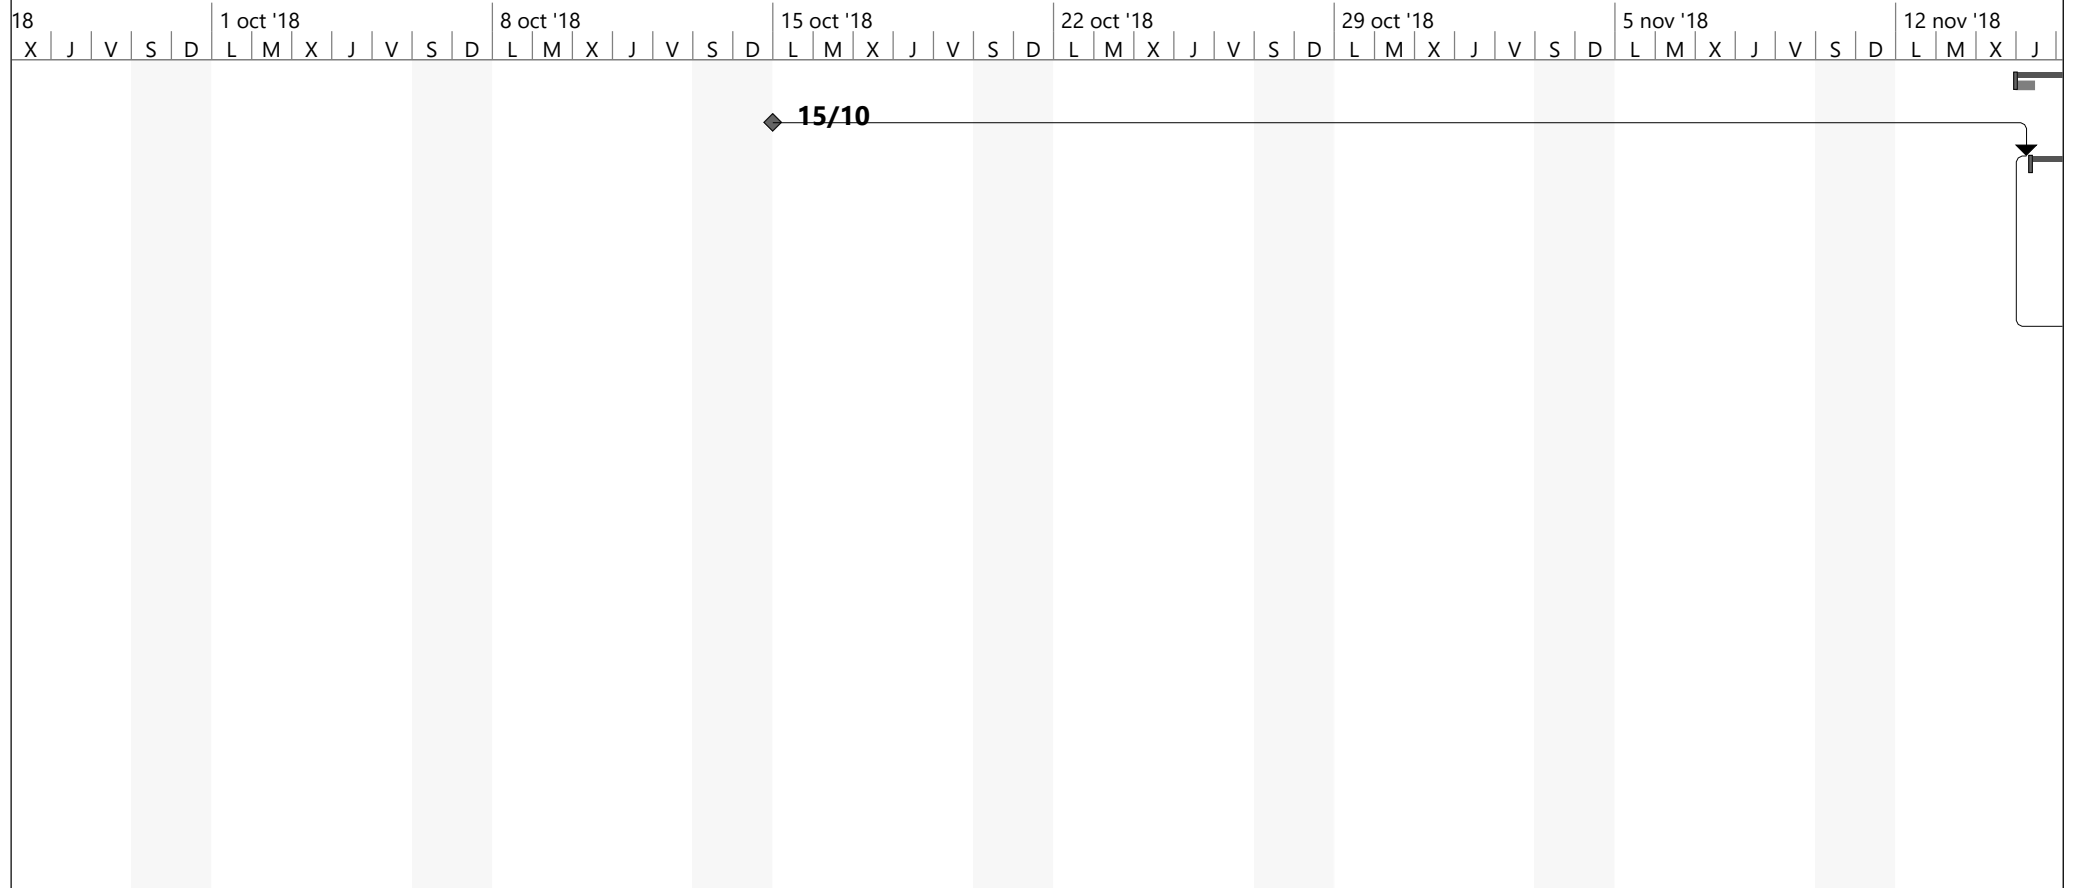

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp


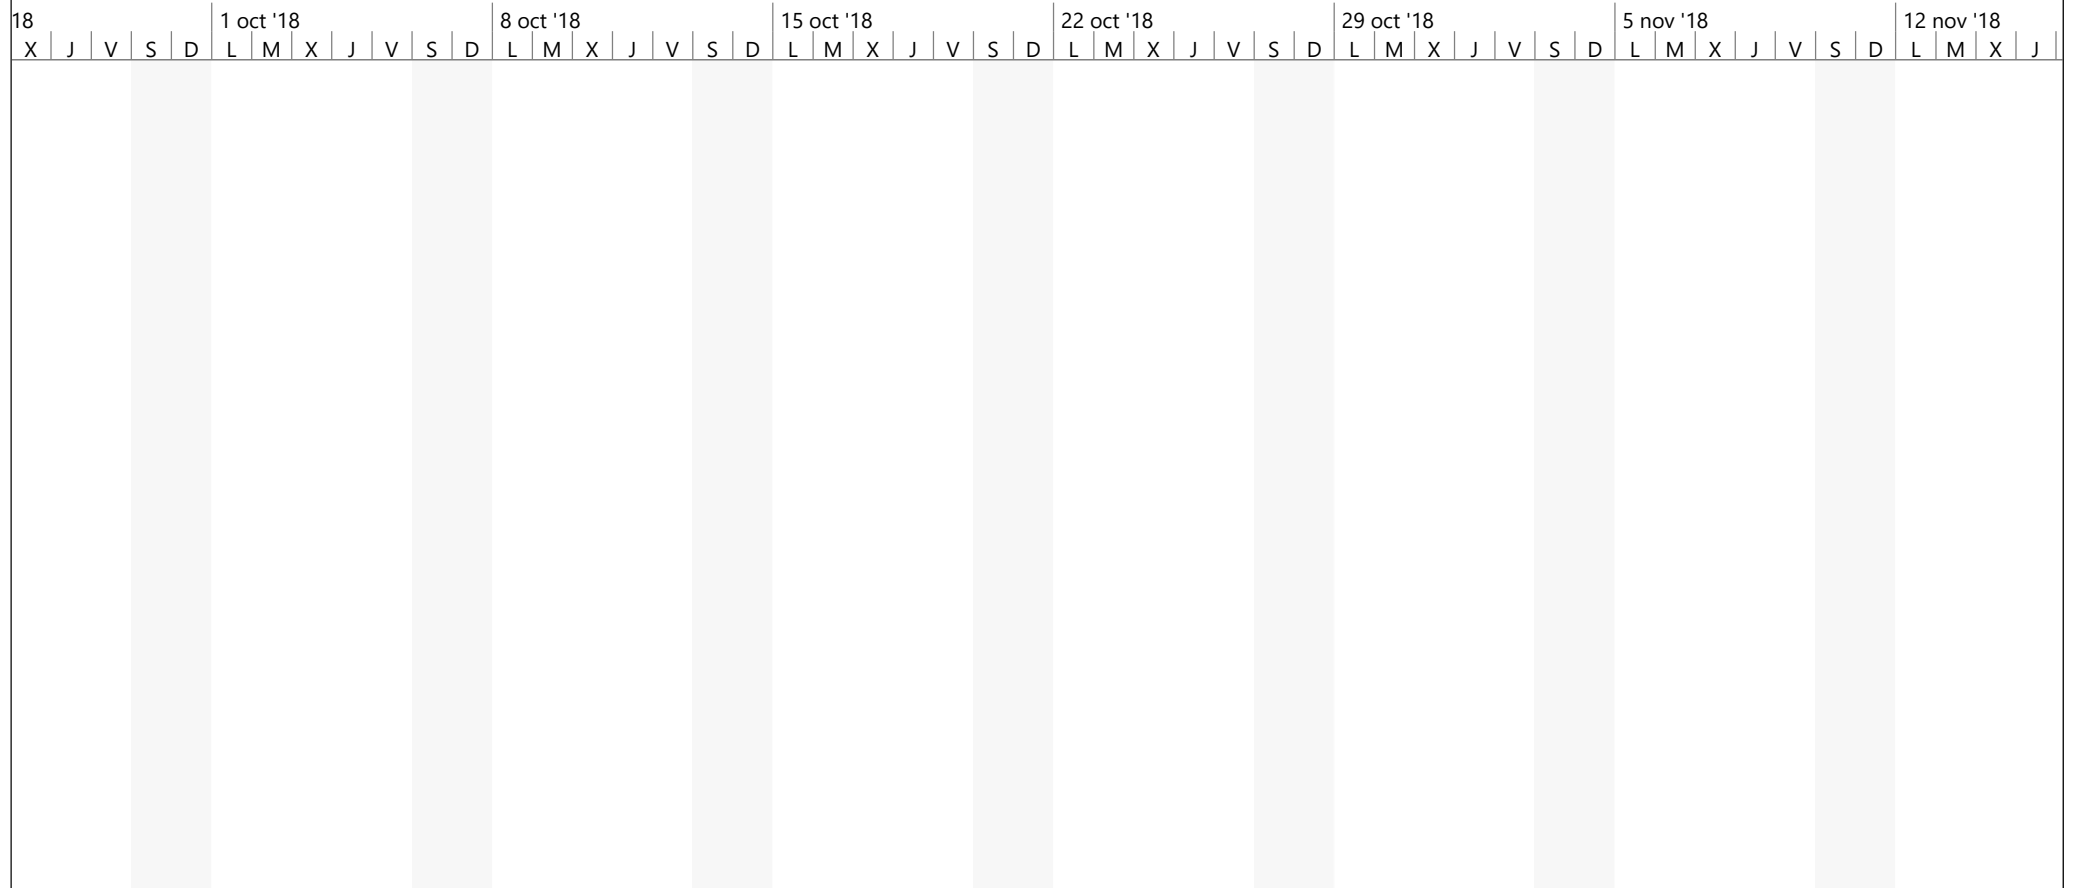


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |





# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 18 |   |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |   |   | 12 nov '18 |   |  |  |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| X  | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V         | S | D | L | M | X          | J |  |  |
|    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

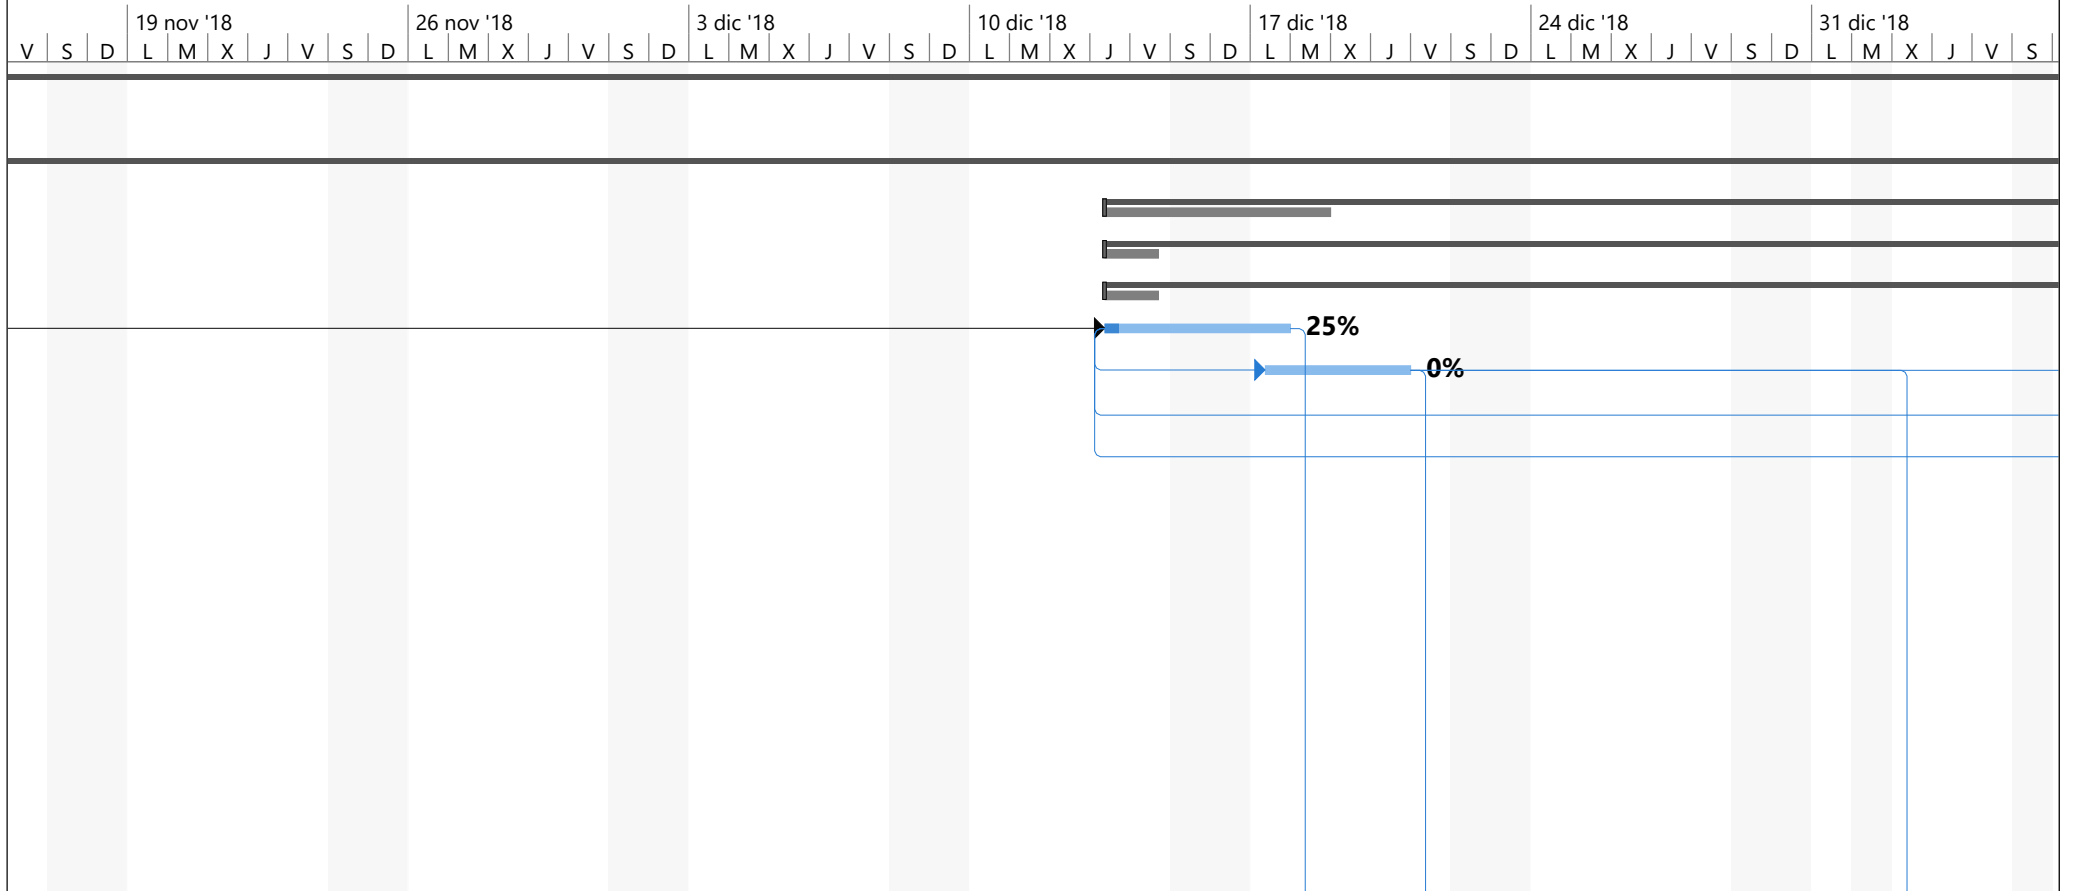

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

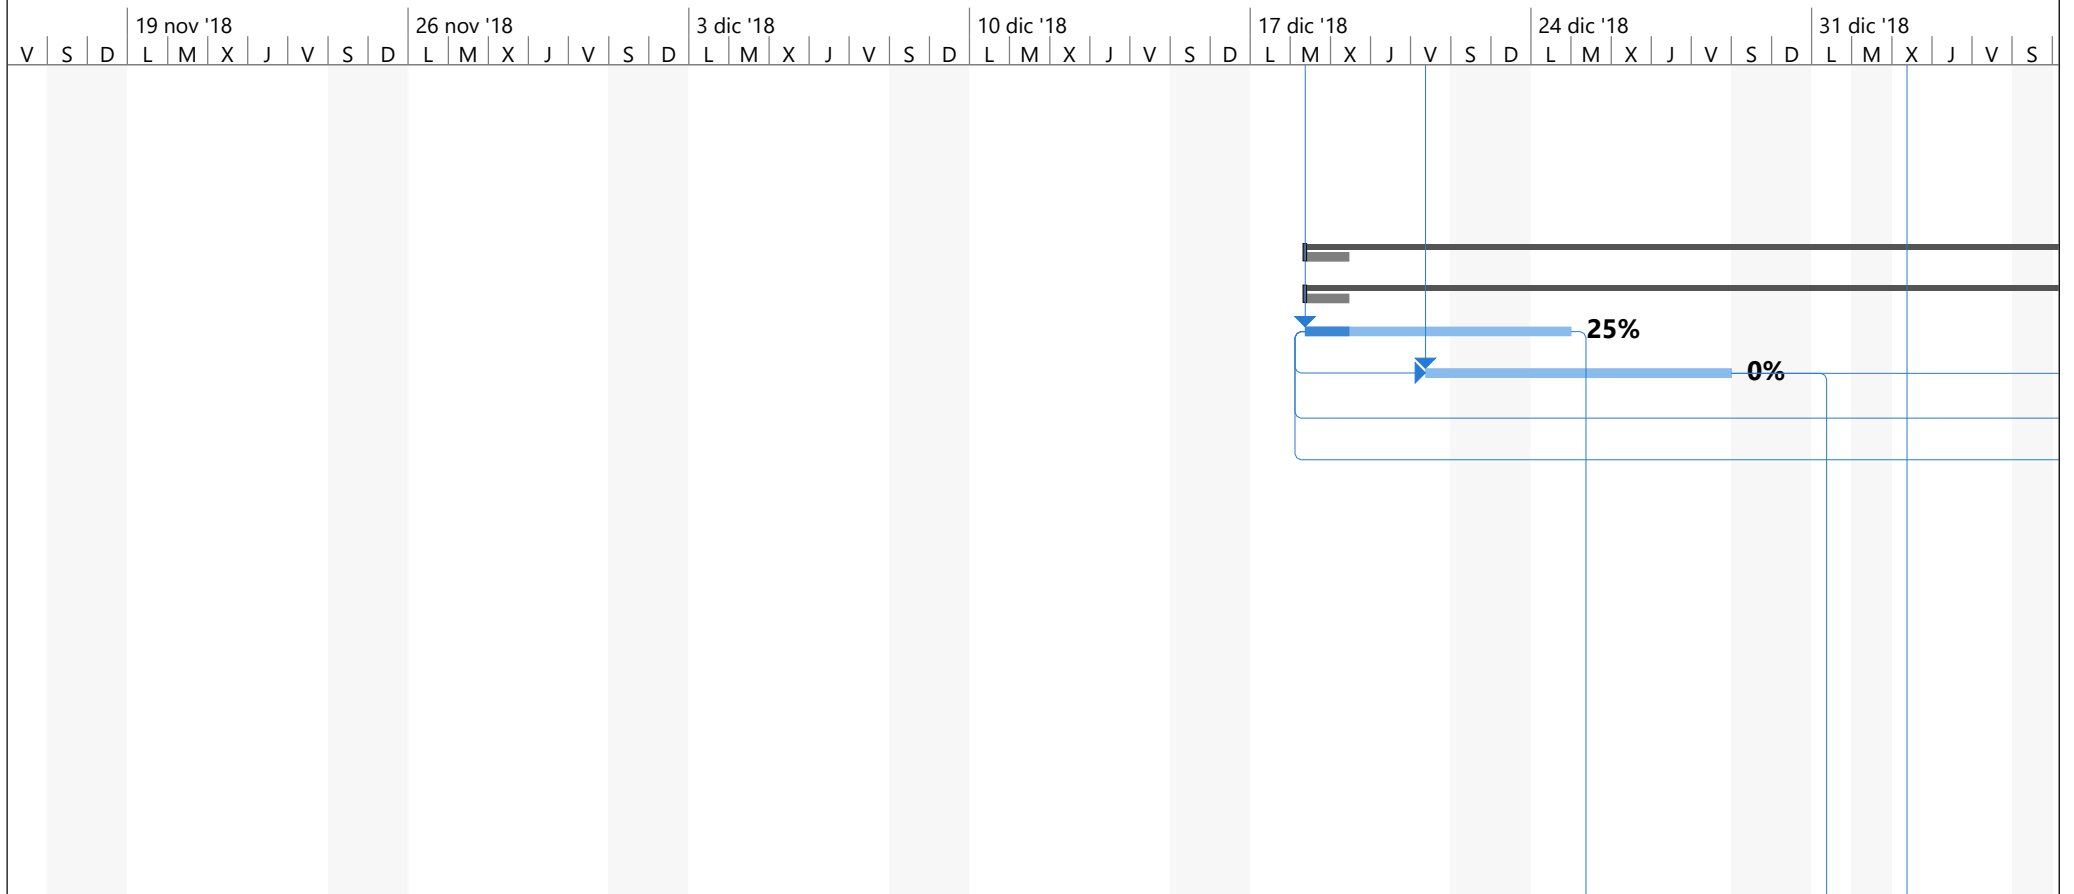


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

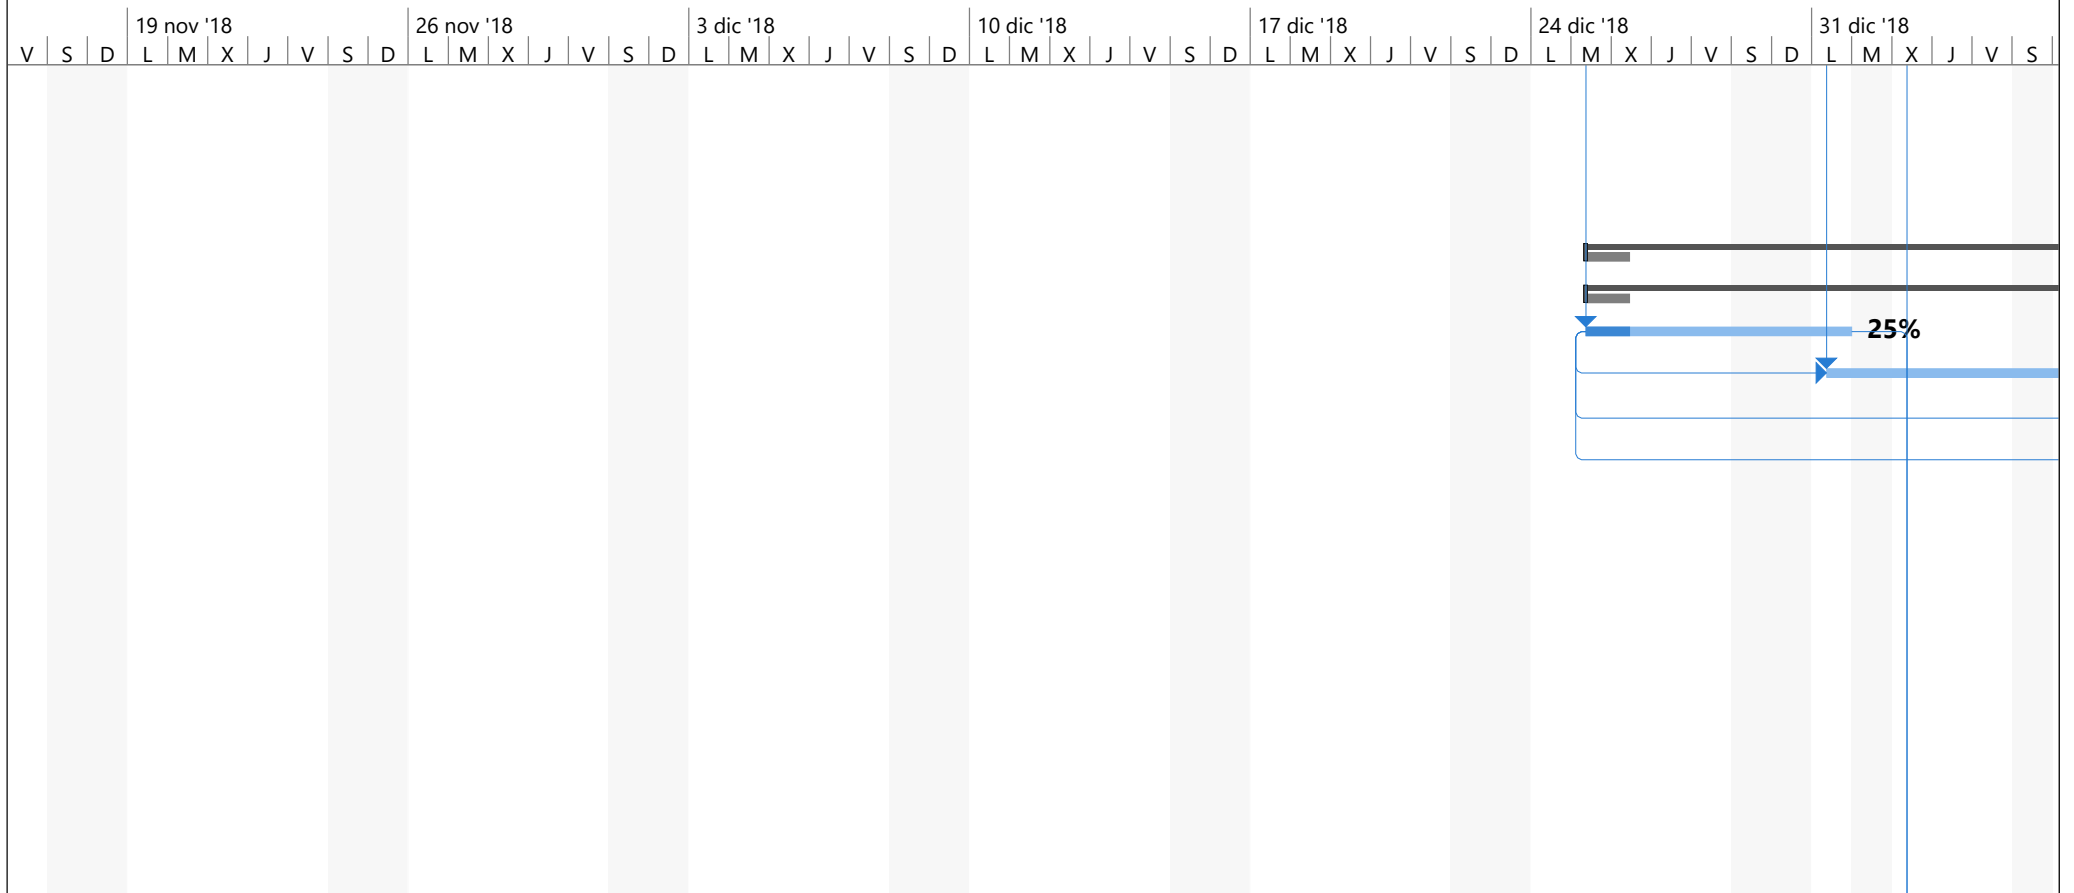



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

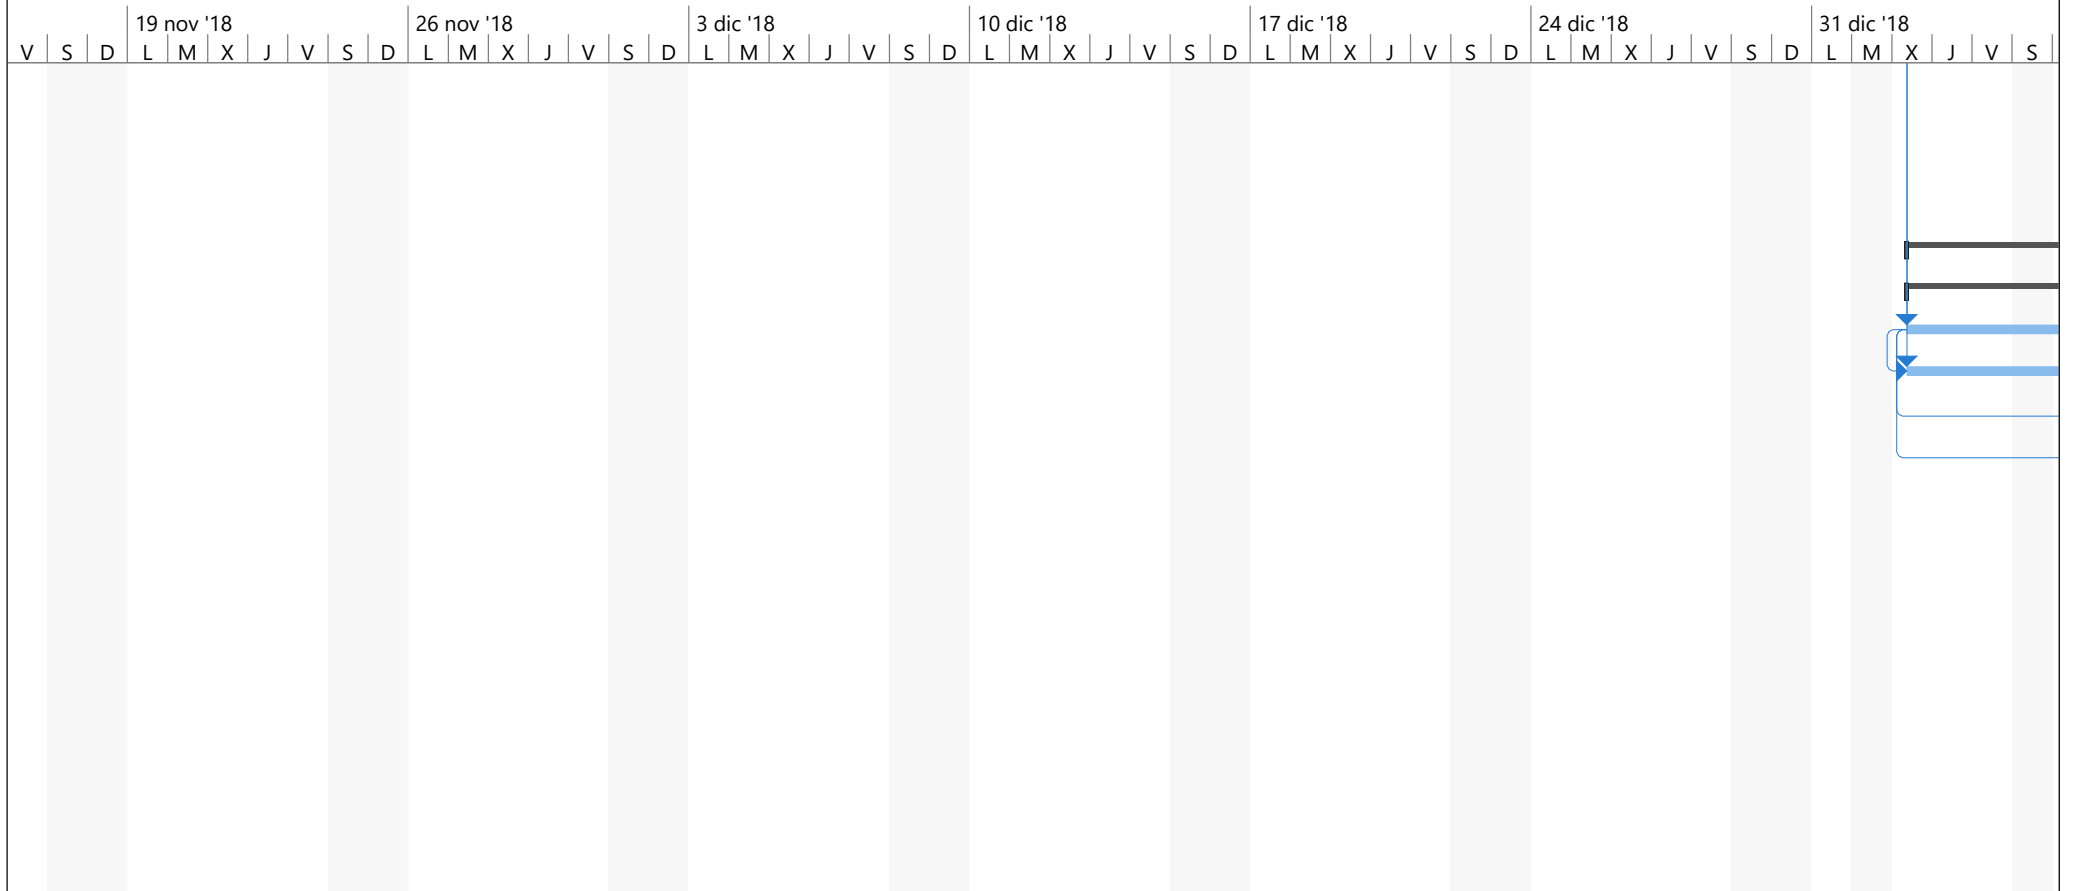

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|   |   |   | 19 nov '18 |   |   |   |   |   |   | 26 nov '18 |   |   |   |   |   |   | 3 dic '18 |   |   |   |   |   |   | 10 dic '18 |   |   |   |   |   |   | 17 dic '18 |   |   |   |   |   |   | 24 dic '18 |   |   |   |   |   |  | 31 dic '18 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S |  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |  |            |  |  |  |  |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|   |   |   | 19 nov '18 |   |   |   |   | 26 nov '18 |   |   |   |   | 3 dic '18 |   |   |   |   | 10 dic '18 |   |   |   |   | 17 dic '18 |   |   |   |   | 24 dic '18 |   |   |   |   | 31 dic '18 |   |   |   |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X          | J | V | S |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp


|   |   |   | 19 nov '18 |   |   |   |   |   |   | 26 nov '18 |   |   |   |   |   |   | 3 dic '18 |   |   |   |   |   |   | 10 dic '18 |   |   |   |   |   |   | 17 dic '18 |   |   |   |   |   |   | 24 dic '18 |   |   |   |   |   |  | 31 dic '18 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S |  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |  |            |  |  |  |  |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 7 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 14 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 21 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 28 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 4 feb '19 |   |   |   |   |   |   | 11 feb '19 |   |   |   |   |   |   | 18 feb '19 |   |  |  |  |  |  | 25 fe |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|--|--|--|-------|
| D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L |  |  |  |  |  |       |

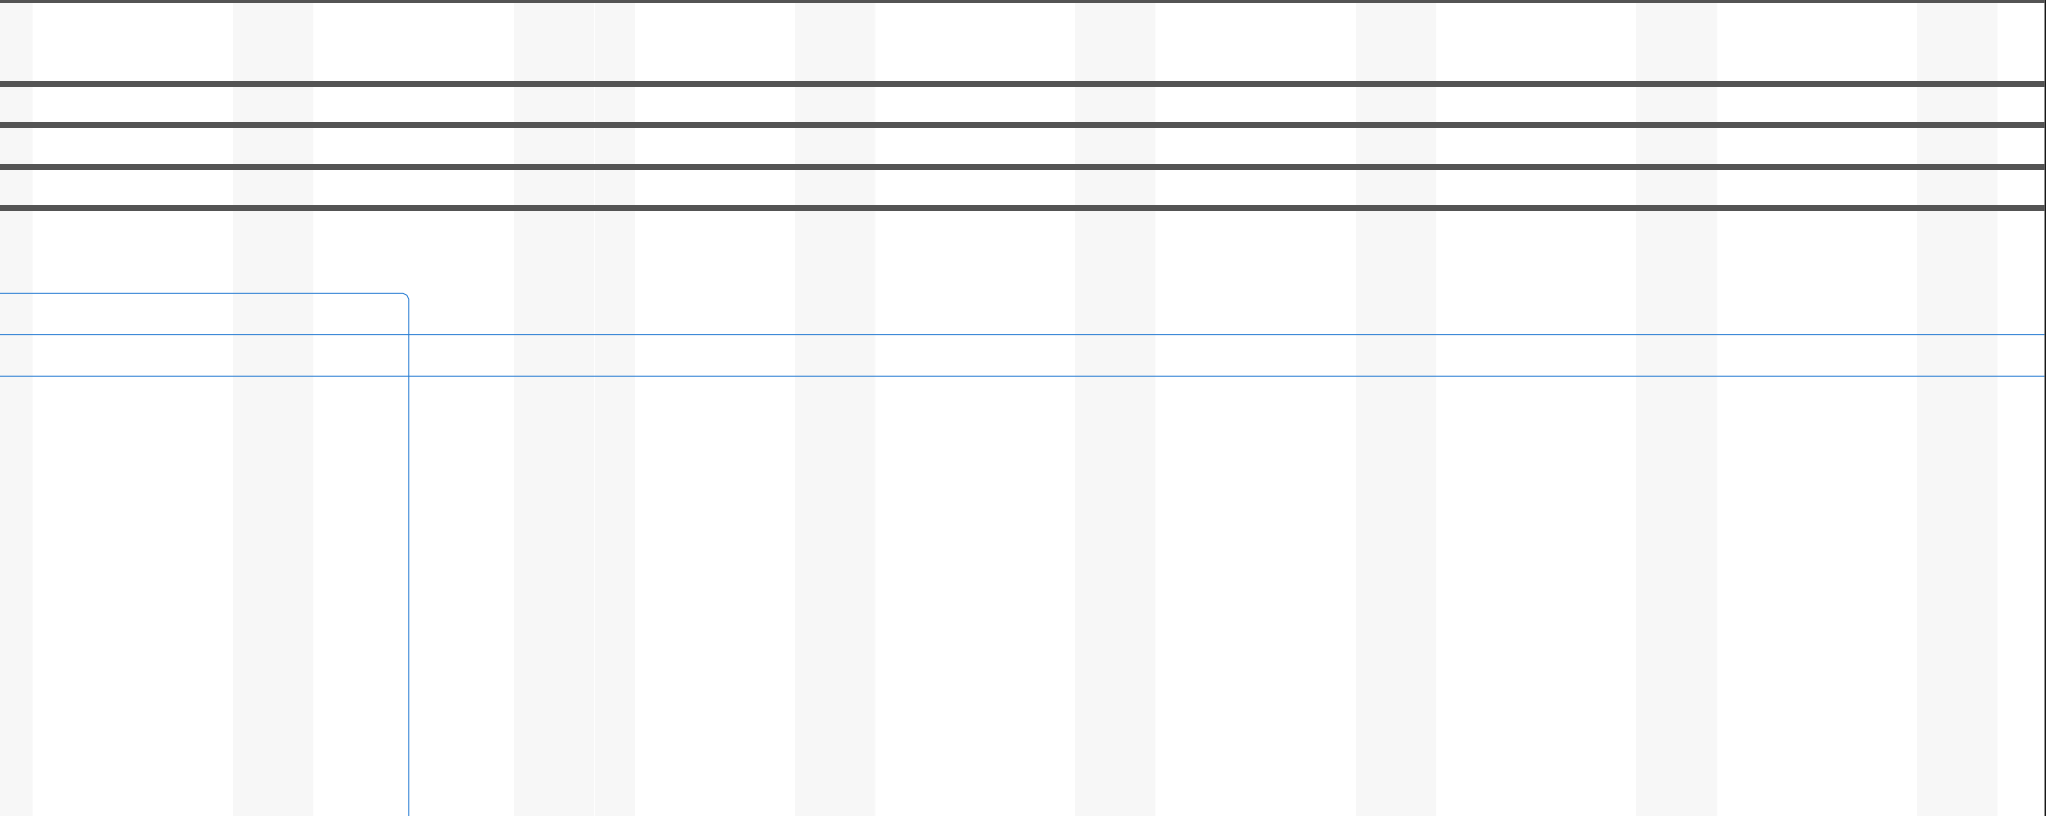


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

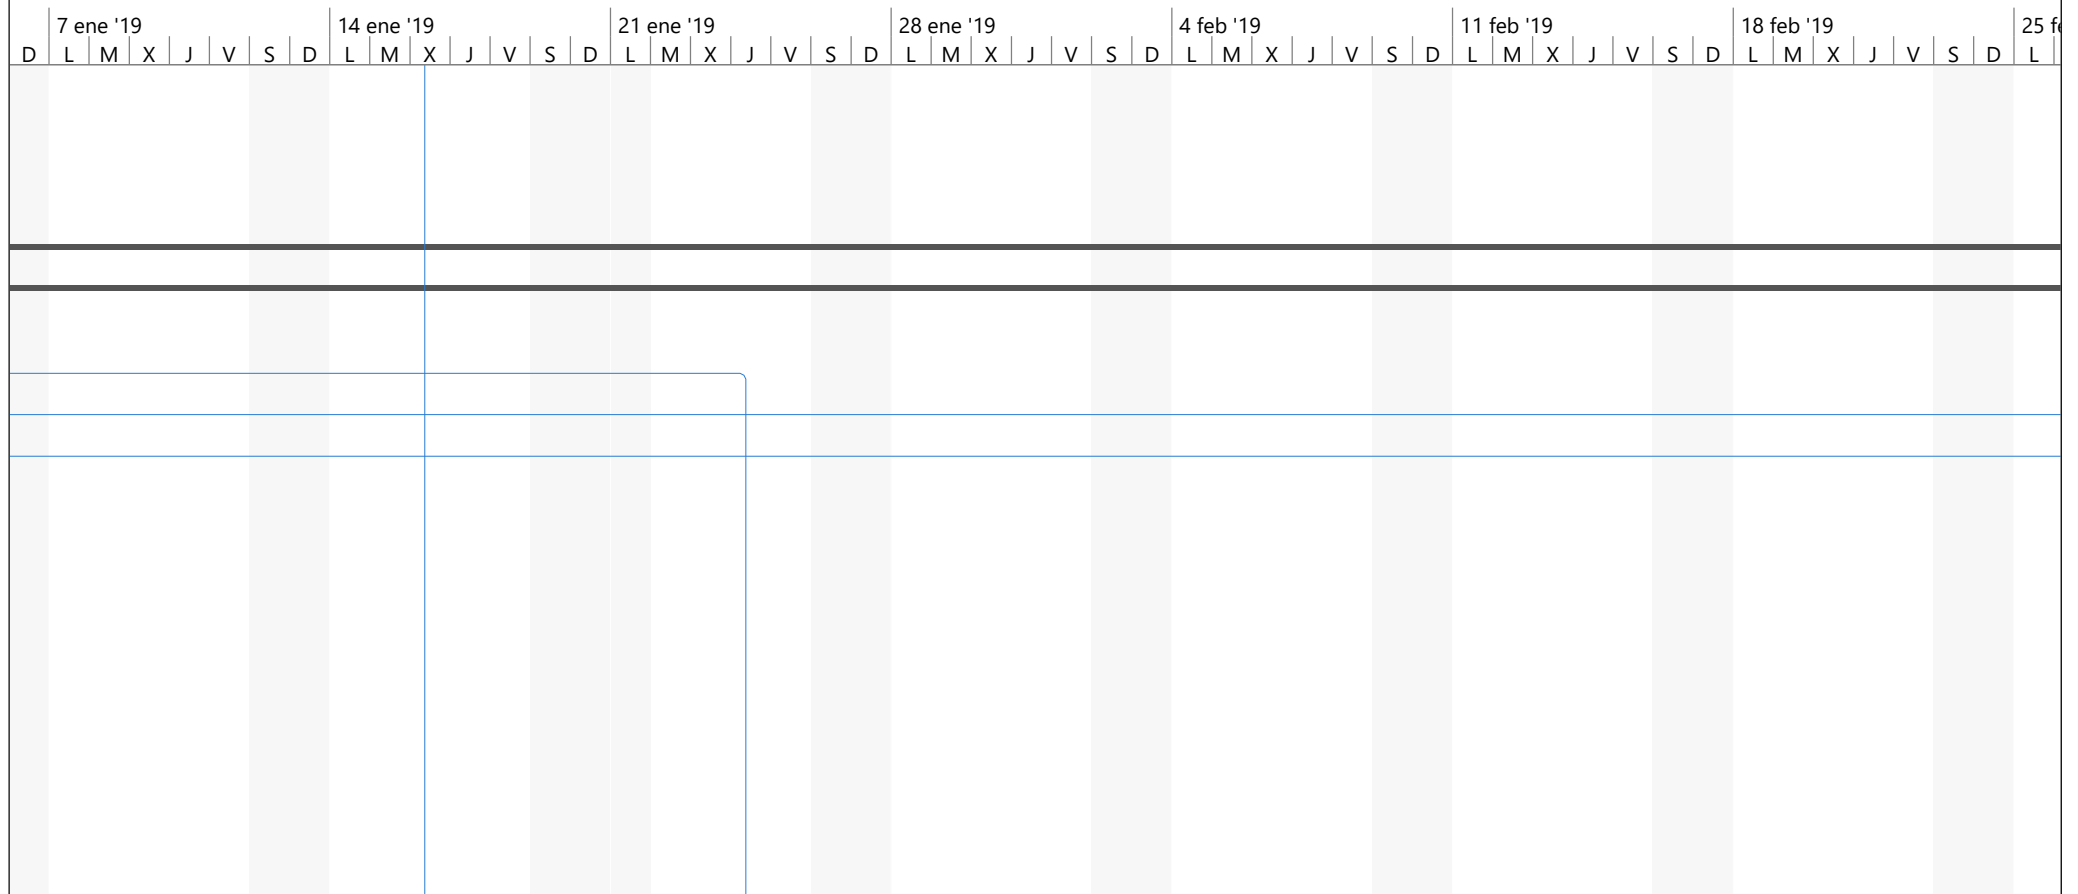


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

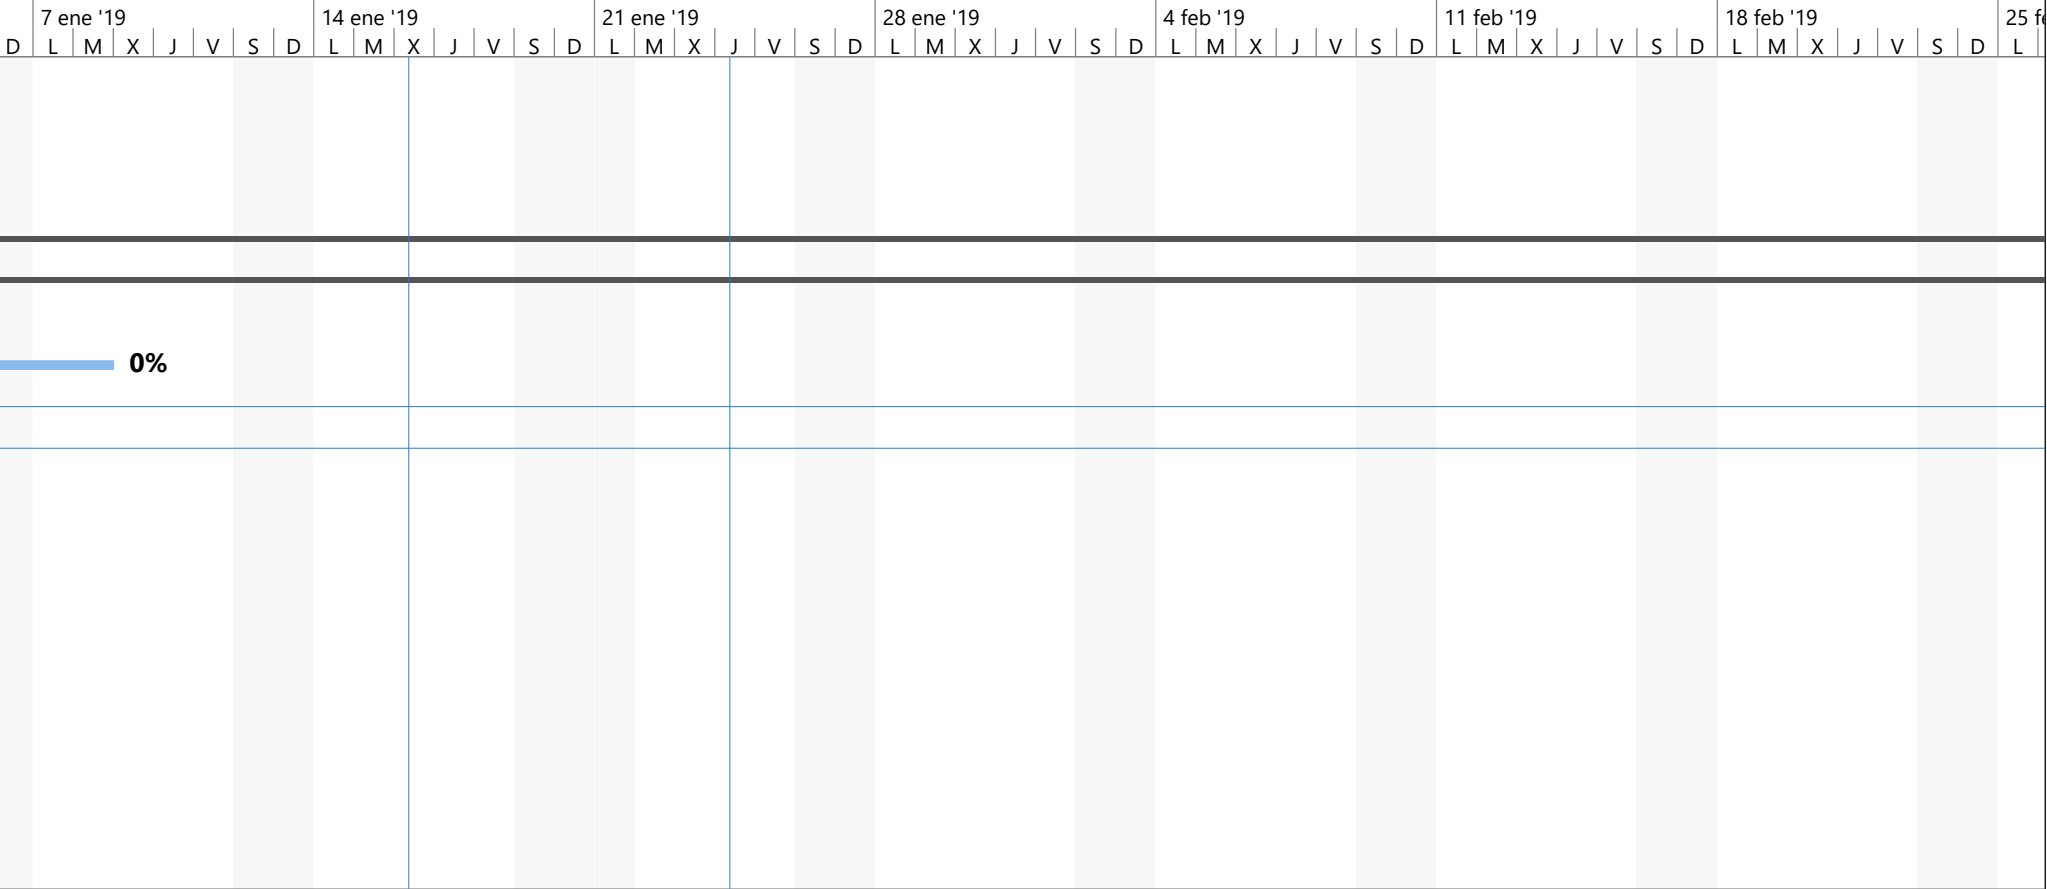


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

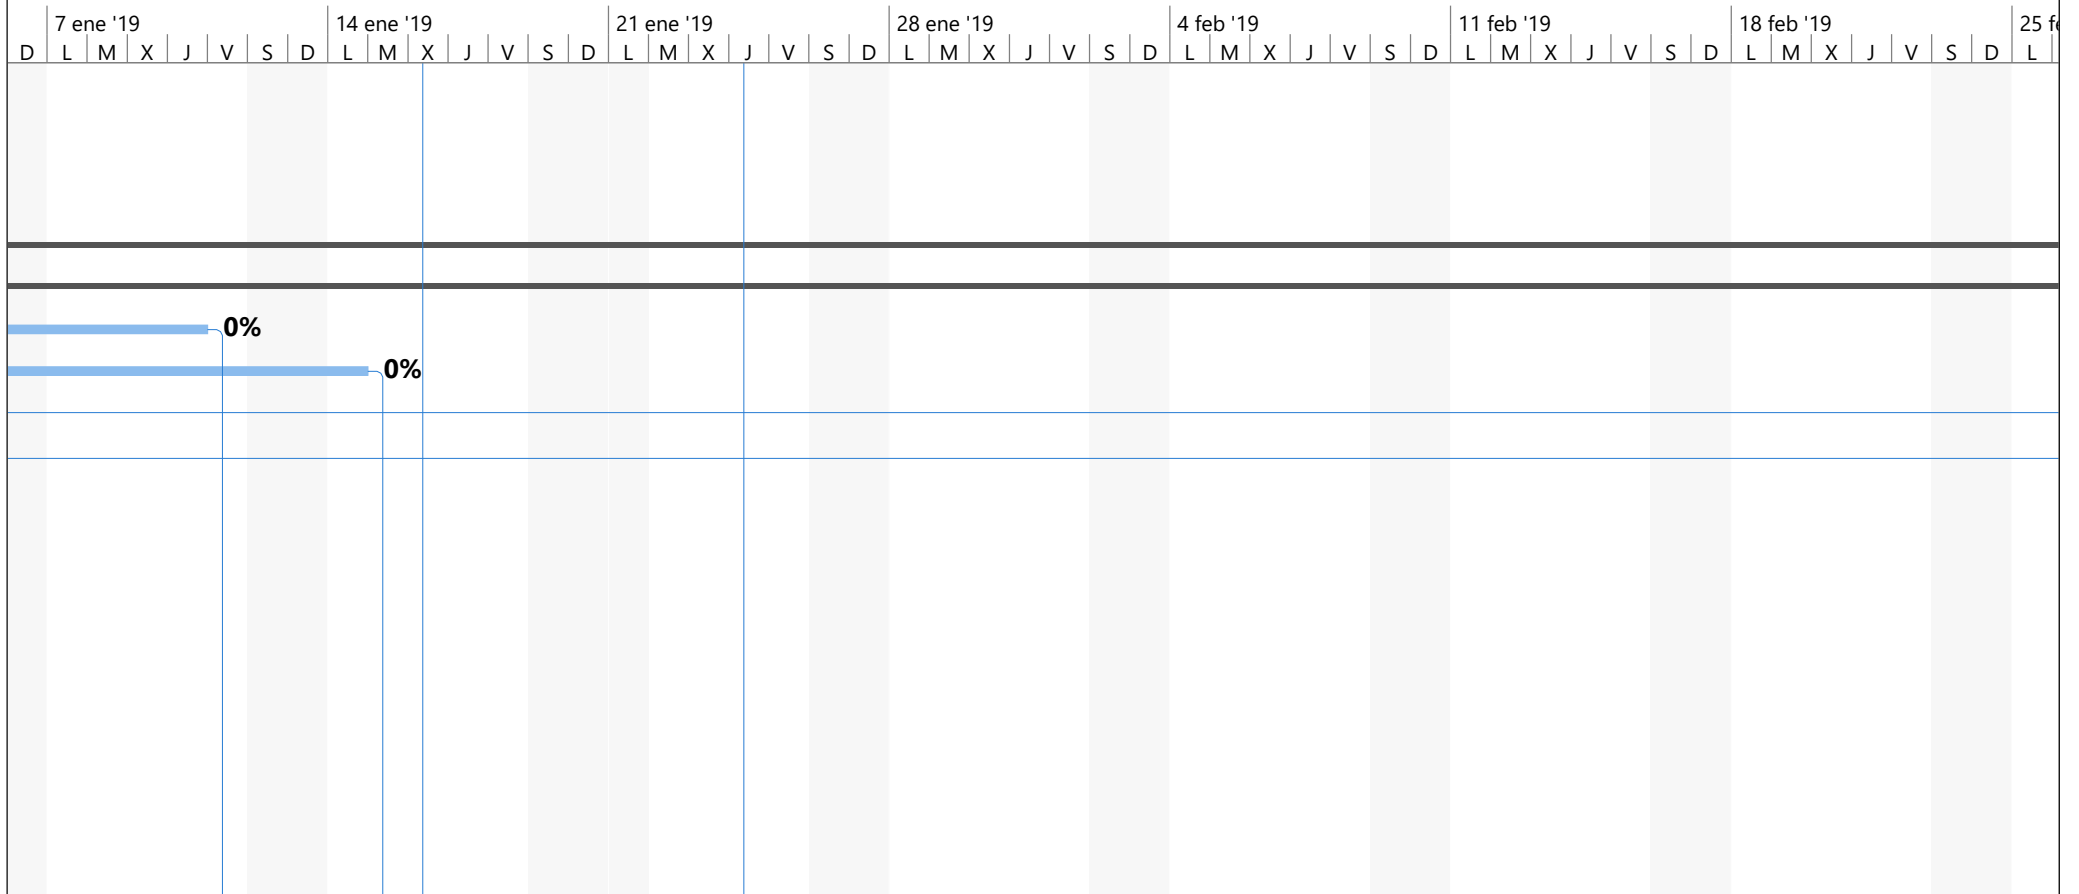


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

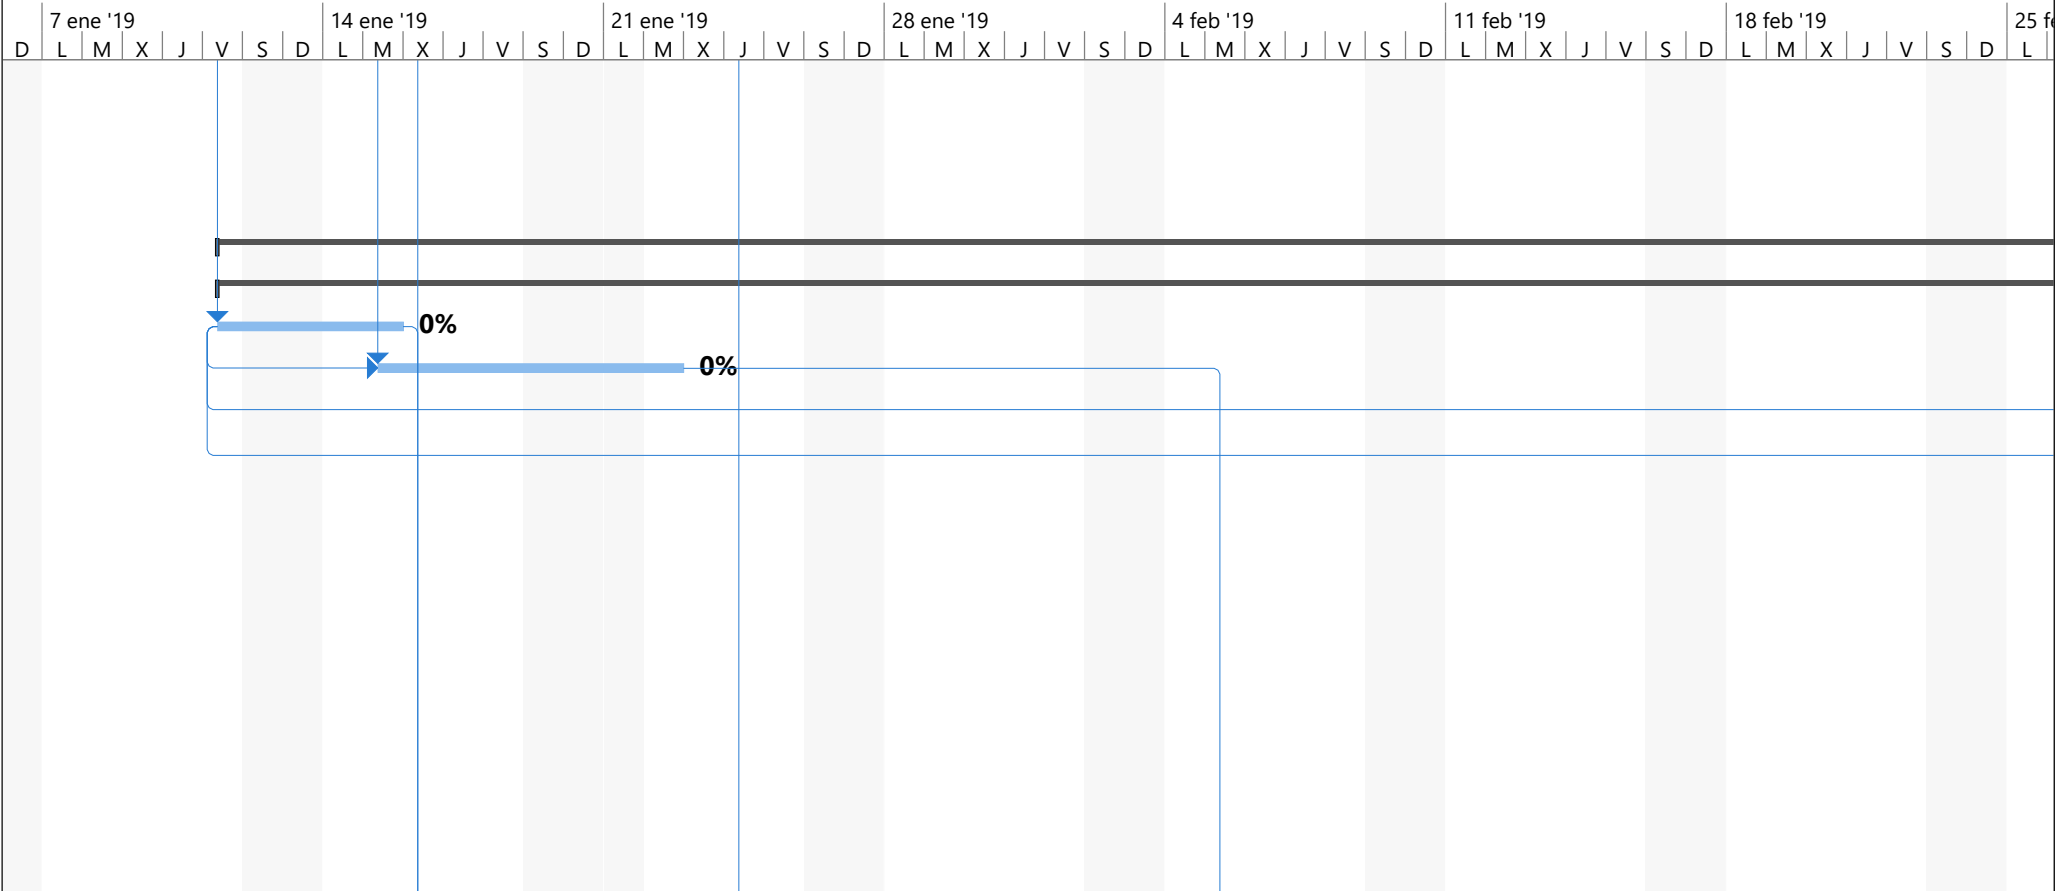

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

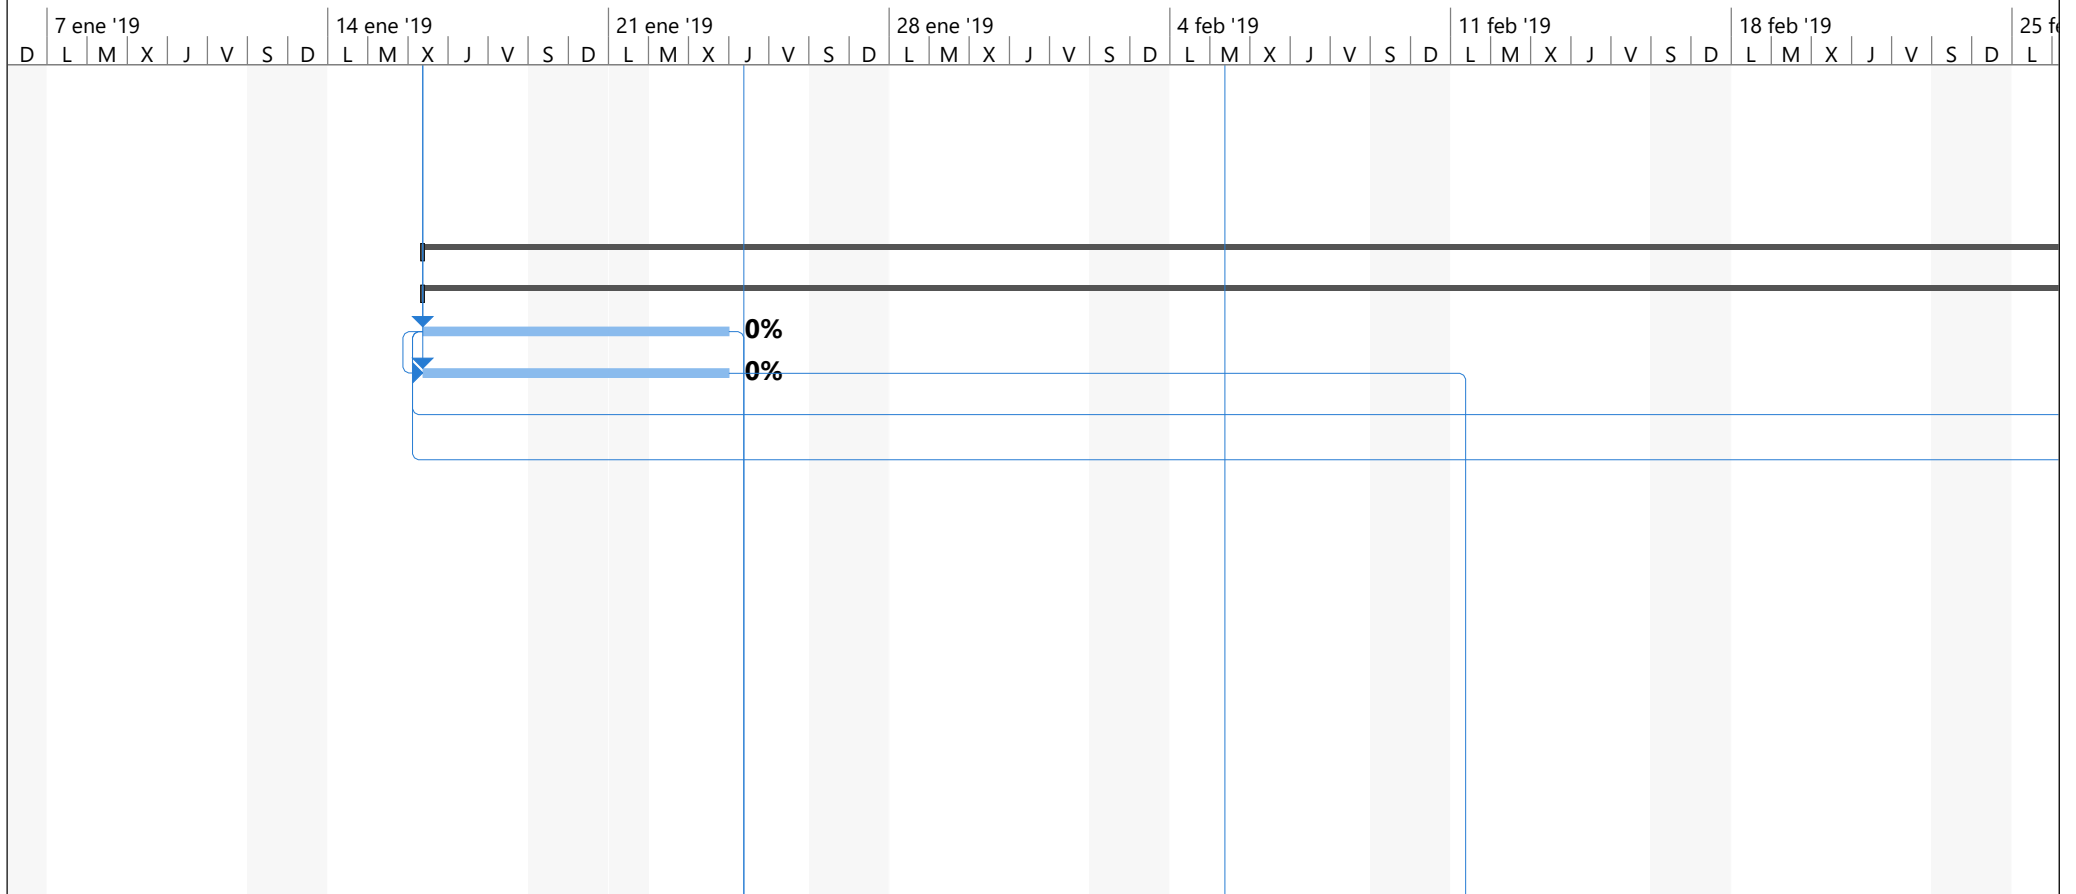

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

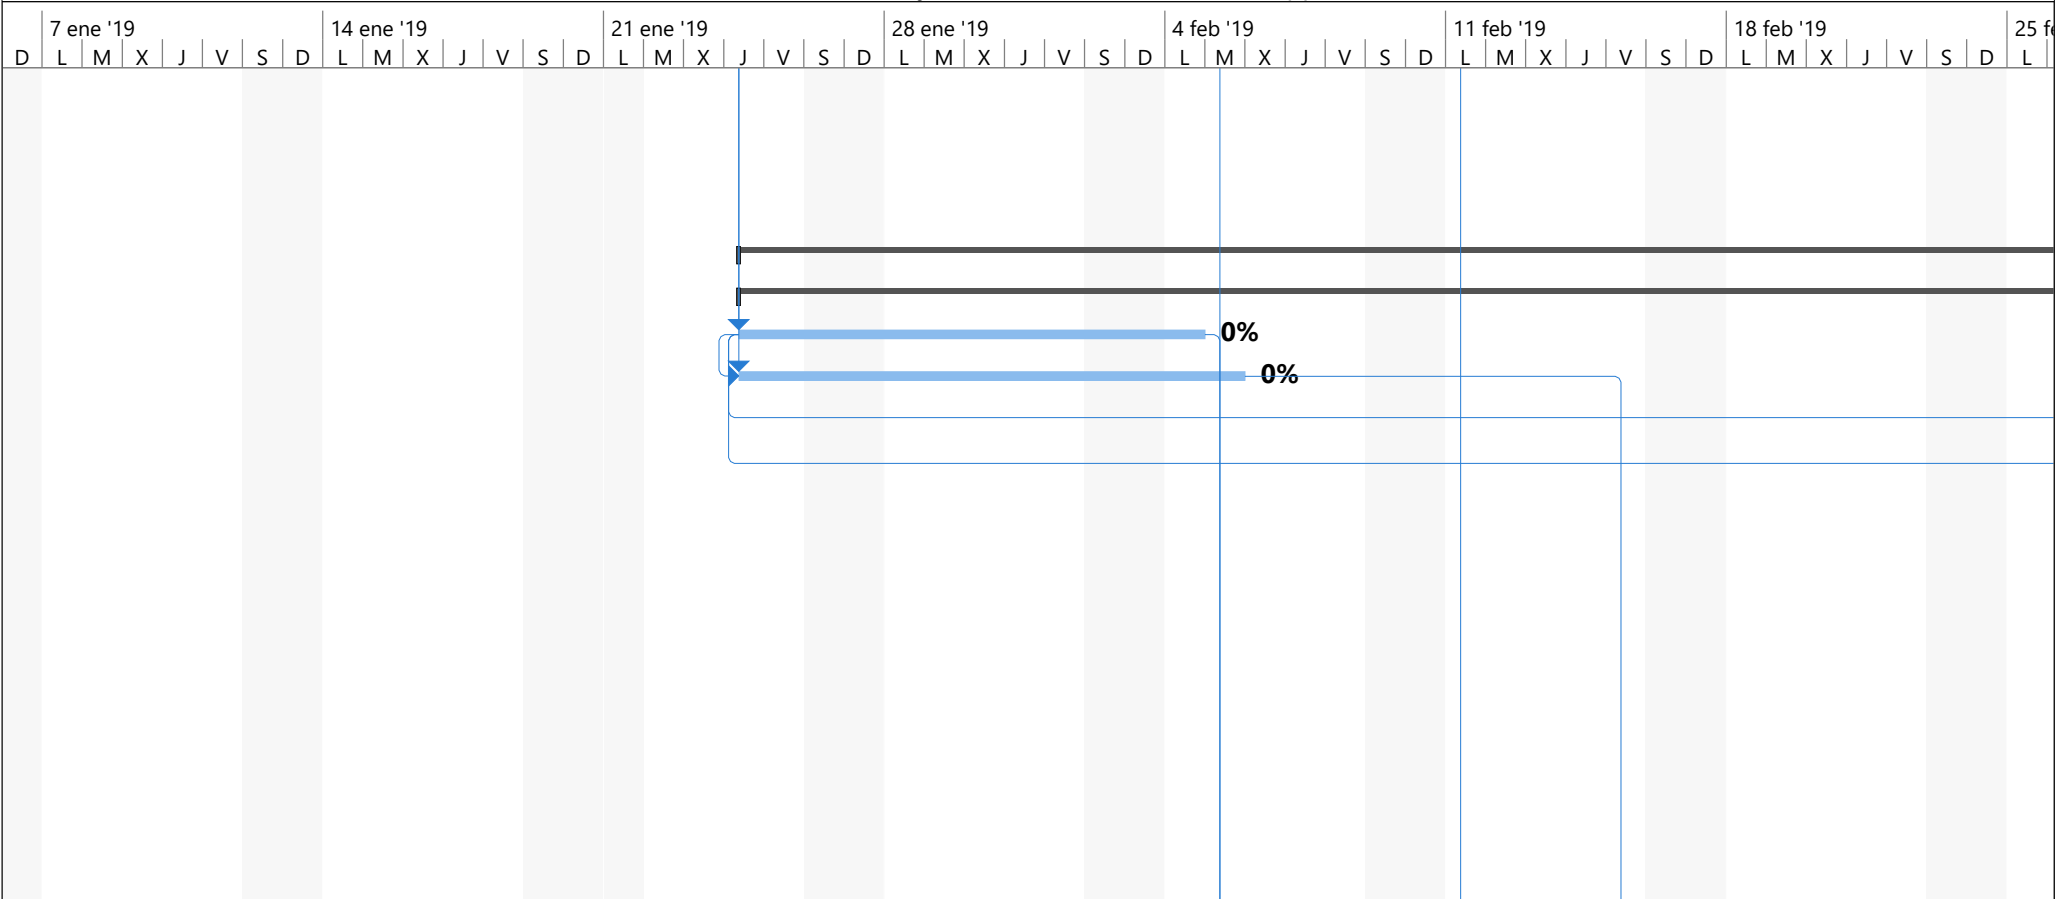


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

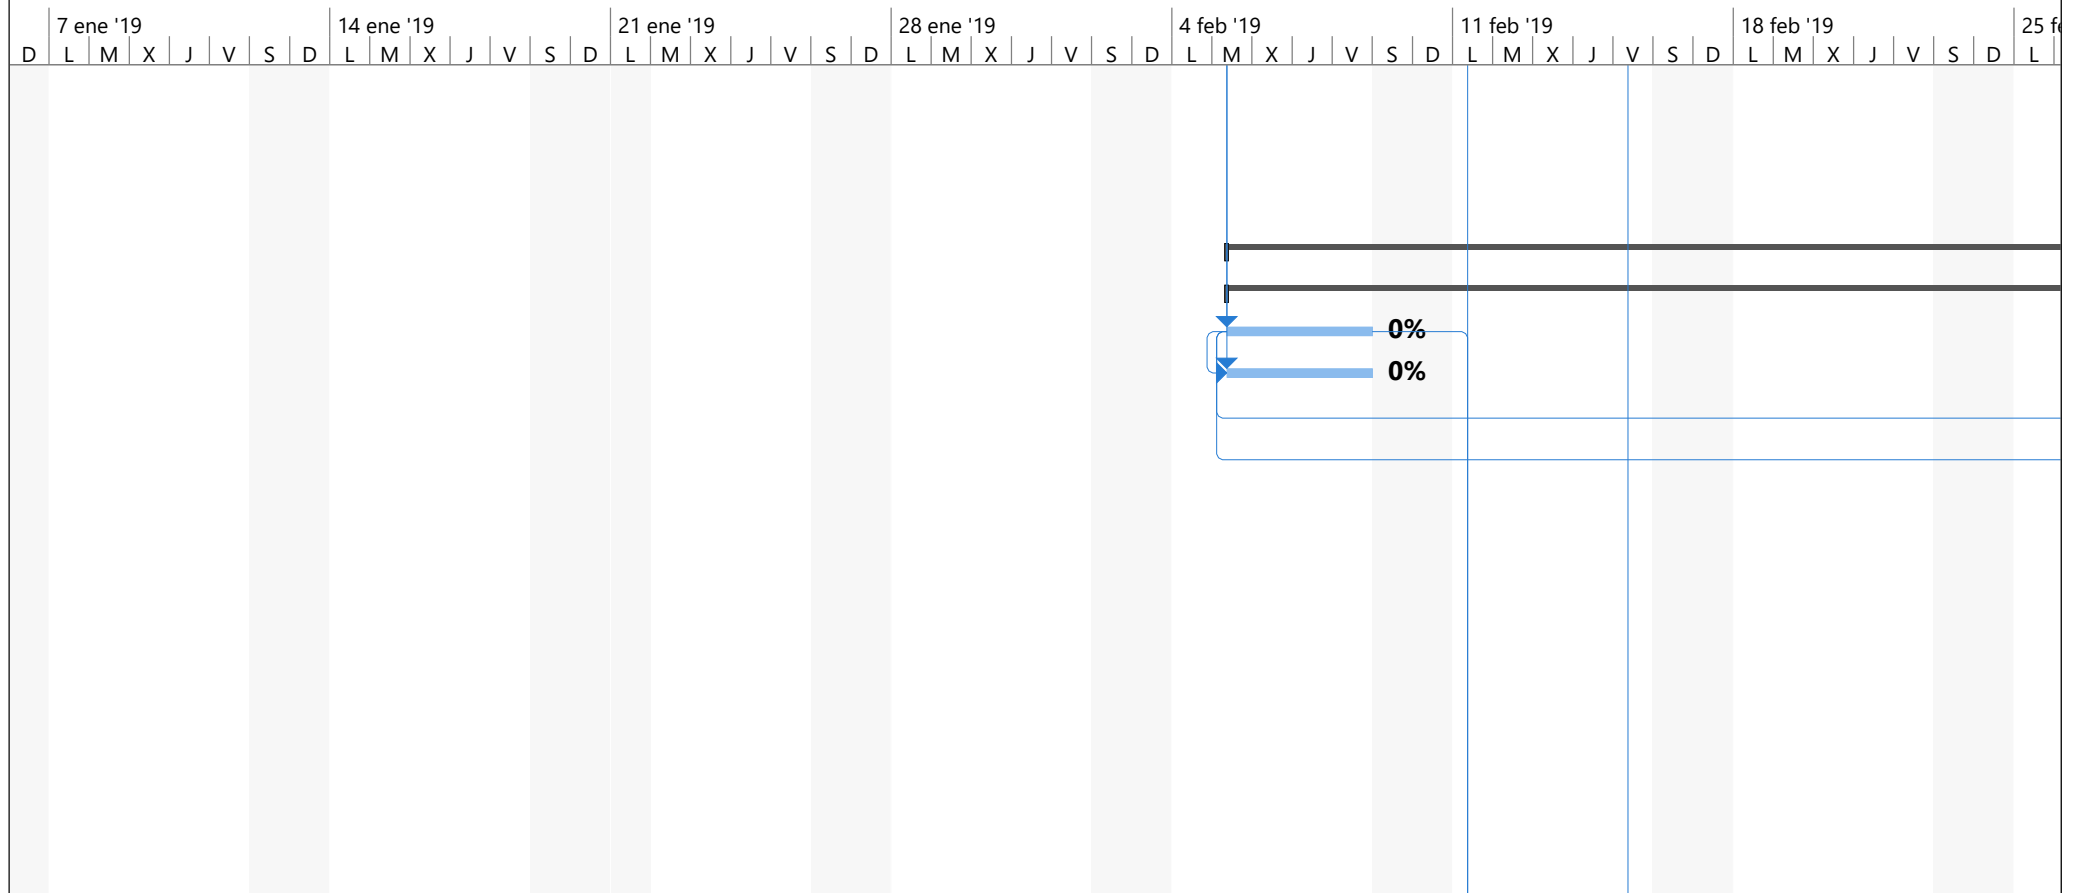


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

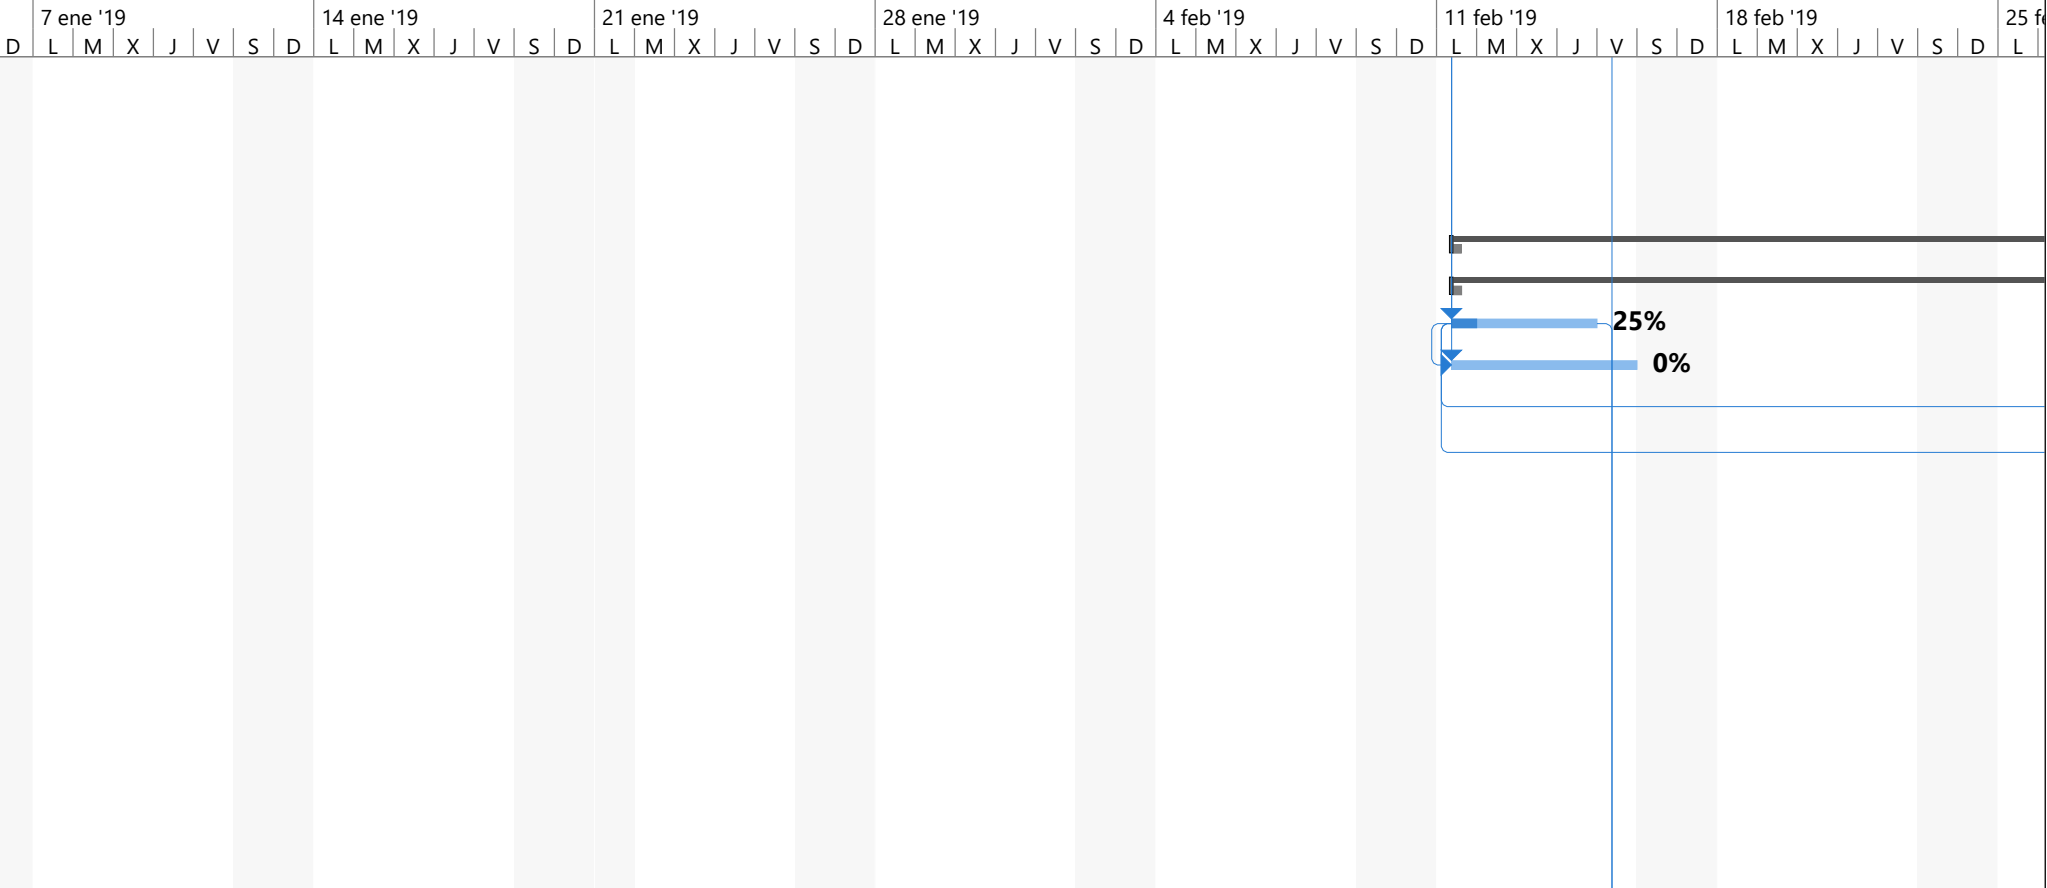

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

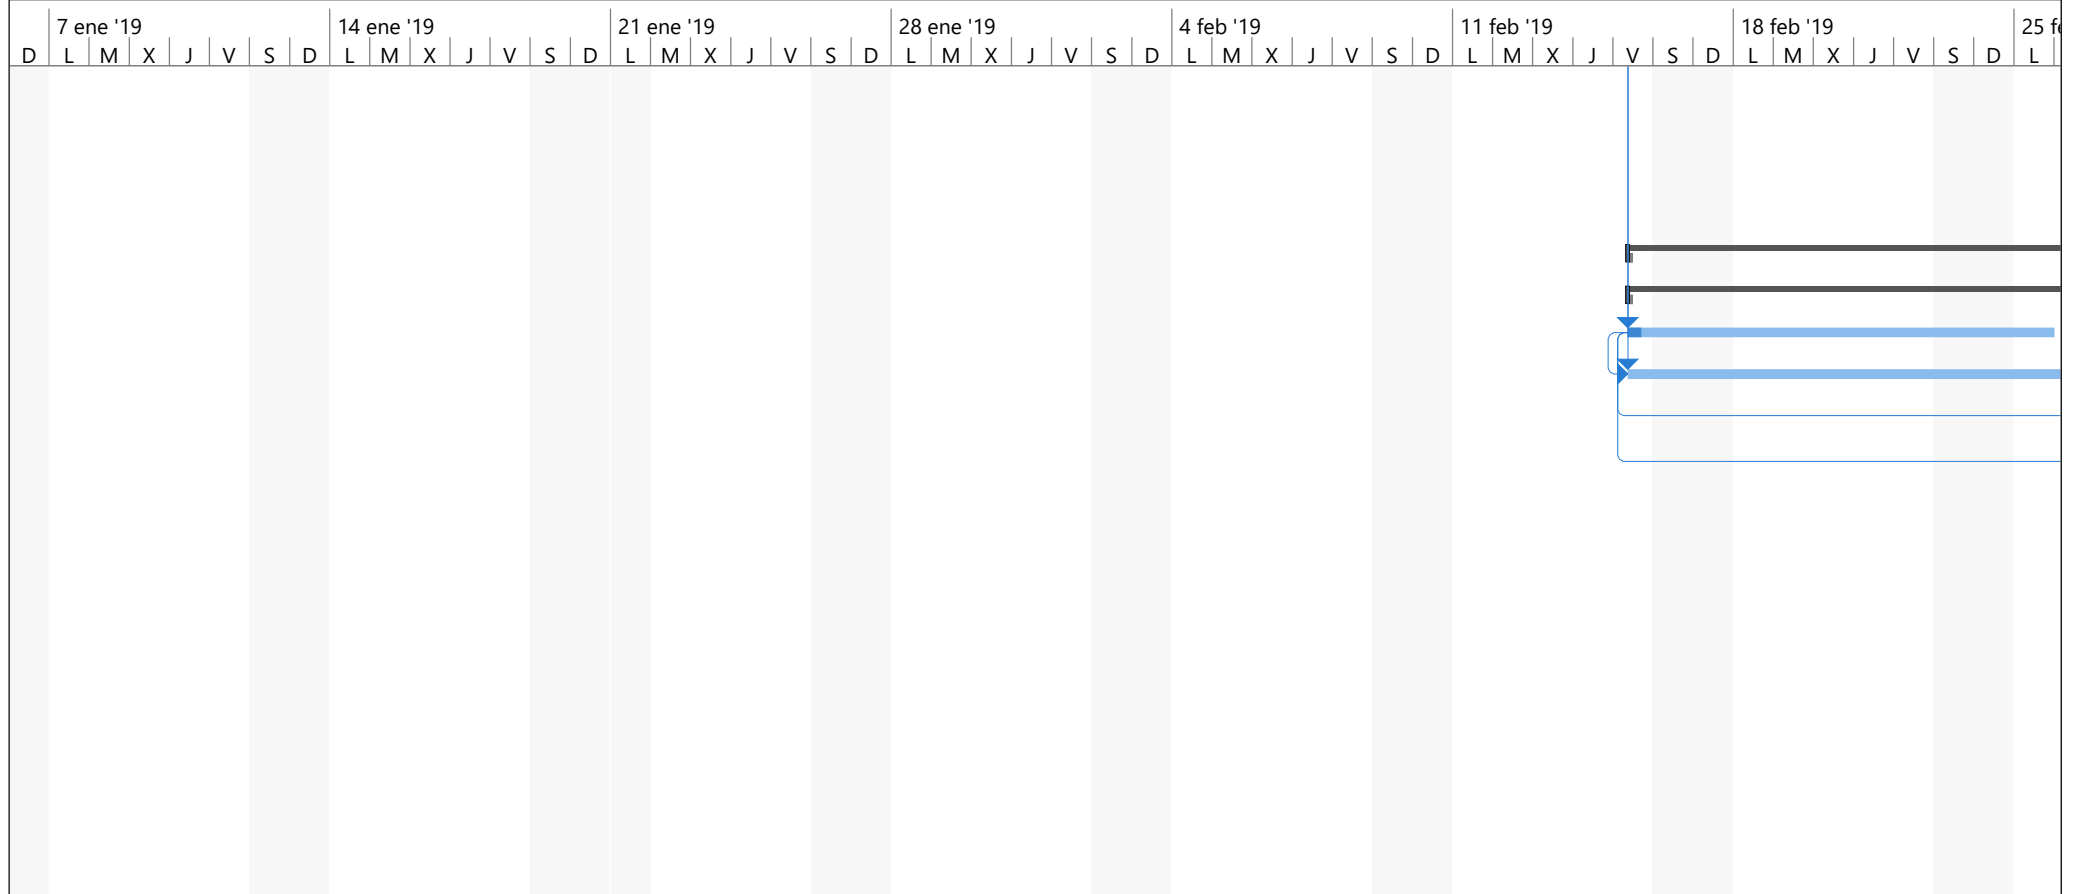


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 7 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 14 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 21 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 28 ene '19 |   |   |   |   |   |   | 4 feb '19 |   |   |   |   |   |   | 11 feb '19 |   |   |   |   |   |   | 18 feb '19 |   |  |  |  |  |  | 25 fe |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|--|--|--|-------|
| D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L |  |  |  |  |  |       |
|           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |  |  |  |       |


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

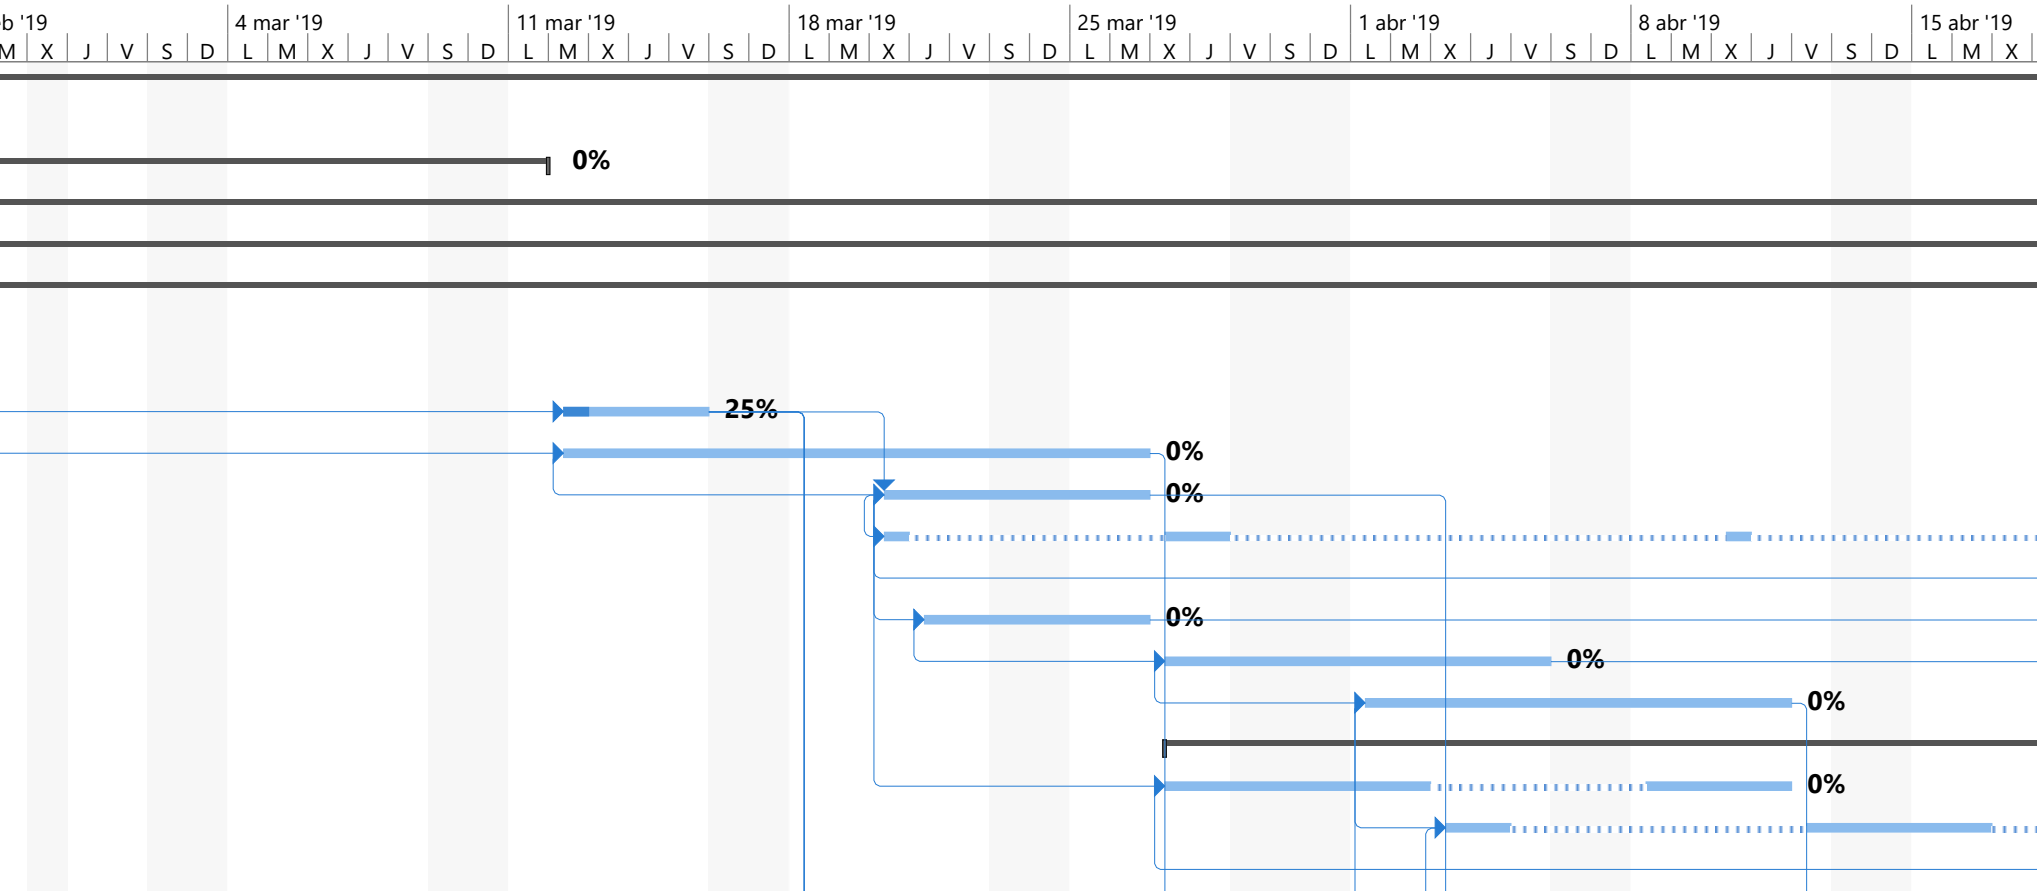


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

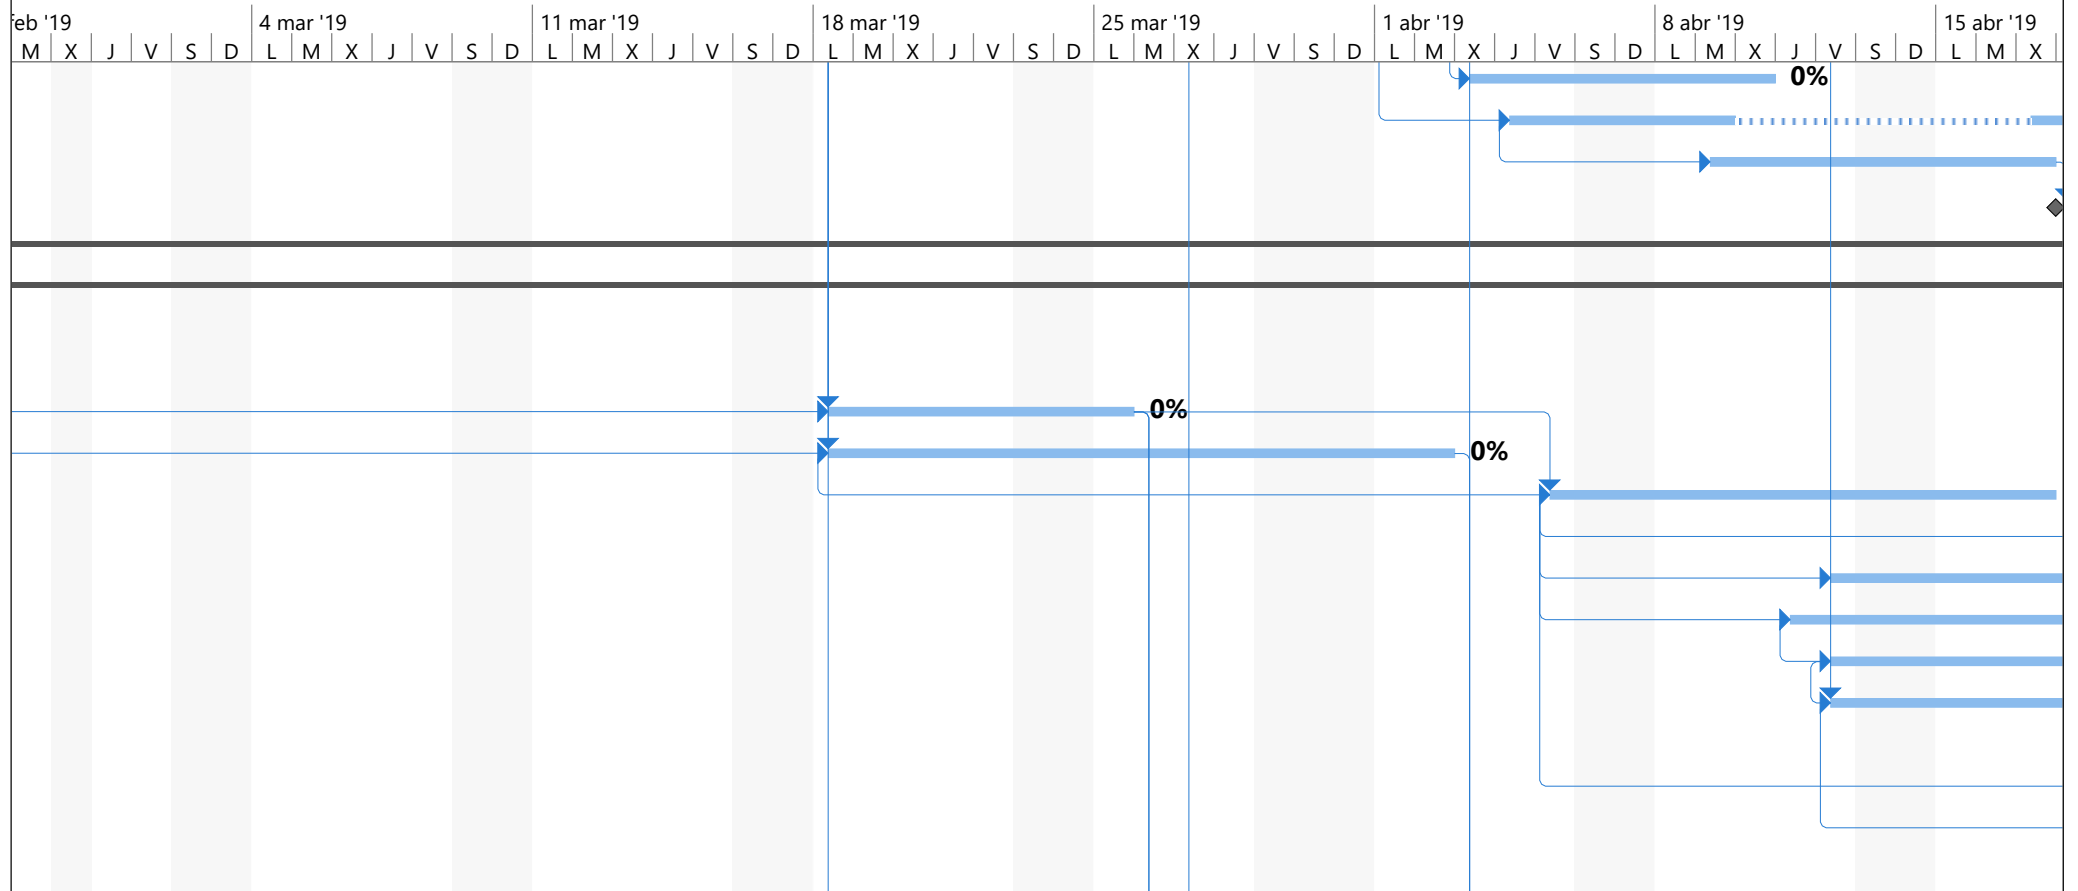

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

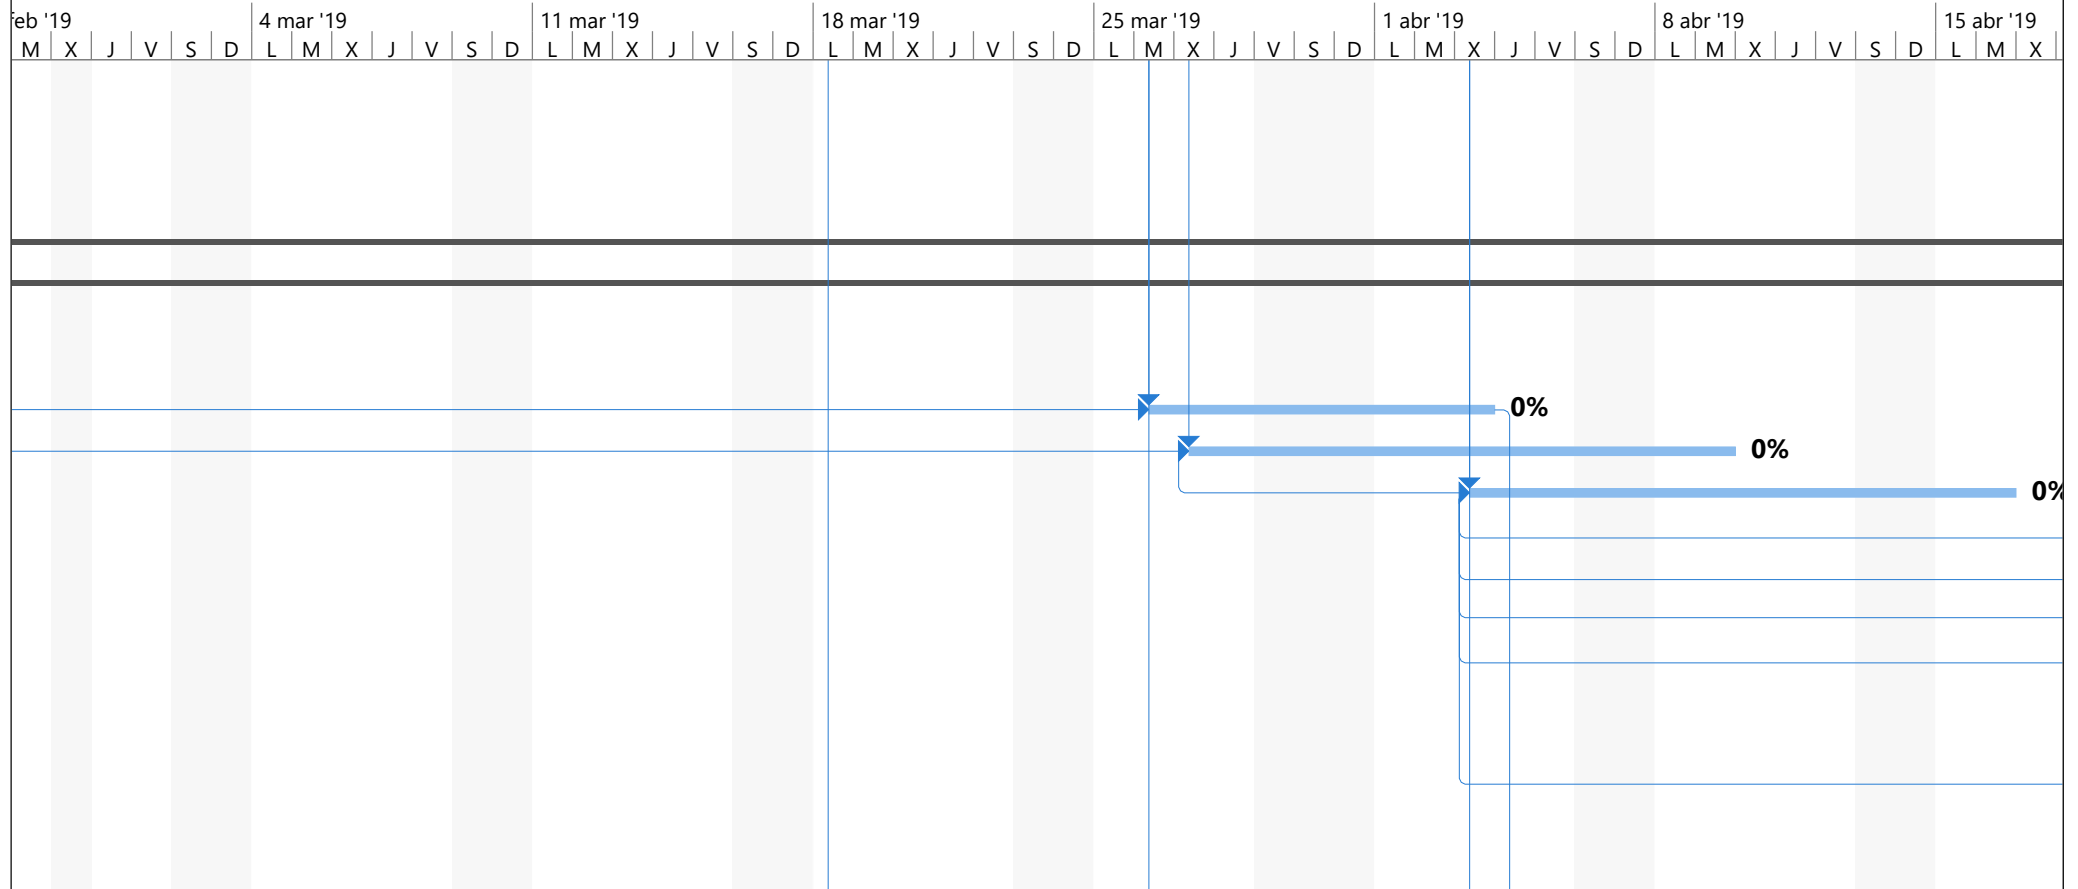

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

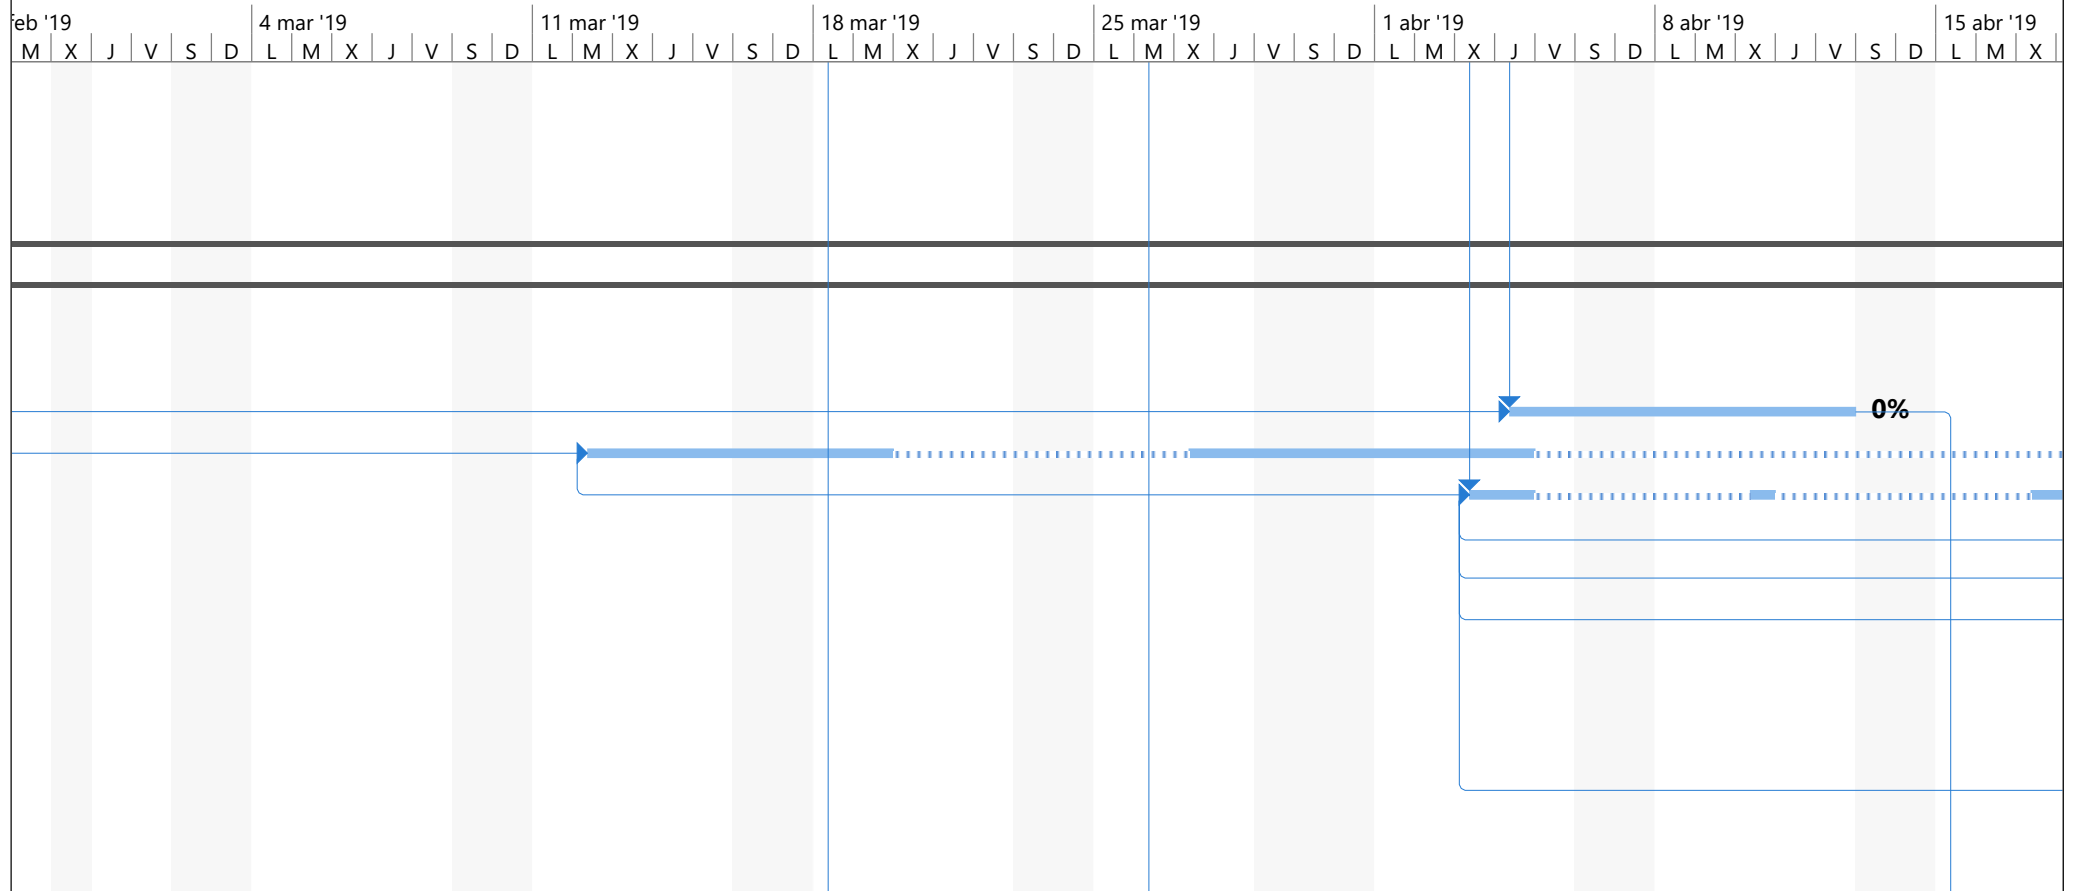


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

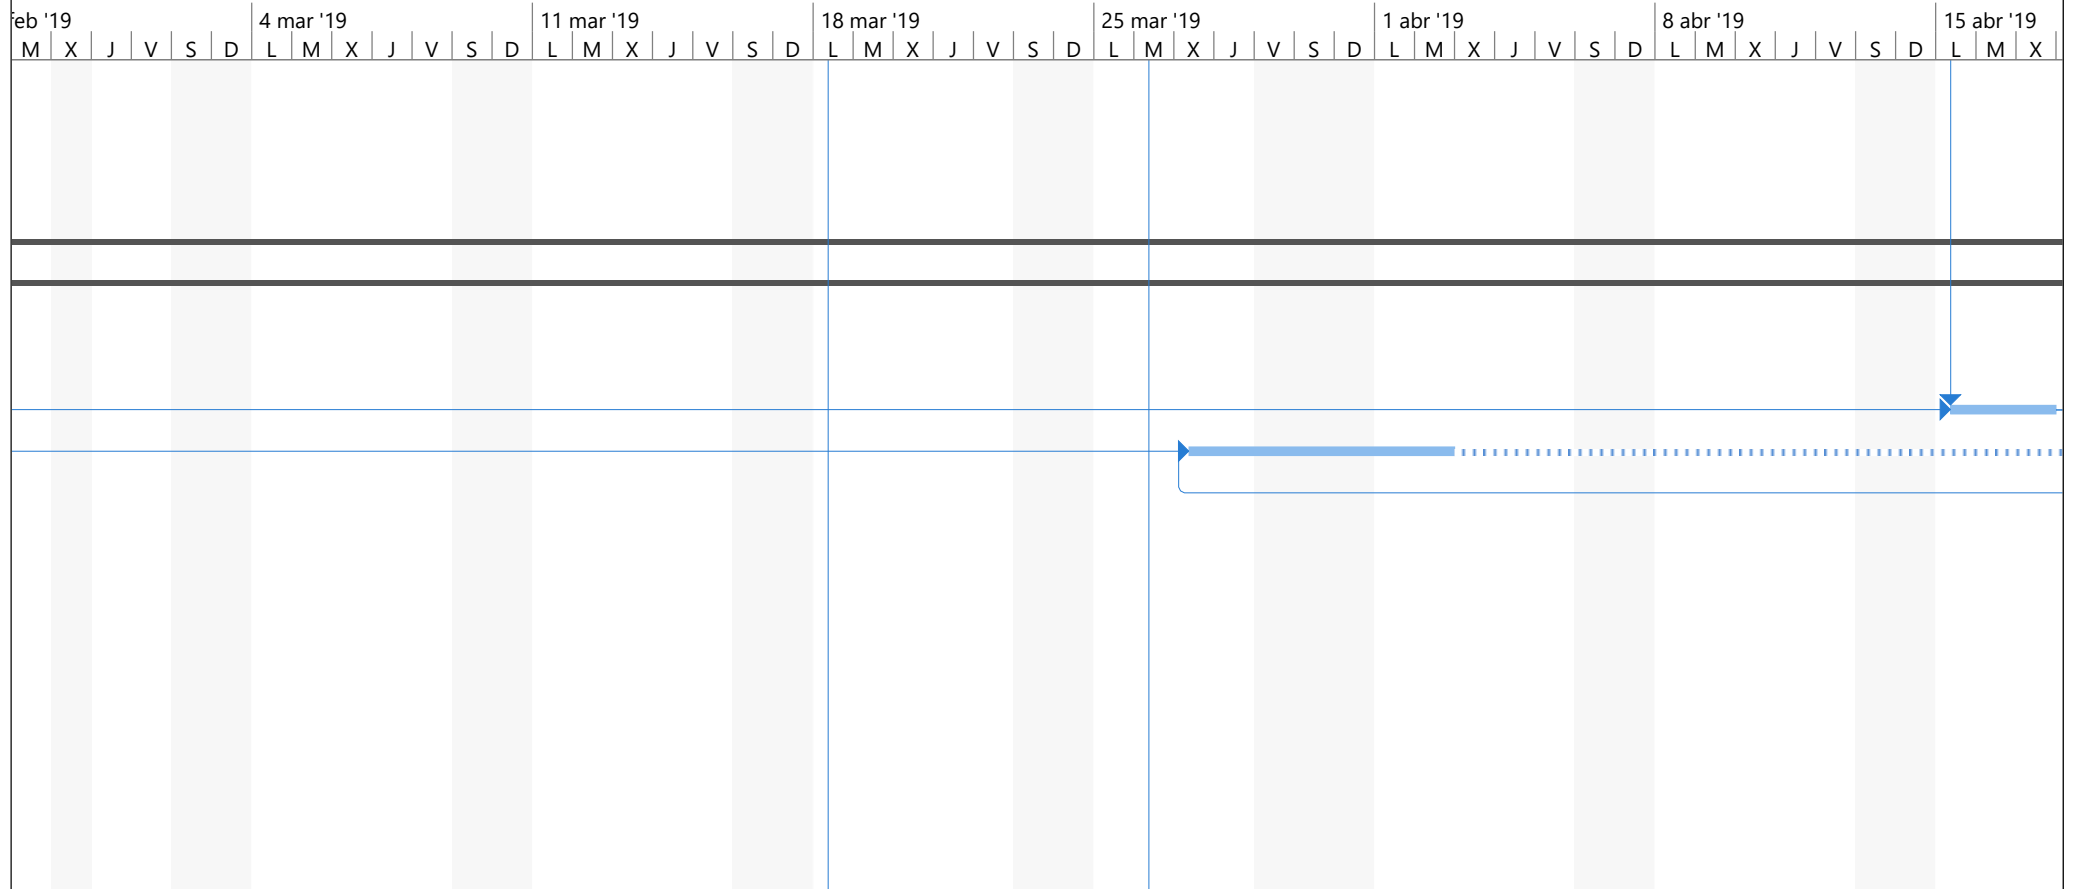


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

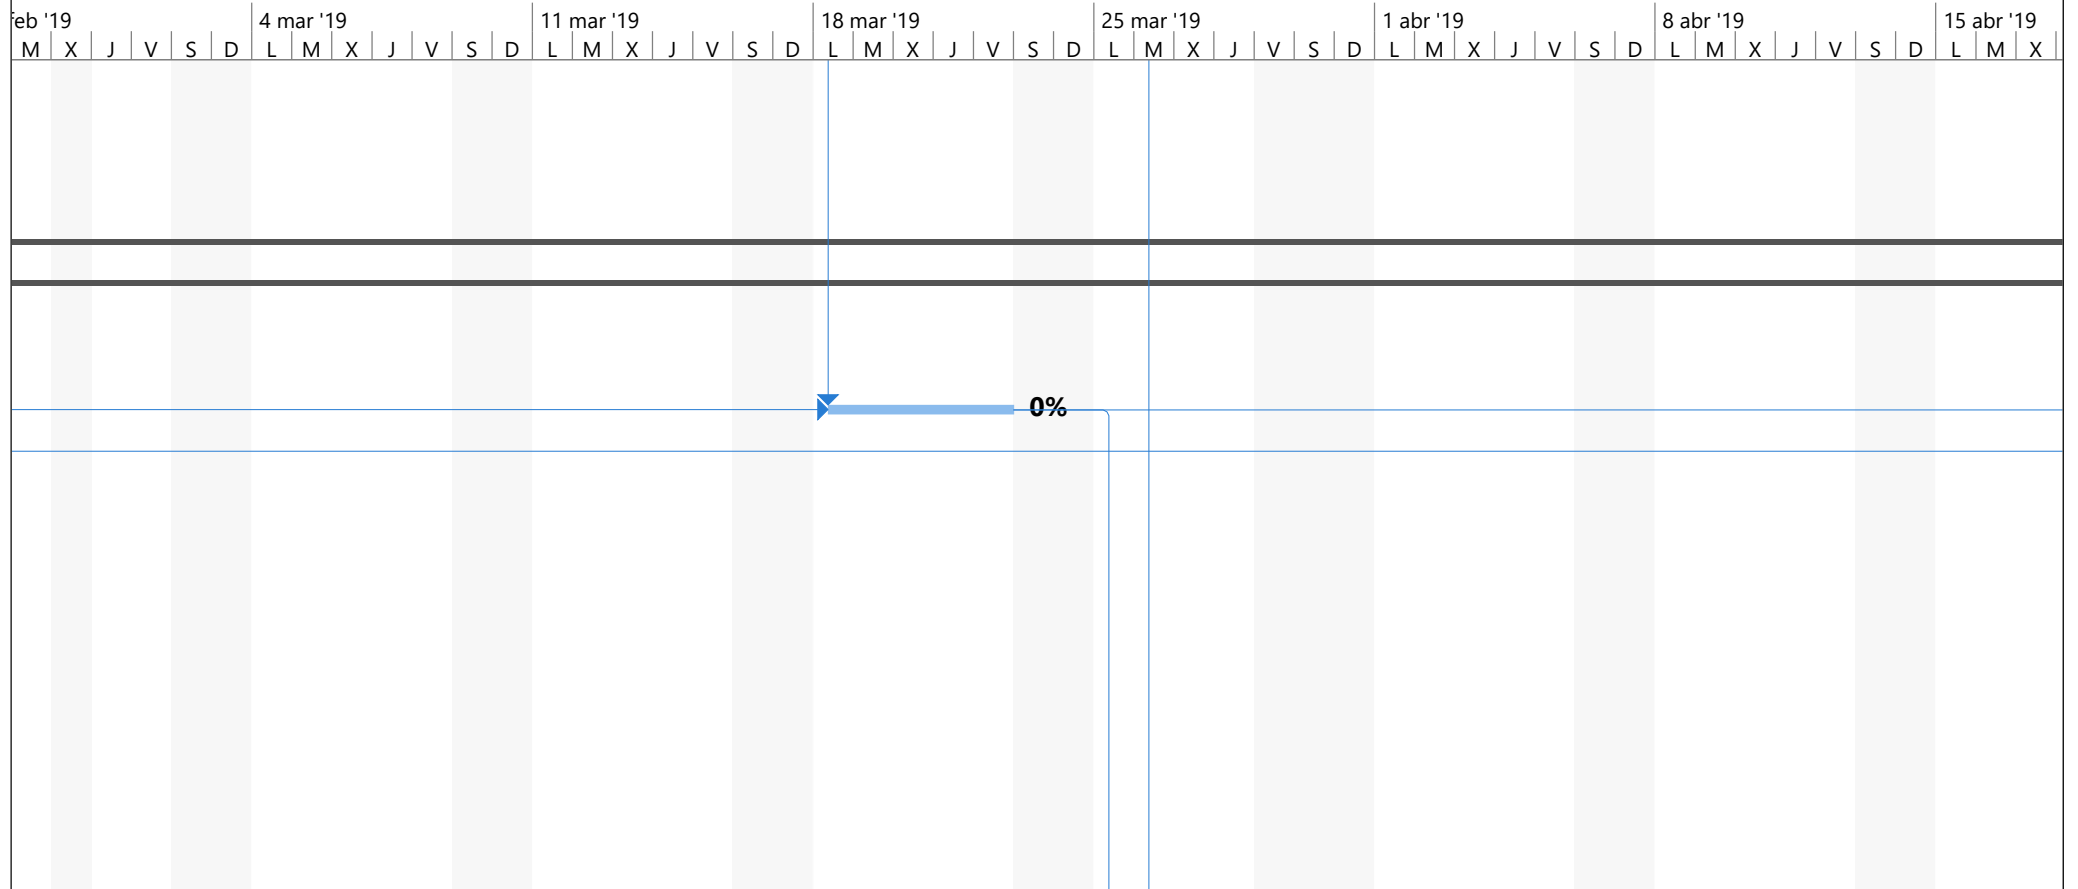

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

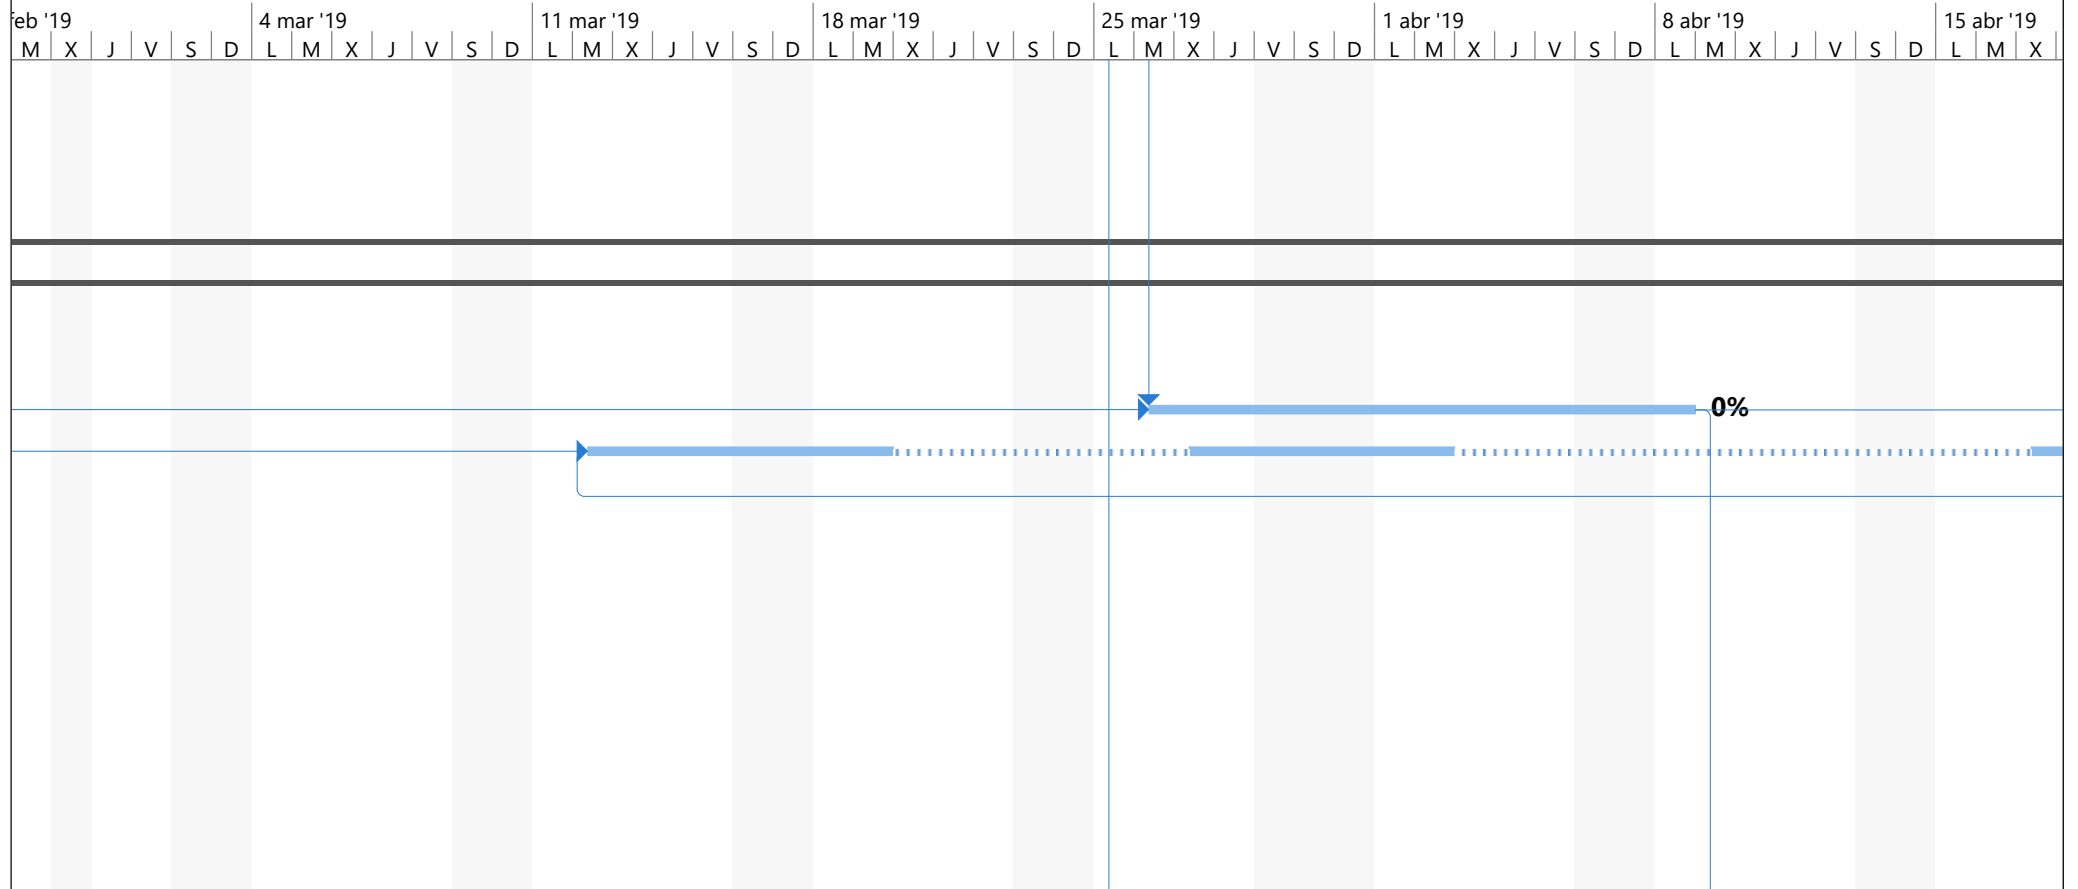


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

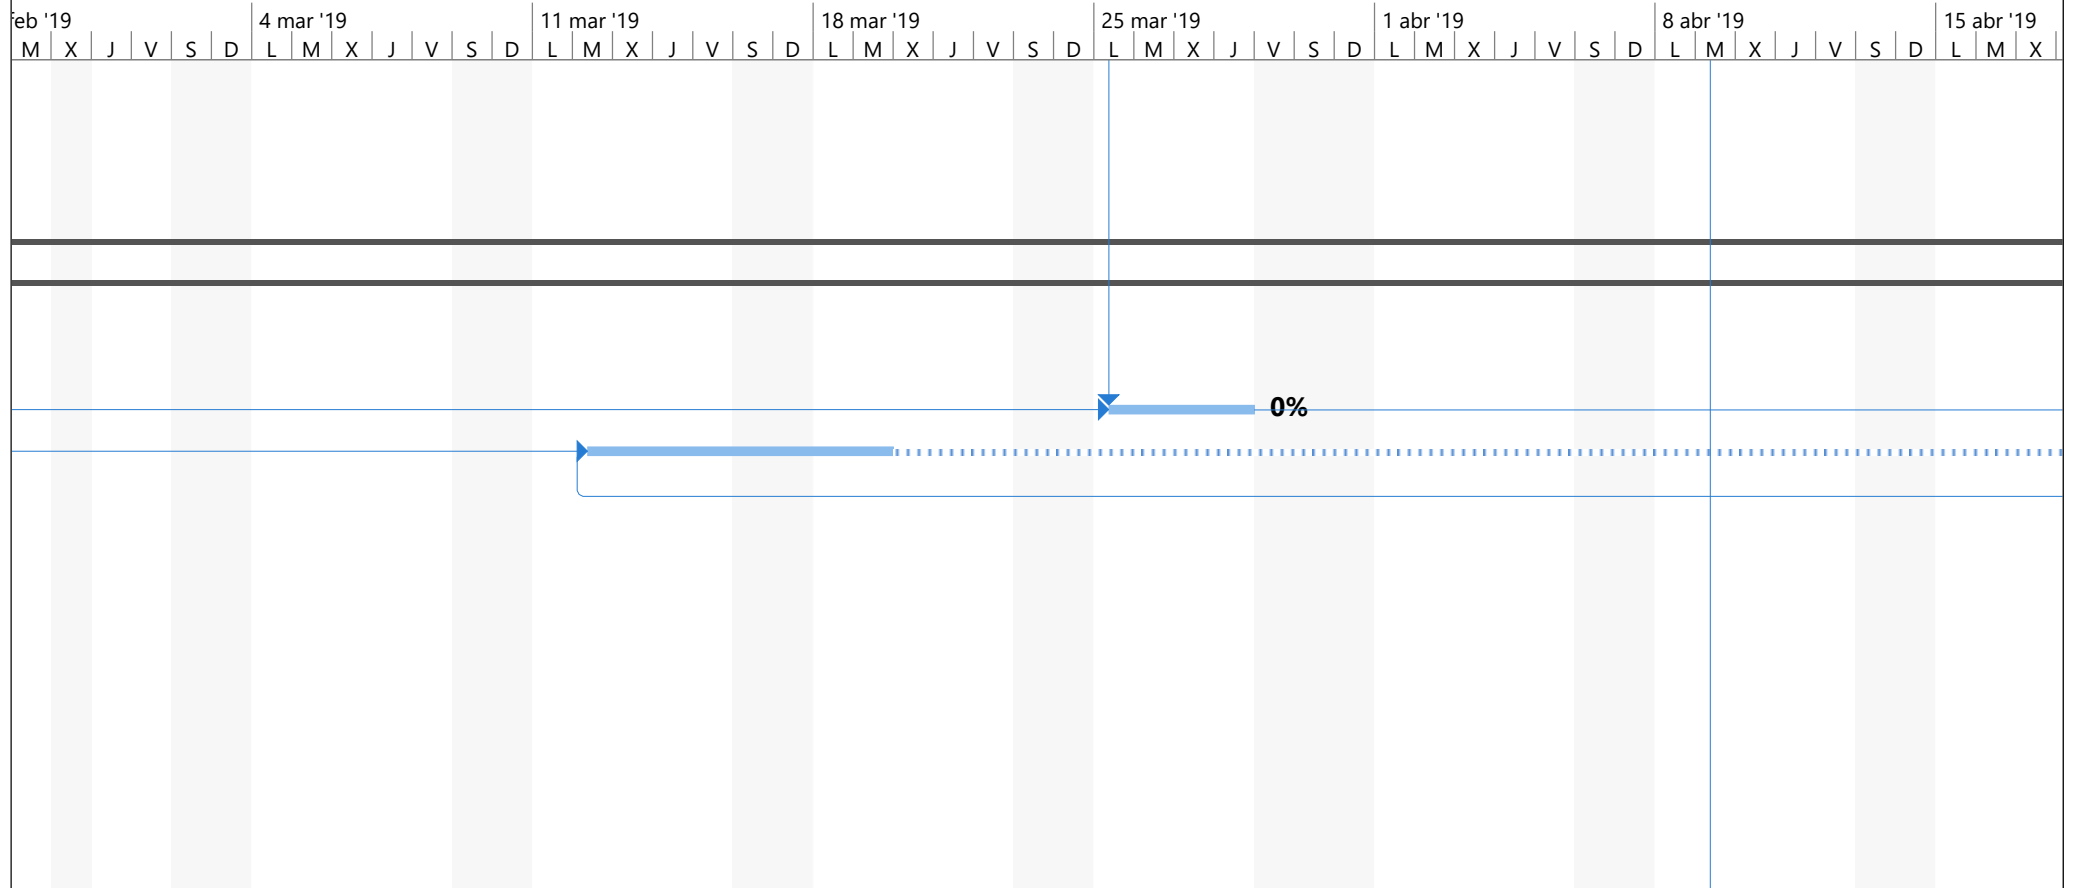

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

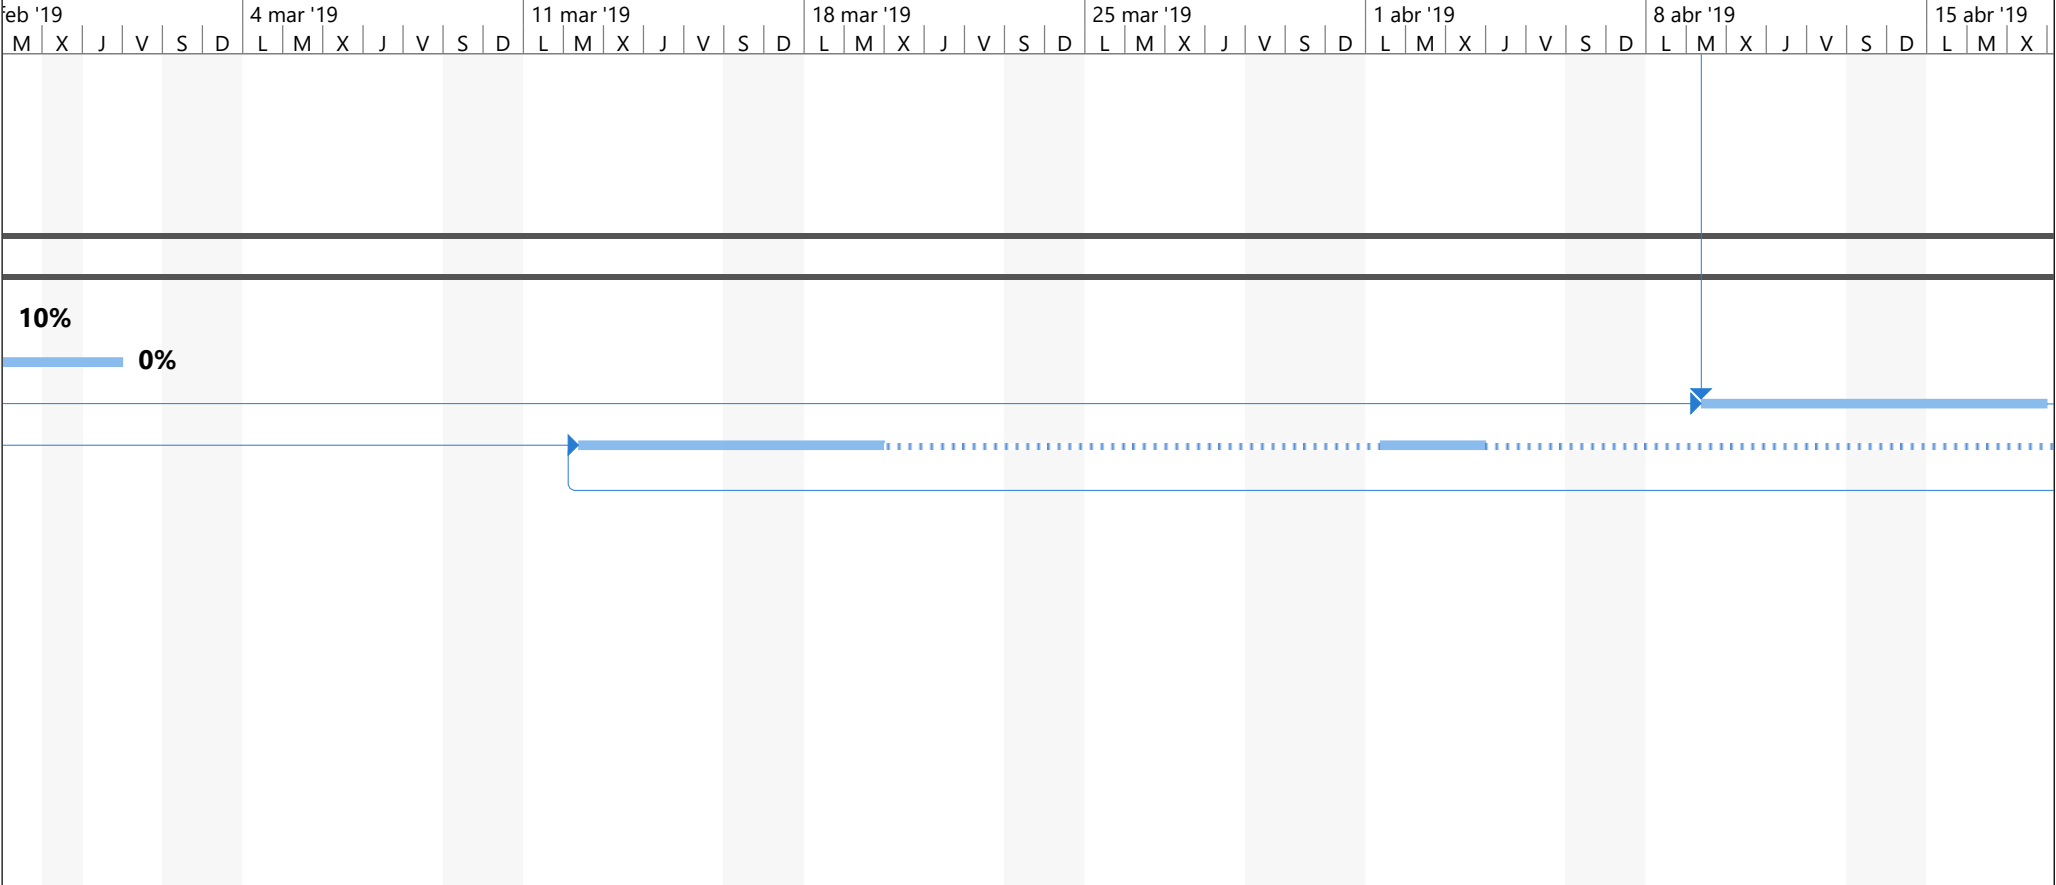

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp


|         |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|
| feb '19 |   |   |   |   |   |   | 4 mar '19 |   |   |   |   |   |   | 11 mar '19 |   |   |   |   |   |   |   | 18 mar '19 |   |   |   |   |   |   | 25 mar '19 |   |   |   |   |   |   | 1 abr '19 |   |   |   |   |   |   | 8 abr '19 |   |   |   |   |   |   | 15 abr '19 |  |  |  |
| M       | X | J | V | S | D | L | M         | X | J | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D | L | M | X          | J | V | S | D | L | M | X          | J | V | S | D | L | M | X         | J | V | S | D | L | M | X         | J | V | S | D | L | M | X          |  |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

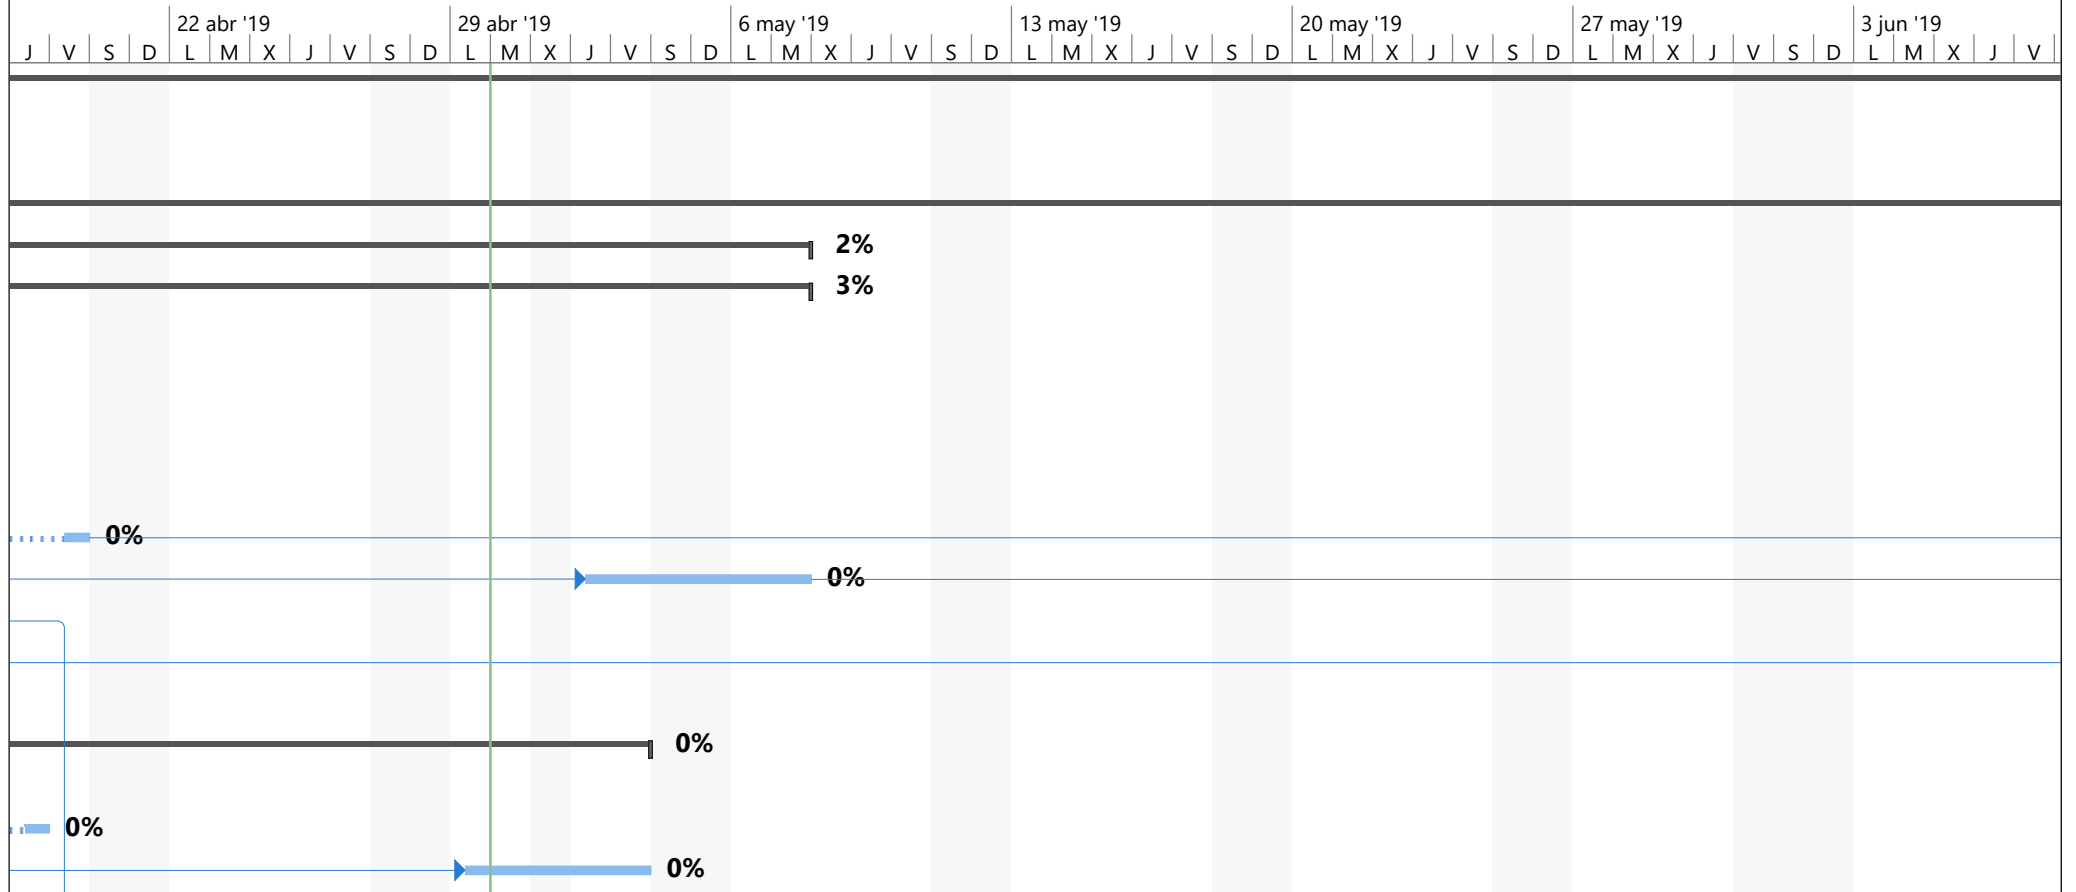


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

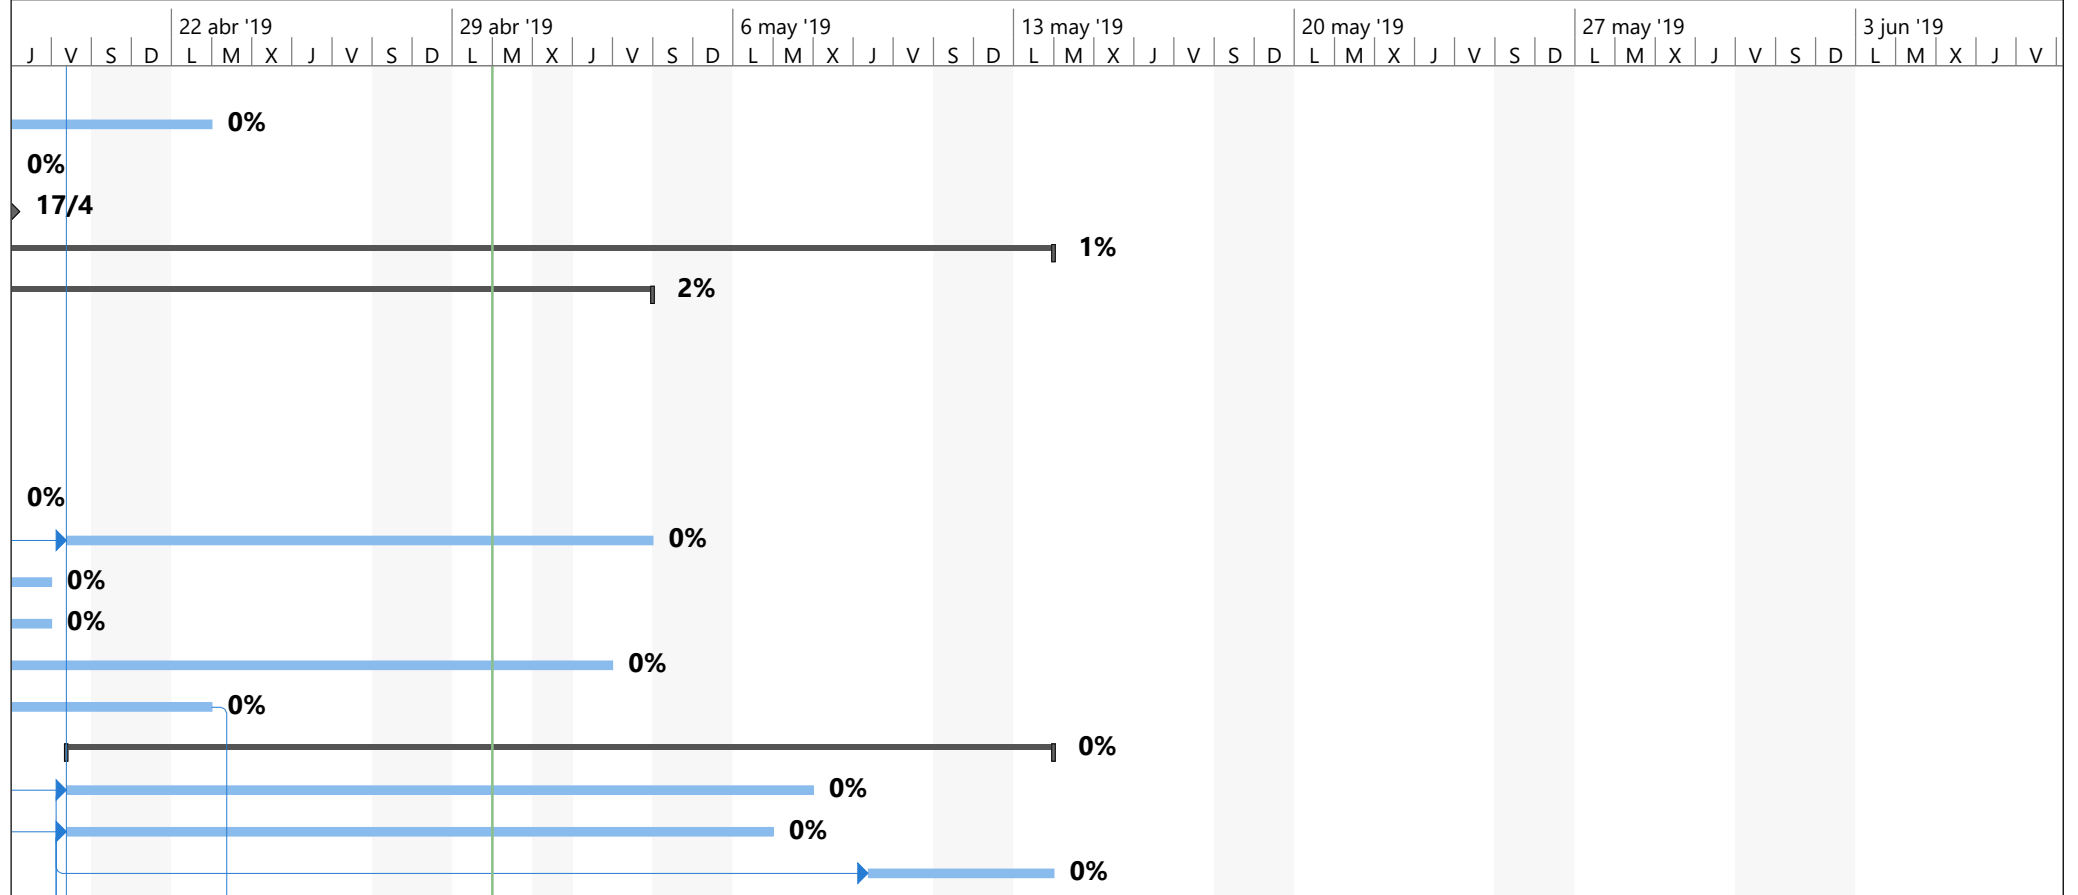


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

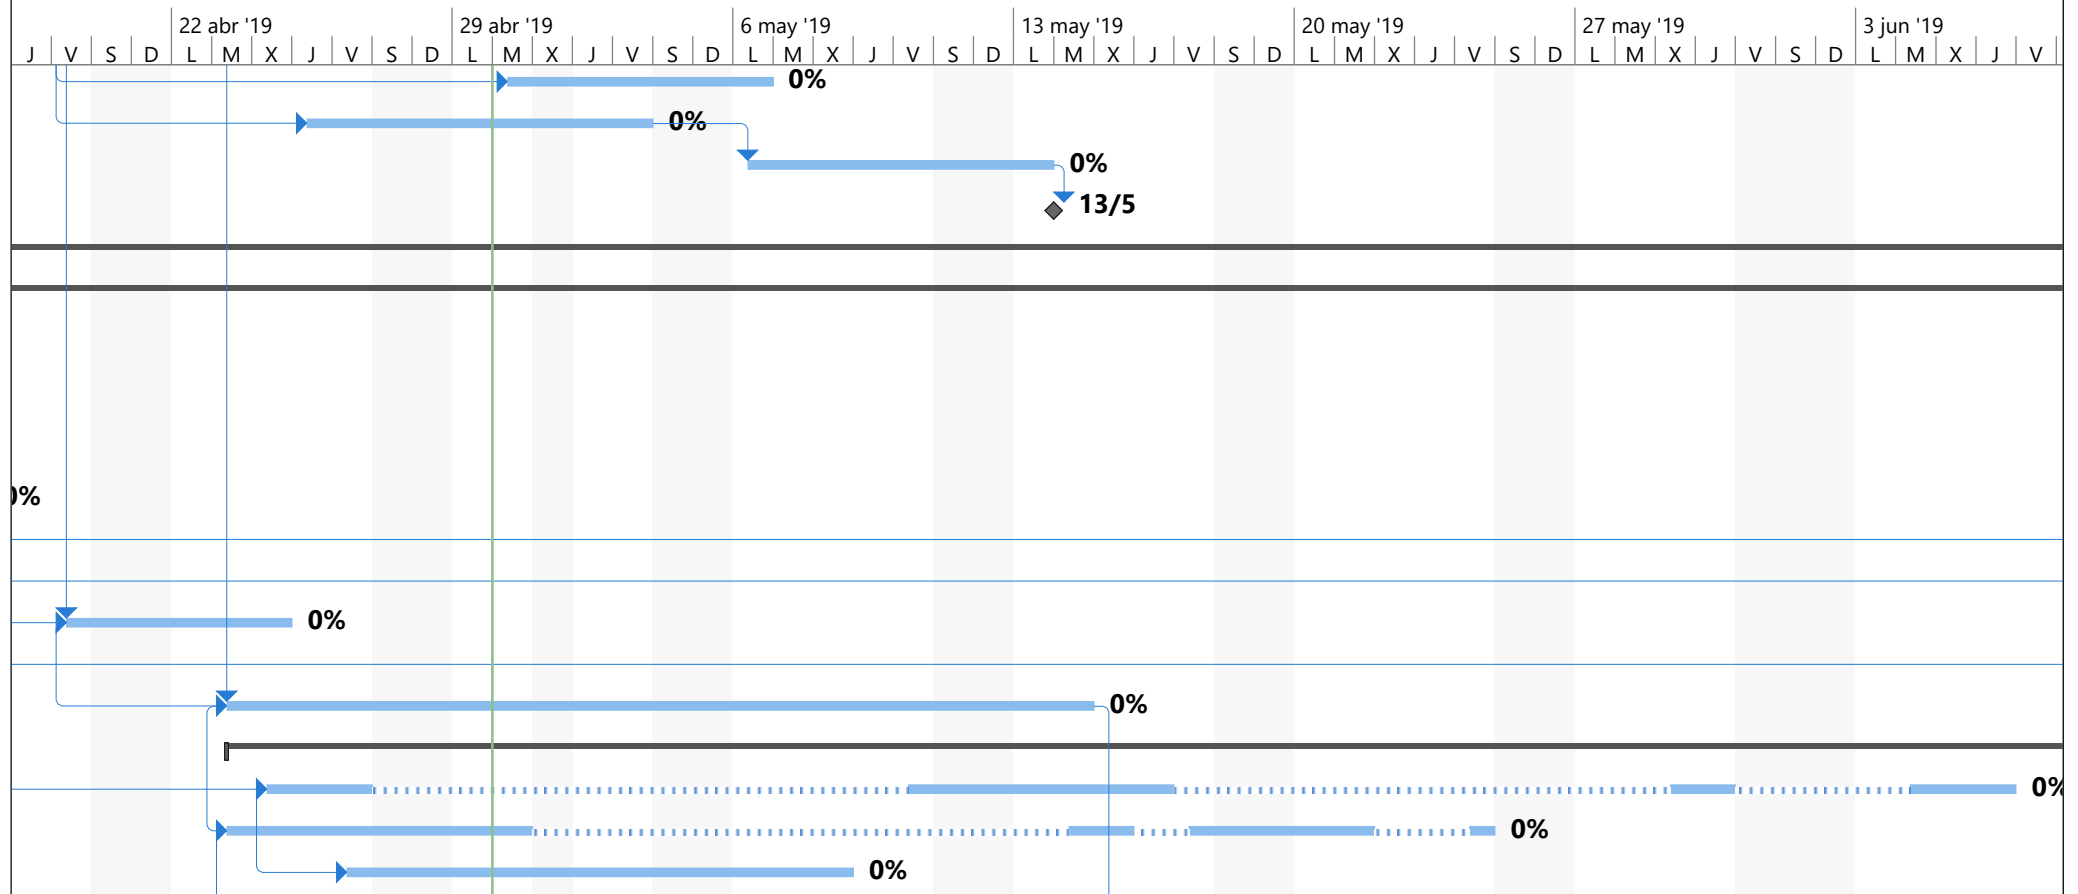


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

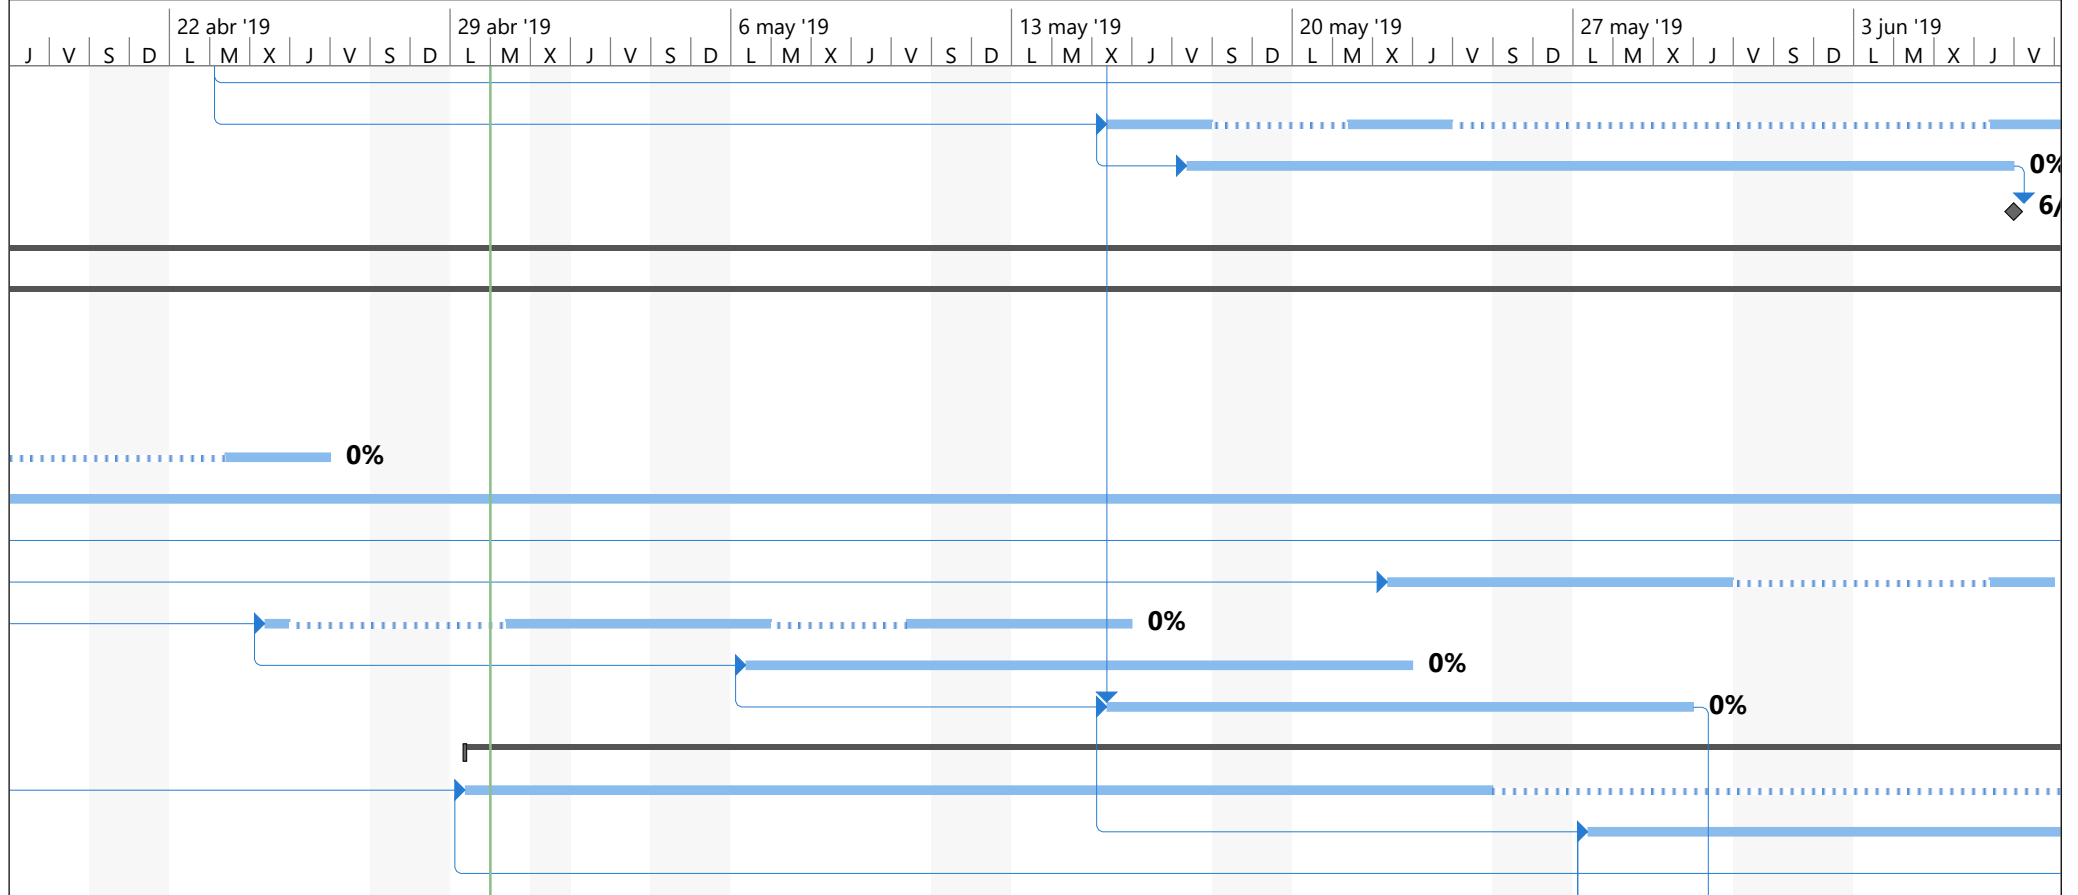


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

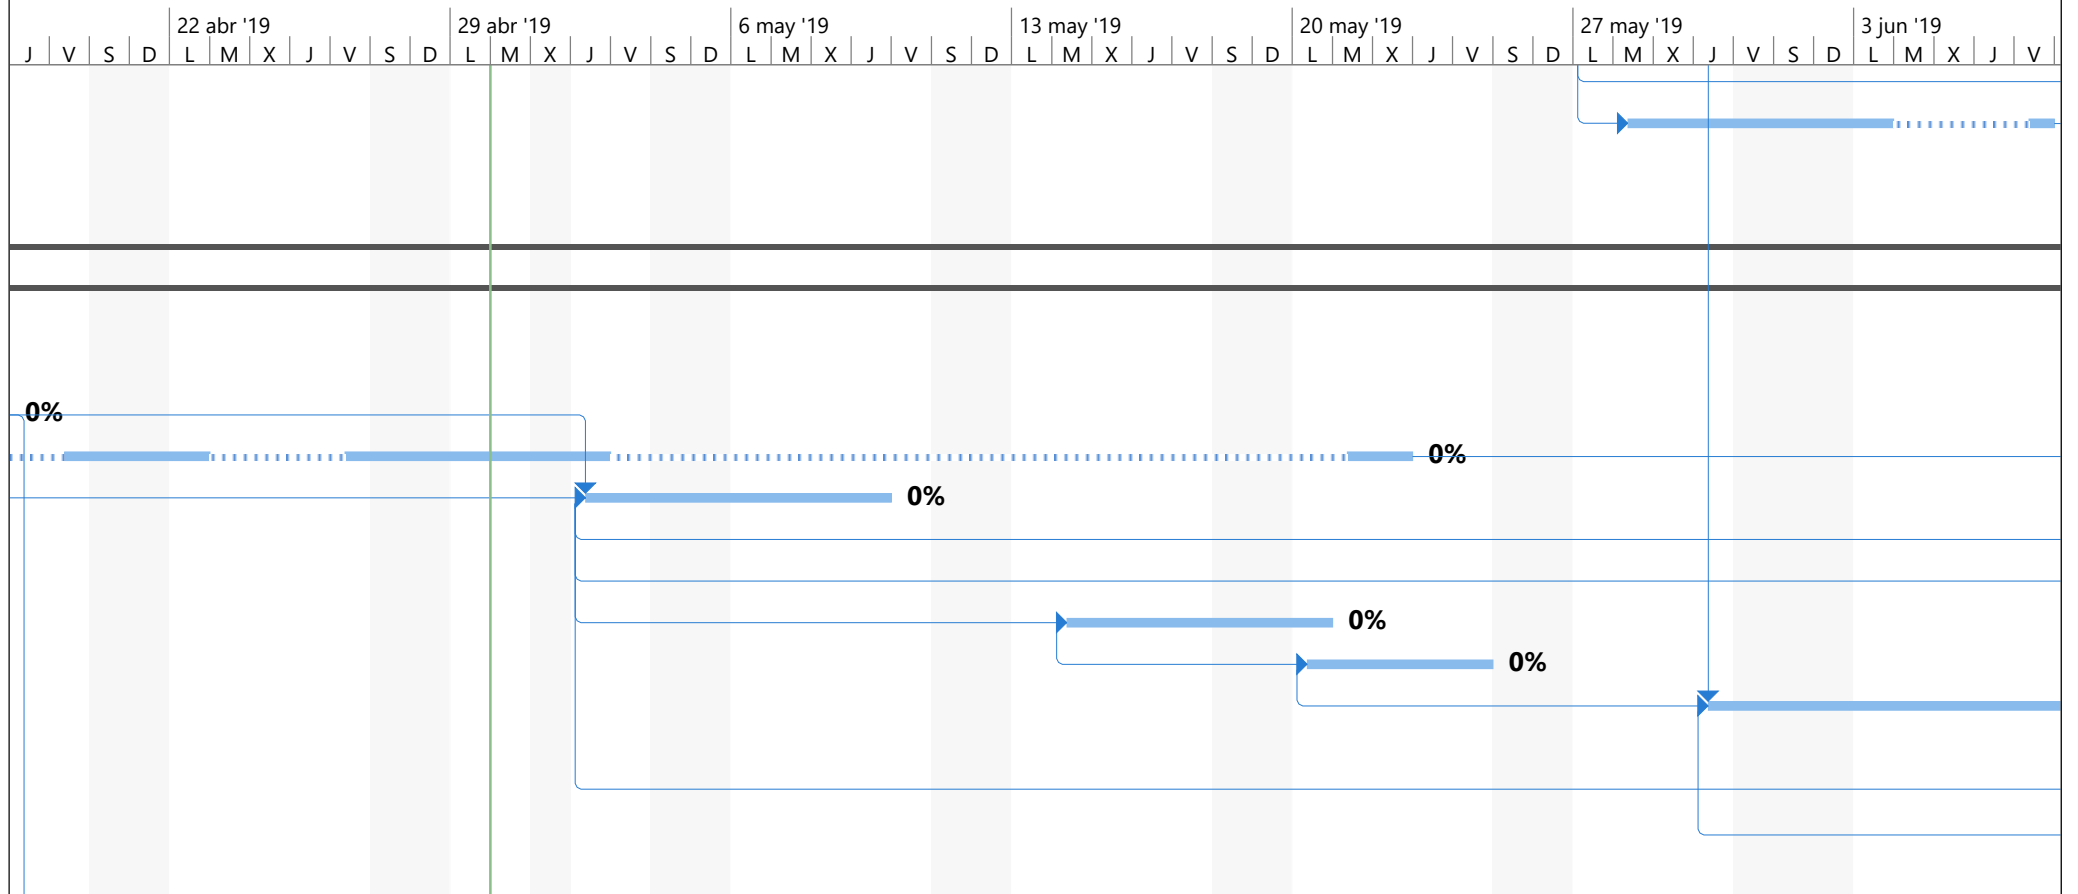


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

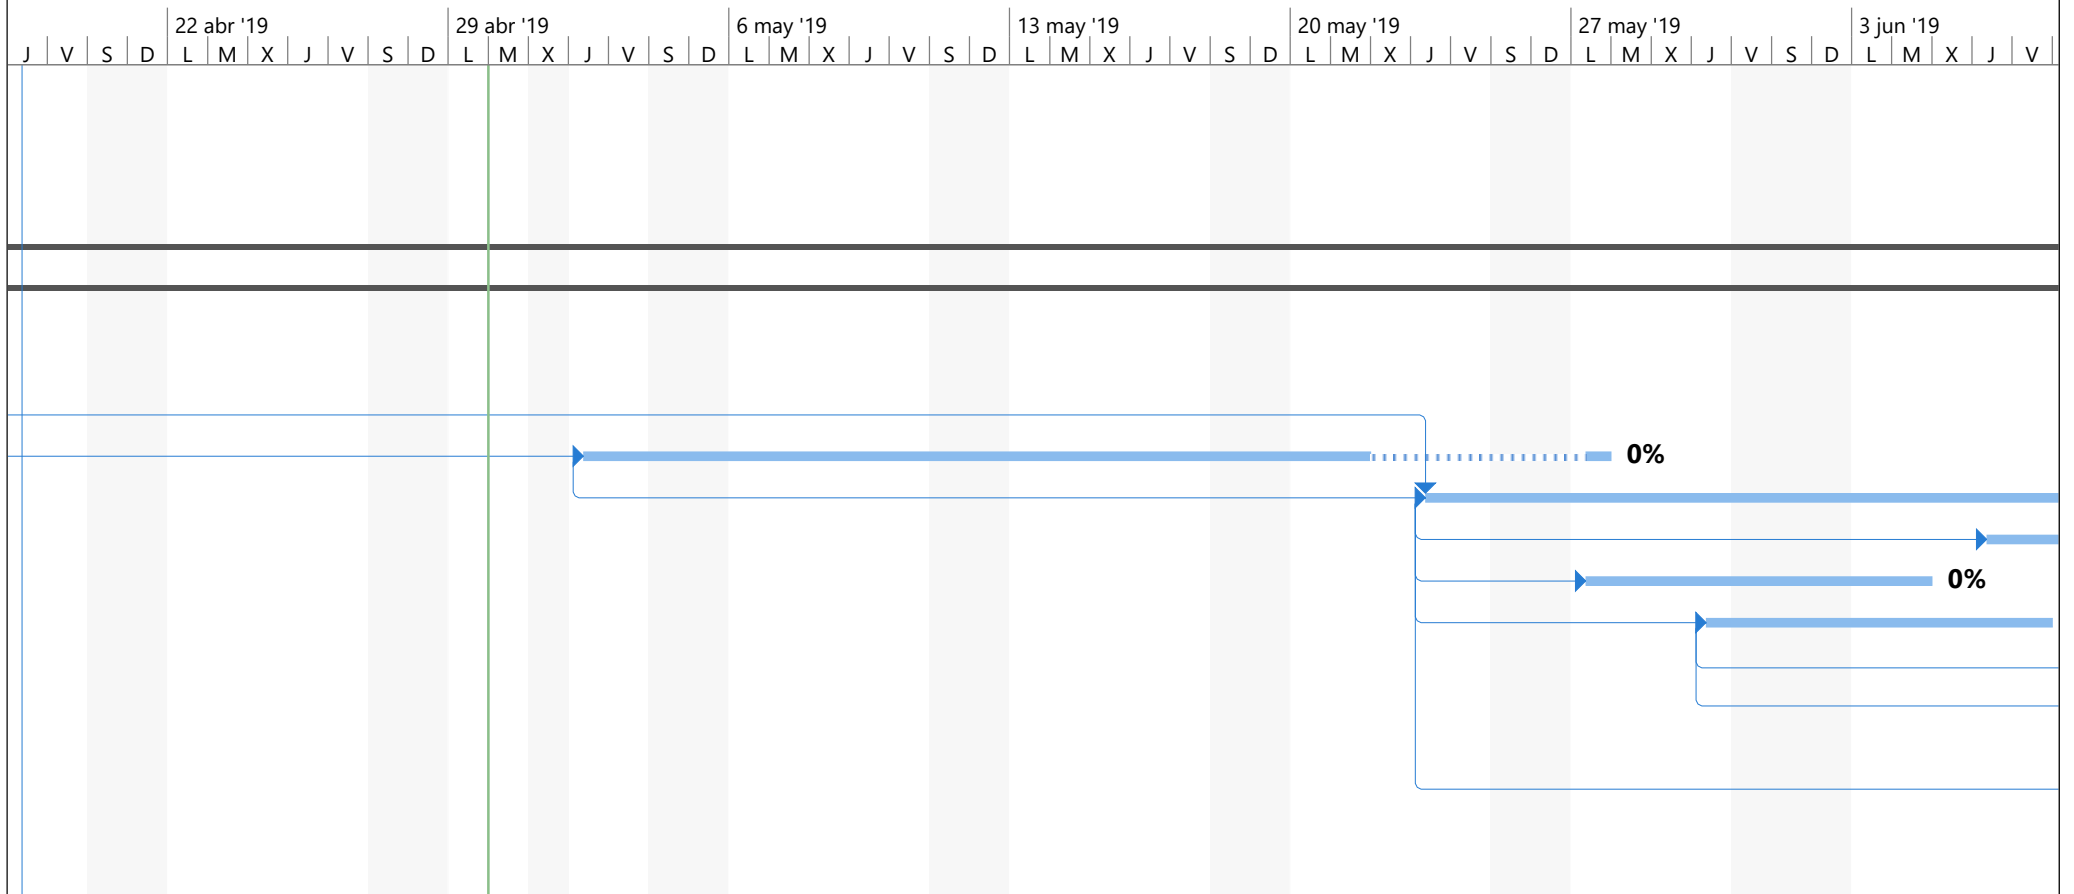


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

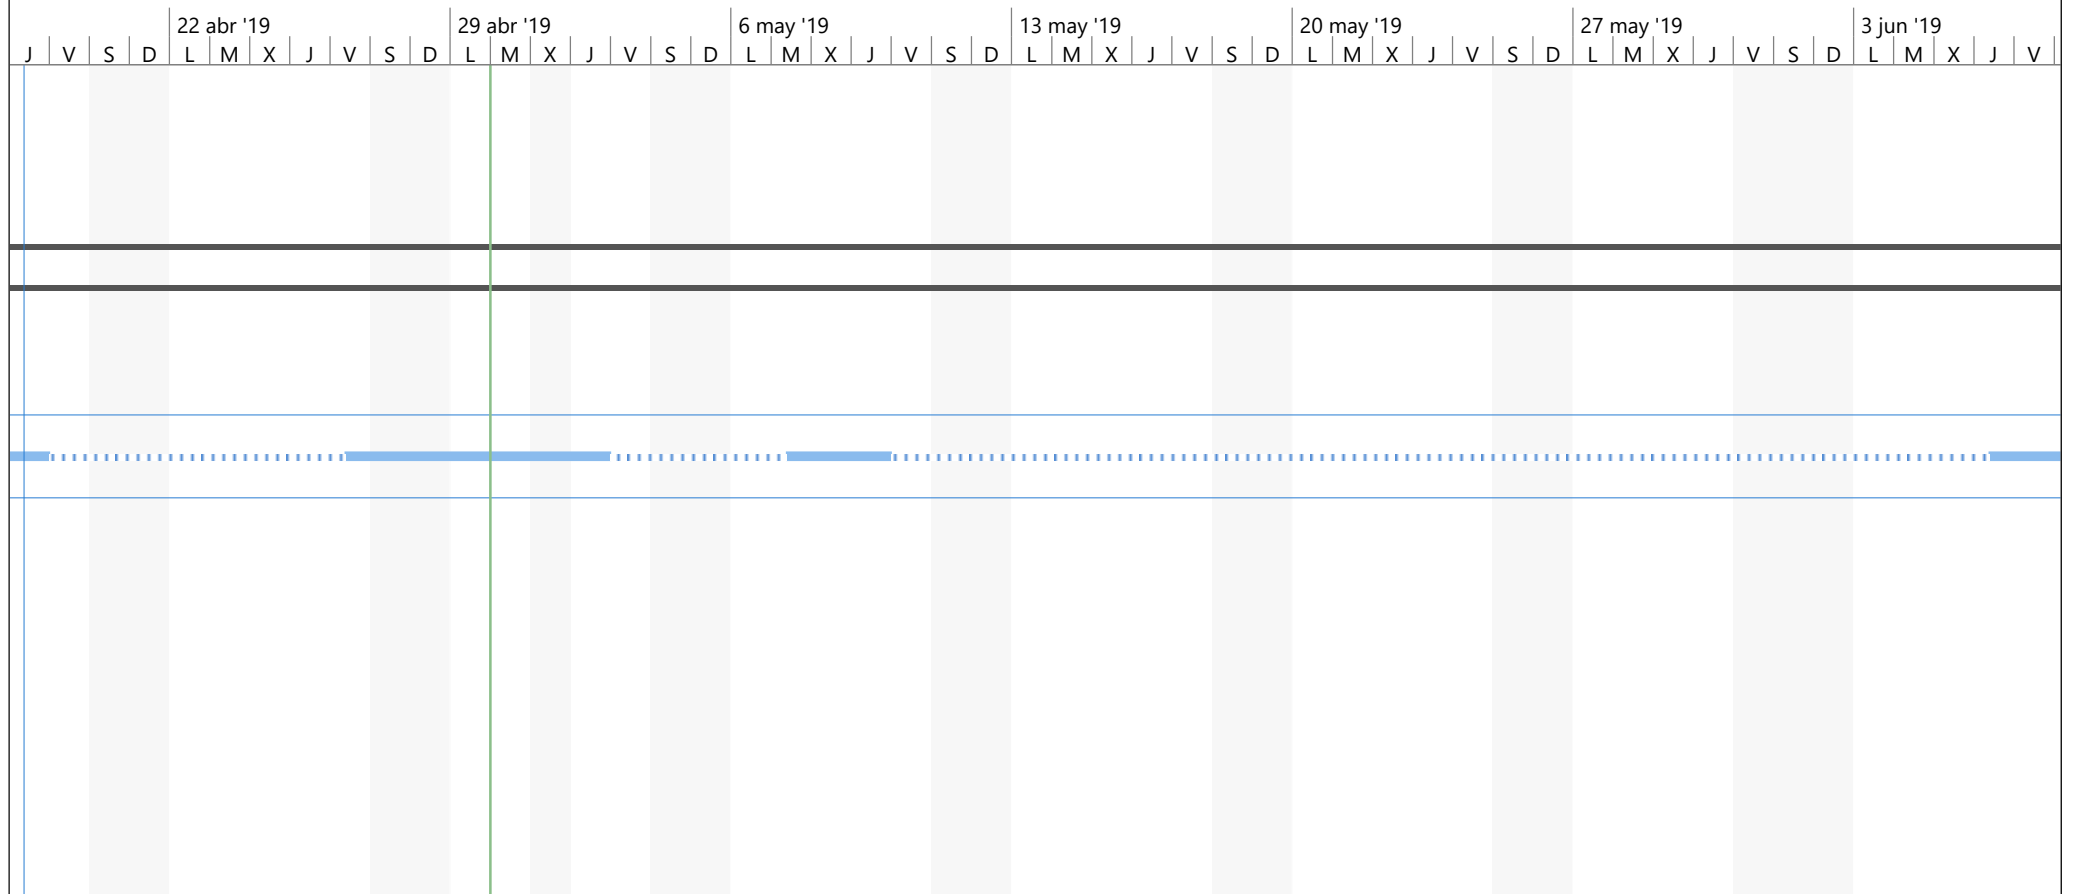

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

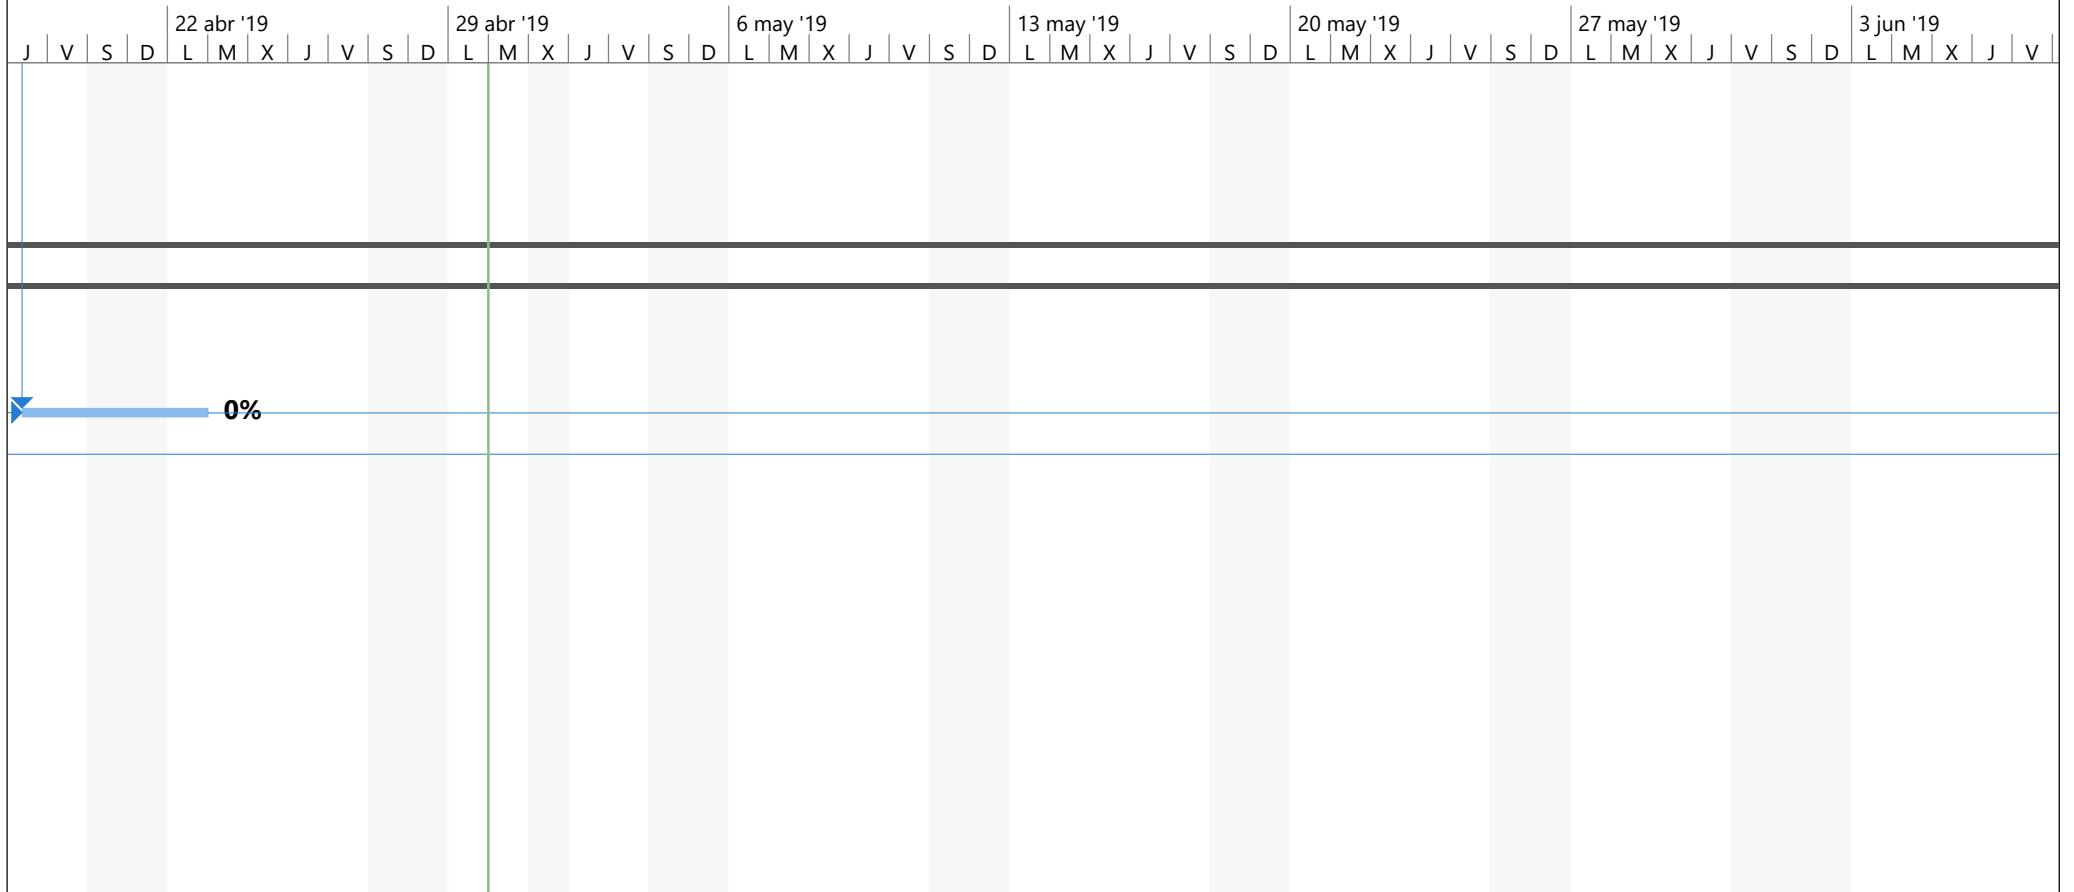

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

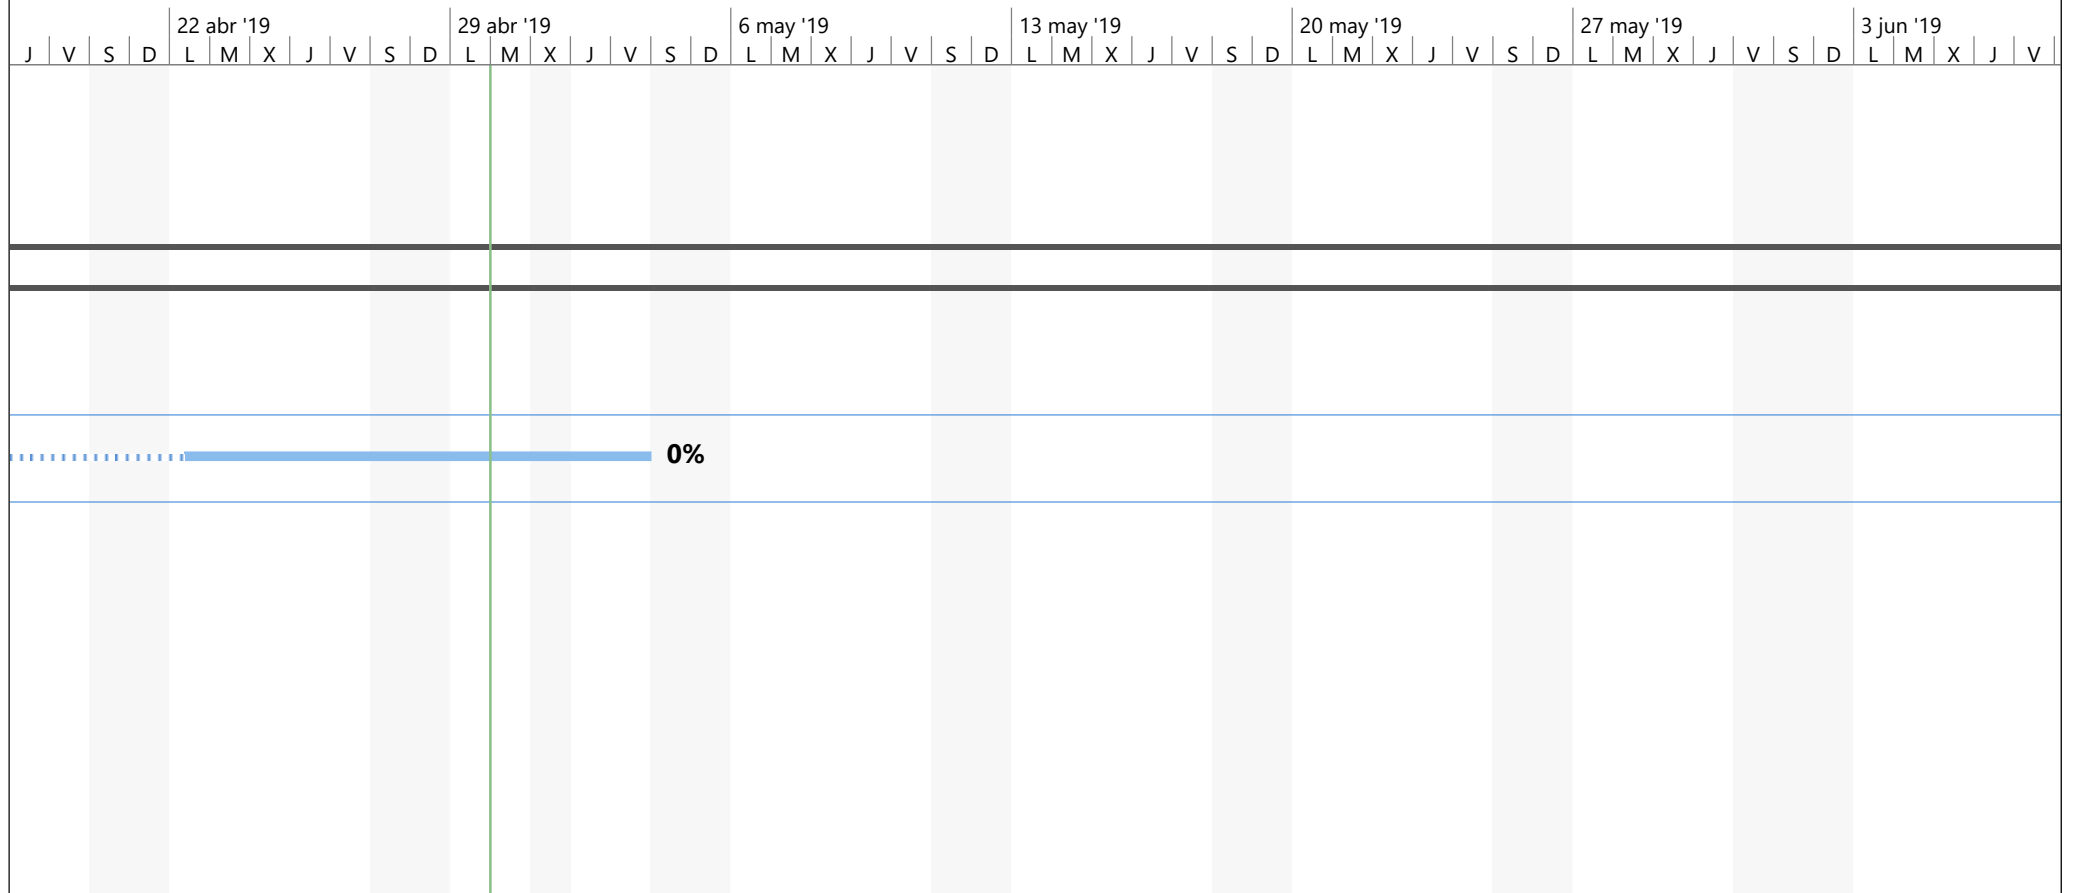

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

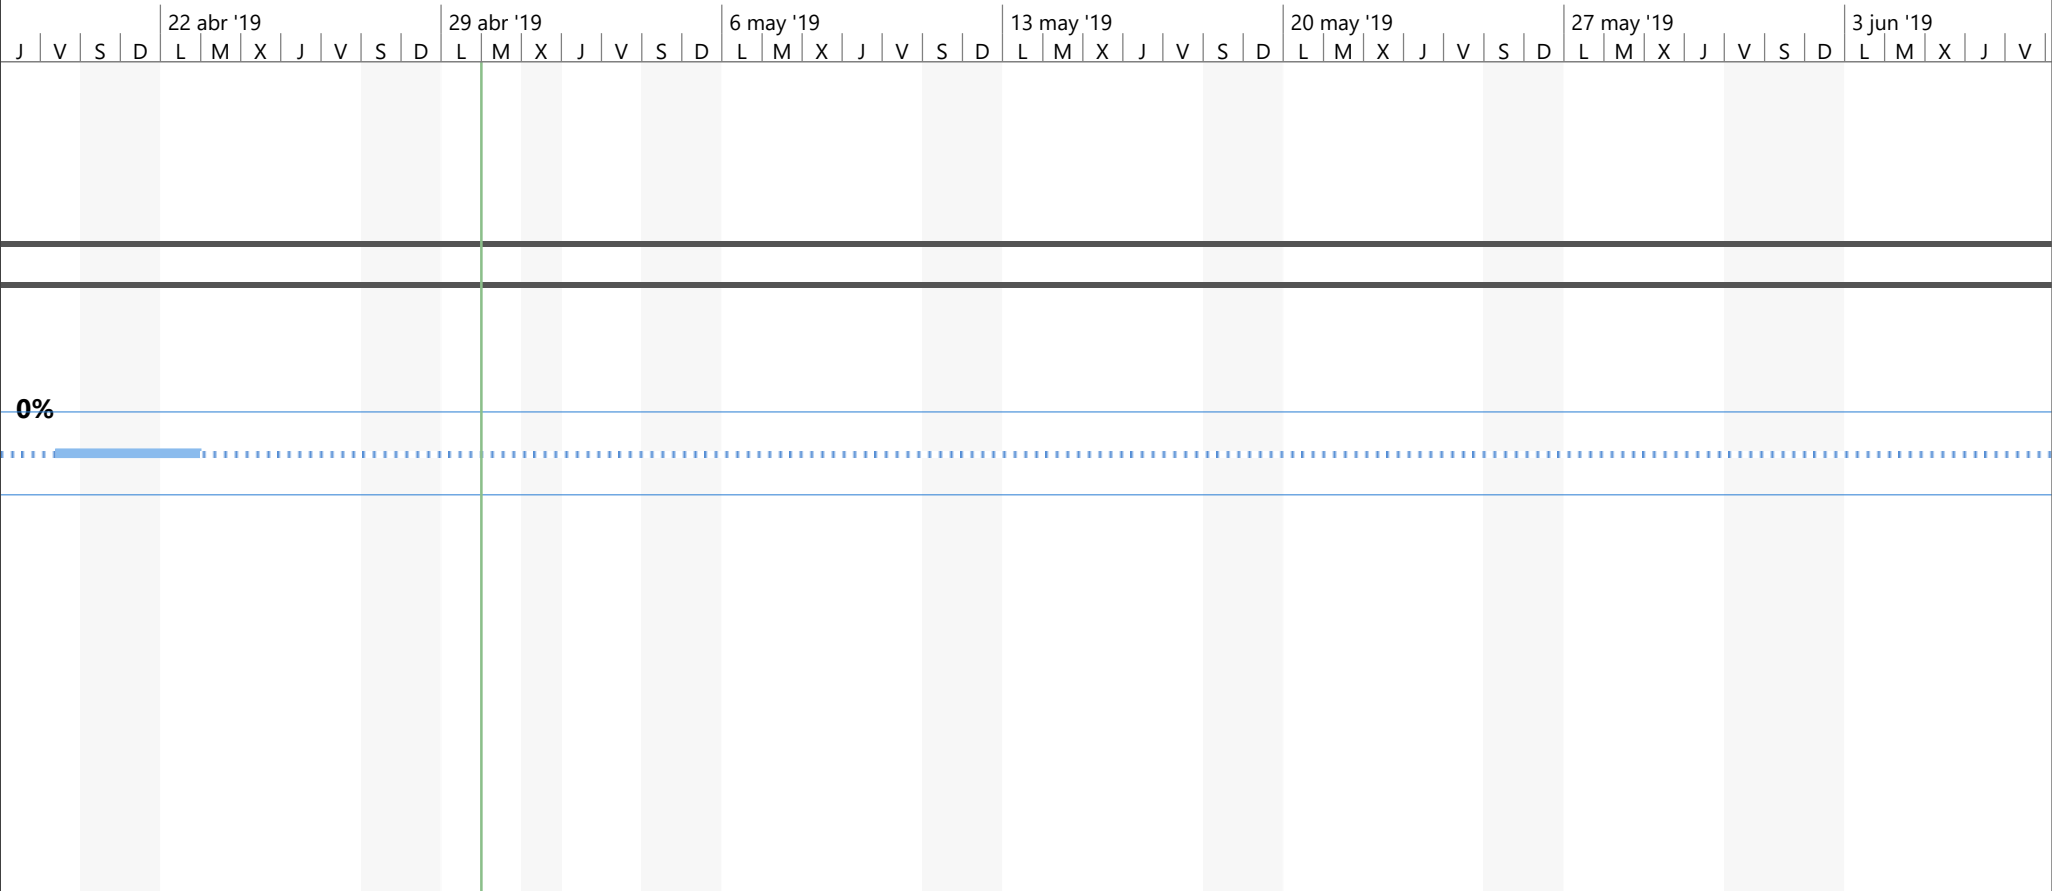

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

|   |   |   |   | 22 abr '19 |   |   |   | 29 abr '19 |   |   |   | 6 may '19 |   |   |   | 13 may '19 |   |   |   | 20 may '19 |   |   |   | 27 may '19 |   |   |   | 3 jun '19 |   |   |   |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S | D |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |





|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

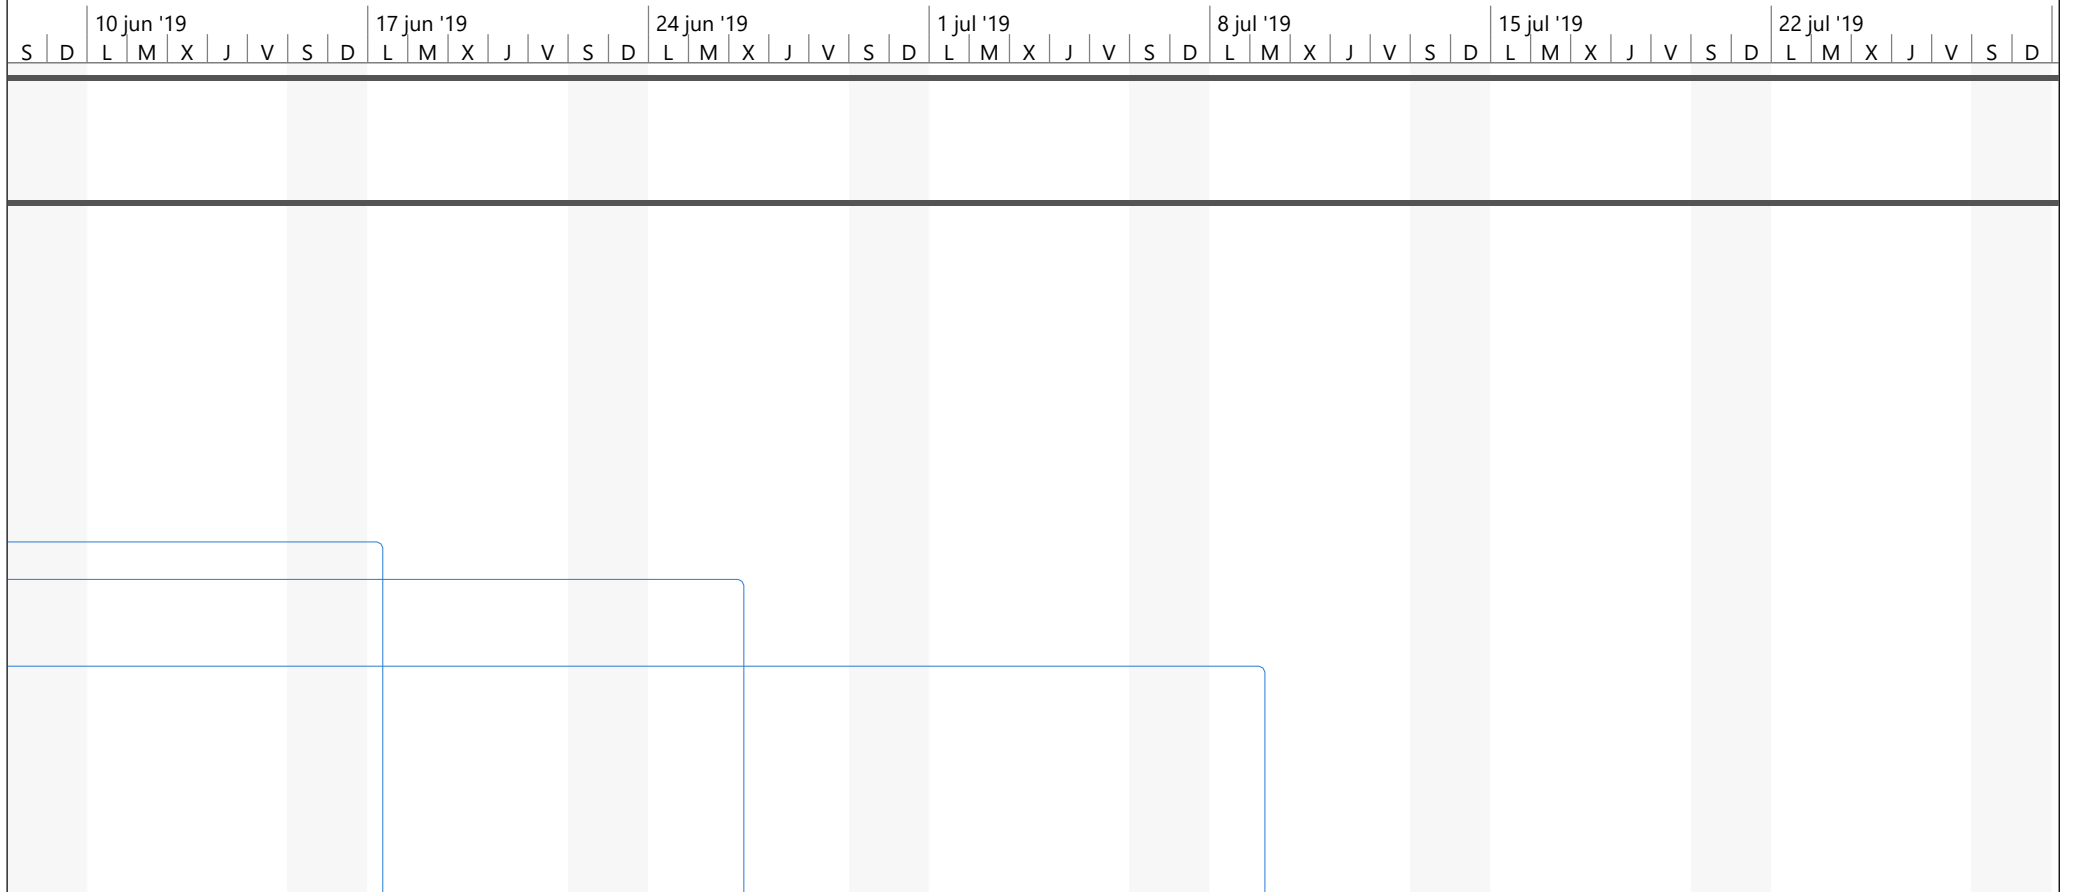


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| S | D | 10 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 17 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 24 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 1 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 8 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 15 jul '19 |  |  |  |  |  |  | 22 jul '19 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

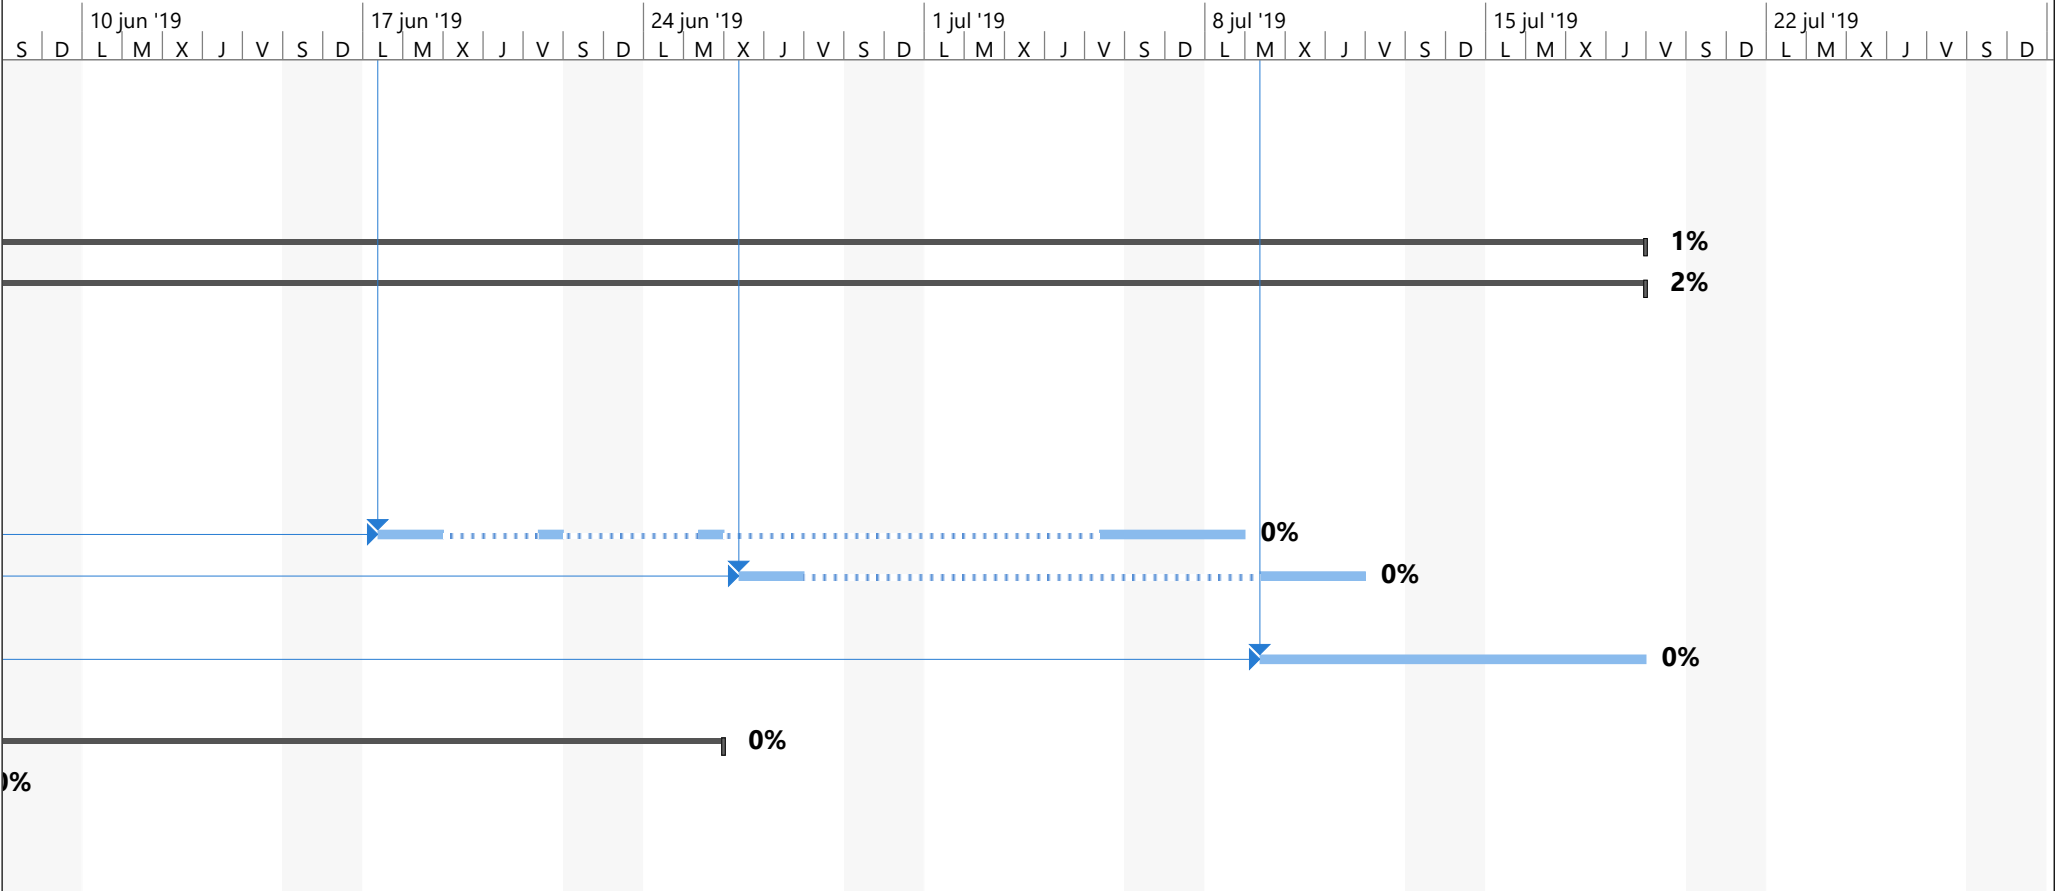


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

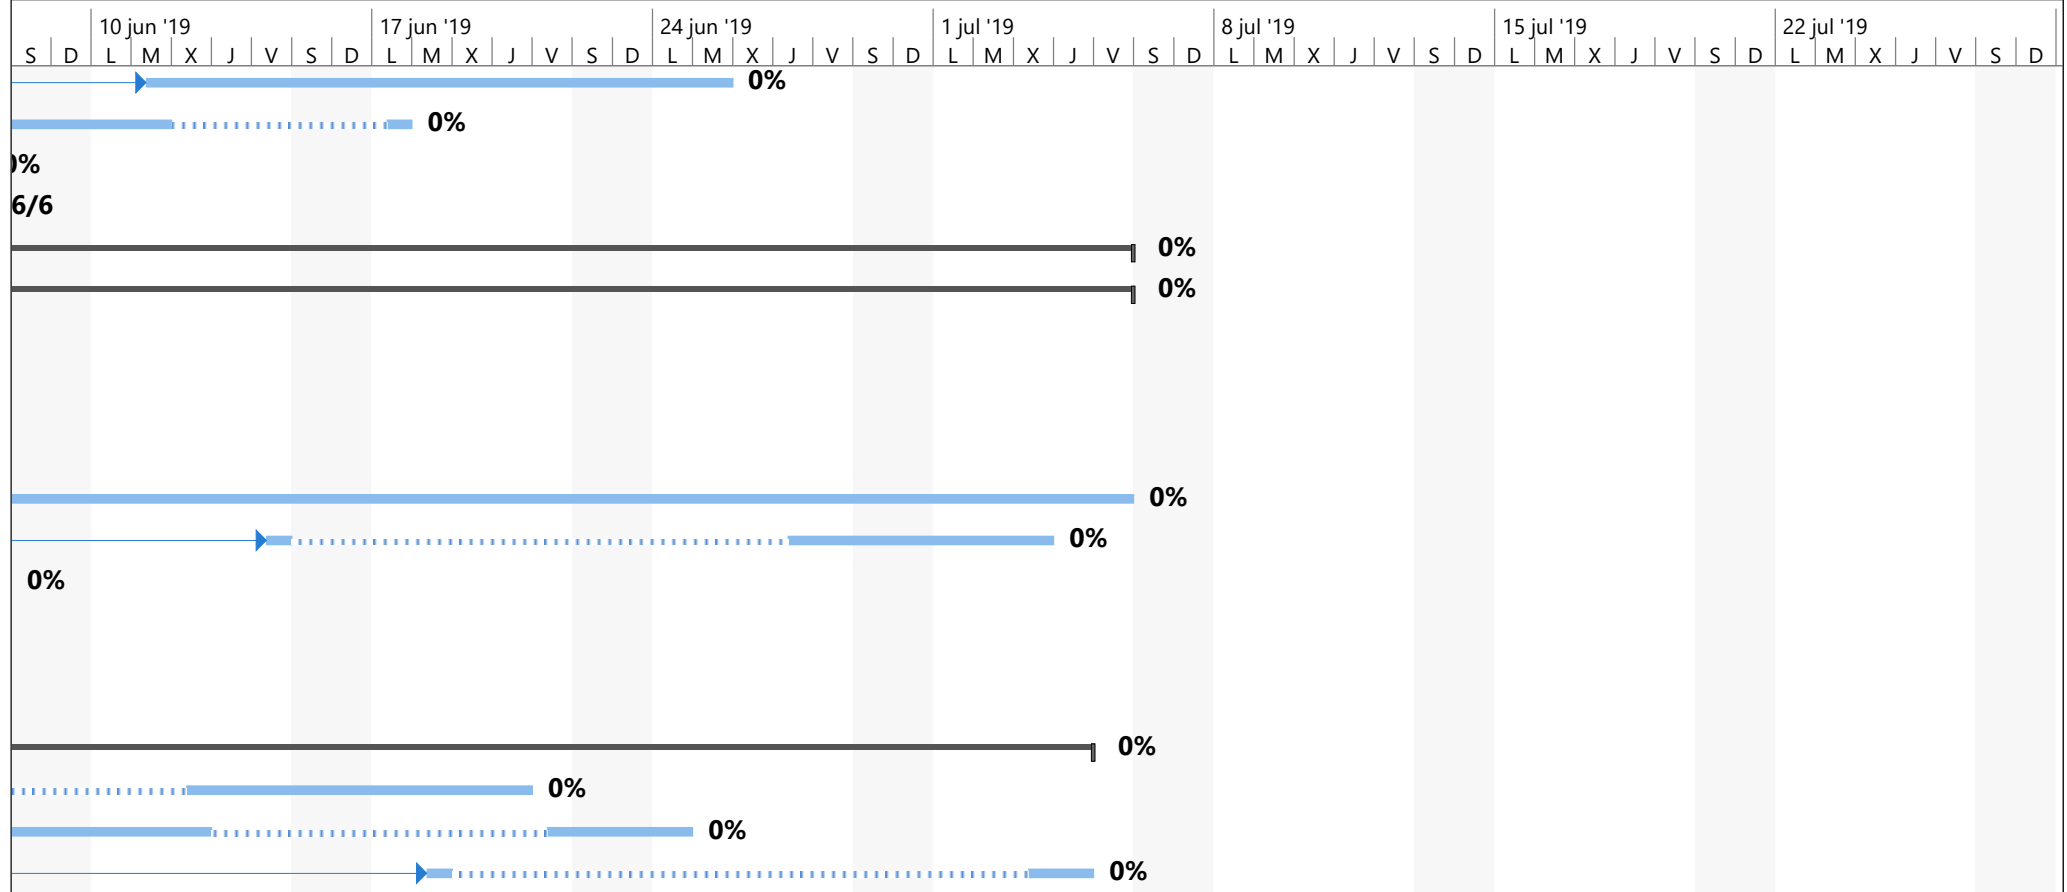

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

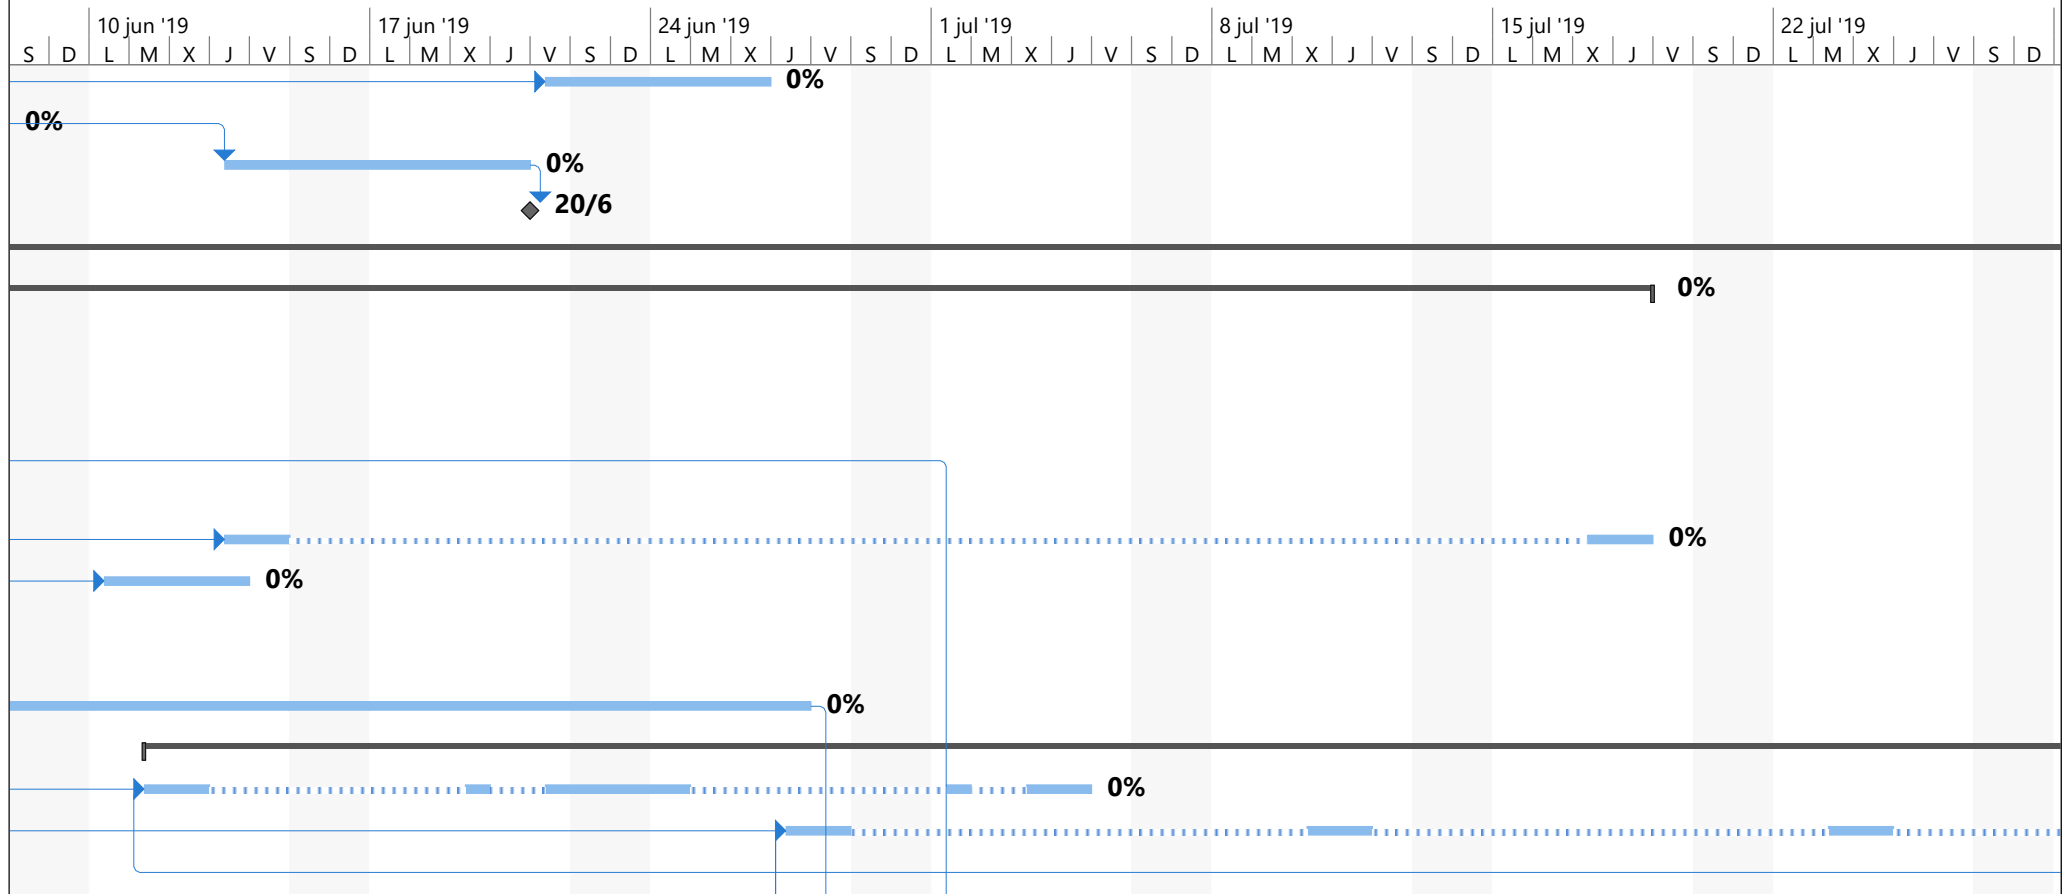


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

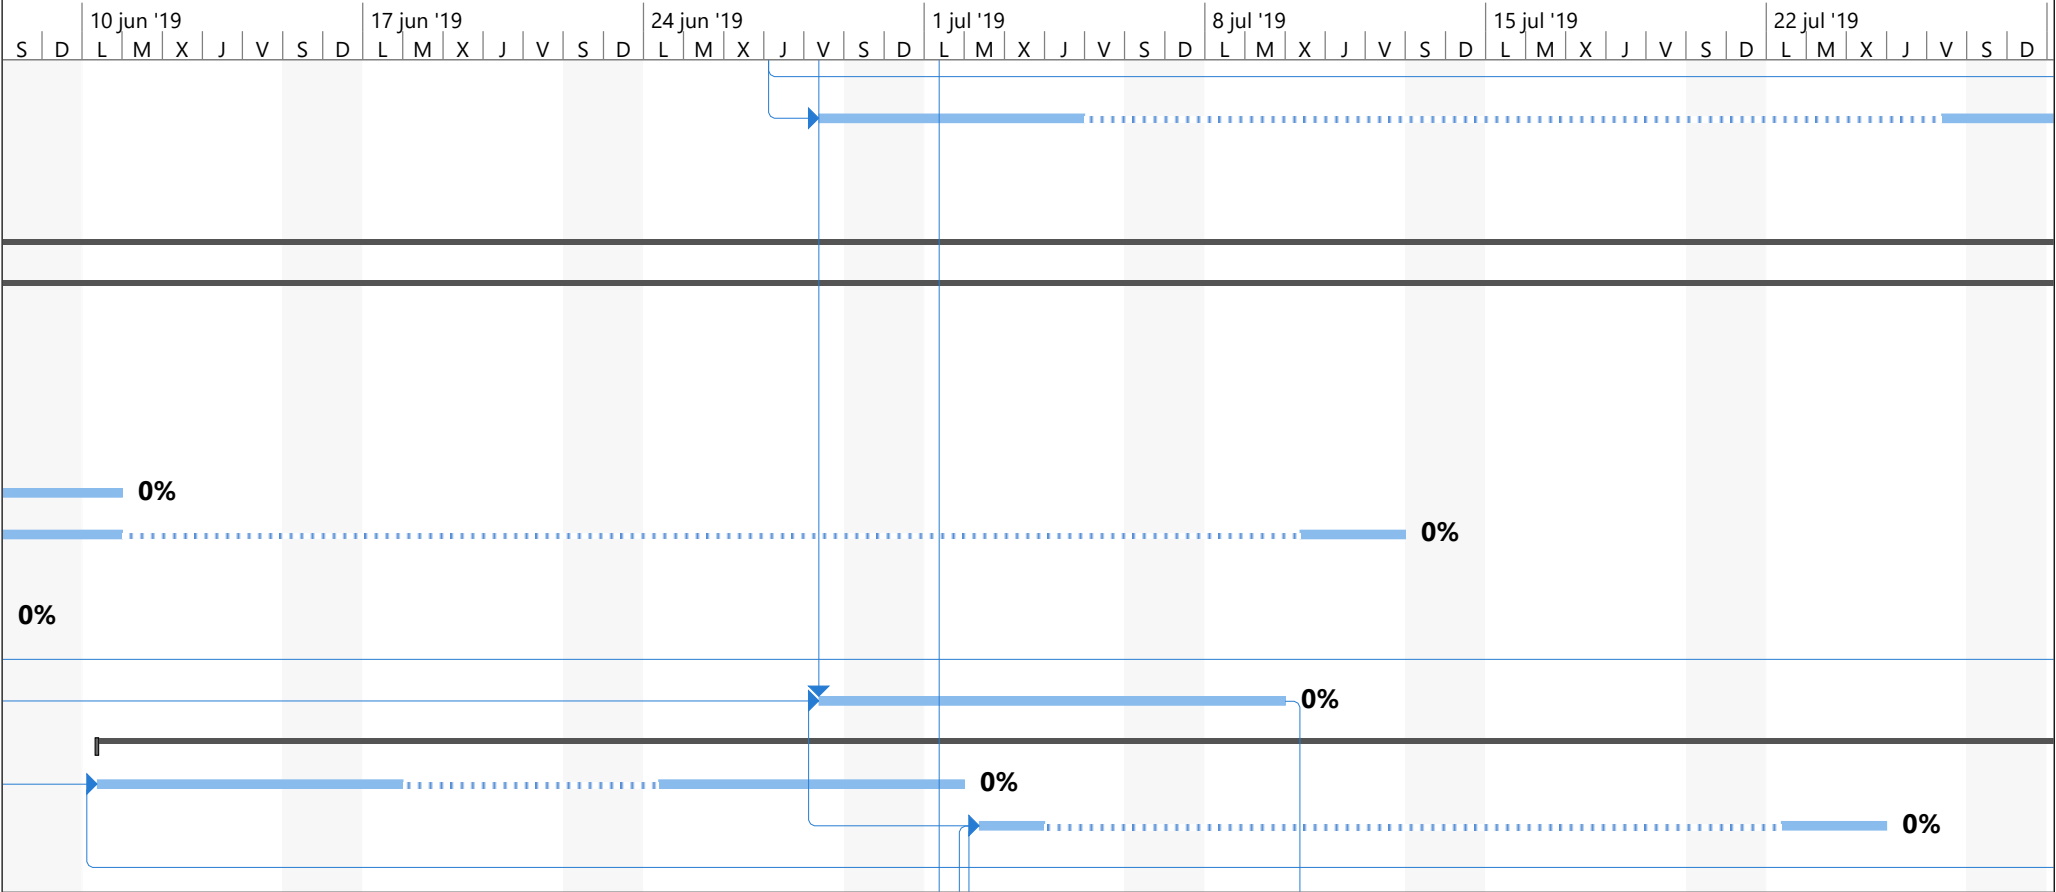


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

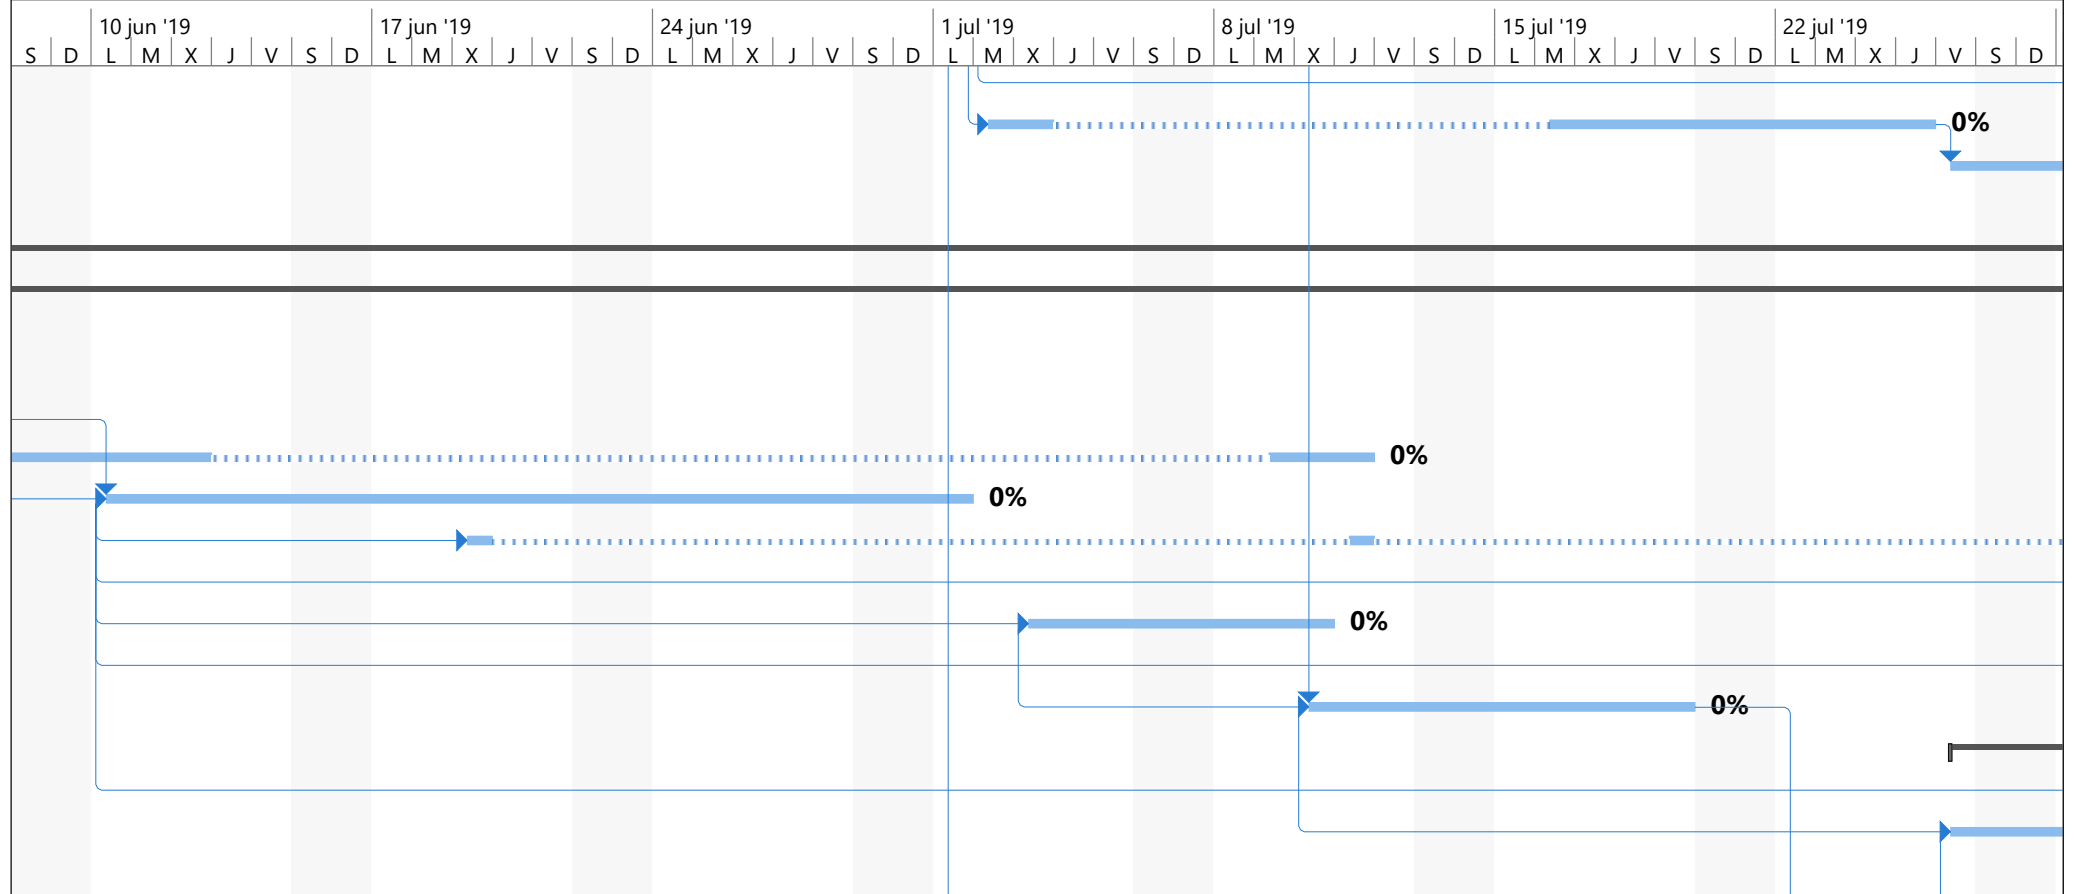


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

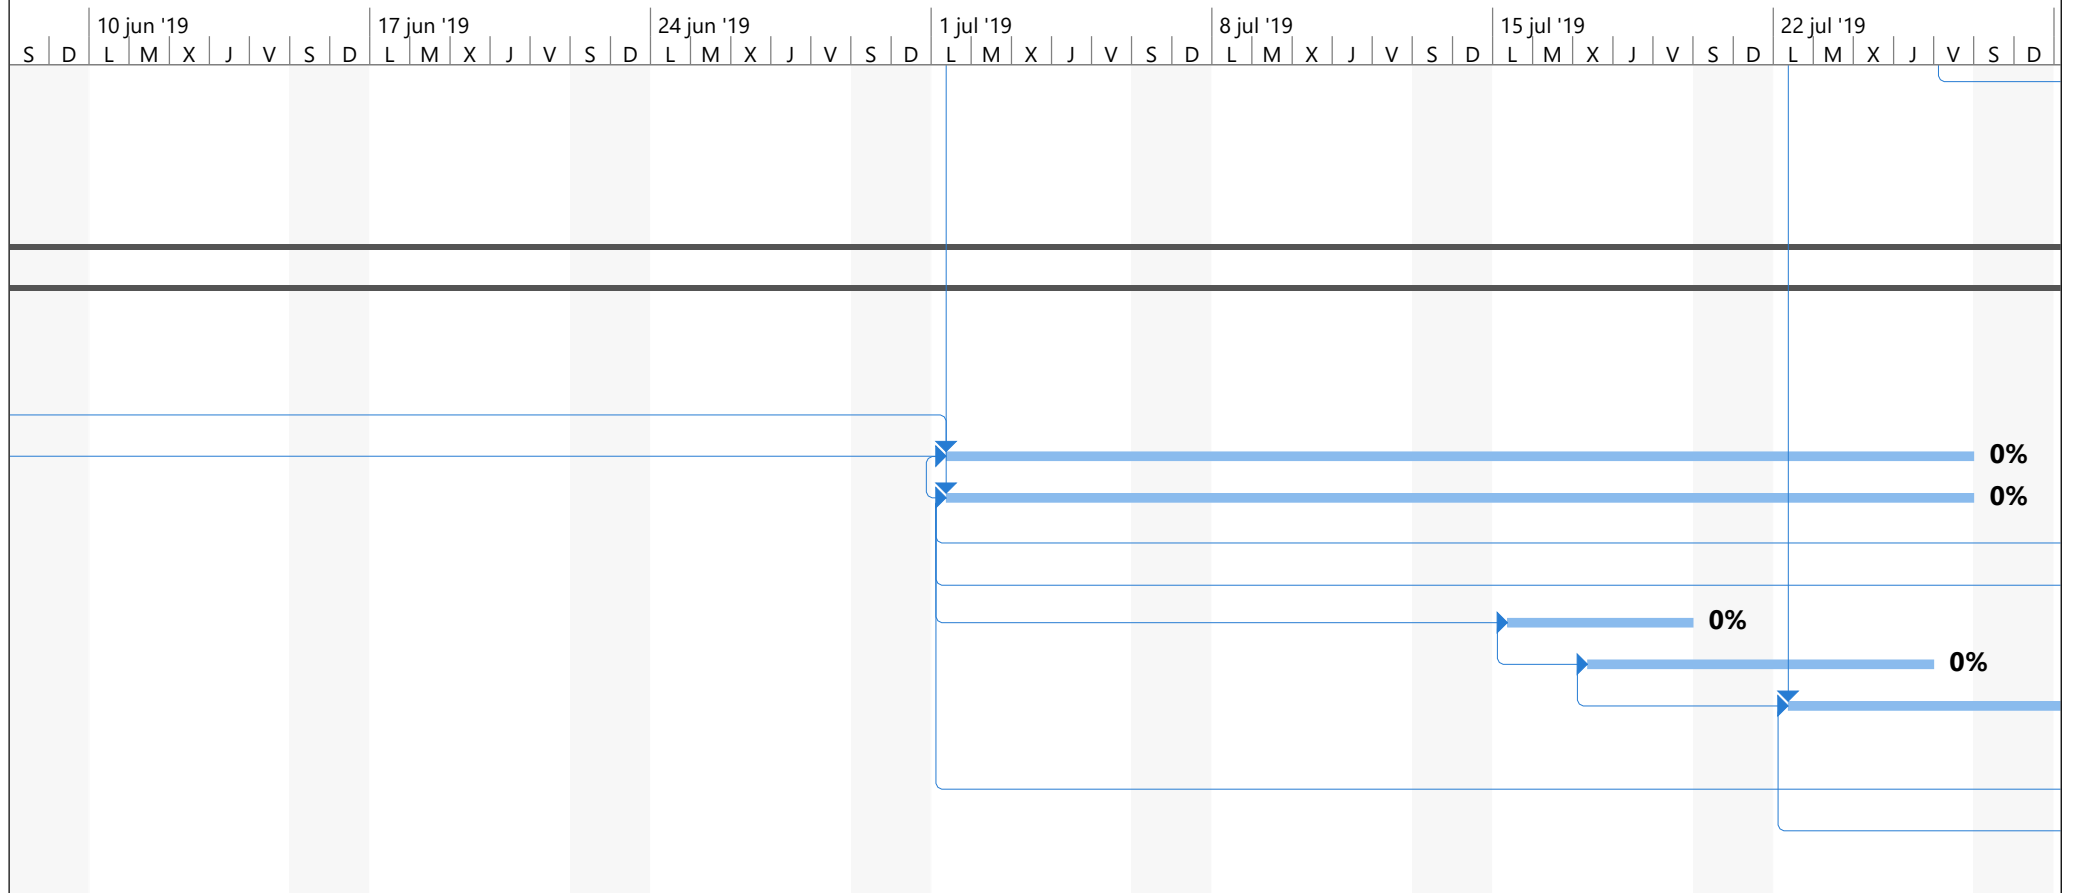


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

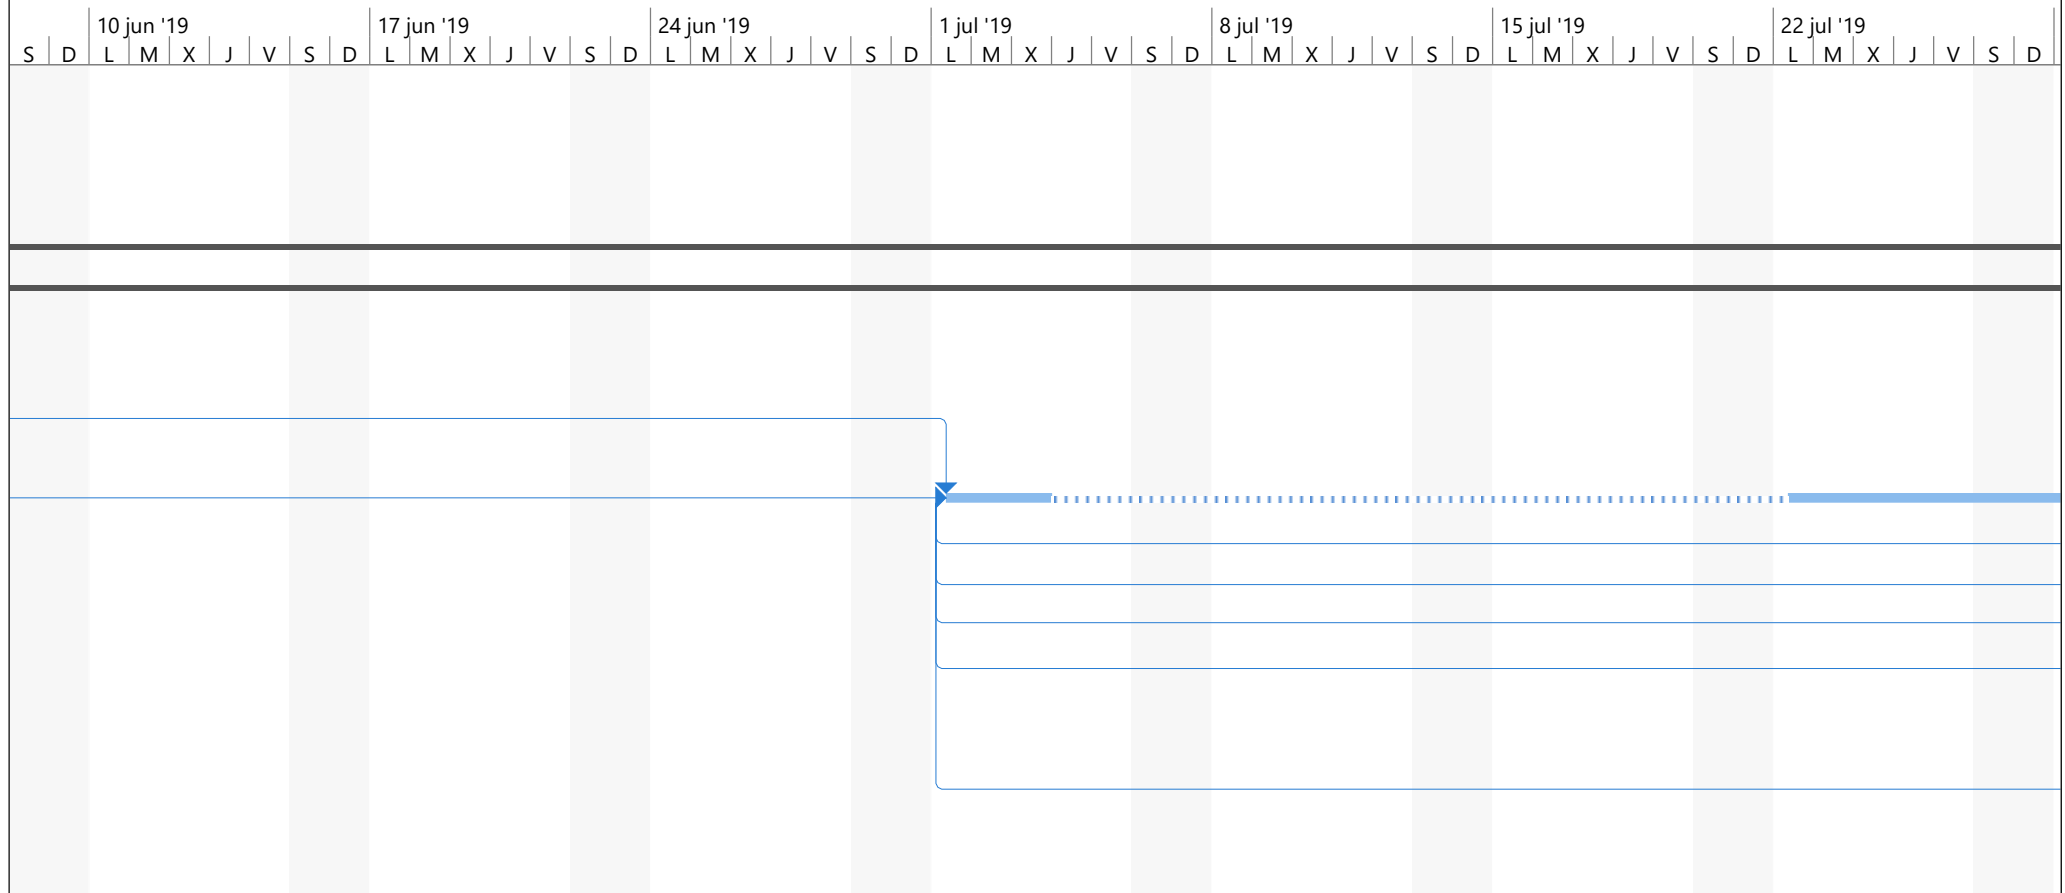

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

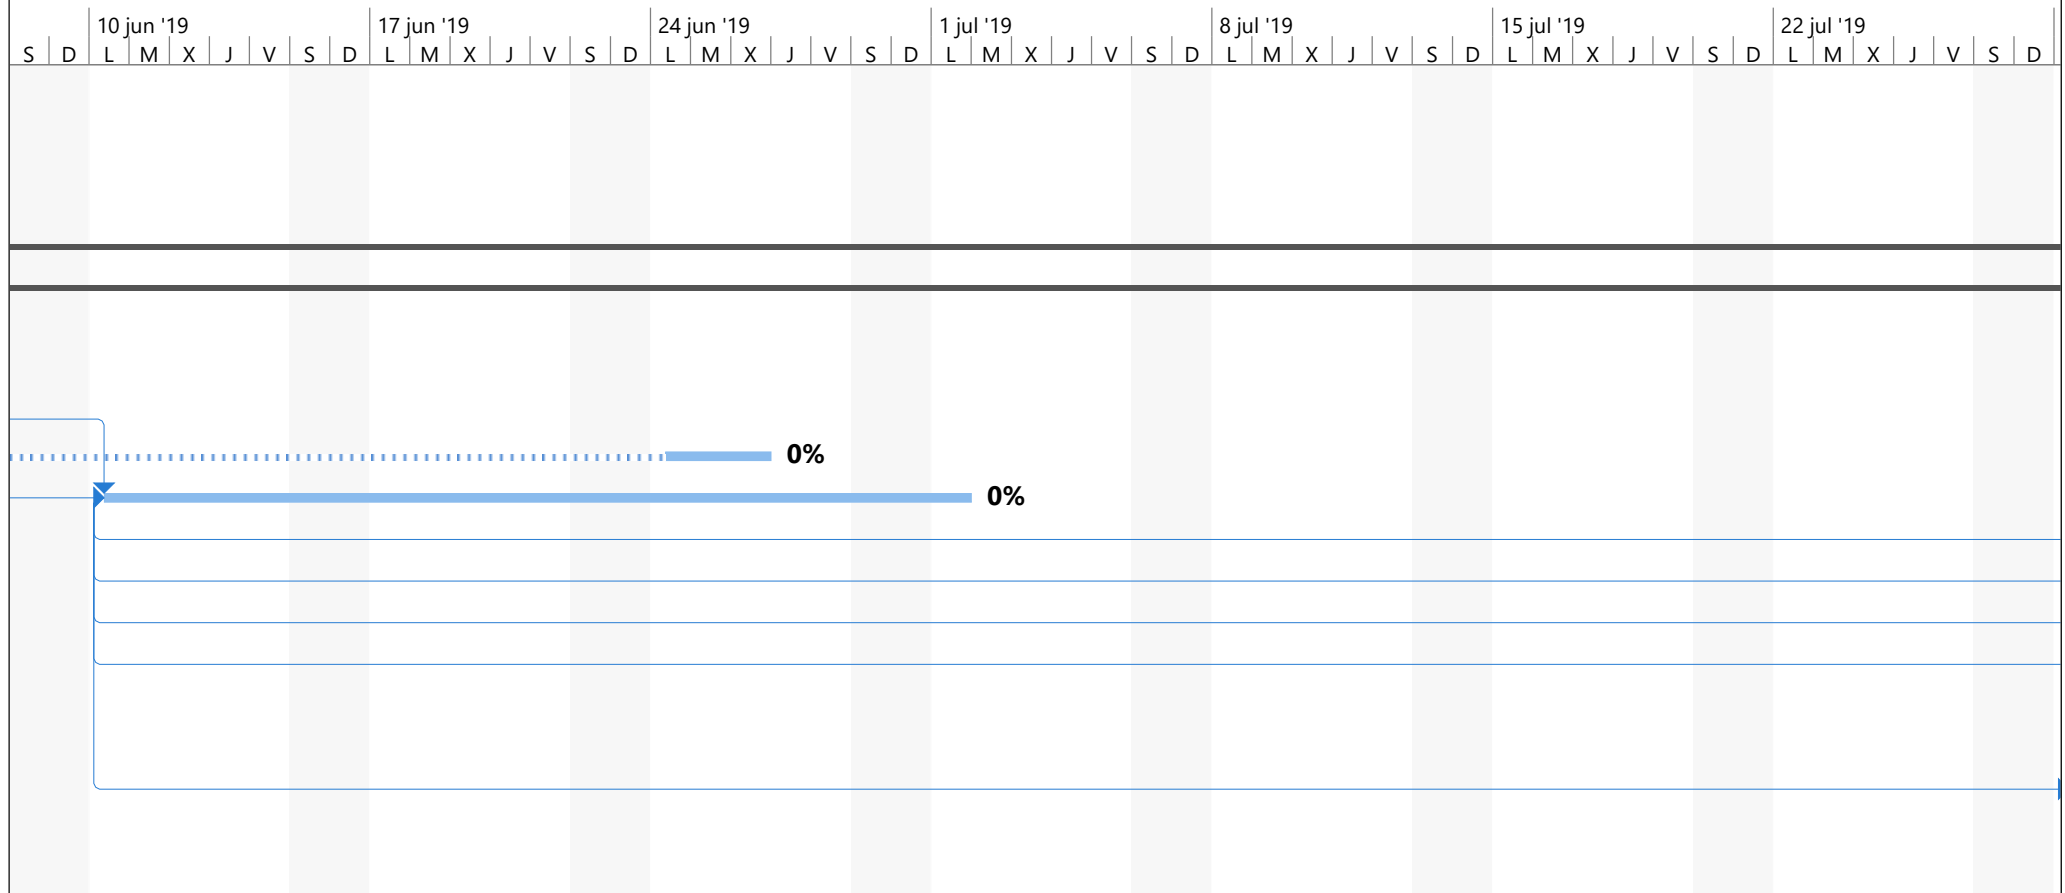

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp


|   |   | 10 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 17 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 24 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 1 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 8 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 15 jul '19 |  |  |  |  |  |  | 22 jul '19 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 29 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 5 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 12 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 19 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 26 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 2 sep '19 |   |   |   |   |   |   | 9 sep '19 |   |   |   |   |   |   | 16 sep '19 |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |

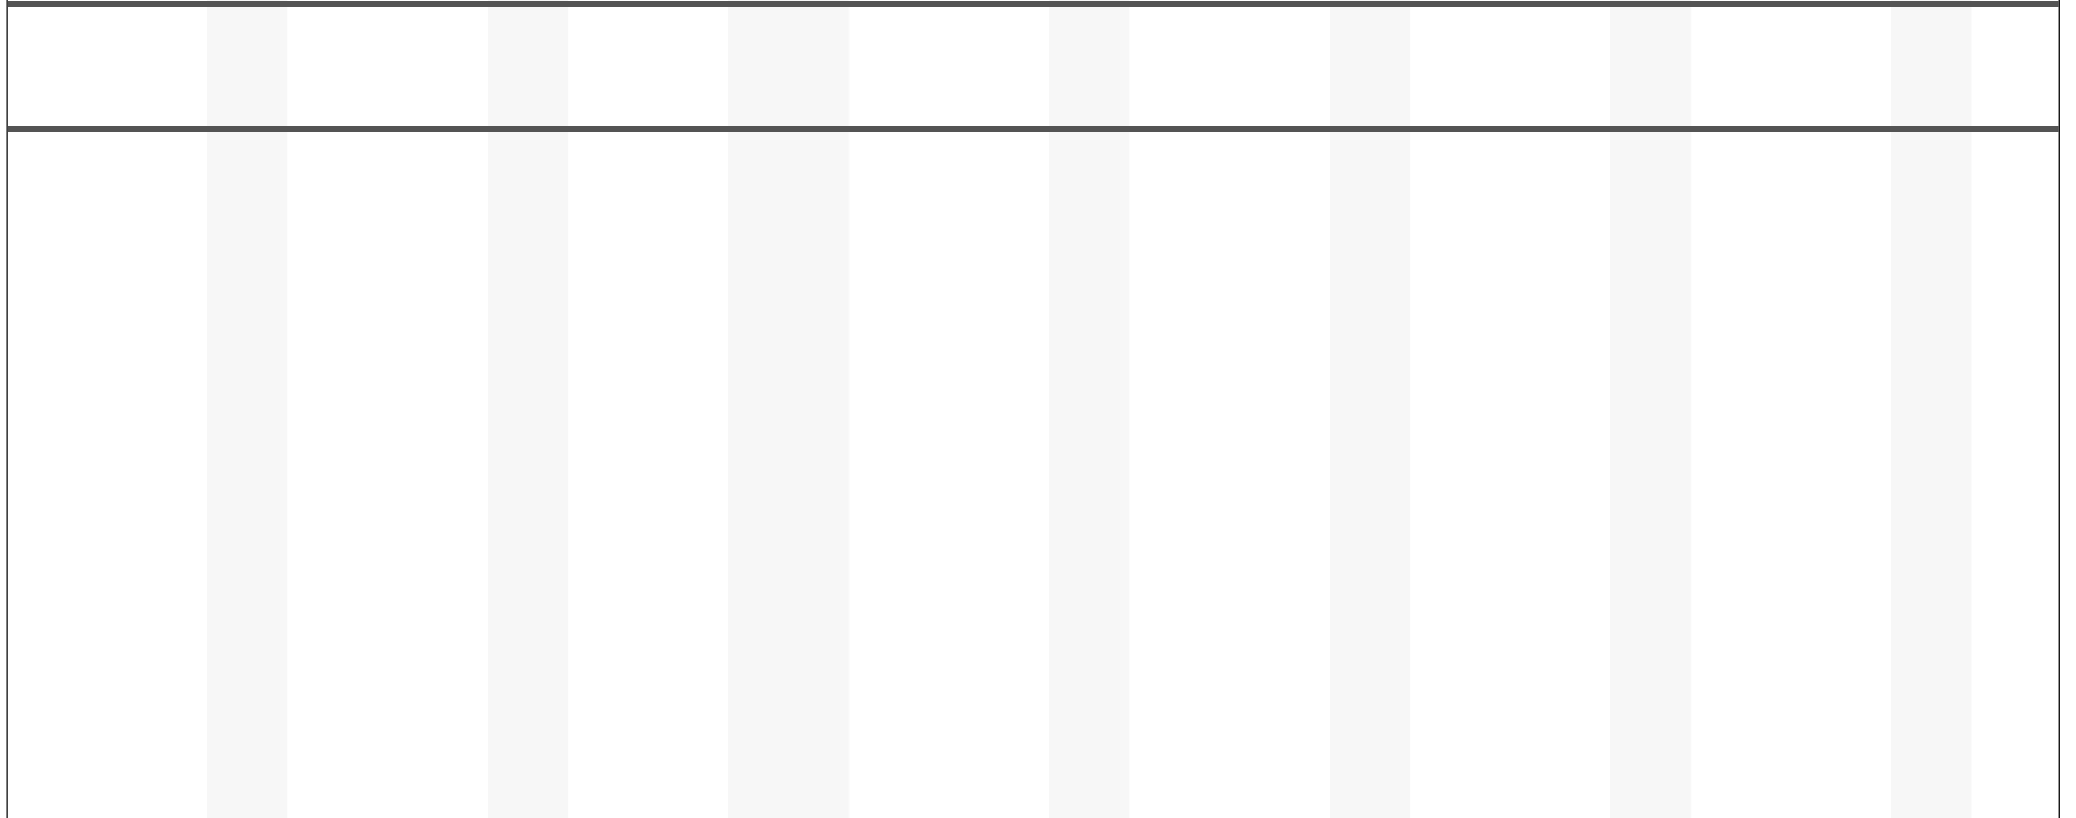

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

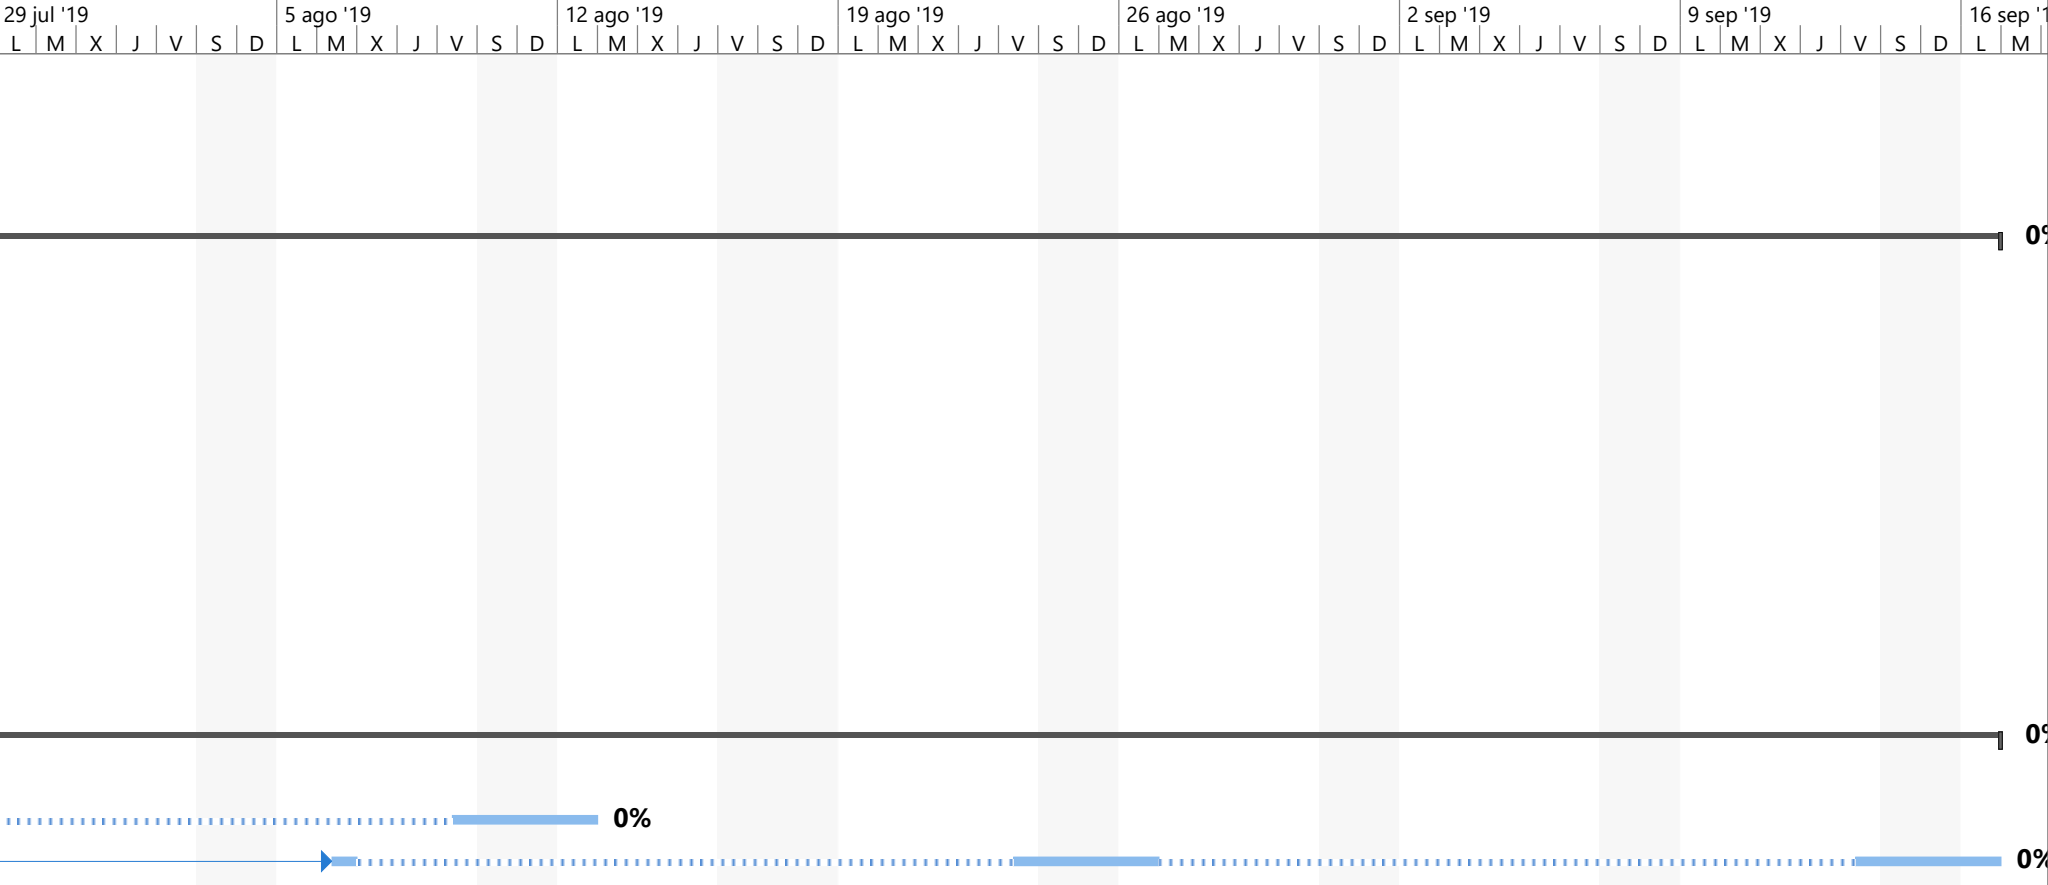


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

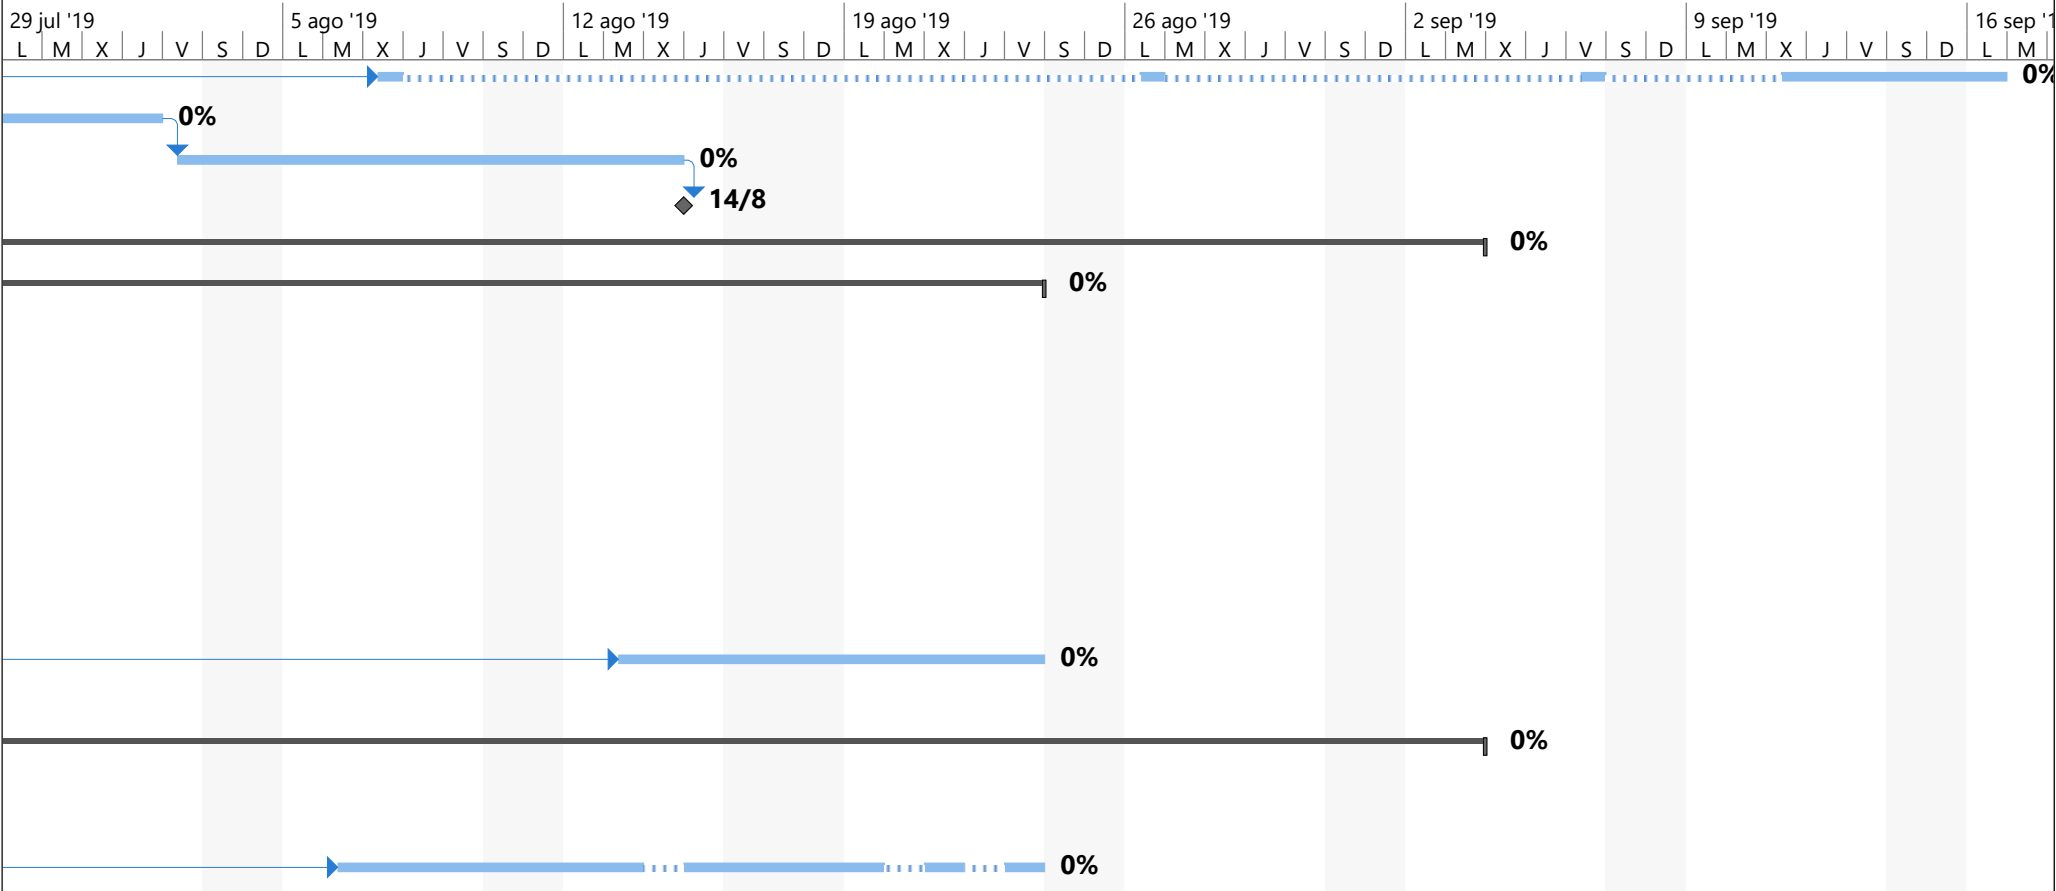


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

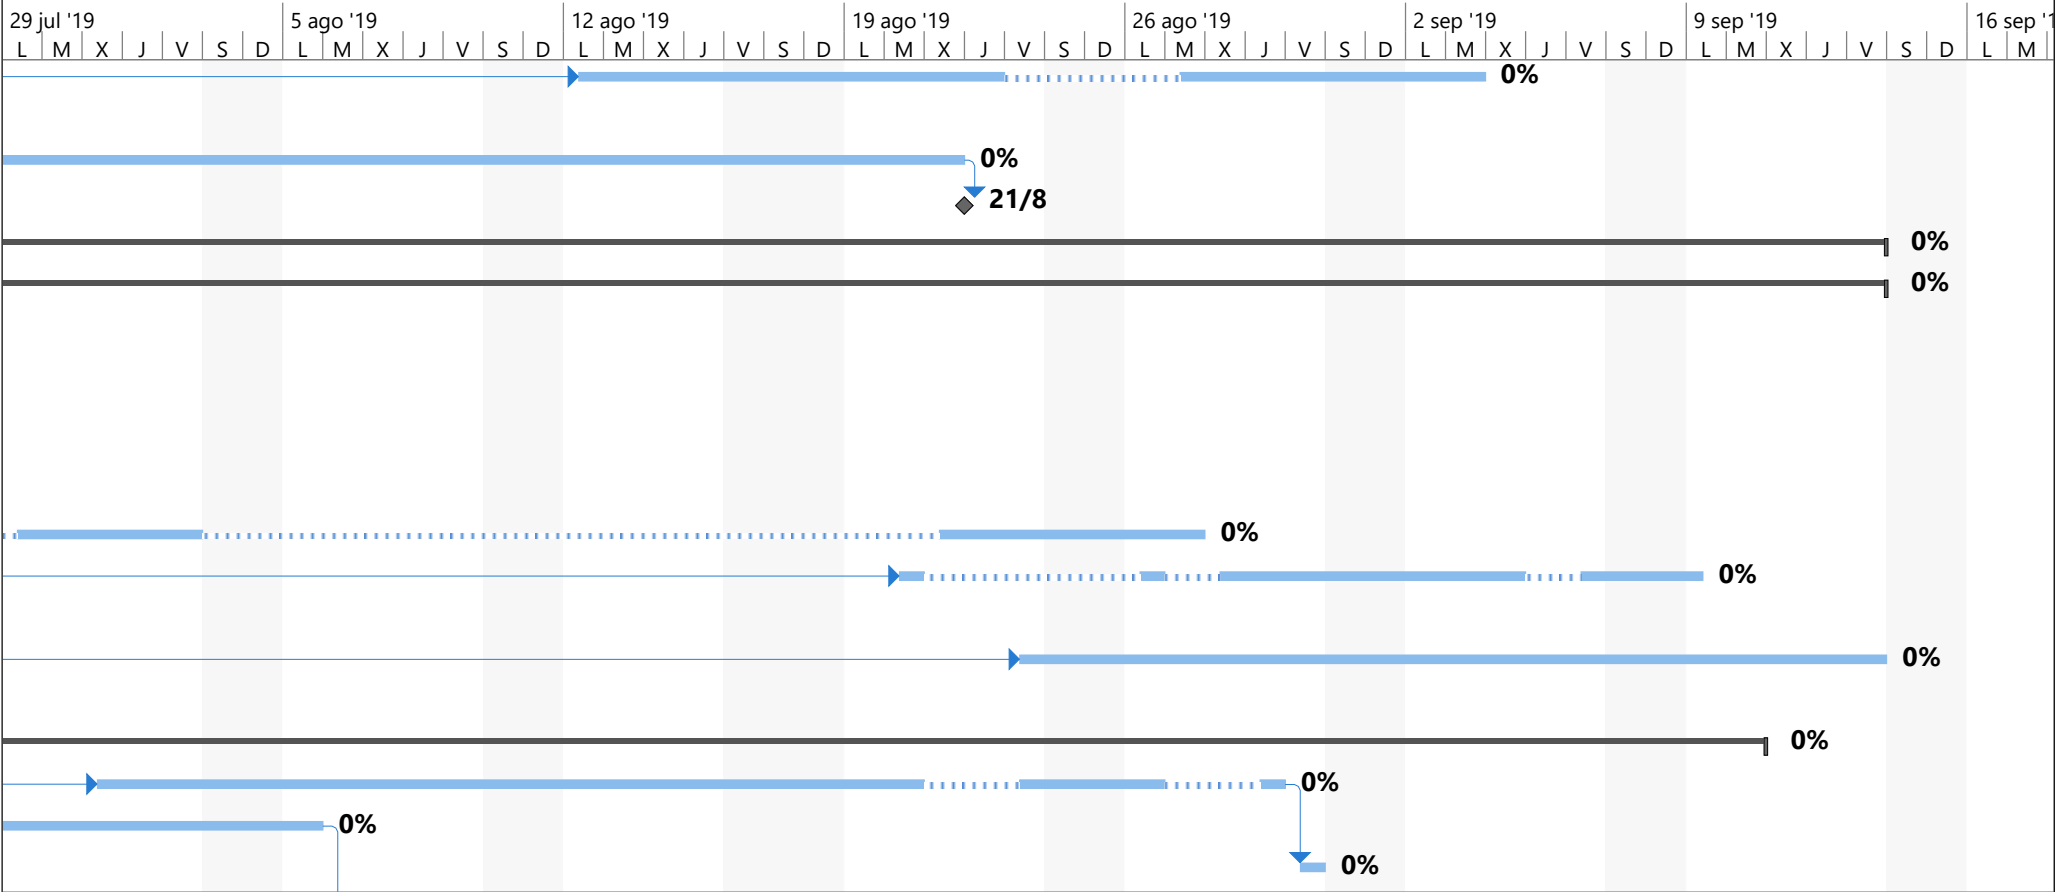


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

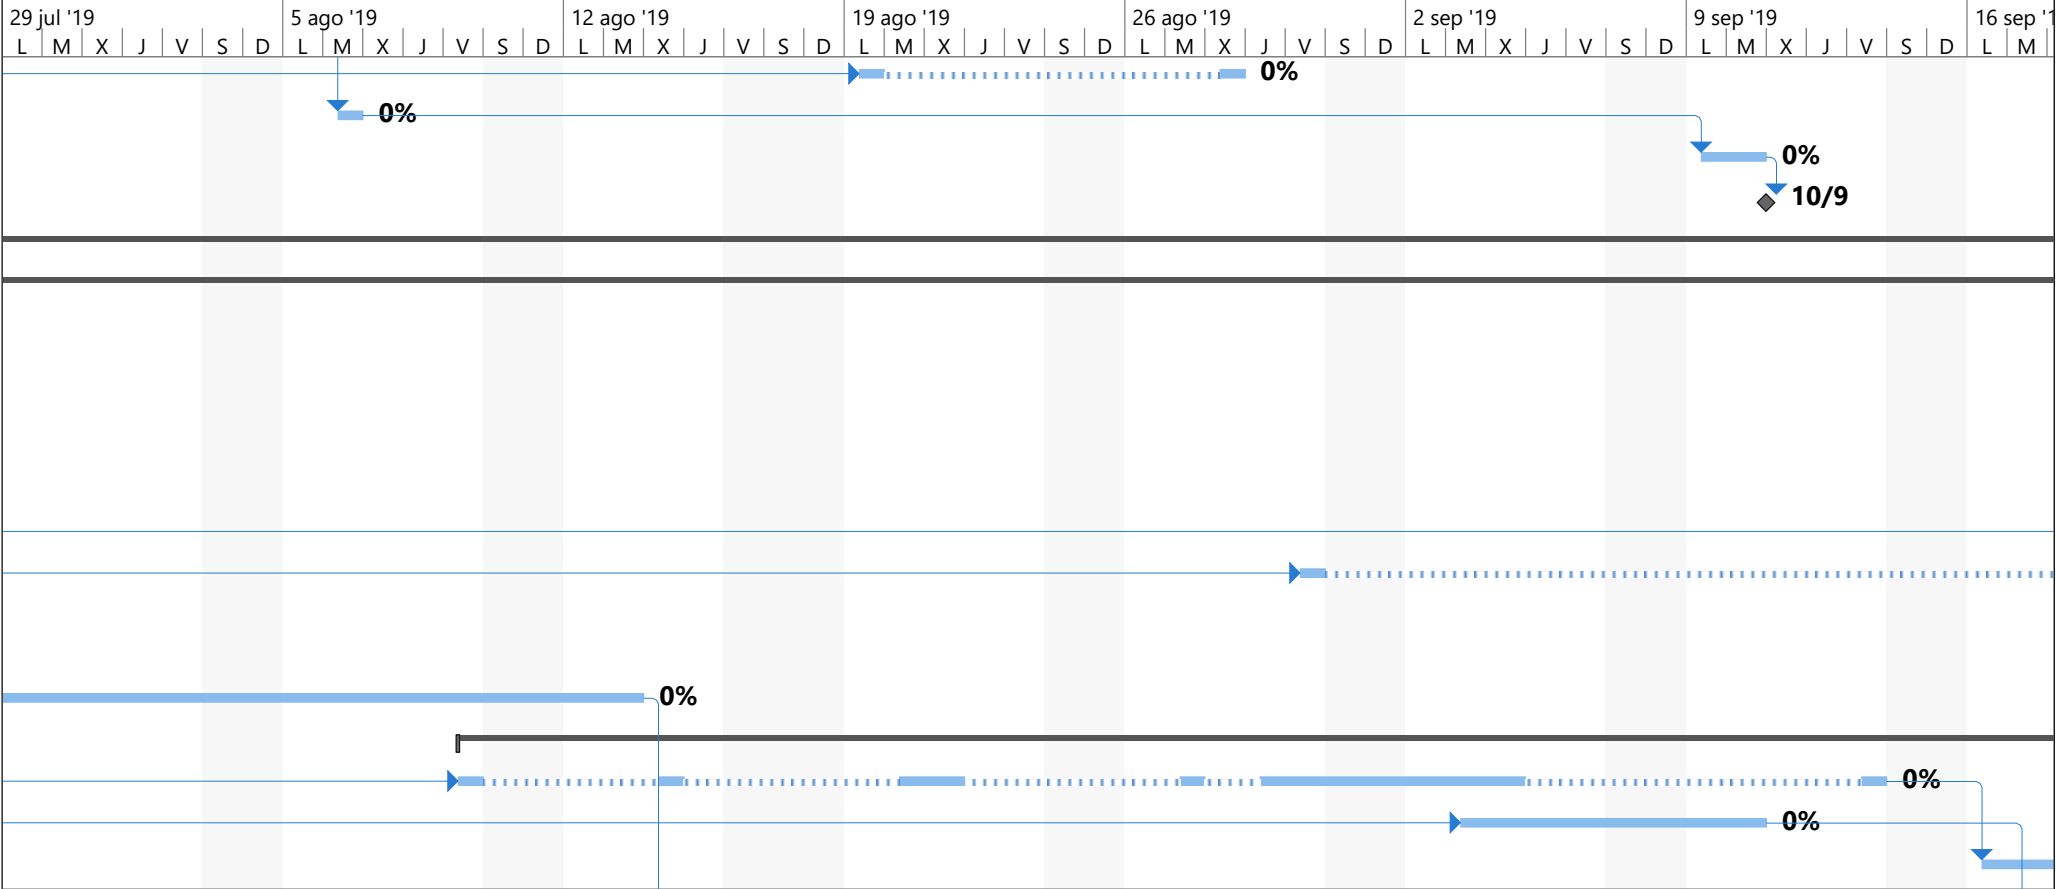


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

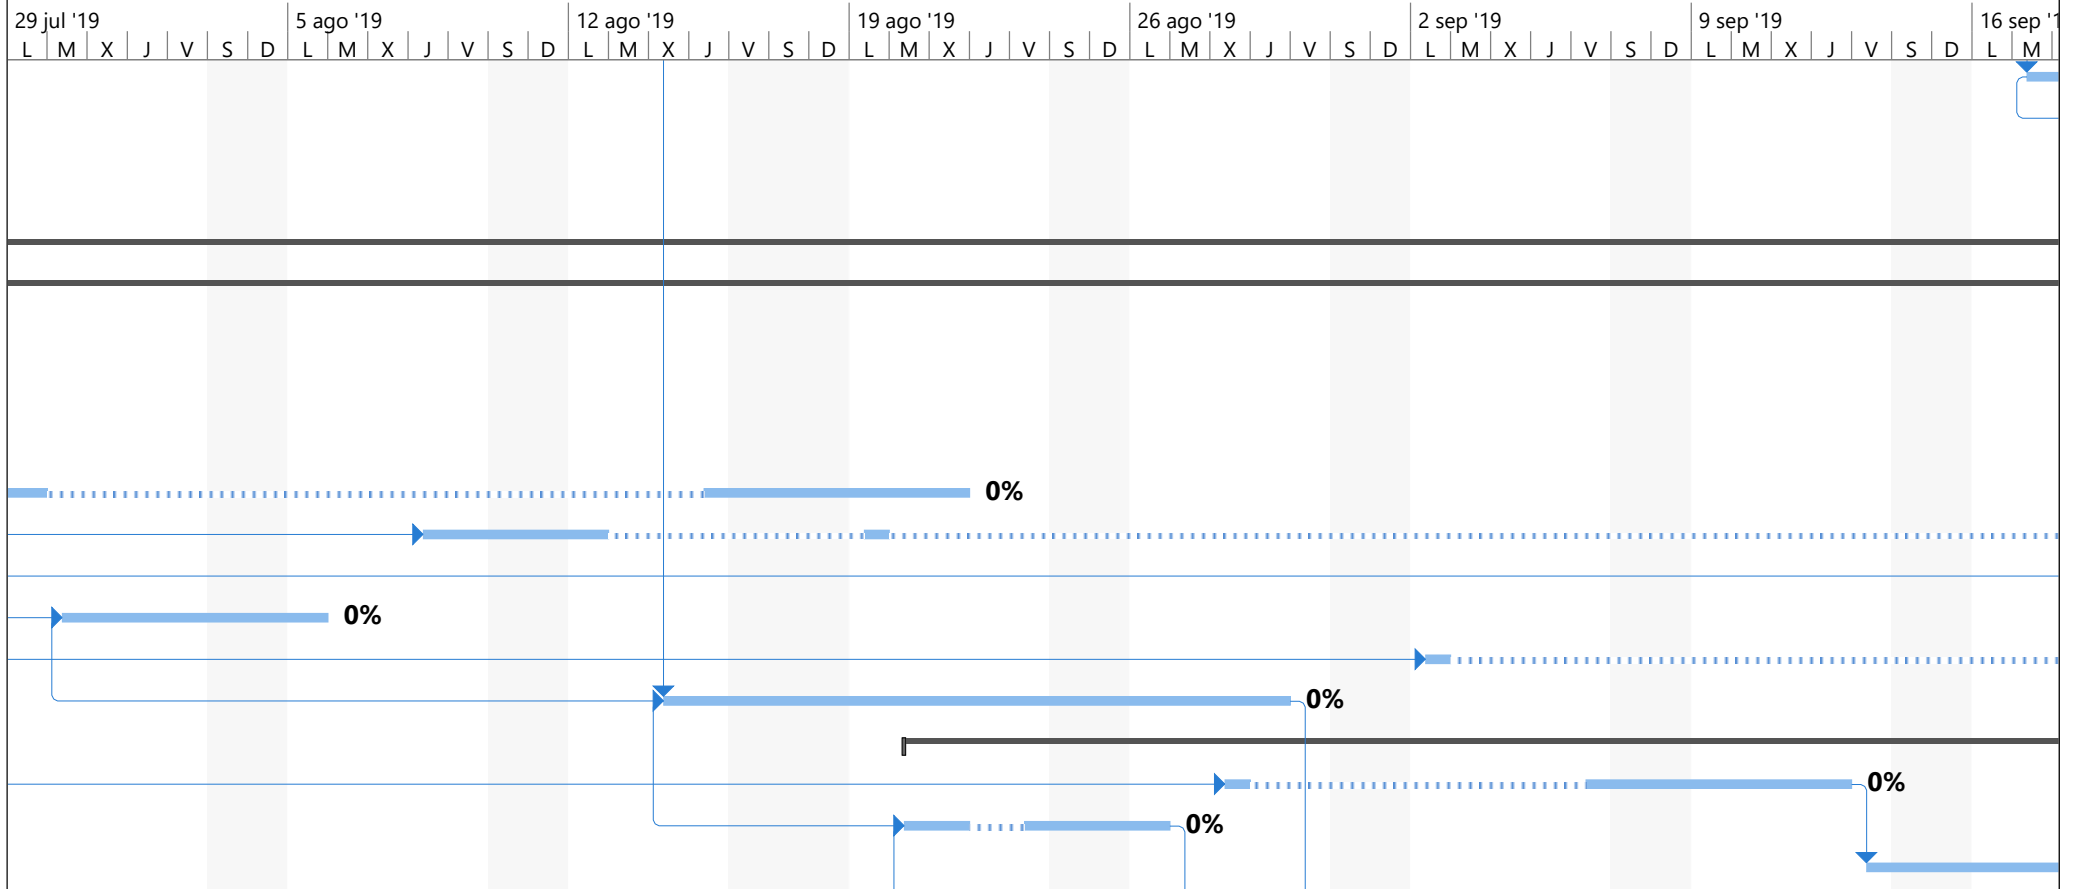

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

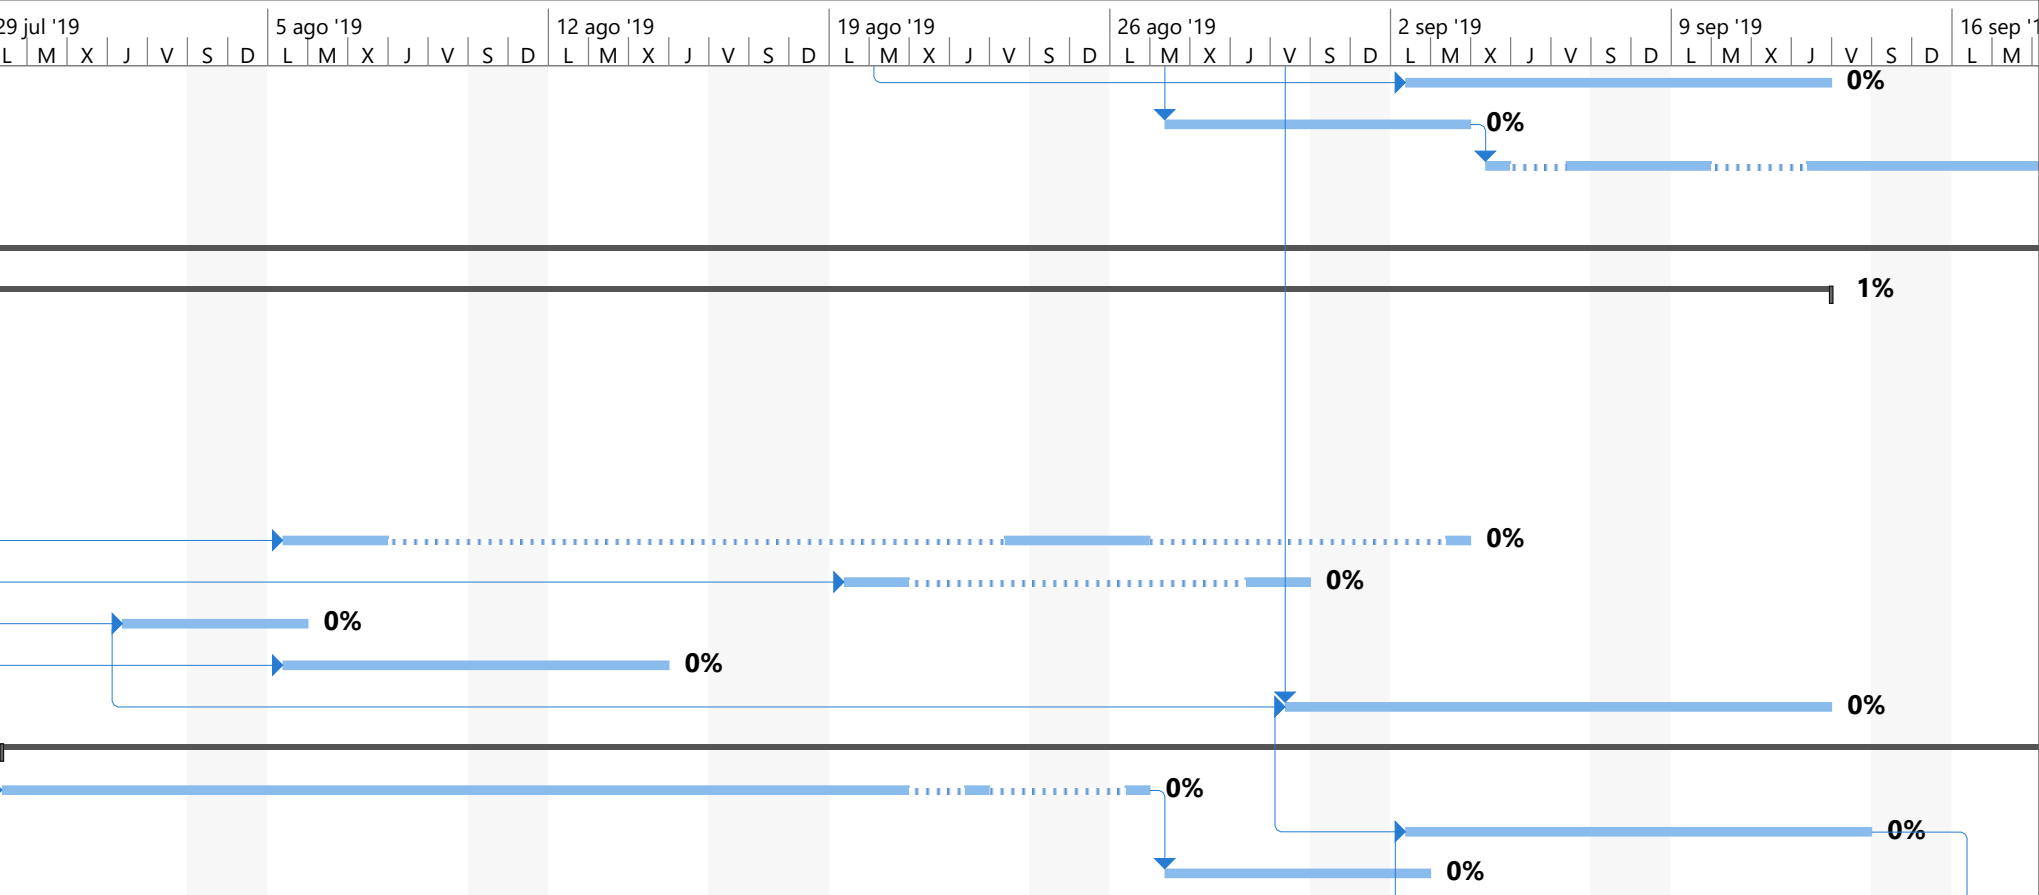


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 29 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 5 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 12 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 19 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 26 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 2 sep '19 |   |   |   |   |   |   | 9 sep '19 |   |   |   |   |   |   | 16 sep '19 |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

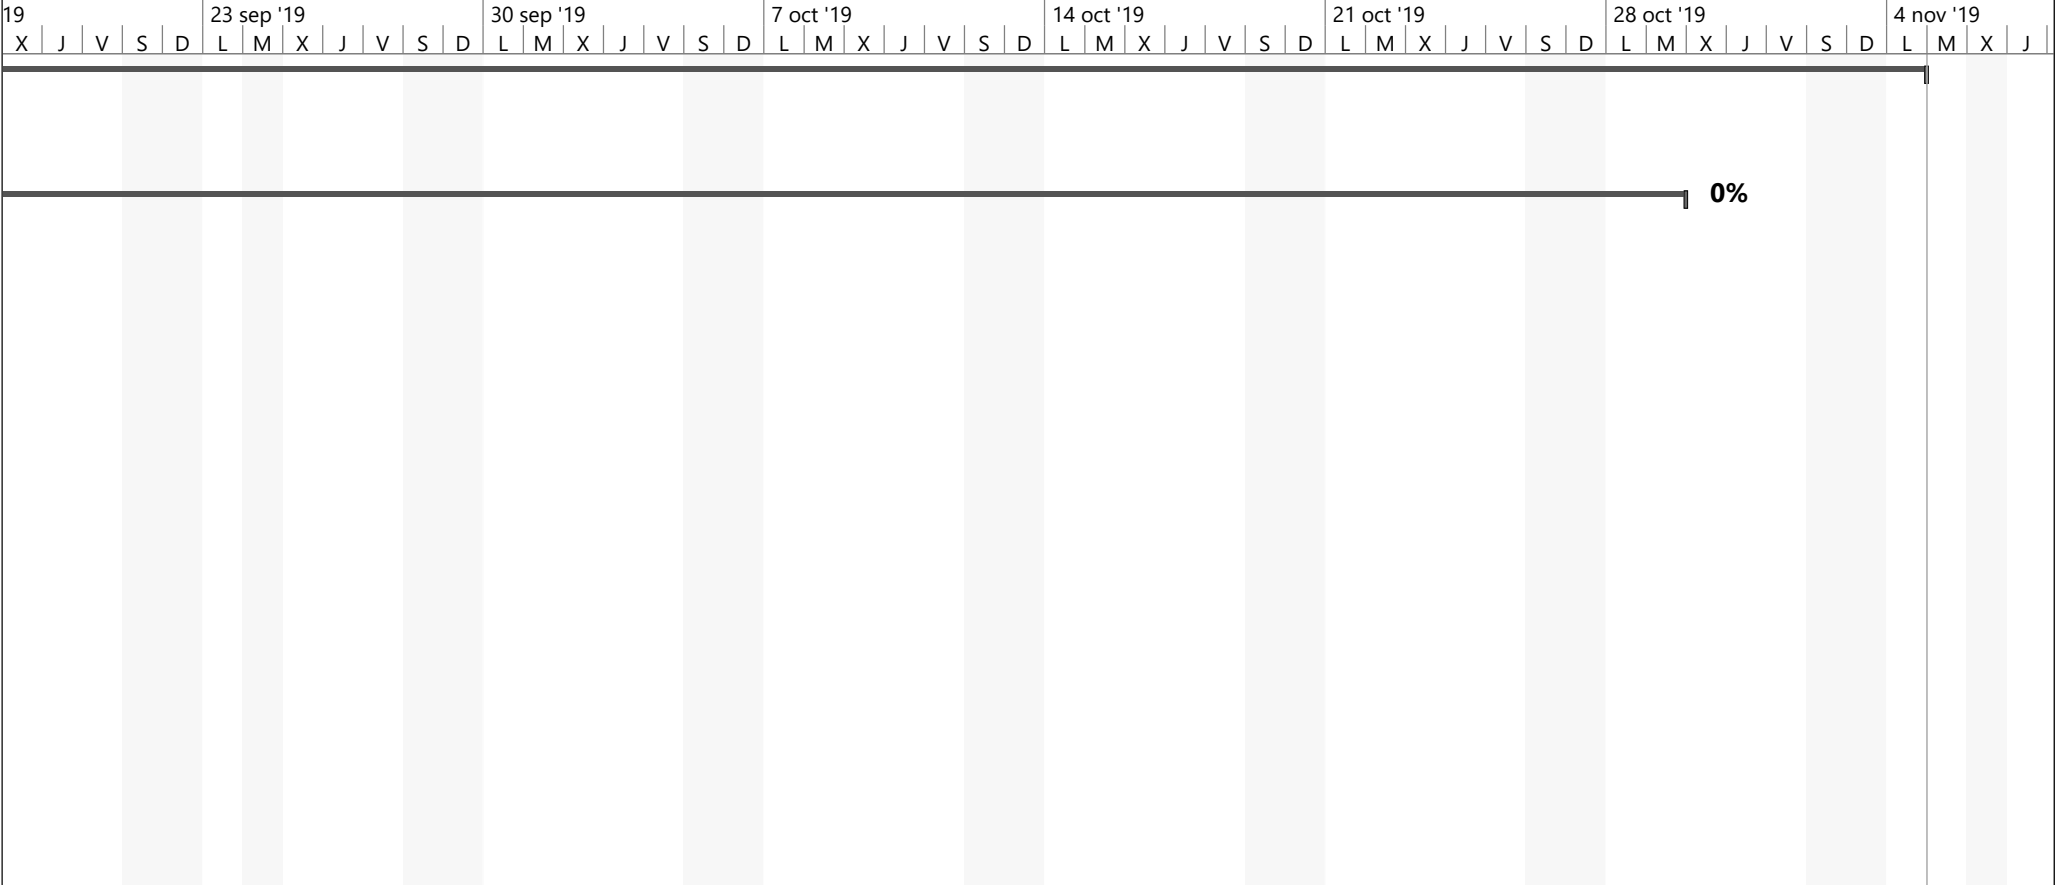


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 19 |   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   |   | 4 nov '19 |   |  |  |  |
|----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|--|--|--|
| X  | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X         | J |  |  |  |
|    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |  |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

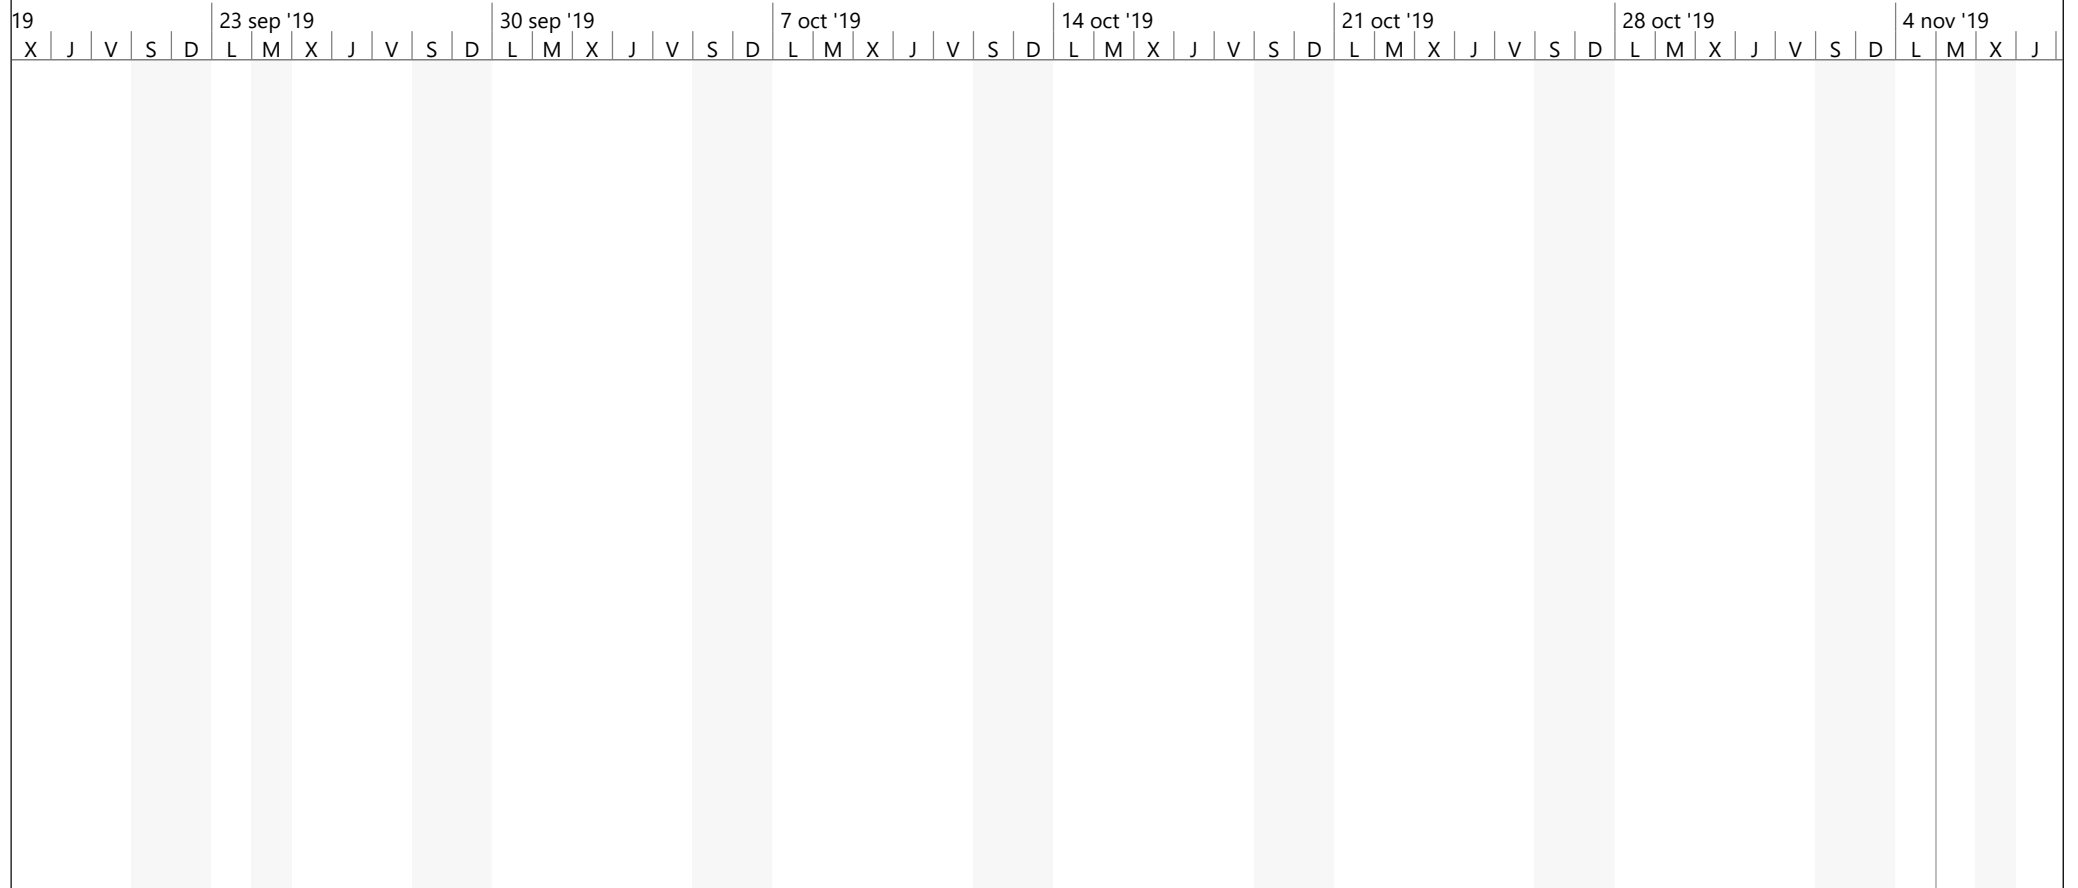


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

| 19 |   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   |   | 4 nov '19 |   |  |  |  |
|----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|--|--|--|
| X  | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X         | J |  |  |  |
|    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |  |  |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

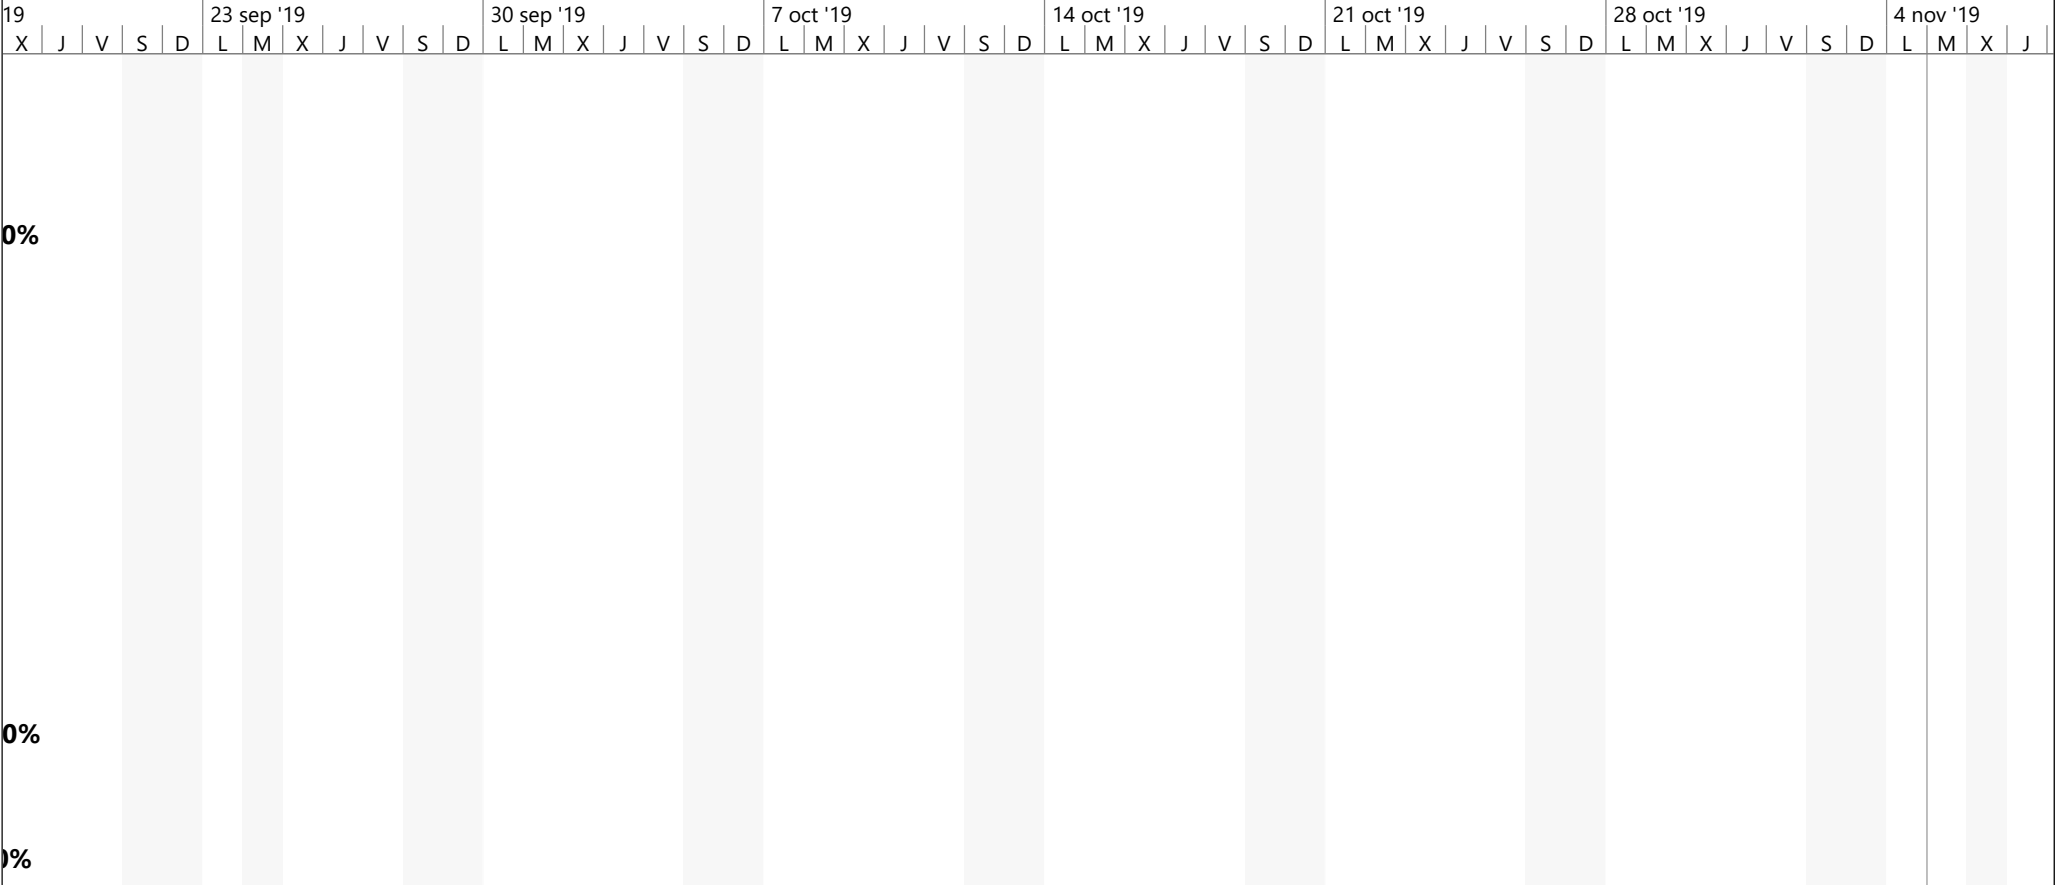


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

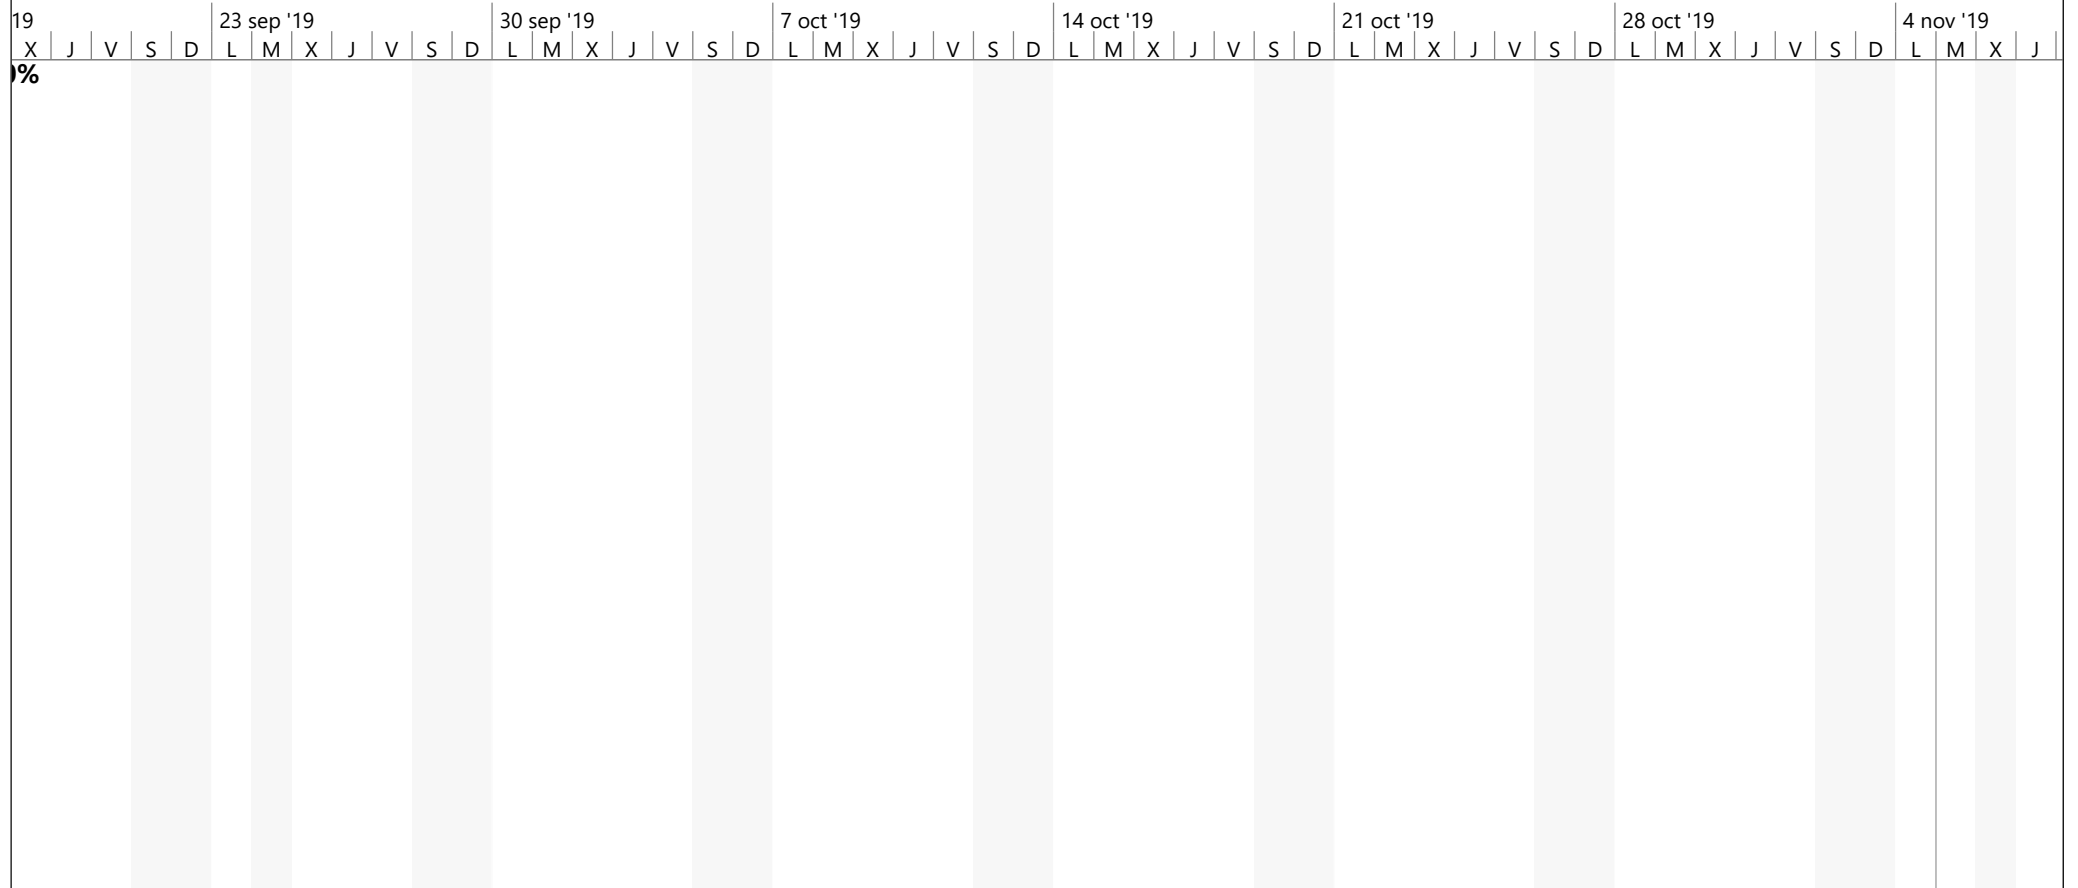

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

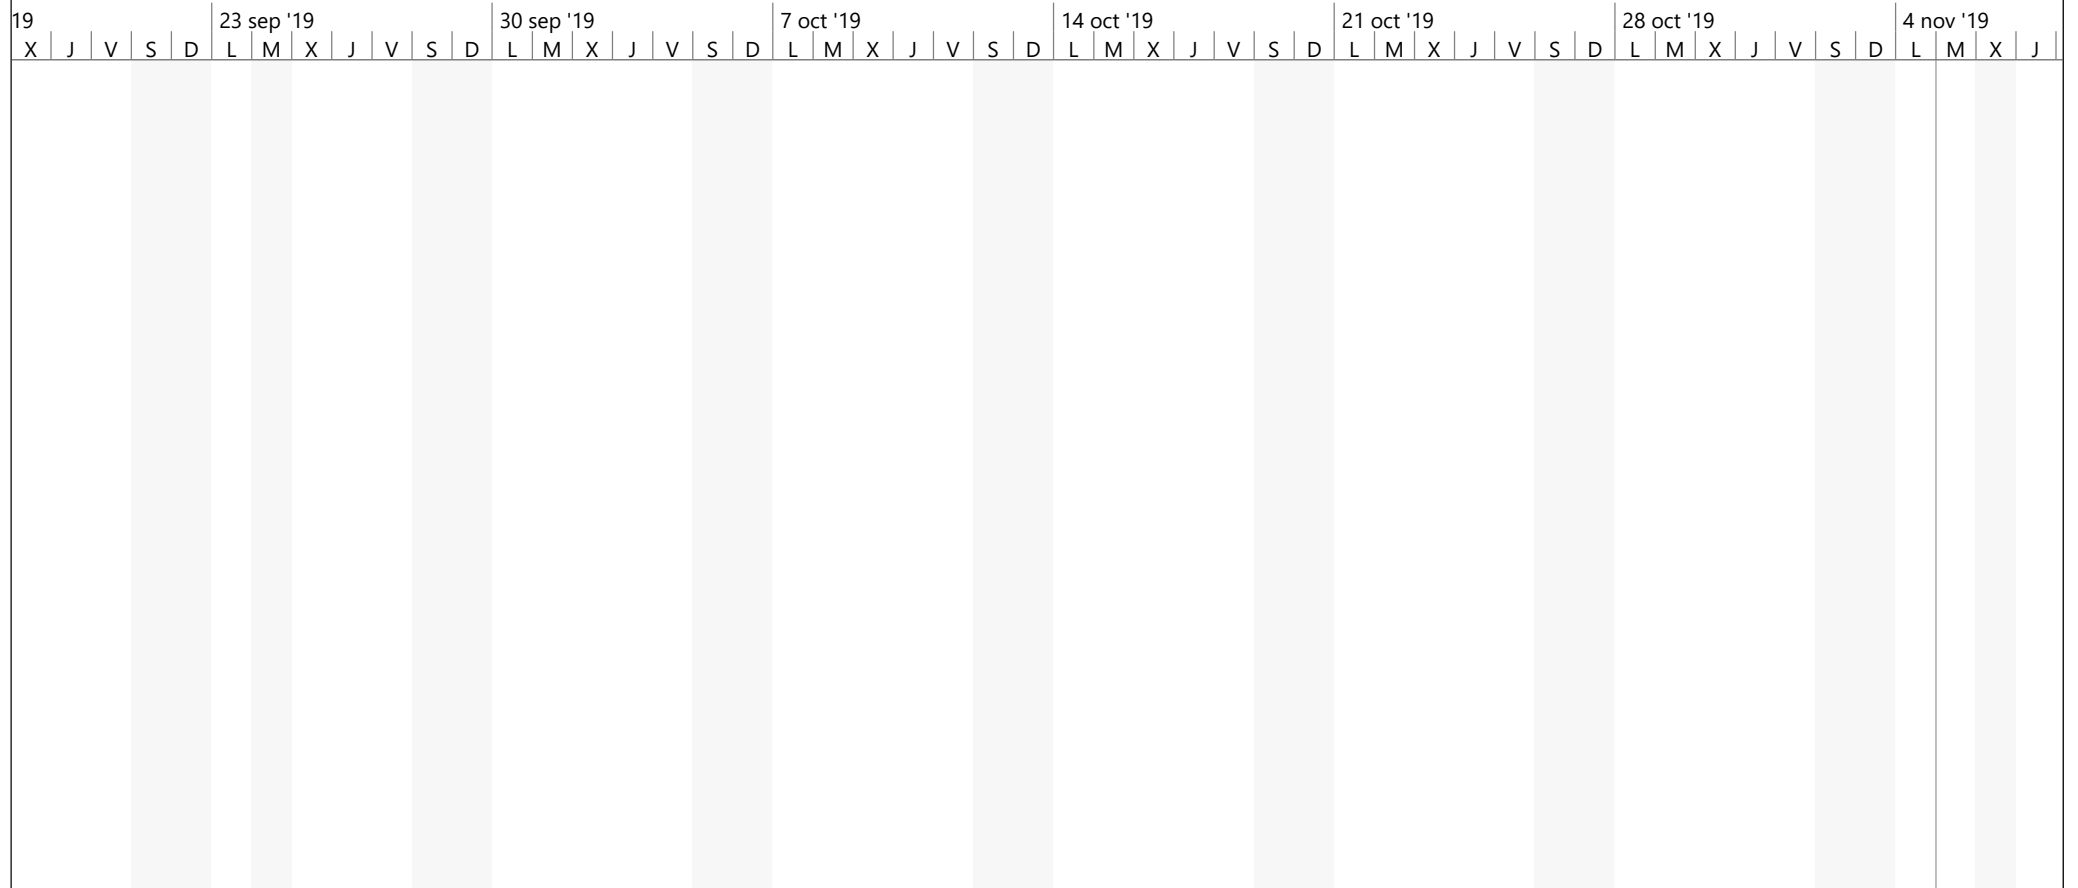

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

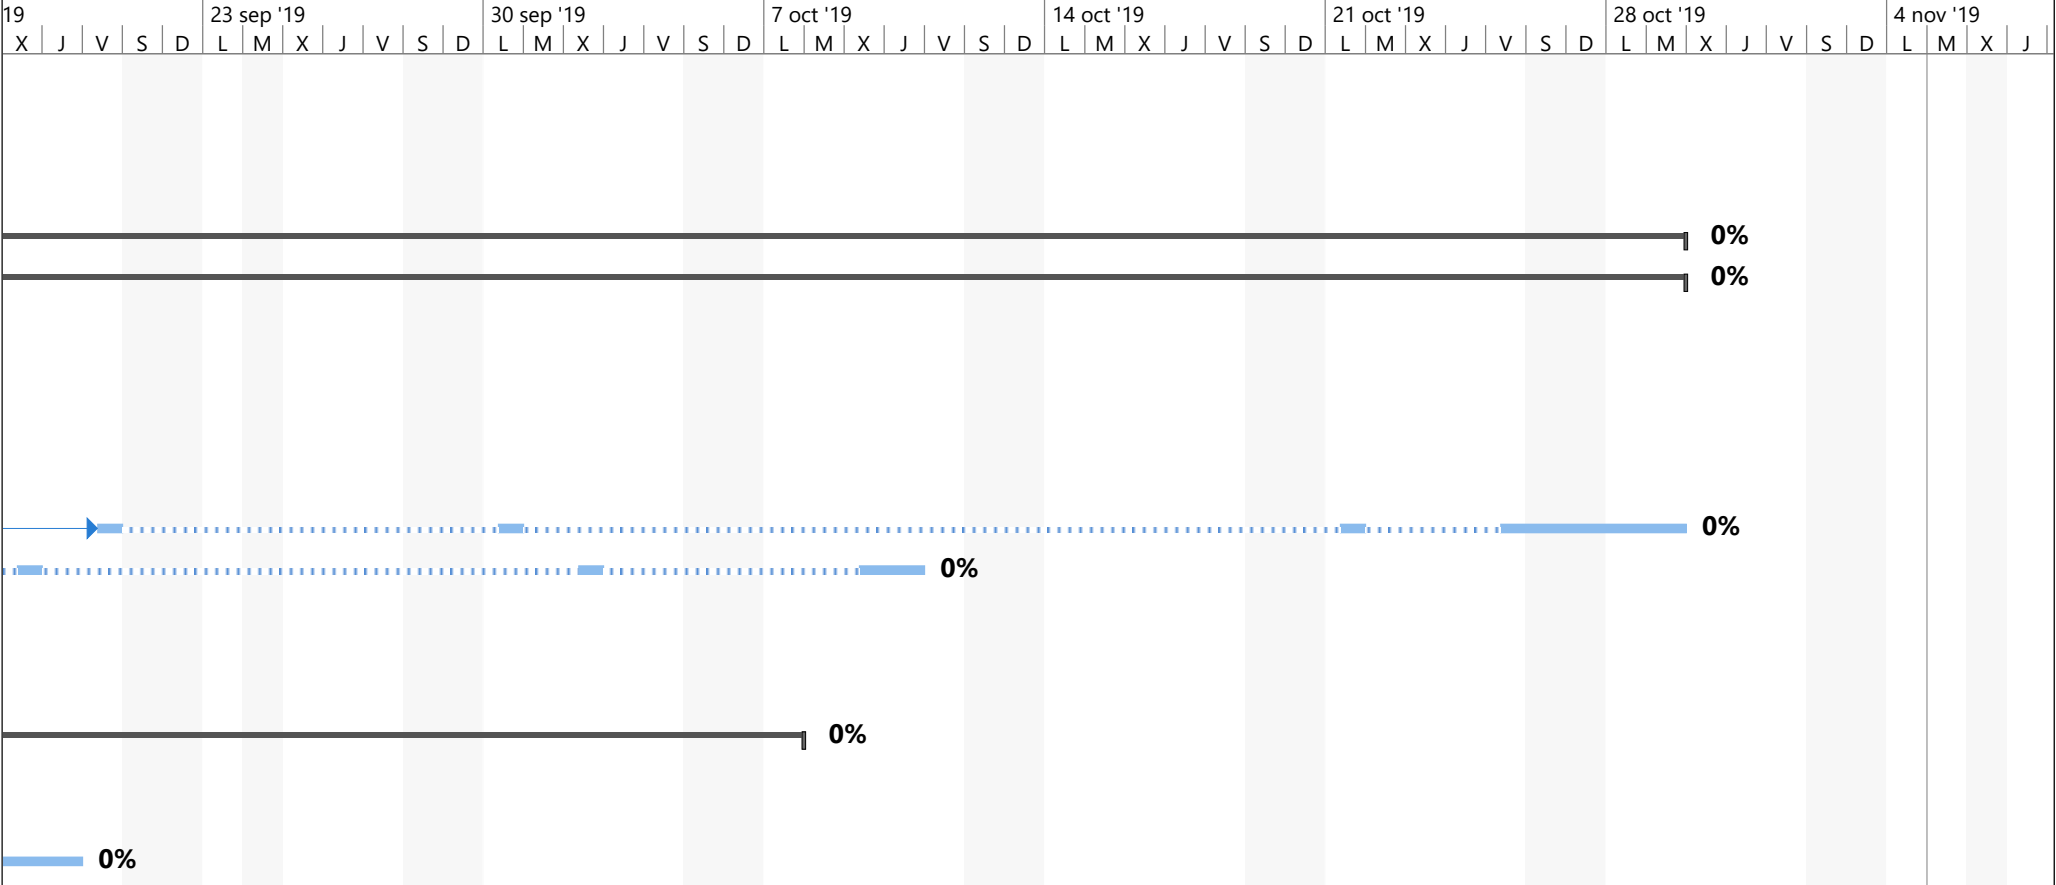


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

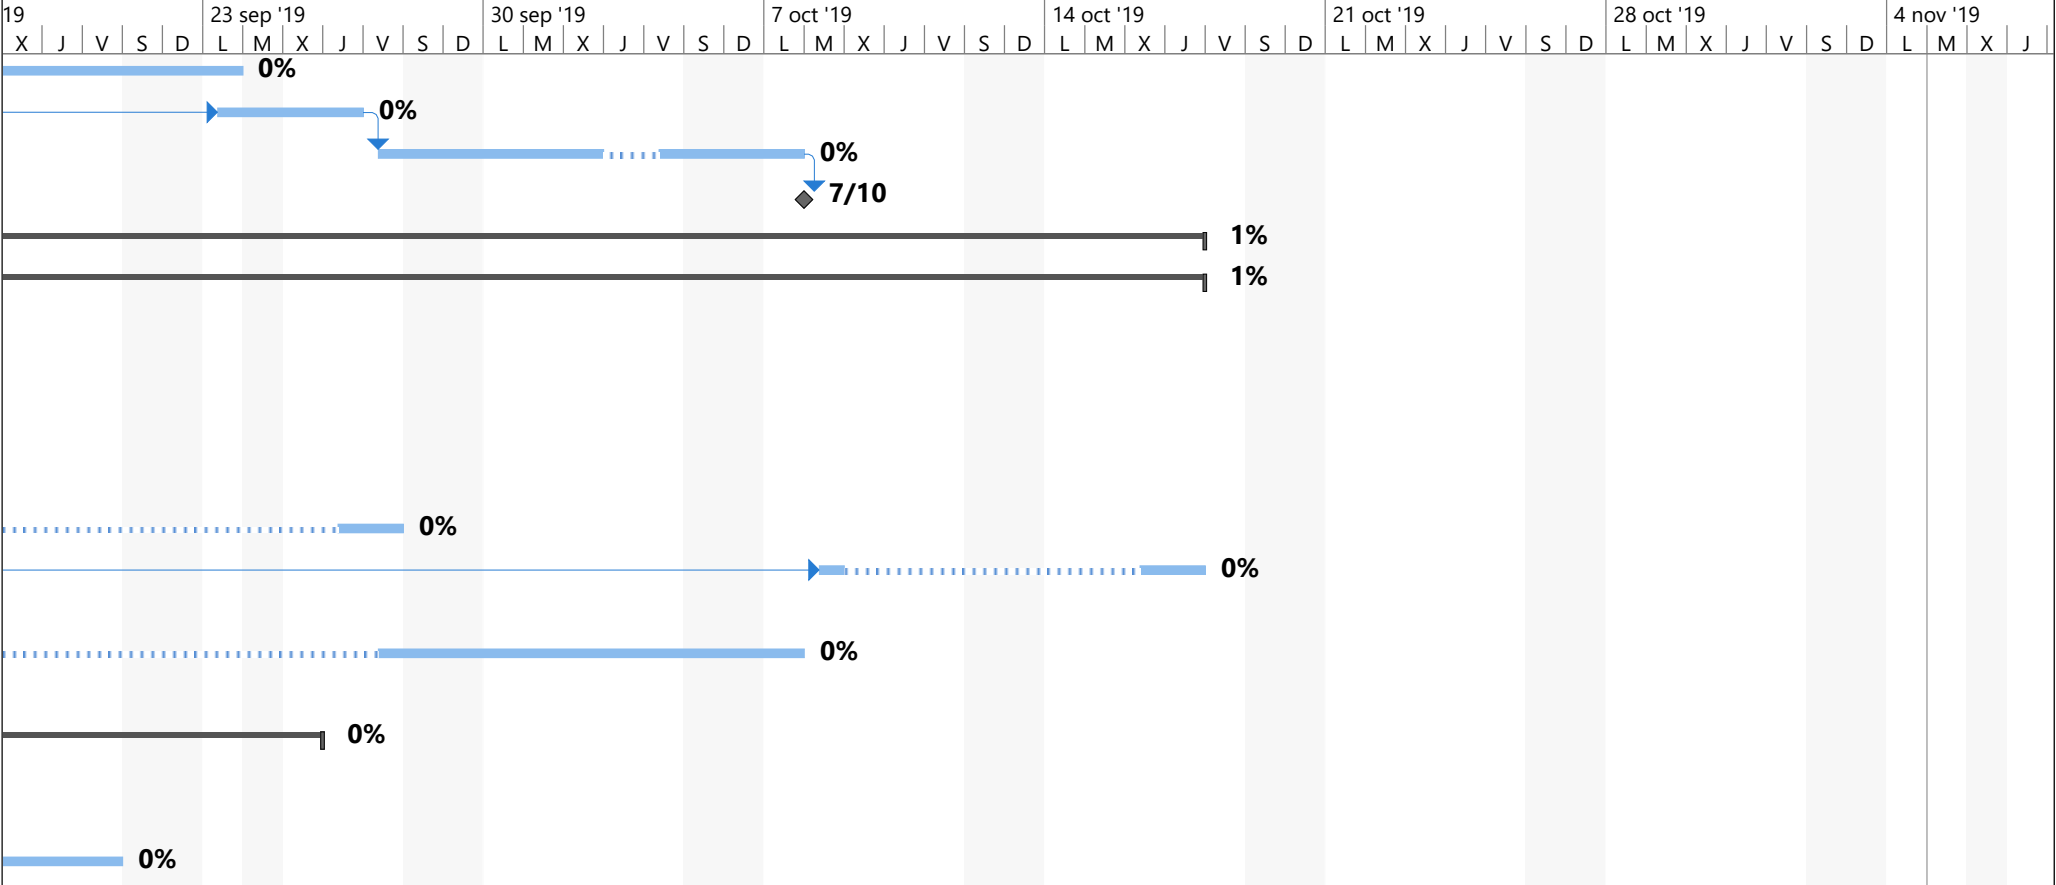


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

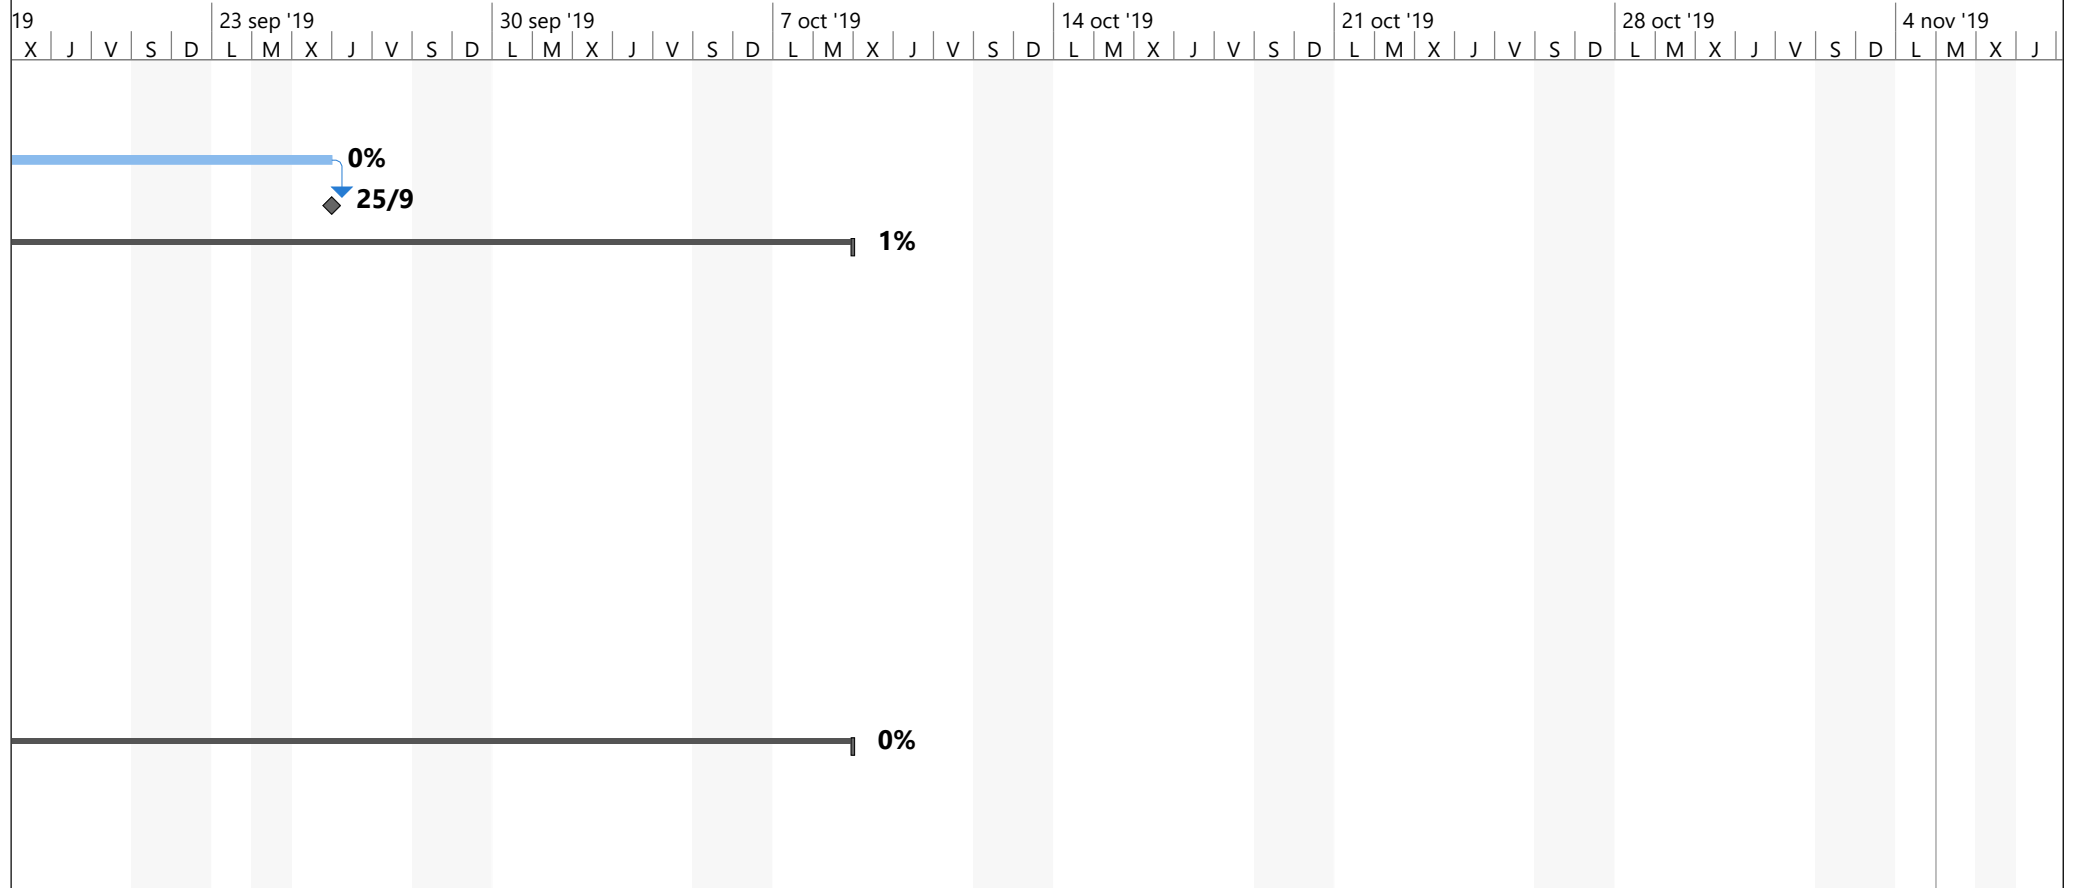

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr. 2019.mpp

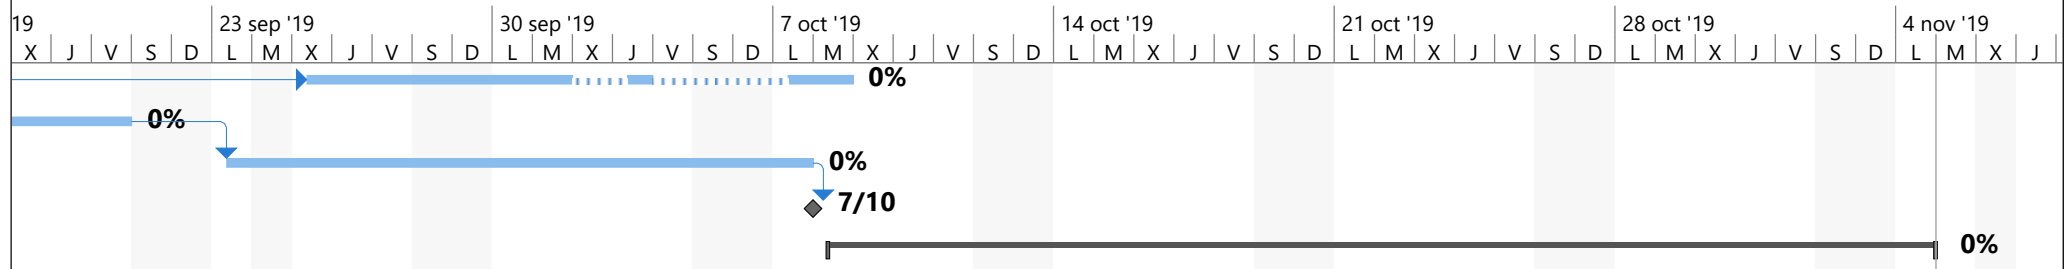

**Ing. Deivy Rodriguez**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorste Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorste.com.do P: www.edenorste.com.do

Síguenos en:



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |
