























































Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
1		Rehabilitación de Redes CHIVO106	257.13 días						
2		Adjudicación	0 días						
3		Periodo de Adquisiciones	80 días						
28		Ejecución	217 días						
29		Polígono 1	100 días						
30		Instalación	94 días						
31		Izado de postes	4 días						
32		Cimentaciones	5 días						
33		Retenidas	4 días						
34		Armados de Media y Baja Tensión	10 días						
35		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días						
36		Elementos de Protección y Maniobra	3 días						
37		Conexiones y Jumpers	6 días						
38		Transformadores	5 días						
39		Alumbrado Publico	4 días						
40		Normalización Suministros	12 días						
41		Remoción	40 días						
42		Tendido de Conductor Media Tensión	0 días						
43		Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días						
44		Armados de Media Tensión	5 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
45			Armados de Baja Tensión	8 días						
46			Transformadores	3 días						
47			Izado de postes	13 días						
48			Cierre de Polígono 1	0 días						
49			Polígono 2	145 días						
50			Instalación	145 días						
51			Izado de postes	22 días						
52			Cimentaciones	19 días						
53			Retenidas	14 días						
54			Armados de Media y Baja Tensión	19 días						
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días						
56			Elementos de Protección y Maniobra	15 días						
57			Conexiones y Jumpers	15 días						
58			Transformadores	25 días						
59			Alumbrado Publico	10 días						
60			Normalización Suministros	41 días						
61			Remoción	41 días						
62			Tendido de Conductor Media Tensión	14 días						
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días						
64			Armados de Media Tensión	7 días						
































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
65		Armados de Baja Tensión	11 días						
66		Transformadores	16 días						
67		Izado de postes	17 días						
68		Cierre de Polígono 2	0 días						
69		Polígono 3	172 días						
70		Instalación	140 días						
71		Izado de postes	12 días						
72		Cimentaciones	8 días						
73		Retenidas	7 días						
74		Armados de Media y Baja Tensión	40 días						
75		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días						
76		Elementos de Protección y Maniobra	7 días						
77		Conexiones y Jumpers	10 días						
78		Transformadores	10 días						
79		Alumbrado Publico	7 días						
80		Normalización Suministros	16 días						
81		Remoción	81 días						
82		Tendido de Conductor Media Tensión	21 días						
83		Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días						
84		Armados de Media Tensión	10 días						






Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
85			Armados de Baja Tensión	16 días						
86			Transformadores	6 días						
87			Izado de postes	25 días						
88			Cierre de Polígono 3	0 días						
89			Polígono 4	179 días						
90			Instalación	169 días						
91			Izado de postes	6 días						
92			Cimentaciones	5 días						
93			Retenidas	4 días						
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días						
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días						
96			Elementos de Protección y Maniobra	7 días						
97			Conexiones y Jumpers	8 días						
98			Transformadores	14 días						
99			Alumbrado Publico	6 días						
100			Normalización Suministros	18 días						
101			Remoción	29 días						
102			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días						
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días						
104			Armados de Media Tensión	12 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
105		Armados de Baja Tensión	10 días						
106		Transformadores	9 días						
107		lizado de postes	15 días						
108		Cierre de Polígono 4	0 días						
109		Cierre de Obras	20 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

◆ 1/10

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

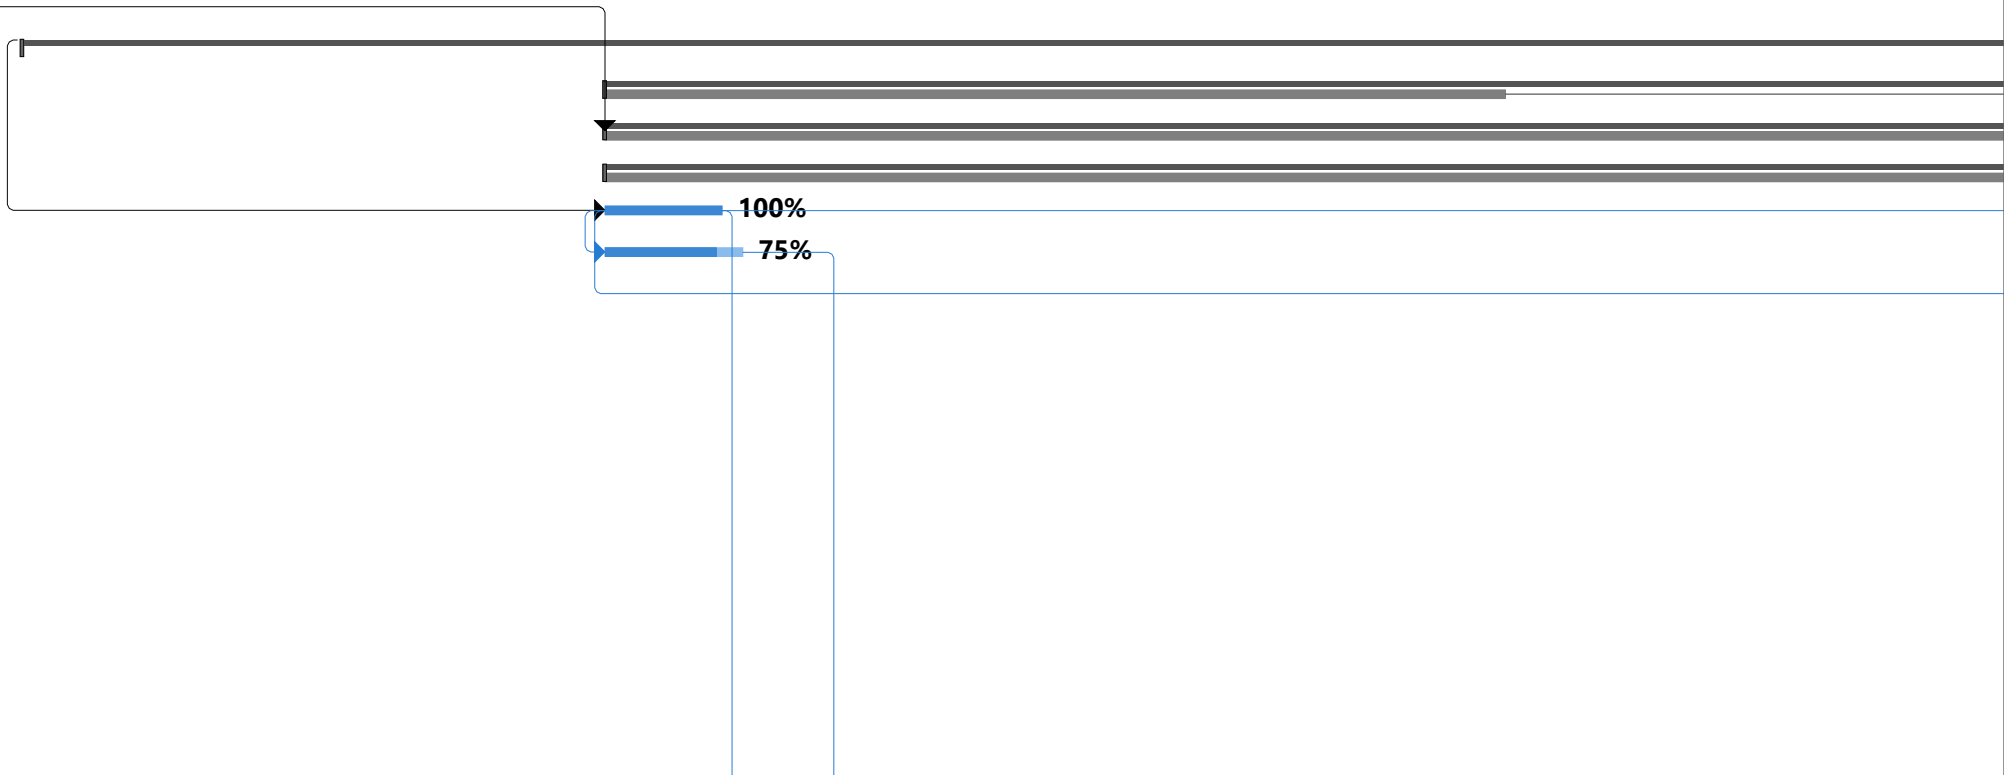

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

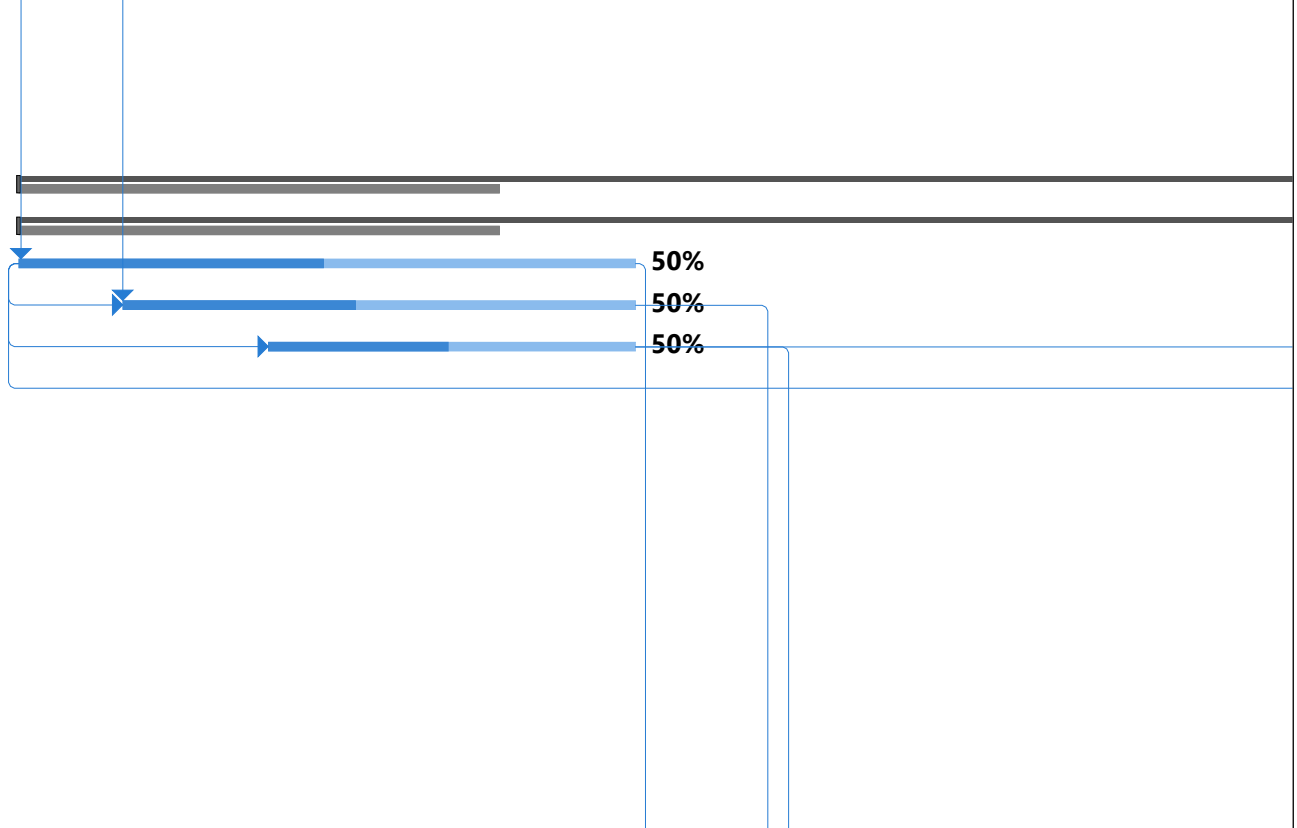

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

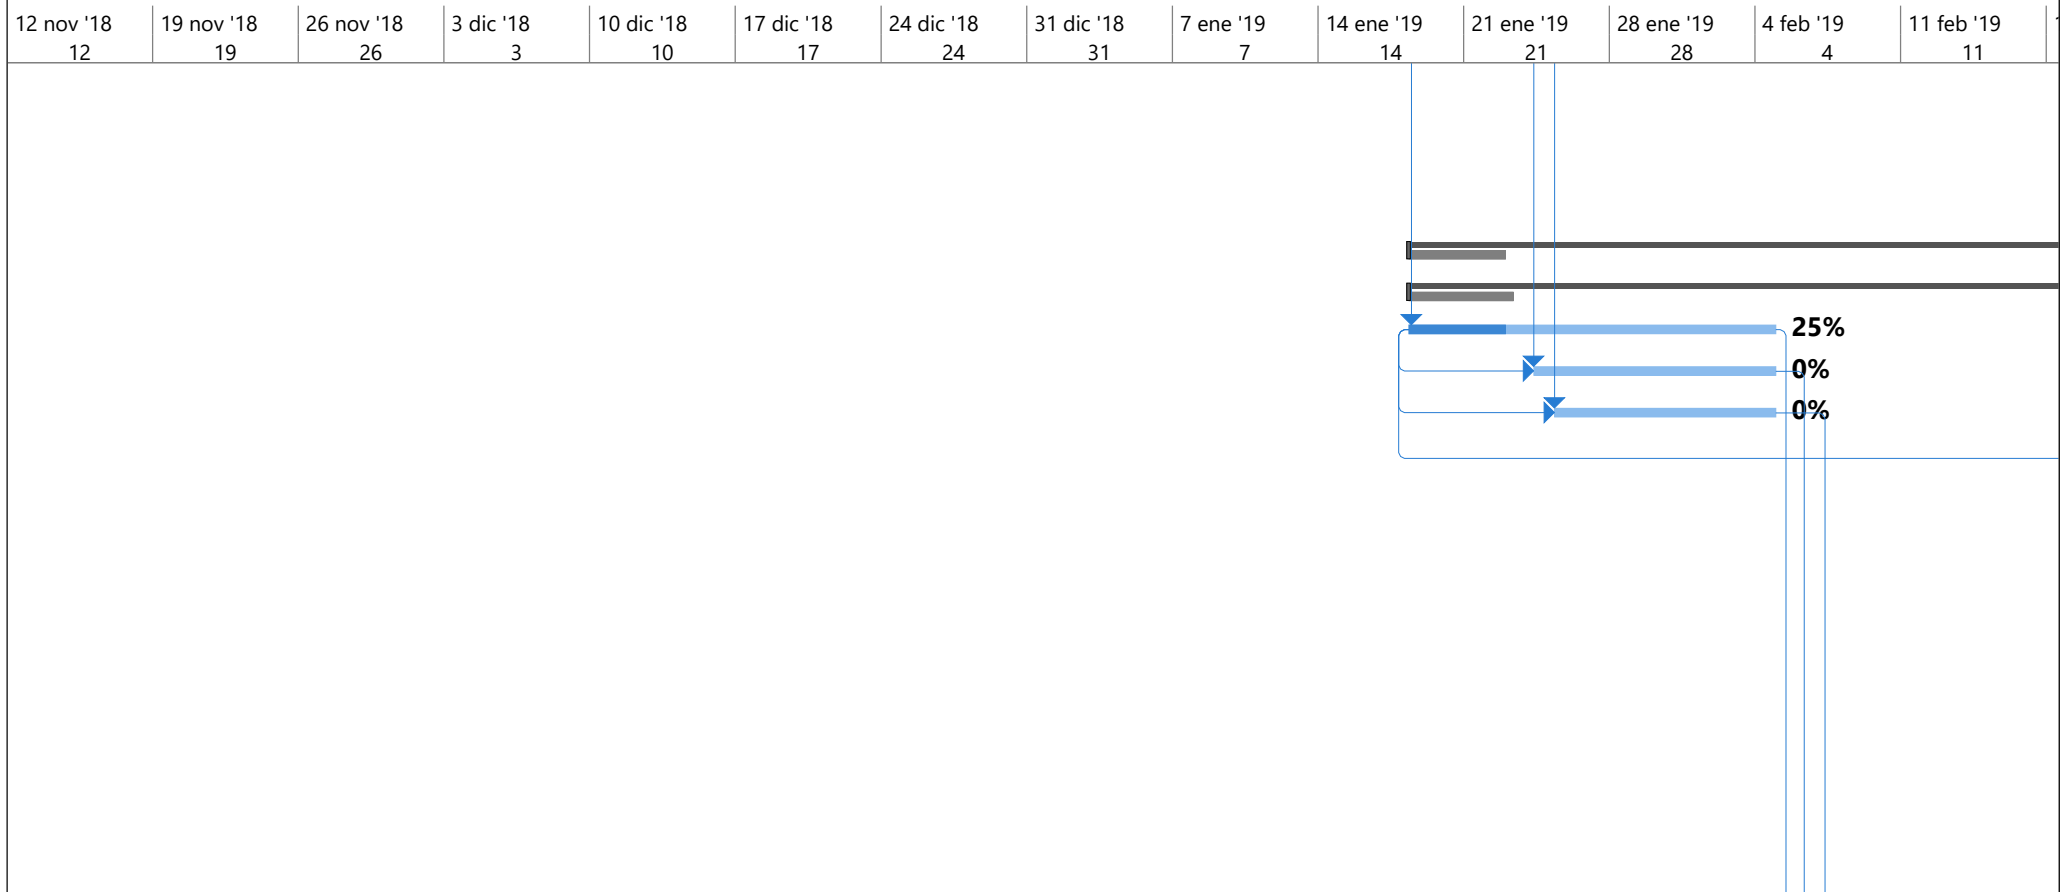

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

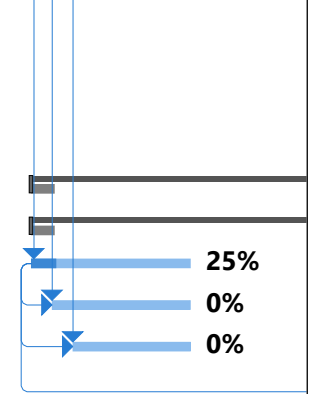

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

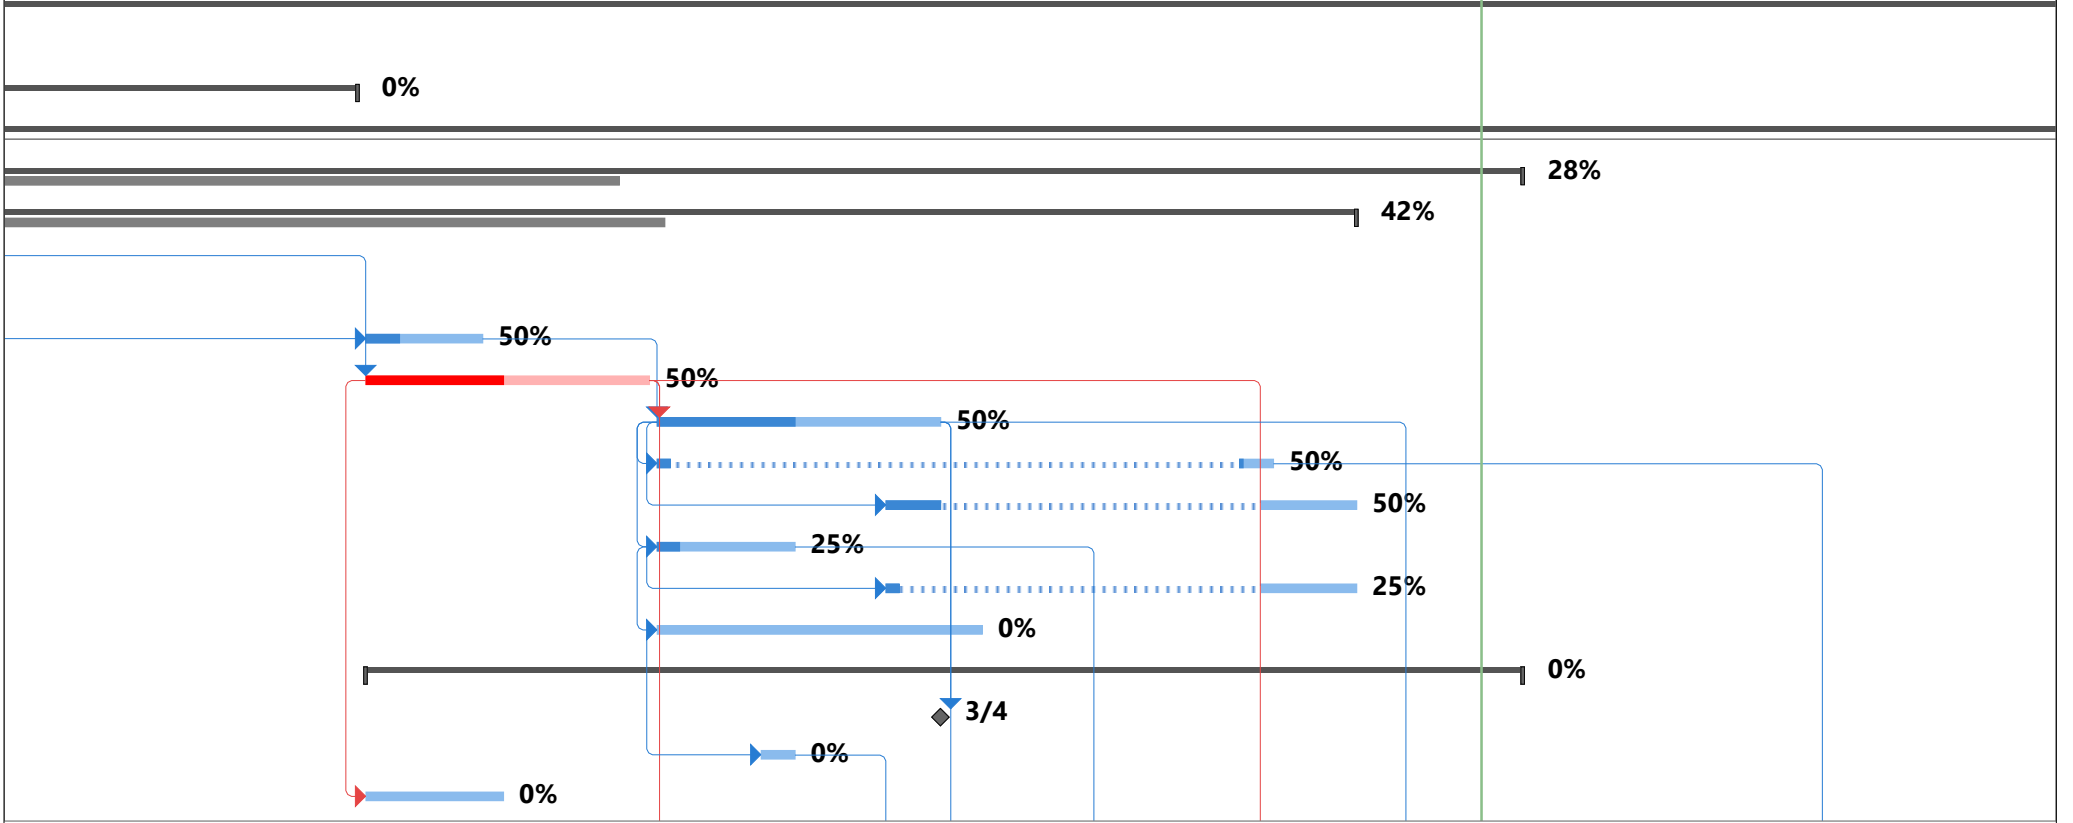


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

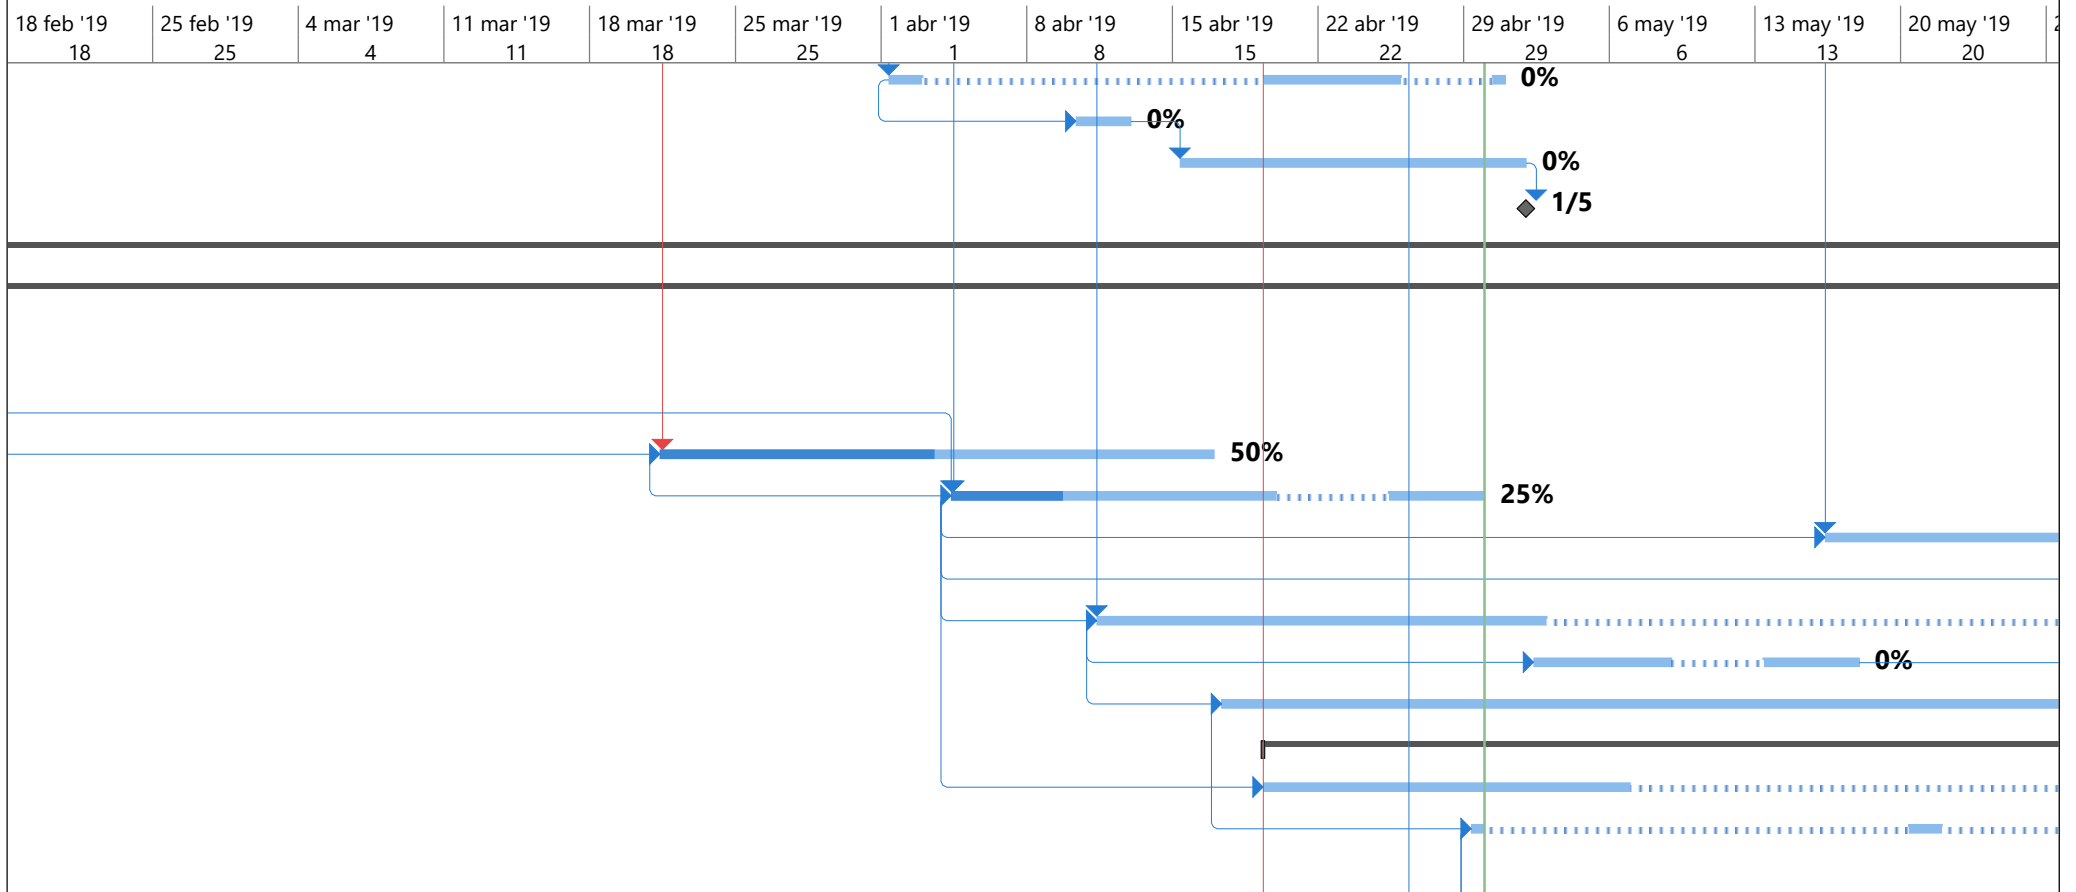

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




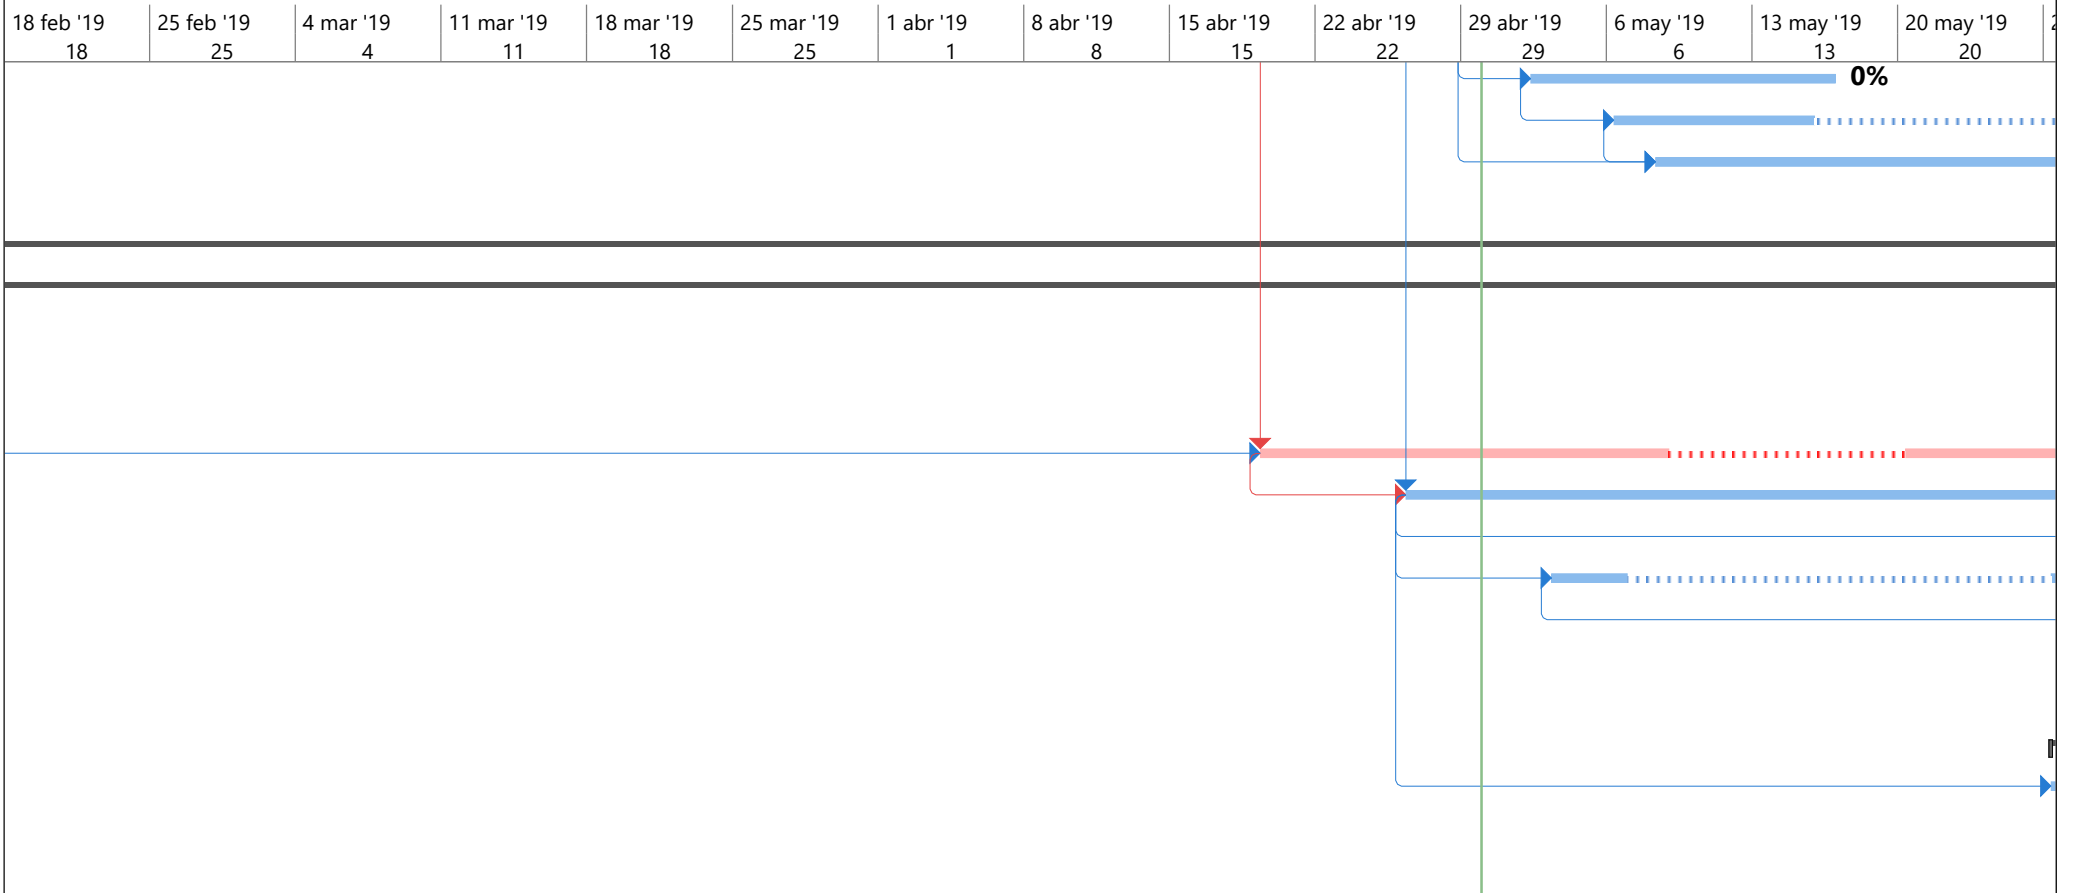




















Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	27 may '19 27

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--

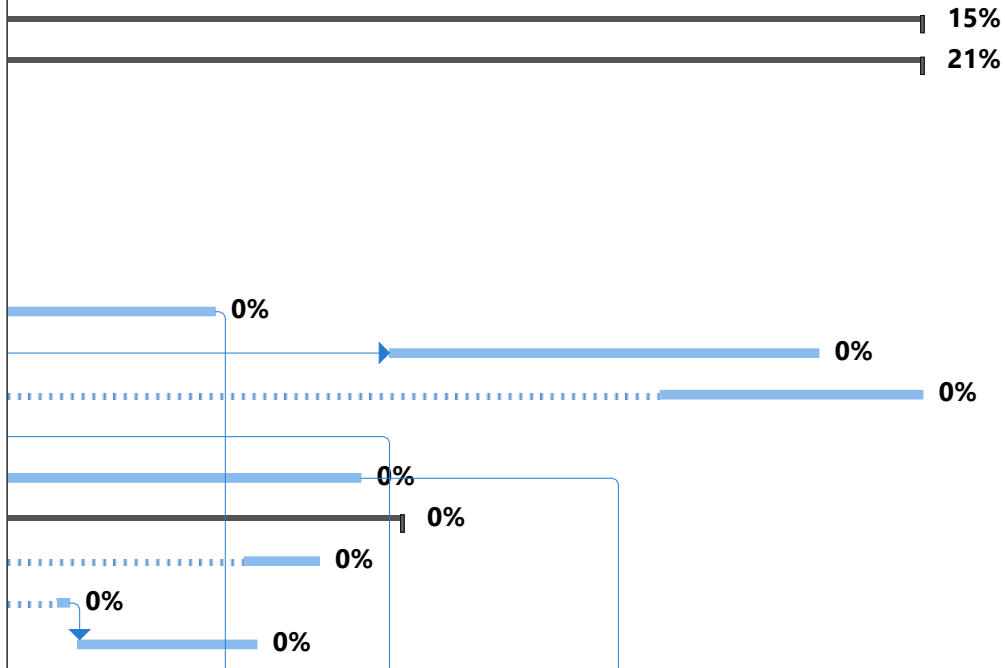


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

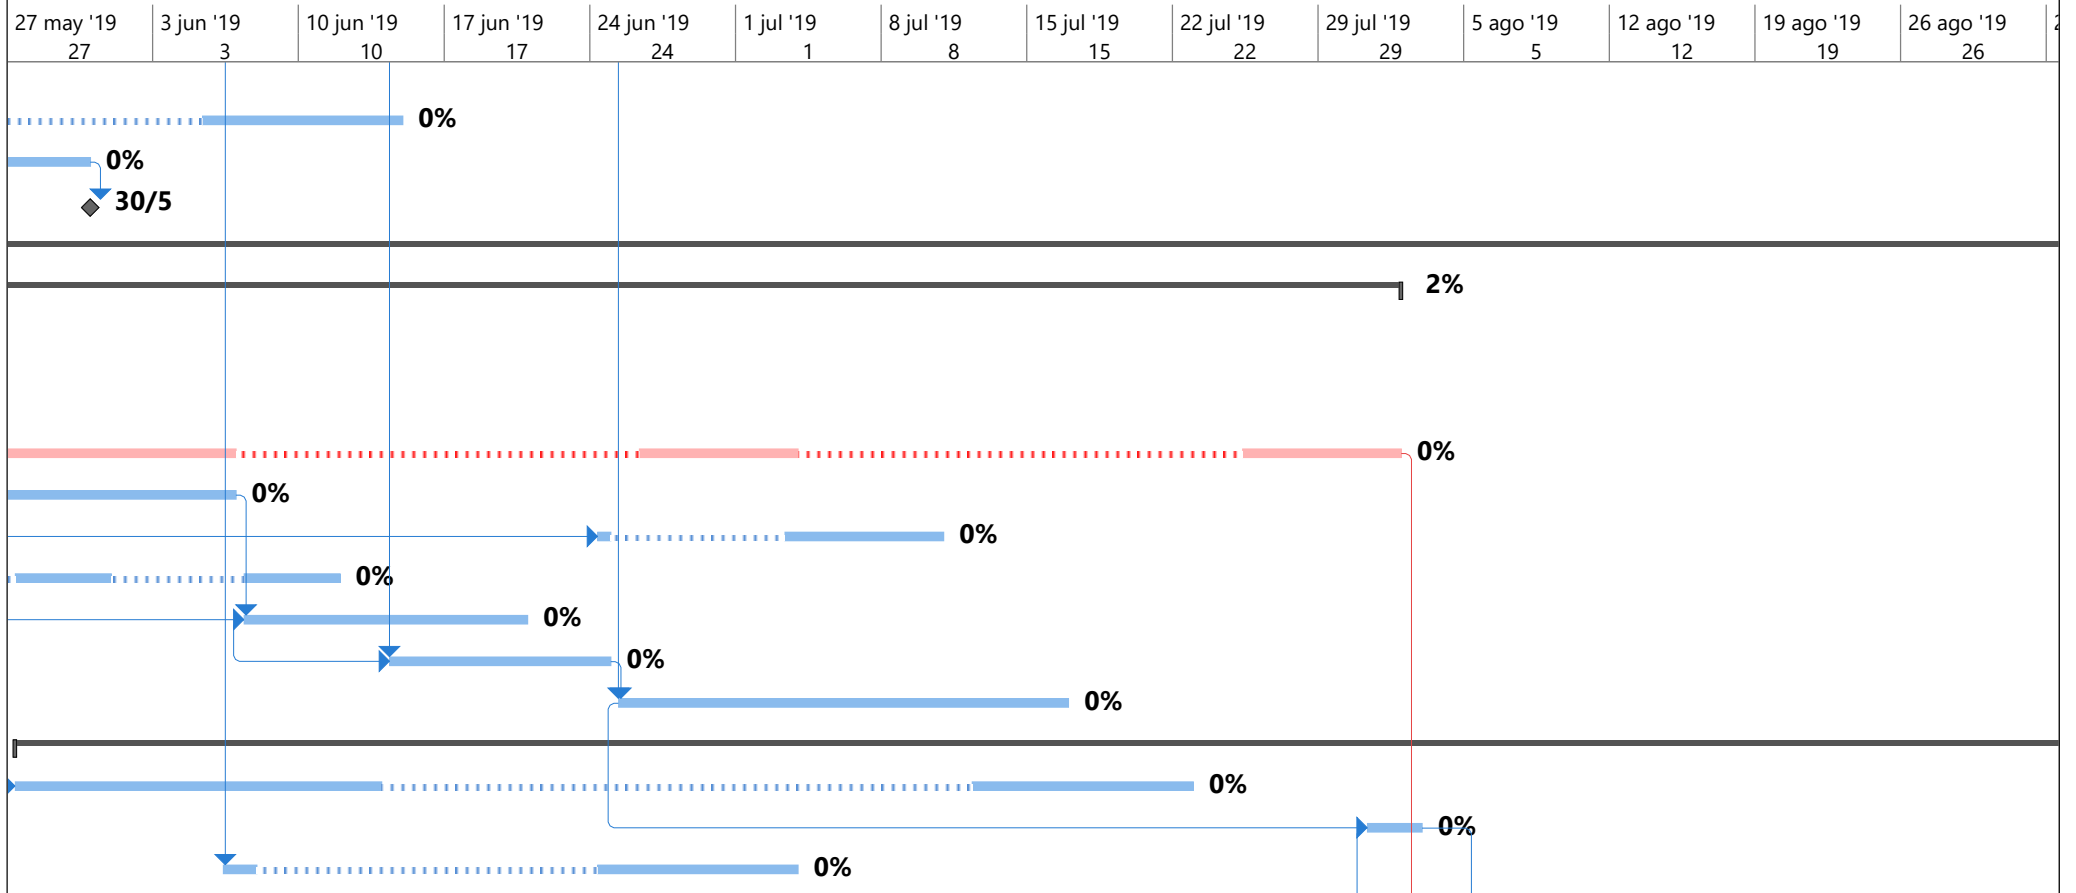

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

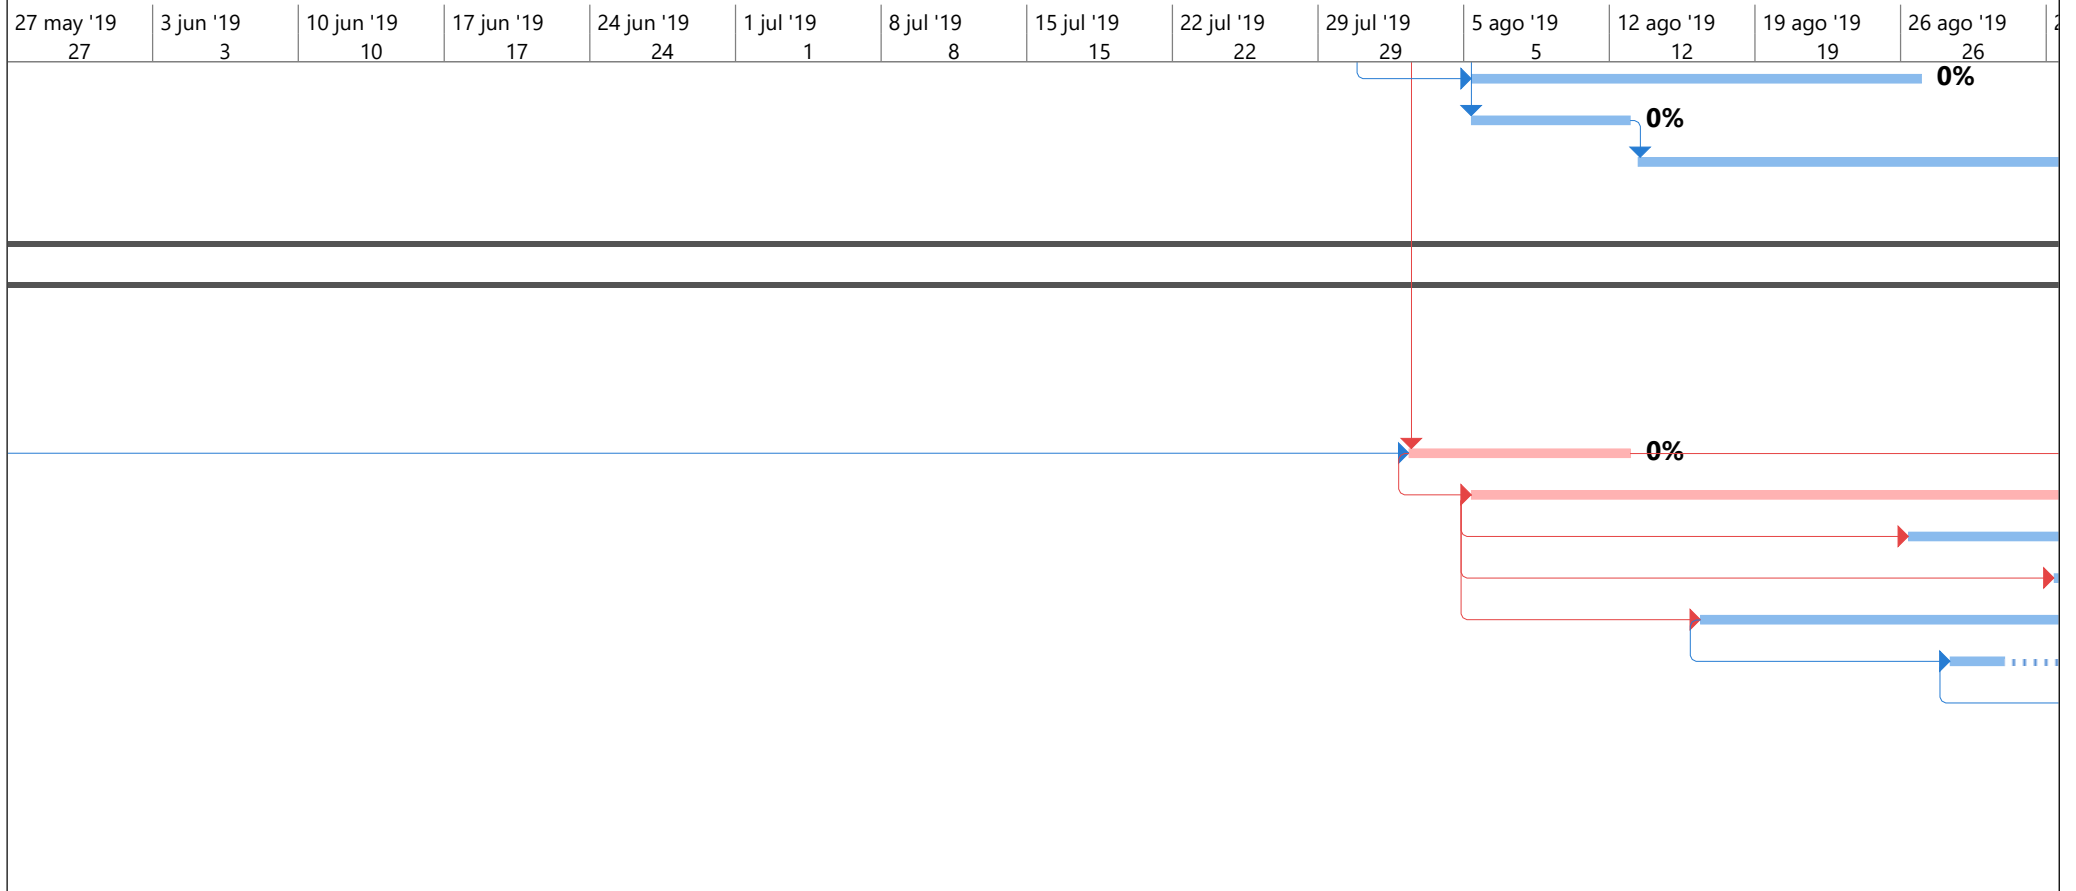

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp


27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	2
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	---



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

























2 sep '19 2	9 sep '19 9	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	7 oct '19 7	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	4 nov '19 4	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25	2 dic '19 2
----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

2 sep '19 2	9 sep '19 9	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	7 oct '19 7	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	4 nov '19 4	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25	2 dic '19 2


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

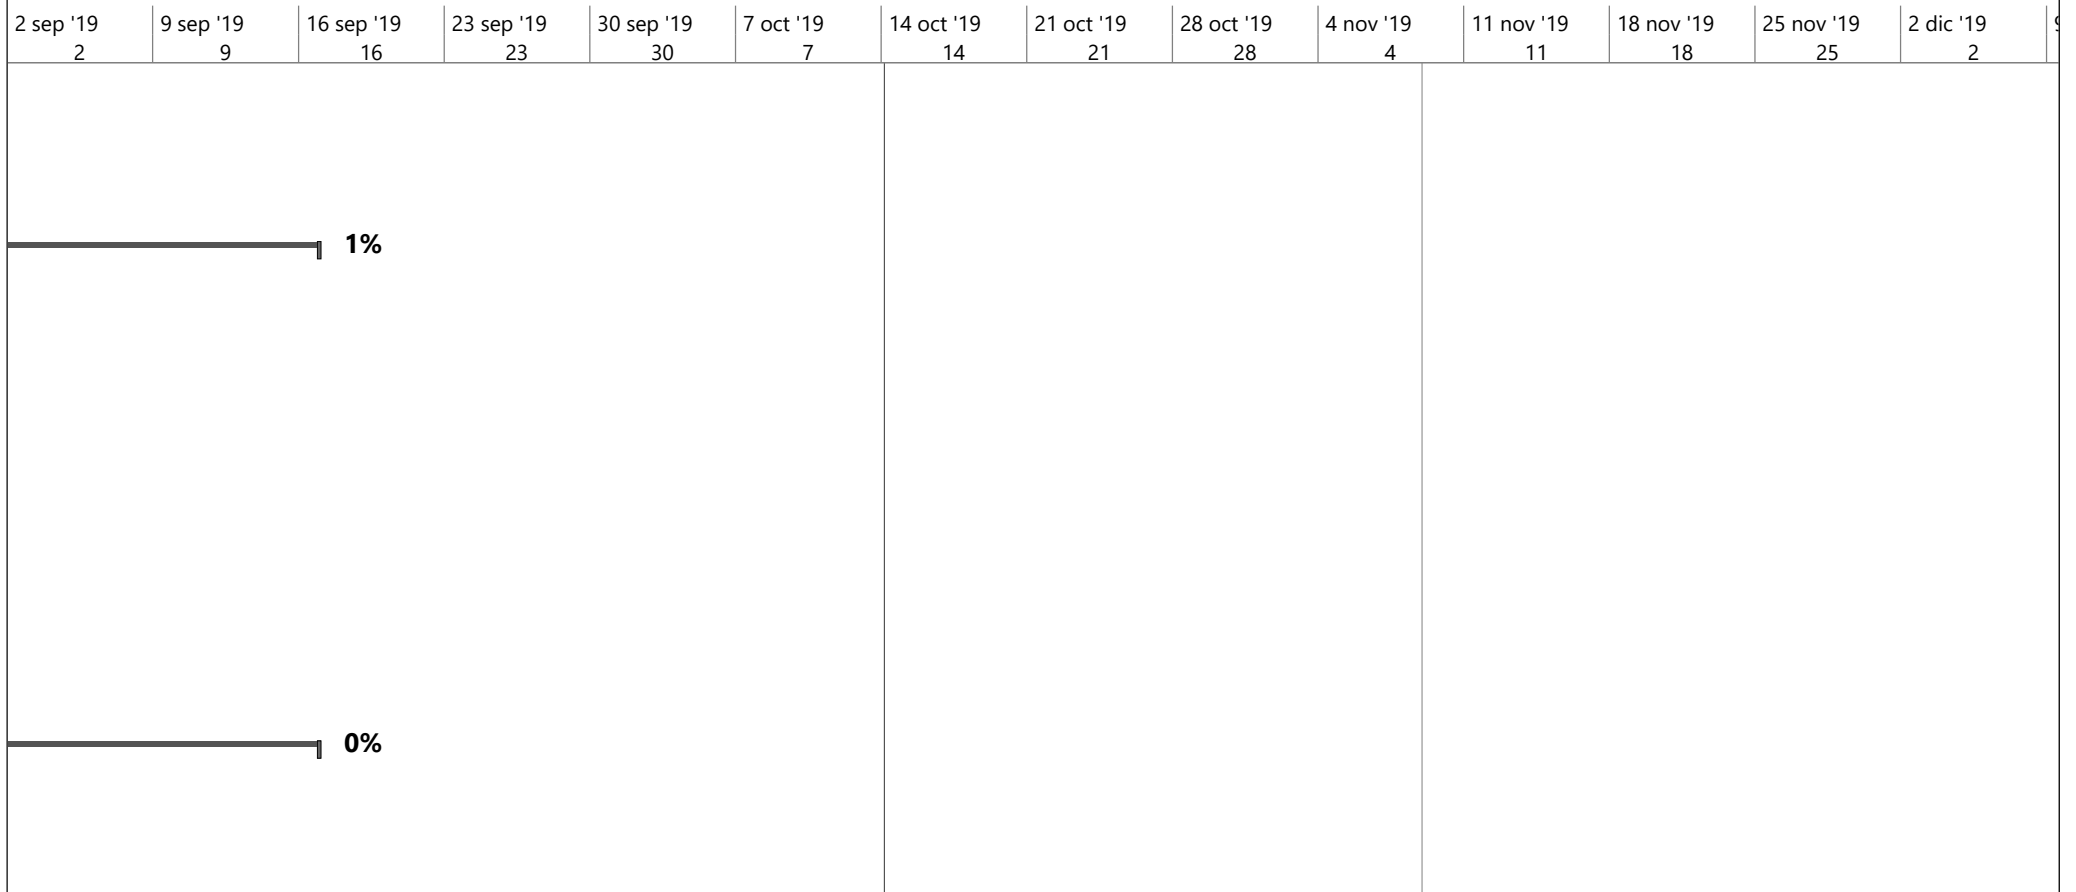


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

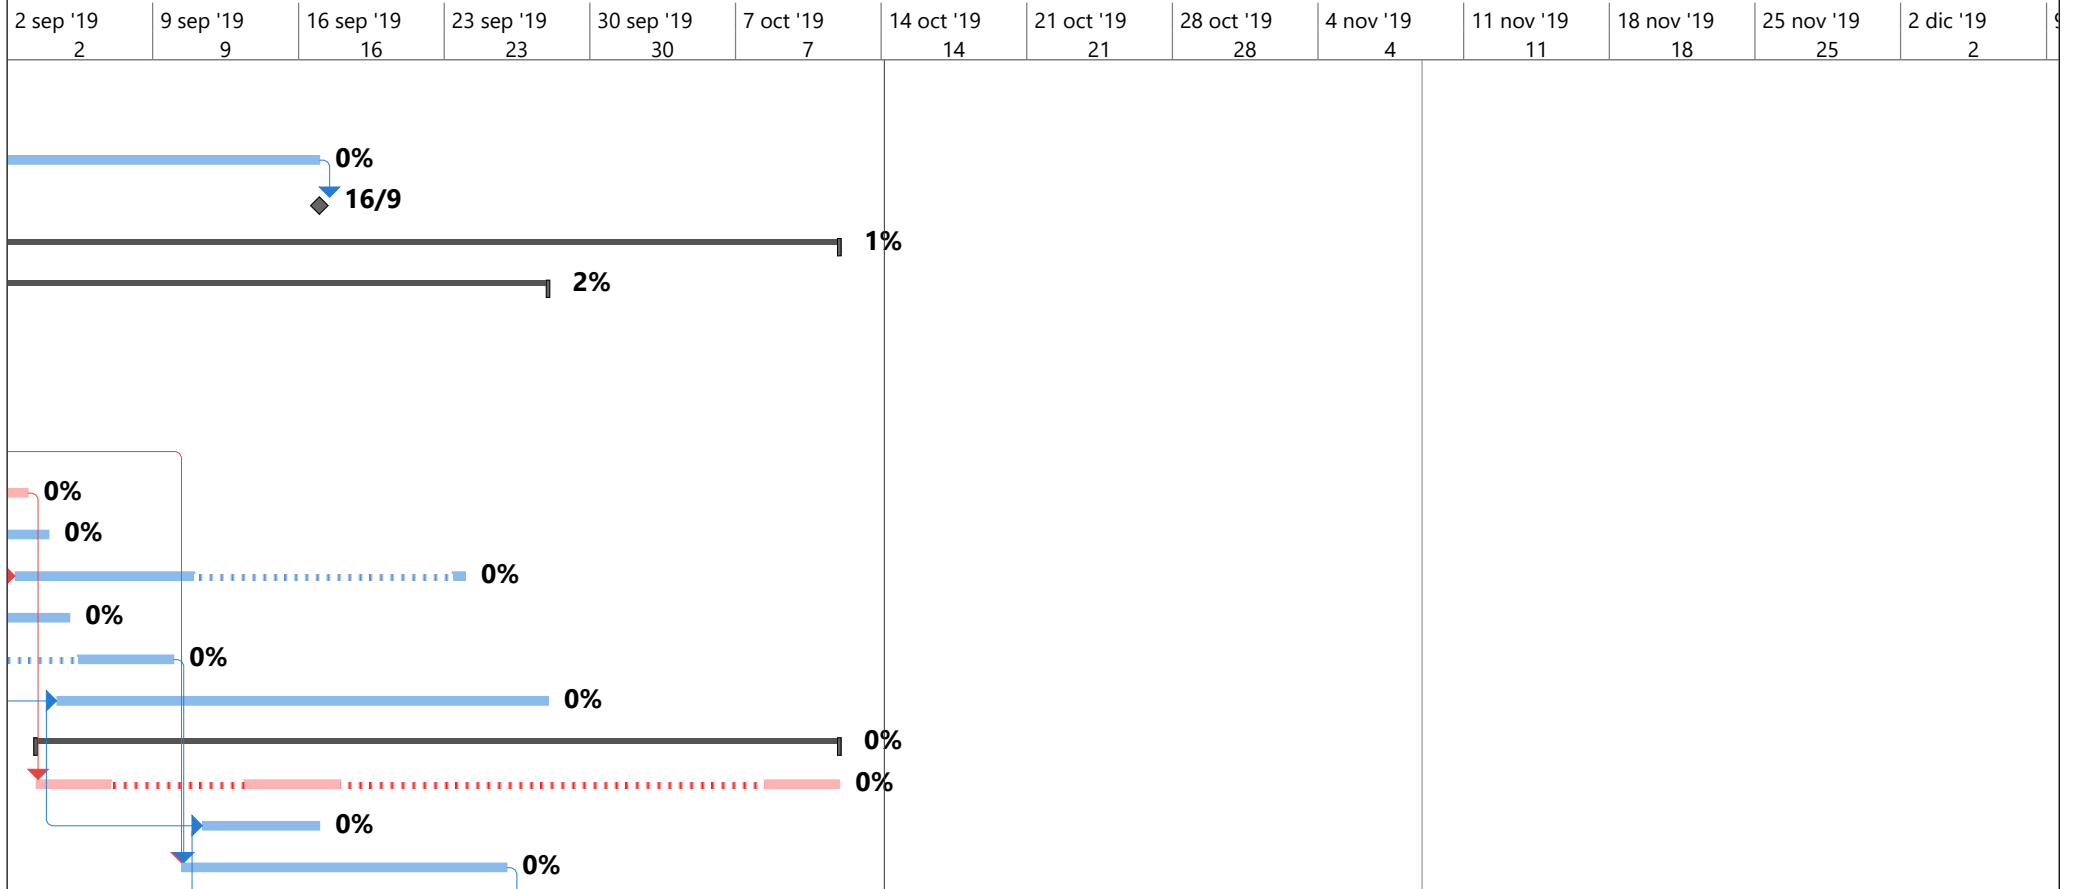

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr. 2019.mpp

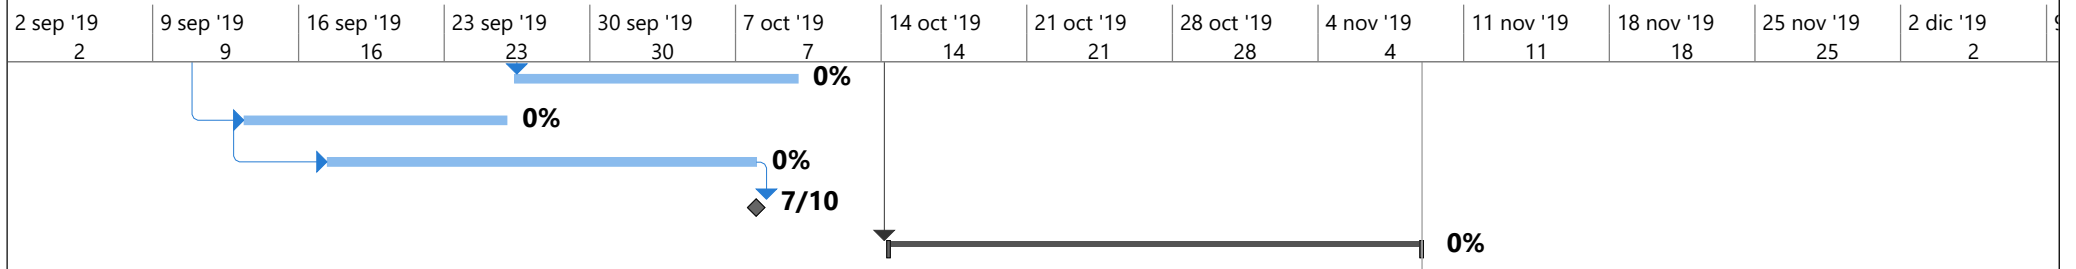

Ing. Deivy Rodriguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
