





























































































Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
1			<b>Rehabilitación de Redes CHIVO106</b>	<b>257.13 días</b>						
2			Adjudicación	0 días						
3			<b>Periodo de Adquisiciones</b>	<b>80 días</b>						
28			<b>Ejecución</b>	<b>217 días</b>						
29			<b>Polígono 1</b>	<b>100 días</b>						
30			<b>Instalación</b>	<b>94 días</b>						
31			Izado de postes	4 días						
32			Cimentaciones	5 días						
33			Retenidas	4 días						
34			Armados de Media y Baja Tensión	10 días						
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días						
36			Elementos de Protección y Maniobra	3 días						
37			Conexiones y Jumpers	6 días						
38			Transformadores	5 días						
39			Alumbrado Publico	4 días						
40			Normalización Suministros	12 días						
41			<b>Remoción</b>	<b>40 días</b>						
42			Tendido de Conductor Media Tensión	0 días						
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días						
44			Armados de Media Tensión	5 días						









Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
45			Armados de Baja Tensión	8 días						
46			Transformadores	3 días						
47			Izado de postes	13 días						
48			Cierre de Polígono 1	0 días						
49			<b>Polígono 2</b>	<b>145 días</b>						
50			<b>Instalación</b>	<b>145 días</b>						
51			Izado de postes	22 días						
52			Cimentaciones	19 días						
53			Retenidas	14 días						
54			Armados de Media y Baja Tensión	19 días						
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días						
56			Elementos de Protección y Maniobra	15 días						
57			Conexiones y Jumpers	15 días						
58			Transformadores	25 días						
59			Alumbrado Publico	10 días						
60			Normalización Suministros	41 días						
61			<b>Remoción</b>	<b>41 días</b>						
62			Tendido de Conductor Media Tensión	14 días						
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días						
64			Armados de Media Tensión	7 días						






























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
65		Armados de Baja Tensión	11 días						
66		Transformadores	16 días						
67		Izado de postes	17 días						
68		Cierre de Polígono 2	0 días						
69		<b>Polígono 3</b>	<b>172 días</b>						
70		<b>Instalación</b>	<b>140 días</b>						
71		Izado de postes	12 días						
72		Cimentaciones	8 días						
73		Retenidas	7 días						
74		Armados de Media y Baja Tensión	40 días						
75		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días						
76		Elementos de Protección y Maniobra	7 días						
77		Conexiones y Jumpers	10 días						
78		Transformadores	10 días						
79		Alumbrado Publico	7 días						
80		Normalización Suministros	16 días						
81		<b>Remoción</b>	<b>81 días</b>						
82		Tendido de Conductor Media Tensión	21 días						
83		Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días						
84		Armados de Media Tensión	10 días						








Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
85			Armados de Baja Tensión	16 días						
86			Transformadores	6 días						
87			Izado de postes	25 días						
88			Cierre de Polígono 3	0 días						
89			<b>Polígono 4</b>	<b>179 días</b>						
90			<b>Instalación</b>	<b>169 días</b>						
91			Izado de postes	6 días						
92			Cimentaciones	5 días						
93			Retenidas	4 días						
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días						
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días						
96			Elementos de Protección y Maniobra	7 días						
97			Conexiones y Jumpers	8 días						
98			Transformadores	14 días						
99			Alumbrado Publico	6 días						
100			Normalización Suministros	18 días						
101			<b>Remoción</b>	<b>29 días</b>						
102			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días						
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días						
104			Armados de Media Tensión	12 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
105		Armados de Baja Tensión	10 días						
106		Transformadores	9 días						
107		Izado de postes	15 días						
108		Cierre de Polígono 4	0 días						
109		<b>Cierre de Obras</b>	<b>20 días</b>						
110		Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms						
111		Presentación de Cierre de Obras	0 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30	
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

◆ 1/10

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

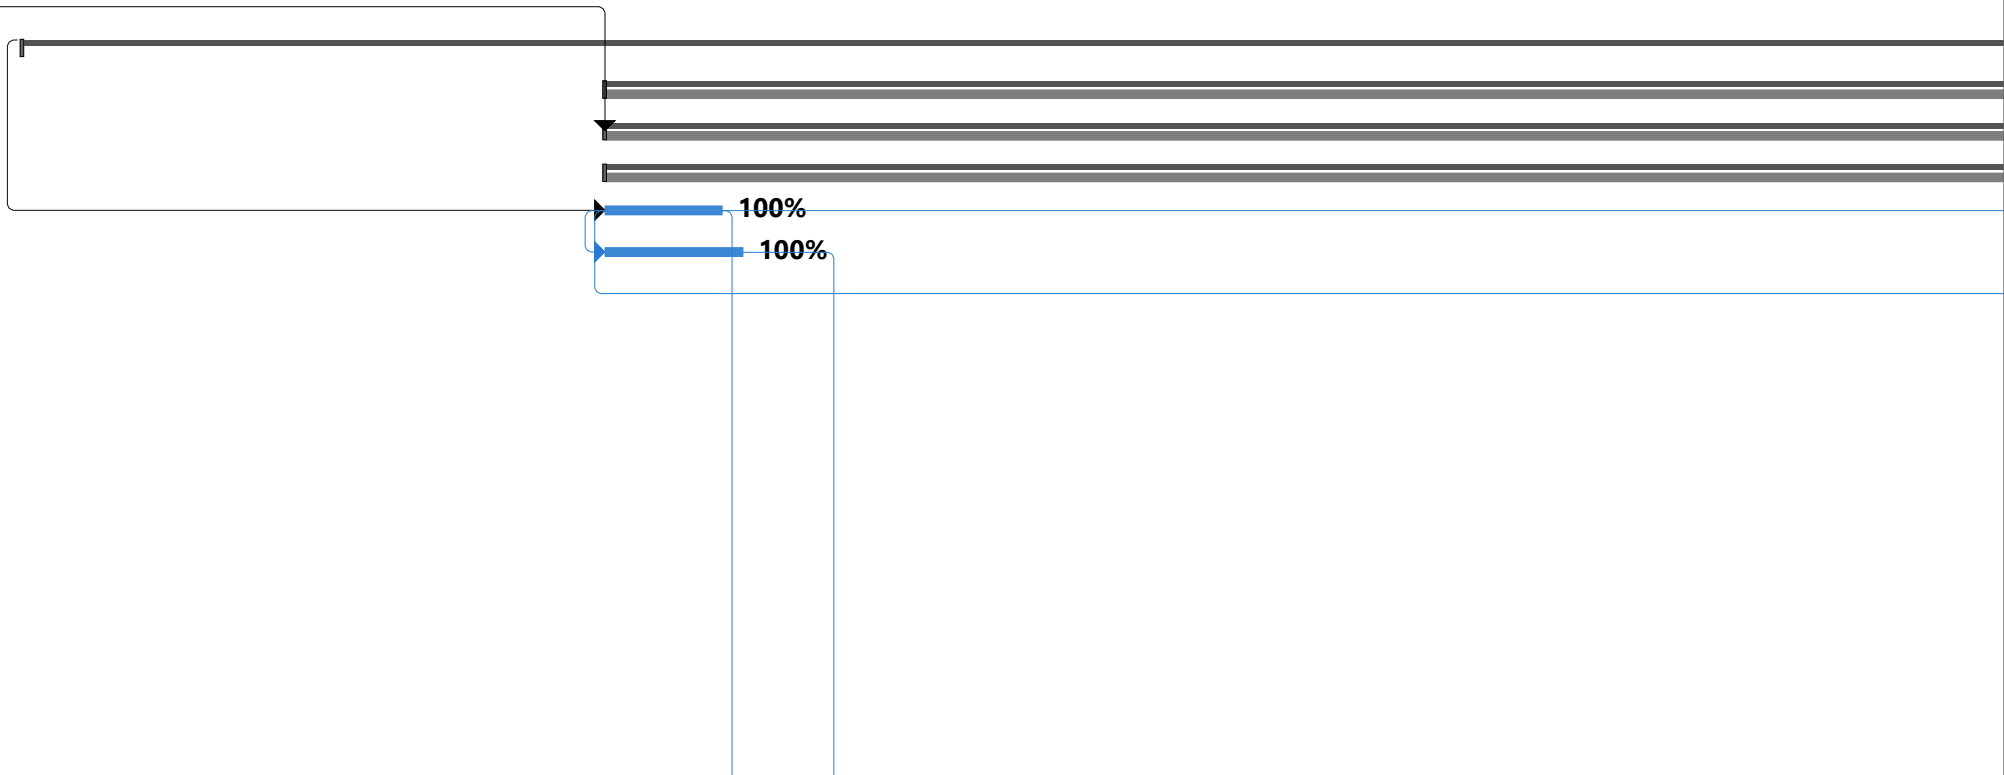

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




### Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

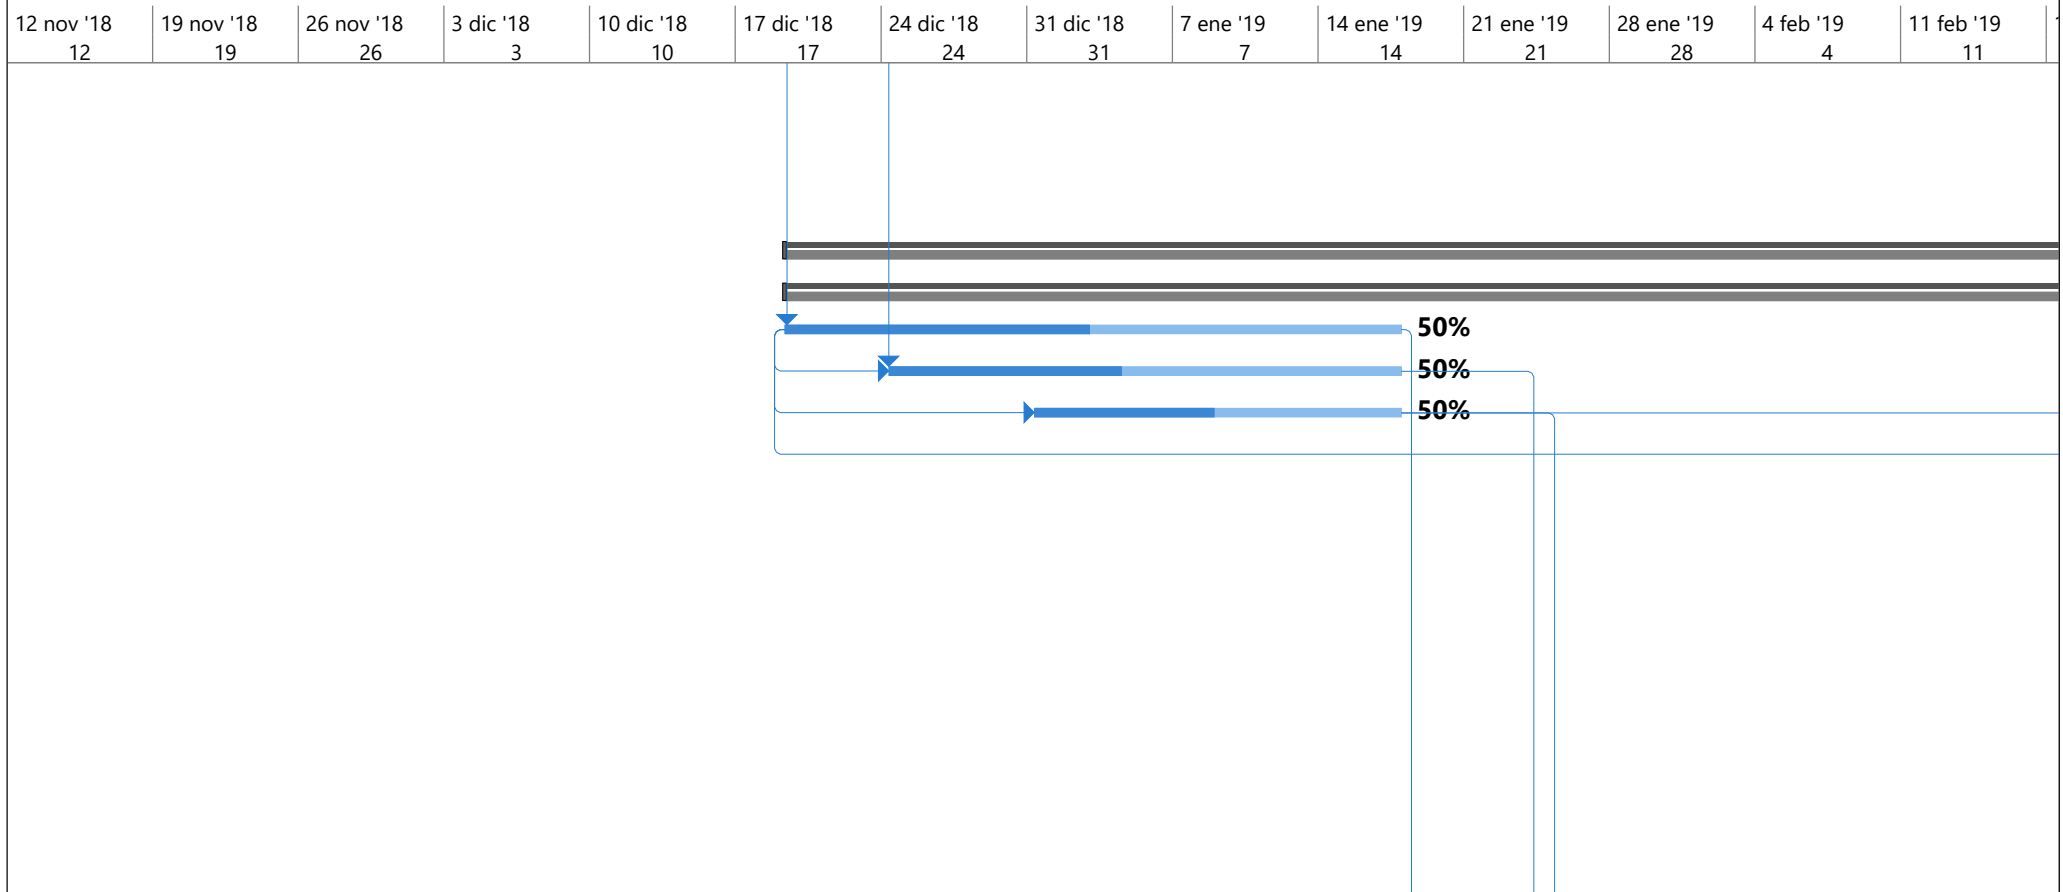

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

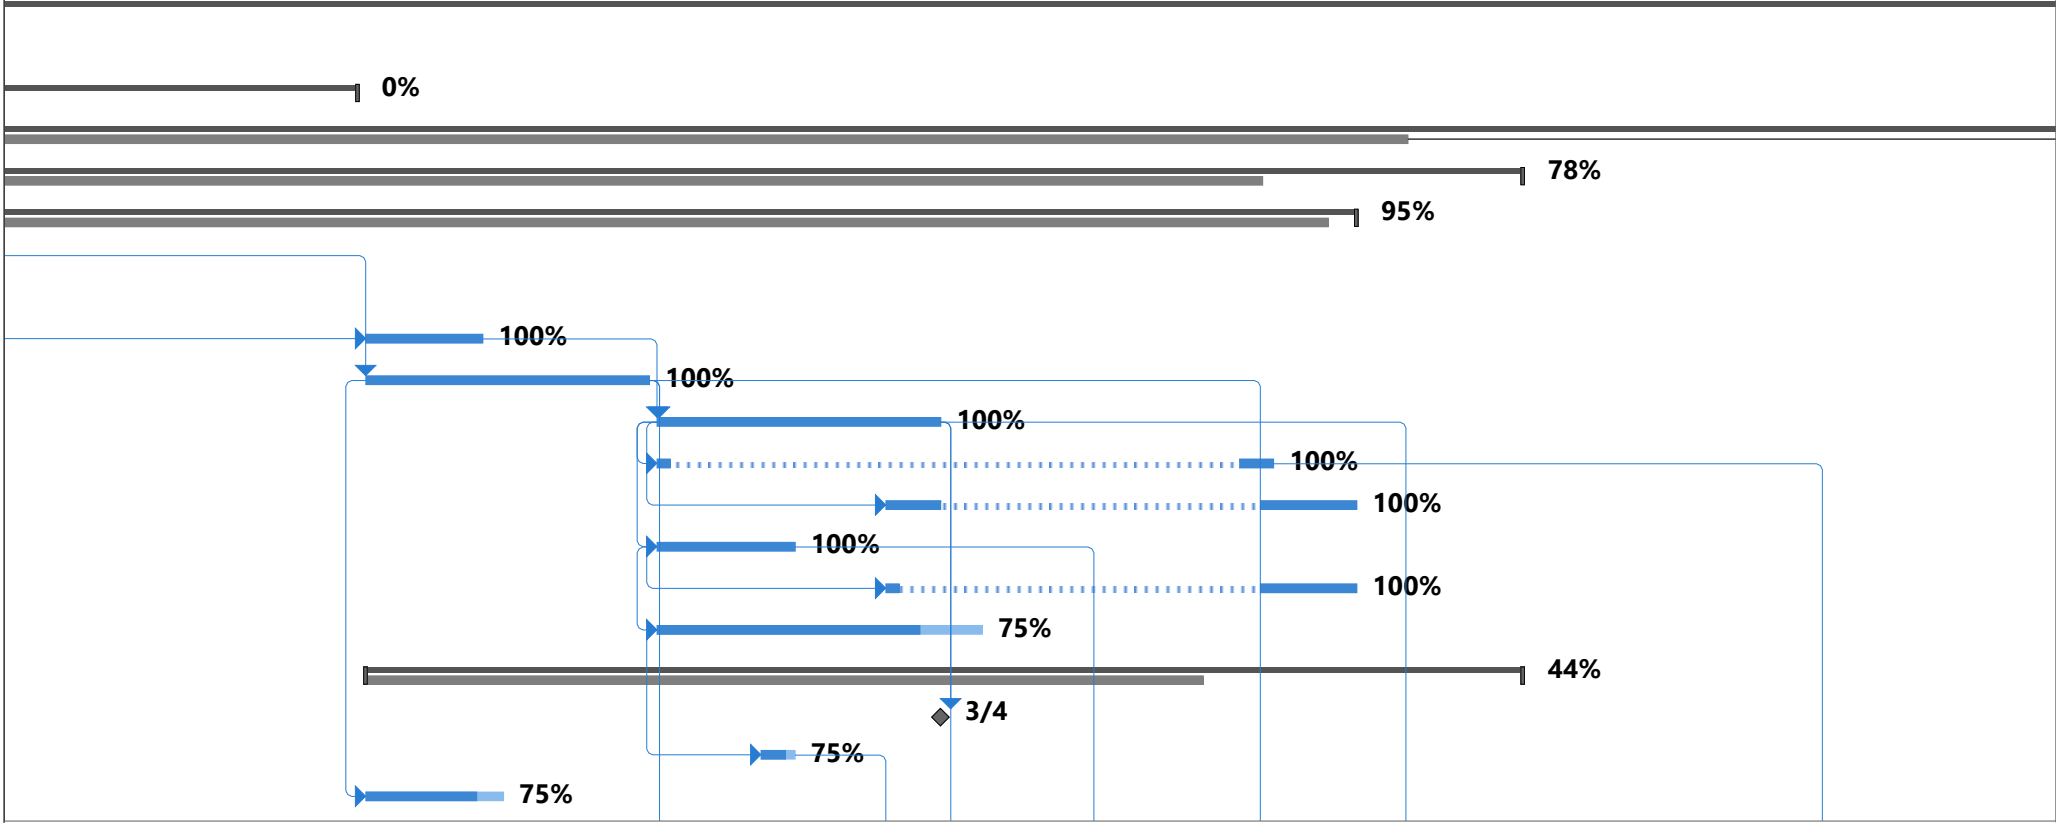


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

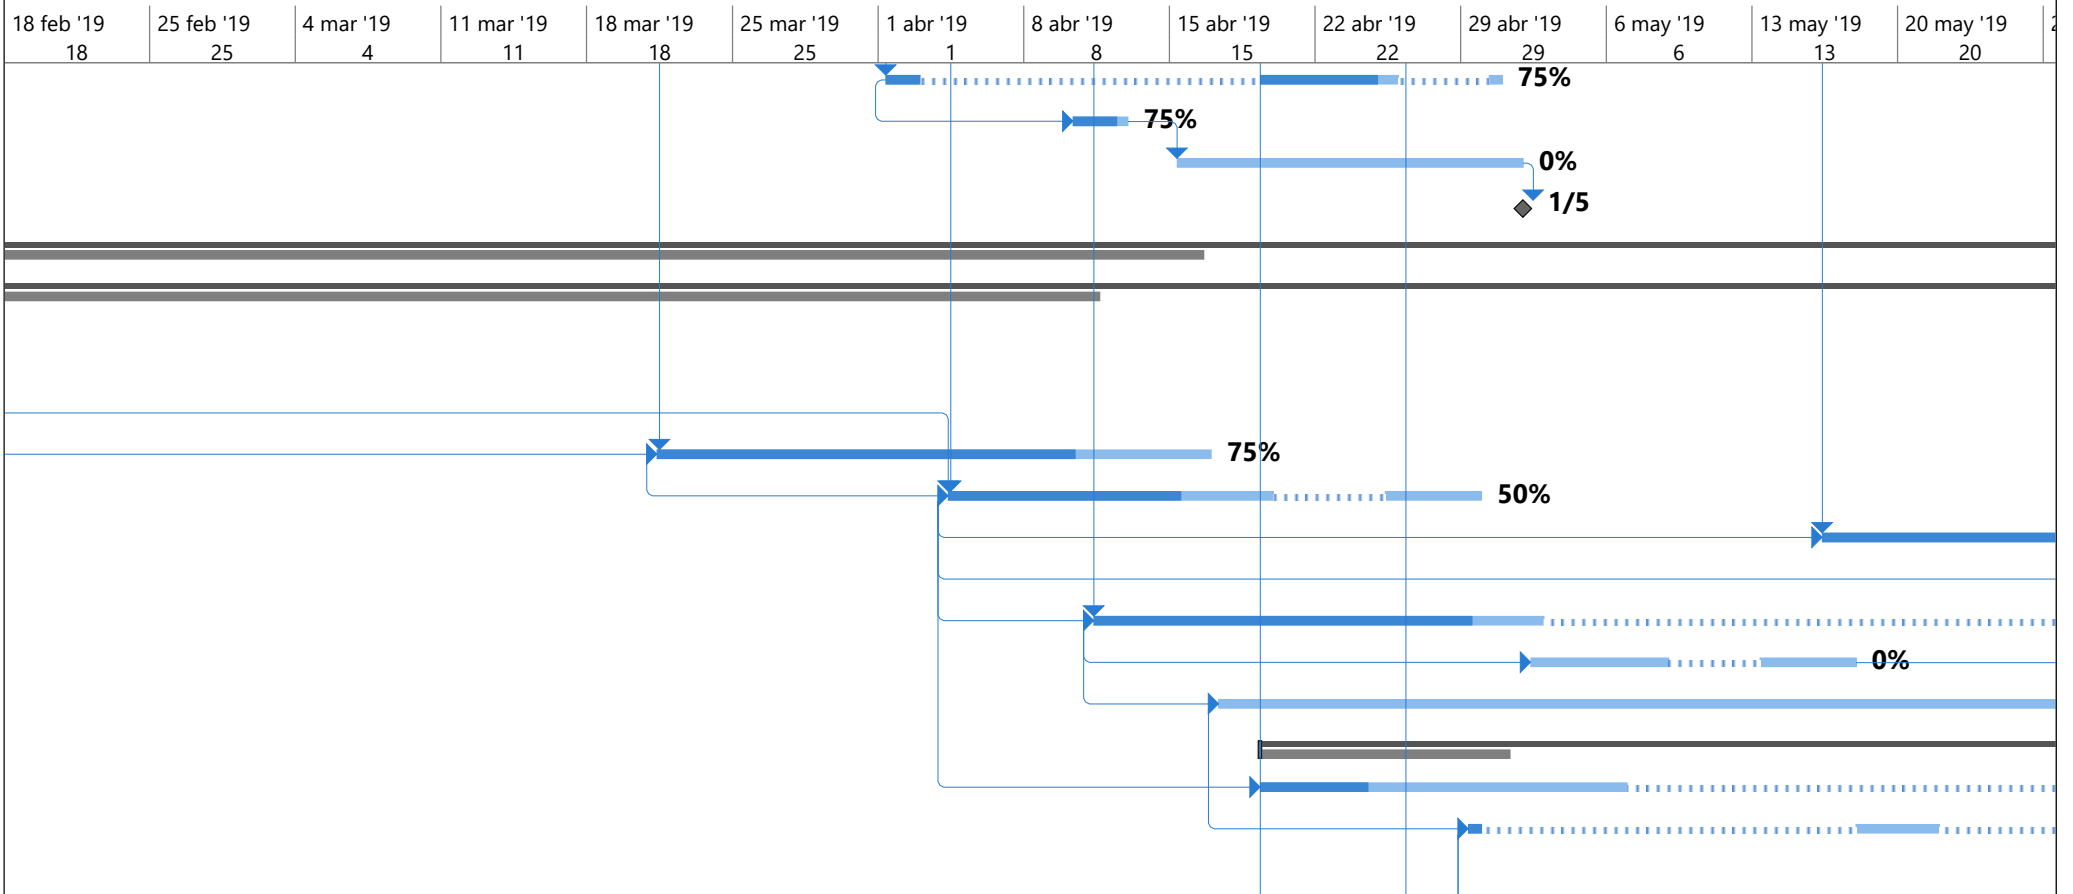

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

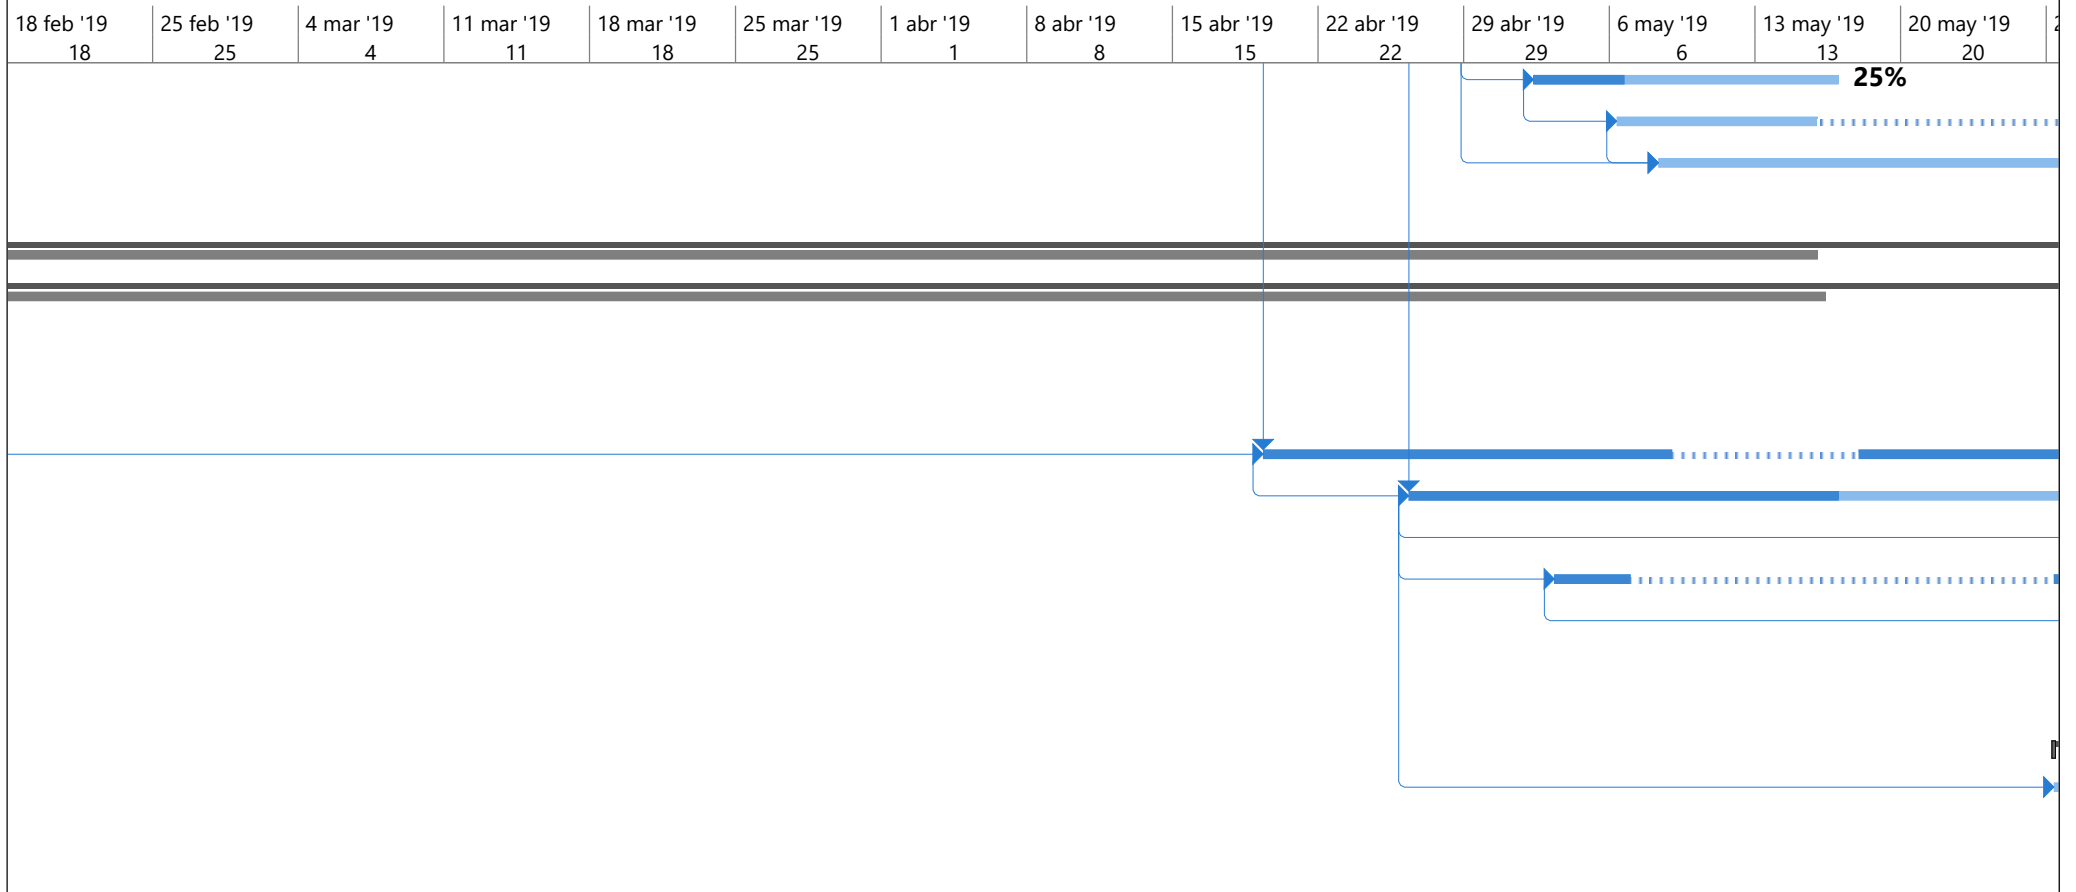

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	27 may '19 27
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	27 may '19 27
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

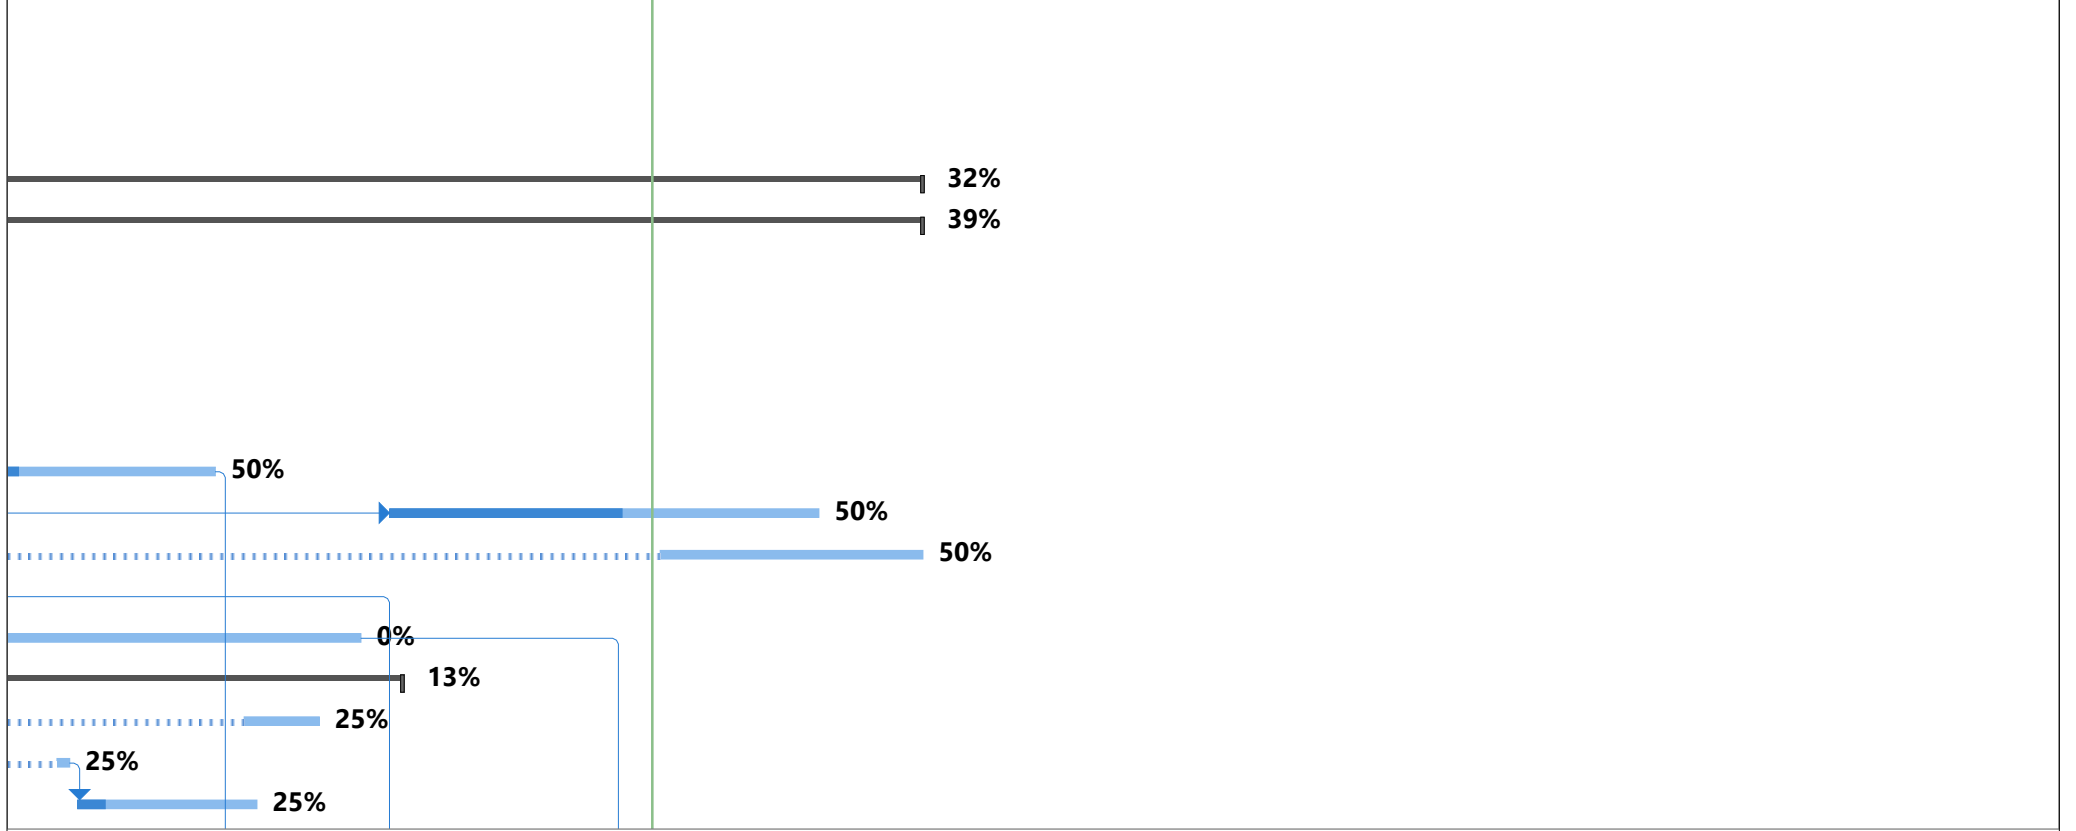


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

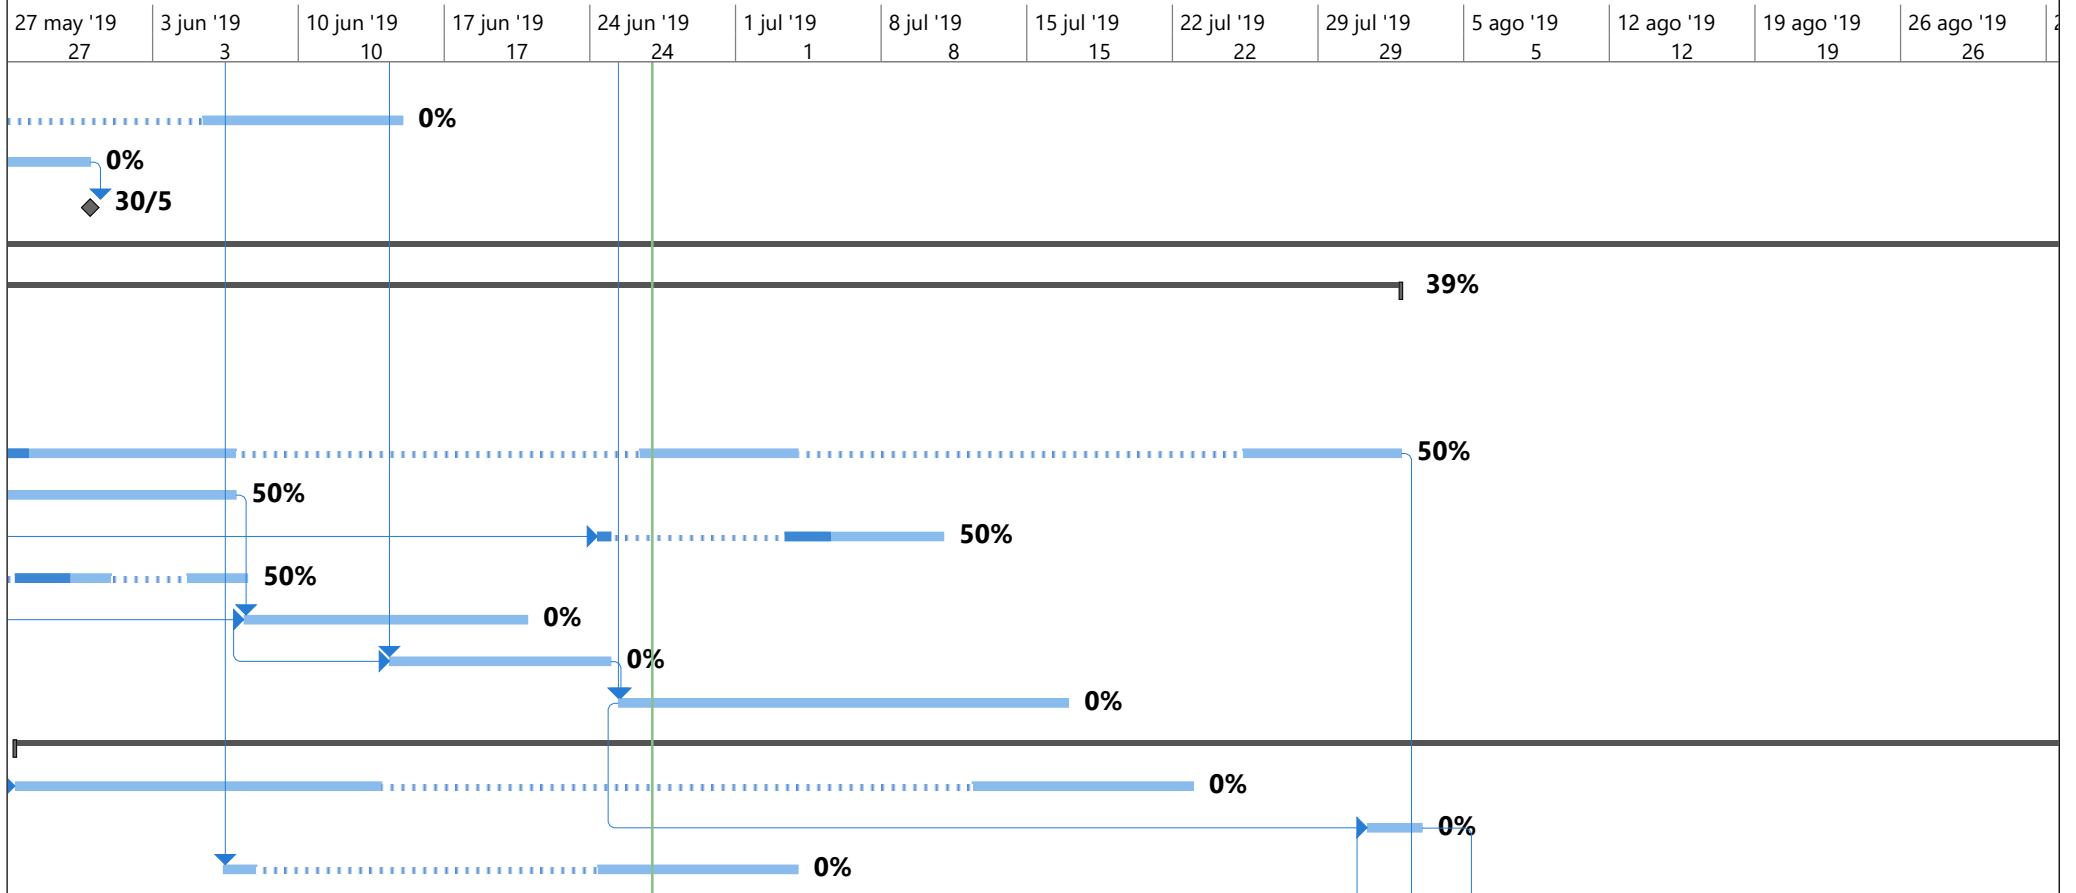

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

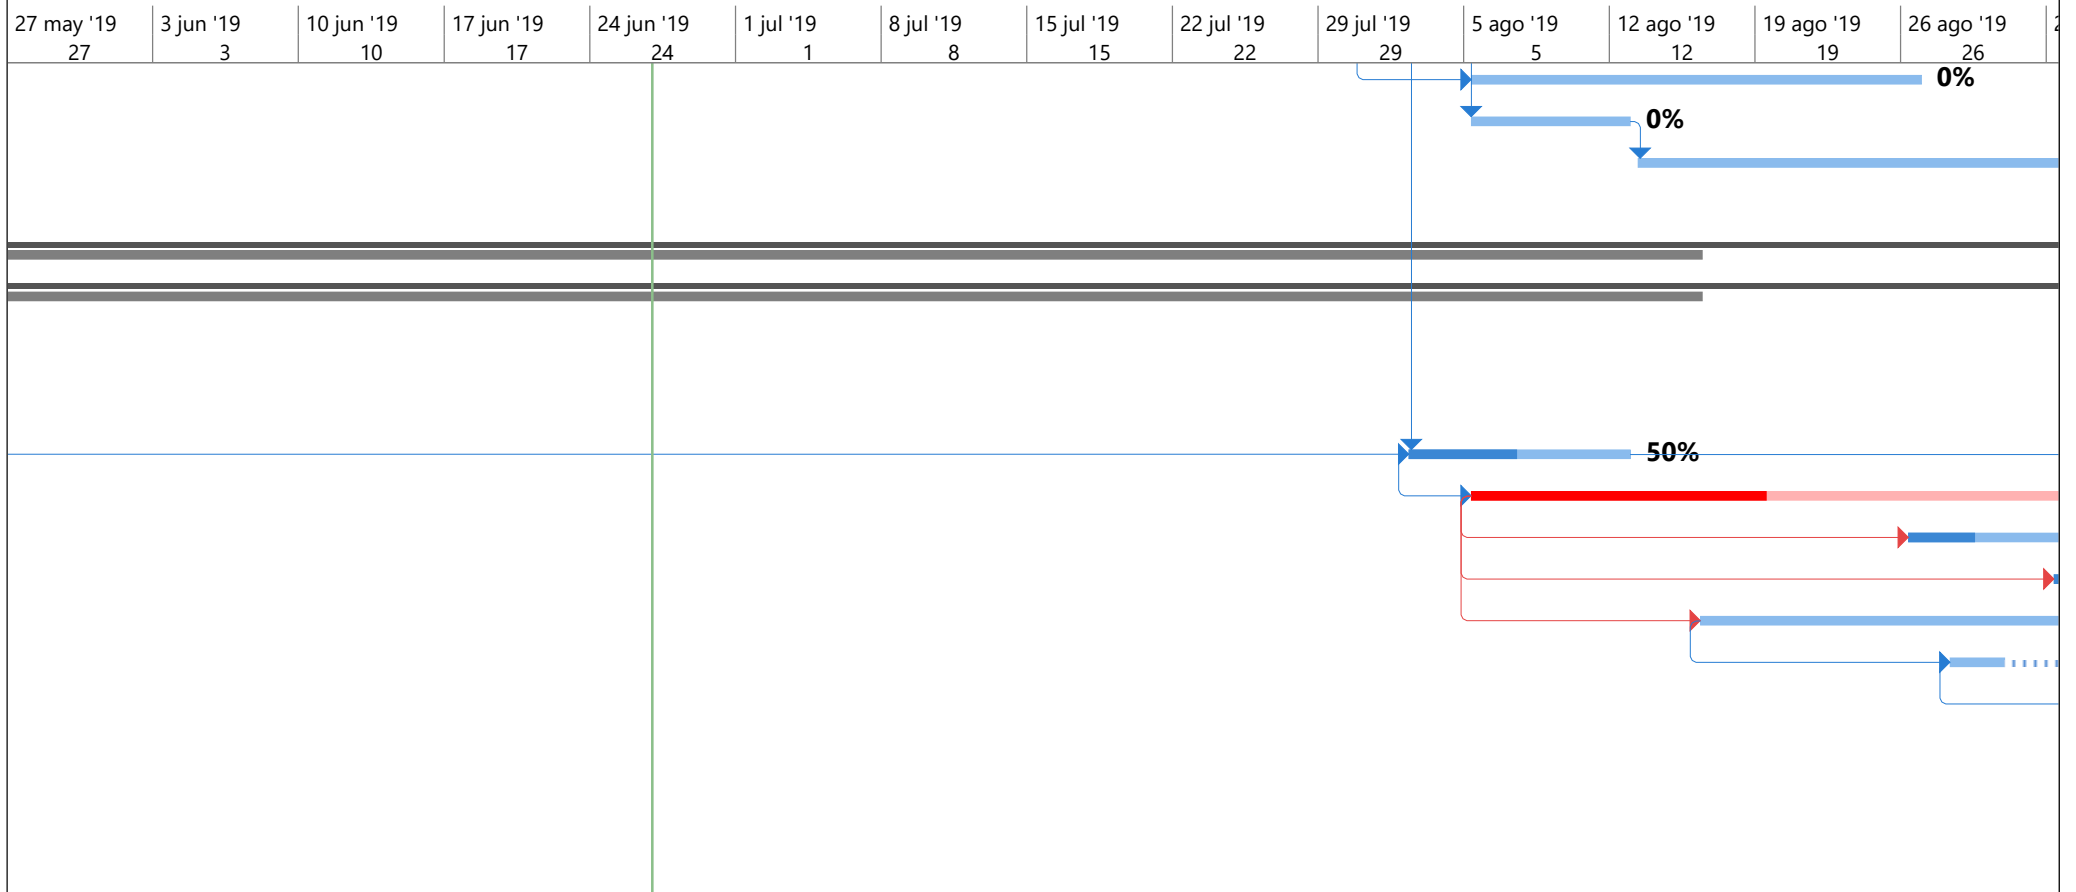

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp


27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	2
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	---



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

























2 sep '19 2	9 sep '19 9	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	7 oct '19 7	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	4 nov '19 4	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25	2 dic '19 2
----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

2 sep '19 2	9 sep '19 9	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	7 oct '19 7	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	4 nov '19 4	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25	2 dic '19 2

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

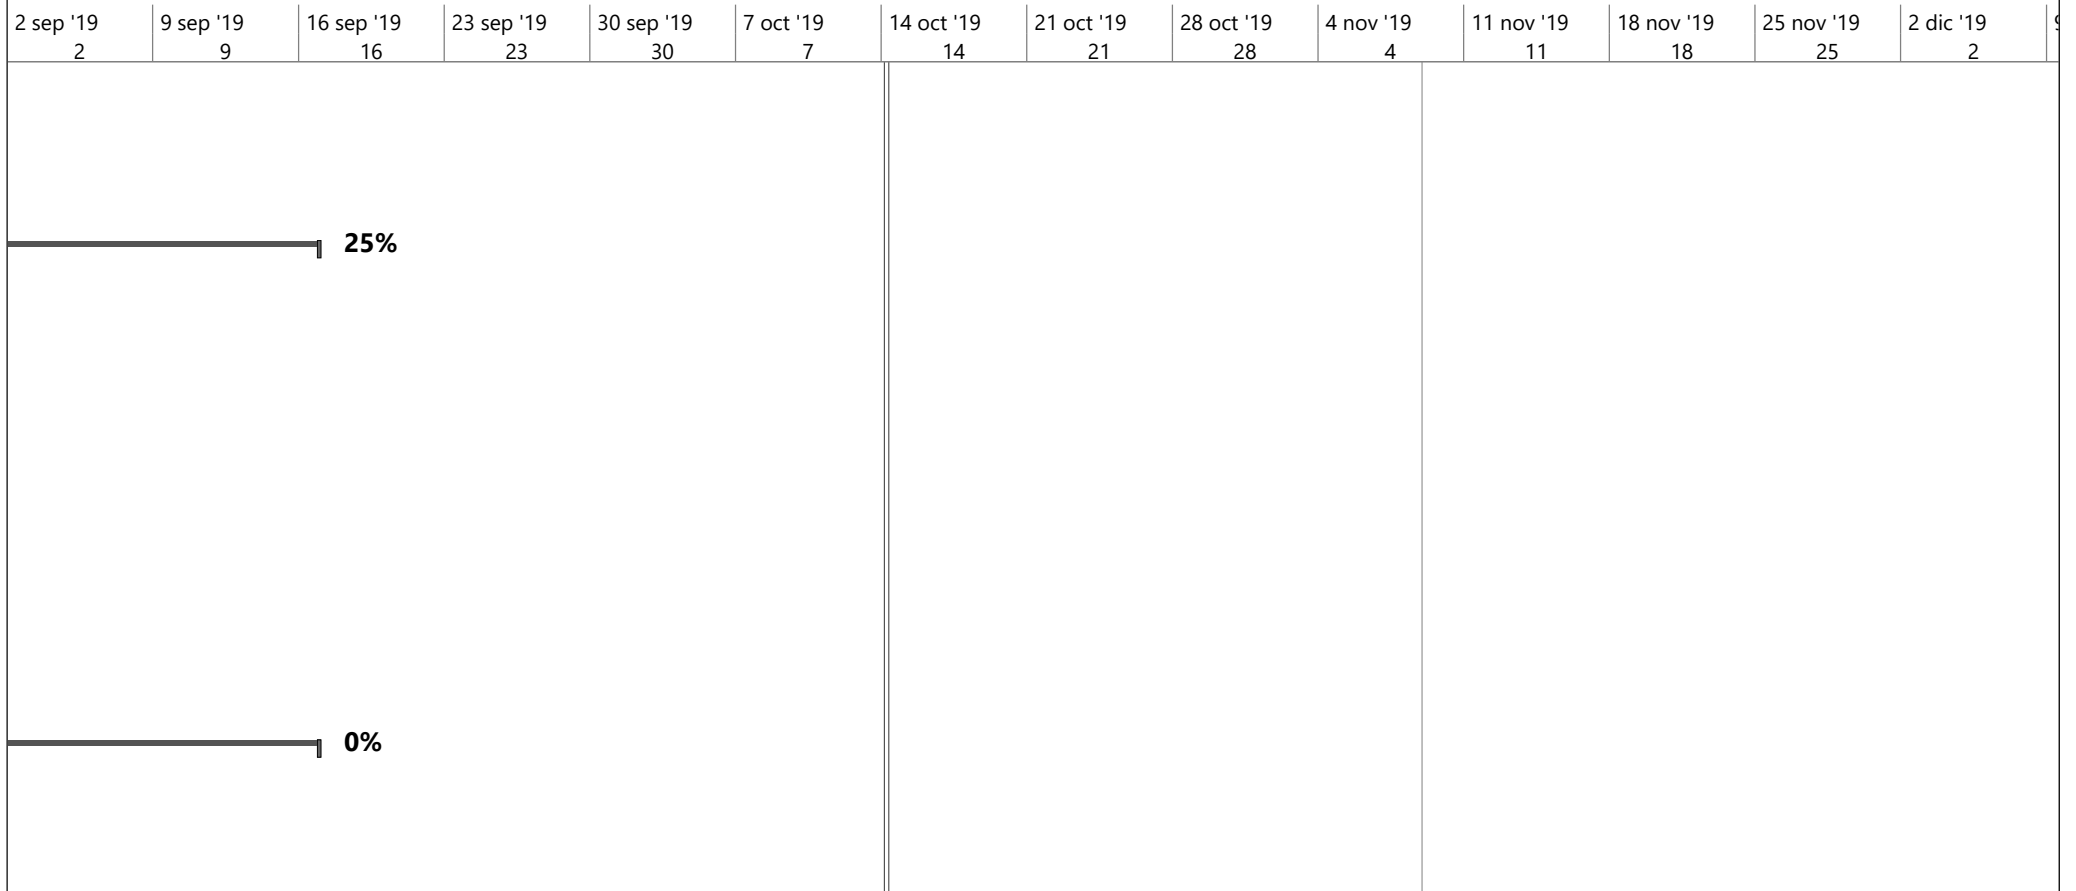

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

2 sep '19 9 sep '19 16 sep '19 23 sep '19 30 sep '19 7 oct '19 14 oct '19 21 oct '19 28 oct '19 4 nov '19 11 nov '19 18 nov '19 25 nov '19 2 dic '19

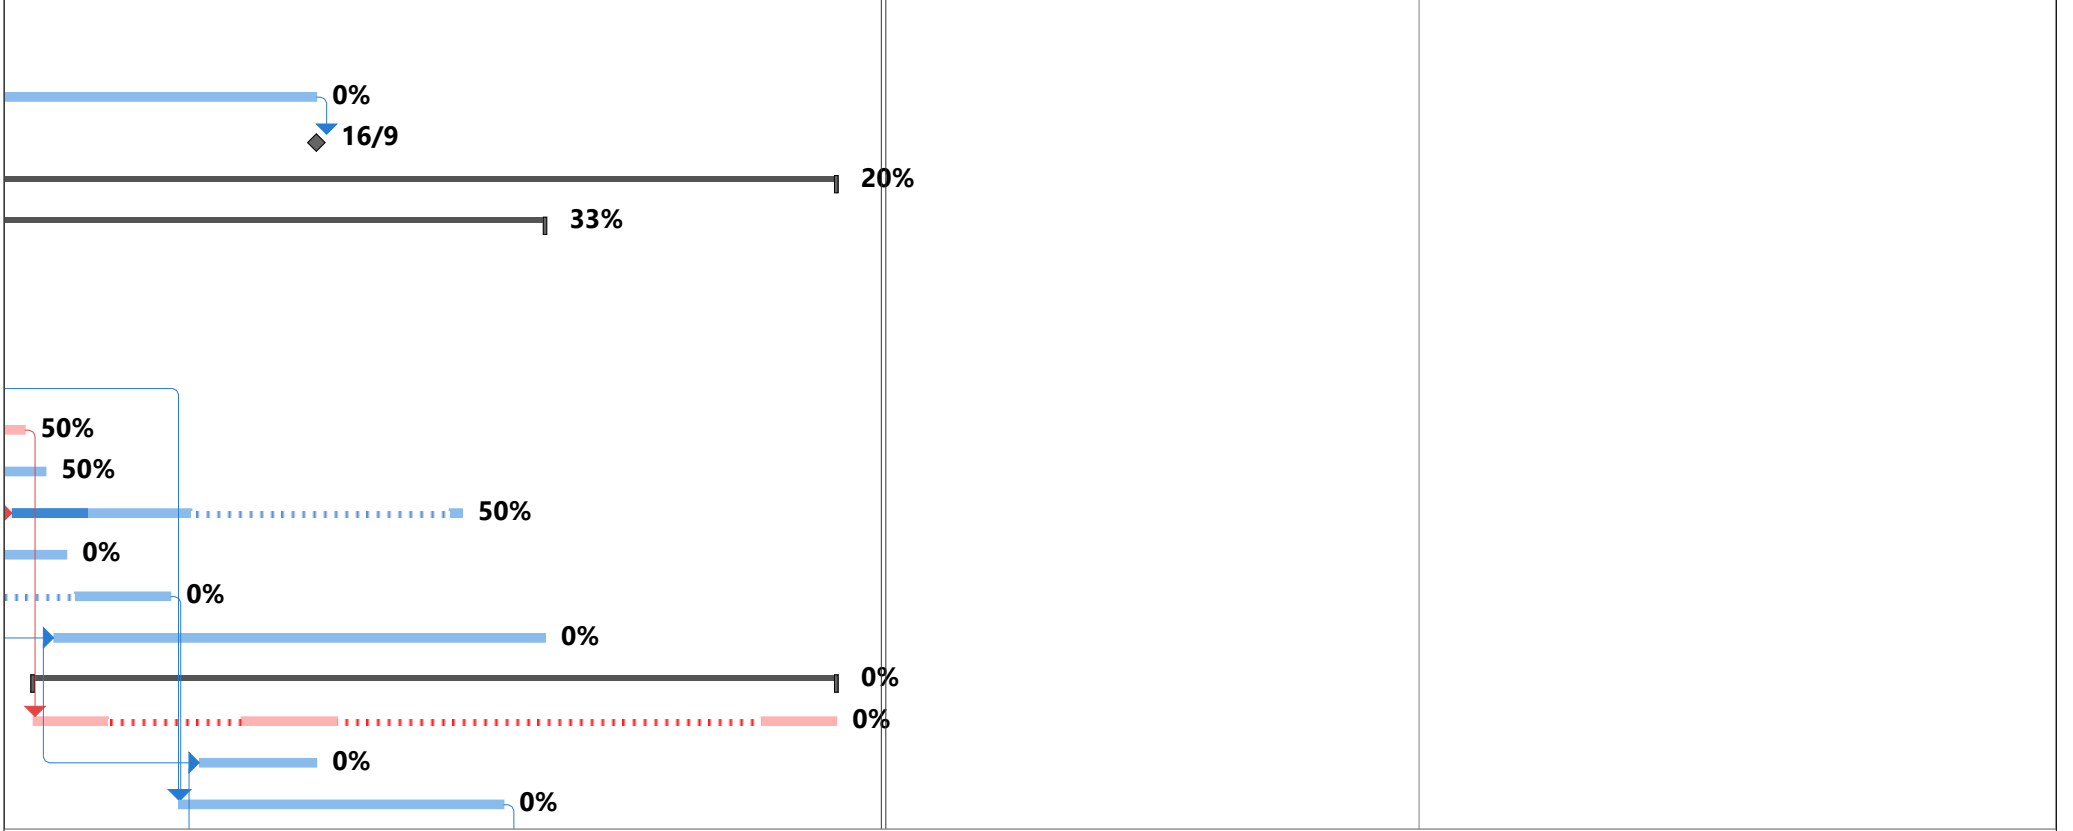

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jun. 2019.mpp

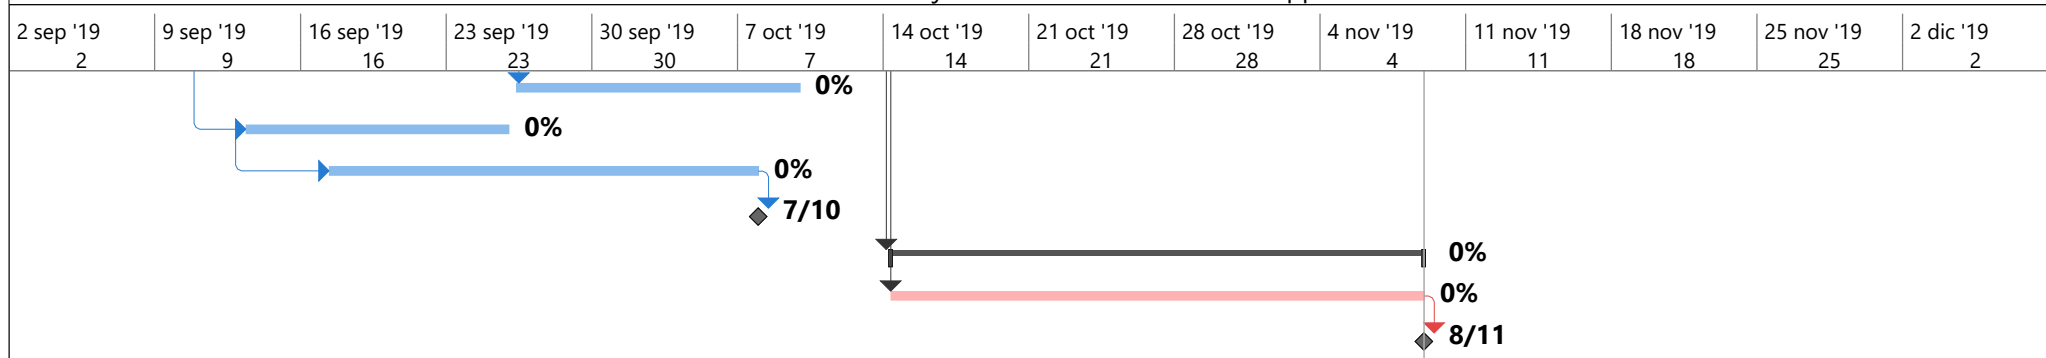

**Ing. Deivy Rodriguez**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F. 809-747-9346

E. drodriguez@edenorte.com.do P. www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
