




























































































Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	02 abr '18 02	09 abr '18 09	16 abr '18 16	23 abr '18 23
1			Rehabilitación de Redes CHIVO106	257.13 días					
2			Adjudicación	0 días					
3			Periodo de Adquisiciones	80 días					
28			Ejecución	217 días					
29			Polígono 1	100 días					
30			Instalación	94 días					
31			lizado de postes	4 días					
32			Cimentaciones	5 días					
33			Retenidas	4 días					
34			Armados de Media y Baja Tensión	10 días					
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días					
36			Elementos de Protección y Maniobra	3 días					
37			Conexiones y Jumpers	6 días					
38			Transformadores	5 días					
39			Alumbrado Publico	4 días					
40			Normalización Suministros	12 días					
41			Remoción	40 días					
42			Tendido de Conductor Media Tensión	0 días					
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días					
44			Armados de Media Tensión	5 días					
45			Armados de Baja Tensión	8 días					







Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	02 abr '18 02	09 abr '18 09	16 abr '18 16	23 abr '18 23
46			Transformadores	3 días					
47			Izado de postes	13 días					
48			Cierre de Polígono 1	0 días					
49			Polígono 2	145 días					
50			Instalación	145 días					
51			Izado de postes	22 días					
52			Cimentaciones	19 días					
53			Retenidas	14 días					
54			Armados de Media y Baja Tensión	19 días					
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días					
56			Elementos de Protección y Maniobra	15 días					
57			Conexiones y Jumpers	15 días					
58			Transformadores	25 días					
59			Alumbrado Publico	10 días					
60			Normalización Suministros	41 días					
61			Remoción	41 días					
62			Tendido de Conductor Media Tensión	14 días					
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días					
64			Armados de Media Tensión	7 días					
65			Armados de Baja Tensión	11 días					
66			Transformadores	16 días					






Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	02 abr '18 02	09 abr '18 09	16 abr '18 16	23 abr '18 23
67			Izado de postes	17 días					
68			Cierre de Polígono 2	0 días					
69			Polígono 3	172 días					
70			Instalación	140 días					
71			Izado de postes	12 días					
72			Cimentaciones	8 días					
73			Retenidas	7 días					
74			Armados de Media y Baja Tensión	40 días					
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días					
76			Elementos de Protección y Maniobra	7 días					
77			Conexiones y Jumpers	10 días					
78			Transformadores	10 días					
79			Alumbrado Publico	7 días					
80			Normalización Suministros	16 días					
81			Remoción	81 días					
82			Tendido de Conductor Media Tensión	21 días					
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días					
84			Armados de Media Tensión	10 días					
85			Armados de Baja Tensión	16 días					
86			Transformadores	6 días					
87			Izado de postes	25 días					





Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	02 abr '18 02	09 abr '18 09	16 abr '18 16	23 abr '18 23
88			Cierre de Polígono 3	0 días					
89			Polígono 4	179 días					
90			Instalación	169 días					
91			Izado de postes	6 días					
92			Cimentaciones	5 días					
93			Retenidas	4 días					
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días					
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días					
96			Elementos de Protección y Maniobra	7 días					
97			Conexiones y Jumpers	8 días					
98			Transformadores	14 días					
99			Alumbrado Publico	6 días					
100			Normalización Suministros	18 días					
101			Remoción	29 días					
102			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días					
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días					
104			Armados de Media Tensión	12 días					
105			Armados de Baja Tensión	10 días					
106			Transformadores	9 días					
107			Izado de postes	15 días					
108			Cierre de Polígono 4	0 días					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	02 abr '18 02	09 abr '18 09	16 abr '18 16	23 abr '18 23
109			Cierre de Obras	20 días					
110			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms					
111			Presentación de Cierre de Obras	0 días					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

23 abr '18 23	30 abr '18 30	07 may '18 07	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	04 jun '18 04	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	02 jul '18 02	09 jul '18 09	16 jul '18 16	23 jul '18 23
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

23 abr '18 23	30 abr '18 30	07 may '18 07	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	04 jun '18 04	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	02 jul '18 02	09 jul '18 09	16 jul '18 16	23 jul '18 23
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

23 abr '18 23	30 abr '18 30	07 may '18 07	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	04 jun '18 04	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	02 jul '18 02	09 jul '18 09	16 jul '18 16	23 jul '18 23
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

23 abr '18 23	30 abr '18 30	07 may '18 07	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	04 jun '18 04	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	02 jul '18 02	09 jul '18 09	16 jul '18 16	23 jul '18 23
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

23 abr '18 23	30 abr '18 30	07 may '18 07	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	04 jun '18 04	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	02 jul '18 02	09 jul '18 09	16 jul '18 16	23 jul '18 23
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

30 jul '18 30	06 ago '18 06	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	03 sep '18 03	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	01 oct '18 01	08 oct '18 08	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

◆ 01/10

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

30 jul '18 30	06 ago '18 06	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	03 sep '18 03	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	01 oct '18 01	08 oct '18 08	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

30 jul '18 30	06 ago '18 06	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	03 sep '18 03	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	01 oct '18 01	08 oct '18 08	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


30 jul '18 30	06 ago '18 06	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	03 sep '18 03	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	01 oct '18 01	08 oct '18 08	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


30 jul '18 30	06 ago '18 06	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	03 sep '18 03	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	01 oct '18 01	08 oct '18 08	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


05 nov '18 05	12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	03 dic '18 03	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	07 ene '19 07	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	04 feb '19 04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

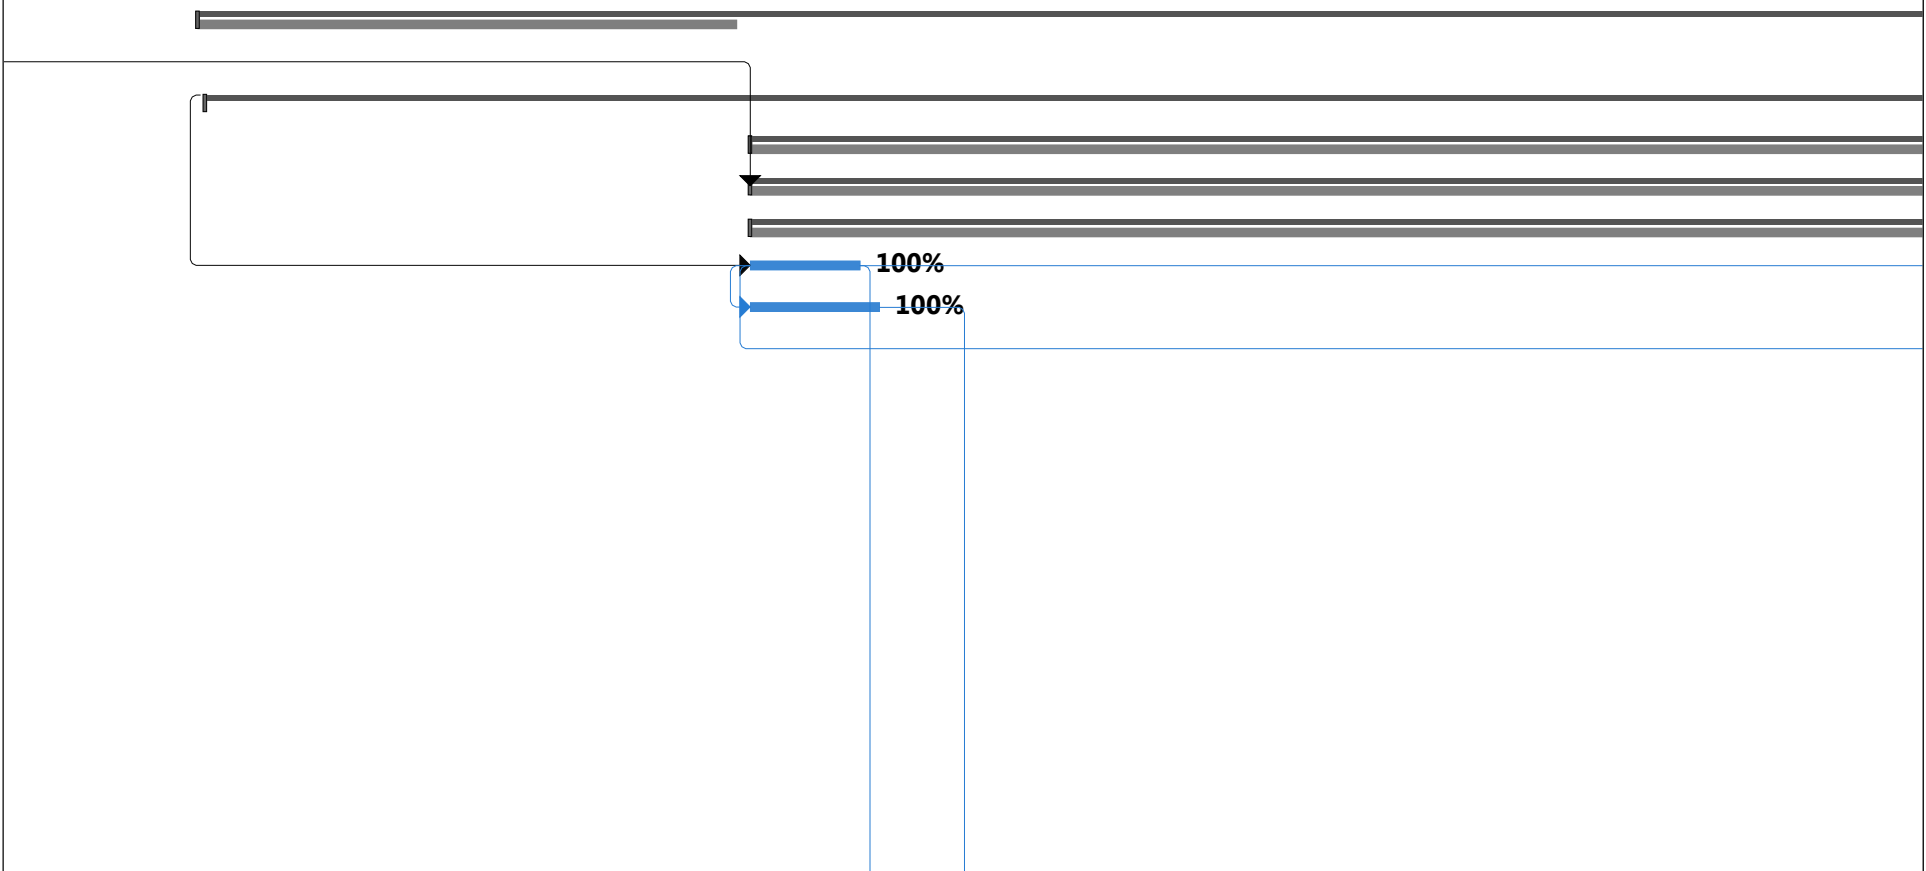

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


05 nov '18 05	12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	03 dic '18 03	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	07 ene '19 07	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	04 feb '19 04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

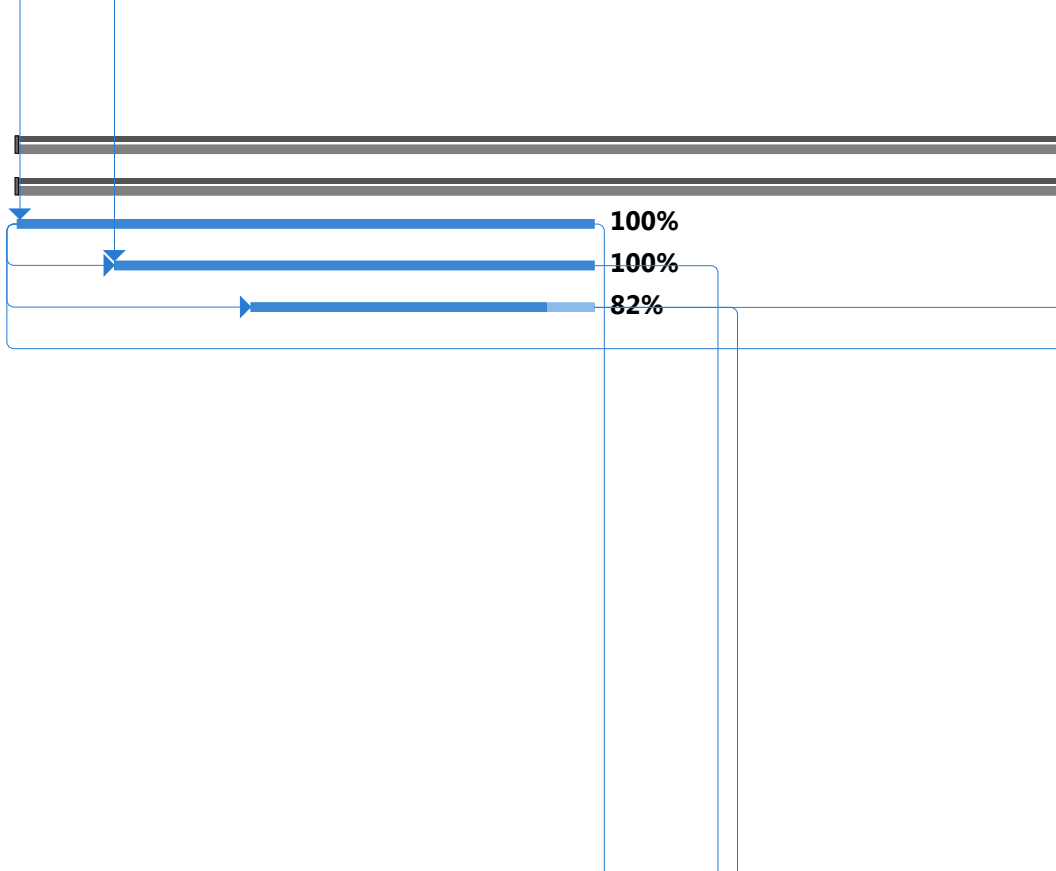

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


05 nov '18 05	12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	03 dic '18 03	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	07 ene '19 07	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	04 feb '19 04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

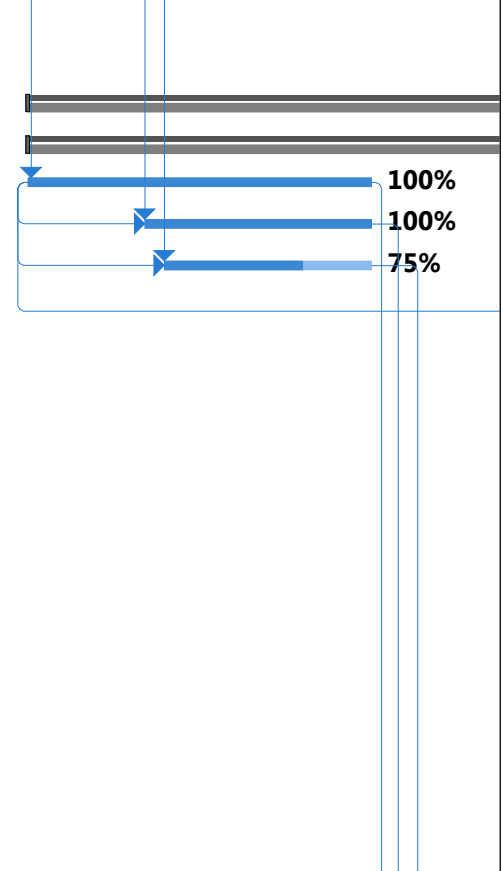

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


05 nov '18 05	12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	03 dic '18 03	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	07 ene '19 07	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	04 feb '19 04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


05 nov '18 05	12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	03 dic '18 03	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	07 ene '19 07	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	04 feb '19 04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

11 feb '19 11	18 feb '19 18	25 feb '19 25	04 mar '19 04	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	01 abr '19 01	08 abr '19 08	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	06 may '19 06	13 may '19 13
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

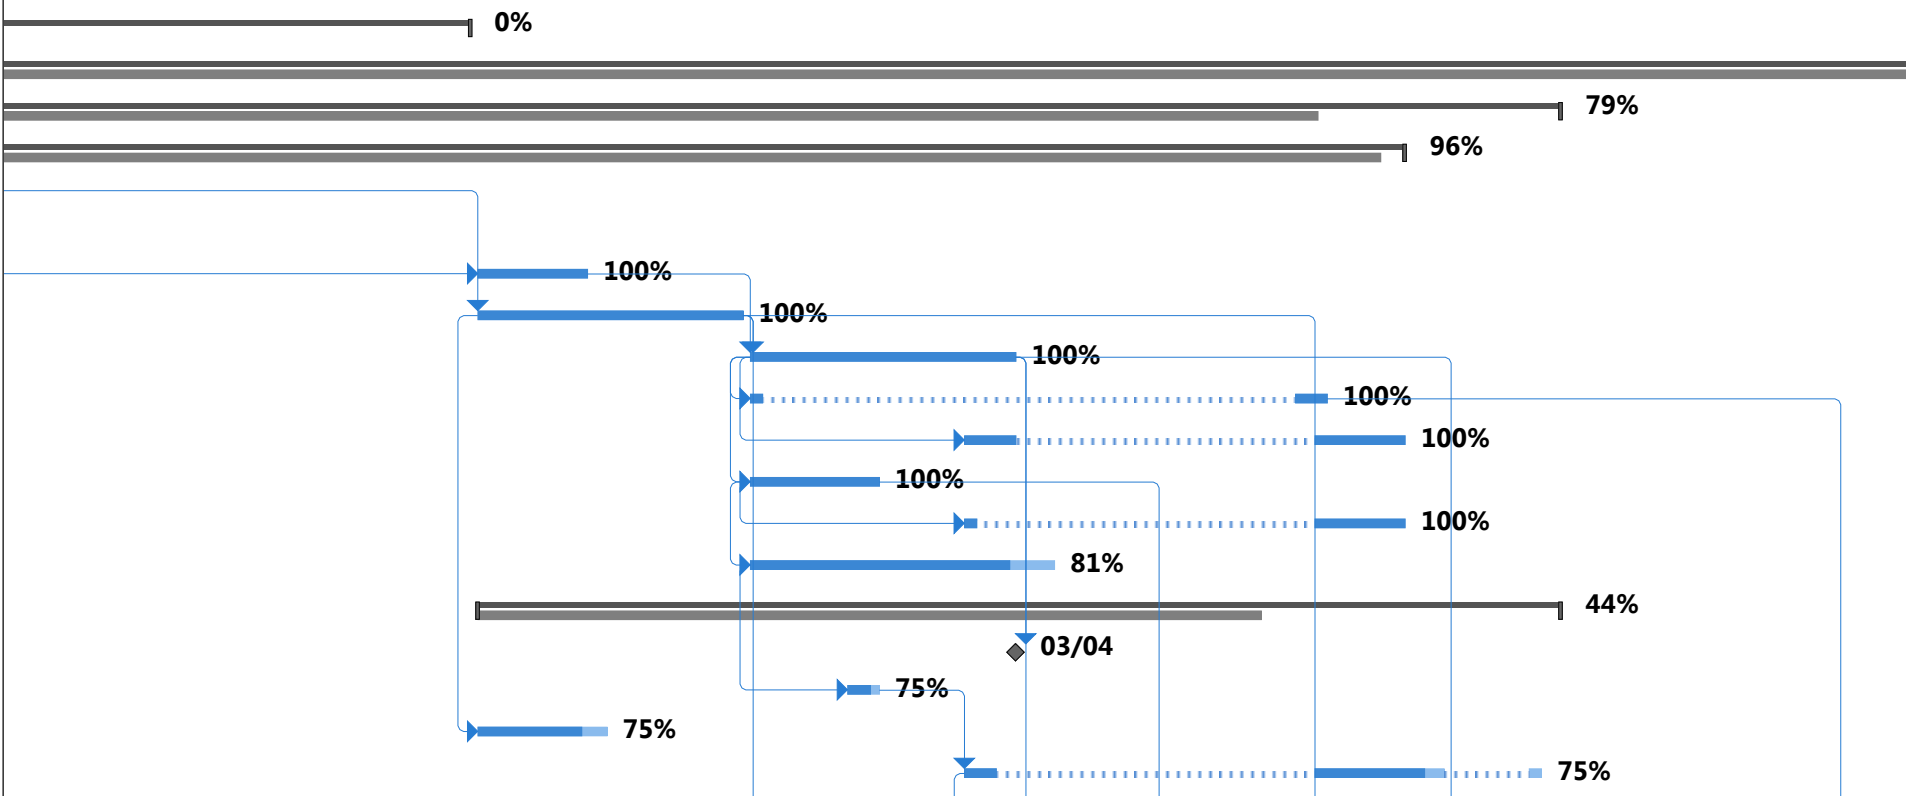

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

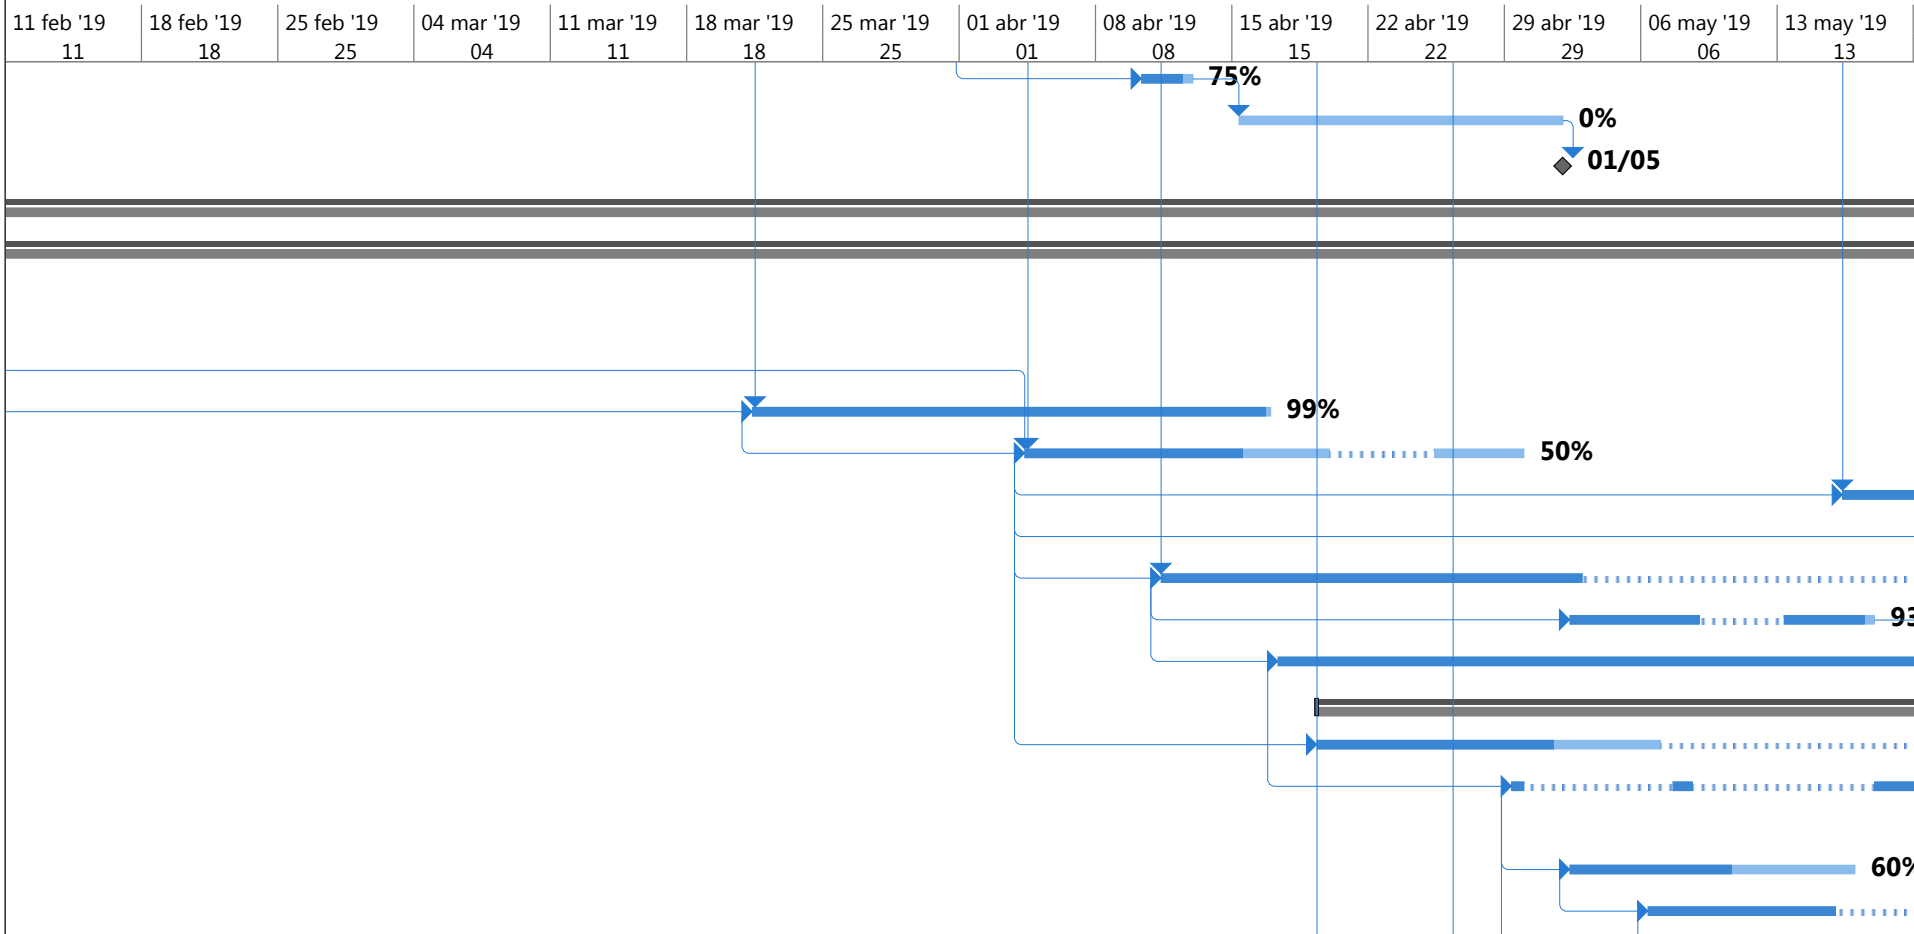

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

11 feb '19 11	18 feb '19 18	25 feb '19 25	04 mar '19 04	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	01 abr '19 01	08 abr '19 08	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	06 may '19 06	13 may '19 13
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


11 feb '19 11	18 feb '19 18	25 feb '19 25	04 mar '19 04	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	01 abr '19 01	08 abr '19 08	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	06 may '19 06	13 may '19 13
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

98%
91%
75%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


11 feb '19 11	18 feb '19 18	25 feb '19 25	04 mar '19 04	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	01 abr '19 01	08 abr '19 08	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	06 may '19 06	13 may '19 13
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


20 may '19 20	27 may '19 27	03 jun '19 03	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	01 jul '19 01	08 jul '19 08	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	05 ago '19 05	12 ago '19 12	19 ago '19 19
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

20 may '19 20	27 may '19 27	03 jun '19 03	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	01 jul '19 01	08 jul '19 08	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	05 ago '19 05	12 ago '19 12	19 ago '19 19
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

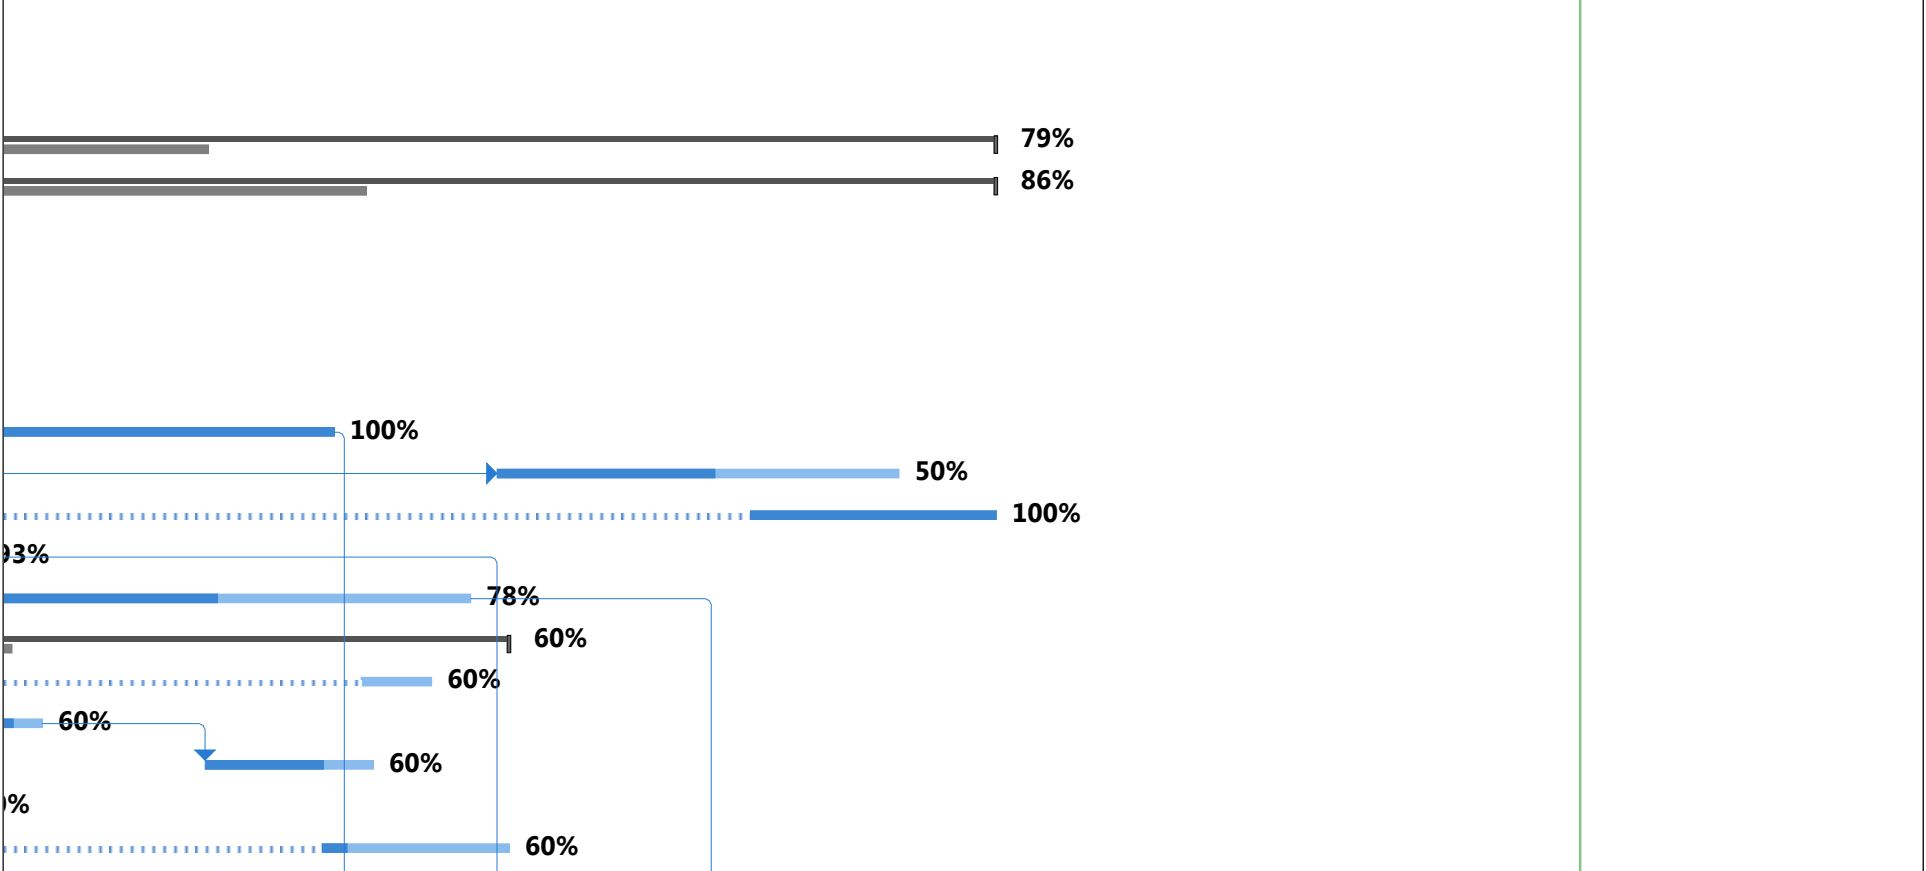

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

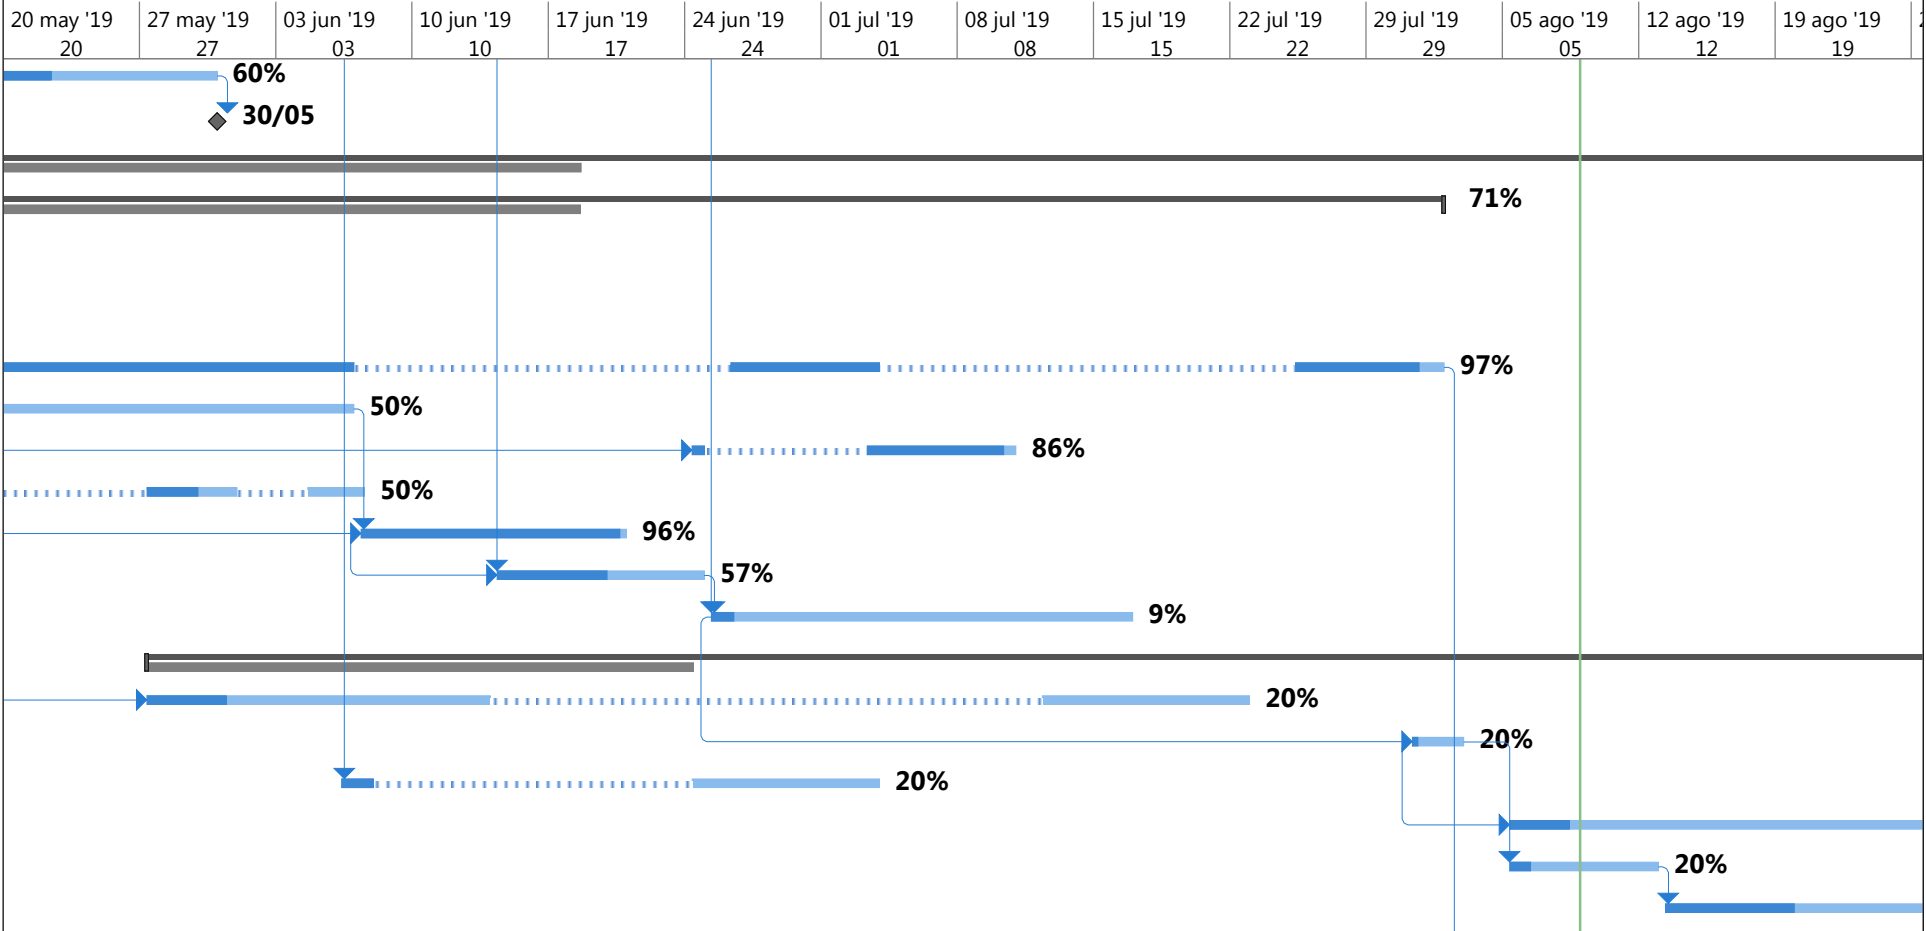

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


20 may '19 20	27 may '19 27	03 jun '19 03	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	01 jul '19 01	08 jul '19 08	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	05 ago '19 05	12 ago '19 12	19 ago '19 19
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

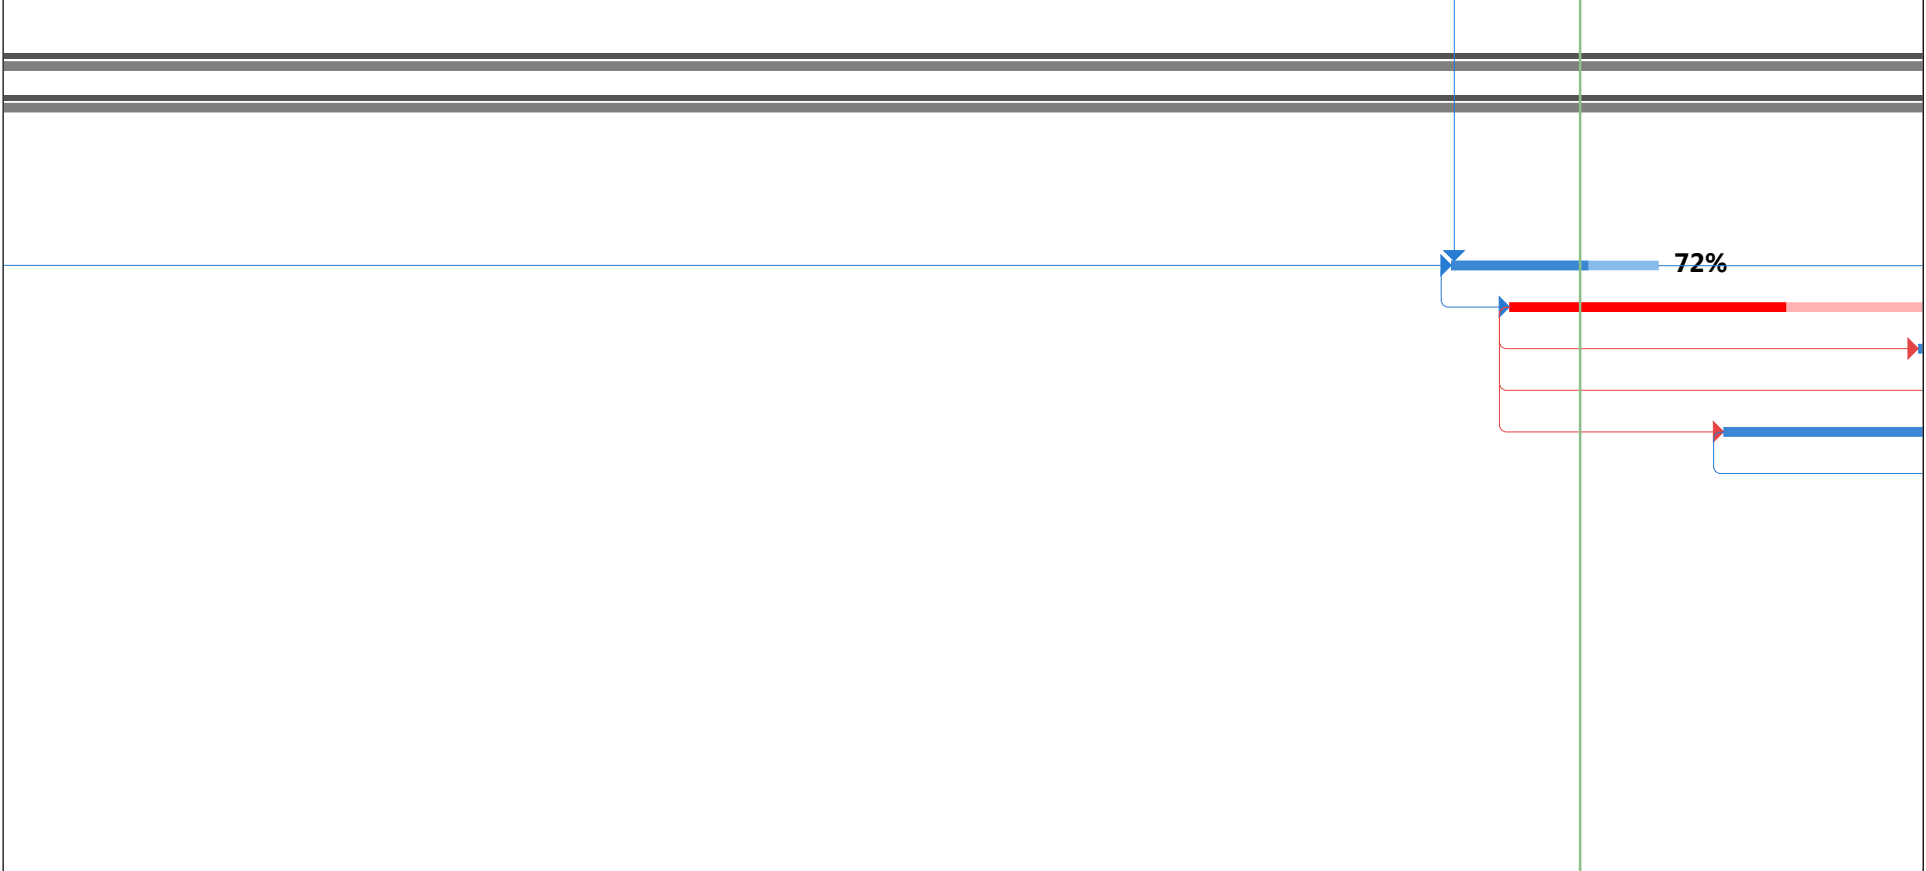

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


20 may '19 20	27 may '19 27	03 jun '19 03	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	01 jul '19 01	08 jul '19 08	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	05 ago '19 05	12 ago '19 12	19 ago '19 19
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


26 ago '19 26	02 sep '19 02	09 sep '19 09	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	07 oct '19 07	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	04 nov '19 04	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019


26 ago '19 26	02 sep '19 02	09 sep '19 09	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	07 oct '19 07	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	04 nov '19 04	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

26 ago '19 26	02 sep '19 02	09 sep '19 09	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	07 oct '19 07	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	04 nov '19 04	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

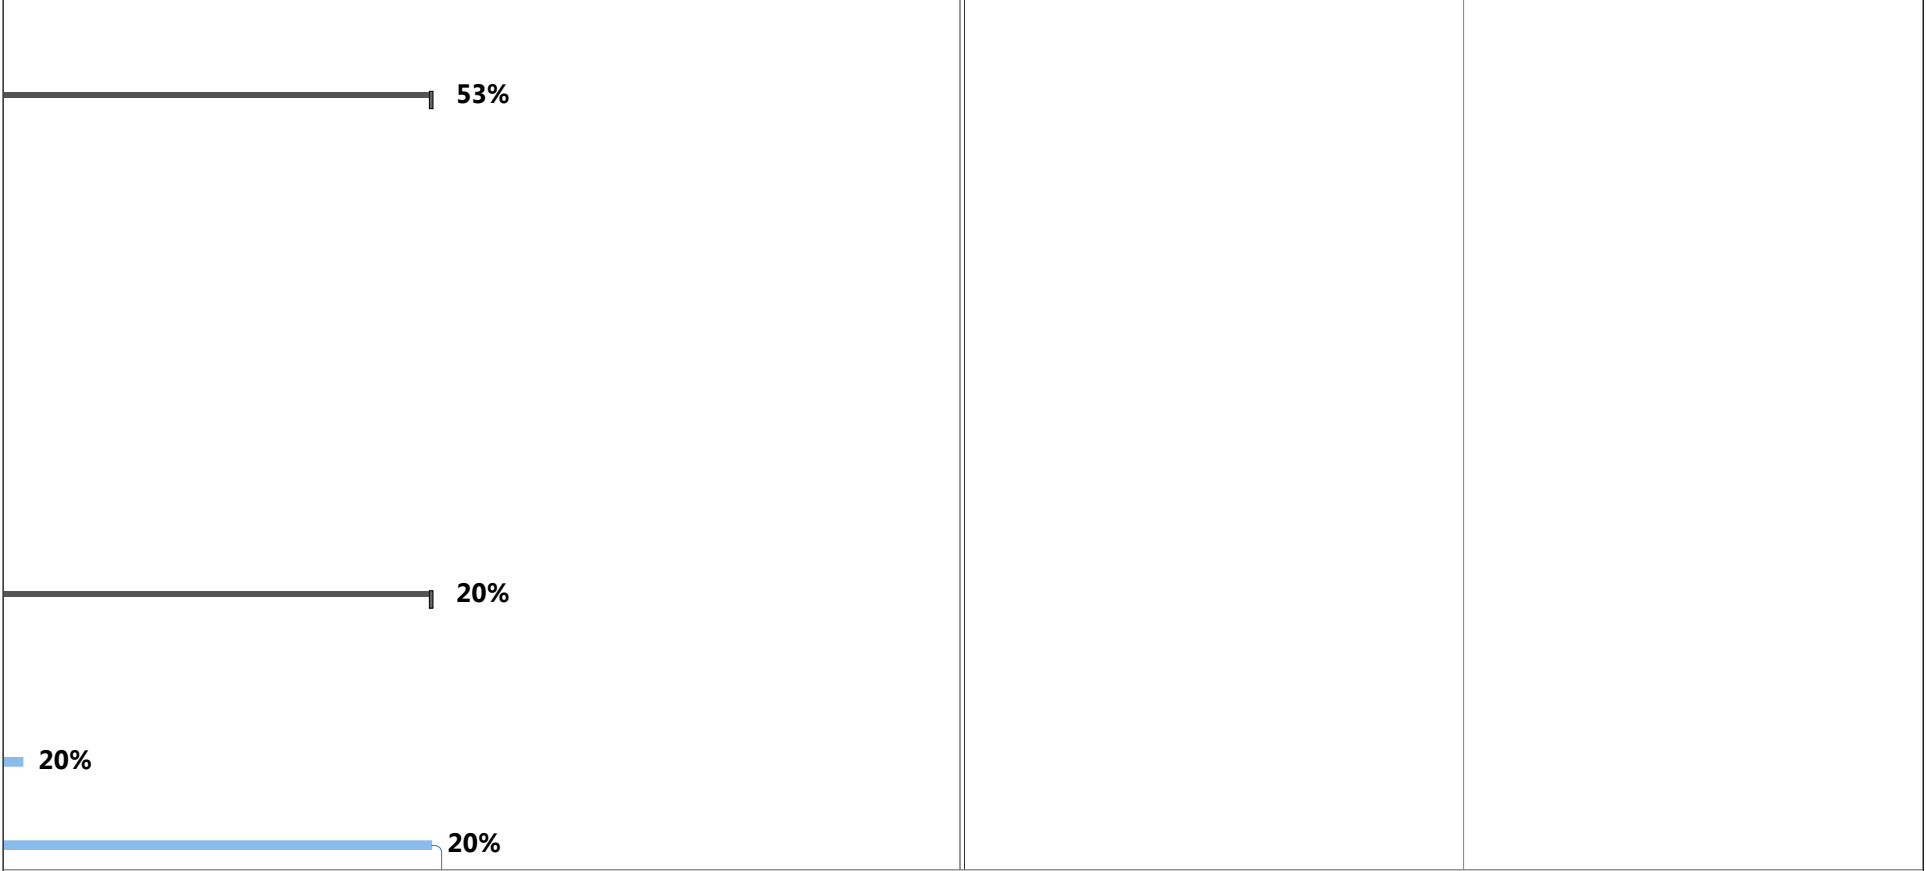


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

26 ago '19 02 sep '19 09 sep '19 16 sep '19 23 sep '19 30 sep '19 07 oct '19 14 oct '19 21 oct '19 28 oct '19 04 nov '19 11 nov '19 18 nov '19 25 nov '19


16/09

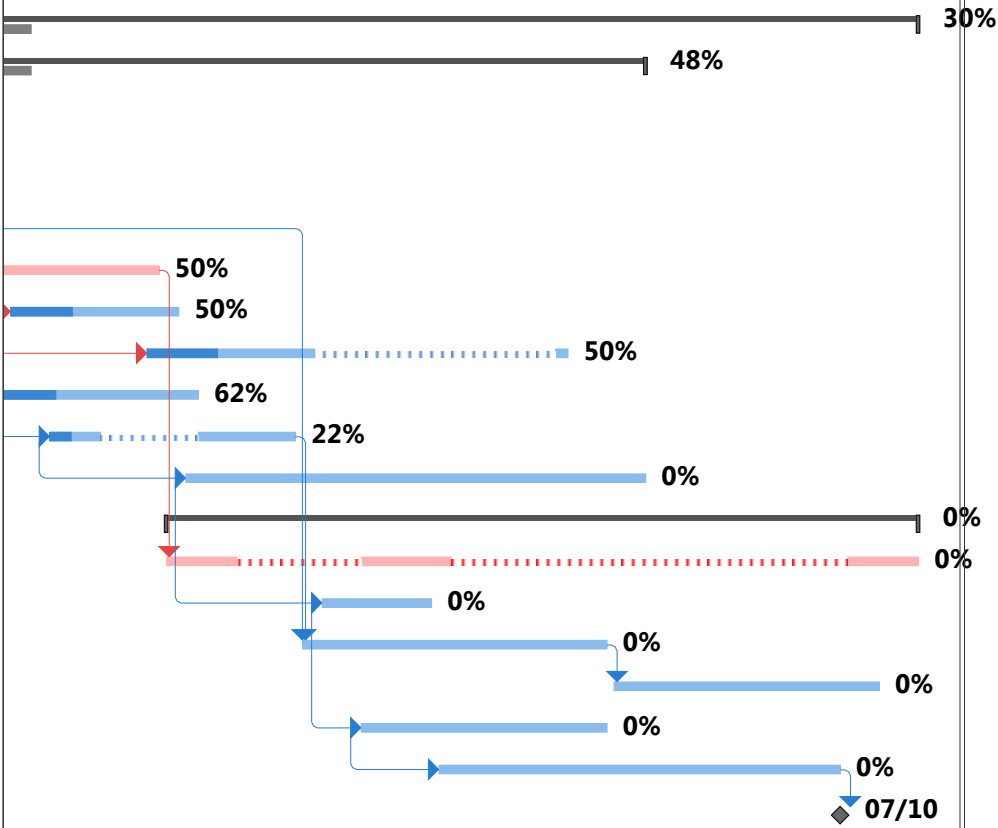

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 Jul. 2019

26 ago '19 26	02 sep '19 02	09 sep '19 09	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	07 oct '19 07	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	04 nov '19 04	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Leonel Gabot

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana
 F: 809-747-2058
 E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
