


































































































































Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
1			Rehabilitación de Redes CHIVO106	257.13 días						
2			Adjudicación	0 días						
3			Periodo de Adquisiciones	80 días						
28			Ejecución	217 días						
29			Polígono 1	100 días						
30			Instalación	94 días						
31			Izado de postes	4 días						
32			Cimentaciones	5 días						
33			Retenidas	4 días						
34			Armados de Media y Baja Tensión	10 días						
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	10 días						
36			Elementos de Protección y Maniobra	3 días						
37			Conexiones y Jumpers	6 días						
38			Transformadores	5 días						
39			Alumbrado Publico	4 días						
40			Normalización Suministros	12 días						
41			Remoción	40 días						
42			Tendido de Conductor Media Tensión	0 días						
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	2 días						
44			Armados de Media Tensión	5 días						



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
45			Armados de Baja Tensión	8 días						
46			Transformadores	3 días						
47			Izado de postes	13 días						
48			Cierre de Polígono 1	0 días						
49			Polígono 2	145 días						
50			Instalación	145 días						
51			Izado de postes	22 días						
52			Cimentaciones	19 días						
53			Retenidas	14 días						
54			Armados de Media y Baja Tensión	19 días						
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	15 días						
56			Elementos de Protección y Maniobra	15 días						
57			Conexiones y Jumpers	15 días						
58			Transformadores	25 días						
59			Alumbrado Publico	10 días						
60			Normalización Suministros	41 días						
61			Remoción	41 días						
62			Tendido de Conductor Media Tensión	14 días						
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días						
64			Armados de Media Tensión	7 días						










































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
65			Armados de Baja Tensión	11 días						
66			Transformadores	16 días						
67			Izado de postes	17 días						
68			Cierre de Polígono 2	0 días						
69			Polígono 3	172 días						
70			Instalación	140 días						
71			Izado de postes	12 días						
72			Cimentaciones	8 días						
73			Retenidas	7 días						
74			Armados de Media y Baja Tensión	40 días						
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días						
76			Elementos de Protección y Maniobra	7 días						
77			Conexiones y Jumpers	8 días						
78			Transformadores	10 días						
79			Alumbrado Publico	7 días						
80			Normalización Suministros	16 días						
81			Remoción	81 días						
82			Tendido de Conductor Media Tensión	21 días						
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	3 días						
84			Armados de Media Tensión	10 días						














Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
85			Armados de Baja Tensión	16 días						
86			Transformadores	6 días						
87			Izado de postes	25 días						
88			Cierre de Polígono 3	0 días						
89			Polígono 4	179 días						
90			Instalación	169 días						
91			Izado de postes	6 días						
92			Cimentaciones	5 días						
93			Retenidas	4 días						
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días						
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	21 días						
96			Elementos de Protección y Maniobra	7 días						
97			Conexiones y Jumpers	8 días						
98			Transformadores	14 días						
99			Alumbrado Publico	6 días						
100			Normalización Suministros	18 días						
101			Remoción	29 días						
102			Tendido de Conductor Media Tensión	11 días						
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días						
104			Armados de Media Tensión	12 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	26 mar '18 26	2 abr '18 2	9 abr '18 9	16 abr '18 16	23 abr '18 23	30 abr '18 30
105			Armados de Baja Tensión	10 días						
106			Transformadores	9 días						
107			lizado de postes	15 días						
108			Cierre de Polígono 4	0 días						
109			Cierre de Obras	20 días						
110			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados	1 ms						
111			Presentación de Cierre de Obras	0 días						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30	6 ago '18 6
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30	6 ago '18 6
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30	
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30	6 ago '18 6
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

30 abr '18 30	7 may '18 7	14 may '18 14	21 may '18 21	28 may '18 28	4 jun '18 4	11 jun '18 11	18 jun '18 18	25 jun '18 25	2 jul '18 2	9 jul '18 9	16 jul '18 16	23 jul '18 23	30 jul '18 30	6 ago '18 6
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

























--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5	12 nov '18 12
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

◆ 1/10

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5	12 nov '18 12
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5	12 nov '18 12
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5	12 nov '18 12
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

6 ago '18 6	13 ago '18 13	20 ago '18 20	27 ago '18 27	3 sep '18 3	10 sep '18 10	17 sep '18 17	24 sep '18 24	1 oct '18 1	8 oct '18 8	15 oct '18 15	22 oct '18 22	29 oct '18 29	5 nov '18 5	12 nov '18 12
----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11	
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--

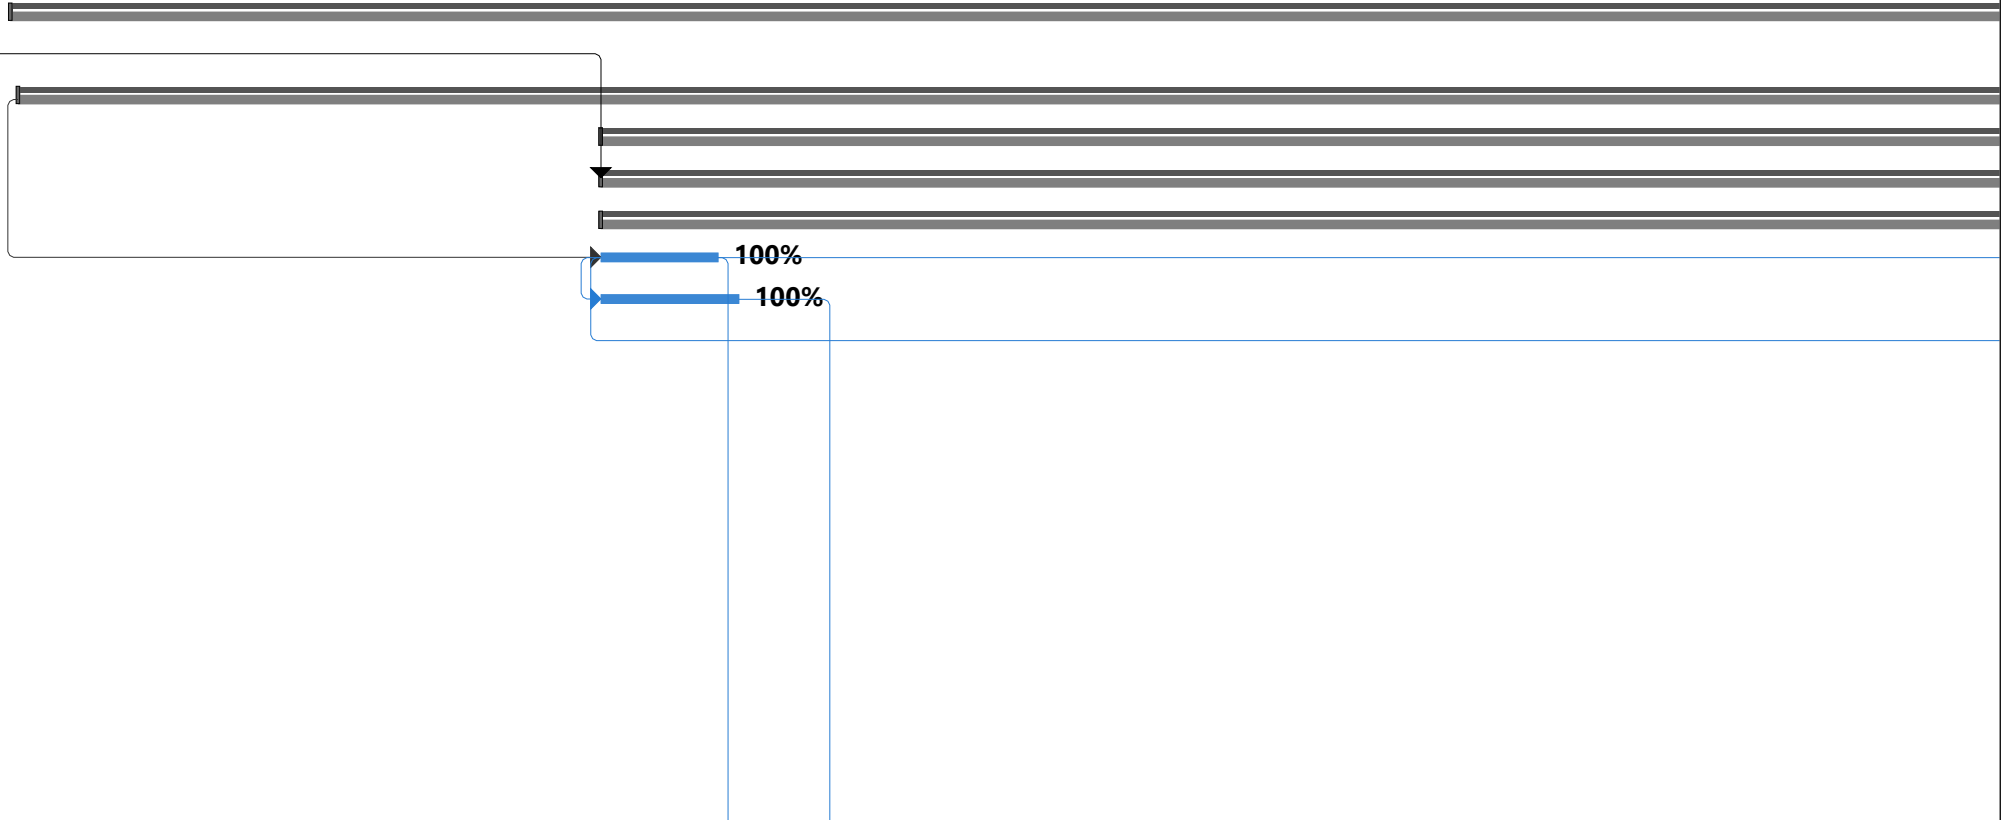


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

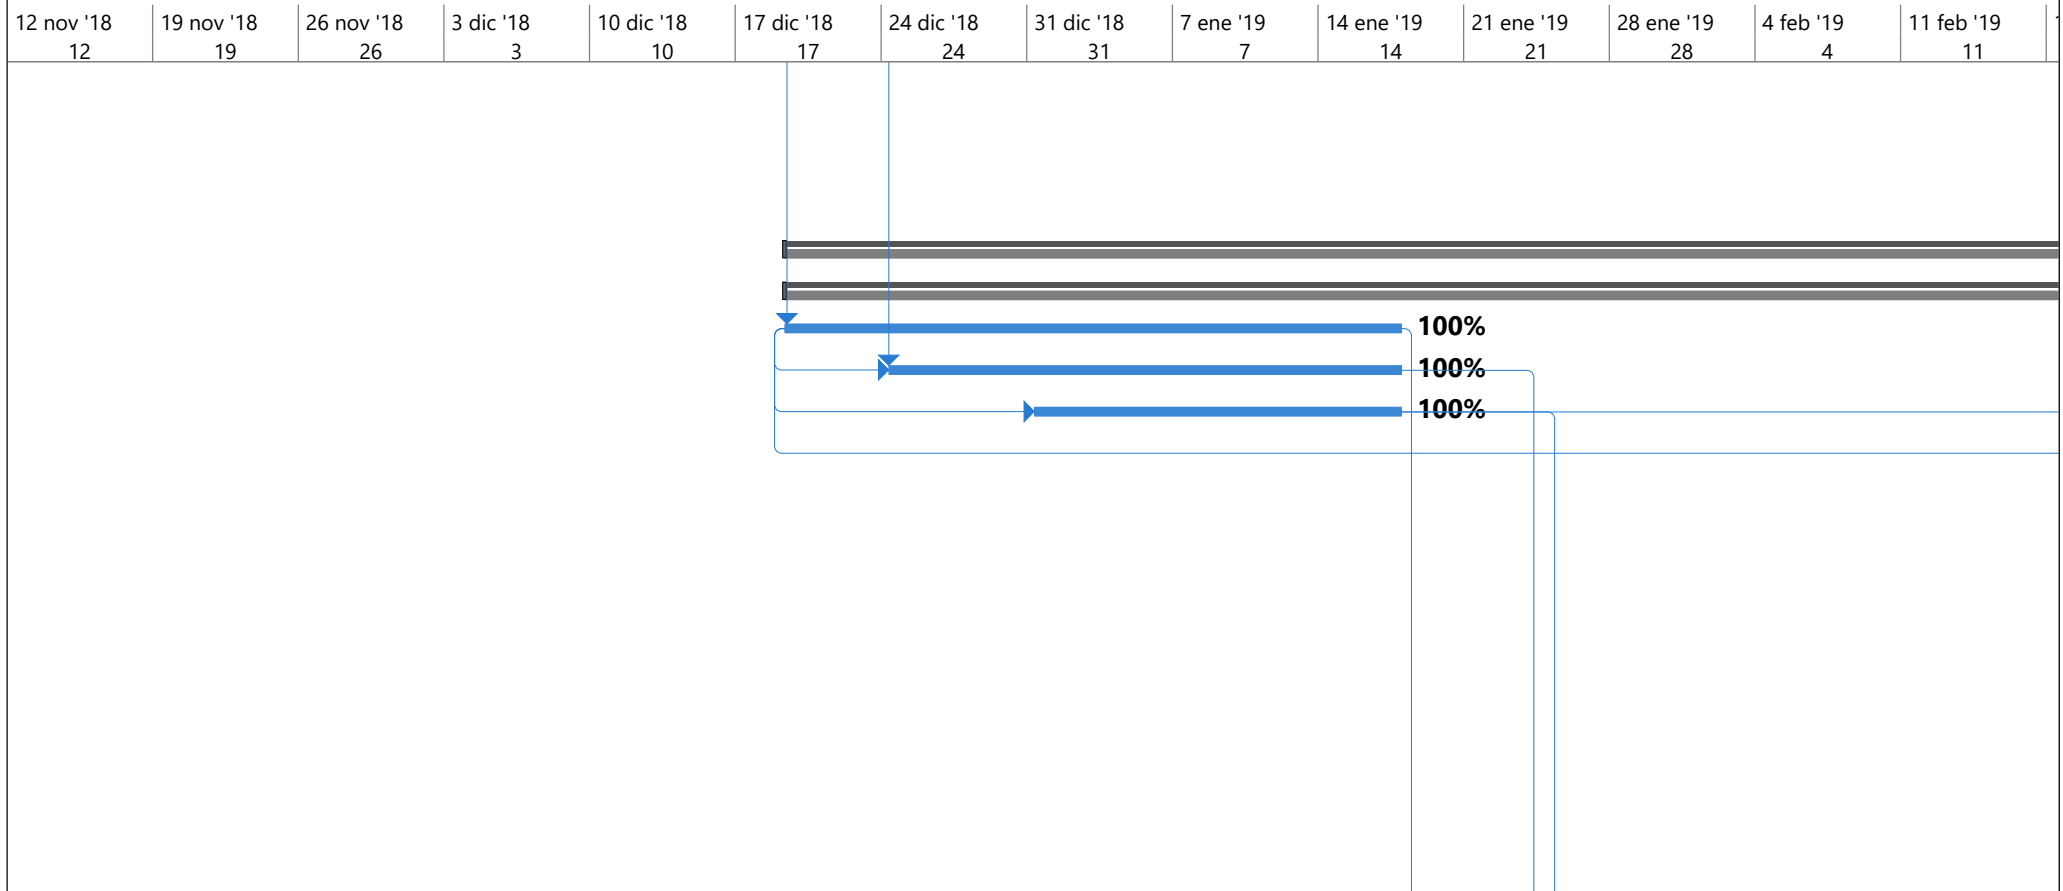

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

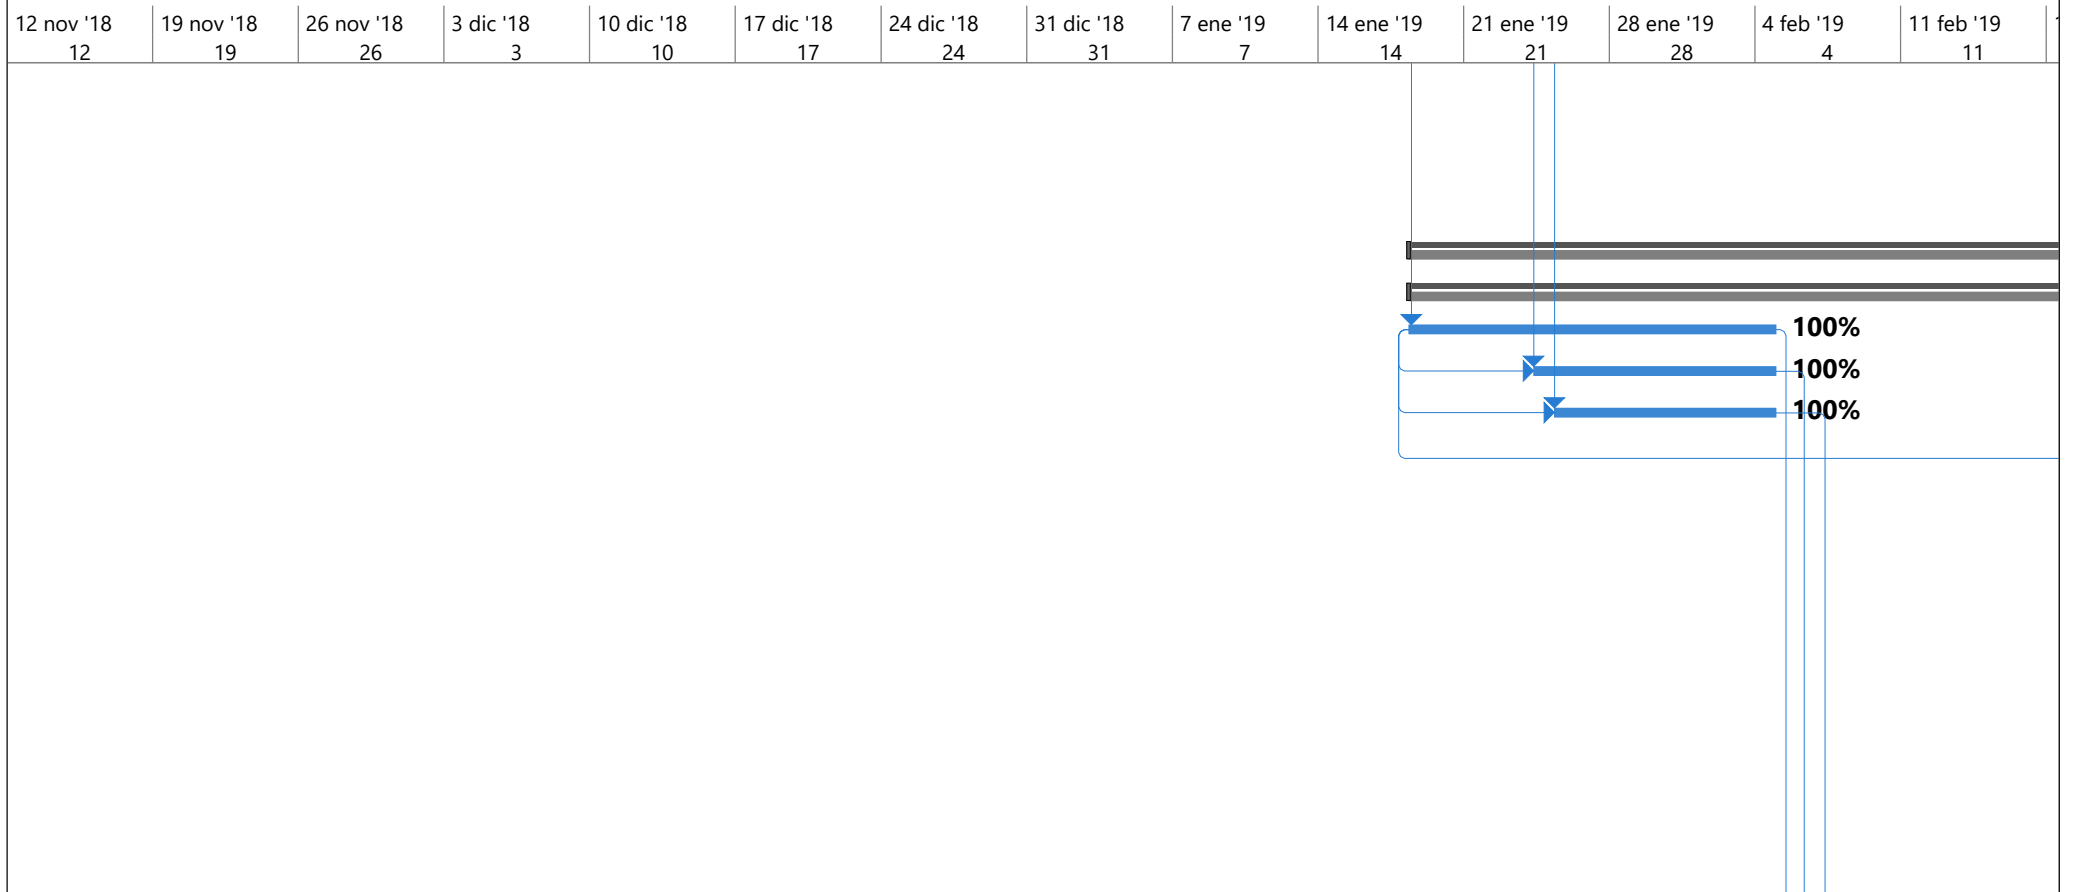

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11	
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

12 nov '18 12	19 nov '18 19	26 nov '18 26	3 dic '18 3	10 dic '18 10	17 dic '18 17	24 dic '18 24	31 dic '18 31	7 ene '19 7	14 ene '19 14	21 ene '19 21	28 ene '19 28	4 feb '19 4	11 feb '19 11	
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	27 may '19 27
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

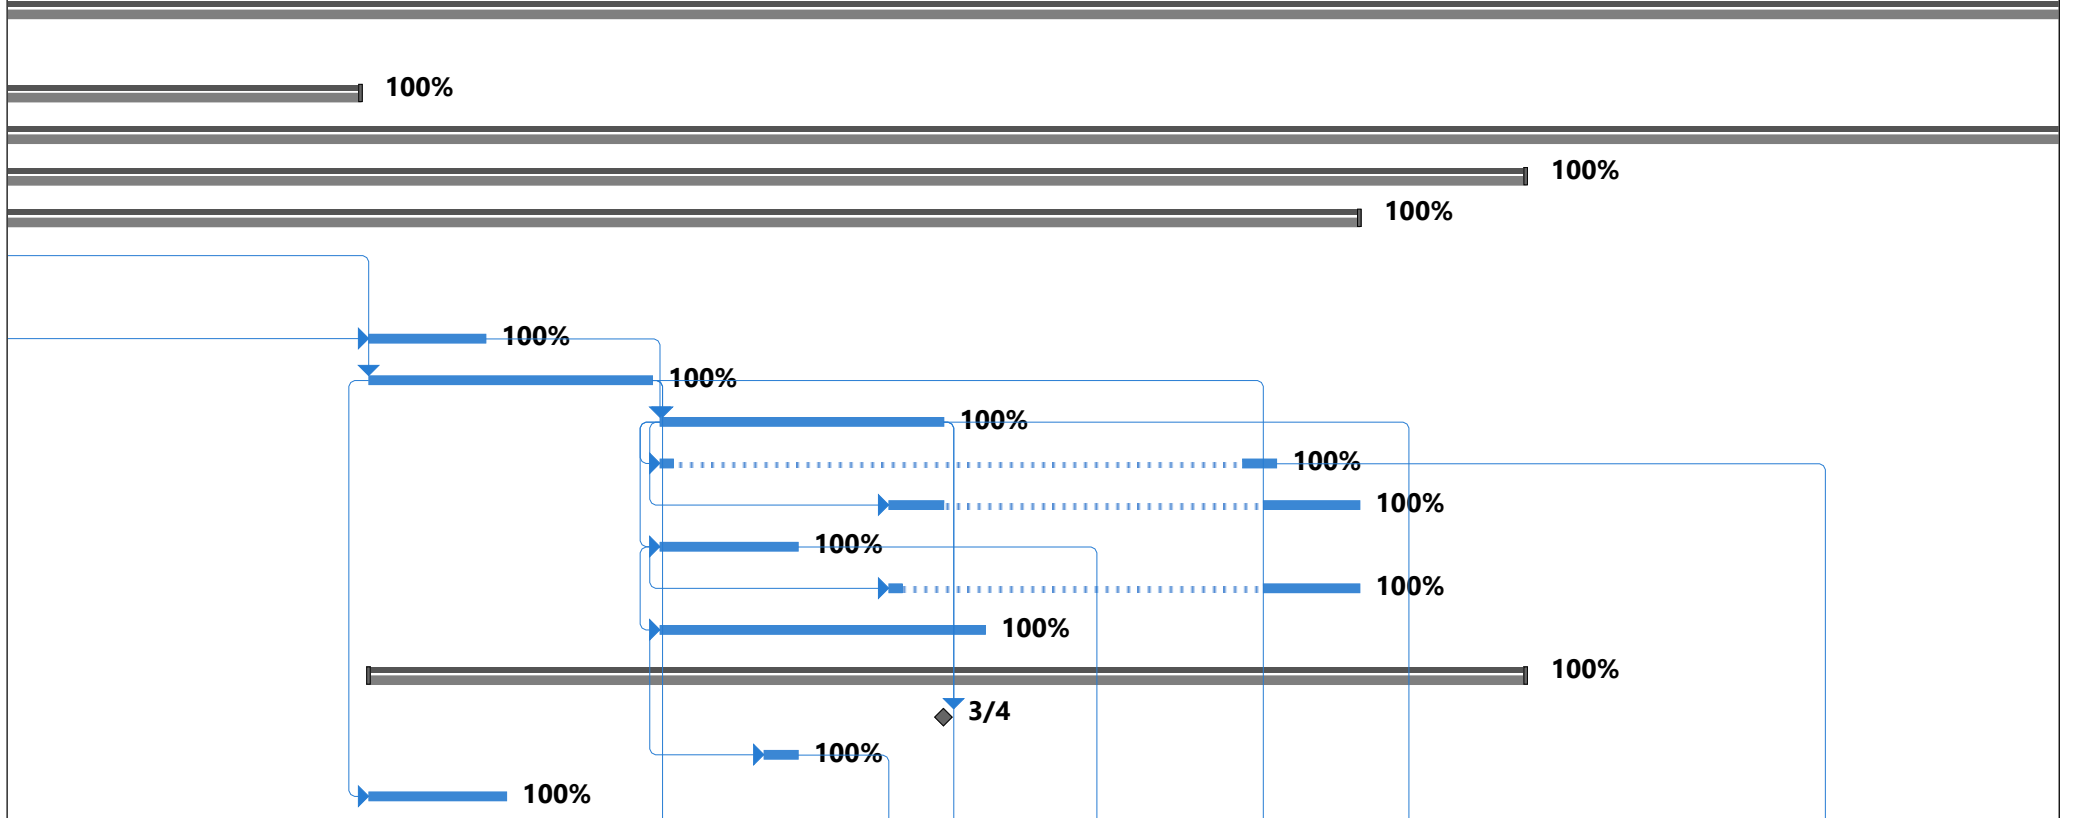


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

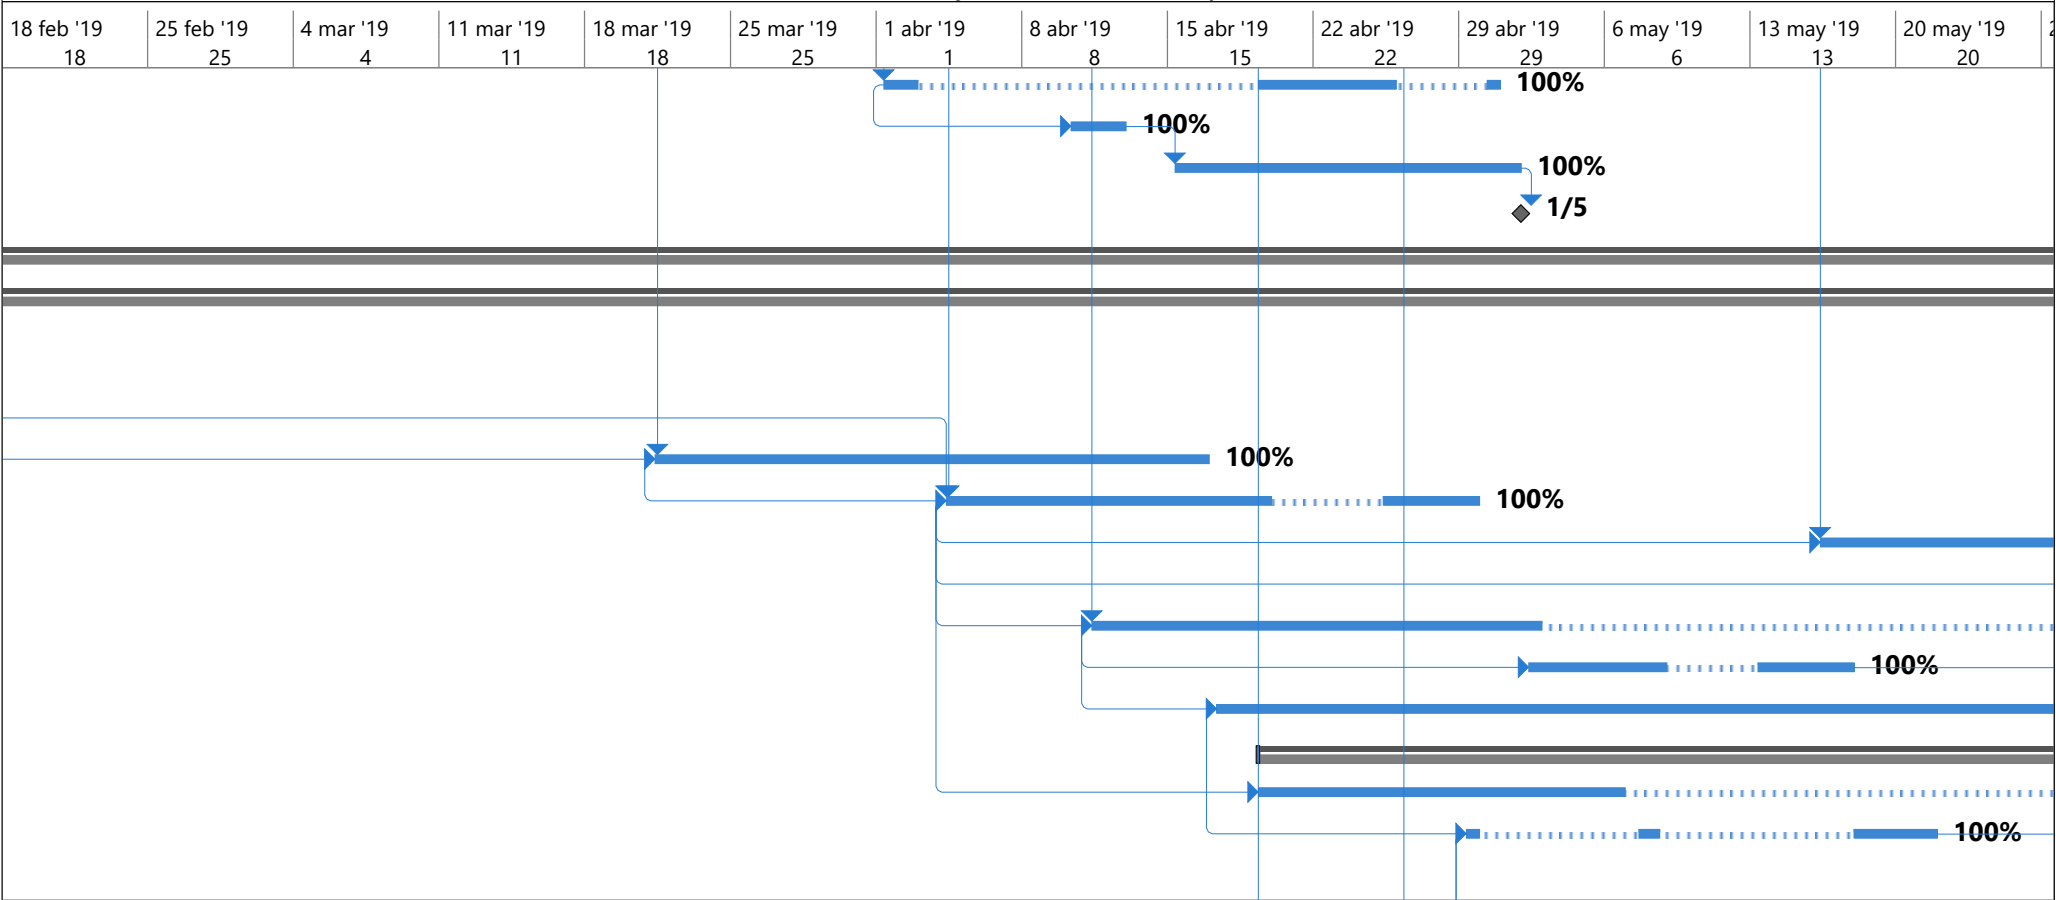

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

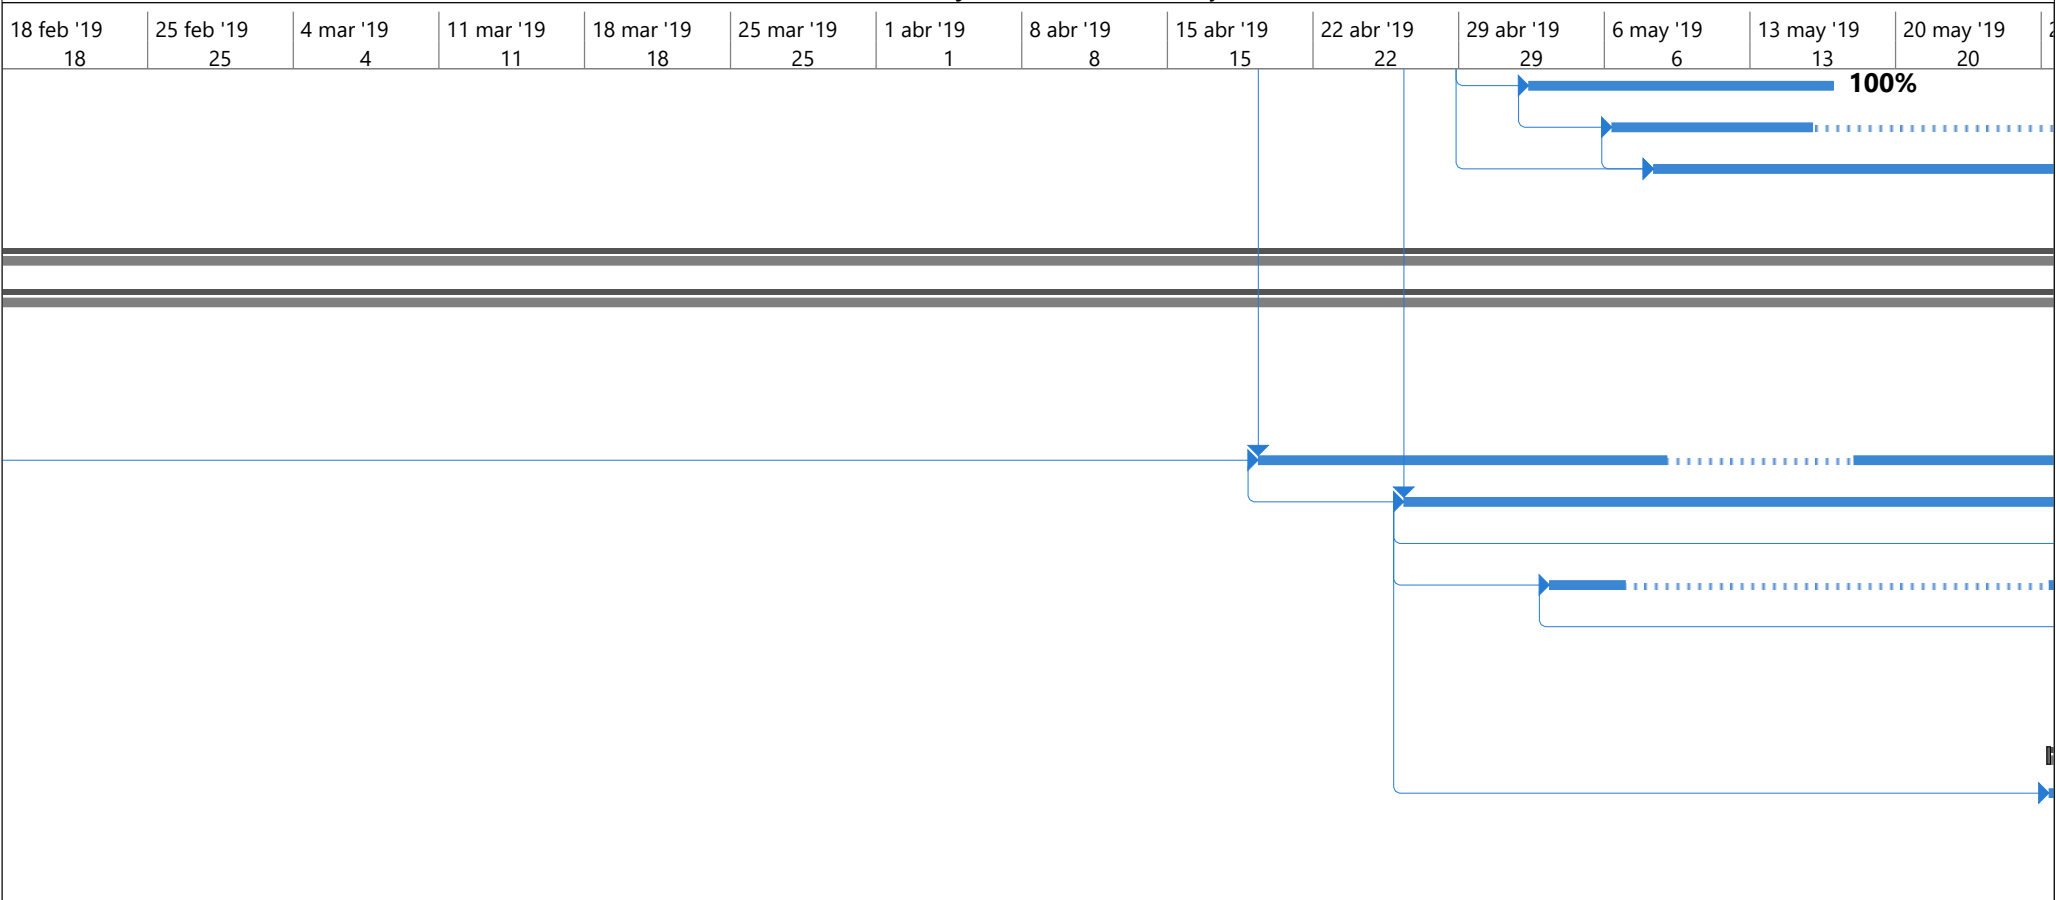

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	27 may '19 27
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

18 feb '19 18	25 feb '19 25	4 mar '19 4	11 mar '19 11	18 mar '19 18	25 mar '19 25	1 abr '19 1	8 abr '19 8	15 abr '19 15	22 abr '19 22	29 abr '19 29	6 may '19 6	13 may '19 13	20 may '19 20	27 may '19 27
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

























--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020													
27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020													
27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	2
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	---

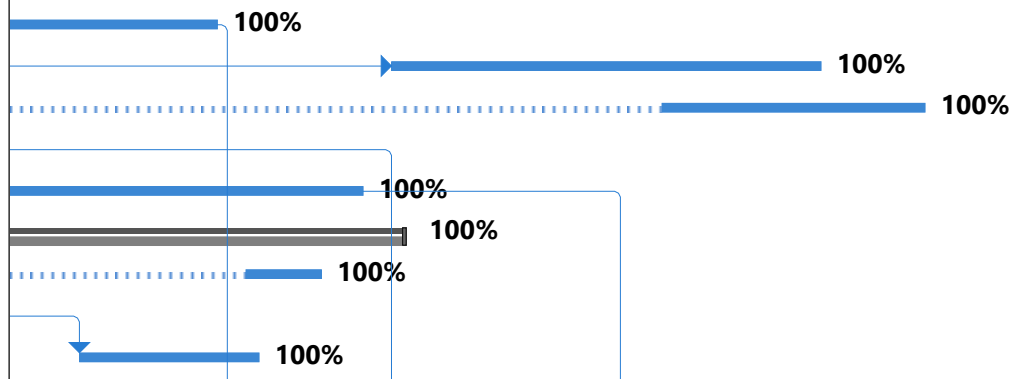





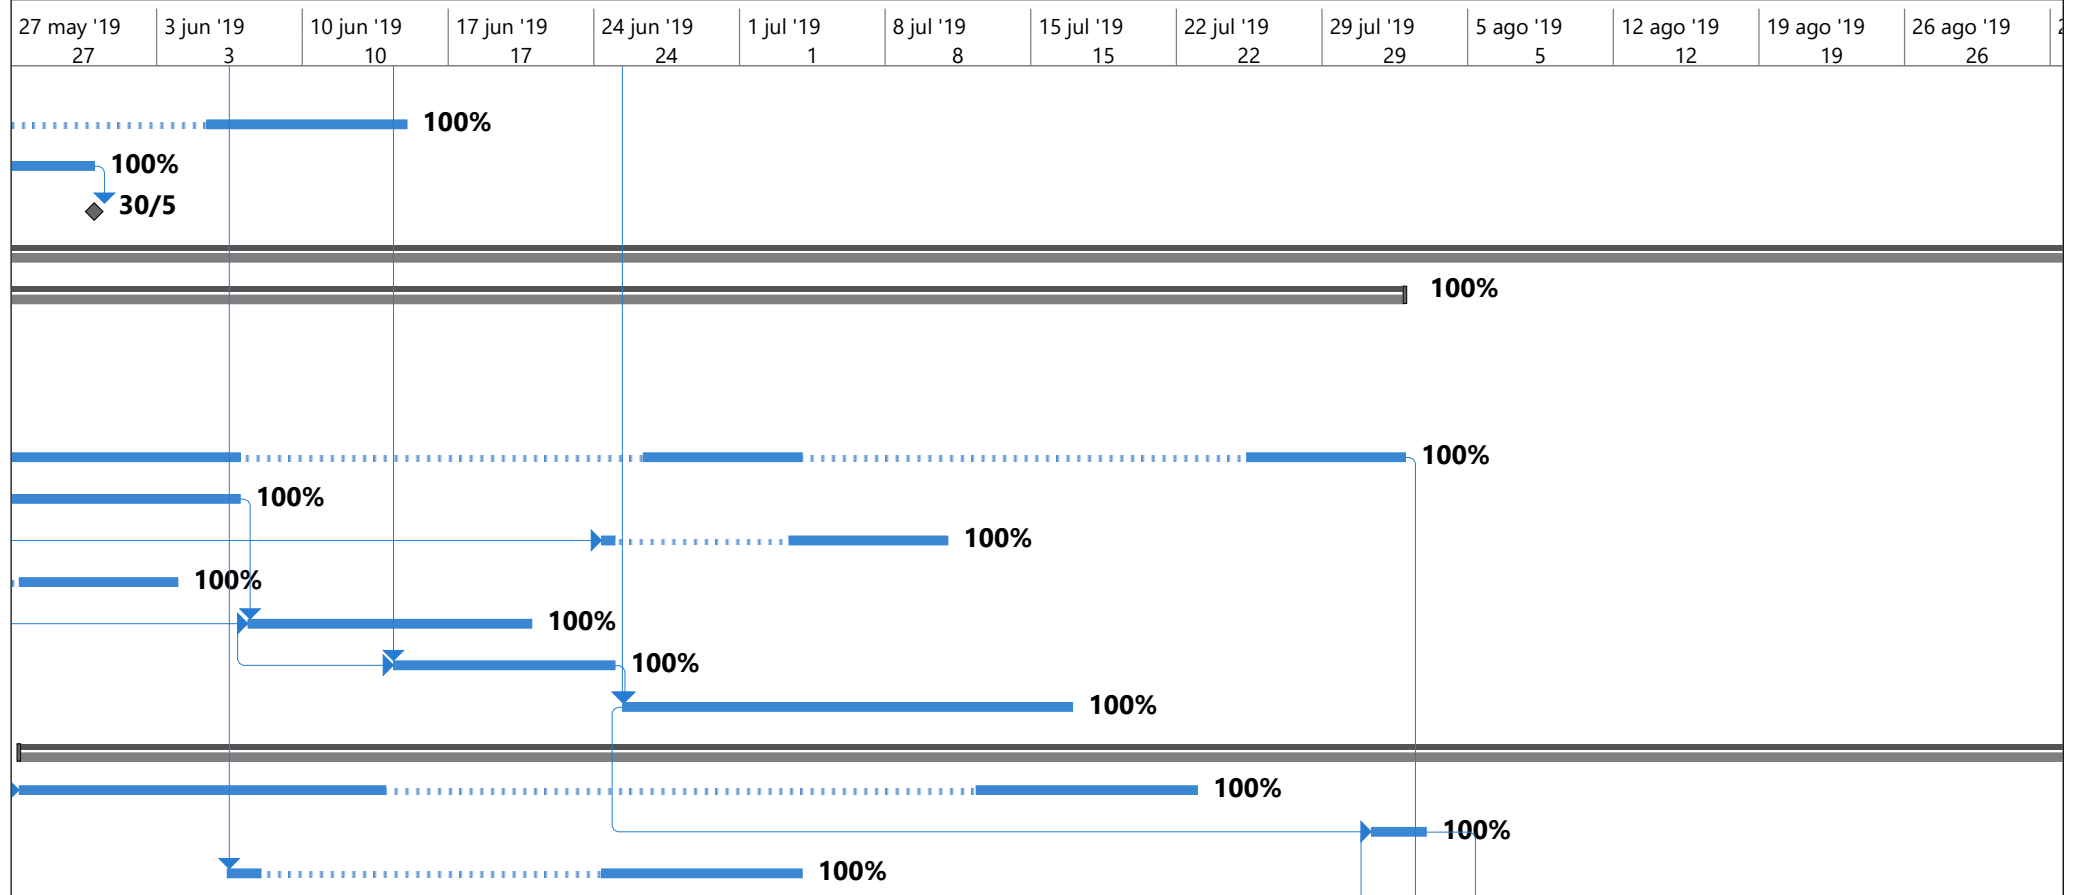



















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020															
27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26		

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020


27 may '19 27	3 jun '19 3	10 jun '19 10	17 jun '19 17	24 jun '19 24	1 jul '19 1	8 jul '19 8	15 jul '19 15	22 jul '19 22	29 jul '19 29	5 ago '19 5	12 ago '19 12	19 ago '19 19	26 ago '19 26	2
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




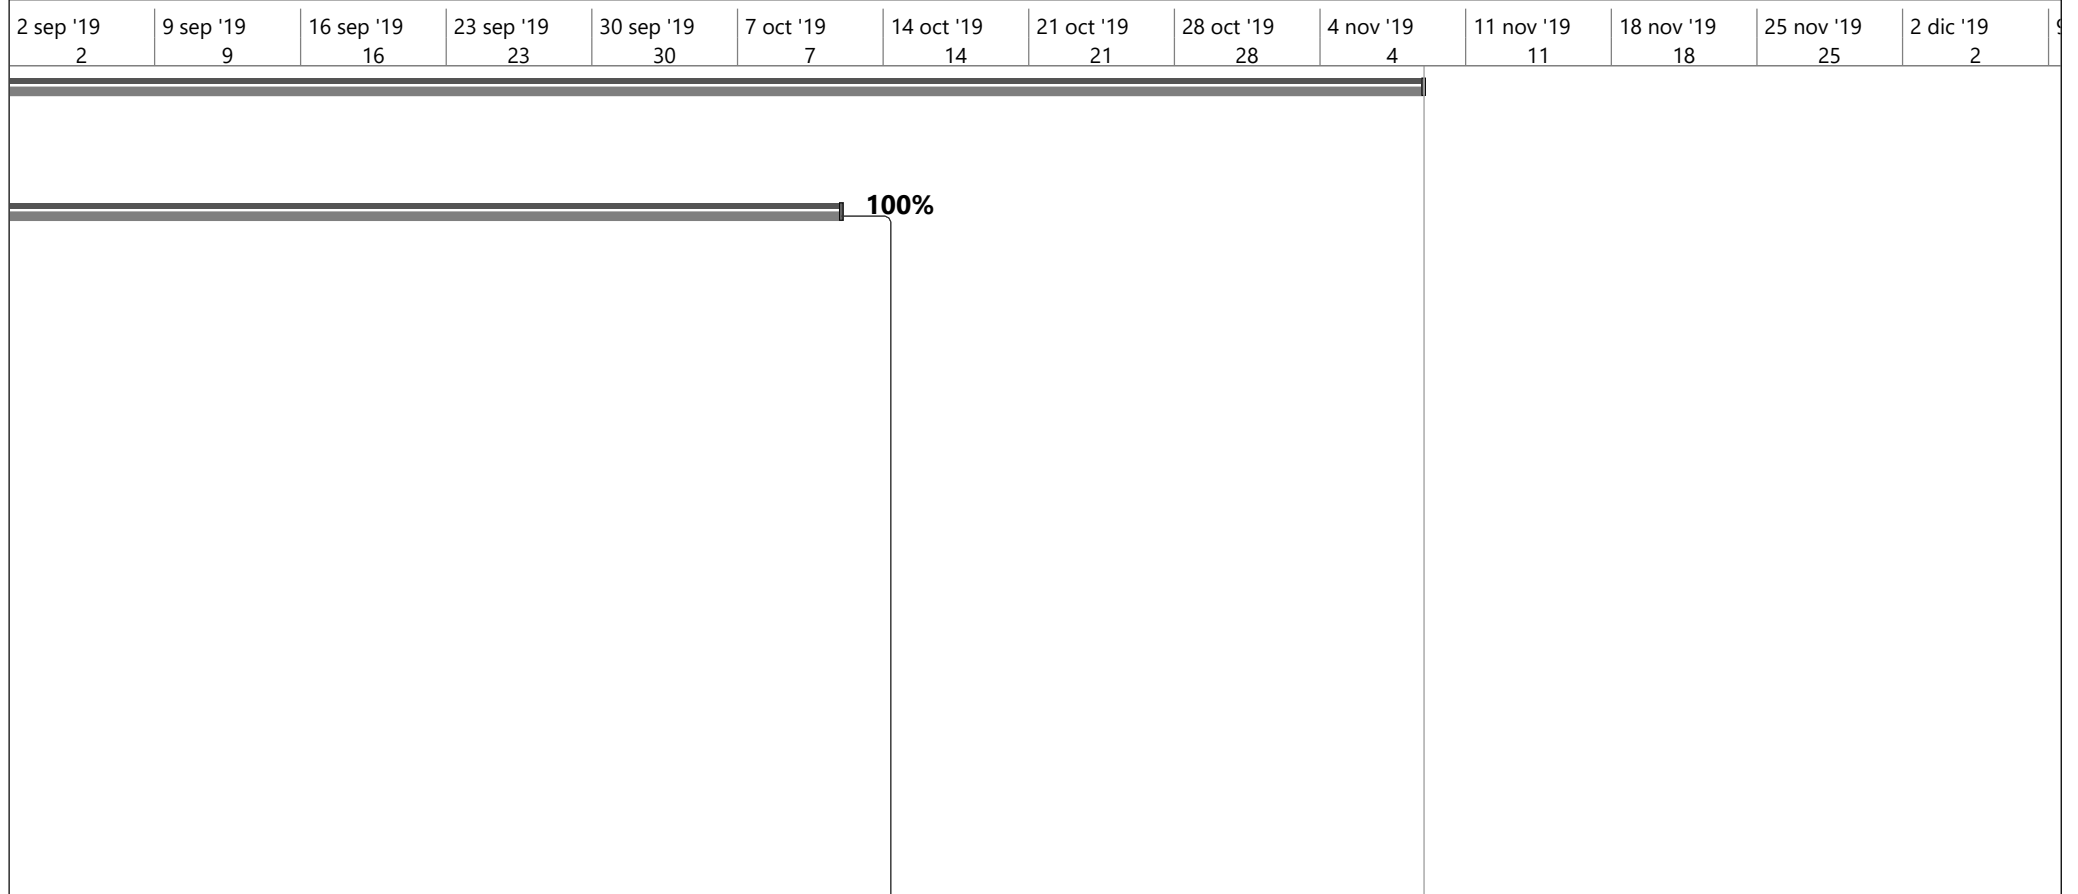




















Calendario de Ejecución CHIV106 May2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	










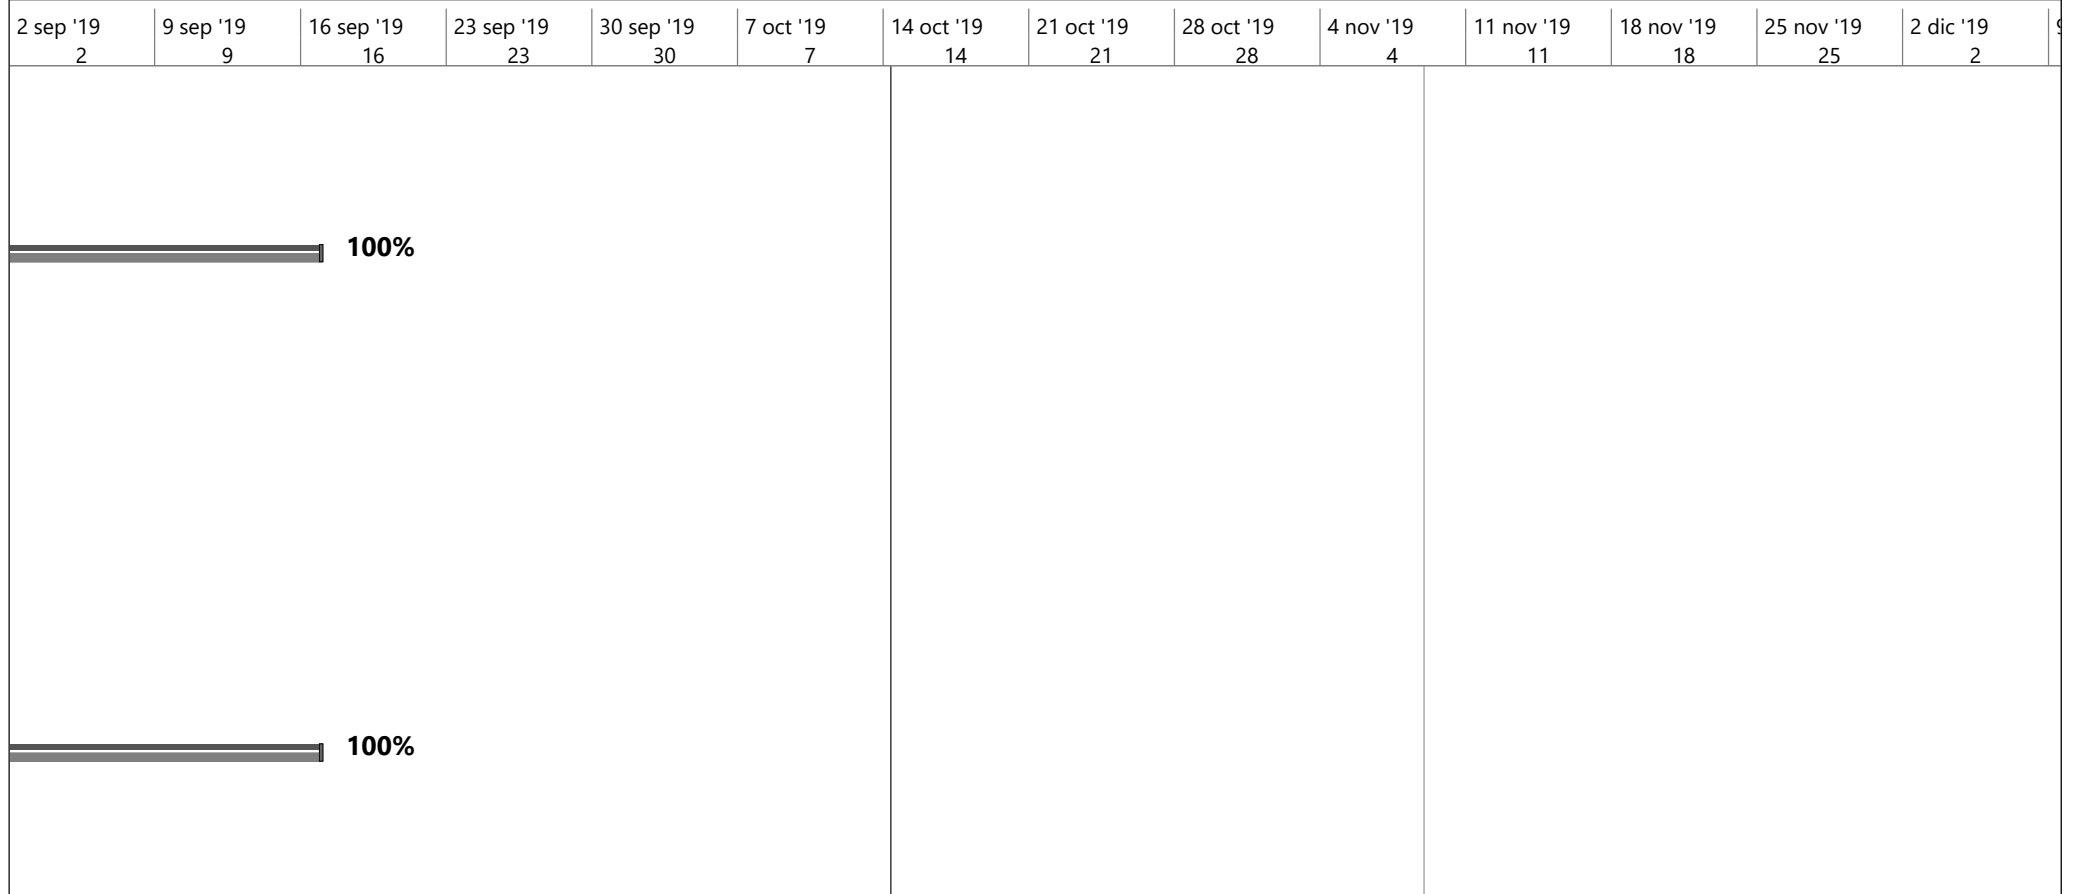














Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

2 sep '19 2	9 sep '19 9	16 sep '19 16	23 sep '19 23	30 sep '19 30	7 oct '19 7	14 oct '19 14	21 oct '19 21	28 oct '19 28	4 nov '19 4	11 nov '19 11	18 nov '19 18	25 nov '19 25	2 dic '19 2	9 dic '19 9


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

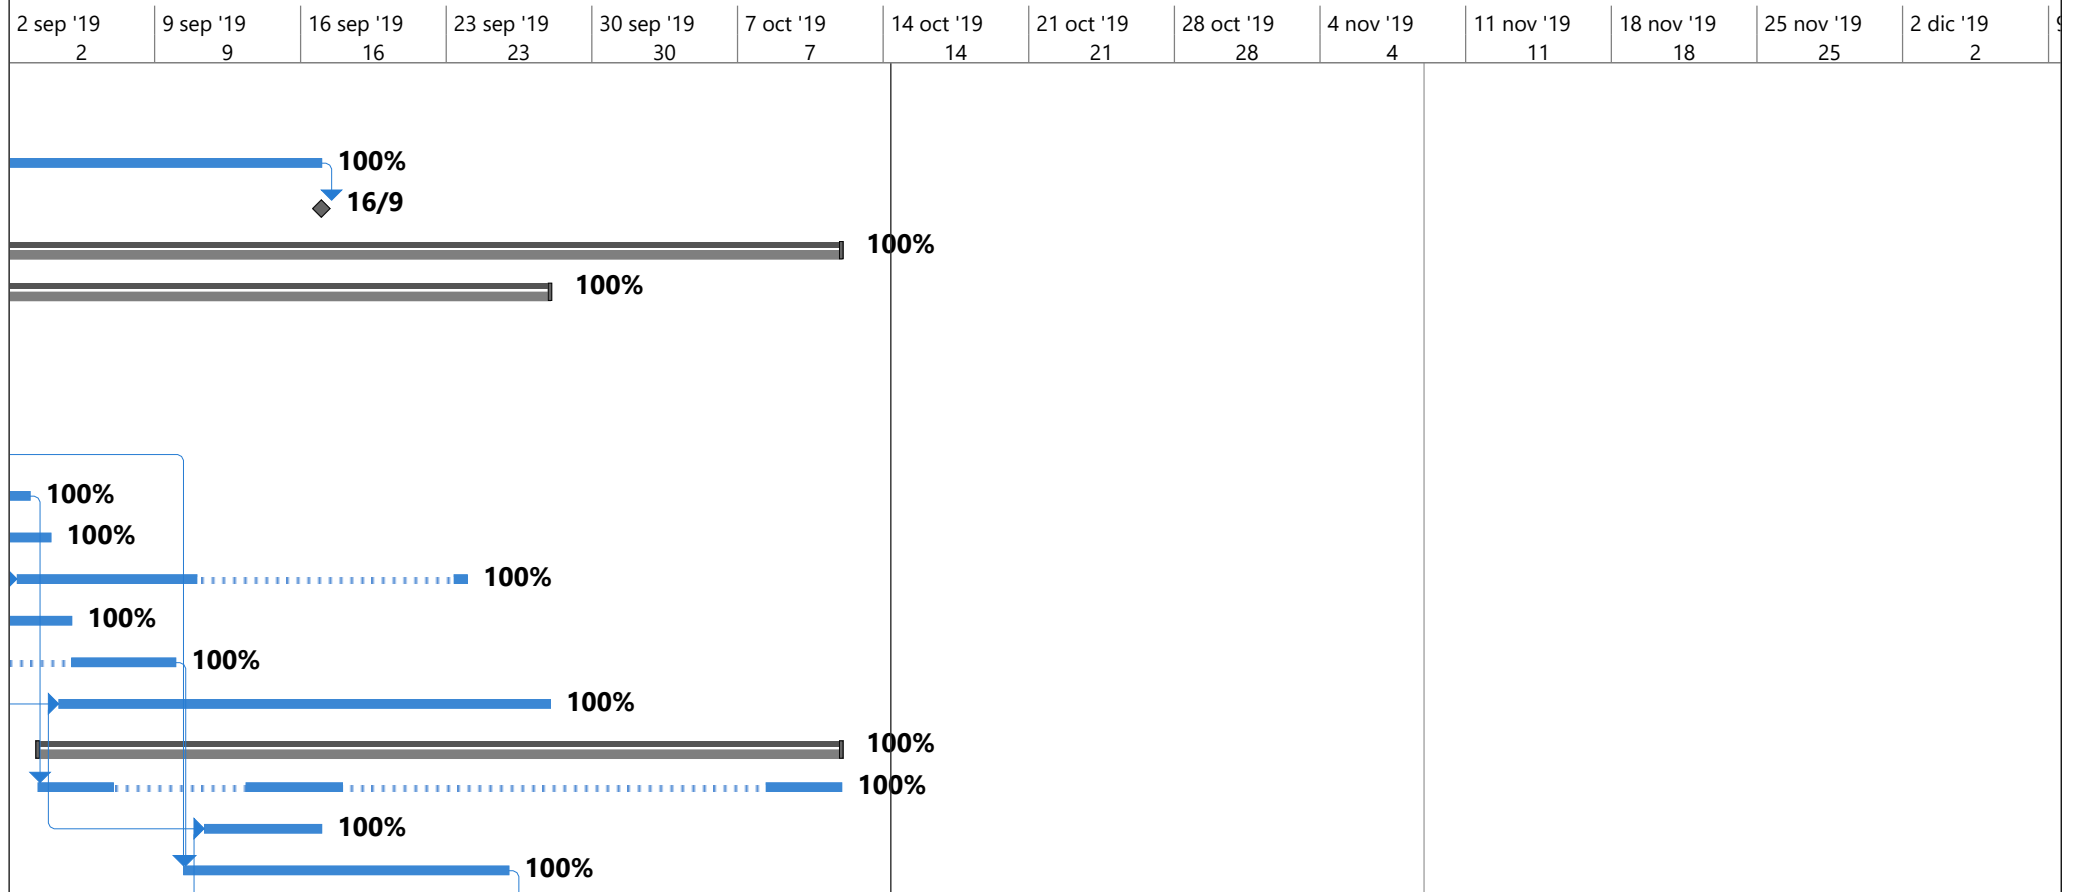

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución CHIV106 May2020

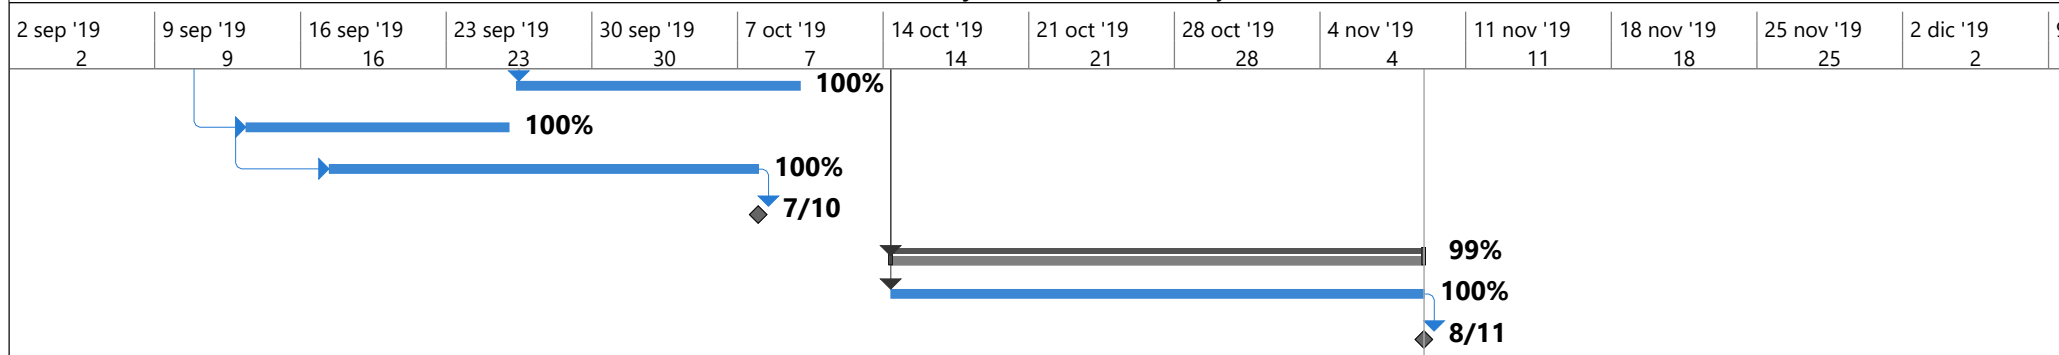

Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana


F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División




Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen



Fecha límite

