
































































































Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 26 mar '18 26 | 2 abr '18 2 | 9 abr '18 9 | 16 abr '18 16 | 23 abr '18 23 | 30 abr '18 30 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | |  | Rehabilitación de Redes CHIVO106 | 257.13 días | | | | | | |
| 2 |  |  | Adjudicación | 0 días | | | | | | |
| 3 |  |  | Periodo de Adquisiciones | 80 días | | | | | | |
| 28 |  |  | Ejecución | 217 días | | | | | | |
| 29 |  |  | Polígono 1 | 100 días | | | | | | |
| 30 |  |  | Instalación | 94 días | | | | | | |
| 31 |  |  | Izado de postes | 4 días | | | | | | |
| 32 |  |  | Cimentaciones | 5 días | | | | | | |
| 33 |  |  | Retenidas | 4 días | | | | | | |
| 34 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 10 días | | | | | | |
| 35 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 10 días | | | | | | |
| 36 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | 3 días | | | | | | |
| 37 |  |  | Conexiones y Jumpers | 6 días | | | | | | |
| 38 |  |  | Transformadores | 5 días | | | | | | |
| 39 |  |  | Alumbrado Publico | 4 días | | | | | | |
| 40 |  |  | Normalización Suministros | 12 días | | | | | | |
| 41 |  |  | Remoción | 40 días | | | | | | |
| 42 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | 0 días | | | | | | |
| 43 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | 2 días | | | | | | |
| 44 |  |  | Armados de Media Tensión | 5 días | | | | | | |





| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 26 mar '18 26 | 2 abr '18 2 | 9 abr '18 9 | 16 abr '18 16 | 23 abr '18 23 | 30 abr '18 30 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 45 |  |  | Armados de Baja Tensión | 8 días | | | | | | |
| 46 |  |  | Transformadores | 3 días | | | | | | |
| 47 |  |  | Izado de postes | 13 días | | | | | | |
| 48 |  |  | Cierre de Polígono 1 | 0 días | | | | | | |
| 49 |  |  | Polígono 2 | 145 días | | | | | | |
| 50 |  |  | Instalación | 145 días | | | | | | |
| 51 |  |  | Izado de postes | 22 días | | | | | | |
| 52 |  |  | Cimentaciones | 19 días | | | | | | |
| 53 |  |  | Retenidas | 14 días | | | | | | |
| 54 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 19 días | | | | | | |
| 55 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 15 días | | | | | | |
| 56 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | 15 días | | | | | | |
| 57 |  |  | Conexiones y Jumpers | 15 días | | | | | | |
| 58 |  |  | Transformadores | 25 días | | | | | | |
| 59 |  |  | Alumbrado Publico | 10 días | | | | | | |
| 60 |  |  | Normalización Suministros | 41 días | | | | | | |
| 61 |  |  | Remoción | 41 días | | | | | | |
| 62 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | 14 días | | | | | | |
| 63 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | 4 días | | | | | | |
| 64 |  |  | Armados de Media Tensión | 7 días | | | | | | |









































| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 26 mar '18 26 | 2 abr '18 2 | 9 abr '18 9 | 16 abr '18 16 | 23 abr '18 23 | 30 abr '18 30 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 65 |  |  | Armados de Baja Tensión | 11 días | | | | | | |
| 66 |  |  | Transformadores | 16 días | | | | | | |
| 67 |  |  | Izado de postes | 17 días | | | | | | |
| 68 |  |  | Cierre de Polígono 2 | 0 días | | | | | | |
| 69 |  |  | Polígono 3 | 172 días | | | | | | |
| 70 |  |  | Instalación | 140 días | | | | | | |
| 71 |  |  | Izado de postes | 12 días | | | | | | |
| 72 |  |  | Cimentaciones | 8 días | | | | | | |
| 73 |  |  | Retenidas | 7 días | | | | | | |
| 74 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 40 días | | | | | | |
| 75 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 30 días | | | | | | |
| 76 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | 7 días | | | | | | |
| 77 |  |  | Conexiones y Jumpers | 8 días | | | | | | |
| 78 |  |  | Transformadores | 10 días | | | | | | |
| 79 |  |  | Alumbrado Publico | 7 días | | | | | | |
| 80 |  |  | Normalización Suministros | 16 días | | | | | | |
| 81 |  |  | Remoción | 81 días | | | | | | |
| 82 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | 21 días | | | | | | |
| 83 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | 3 días | | | | | | |
| 84 |  |  | Armados de Media Tensión | 10 días | | | | | | |














| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 26 mar '18 26 | 2 abr '18 2 | 9 abr '18 9 | 16 abr '18 16 | 23 abr '18 23 | 30 abr '18 30 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 85 |  |  | Armados de Baja Tensión | 16 días | | | | | | |
| 86 |  |  | Transformadores | 6 días | | | | | | |
| 87 |  |  | Izado de postes | 25 días | | | | | | |
| 88 |  |  | Cierre de Polígono 3 | 0 días | | | | | | |
| 89 |  |  | Polígono 4 | 179 días | | | | | | |
| 90 |  |  | Instalación | 169 días | | | | | | |
| 91 |  |  | Izado de postes | 6 días | | | | | | |
| 92 |  |  | Cimentaciones | 5 días | | | | | | |
| 93 |  |  | Retenidas | 4 días | | | | | | |
| 94 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 7 días | | | | | | |
| 95 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 21 días | | | | | | |
| 96 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | 7 días | | | | | | |
| 97 |  |  | Conexiones y Jumpers | 8 días | | | | | | |
| 98 |  |  | Transformadores | 14 días | | | | | | |
| 99 |  |  | Alumbrado Publico | 6 días | | | | | | |
| 100 |  |  | Normalización Suministros | 18 días | | | | | | |
| 101 |  |  | Remoción | 29 días | | | | | | |
| 102 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | 11 días | | | | | | |
| 103 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | 4 días | | | | | | |
| 104 |  |  | Armados de Media Tensión | 12 días | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 26 mar '18 26 | 2 abr '18 2 | 9 abr '18 9 | 16 abr '18 16 | 23 abr '18 23 | 30 abr '18 30 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 105 |  |  | Armados de Baja Tensión | 10 días | | | | | | |
| 106 |  |  | Transformadores | 9 días | | | | | | |
| 107 |  |  | Izado de postes | 15 días | | | | | | |
| 108 |  |  | Cierre de Polígono 4 | 0 días | | | | | | |
| 109 | |  | Cierre de Obras | 20 días | | | | | | |
| 110 |  |  | Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados | 1 ms | | | | | | |
| 111 | |  | Presentación de Cierre de Obras | 0 días | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30 abr '18 30 | 7 may '18 7 | 14 may '18 14 | 21 may '18 21 | 28 may '18 28 | 4 jun '18 4 | 11 jun '18 11 | 18 jun '18 18 | 25 jun '18 25 | 2 jul '18 2 | 9 jul '18 9 | 16 jul '18 16 | 23 jul '18 23 | 30 jul '18 30 | 6 ago '18 6 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30 abr '18 30 | 7 may '18 7 | 14 may '18 14 | 21 may '18 21 | 28 may '18 28 | 4 jun '18 4 | 11 jun '18 11 | 18 jun '18 18 | 25 jun '18 25 | 2 jul '18 2 | 9 jul '18 9 | 16 jul '18 16 | 23 jul '18 23 | 30 jul '18 30 | 6 ago '18 6 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30 abr '18 30 | 7 may '18 7 | 14 may '18 14 | 21 may '18 21 | 28 may '18 28 | 4 jun '18 4 | 11 jun '18 11 | 18 jun '18 18 | 25 jun '18 25 | 2 jul '18 2 | 9 jul '18 9 | 16 jul '18 16 | 23 jul '18 23 | 30 jul '18 30 | 6 ago '18 6 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30 abr '18 30 | 7 may '18 7 | 14 may '18 14 | 21 may '18 21 | 28 may '18 28 | 4 jun '18 4 | 11 jun '18 11 | 18 jun '18 18 | 25 jun '18 25 | 2 jul '18 2 | 9 jul '18 9 | 16 jul '18 16 | 23 jul '18 23 | 30 jul '18 30 | 6 ago '18 6 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|



























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30 abr '18 30 | 7 may '18 7 | 14 may '18 14 | 21 may '18 21 | 28 may '18 28 | 4 jun '18 4 | 11 jun '18 11 | 18 jun '18 18 | 25 jun '18 25 | 2 jul '18 2 | 9 jul '18 9 | 16 jul '18 16 | 23 jul '18 23 | 30 jul '18 30 | 6 ago '18 6 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

























| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 6 ago '18 6 | 13 ago '18 13 | 20 ago '18 20 | 27 ago '18 27 | 3 sep '18 3 | 10 sep '18 10 | 17 sep '18 17 | 24 sep '18 24 | 1 oct '18 1 | 8 oct '18 8 | 15 oct '18 15 | 22 oct '18 22 | 29 oct '18 29 | 5 nov '18 5 | 12 nov '18 12 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|

◆ 1/10

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 6 ago '18 6 | 13 ago '18 13 | 20 ago '18 20 | 27 ago '18 27 | 3 sep '18 3 | 10 sep '18 10 | 17 sep '18 17 | 24 sep '18 24 | 1 oct '18 1 | 8 oct '18 8 | 15 oct '18 15 | 22 oct '18 22 | 29 oct '18 29 | 5 nov '18 5 | 12 nov '18 12 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 6 ago '18 6 | 13 ago '18 13 | 20 ago '18 20 | 27 ago '18 27 | 3 sep '18 3 | 10 sep '18 10 | 17 sep '18 17 | 24 sep '18 24 | 1 oct '18 1 | 8 oct '18 8 | 15 oct '18 15 | 22 oct '18 22 | 29 oct '18 29 | 5 nov '18 5 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 6 ago '18 6 | 13 ago '18 13 | 20 ago '18 20 | 27 ago '18 27 | 3 sep '18 3 | 10 sep '18 10 | 17 sep '18 17 | 24 sep '18 24 | 1 oct '18 1 | 8 oct '18 8 | 15 oct '18 15 | 22 oct '18 22 | 29 oct '18 29 | 5 nov '18 5 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|



























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 6 ago '18 6 | 13 ago '18 13 | 20 ago '18 20 | 27 ago '18 27 | 3 sep '18 3 | 10 sep '18 10 | 17 sep '18 17 | 24 sep '18 24 | 1 oct '18 1 | 8 oct '18 8 | 15 oct '18 15 | 22 oct '18 22 | 29 oct '18 29 | 5 nov '18 5 | 12 nov '18 12 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 12 nov '18 12 | 19 nov '18 19 | 26 nov '18 26 | 3 dic '18 3 | 10 dic '18 10 | 17 dic '18 17 | 24 dic '18 24 | 31 dic '18 31 | 7 ene '19 7 | 14 ene '19 14 | 21 ene '19 21 | 28 ene '19 28 | 4 feb '19 4 | 11 feb '19 11 | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|

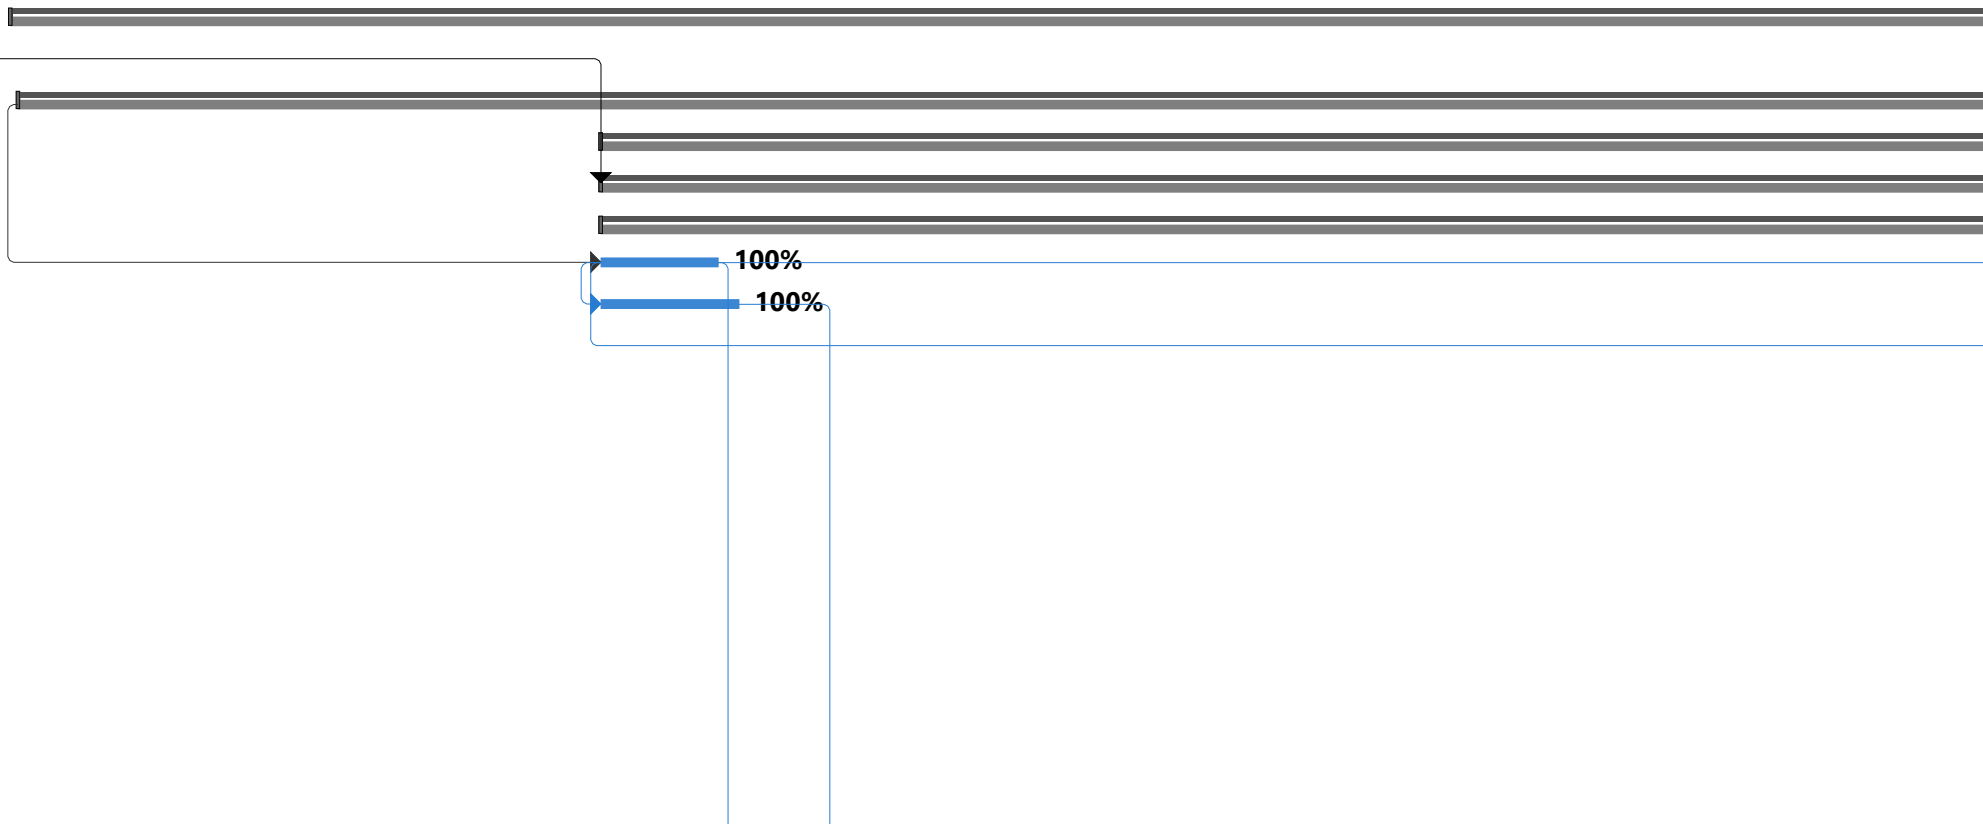


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

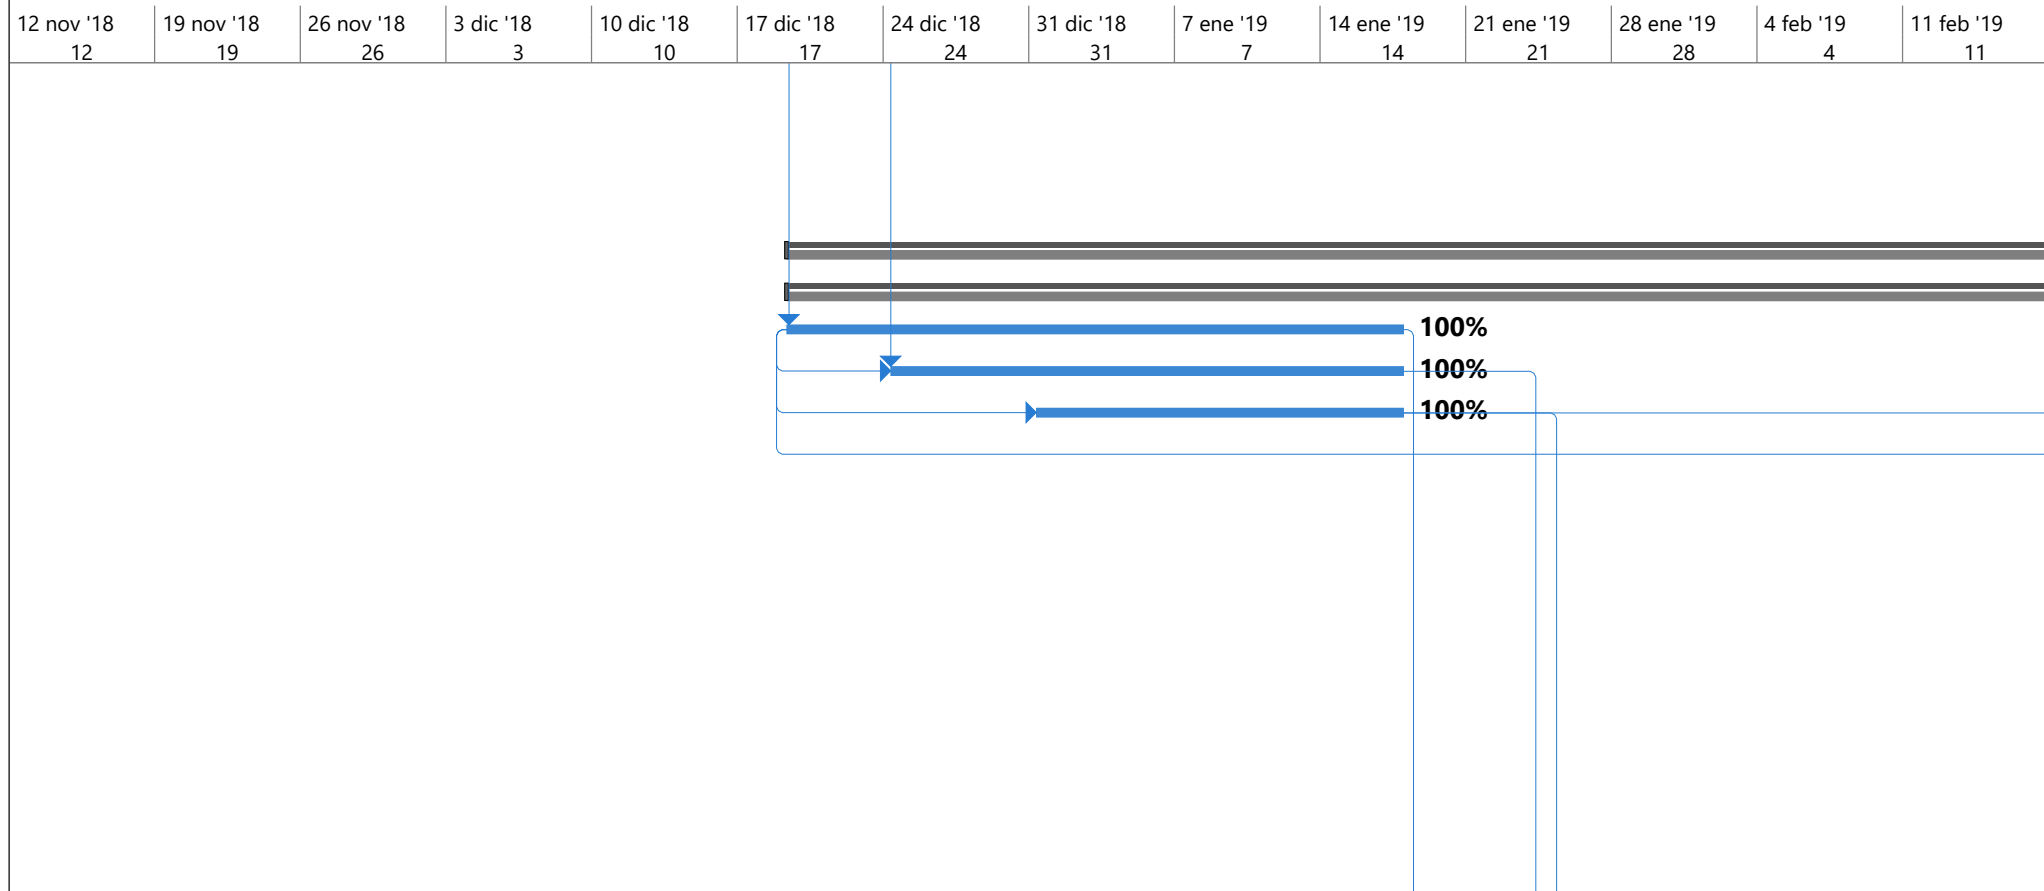

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

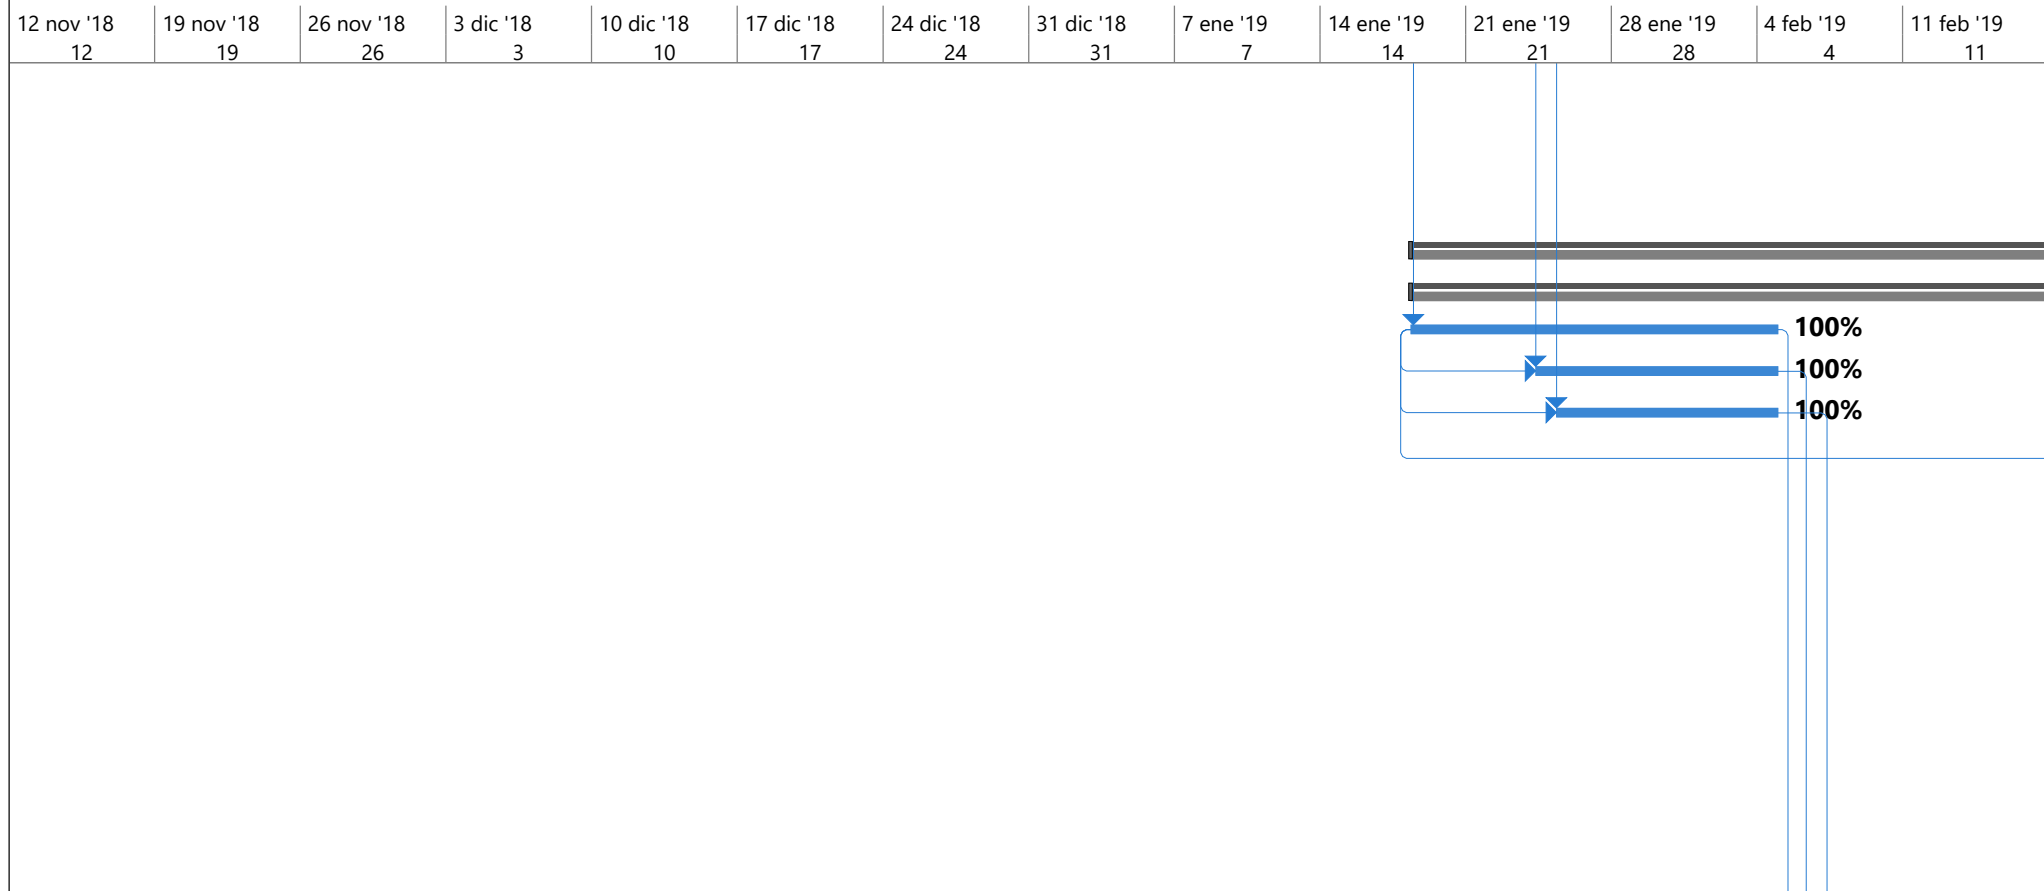

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 12 nov '18 12 | 19 nov '18 19 | 26 nov '18 26 | 3 dic '18 3 | 10 dic '18 10 | 17 dic '18 17 | 24 dic '18 24 | 31 dic '18 31 | 7 ene '19 7 | 14 ene '19 14 | 21 ene '19 21 | 28 ene '19 28 | 4 feb '19 4 | 11 feb '19 11 | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|



























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 12 nov '18 12 | 19 nov '18 19 | 26 nov '18 26 | 3 dic '18 3 | 10 dic '18 10 | 17 dic '18 17 | 24 dic '18 24 | 31 dic '18 31 | 7 ene '19 7 | 14 ene '19 14 | 21 ene '19 21 | 28 ene '19 28 | 4 feb '19 4 | 11 feb '19 11 | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|









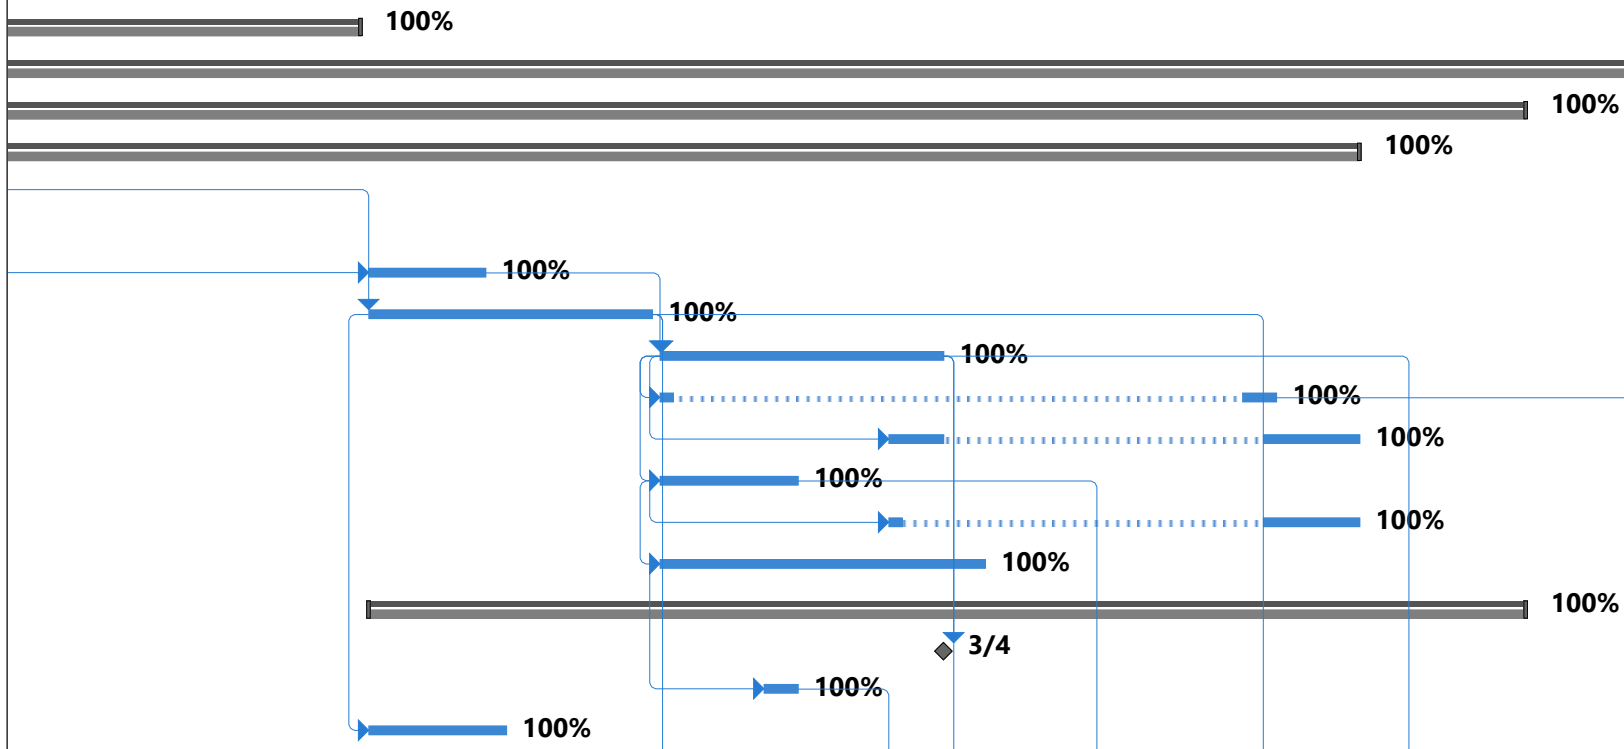















| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 18 feb '19 | 25 feb '19 | 4 mar '19 | 11 mar '19 | 18 mar '19 | 25 mar '19 | 1 abr '19 | 8 abr '19 | 15 abr '19 | 22 abr '19 | 29 abr '19 | 6 may '19 | 13 may '19 | 20 may '19 | 27 may '19 |
| 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |




| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

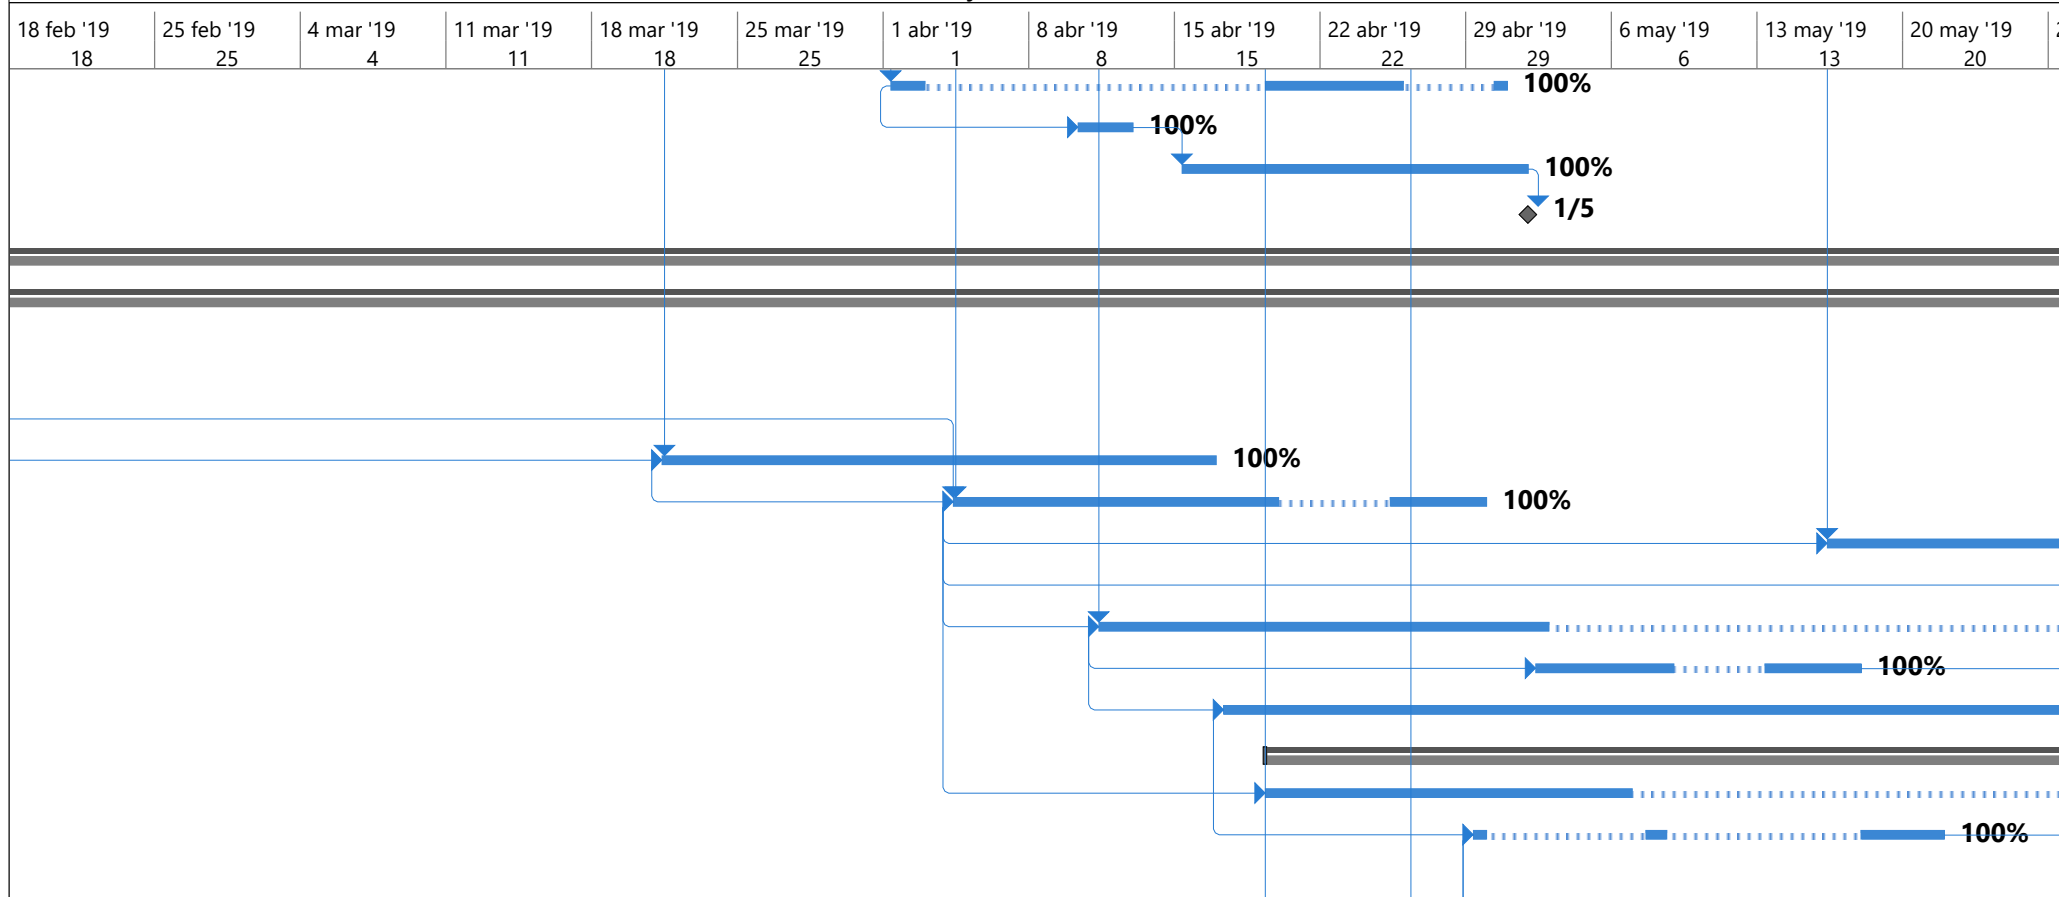



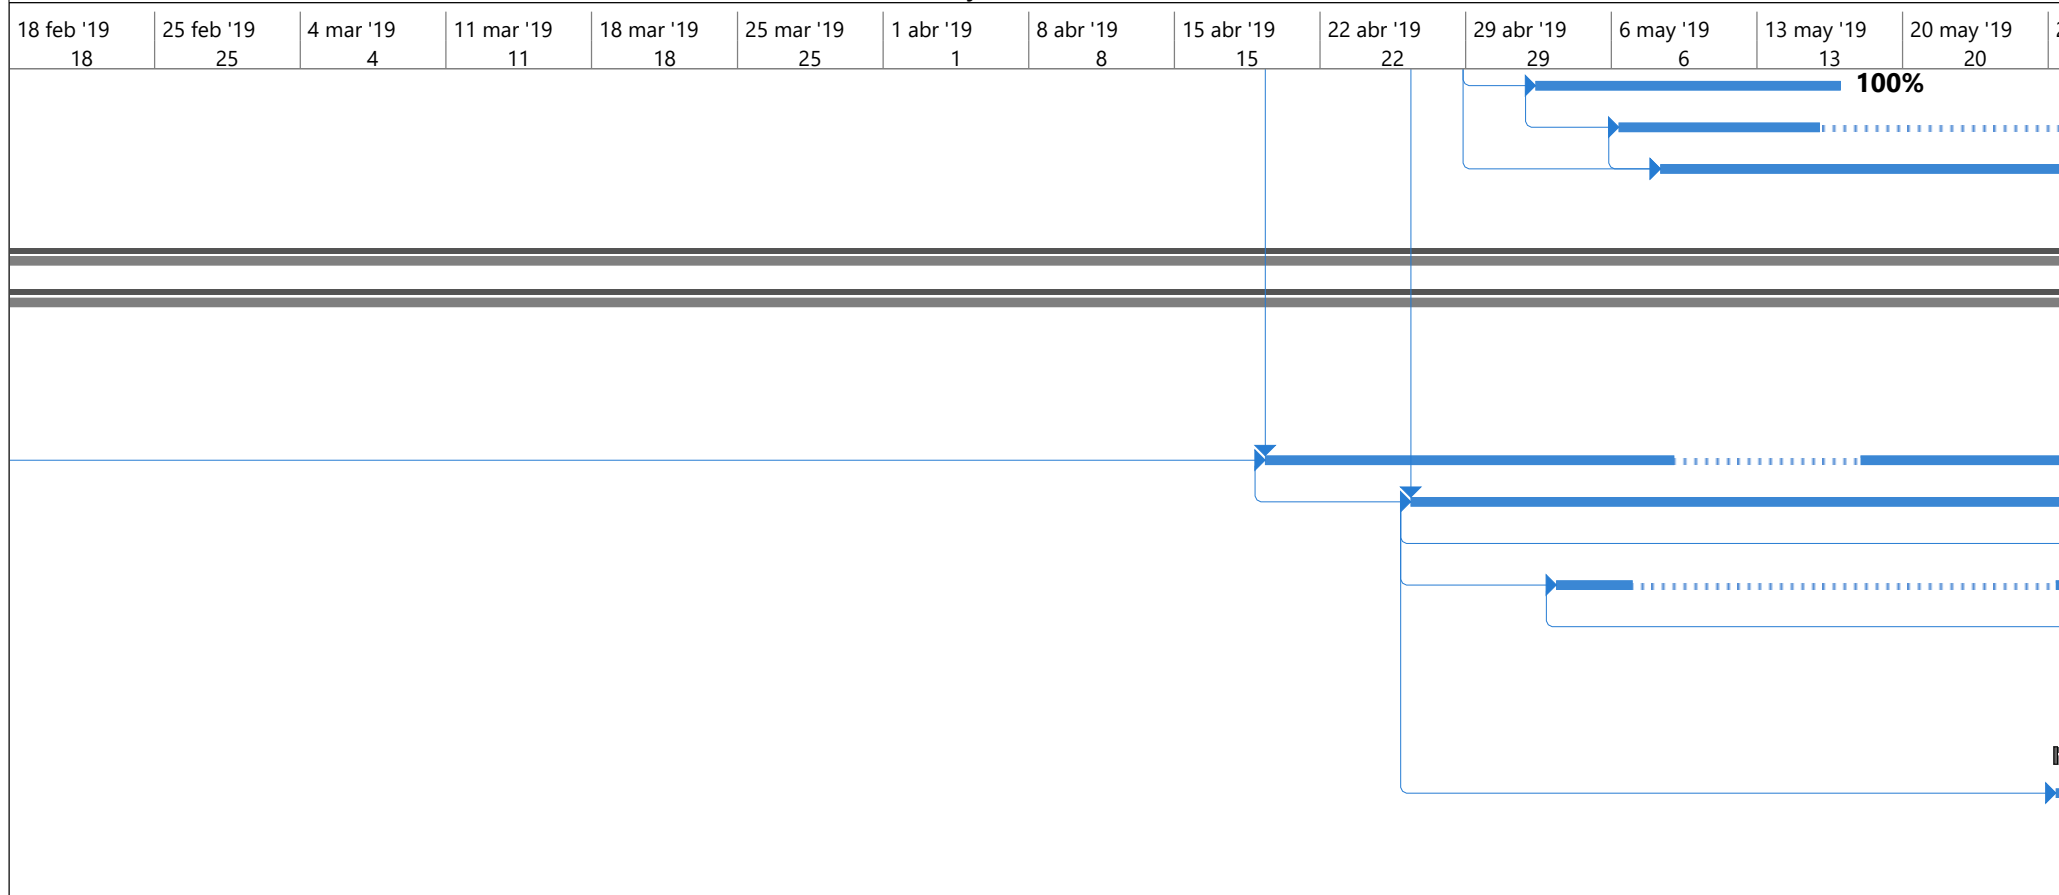





















Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


| Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 18 feb '19 | 25 feb '19 | 4 mar '19 | 11 mar '19 | 18 mar '19 | 25 mar '19 | 1 abr '19 | 8 abr '19 | 15 abr '19 | 22 abr '19 | 29 abr '19 | 6 may '19 | 13 may '19 | 20 may '19 | 27 may '19 |
| 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |

| Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 18 feb '19 | 25 feb '19 | 4 mar '19 | 11 mar '19 | 18 mar '19 | 25 mar '19 | 1 abr '19 | 8 abr '19 | 15 abr '19 | 22 abr '19 | 29 abr '19 | 6 may '19 | 13 may '19 | 20 may '19 | 27 may '19 |
| 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

























| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 feb '19 18 | 25 feb '19 25 | 4 mar '19 4 | 11 mar '19 11 | 18 mar '19 18 | 25 mar '19 25 | 1 abr '19 1 | 8 abr '19 8 | 15 abr '19 15 | 22 abr '19 22 | 29 abr '19 29 | 6 may '19 6 | 13 may '19 13 | 20 may '19 20 | 27 may '19 27 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


| Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 may '19 27 | 3 jun '19 3 | 10 jun '19 10 | 17 jun '19 17 | 24 jun '19 24 | 1 jul '19 1 | 8 jul '19 8 | 15 jul '19 15 | 22 jul '19 22 | 29 jul '19 29 | 5 ago '19 5 | 12 ago '19 12 | 19 ago '19 19 | 26 ago '19 26 |

| Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 may '19 27 | 3 jun '19 3 | 10 jun '19 10 | 17 jun '19 17 | 24 jun '19 24 | 1 jul '19 1 | 8 jul '19 8 | 15 jul '19 15 | 22 jul '19 22 | 29 jul '19 29 | 5 ago '19 5 | 12 ago '19 12 | 19 ago '19 19 | 26 ago '19 26 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 27 may '19 27 | 3 jun '19 3 | 10 jun '19 10 | 17 jun '19 17 | 24 jun '19 24 | 1 jul '19 1 | 8 jul '19 8 | 15 jul '19 15 | 22 jul '19 22 | 29 jul '19 29 | 5 ago '19 5 | 12 ago '19 12 | 19 ago '19 19 | 26 ago '19 26 | 2 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|

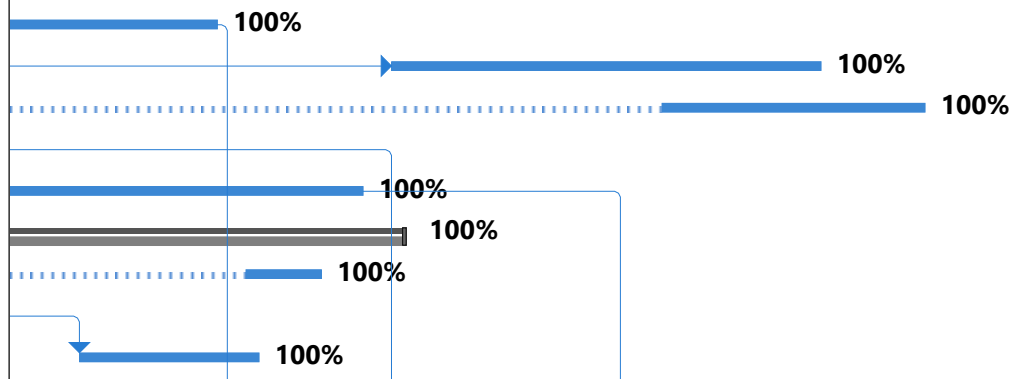


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

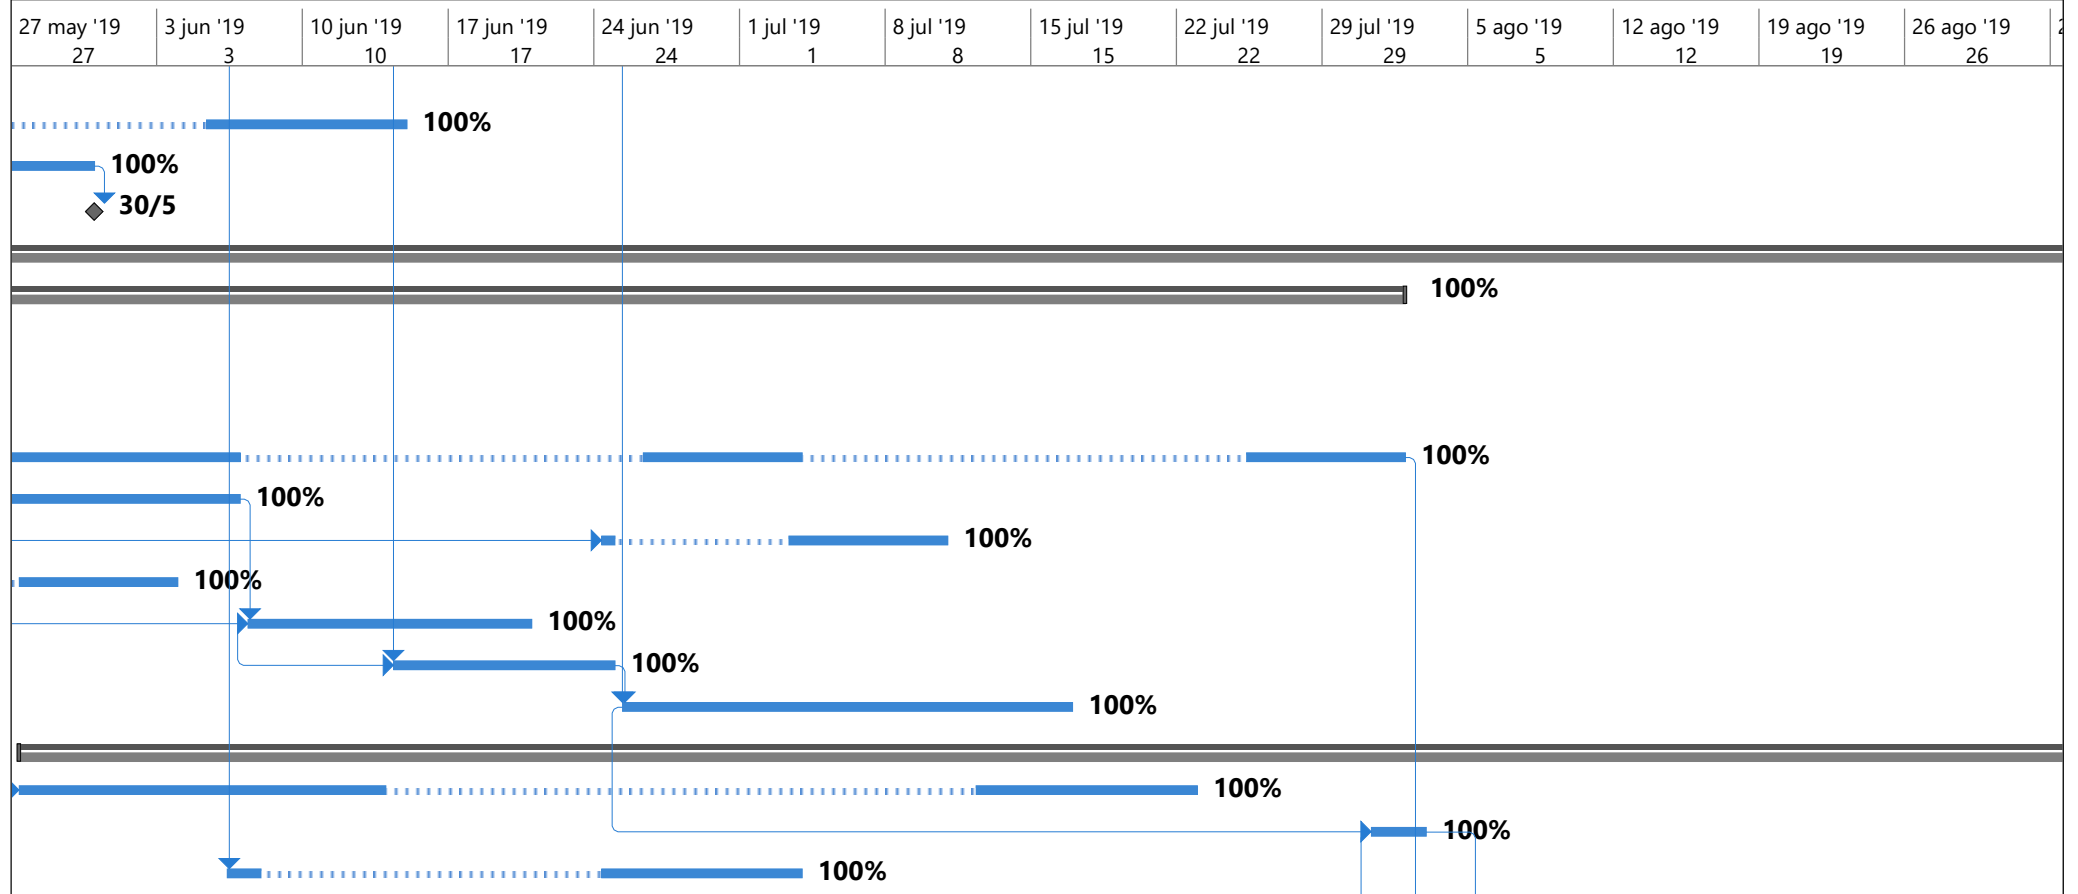

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

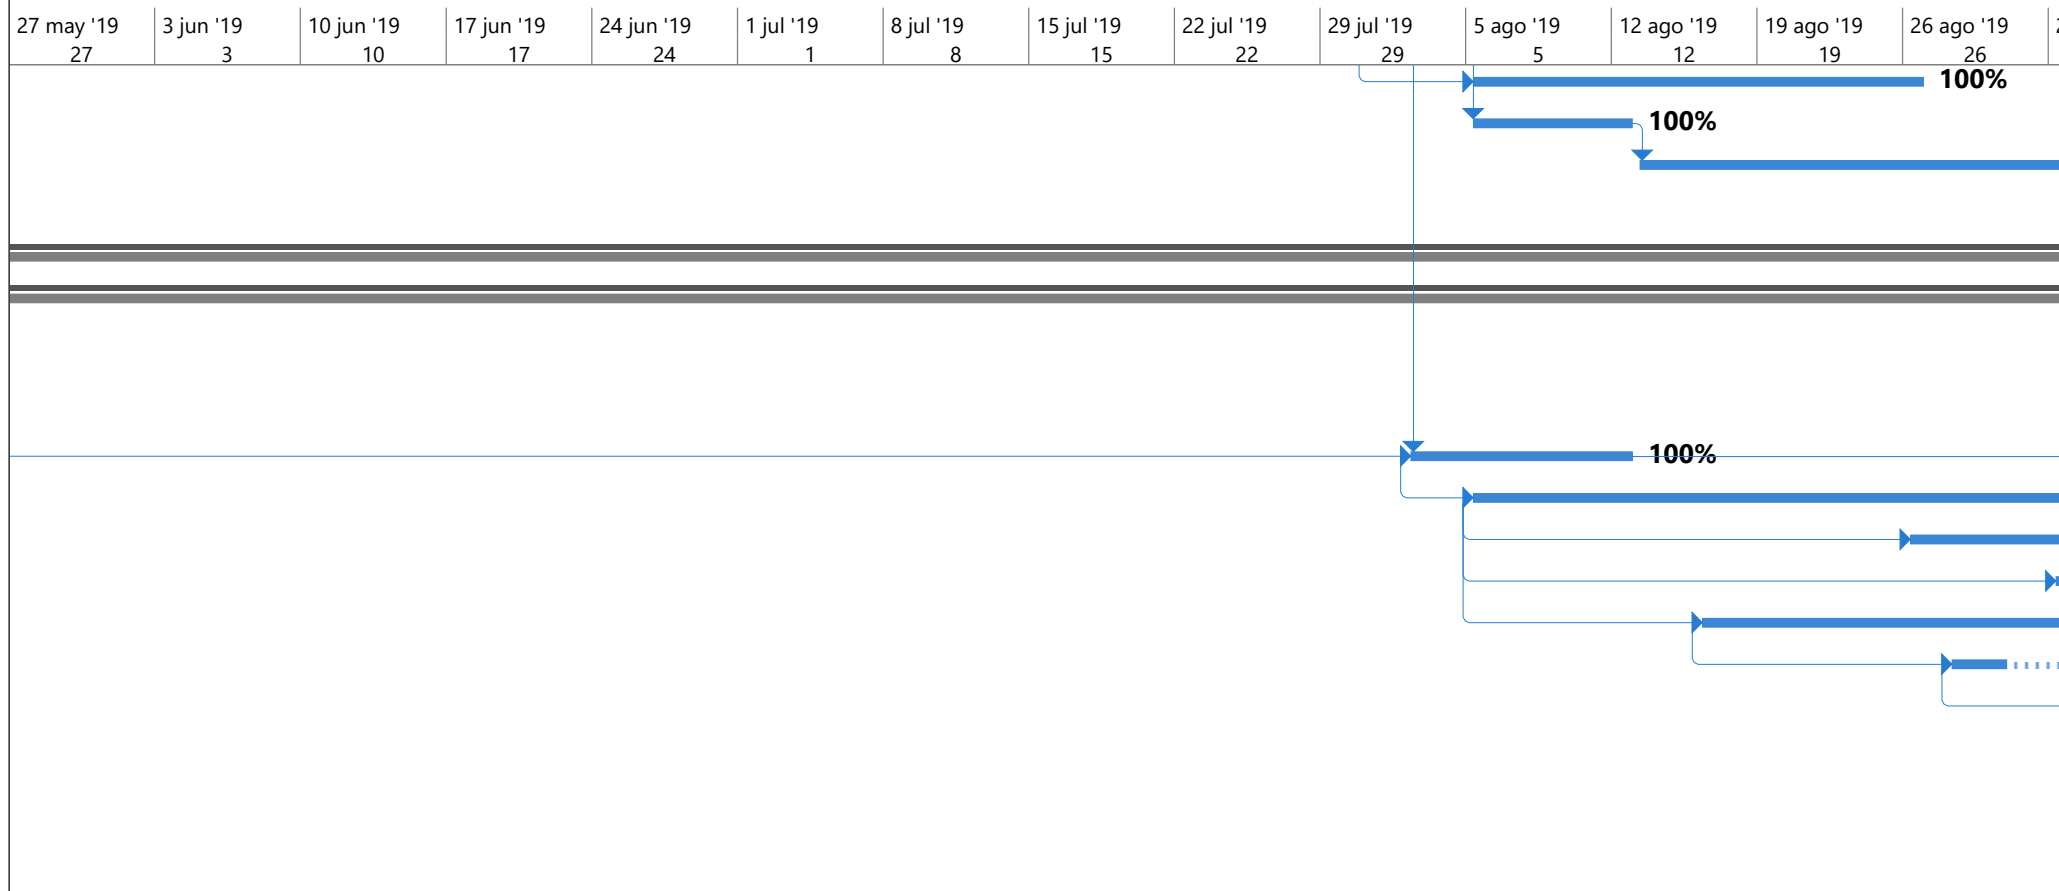

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 27 may '19 27 | 3 jun '19 3 | 10 jun '19 10 | 17 jun '19 17 | 24 jun '19 24 | 1 jul '19 1 | 8 jul '19 8 | 15 jul '19 15 | 22 jul '19 22 | 29 jul '19 29 | 5 ago '19 5 | 12 ago '19 12 | 19 ago '19 19 | 26 ago '19 26 | 2 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

























| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2 sep '19 2 | 9 sep '19 9 | 16 sep '19 16 | 23 sep '19 23 | 30 sep '19 30 | 7 oct '19 7 | 14 oct '19 14 | 21 oct '19 21 | 28 oct '19 28 | 4 nov '19 4 | 11 nov '19 11 | 18 nov '19 18 | 25 nov '19 25 | 2 dic '19 2 | 9 dic '19 9 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |










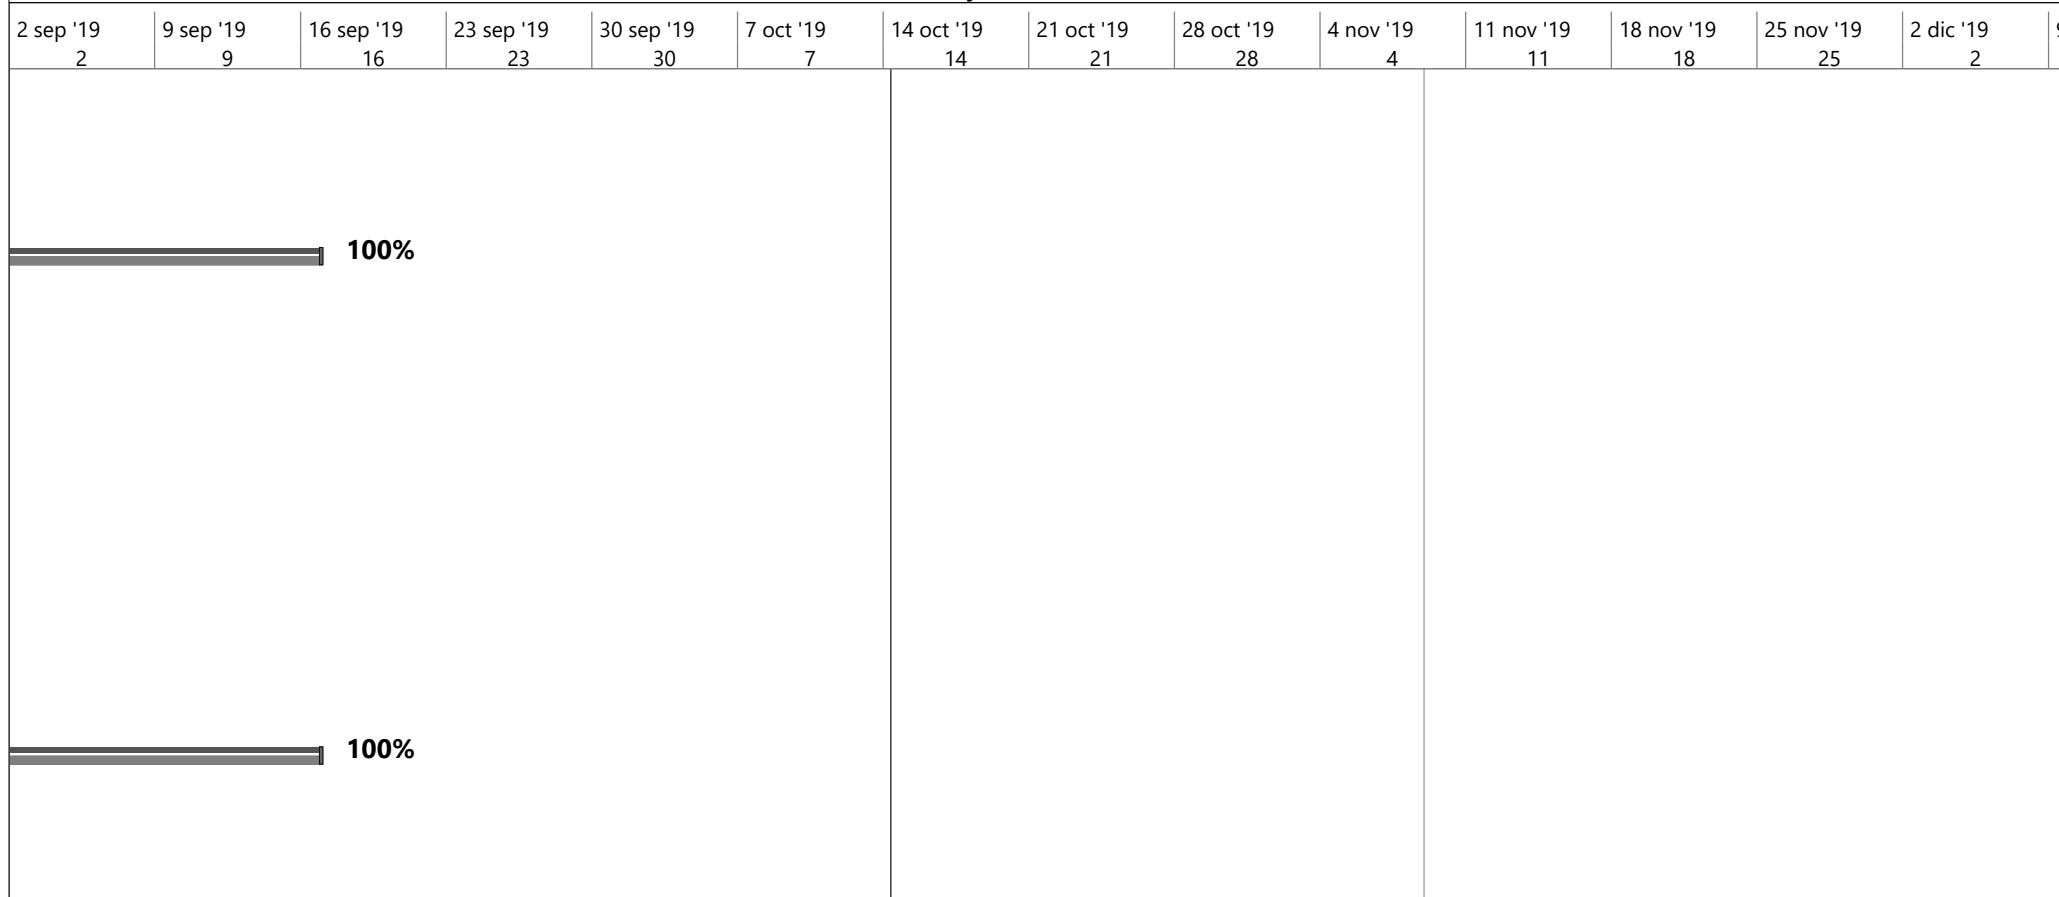














Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

| 2 sep '19 2 | 9 sep '19 9 | 16 sep '19 16 | 23 sep '19 23 | 30 sep '19 30 | 7 oct '19 7 | 14 oct '19 14 | 21 oct '19 21 | 28 oct '19 28 | 4 nov '19 4 | 11 nov '19 11 | 18 nov '19 18 | 25 nov '19 25 | 2 dic '19 2 | 9 dic '19 9 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |









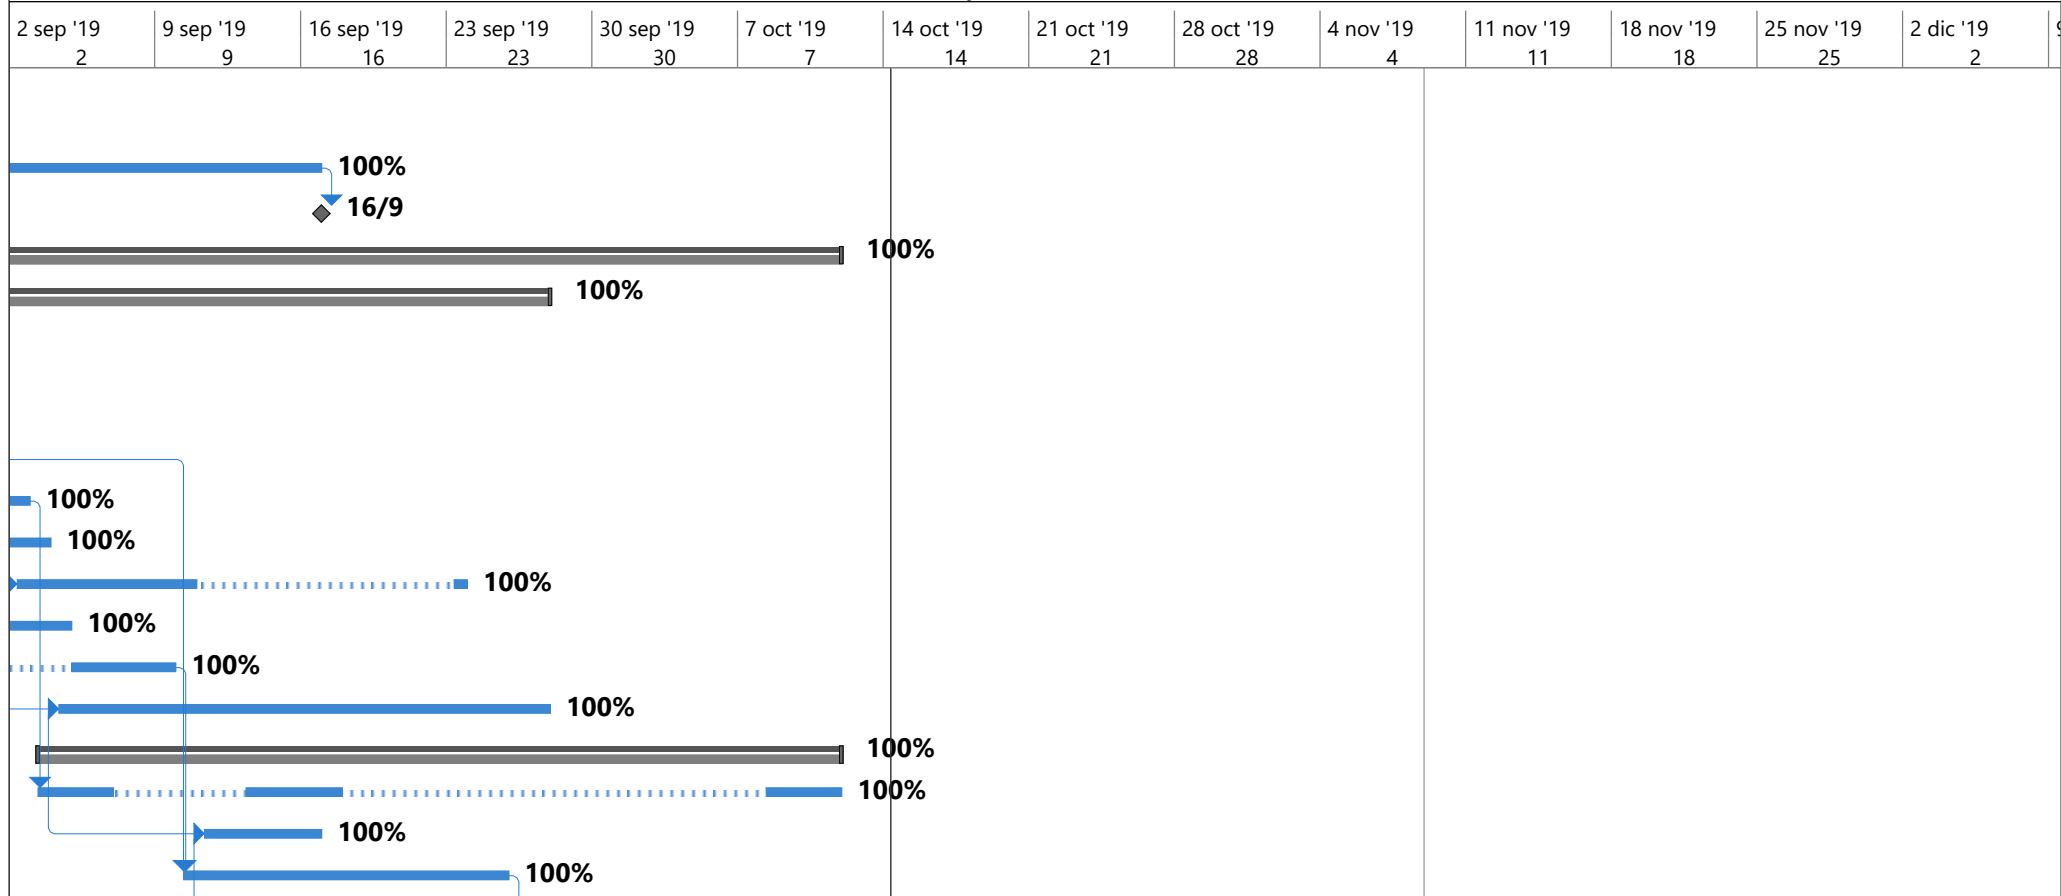















Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020




| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020



| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV106 Abr2020

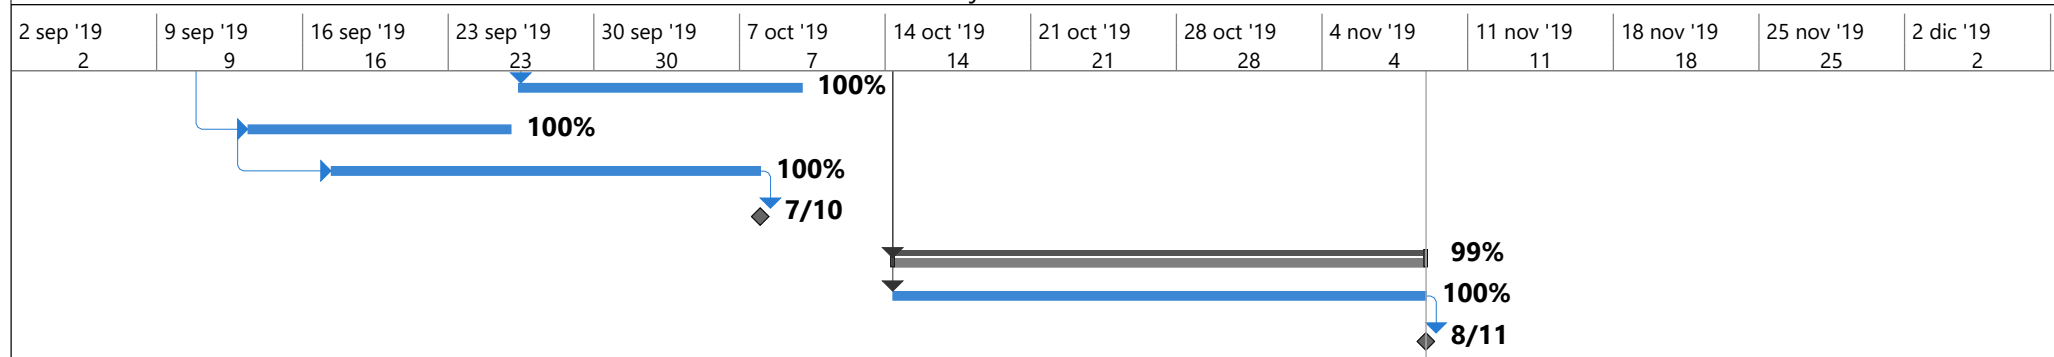

Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana


F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen



Fecha límite

