

















































































Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | |  | Rehabilitación de Redes BPER104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  |  | Adjudicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  |  | Periodo de Adquisiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | |  | Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 |  |  | Polígono 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 |  |  | Instalación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 |  |  | Izado de postes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 |  |  | Cimentaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 |  |  | Retenidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 |  |  | Conexiones y Jumpers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 |  |  | Transformadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 |  |  | Alumbrado Publico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 |  |  | Normalización Suministros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 |  |  | Remoción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 |  |  | Armados de Media Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |








































| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S |
| 45 |  |  | Armados de Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 |  |  | Transformadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 |  |  | Izado de postes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 |  |  | Cierre de Polígono 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 |  |  | Polígono 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 |  |  | Instalación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 |  |  | Izado de postes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 |  |  | Cimentaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 |  |  | Retenidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 |  |  | Conexiones y Jumpers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 |  |  | Transformadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 |  |  | Alumbrado Publico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 |  |  | Normalización Suministros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 |  |  | Remoción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 |  |  | Armados de Media Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |











| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S |
| 65 |  |  | Armados de Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 |  |  | Transformadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 |  |  | Izado de postes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 |  |  | Cierre de Polígono 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | |  | Polígono 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 |  |  | Instalación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 |  |  | Izado de postes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 |  |  | Cimentaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 |  |  | Retenidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 |  |  | Conexiones y Jumpers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 |  |  | Transformadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 |  |  | Alumbrado Publico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 |  |  | Normalización Suministros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | |  | Remoción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 |  |  | Armados de Media Tensión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | D | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| 85 |  |  | Armados de Baja Tensión |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 |  |  | Transformadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 |  |  | Izado de postes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | |  | Cierre de Polígono 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | |  | Cierre de Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 18 jun '18 | | | | | | | 25 jun '18 | | | | | | | 2 jul '18 | | | | | | | 9 jul '18 | | | | | | | 16 jul '18 | | | | | | | 23 jul '18 | | | | | | | 30 jul '18 | | | | | | | 6 aug '18 | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 18 jun '18 | | | | | | | 25 jun '18 | | | | | | | 2 jul '18 | | | | | | | 9 jul '18 | | | | | | | 16 jul '18 | | | | | | | 23 jul '18 | | | | | | | 30 jul '18 | | | | | | | 6 aug '18 | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 18 jun '18 | | | | | | | 25 jun '18 | | | | | | | 2 jul '18 | | | | | | | 9 jul '18 | | | | | | | 16 jul '18 | | | | | | | 23 jul '18 | | | | | | | 30 jul '18 | | | | | | | 6 aug '18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 6 ago '18 | | | | | | | 13 ago '18 | | | | | | | 20 ago '18 | | | | | | | 27 ago '18 | | | | | | | 3 sep '18 | | | | | | | 10 sep '18 | | | | | | | 17 sep '18 | | | | | | | 24 se |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |







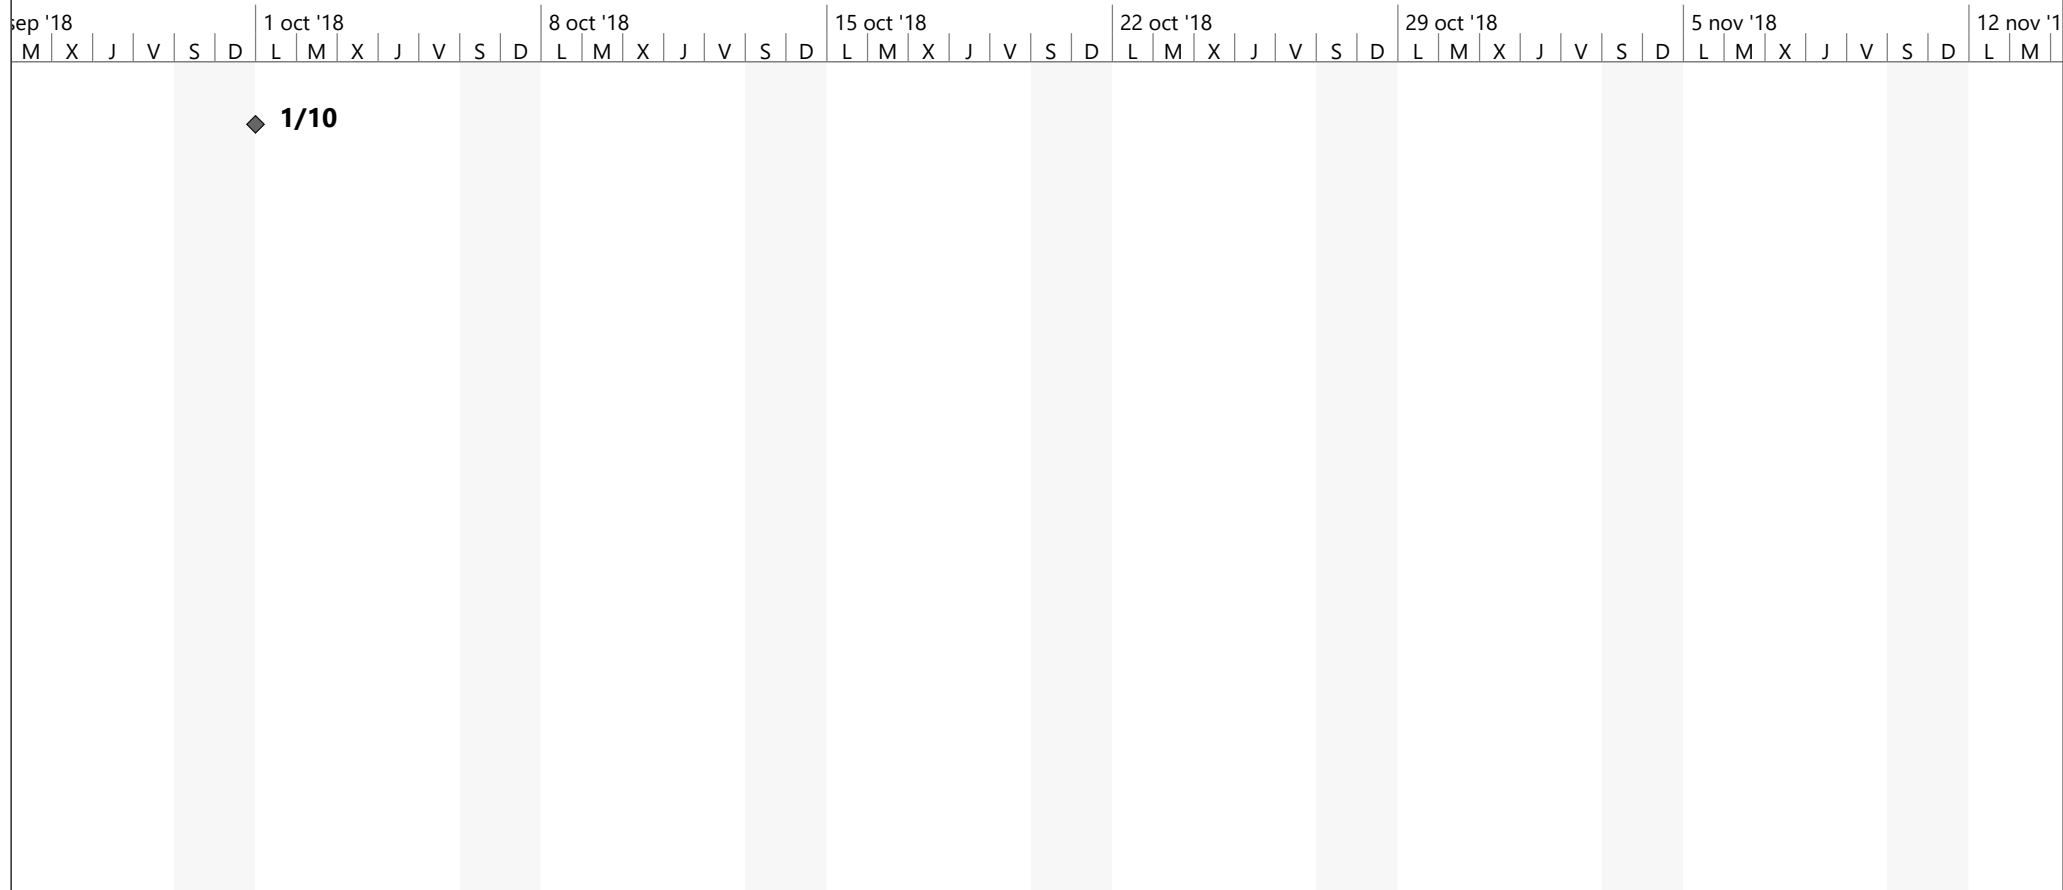



















| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| sep '18 | | | | | | | 1 oct '18 | | | | | | | 8 oct '18 | | | | | | | 15 oct '18 | | | | | | | 22 oct '18 | | | | | | | 29 oct '18 | | | | | | | 5 nov '18 | | | | | | | 12 nov '18 | |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | | | | | | | | |




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

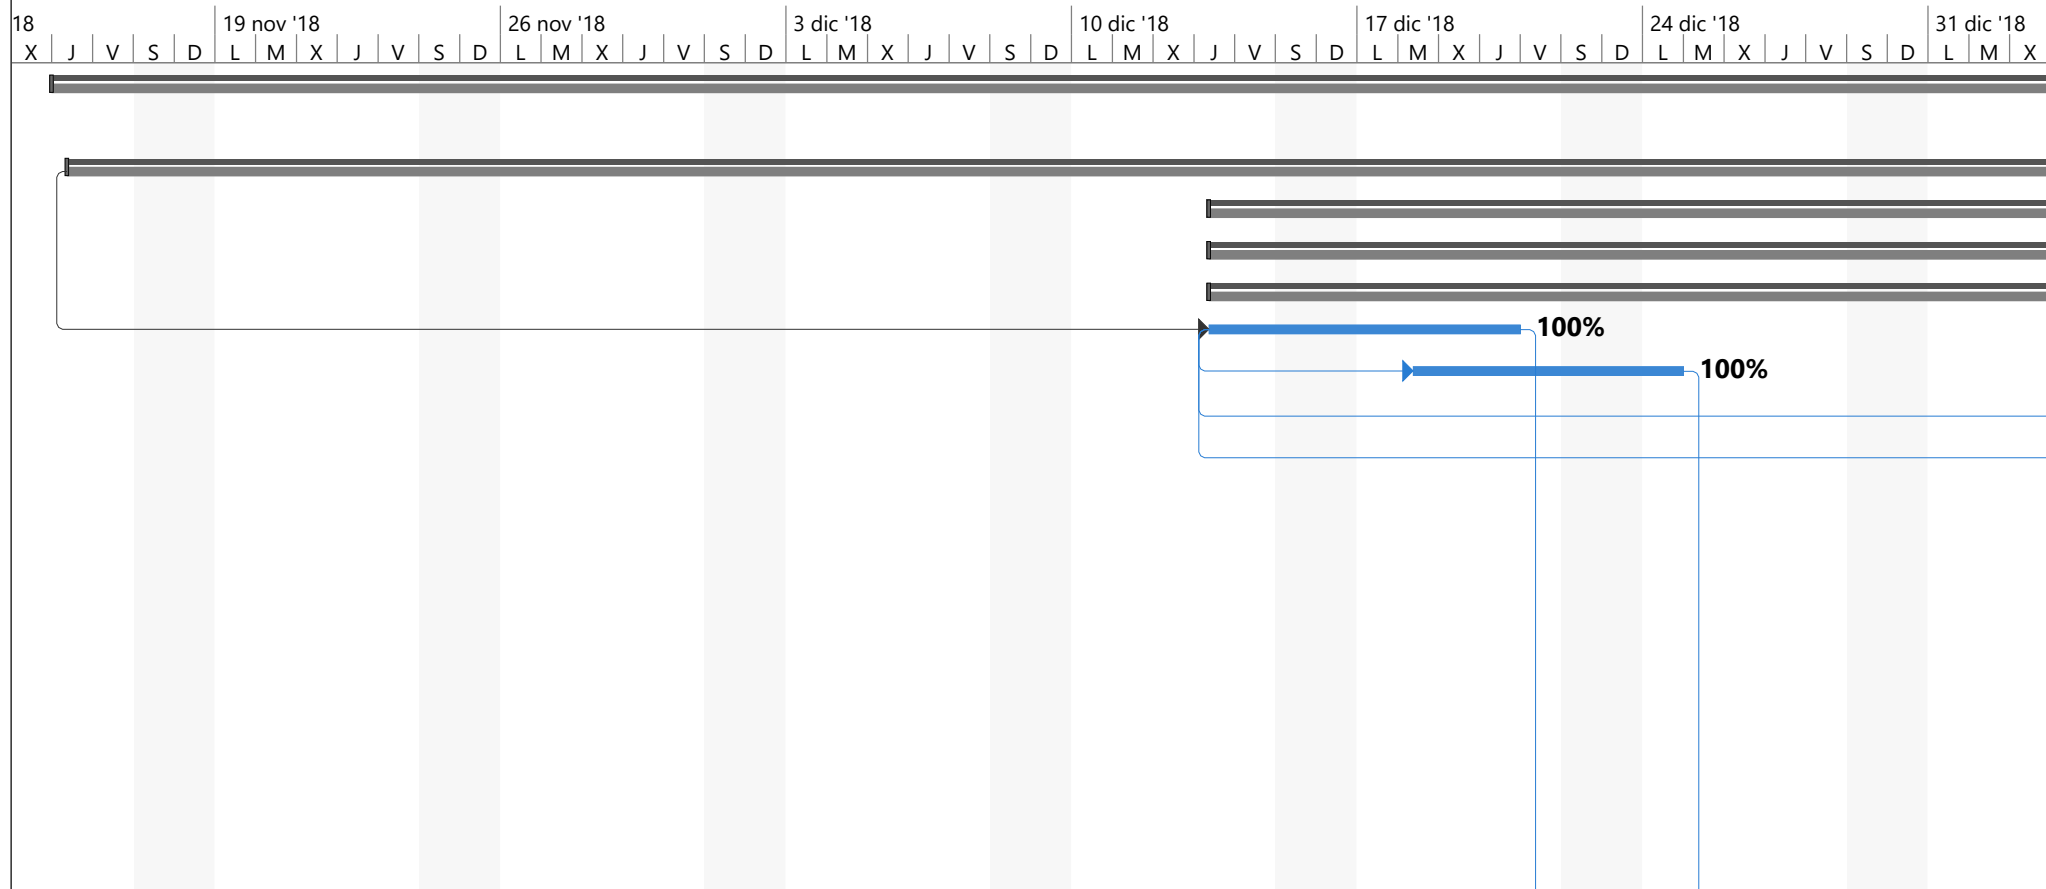




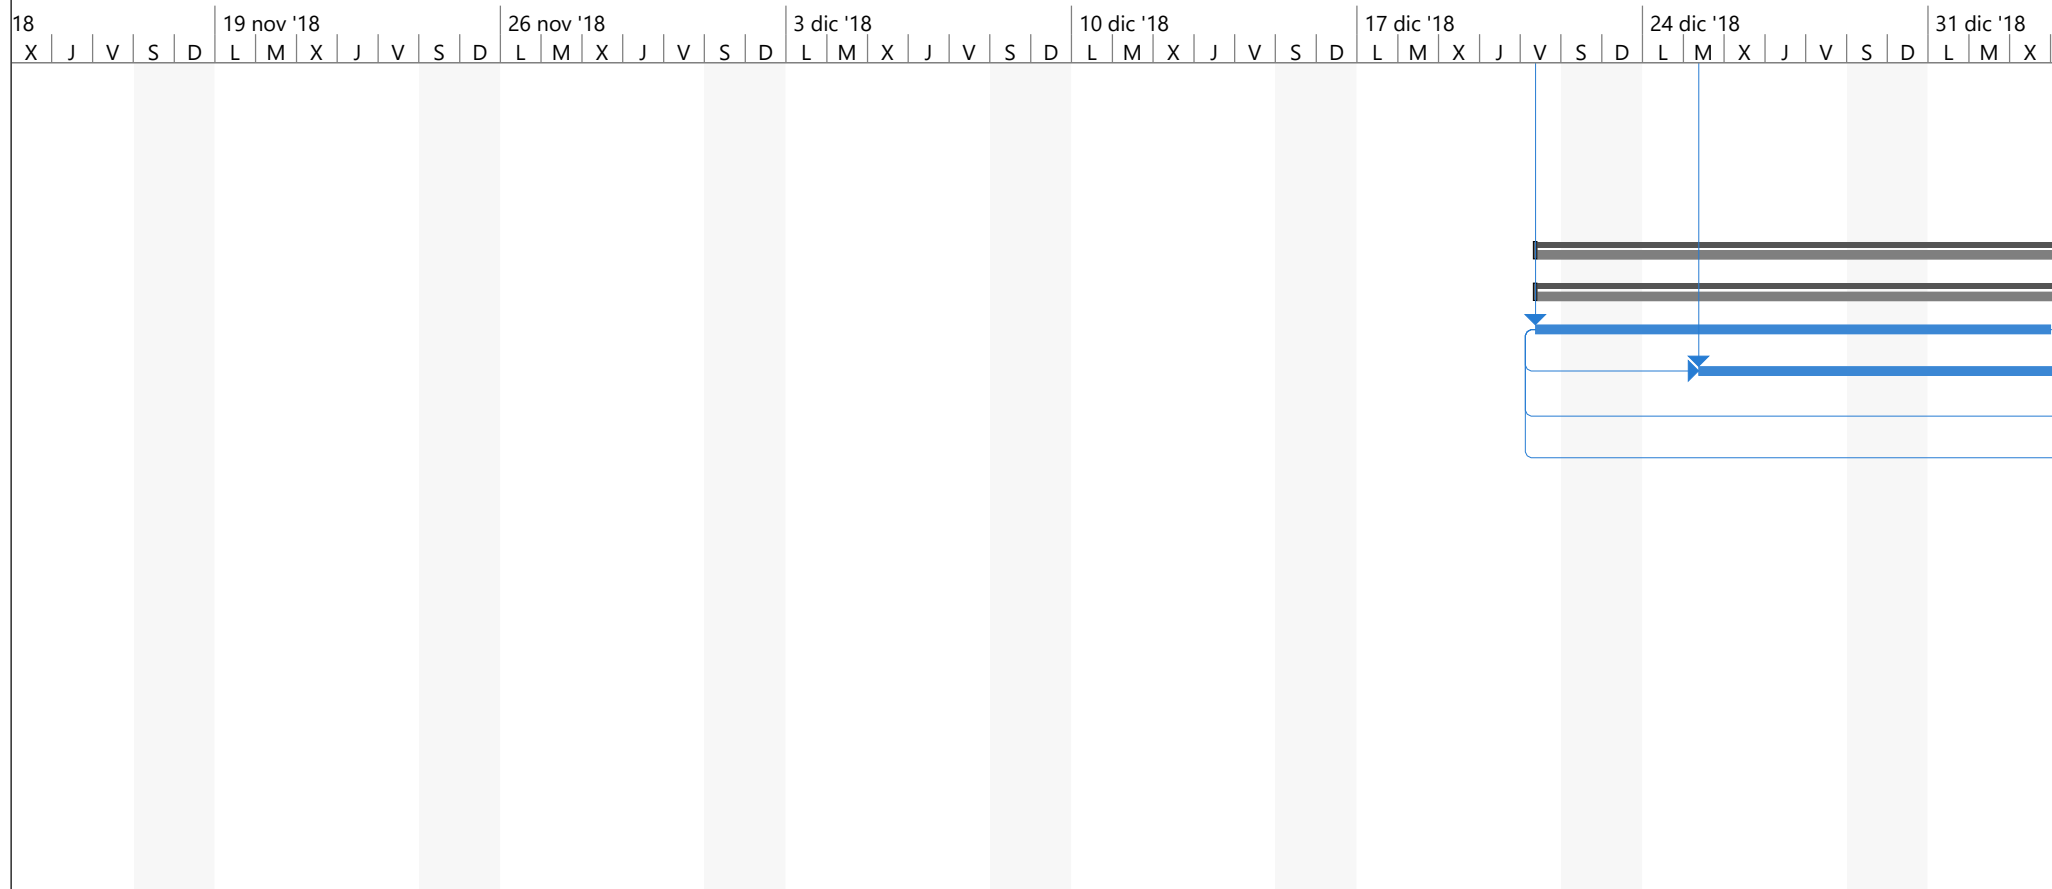


















Calendario de ejecución BPER104 Abr2020



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 18 | | | | | 19 nov '18 | | | | | 26 nov '18 | | | | | 3 dic '18 | | | | | 10 dic '18 | | | | | 17 dic '18 | | | | | 24 dic '18 | | | | | 31 dic '18 | | | | |
|----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|--|--|
| 18 | | | | | 19 nov '18 | | | | | 26 nov '18 | | | | | 3 dic '18 | | | | | 10 dic '18 | | | | | 17 dic '18 | | | | | 24 dic '18 | | | | | 31 dic '18 | | |
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | | |




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

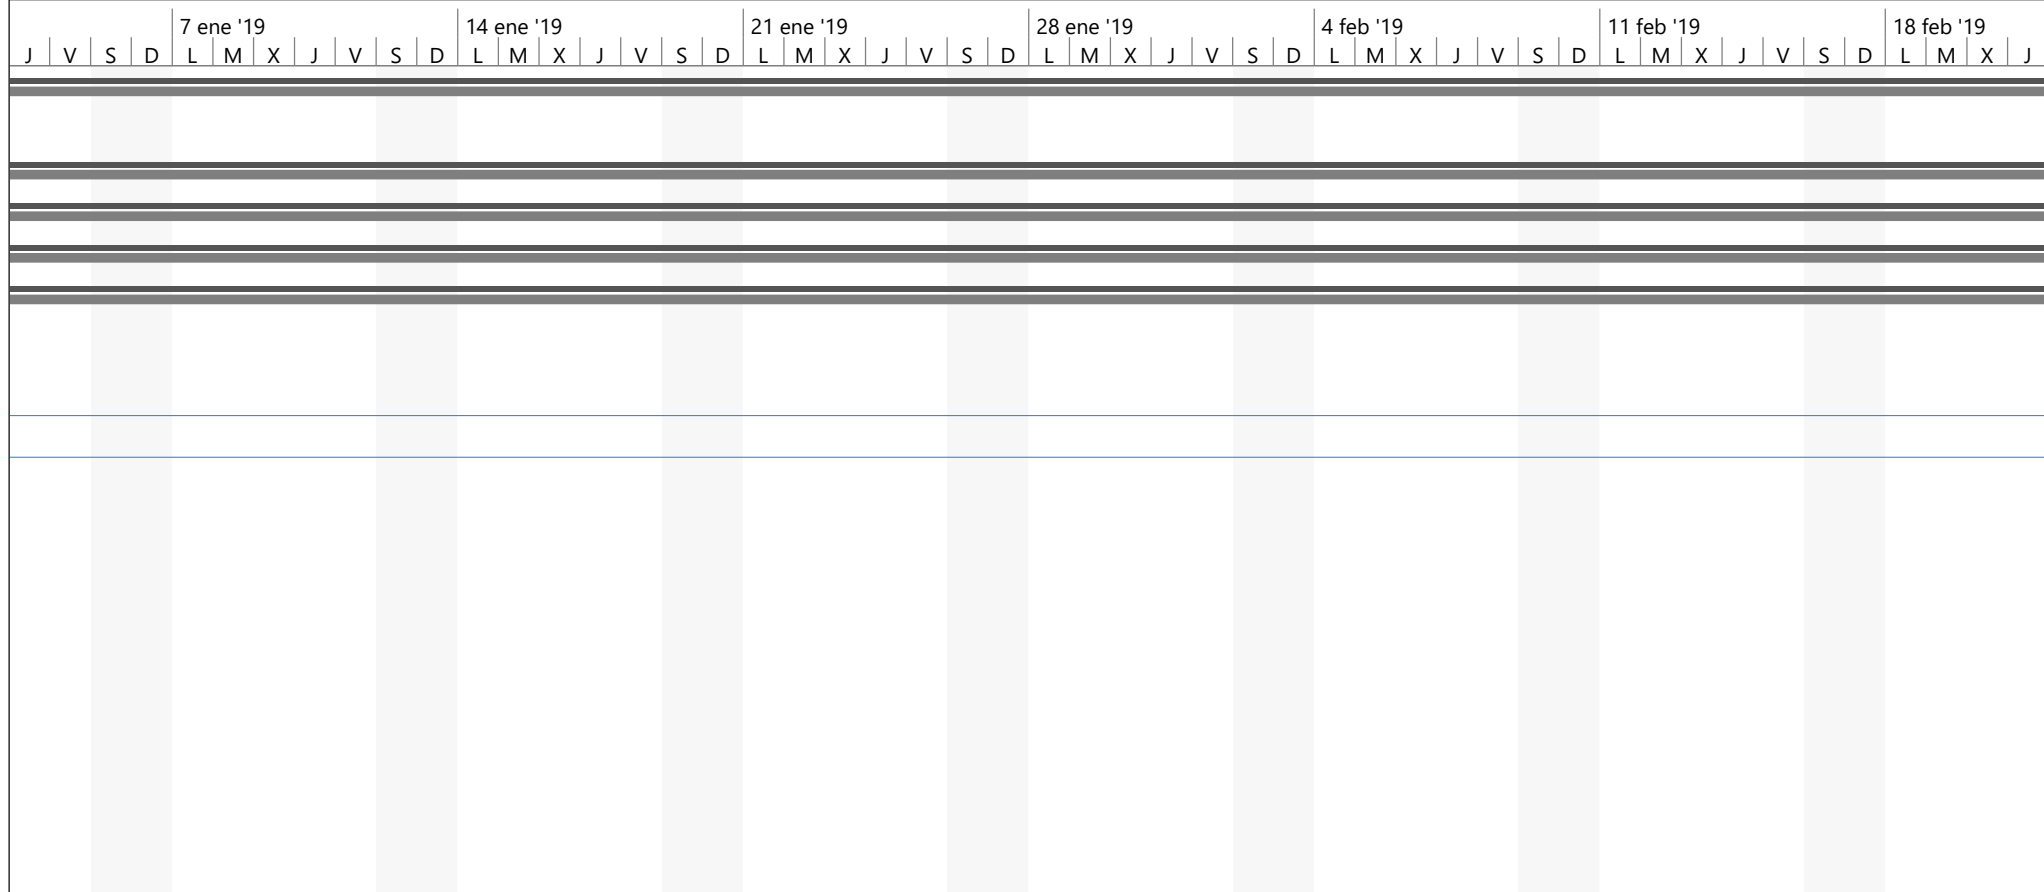


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

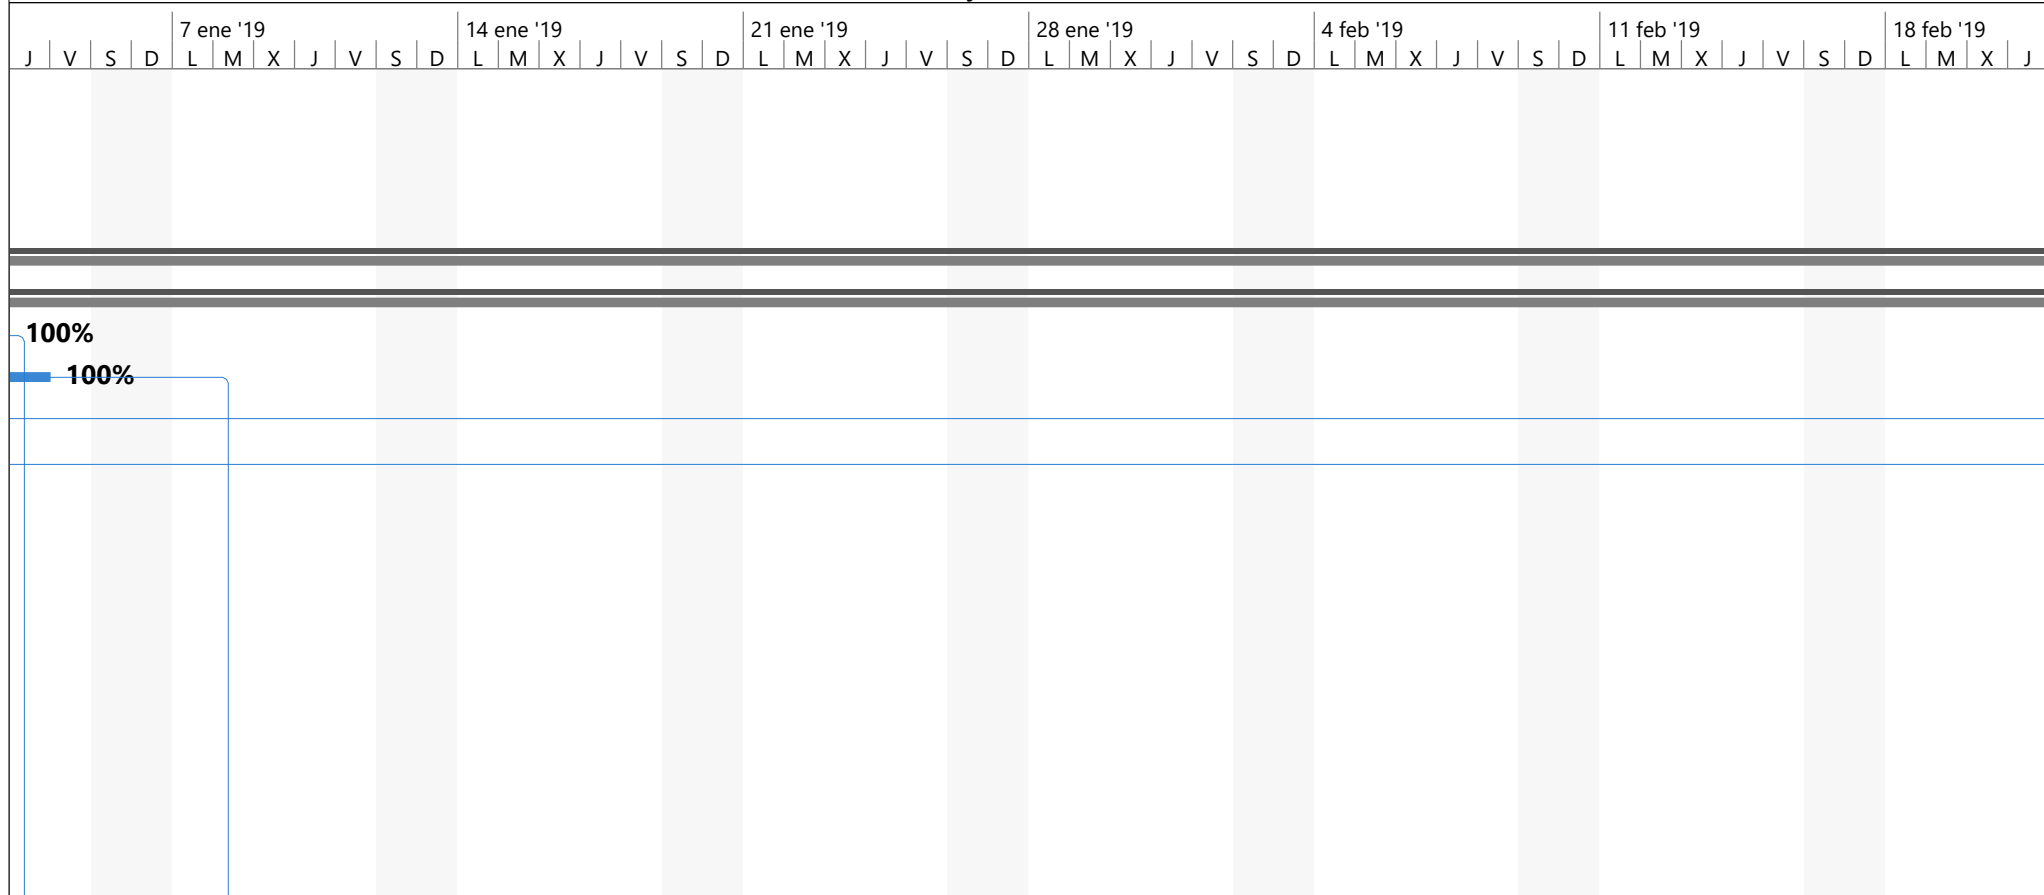

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

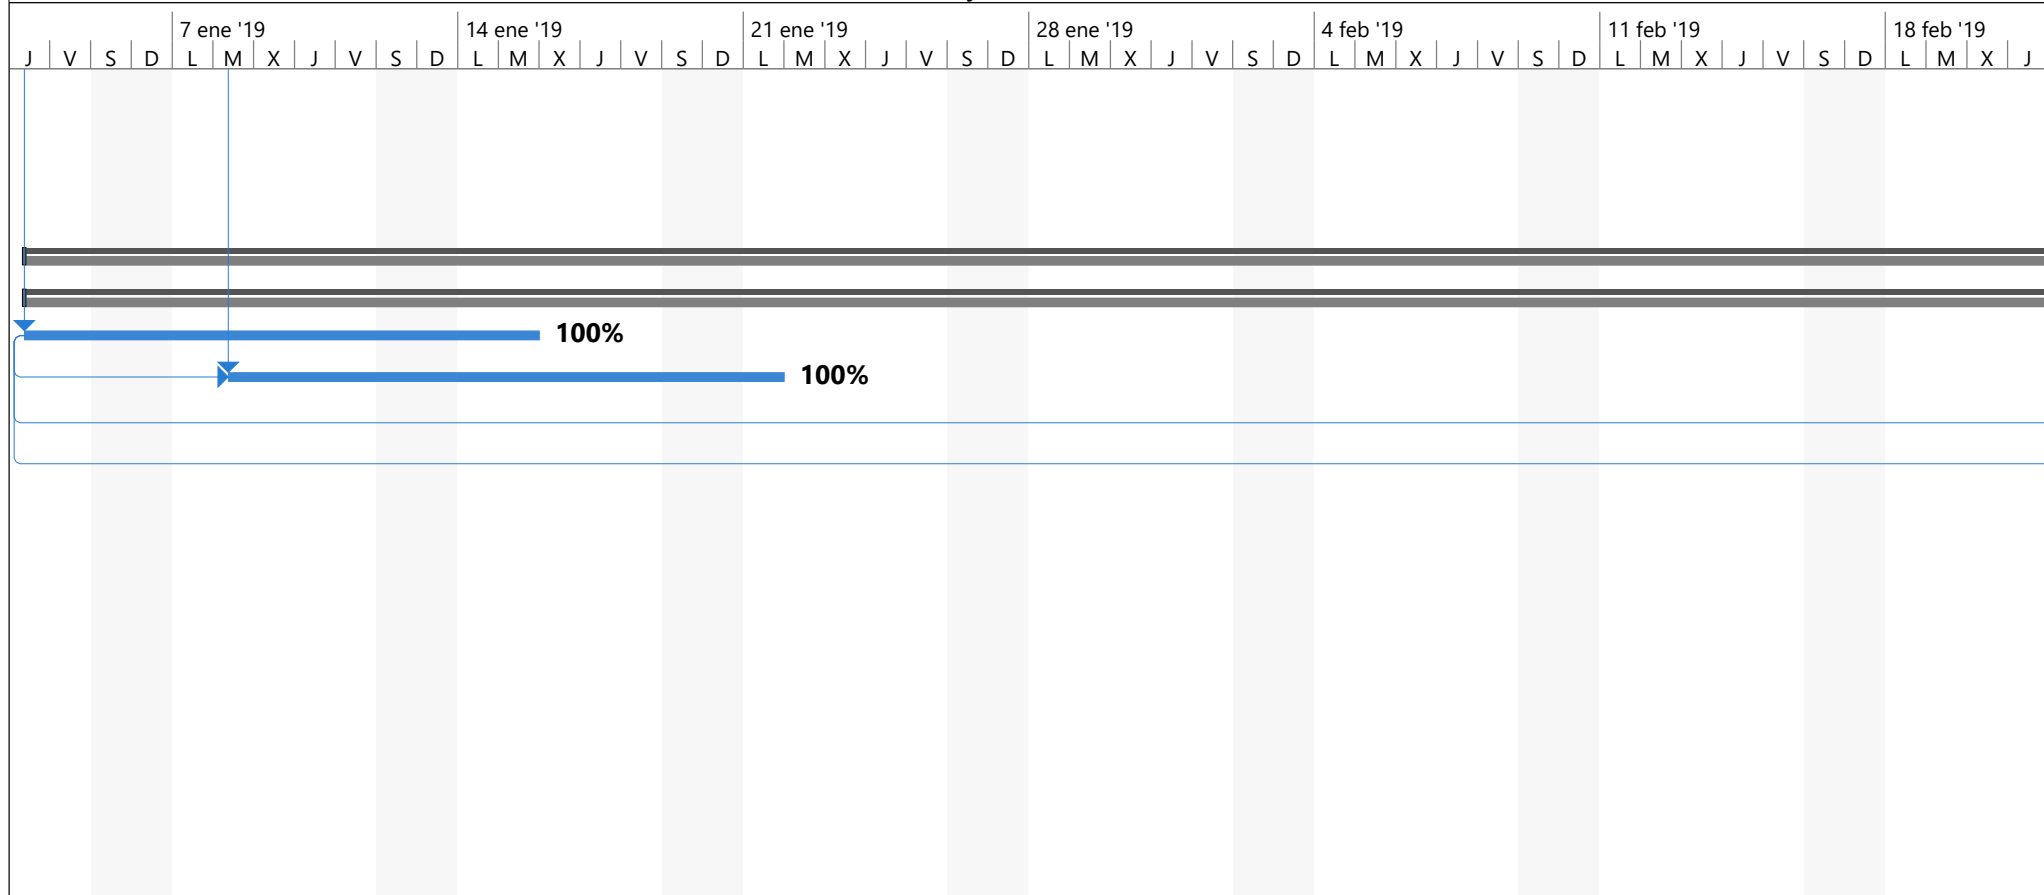

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| | | | | 7 ene '19 | | | | 14 ene '19 | | | | 21 ene '19 | | | | 28 ene '19 | | | | 4 feb '19 | | | | 11 feb '19 | | | | 18 feb '19 | | | |
|---|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

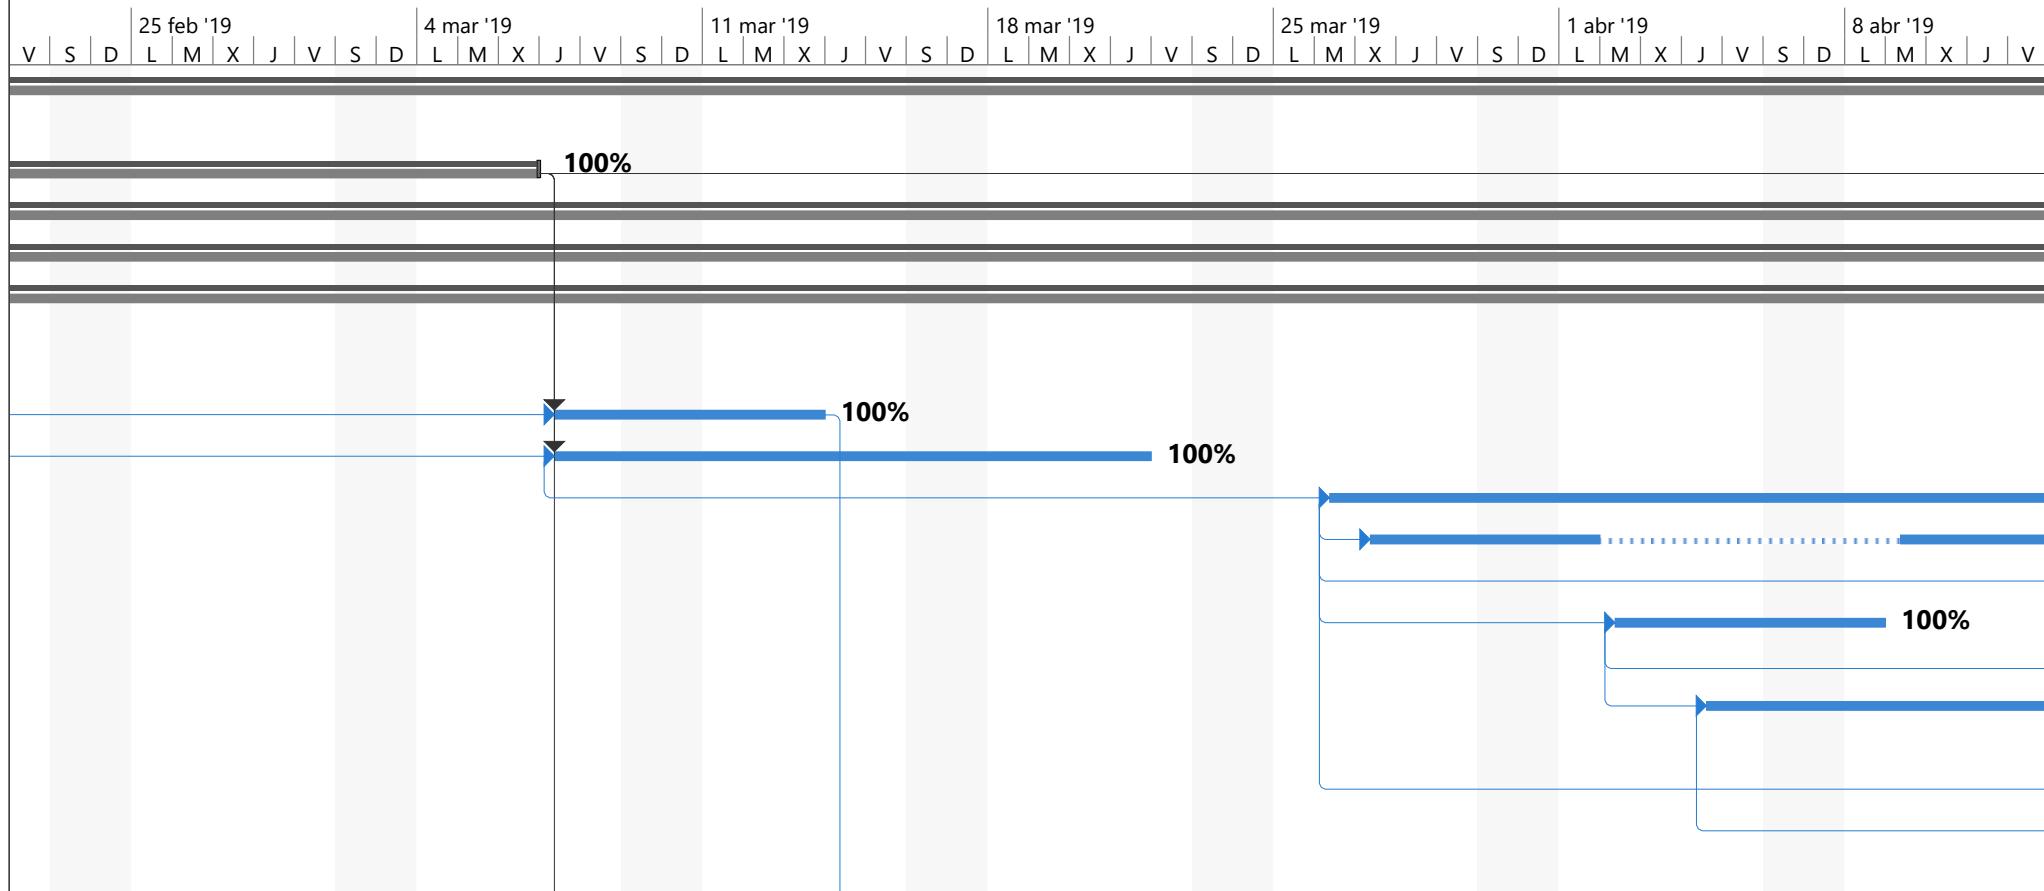


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

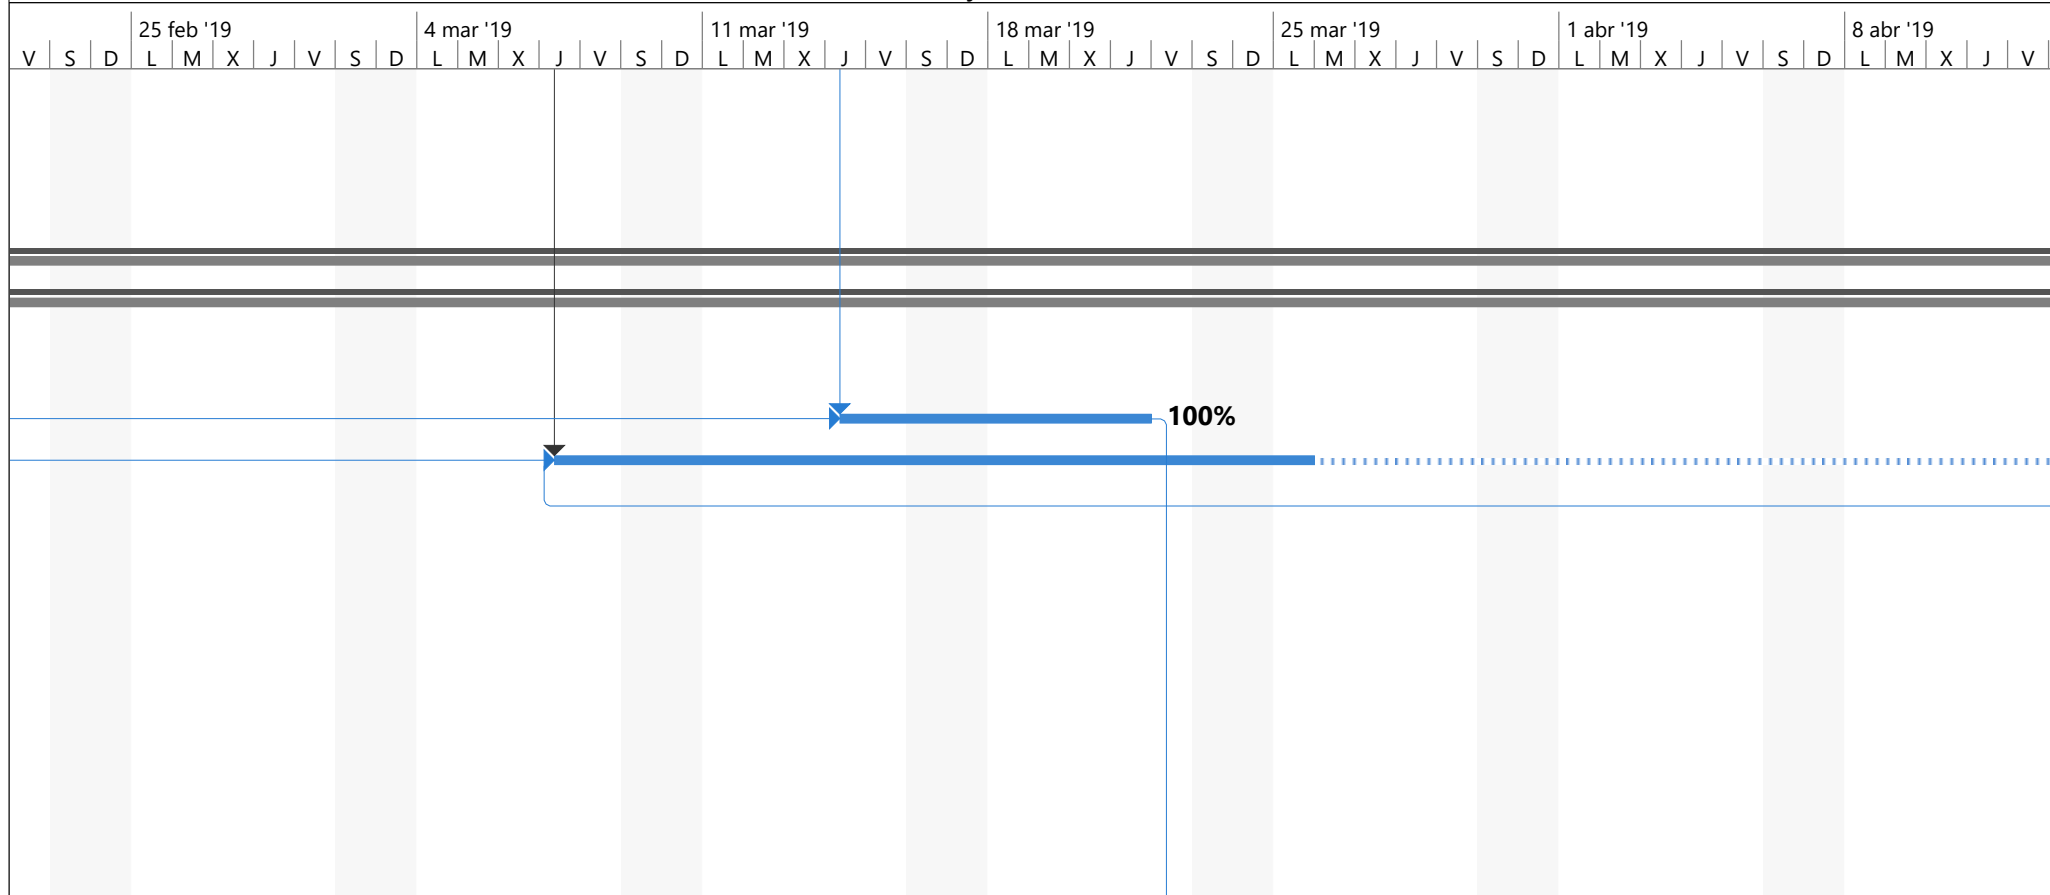

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

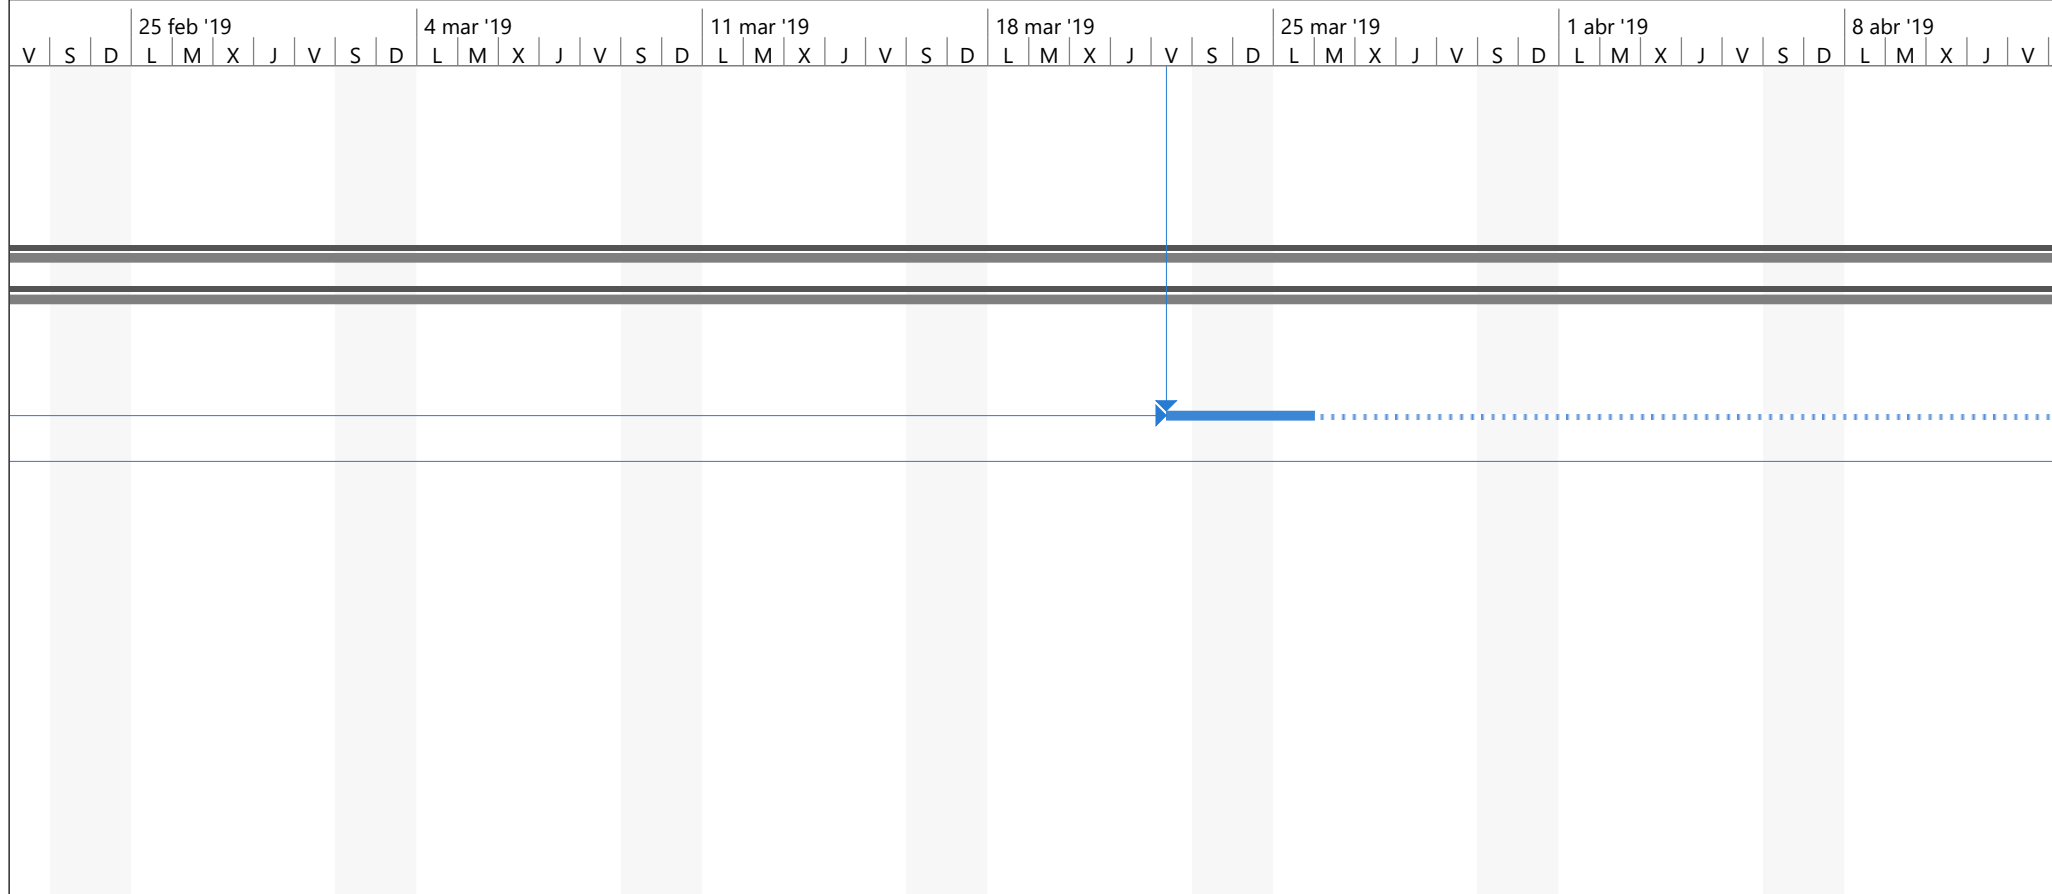




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020


| | | | 25 feb '19 | | | | | 4 mar '19 | | | | | 11 mar '19 | | | | | 18 mar '19 | | | | | 25 mar '19 | | | | | 1 abr '19 | | | | | 8 abr '19 | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|--|--|
| V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

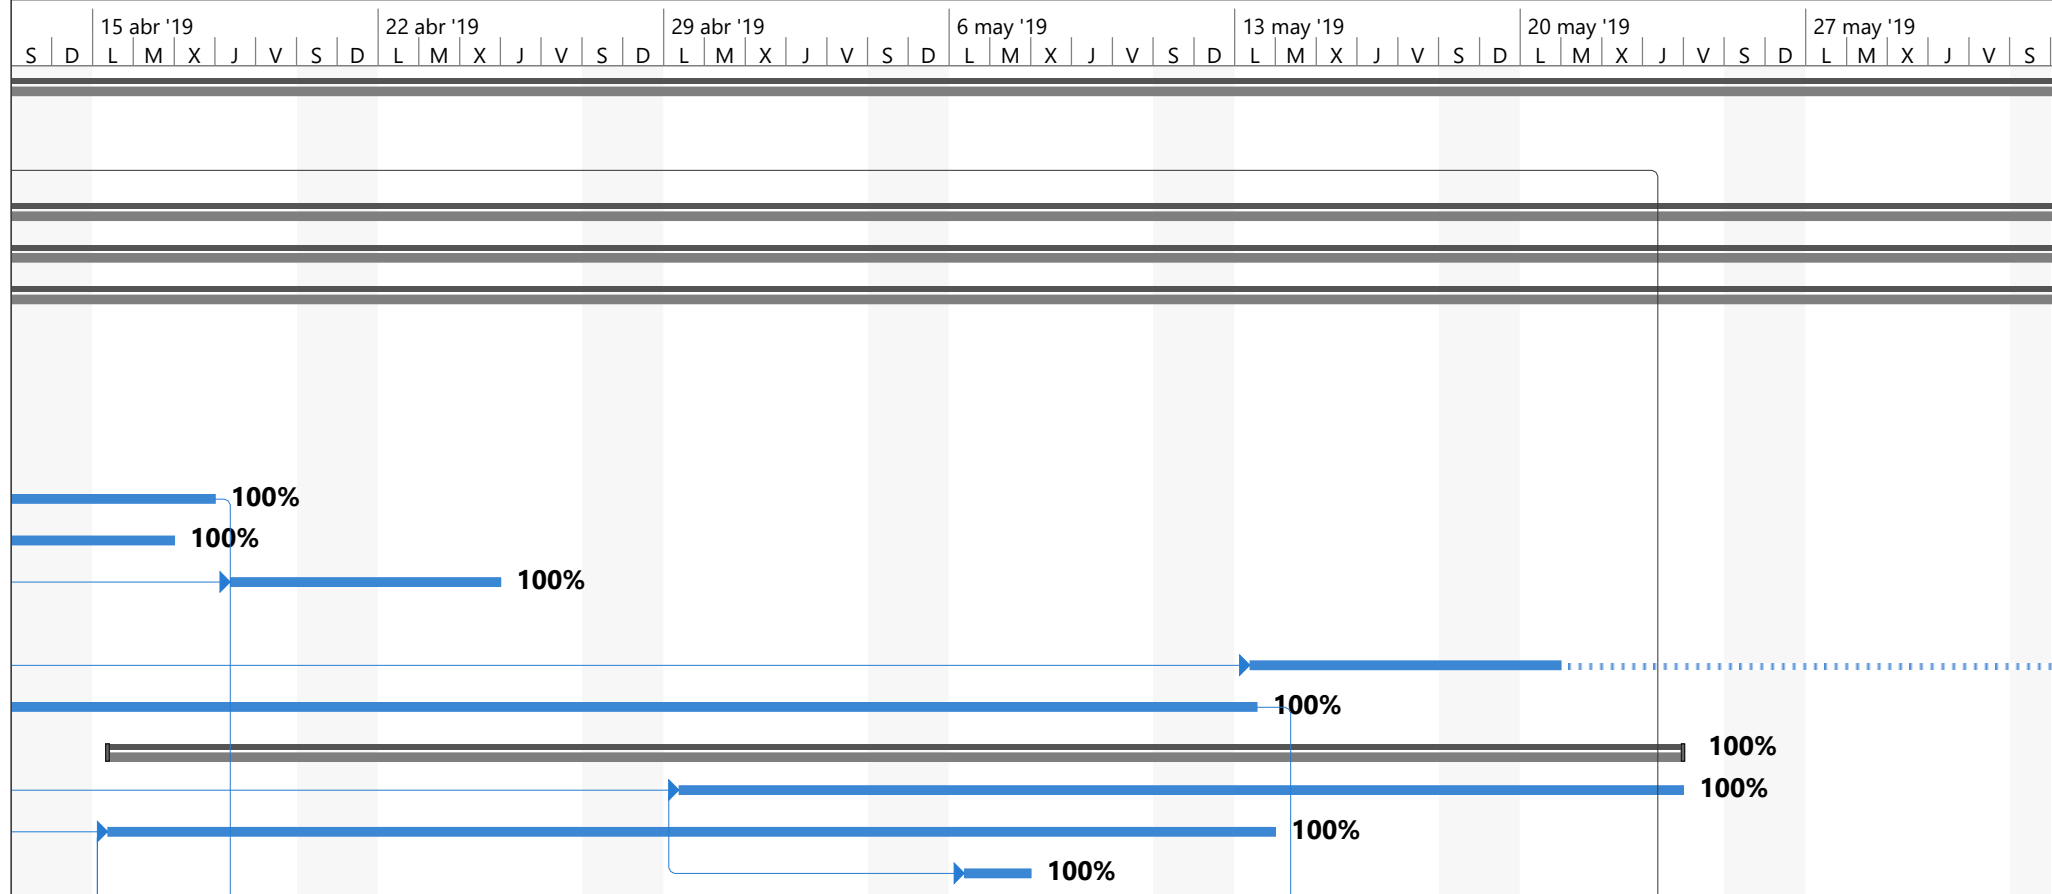


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |



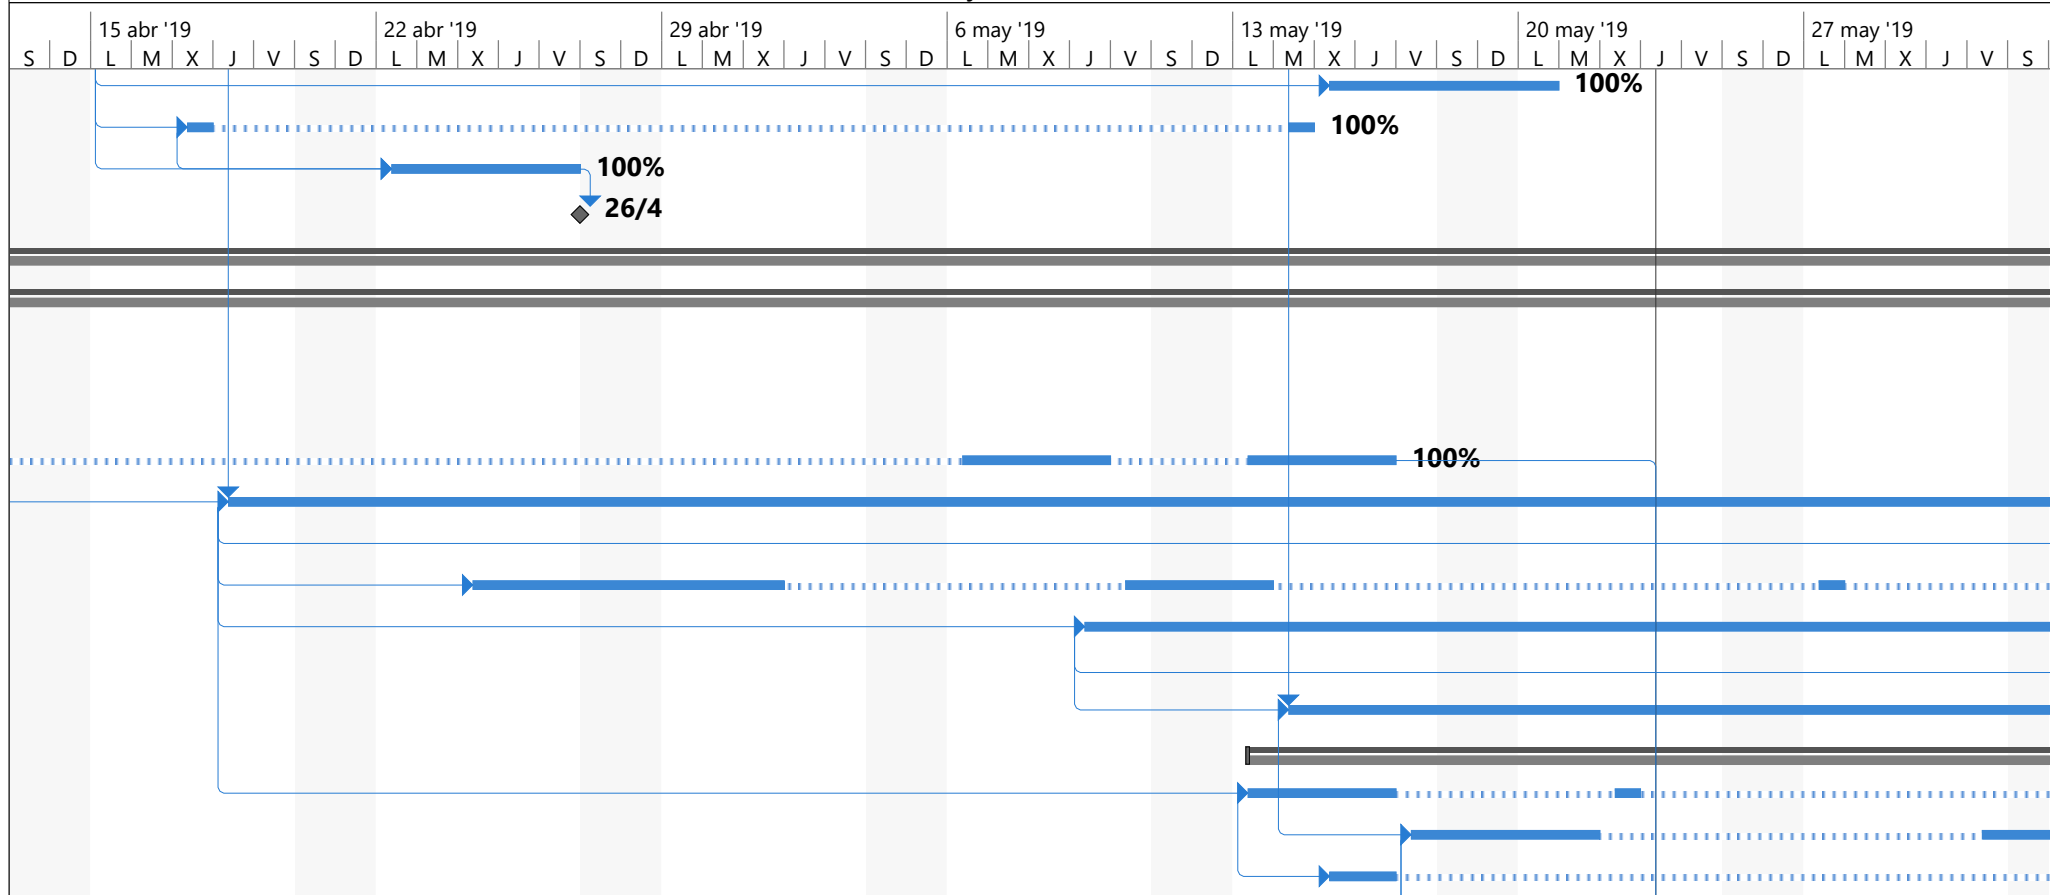





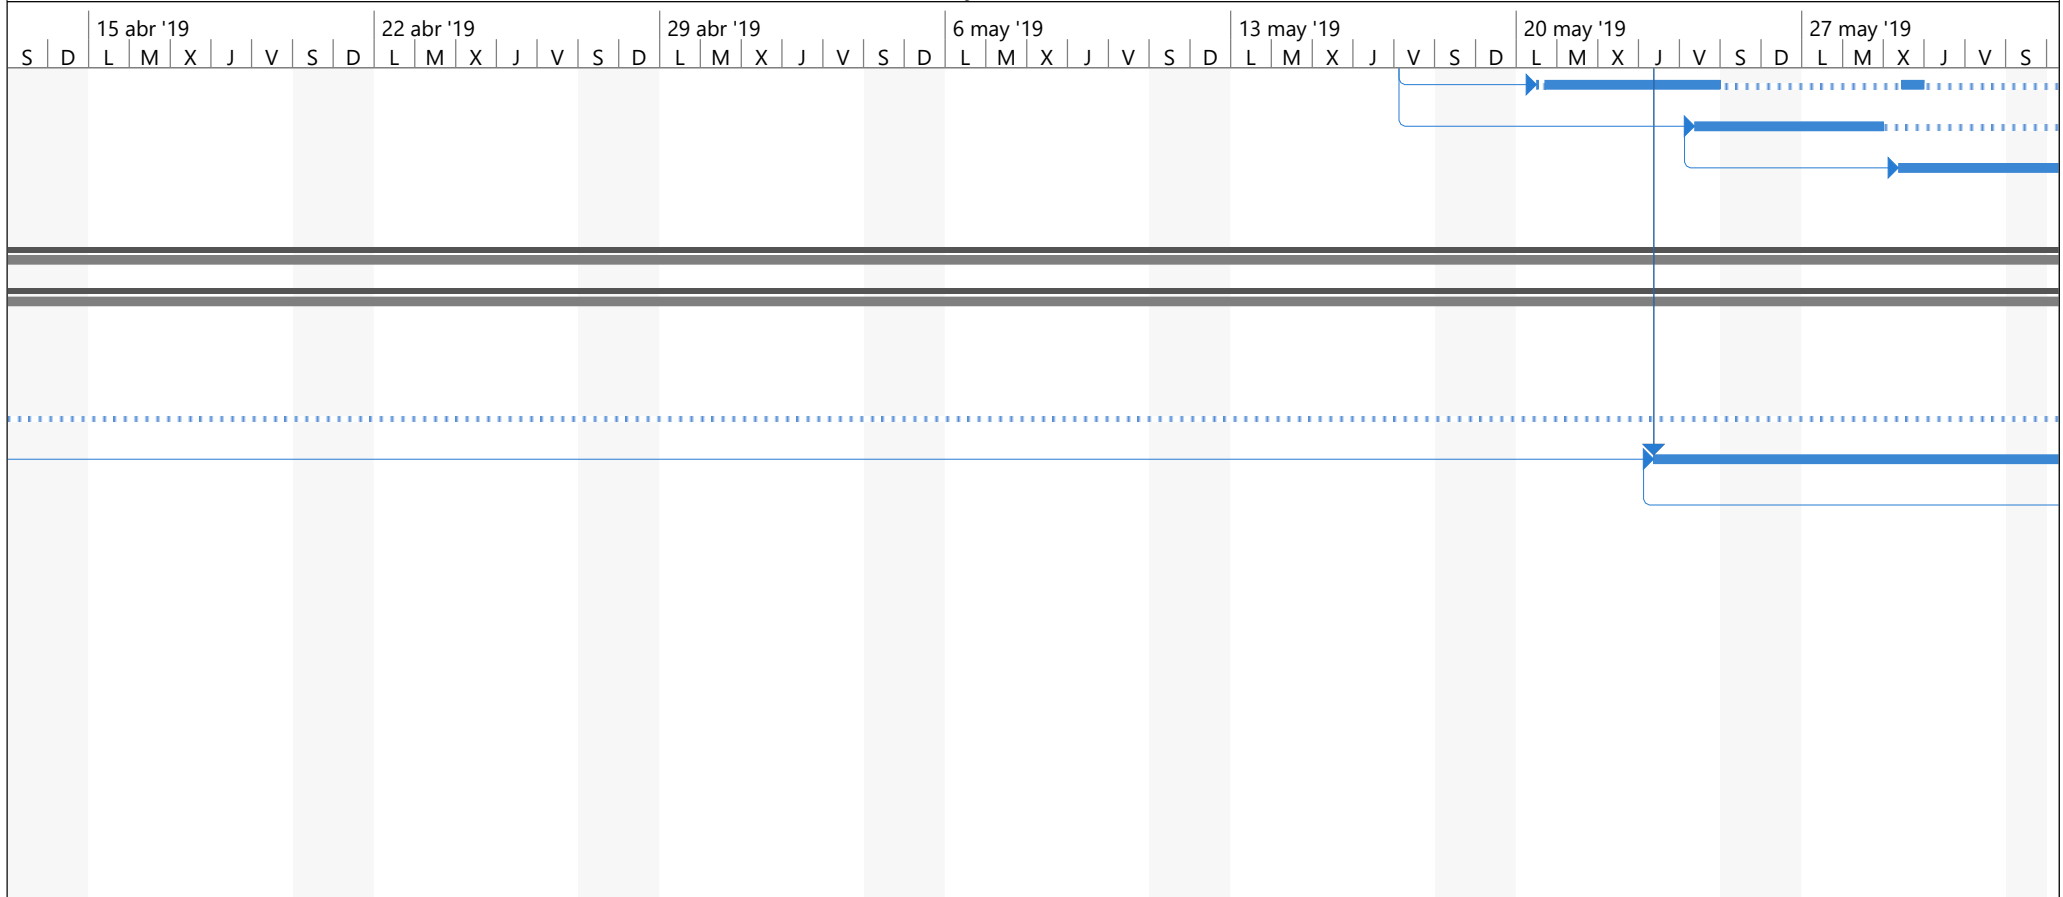















Calendario de ejecución BPER104 Abr2020



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de ejecución BPER104 Abr2020




| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020


[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

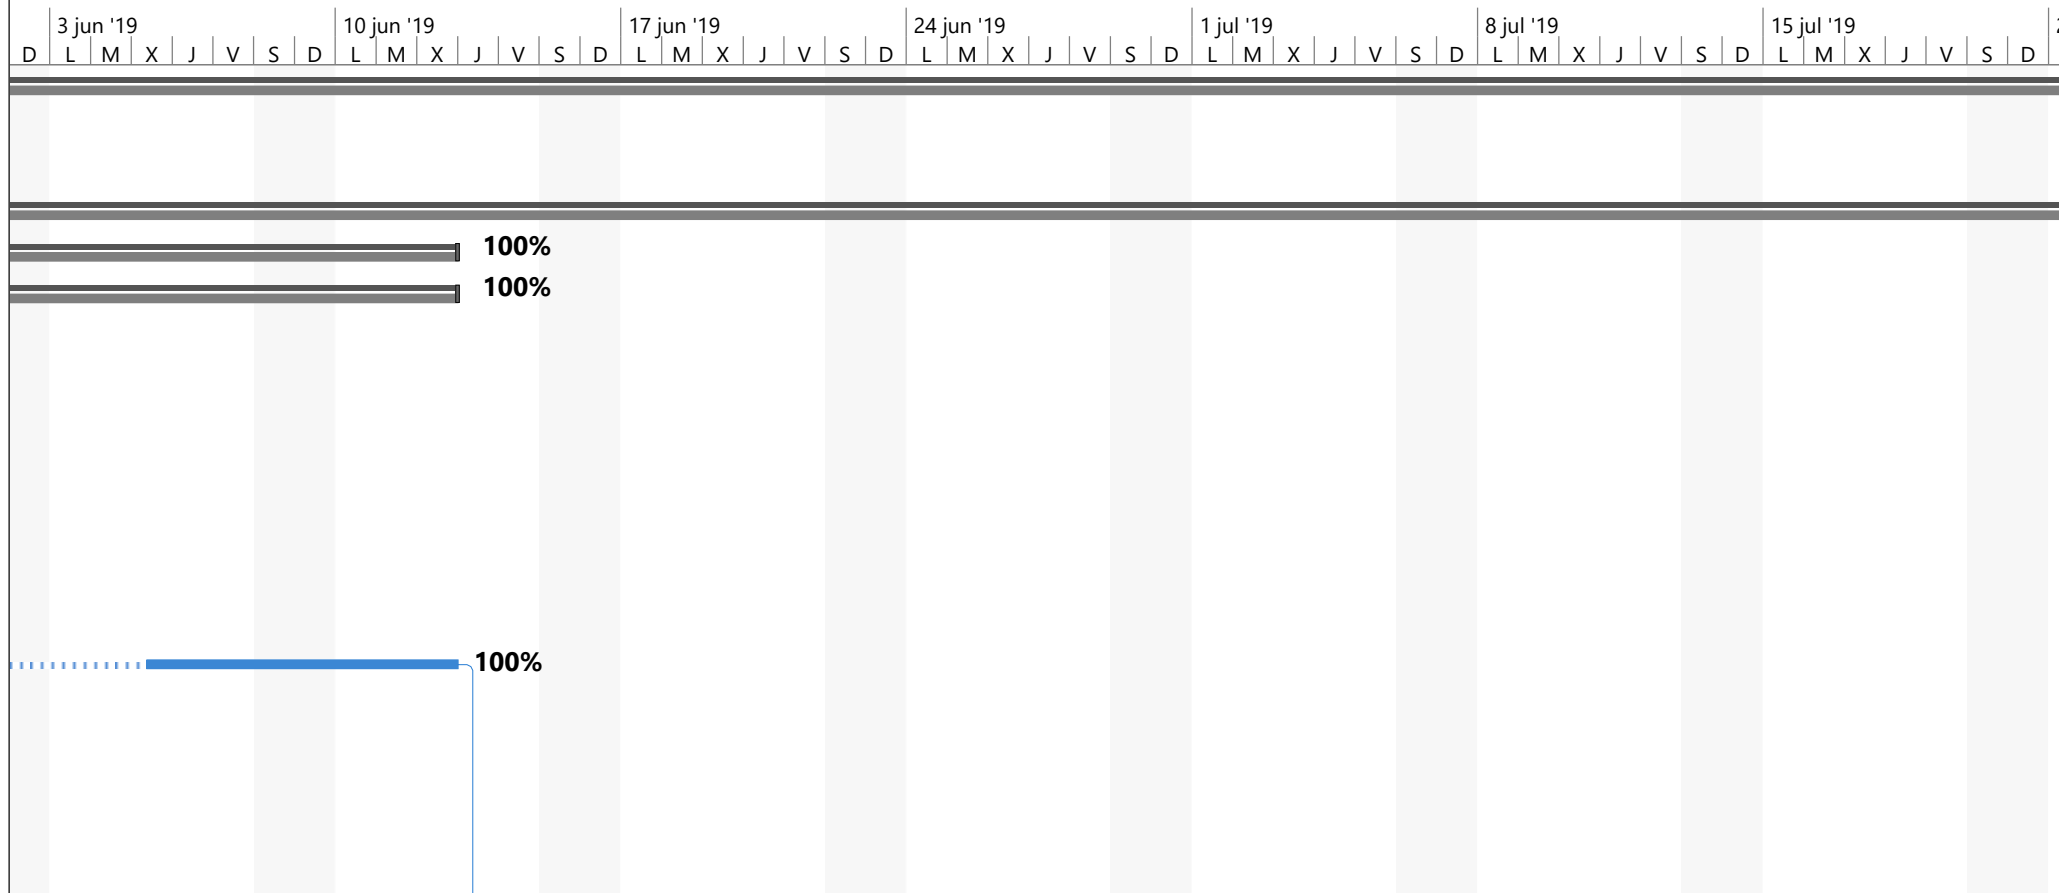


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

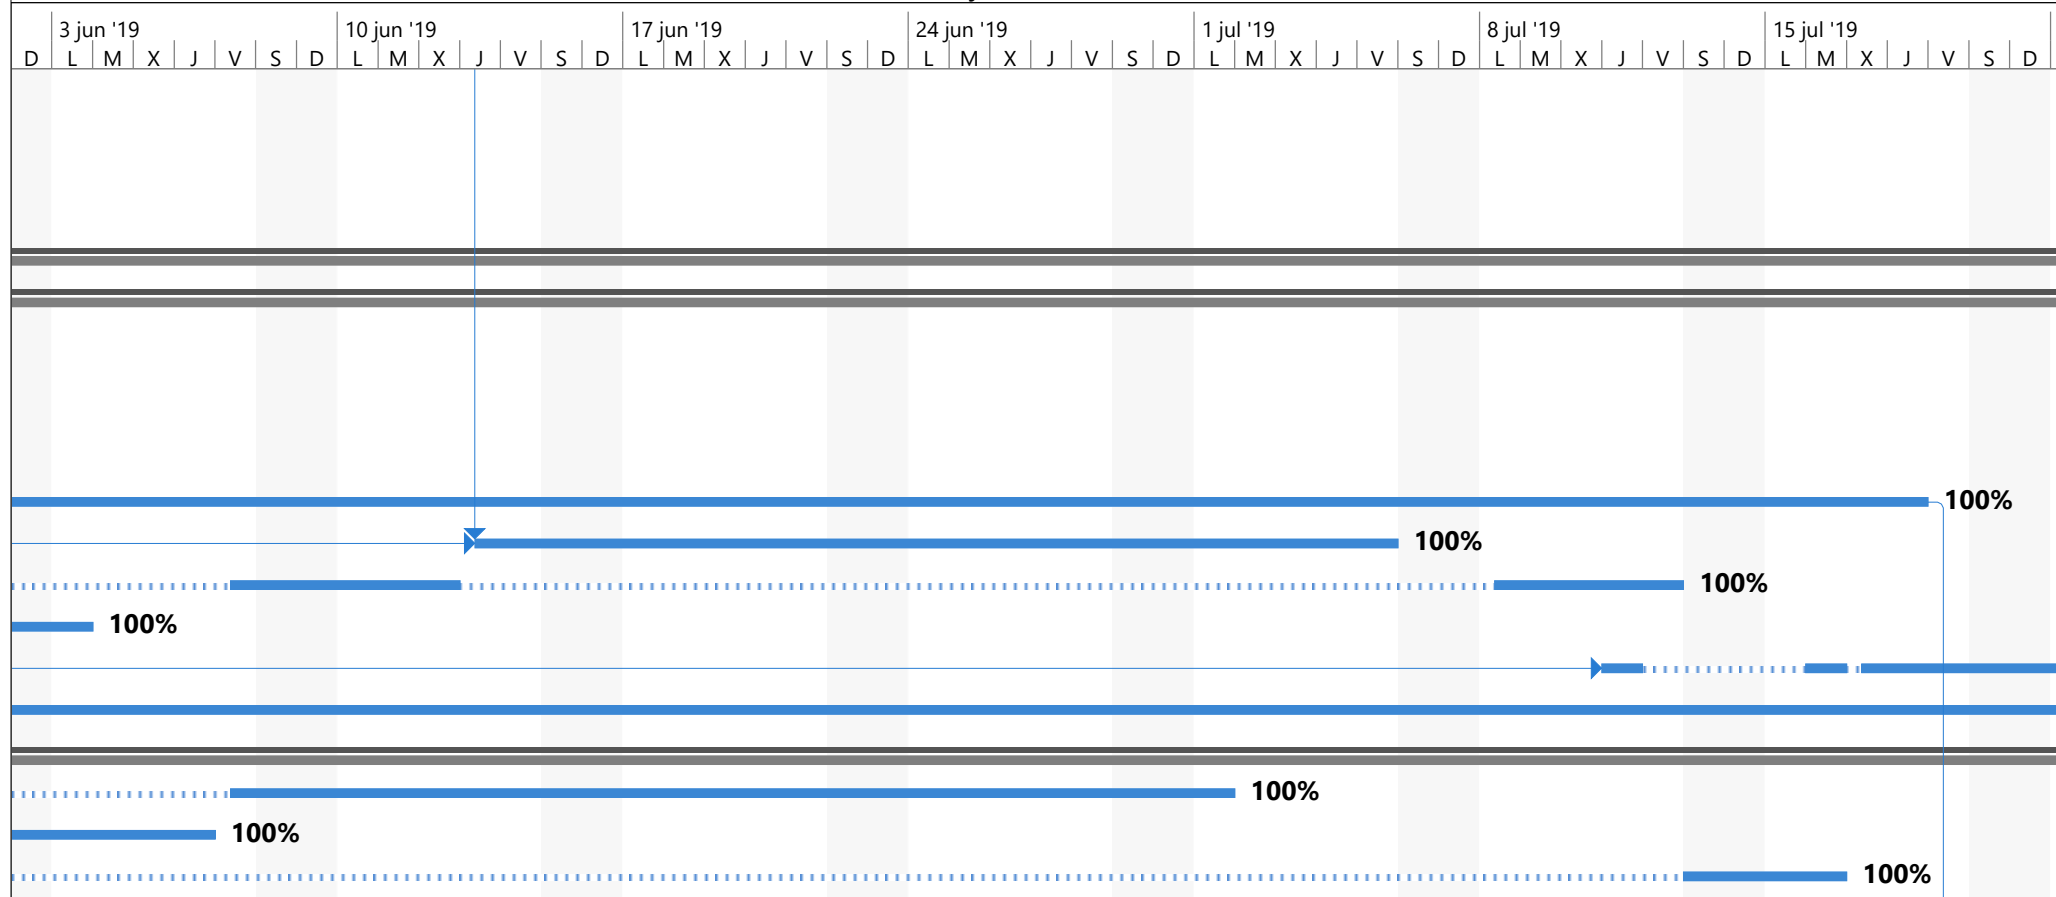

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

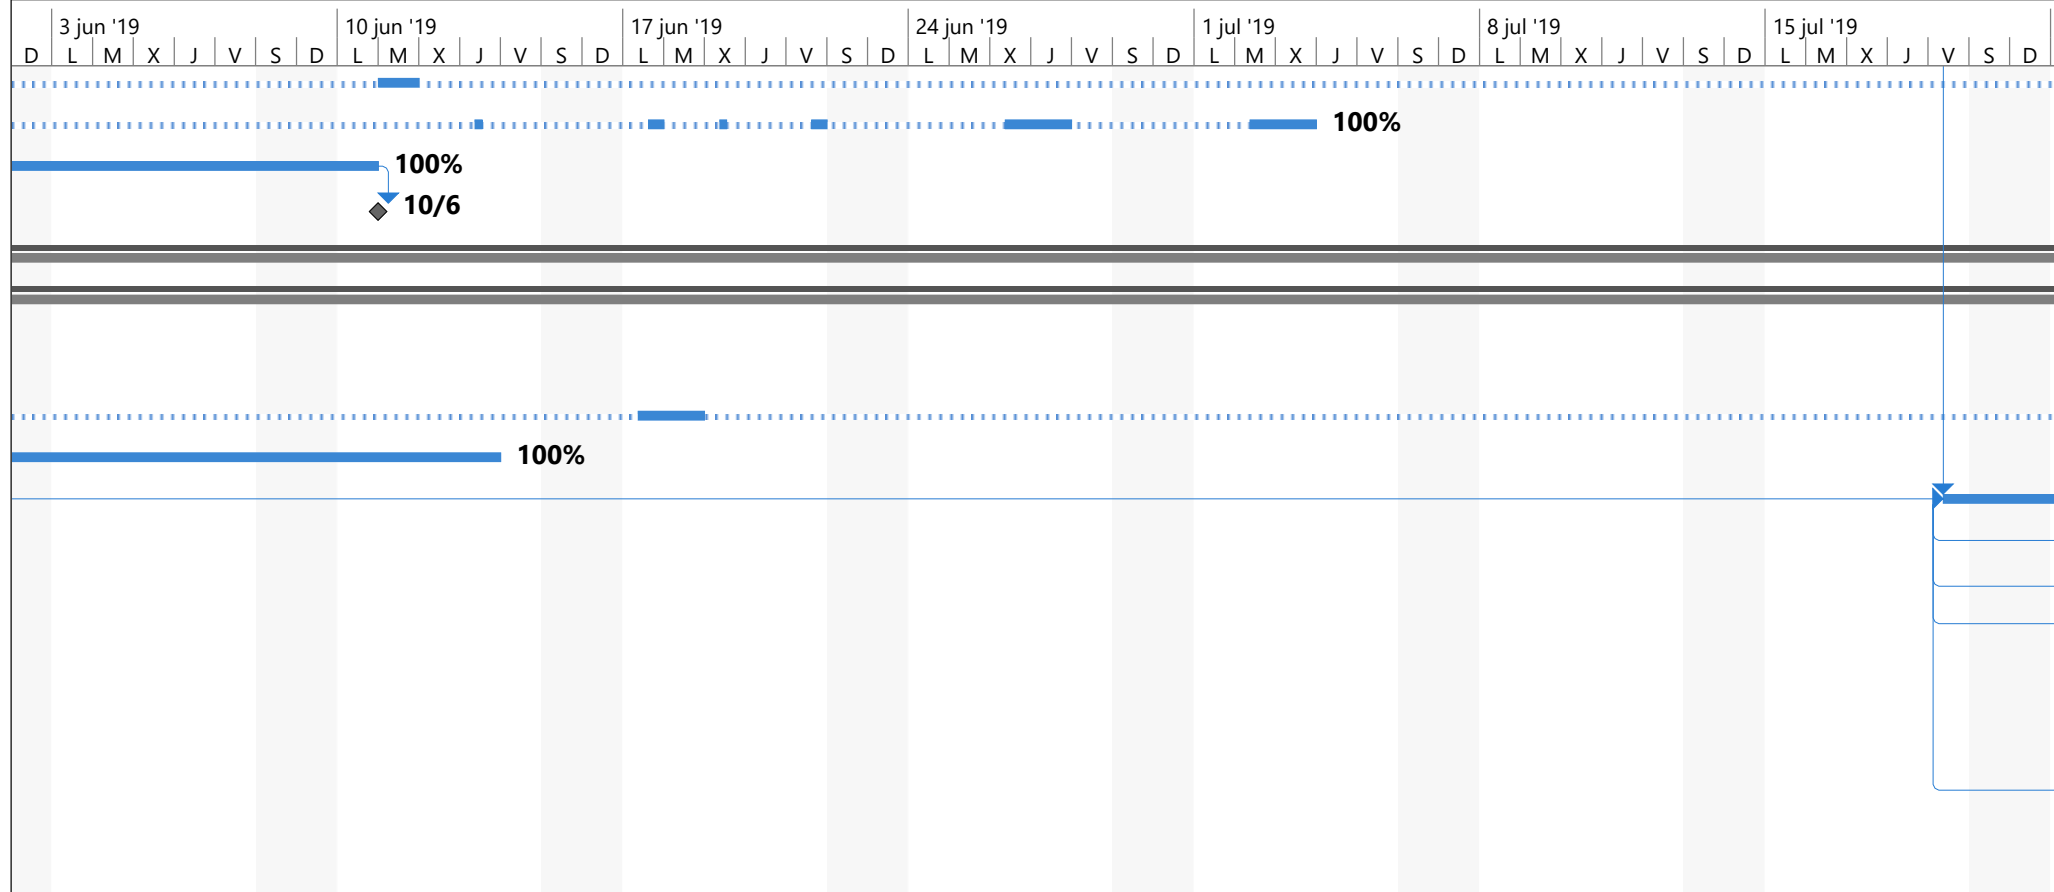

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 22 jul '19 | | | | | | | 29 jul '19 | | | | | | | 5 ago '19 | | | | | | | 12 ago '19 | | | | | | | 19 ago '19 | | | | | | | 26 ago '19 | | | | | | | 2 sep '19 | | | | | | | 9 sep '19 |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | |

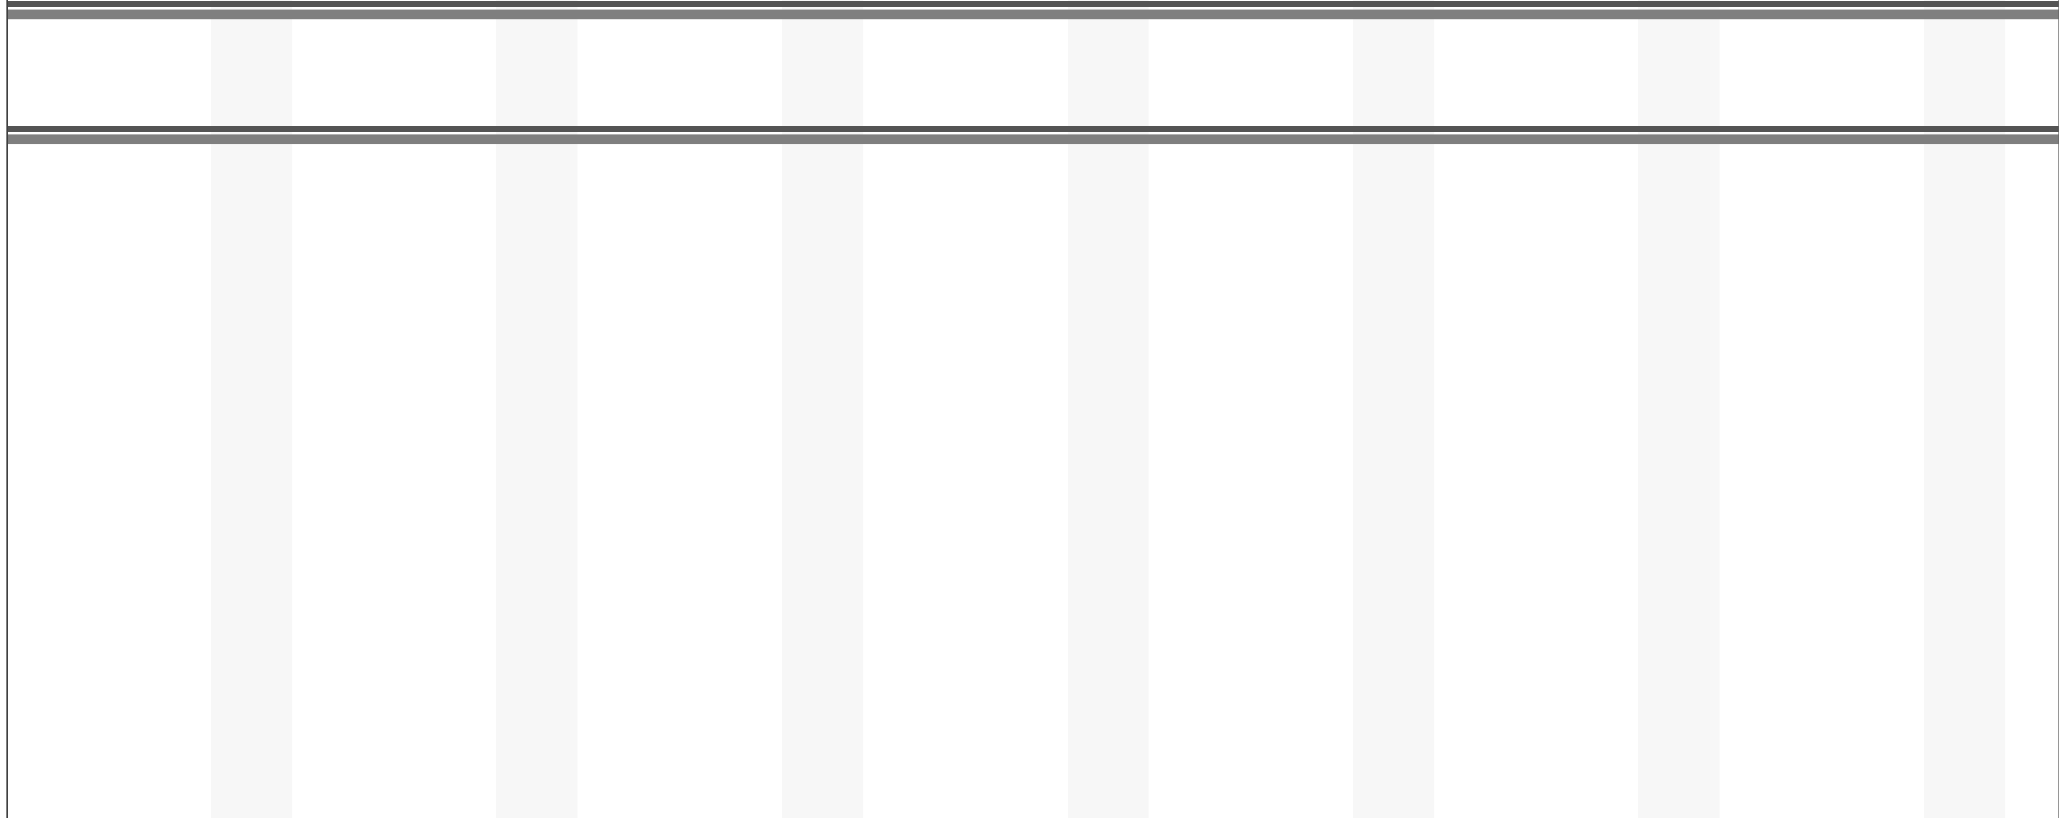


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

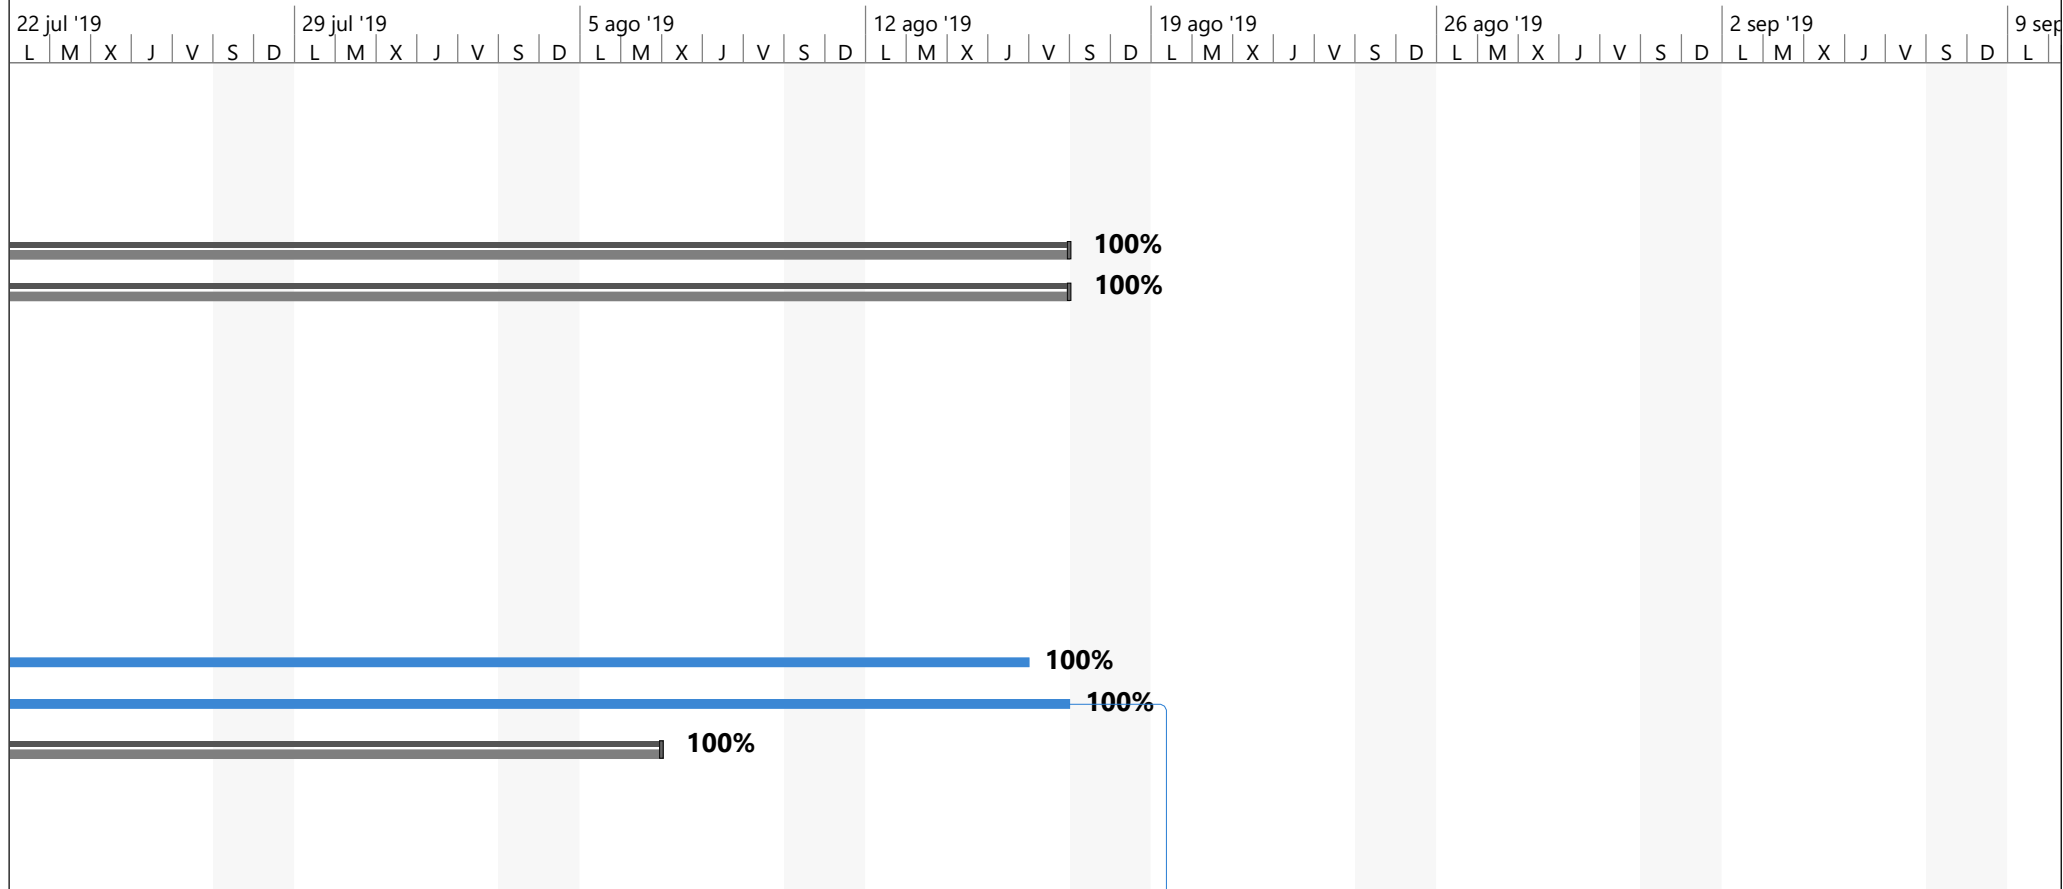

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

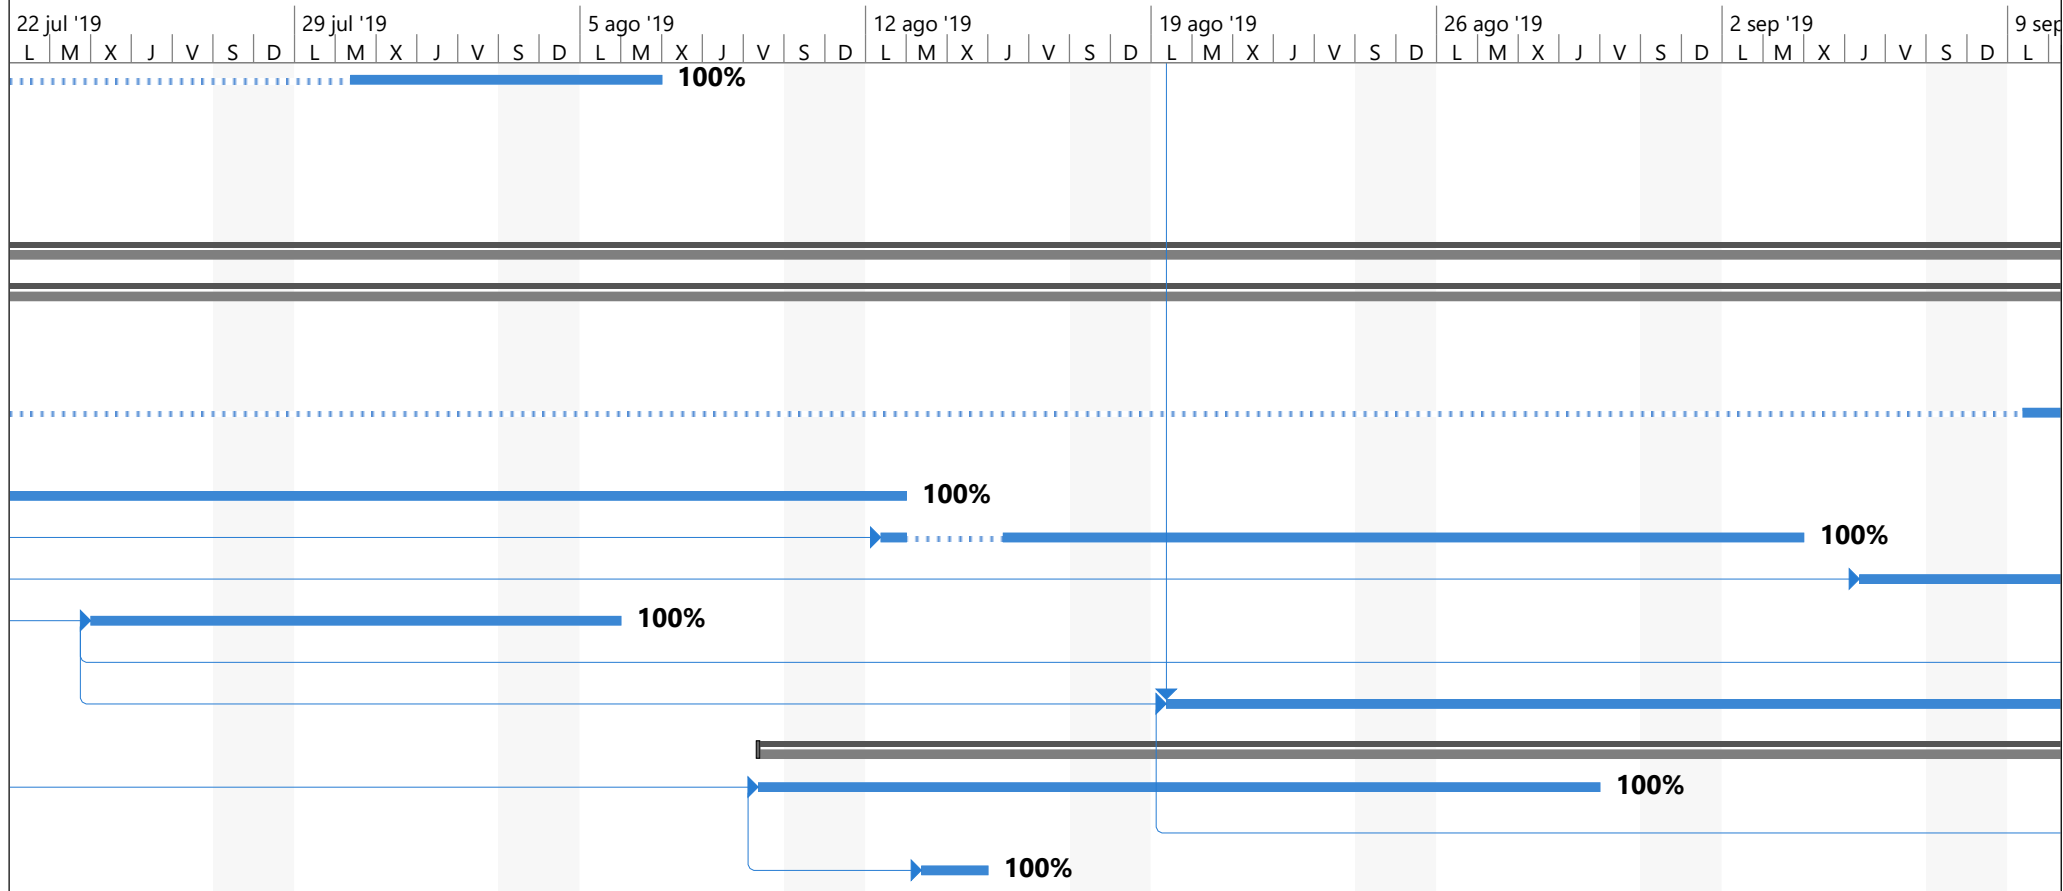

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020


| 22 jul '19 | | | | | | | 29 jul '19 | | | | | | | 5 ago '19 | | | | | | | 12 ago '19 | | | | | | | 19 ago '19 | | | | | | | 26 ago '19 | | | | | | | 2 sep '19 | | | | | | | 9 sep |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | |



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

p '19 M X J V S D 16 sep '19 L M X J V S D 23 sep '19 L M X J V S D 30 sep '19 L M X J V S D 7 oct '19 L M X J V S D 14 oct '19 L M X J V S D 21 oct '19 L M X J V S D 28 oct '19 L M

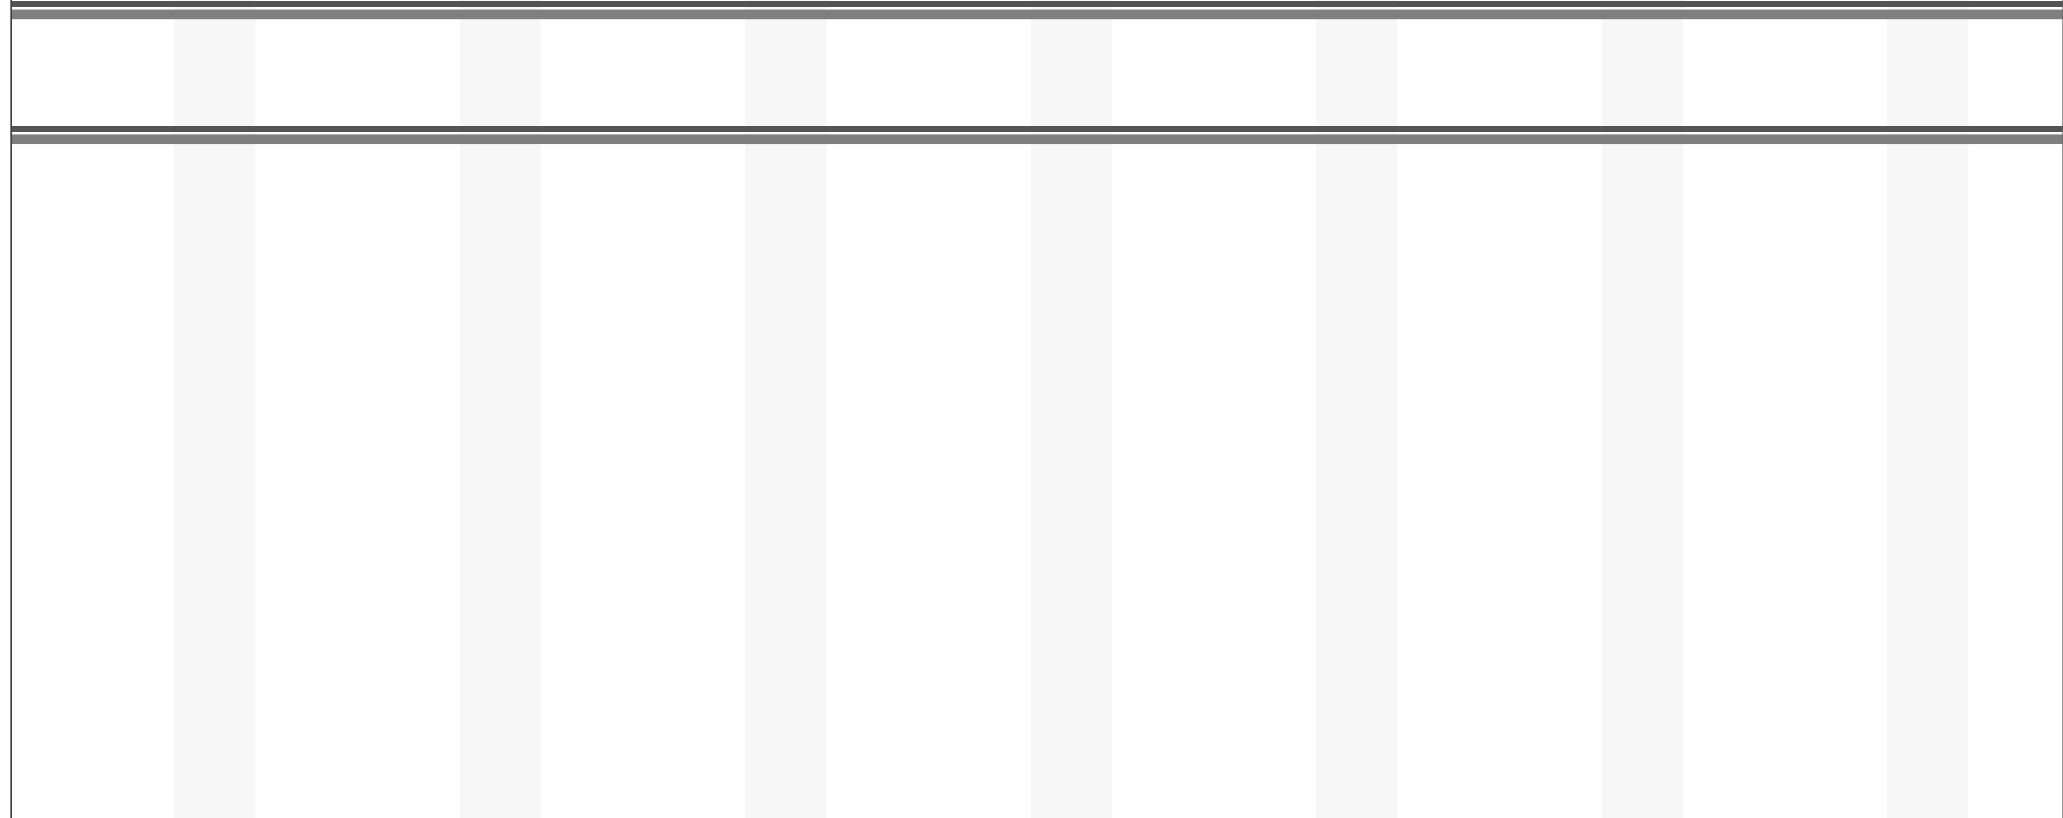

























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| Task | Start Date | End Date | Completion Status |
|--------|------------|------------|-------------------|
| Task 1 | 16 sep '19 | 30 sep '19 | 100% |
| Task 2 | 16 sep '19 | 30 sep '19 | 100% |
| Task 3 | 16 sep '19 | 30 sep '19 | 100% |
| Task 4 | 16 sep '19 | 30 sep '19 | 100% |
| Task 5 | 16 sep '19 | 30 sep '19 | 100% |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

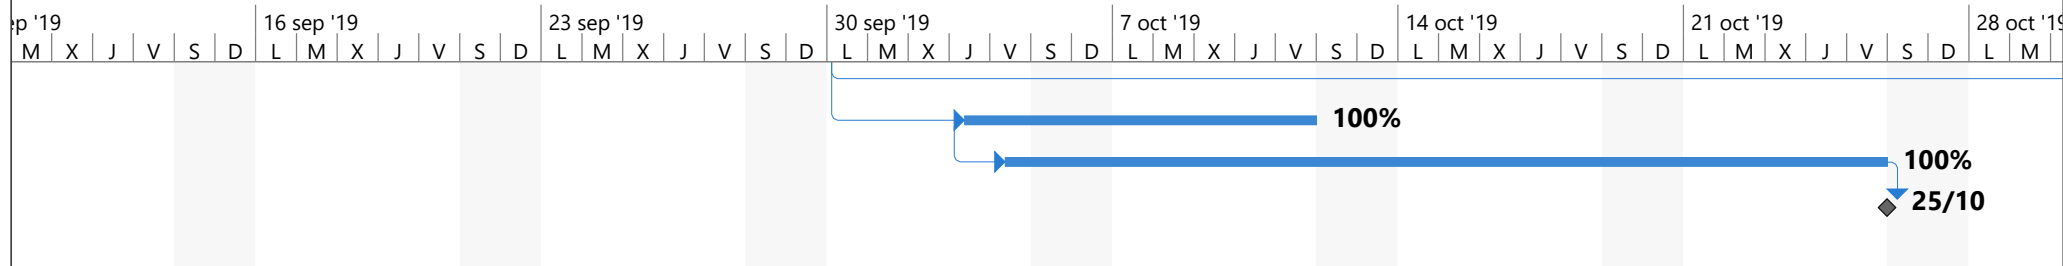

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

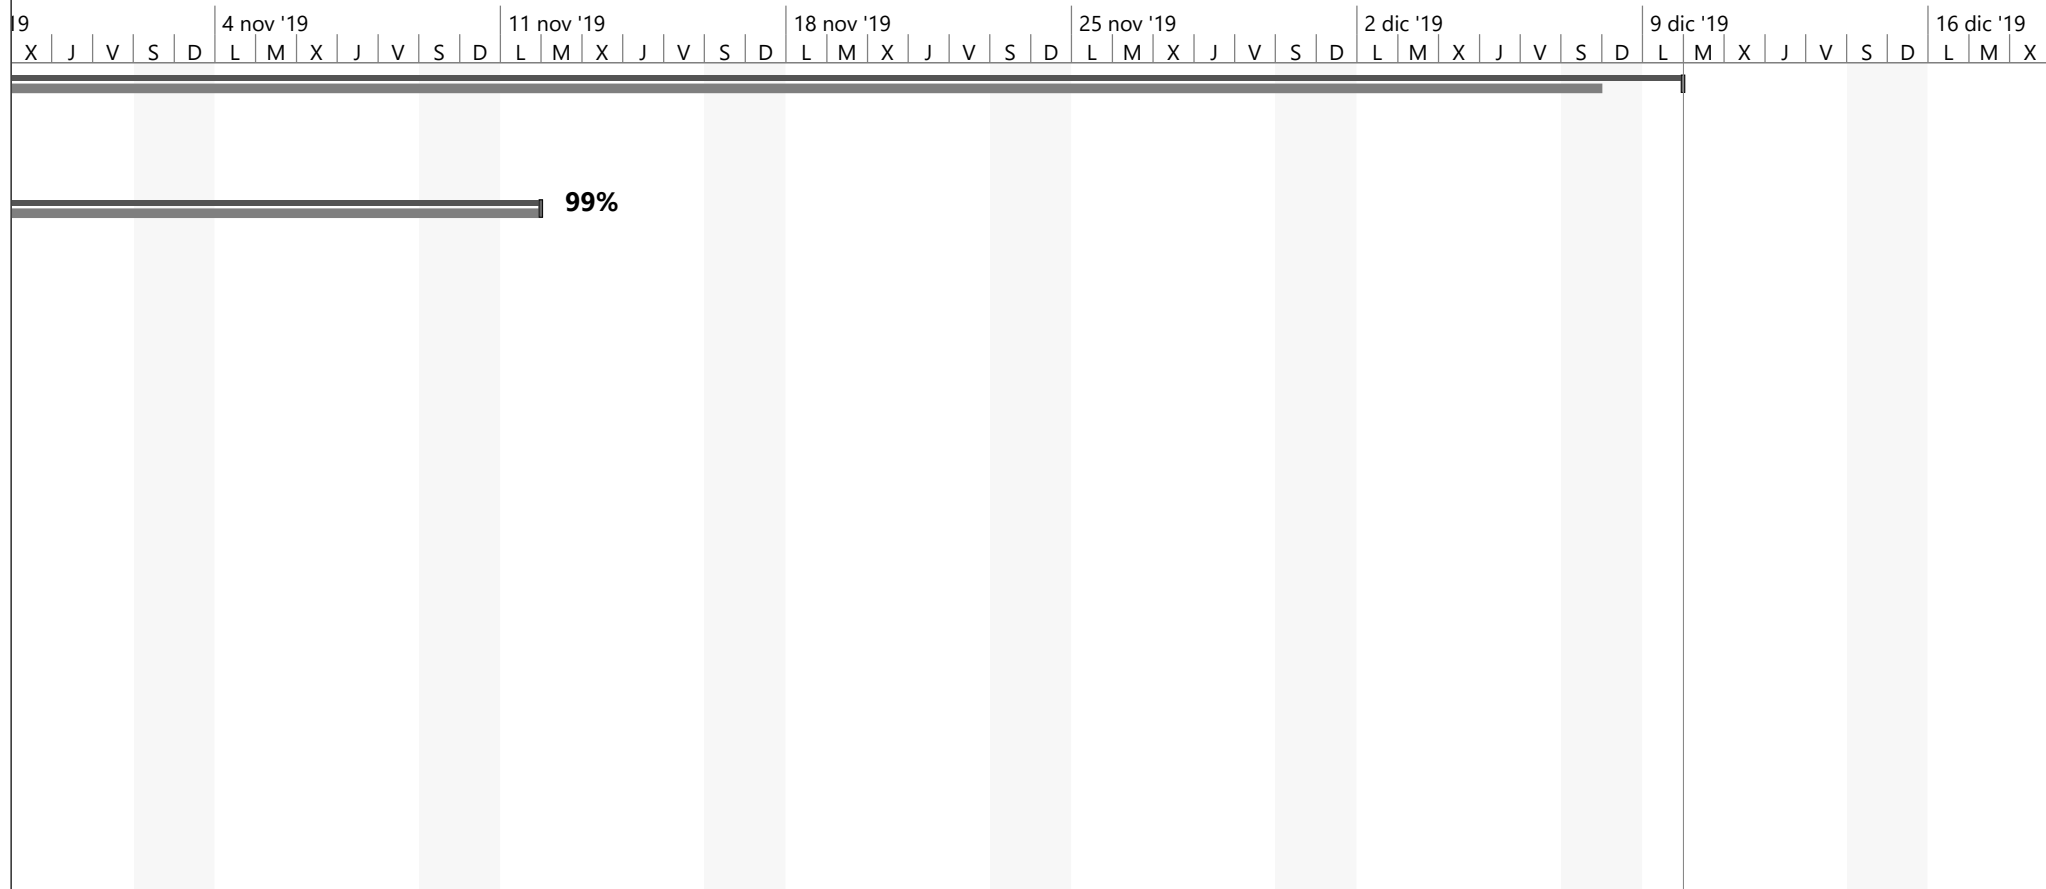


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020

| 9 | | | | | 4 nov '19 | | | | | 11 nov '19 | | | | | 18 nov '19 | | | | | 25 nov '19 | | | | | 2 dic '19 | | | | | 9 dic '19 | | | | | 16 dic '19 | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





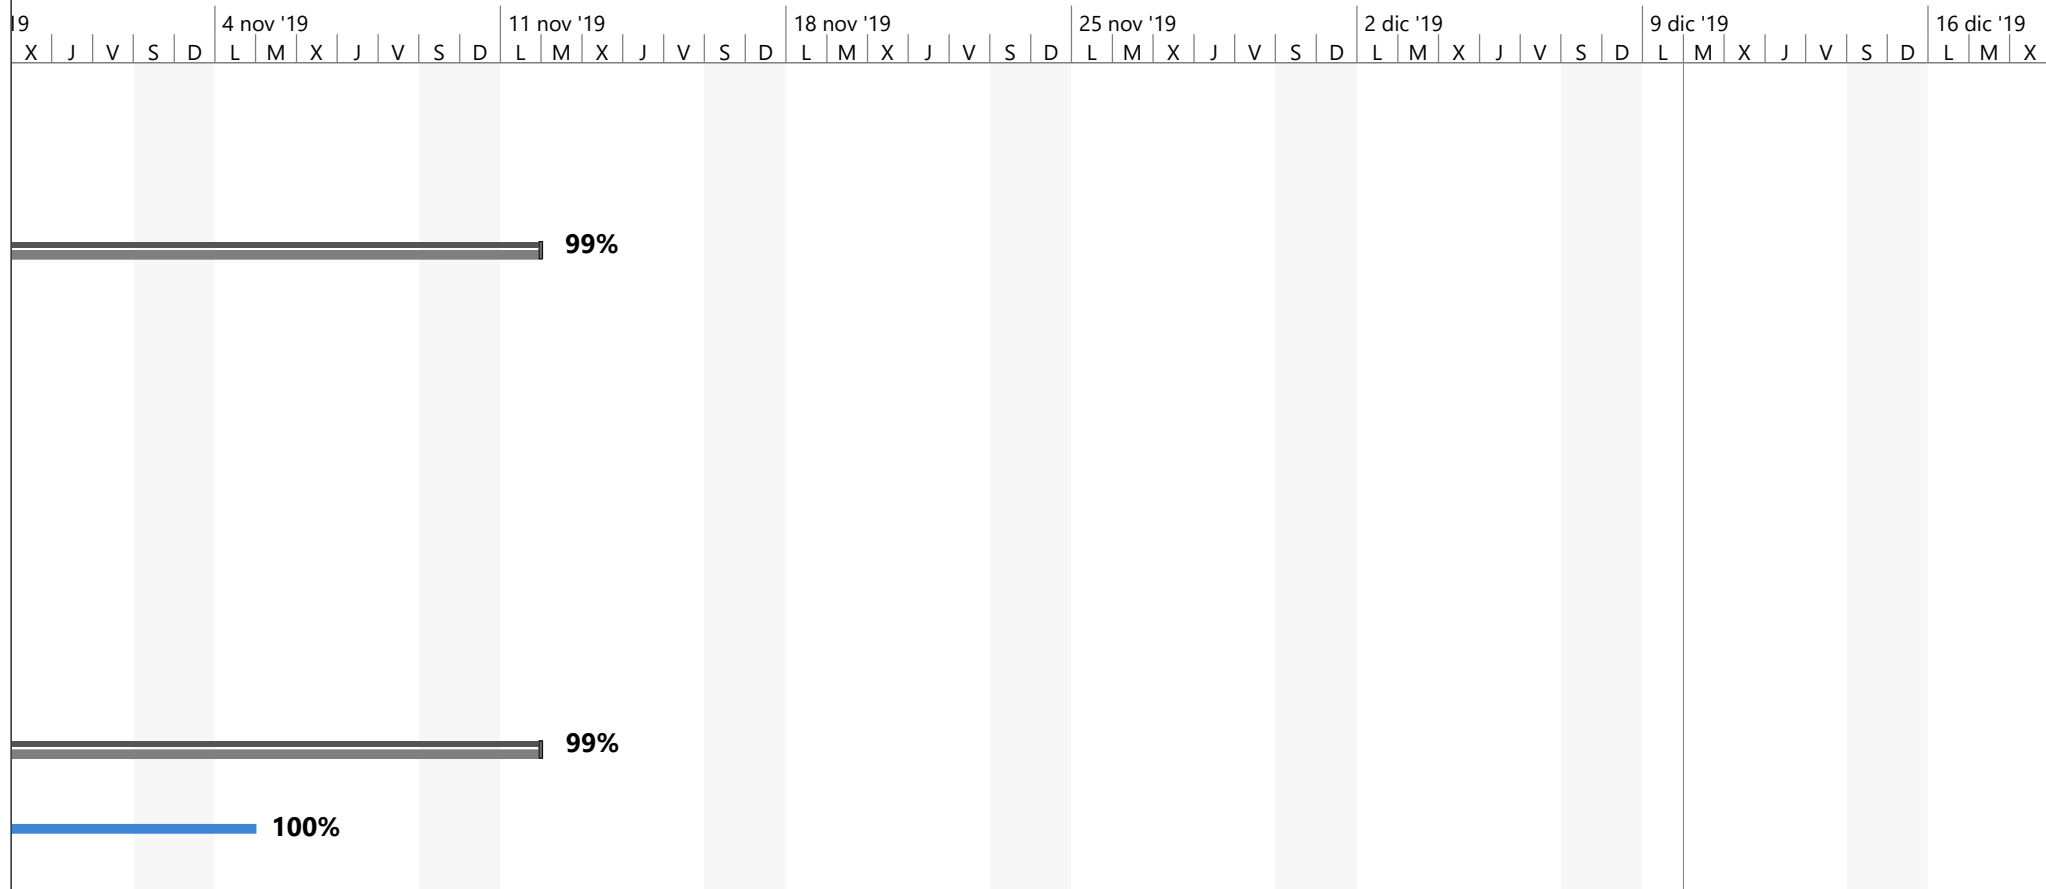



















| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de ejecución BPER104 Abr2020



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |
