
















































































# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración    | Comienzo     | Fin          | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                         |             |              |              | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | N |  |
| 1  |                                                                                   |  | Rehabilitación de Redes CANA102         | 245.13 días | jue 15/11/18 | lun 4/11/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 2  |  |  | Adjudicación                            | 0 días      | lun 15/10/18 | lun 15/10/18 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 3  |                                                                                   |  | Periodo de Adquisiciones                | 80 días     | jue 15/11/18 | lun 11/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 28 |                                                                                   |  | Ejecución                               | 221 días    | jue 13/12/18 | mar 29/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 29 |  |  | Polígono 1                              | 99 días     | jue 13/12/18 | mar 7/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 30 |  |  | Instalación                             | 99 días     | jue 13/12/18 | mar 7/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 31 |  |  | Izado de postes                         | 3 días      | jue 13/12/18 | lun 17/12/18 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 32 |  |  | Cimentaciones                           | 4 días      | lun 17/12/18 | jue 20/12/18 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 33 |  |  | Retenidas                               | 4 días      | mar 12/3/19  | vie 15/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 34 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 11 días     | mar 12/3/19  | mar 26/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 35 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 5 días      | mié 20/3/19  | mar 26/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 36 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 4.95 días   | mié 20/3/19  | mié 10/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 37 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 4 días      | jue 2/5/19   | mar 7/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 38 |  |  | Transformadores                         | 4 días      | jue 21/3/19  | mar 26/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 39 |  |  | Alumbrado Publico                       | 7 días      | mié 27/3/19  | vie 5/4/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 40 |  |  | Normalización Suministros               | 9 días      | lun 1/4/19   | jue 11/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 41 |  |  | Remoción                                | 26 días     | mié 27/3/19  | vie 3/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 42 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 8 días      | mié 27/3/19  | jue 11/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 43 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 5 días      | mié 3/4/19   | mar 16/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 44 |  |  | Armados de Media Tensión                | 4 días      | lun 29/4/19  | vie 3/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Duración | Comienzo     | Fin          | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                        |          |              |              |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |  |
| 45 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 6 días   | mié 3/4/19   | mié 10/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 46 |  |  | Transformadores                        | 8 días   | jue 4/4/19   | lun 22/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 47 |  |  | Izado de postes                        | 7 días   | mar 9/4/19   | mié 17/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 48 |  |  | Cierre de Polígono 1                   | 0 días   | mié 17/4/19  | mié 17/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 49 |                                                                                   |  | Polígono 2                             | 100 días | mar 18/12/18 | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 50 |                                                                                   |  | Instalación                            | 94 días  | mar 18/12/18 | vie 3/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 51 |  |  | Izado de postes                        | 5 días   | mar 18/12/18 | lun 24/12/18 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 52 |                                                                                   |  | Cimentaciones                          | 6 días   | vie 21/12/18 | vie 28/12/18 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 53 |                                                                                   |  | Retenidas                              | 6 días   | lun 18/3/19  | lun 25/3/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 54 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 11 días  | lun 18/3/19  | mar 2/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 55 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tens | 9 días   | vie 5/4/19   | mié 17/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 56 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 10 días  | vie 19/4/19  | vie 3/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 57 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                   | 5 días   | vie 12/4/19  | jue 18/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 58 |                                                                                   |  | Transformadores                        | 6 días   | jue 11/4/19  | jue 18/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 59 |  |  | Alumbrado Publico                      | 14 días  | vie 12/4/19  | jue 2/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 60 |                                                                                   |  | Normalización Suministros              | 7 días   | vie 12/4/19  | lun 22/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 61 |                                                                                   |  | Remoción                               | 16 días  | vie 19/4/19  | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 62 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 12 días  | vie 19/4/19  | mar 7/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 63 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 11 días  | vie 19/4/19  | lun 6/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 64 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión               | 3 días   | jue 9/5/19   | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                           | Duración | Comienzo     | Fin          | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                           |          |              |              |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | N |  |
| 65 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                   | 4 días   | mar 30/4/19  | lun 6/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 66 |                                                                                   |  | Transformadores                           | 6 días   | jue 25/4/19  | vie 3/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 67 |                                                                                   |  | Izado de postes                           | 6 días   | lun 6/5/19   | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 68 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 2                      | 0 días   | lun 13/5/19  | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 69 |                                                                                   |  | Polígono 3                                | 142 días | mar 25/12/18 | jue 18/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 70 |                                                                                   |  | Instalación                               | 142 días | mar 25/12/18 | jue 18/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 71 |  |  | Izado de postes                           | 5 días   | mar 25/12/18 | lun 31/12/18 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 72 |                                                                                   |  | Cimentaciones                             | 6 días   | lun 31/12/18 | mar 8/1/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 73 |                                                                                   |  | Retenidas                                 | 6 días   | mar 26/3/19  | mié 3/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 74 |                                                                                   |  | Armados de Media y Baja Tensión           | 9 días   | mié 27/3/19  | mar 9/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 75 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 10 días  | mié 3/4/19   | mar 16/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 76 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra        | 6 días   | lun 17/6/19  | lun 8/7/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 77 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                      | 5 días   | mié 26/6/19  | jue 11/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 78 |  |  | Transformadores                           | 4 días   | vie 19/4/19  | mié 24/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 79 |  |  | Alumbrado Publico                         | 8 días   | mar 9/7/19   | jue 18/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 80 |                                                                                   |  | Normalización Suministros                 | 15 días  | mar 23/4/19  | mar 14/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 81 |                                                                                   |  | Remoción                                  | 44 días  | mar 23/4/19  | mar 25/6/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 82 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión        | 13 días  | mié 24/4/19  | jue 6/6/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 83 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión         | 12 días  | mar 23/4/19  | vie 24/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 84 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión                  | 8 días   | vie 26/4/19  | mié 8/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                       | Duración        | Comienzo           | Fin               | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                       |                 |                    |                   |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |
| 85  |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión               | 11 días         | mar 11/6/19        | mar 25/6/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 86  |                                                                                   |  | Transformadores                       | 11 días         | mié 15/5/19        | lun 17/6/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 87  |                                                                                   |  | Izado de postes                       | 14 días         | vie 17/5/19        | jue 6/6/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 88  |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 3                  | 0 días          | jue 6/6/19         | jue 6/6/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 89  |                                                                                   |  | <b>Polígono 4</b>                     | <b>128 días</b> | <b>mié 2/1/19</b>  | <b>vie 5/7/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 90  |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                    | <b>128 días</b> | <b>mié 2/1/19</b>  | <b>vie 5/7/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 91  |  |  | Izado de postes                       | 7 días          | mié 2/1/19         | jue 10/1/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 92  |                                                                                   |  | Cimentaciones                         | 9 días          | mié 2/1/19         | lun 14/1/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 93  |                                                                                   |  | Retenidas                             | 7 días          | jue 4/4/19         | vie 12/4/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 94  |  |  | Armados de Media y Baja Tensión       | 15 días         | mar 12/3/19        | jue 25/4/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 95  |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten | 59 días         | mié 3/4/19         | vie 5/7/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 96  |  |  | Elementos de Protección y Maniobra    | 6 días          | vie 14/6/19        | mié 3/7/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 97  |  |  | Conexiones y Jumpers                  | 9 días          | mié 22/5/19        | vie 7/6/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 98  |  |  | Transformadores                       | 9 días          | mié 24/4/19        | mié 15/5/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 99  |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                     | 13 días         | lun 6/5/19         | mié 22/5/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 100 |                                                                                   |  | Normalización Suministros             | 11 días         | mié 15/5/19        | mié 29/5/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 101 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                       | <b>47 días</b>  | <b>lun 29/4/19</b> | <b>jue 4/7/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 102 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión    | 26 días         | lun 29/4/19        | jue 20/6/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 103 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión     | 14 días         | lun 27/5/19        | lun 24/6/19       |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 104 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión              | 3 días          | mar 18/6/19        | jue 4/7/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                           | Duración        | Comienzo           | Fin                | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                           |                 |                    |                    | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | N |  |
| 105 |  |  | Armados de Baja Tensión                   | 4 días          | vie 21/6/19        | mié 26/6/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 106 |                                                                                   |  | Transformadores                           | 5 días          | mar 28/5/19        | vie 7/6/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 107 |                                                                                   |  | Izado de postes                           | 6 días          | jue 13/6/19        | jue 20/6/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 108 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 4                      | 0 días          | jue 20/6/19        | jue 20/6/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 109 |                                                                                   |  | <b>Polígono 5</b>                         | <b>171 días</b> | <b>vie 11/1/19</b> | <b>lun 16/9/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 110 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                        | <b>130 días</b> | <b>vie 11/1/19</b> | <b>jue 18/7/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 111 |  |  | Izado de postes                           | 3 días          | vie 11/1/19        | mar 15/1/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 112 |                                                                                   |  | Cimentaciones                             | 5 días          | mar 15/1/19        | mar 22/1/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 113 |  |  | Retenidas                                 | 3 días          | lun 15/4/19        | mié 17/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 114 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión           | 12 días         | mié 27/3/19        | mié 22/5/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 115 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 6 días          | jue 2/5/19         | jue 9/5/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 116 |                                                                                   |  | Elementos de Protección y Maniobra        | 4 días          | jue 13/6/19        | jue 18/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 117 |  |  | Conexiones y Jumpers                      | 4 días          | lun 10/6/19        | jue 13/6/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 118 |  |  | Transformadores                           | 5 días          | mar 14/5/19        | lun 20/5/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 119 |  |  | Alumbrado Publico                         | 5 días          | lun 20/5/19        | vie 24/5/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 120 |                                                                                   |  | Normalización Suministros                 | 20 días         | jue 30/5/19        | jue 27/6/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 121 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                           | <b>69 días</b>  | <b>mar 11/6/19</b> | <b>lun 16/9/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 122 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media Tensión        | 8 días          | mar 11/6/19        | jue 4/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 123 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión         | 8 días          | jue 27/6/19        | lun 12/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 124 |  |  | Armados de Media Tensión                  | 5 días          | mar 6/8/19         | lun 16/9/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                       | Duración | Comienzo    | Fin         | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                       |          |             |             |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |
| 125 |  |  | Armados de Baja Tensión               | 7 días   | mié 7/8/19  | lun 16/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 126 |  |  | Transformadores                       | 10 días  | vie 28/6/19 | jue 1/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 127 |                                                                                   |  | Izado de postes                       | 9 días   | vie 2/8/19  | mié 14/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 128 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 5                  | 0 días   | mié 14/8/19 | mié 14/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 129 |                                                                                   |  | Polígono 6                            | 159 días | mié 16/1/19 | mar 3/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 130 |                                                                                   |  | Instalación                           | 152 días | mié 16/1/19 | vie 23/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 131 |  |  | Izado de postes                       | 5 días   | mié 16/1/19 | mié 23/1/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 132 |                                                                                   |  | Cimentaciones                         | 5 días   | mié 16/1/19 | mié 23/1/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 133 |                                                                                   |  | Retenidas                             | 5 días   | lun 18/3/19 | vie 22/3/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 134 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión       | 15 días  | jue 2/5/19  | lun 27/5/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 135 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten | 12 días  | jue 23/5/19 | lun 10/6/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 136 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra    | 6 días   | jue 6/6/19  | vie 12/7/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 137 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                  | 6 días   | lun 27/5/19 | mar 4/6/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 138 |  |  | Transformadores                       | 6 días   | jue 30/5/19 | vie 7/6/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 139 |  |  | Alumbrado Publico                     | 8 días   | mar 13/8/19 | vie 23/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 140 |                                                                                   |  | Normalización Suministros             | 8 días   | vie 28/6/19 | mar 9/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 141 |                                                                                   |  | Remoción                              | 61 días  | lun 10/6/19 | mar 3/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 142 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión    | 12 días  | lun 10/6/19 | lun 1/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 143 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión     | 5 días   | mar 2/7/19  | mié 24/7/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 144 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión              | 10 días  | mar 6/8/19  | vie 23/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración   | Comienzo    | Fin         | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |            |             |             |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |
| 145 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 14 días    | lun 12/8/19 | mar 3/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 146 |  |  | Transformadores                         | 10 días    | mar 2/7/19  | jue 25/7/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 147 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 18 días    | vie 26/7/19 | mié 21/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 148 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 6                    | 0 días     | mié 21/8/19 | mié 21/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 149 |                                                                                   |  | Polígono 7                              | 162 días   | jue 24/1/19 | vie 13/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 150 |                                                                                   |  | Instalación                             | 162 días   | jue 24/1/19 | vie 13/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 151 |  |  | Izado de postes                         | 8 días     | jue 24/1/19 | lun 4/2/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 152 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 9 días     | jue 24/1/19 | mar 5/2/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 153 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 9 días     | mar 26/3/19 | lun 8/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 154 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 27.34 días | mar 12/3/19 | jue 11/7/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 155 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 16 días    | lun 10/6/19 | lun 1/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 156 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 12 días    | mié 19/6/19 | mar 27/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 157 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                    | 9 días     | mar 20/8/19 | lun 9/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 158 |  |  | Transformadores                         | 6 días     | mié 3/7/19  | mié 10/7/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 159 |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                       | 16 días    | vie 23/8/19 | vie 13/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 160 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 8 días     | mié 10/7/19 | vie 19/7/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 161 |                                                                                   |  | Remoción                                | 32 días    | vie 26/7/19 | mar 10/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 162 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 17 días    | mié 31/7/19 | jue 29/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 163 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 7 días     | vie 26/7/19 | lun 5/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 164 |  |  | Armados de Media Tensión                | 1 día      | vie 30/8/19 | vie 30/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración        | Comienzo          | Fin                 | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 |                   |                     | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | N |
| 165 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                 | 2 días          | lun 19/8/19       | mié 28/8/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 166 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 1 día           | mar 6/8/19        | mar 6/8/19          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 167 |  |  | Izado de postes                         | 2 días          | lun 9/9/19        | mar 10/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 168 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 7                    | 0 días          | mar 10/9/19       | mar 10/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 169 |                                                                                   |  | <b>Polígono 8</b>                       | <b>185 días</b> | <b>mar 5/2/19</b> | <b>mar 29/10/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 170 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                      | <b>185 días</b> | <b>mar 5/2/19</b> | <b>mar 29/10/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 171 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 4 días          | mar 5/2/19        | vie 8/2/19          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 172 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 4 días          | mar 5/2/19        | vie 8/2/19          |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 173 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 3 días          | jue 18/4/19       | lun 22/4/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 174 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 20 días         | lun 1/7/19        | vie 26/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 175 |                                                                                   |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 20 días         | lun 1/7/19        | vie 26/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 176 |                                                                                   |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días          | vie 20/9/19       | mar 29/10/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 177 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 5 días          | vie 30/8/19       | jue 10/10/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 178 |  |  | Transformadores                         | 5 días          | lun 15/7/19       | vie 19/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 179 |                                                                                   |  | Alumbrado Publico                       | 7 días          | mié 17/7/19       | jue 25/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 180 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 17 días         | lun 22/7/19       | mar 13/8/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 181 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                         | <b>40 días</b>  | <b>vie 9/8/19</b> | <b>lun 7/10/19</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 182 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 11 días         | vie 9/8/19        | vie 13/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 183 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 6 días          | mar 3/9/19        | mar 10/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 184 |  |  | Armados de Media Tensión                | 4 días          | lun 16/9/19       | jue 19/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración   | Comienzo    | Fin          | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |            |             |              |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |
| 185 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión                 | 5 días     | mar 17/9/19 | lun 23/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 186 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 3 días     | lun 23/9/19 | jue 26/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 187 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 6 días     | vie 27/9/19 | lun 7/10/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 188 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 8                    | 0 días     | lun 7/10/19 | lun 7/10/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 189 |                                                                                   |  | Polígono 9                              | 173 días   | lun 11/2/19 | jue 17/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 190 |                                                                                   |  | Instalación                             | 173 días   | lun 11/2/19 | jue 17/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 191 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 4 días     | lun 11/2/19 | jue 14/2/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 192 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 5 días     | lun 11/2/19 | vie 15/2/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 193 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 4 días     | lun 25/3/19 | jue 28/3/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 194 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 16.08 días | mar 12/3/19 | vie 5/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 195 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 13 días    | lun 1/7/19  | mié 21/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 196 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días     | jue 8/8/19  | vie 27/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 197 |                                                                                   |  | Conexiones y Jumpers                    | 3 días     | mar 8/10/19 | jue 17/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 198 |  |  | Transformadores                         | 5 días     | mar 30/7/19 | lun 5/8/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 199 |  |  | Alumbrado Publico                       | 8 días     | lun 2/9/19  | lun 7/10/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 200 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 11 días    | mié 14/8/19 | jue 29/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 201 |                                                                                   |  | Remoción                                | 26 días    | mar 20/8/19 | mié 25/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 202 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 6 días     | mié 28/8/19 | jue 12/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 203 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 4 días     | mar 20/8/19 | lun 26/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 204 |                                                                                   |  | Armados de Media Tensión                | 6 días     | vie 13/9/19 | vie 20/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |








|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                         | Duración        | Comienzo           | Fin                | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 |                    |                    |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | N |  |  |
| 205 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 9 días          | lun 2/9/19         | jue 12/9/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 206 |                                                                                   |  | Transformadores                         | 6 días          | mar 27/8/19        | mar 3/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 207 |  |  | Izado de postes                         | 12 días         | mié 4/9/19         | mié 25/9/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 208 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 9                    | 0 días          | mié 25/9/19        | mié 25/9/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 209 |  |  | <b>Polígono 10</b>                      | <b>162 días</b> | <b>vie 15/2/19</b> | <b>mar 8/10/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 210 |                                                                                   |  | <b>Instalación</b>                      | <b>145 días</b> | <b>vie 15/2/19</b> | <b>jue 12/9/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 211 |                                                                                   |  | Izado de postes                         | 7 días          | vie 15/2/19        | lun 25/2/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 212 |                                                                                   |  | Cimentaciones                           | 9 días          | vie 15/2/19        | jue 28/2/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 213 |                                                                                   |  | Retenidas                               | 7 días          | mar 9/4/19         | mié 17/4/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 214 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 14 días         | mar 12/3/19        | mié 26/6/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 215 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 16 días         | lun 10/6/19        | lun 1/7/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 216 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días          | lun 5/8/19         | mar 3/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 217 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 4 días          | lun 19/8/19        | vie 30/8/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 218 |  |  | Transformadores                         | 3 días          | jue 1/8/19         | lun 5/8/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 219 |  |  | Alumbrado Publico                       | 8 días          | lun 5/8/19         | mié 14/8/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 220 |                                                                                   |  | Normalización Suministros               | 10 días         | vie 30/8/19        | jue 12/9/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 221 |                                                                                   |  | <b>Remoción</b>                         | <b>50 días</b>  | <b>lun 29/7/19</b> | <b>mar 8/10/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 222 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 18 días         | lun 29/7/19        | lun 26/8/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 223 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 10 días         | lun 2/9/19         | vie 13/9/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| 224 |  |  | Armados de Media Tensión                | 5 días          | mar 27/8/19        | lun 2/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea         | Duración | Comienzo    | Fin         | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |  |  |  |  | 16 abr '18 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|--|--|--|--|------------|--|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                         |          |             |             | D         | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D         | L | M |  |  |  |  |            |  |
| 225 |                                                                                   |  | Armados de Baja Tensión | 8 días   | mié 25/9/19 | mar 8/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |            |  |
| 226 |                                                                                   |  | Transformadores         | 5 días   | lun 16/9/19 | vie 20/9/19 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |            |  |
| 227 |                                                                                   |  | lizado de postes        | 10 días  | lun 23/9/19 | lun 7/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |            |  |
| 228 |                                                                                   |  | Cierre de Polígono 10   | 0 días   | lun 7/10/19 | lun 7/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |            |  |
| 229 |  |  | Cierre de Obras         | 20 días  | mar 8/10/19 | lun 4/11/19 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |            |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

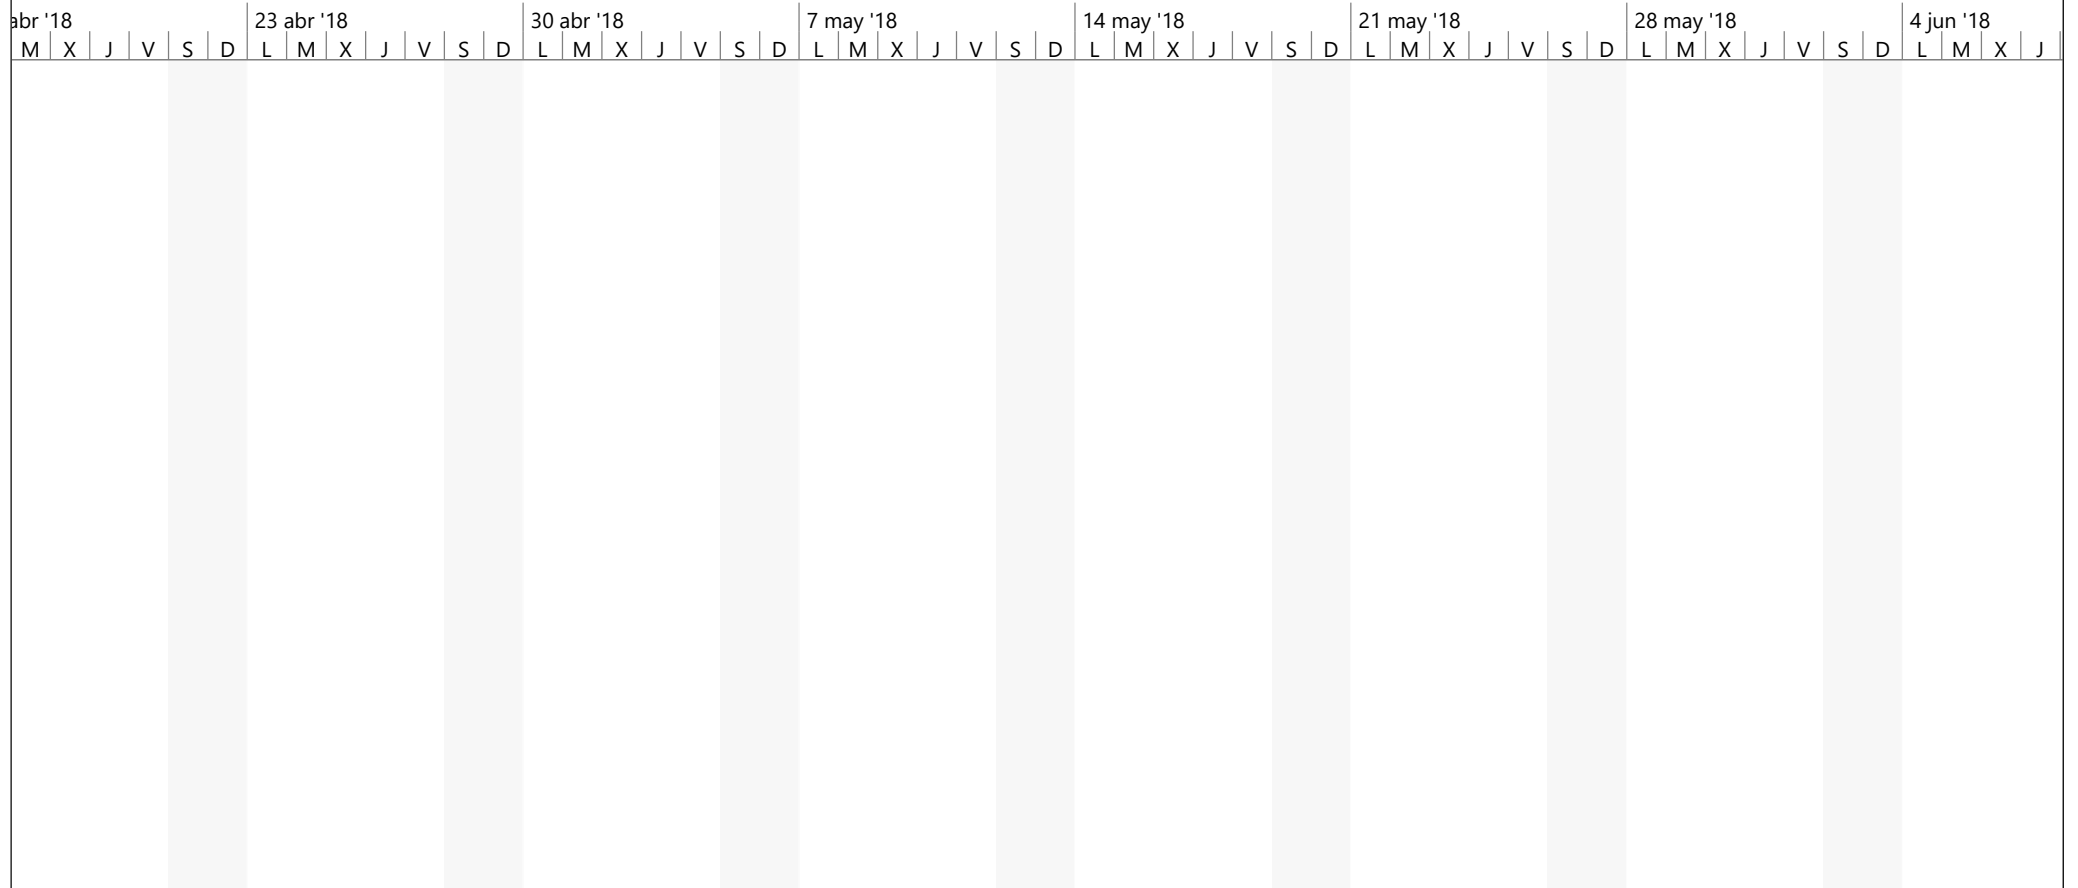


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

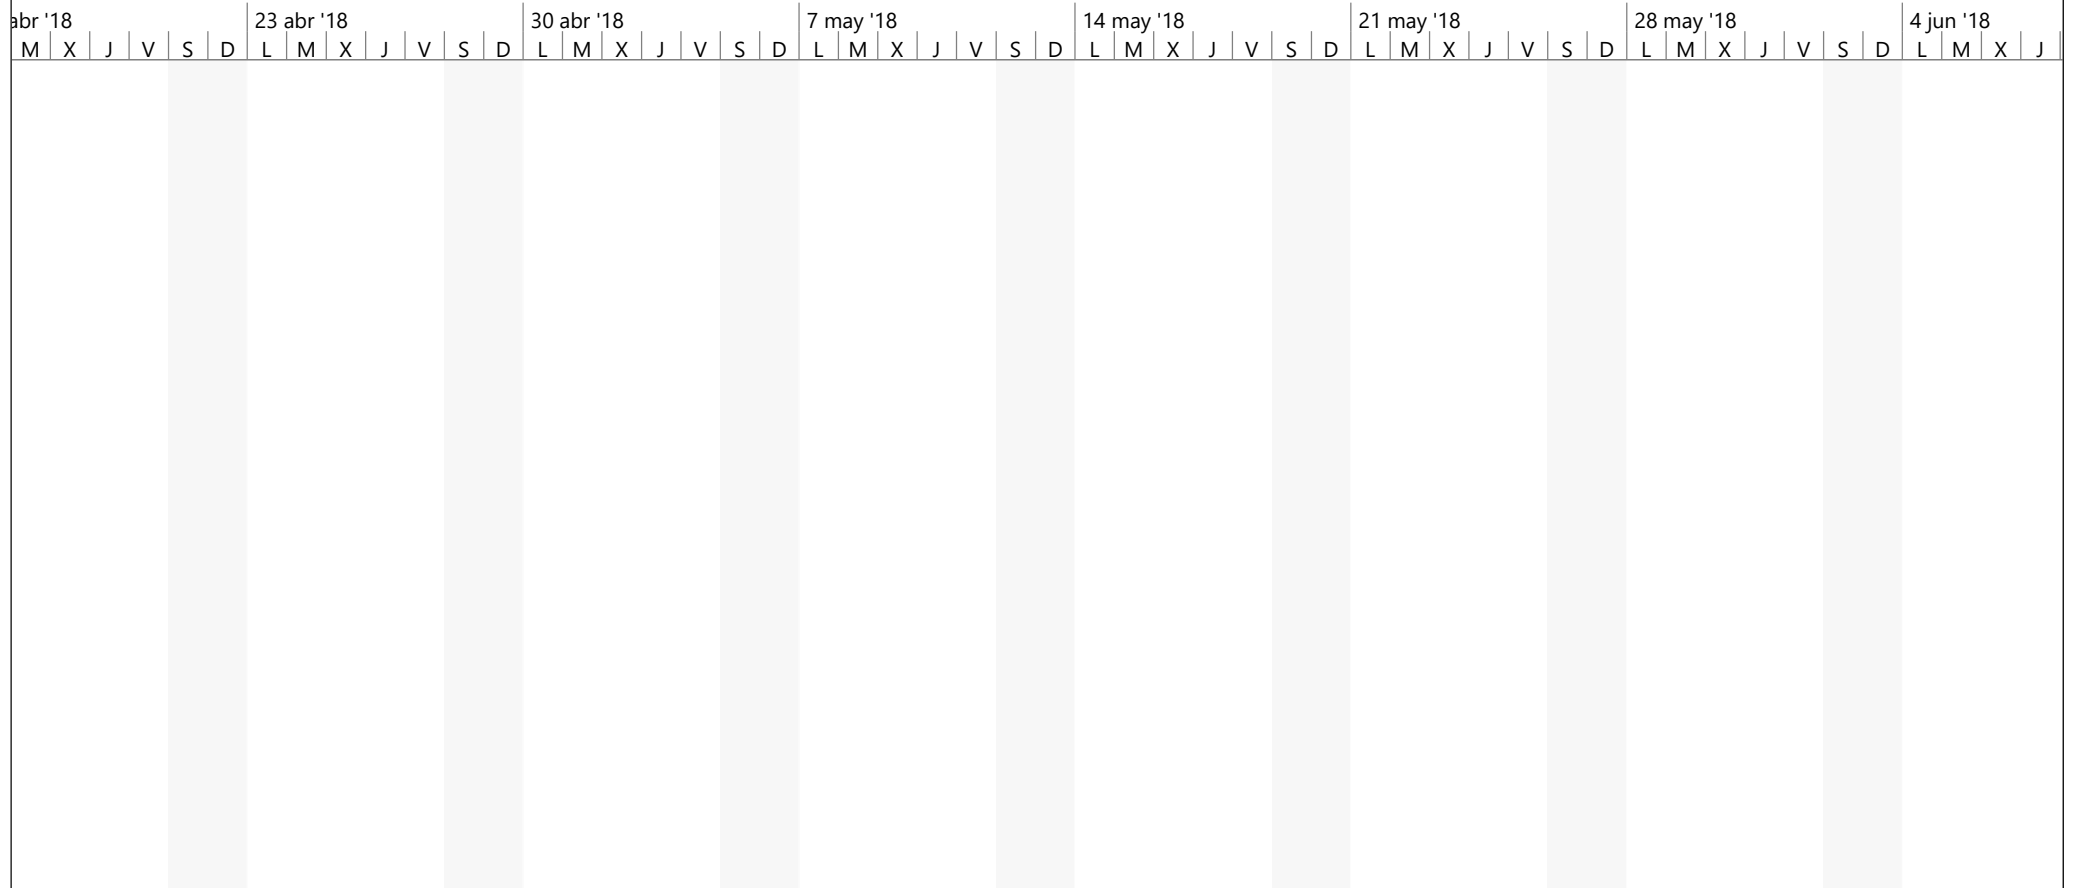


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

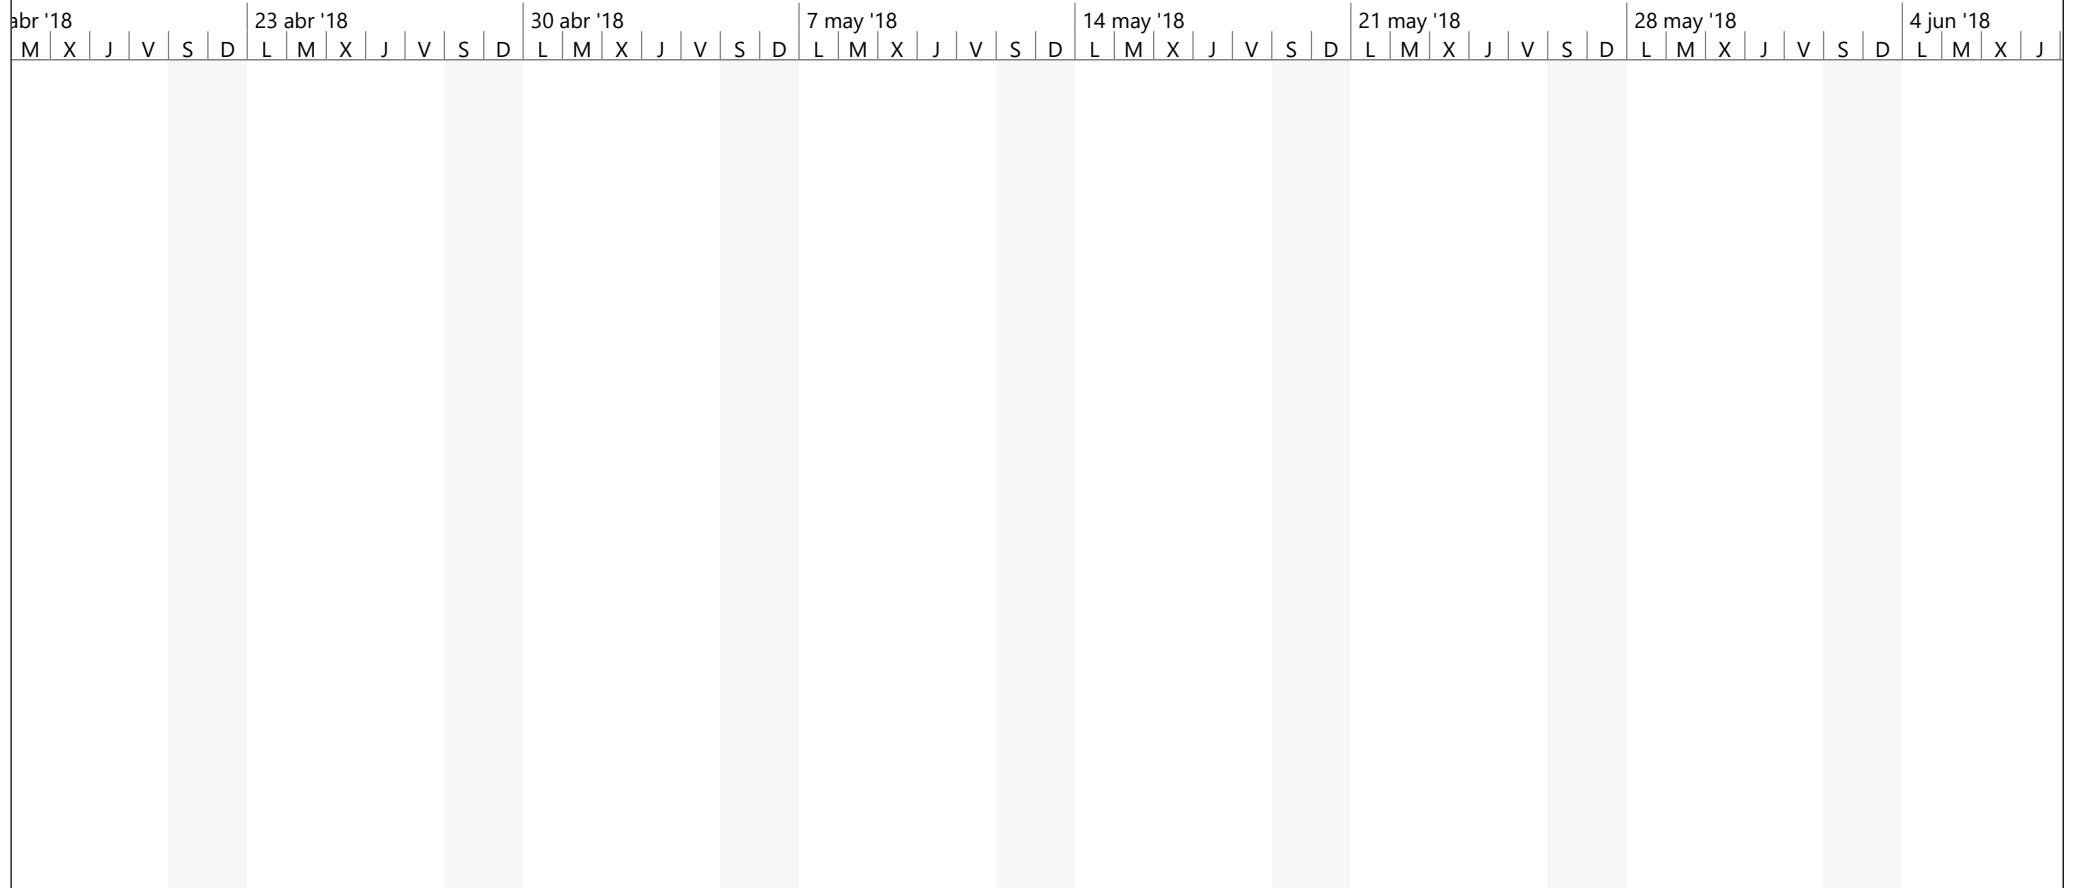


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

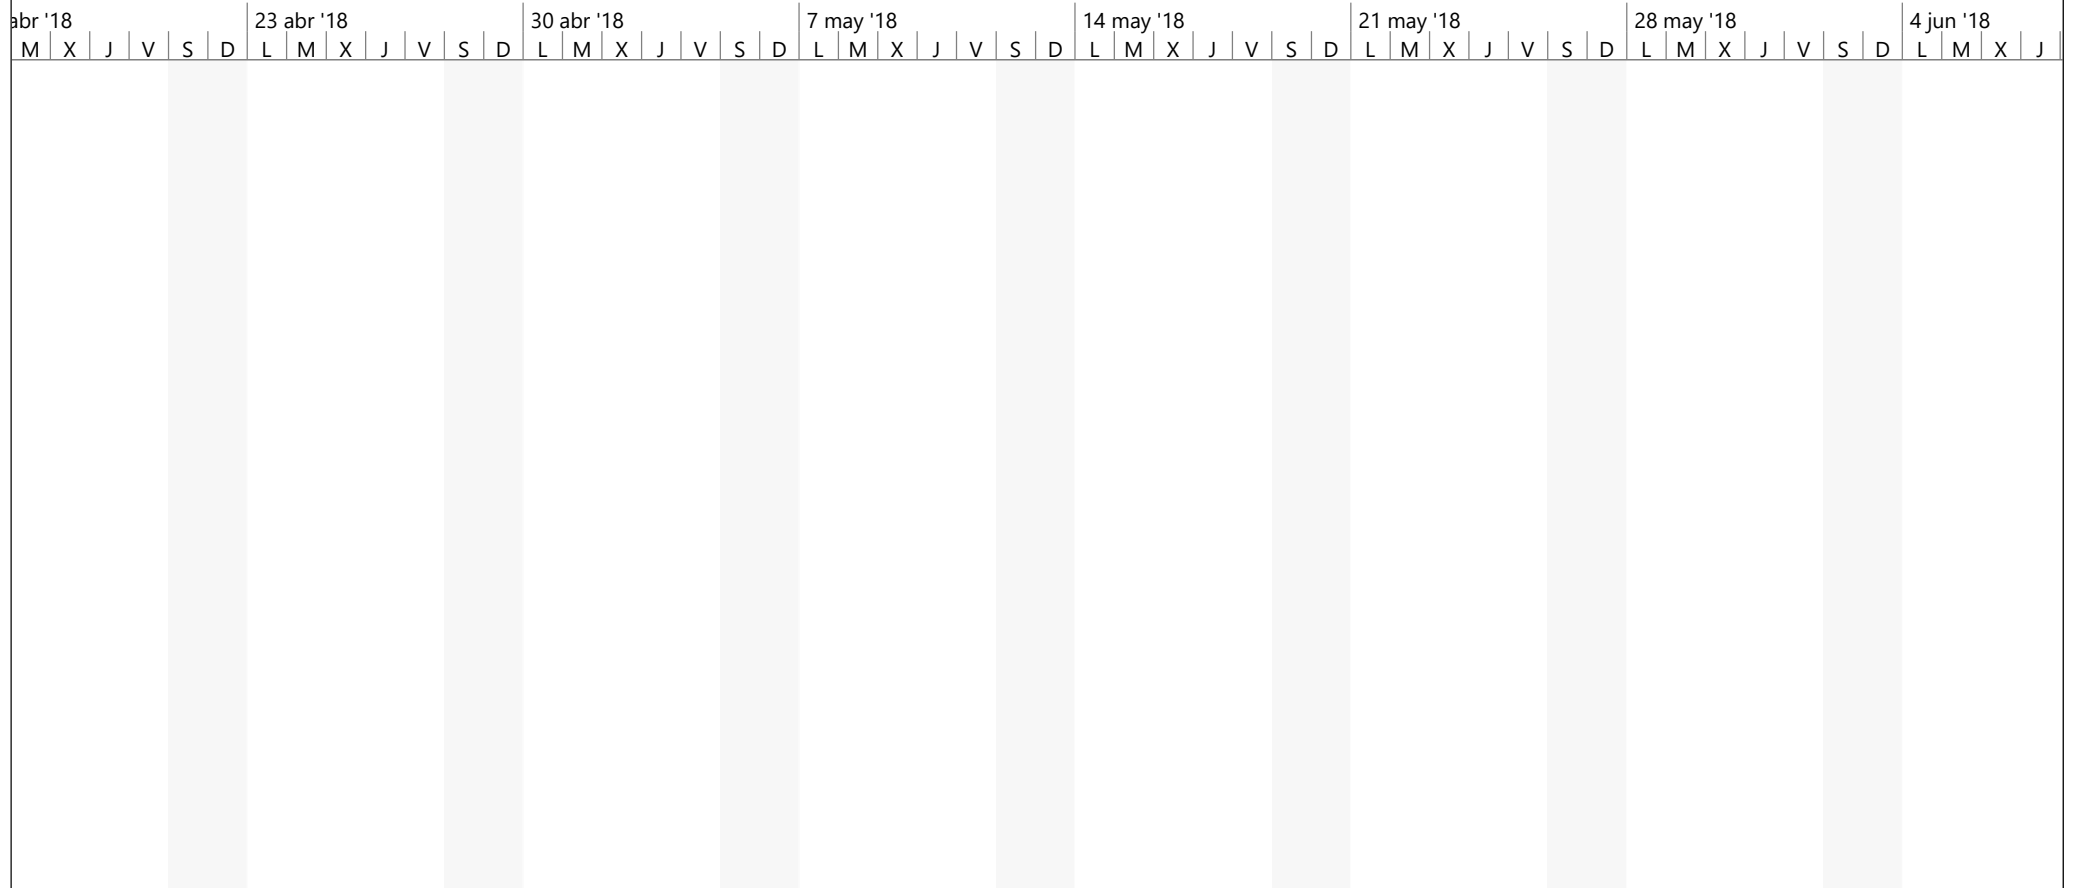

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

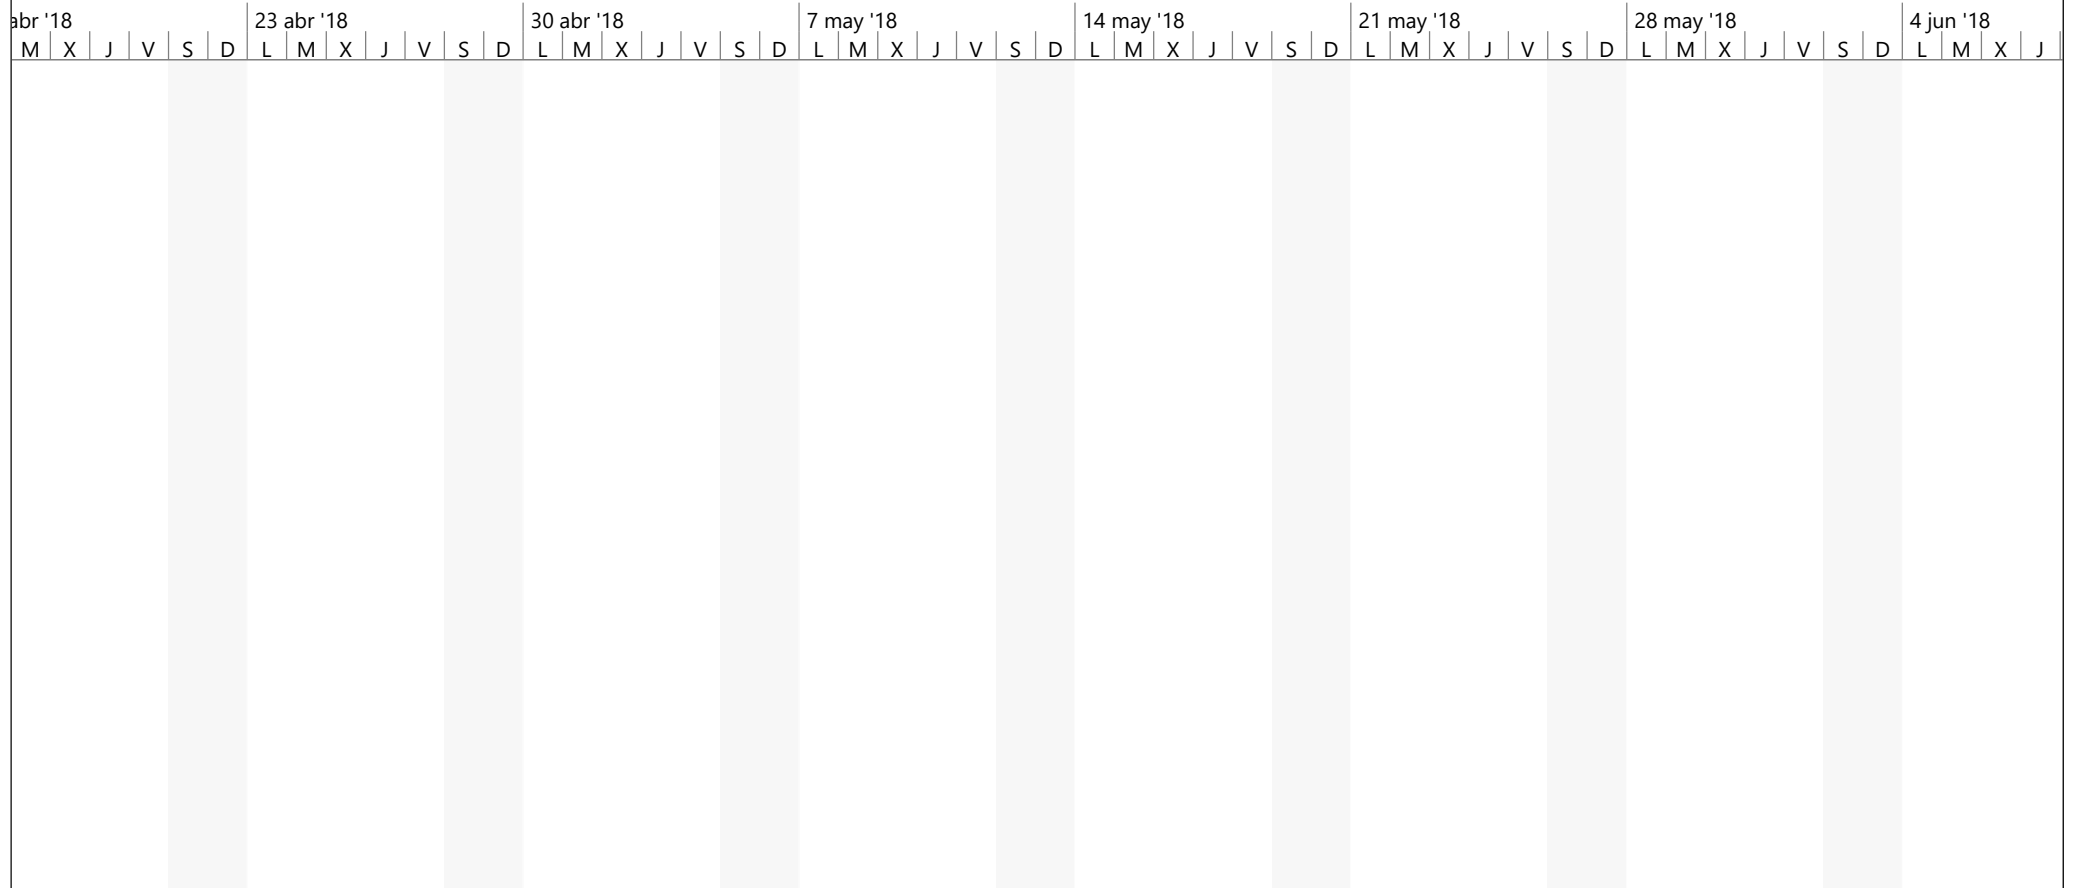


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

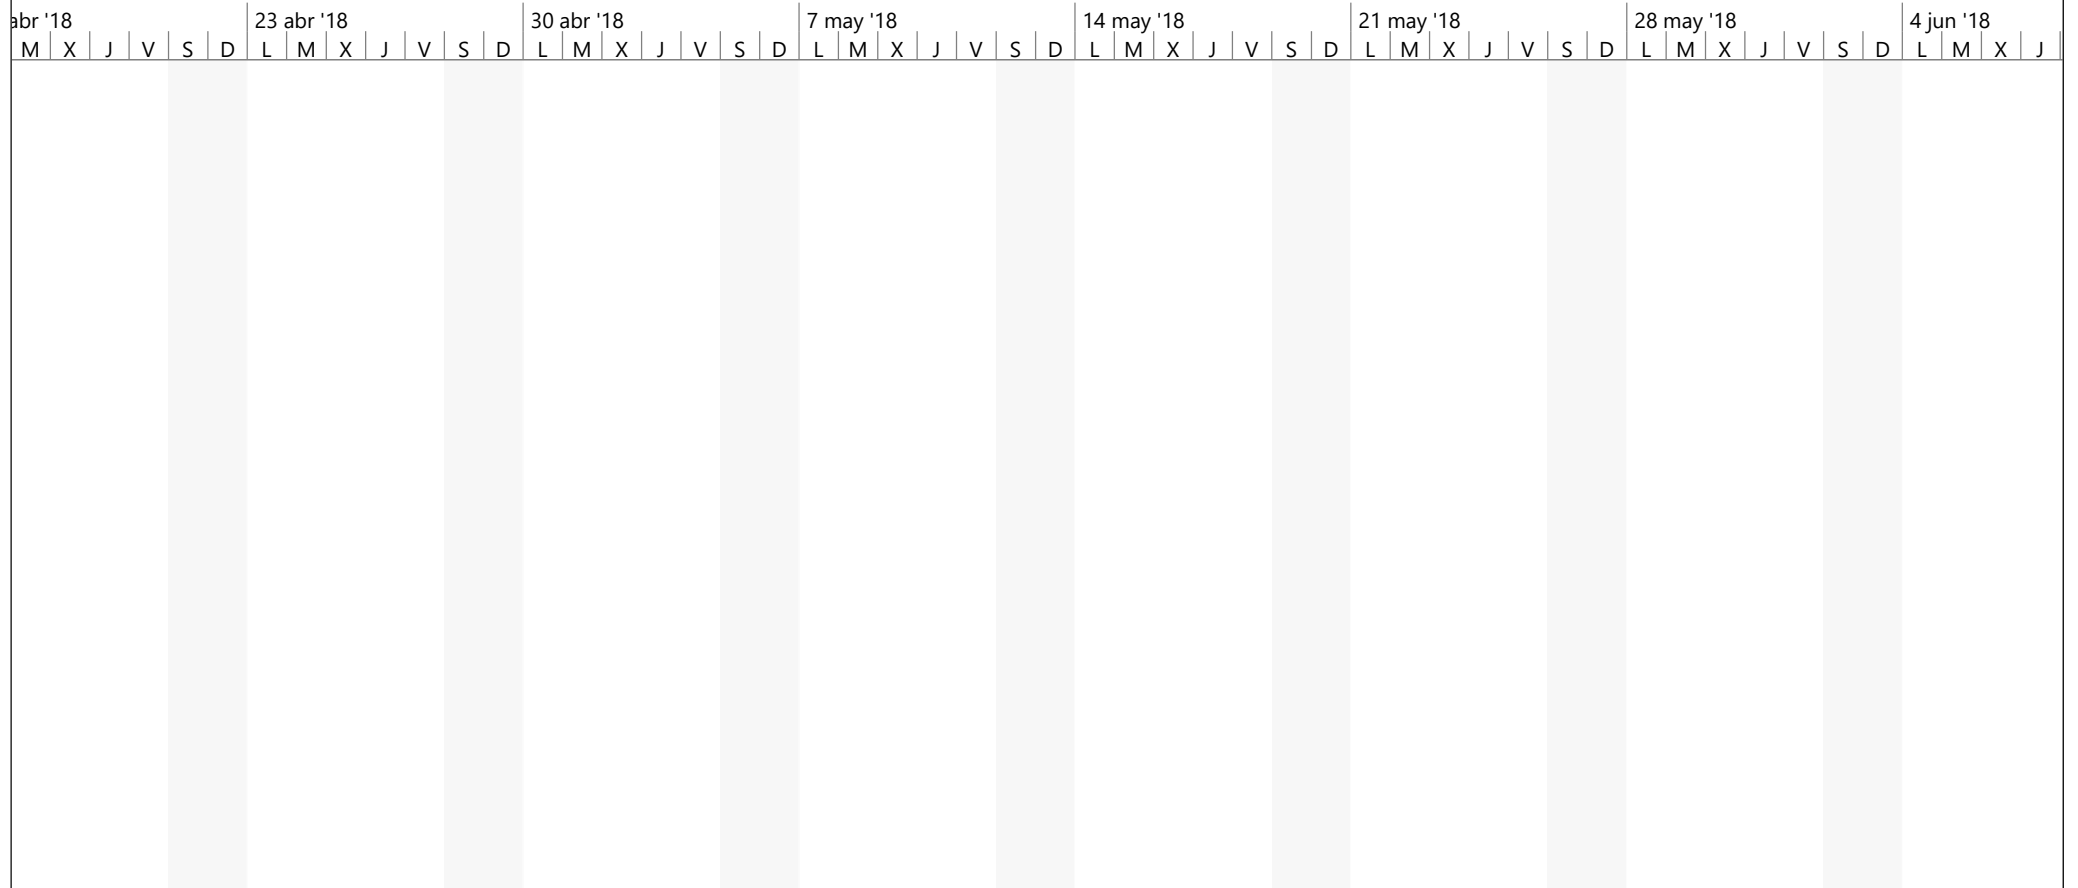


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

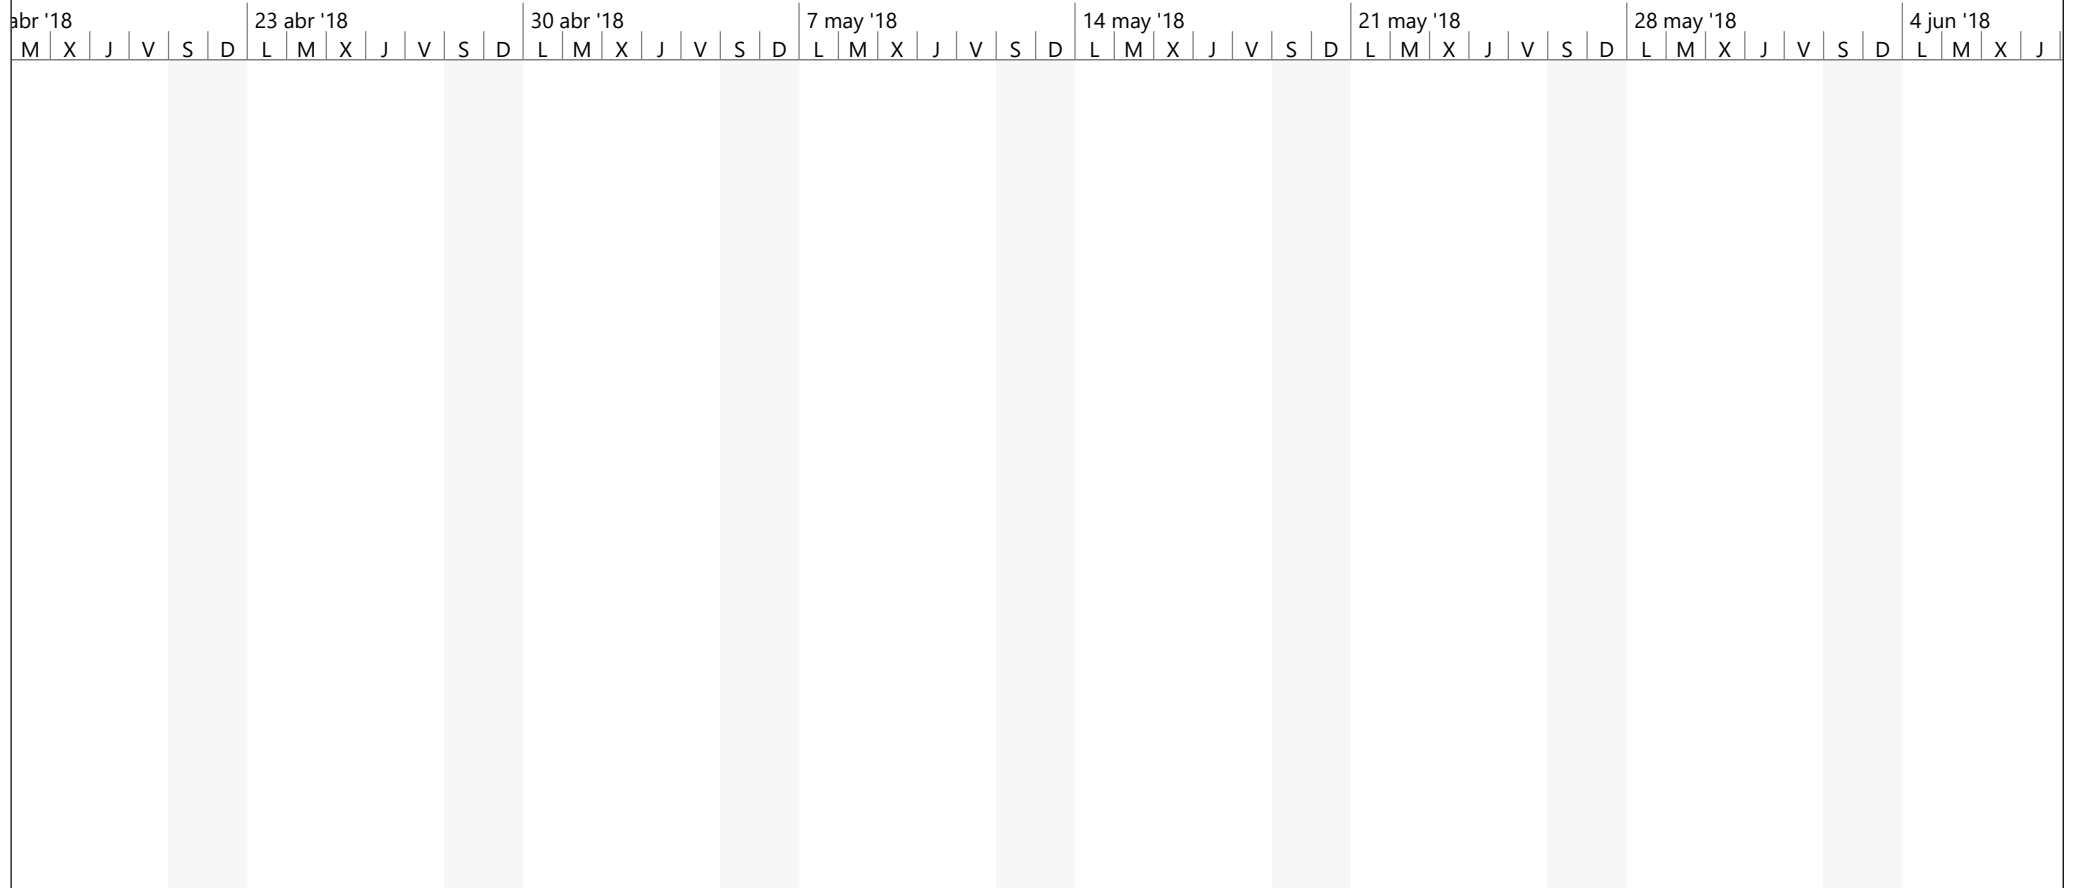

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

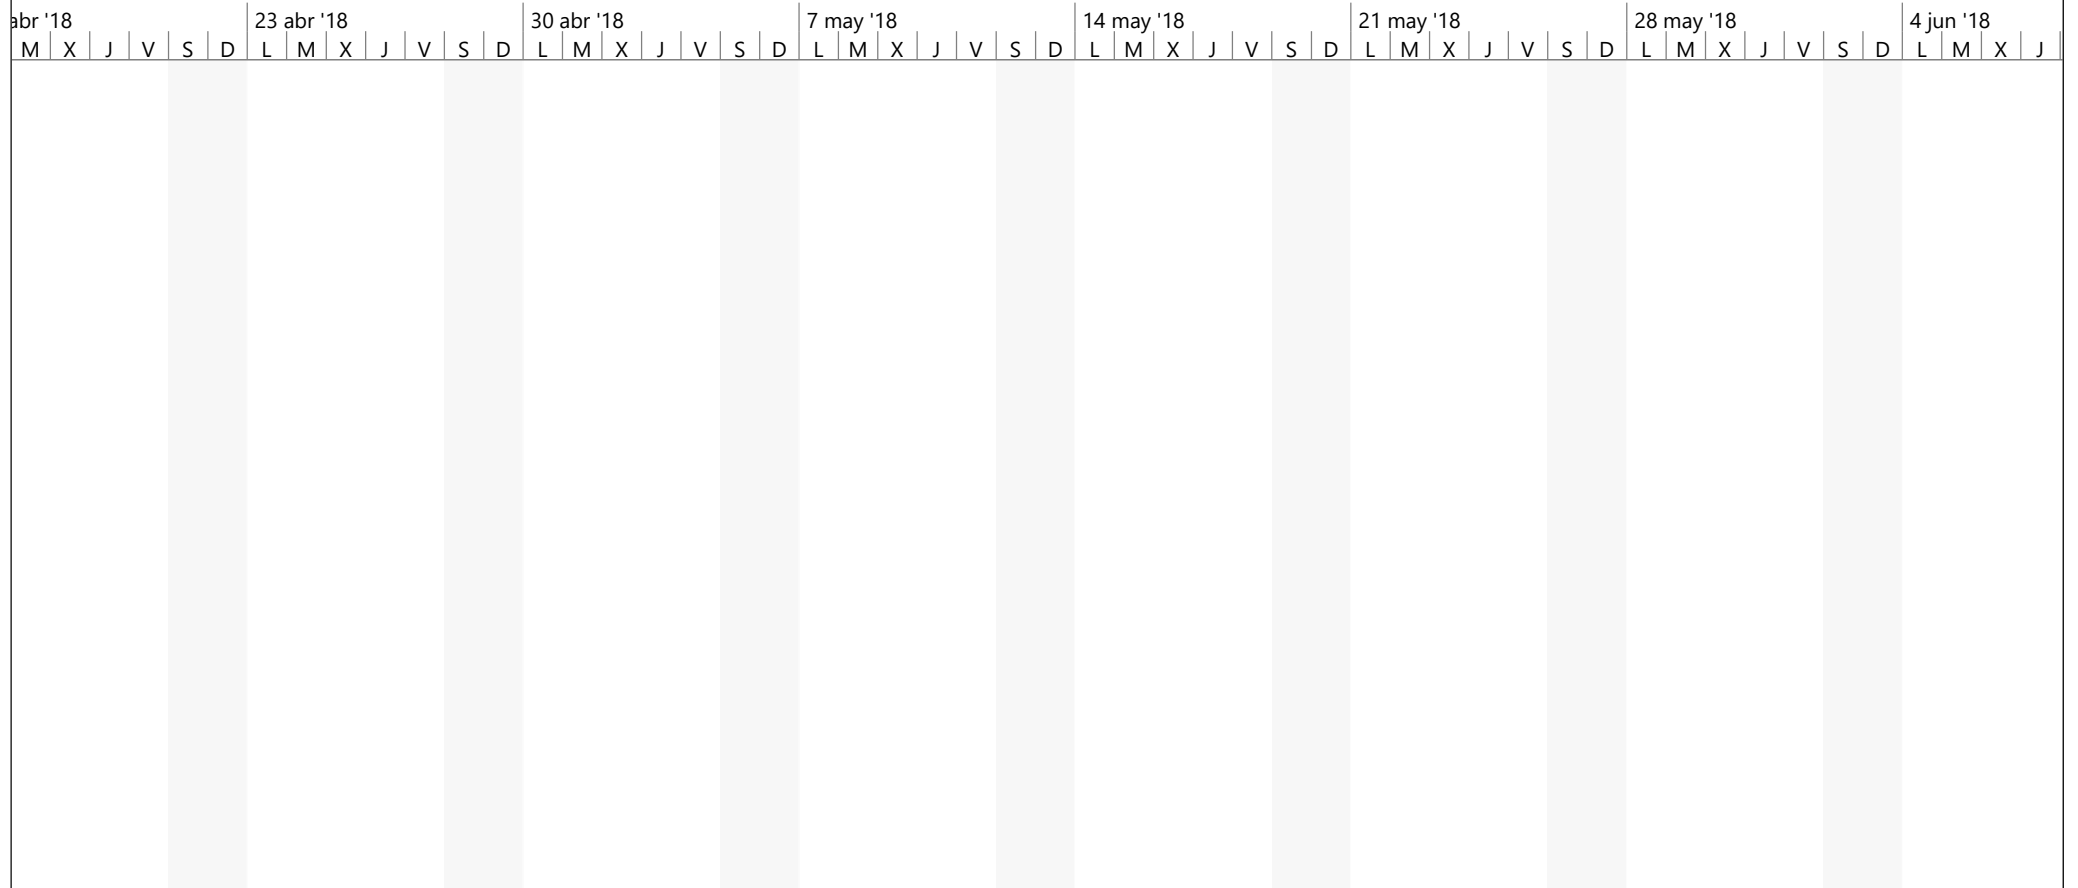


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

























| abr '18 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 30 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 7 may '18 |   |   |   |   |   |   | 14 may '18 |   |   |   |   |   |   | 21 may '18 |   |   |   |   |   |   | 28 may '18 |   |   |  |  |  |  | 4 jun '18 |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| M       | X | J | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D | L | M         | X | J | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D | L | M          | X | J |  |  |  |  |           |  |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   | 11 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 18 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 25 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 2 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 9 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 16 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 23 jul '18 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

























|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



























[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| 30 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 6 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 13 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 20 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 27 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 3 sep '18 |   |   |   |   |   |   | 10 sep '18 |   |   |  |  |  |  | 17 sep '18 |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|
| L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X |  |  |  |  |            |  |  |
|            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |  |  |  |            |  |  |




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

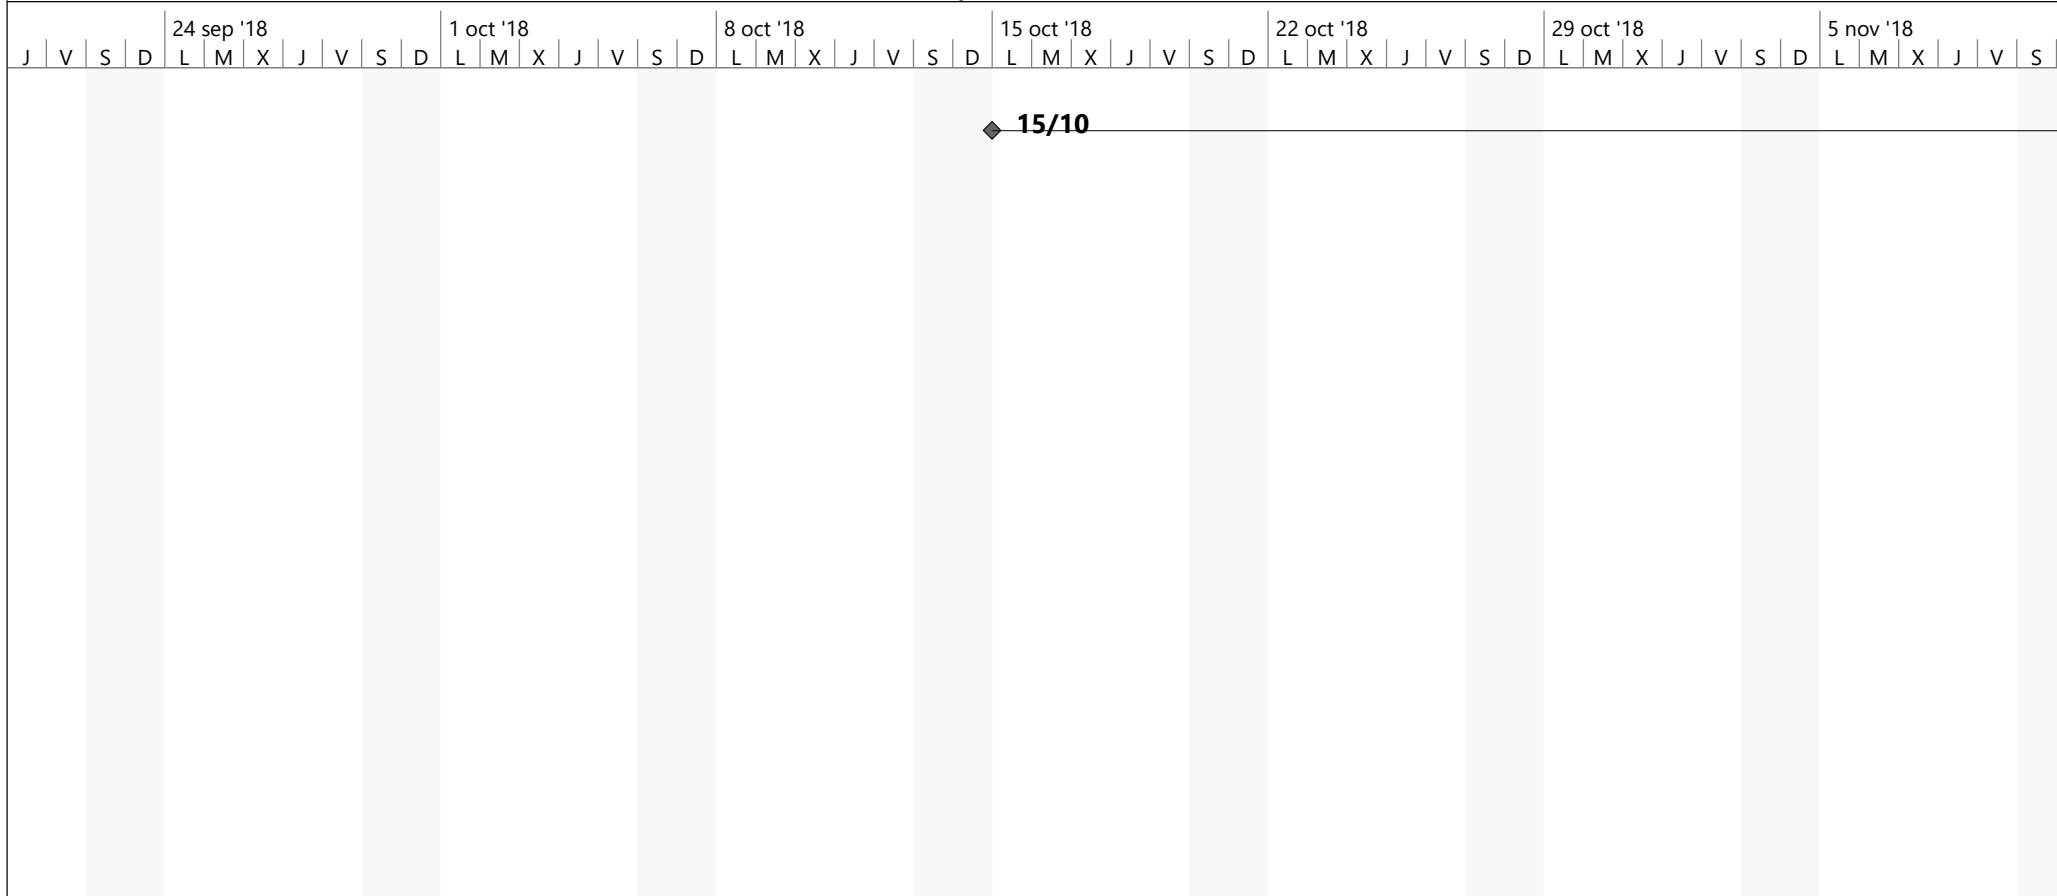


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

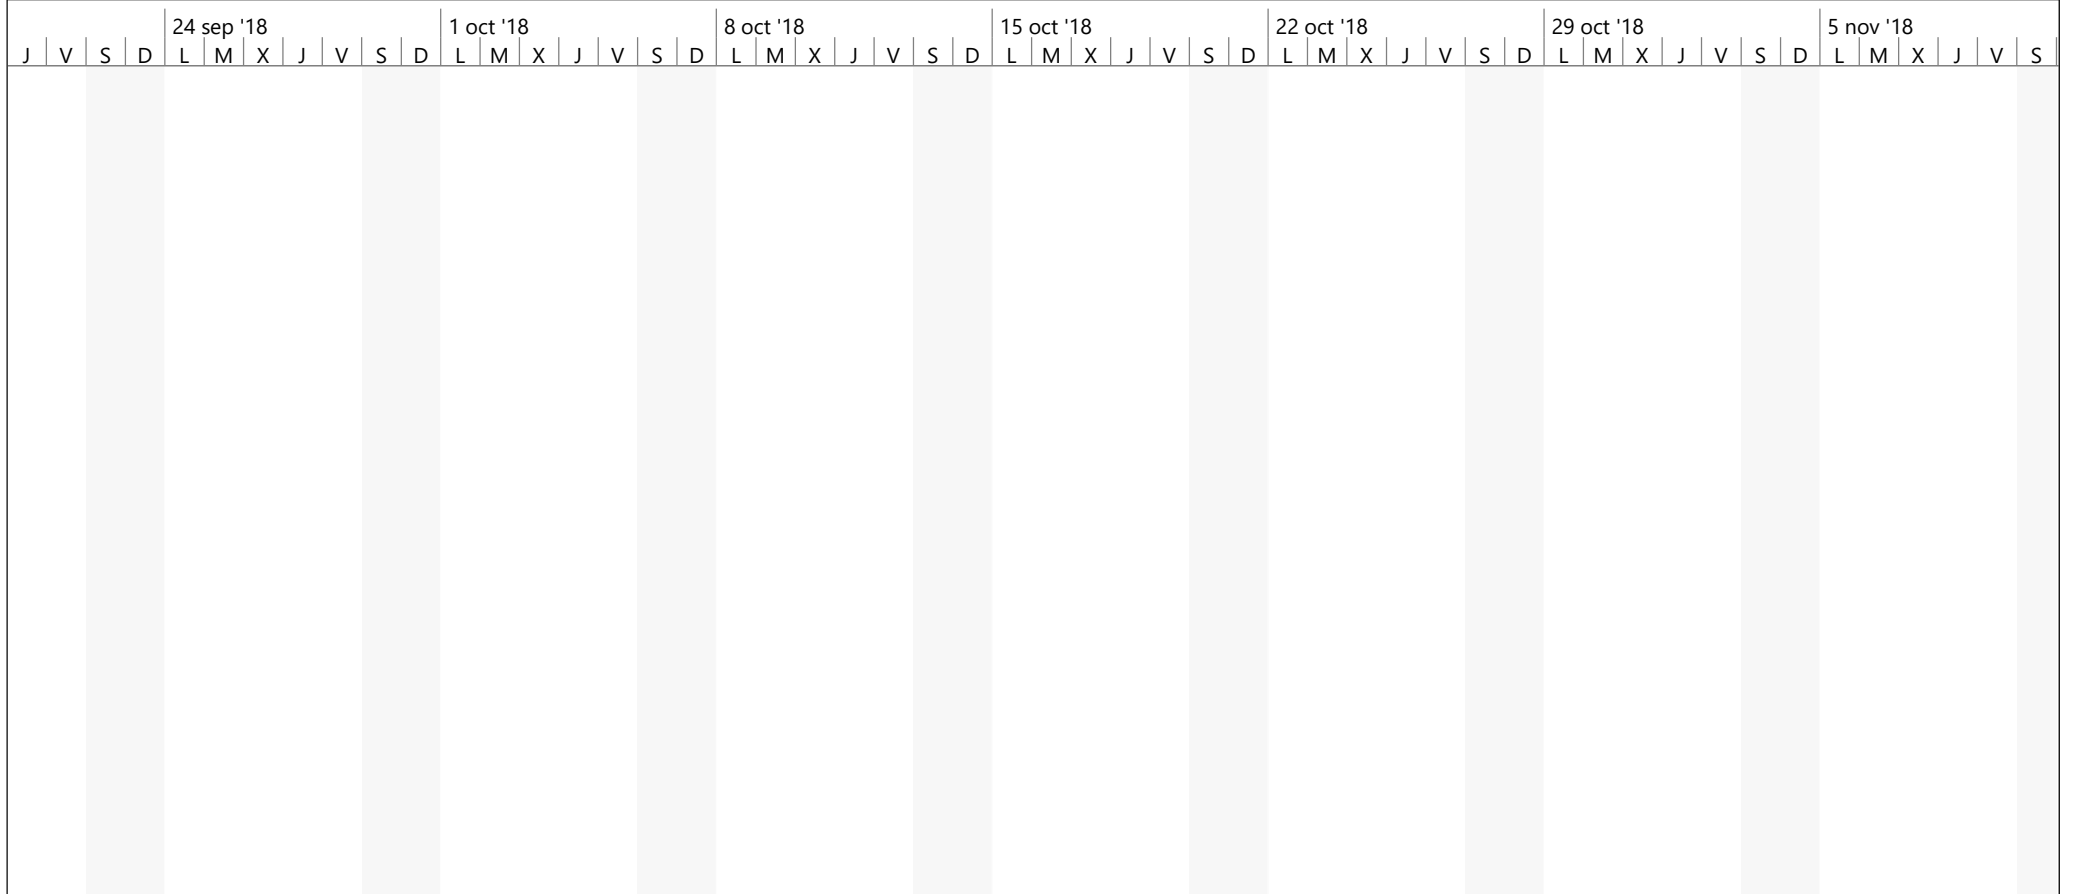


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

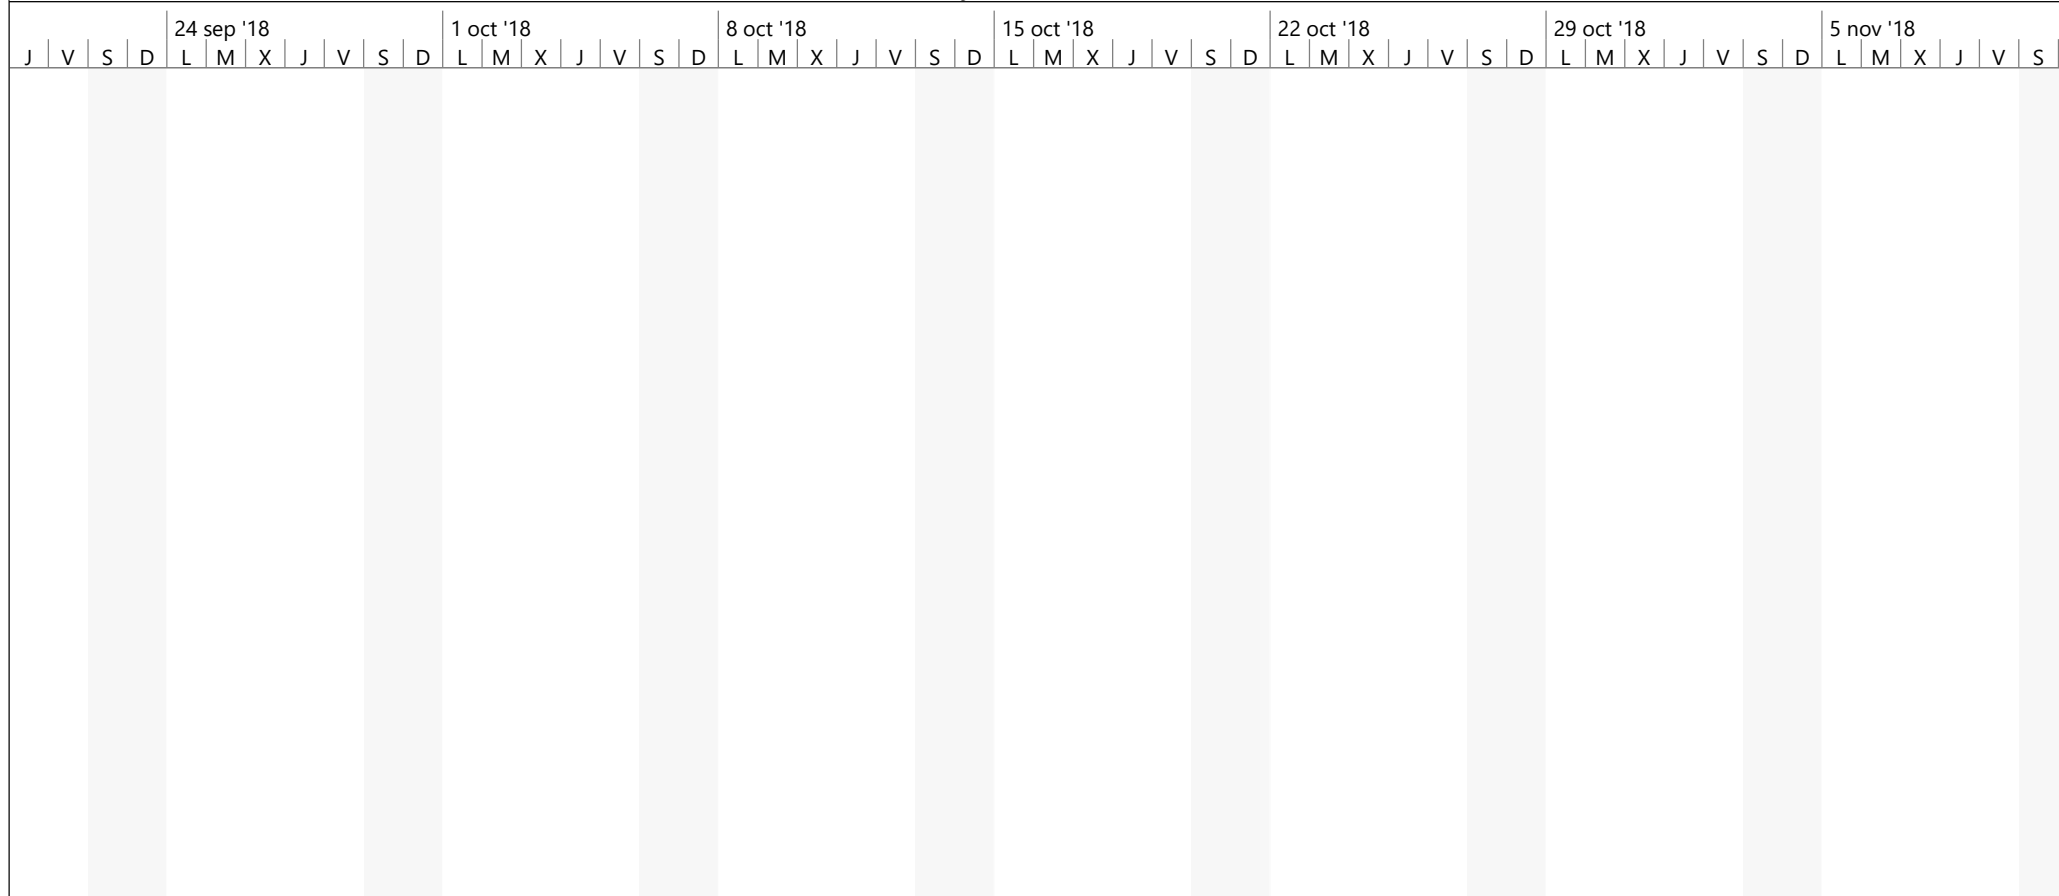

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

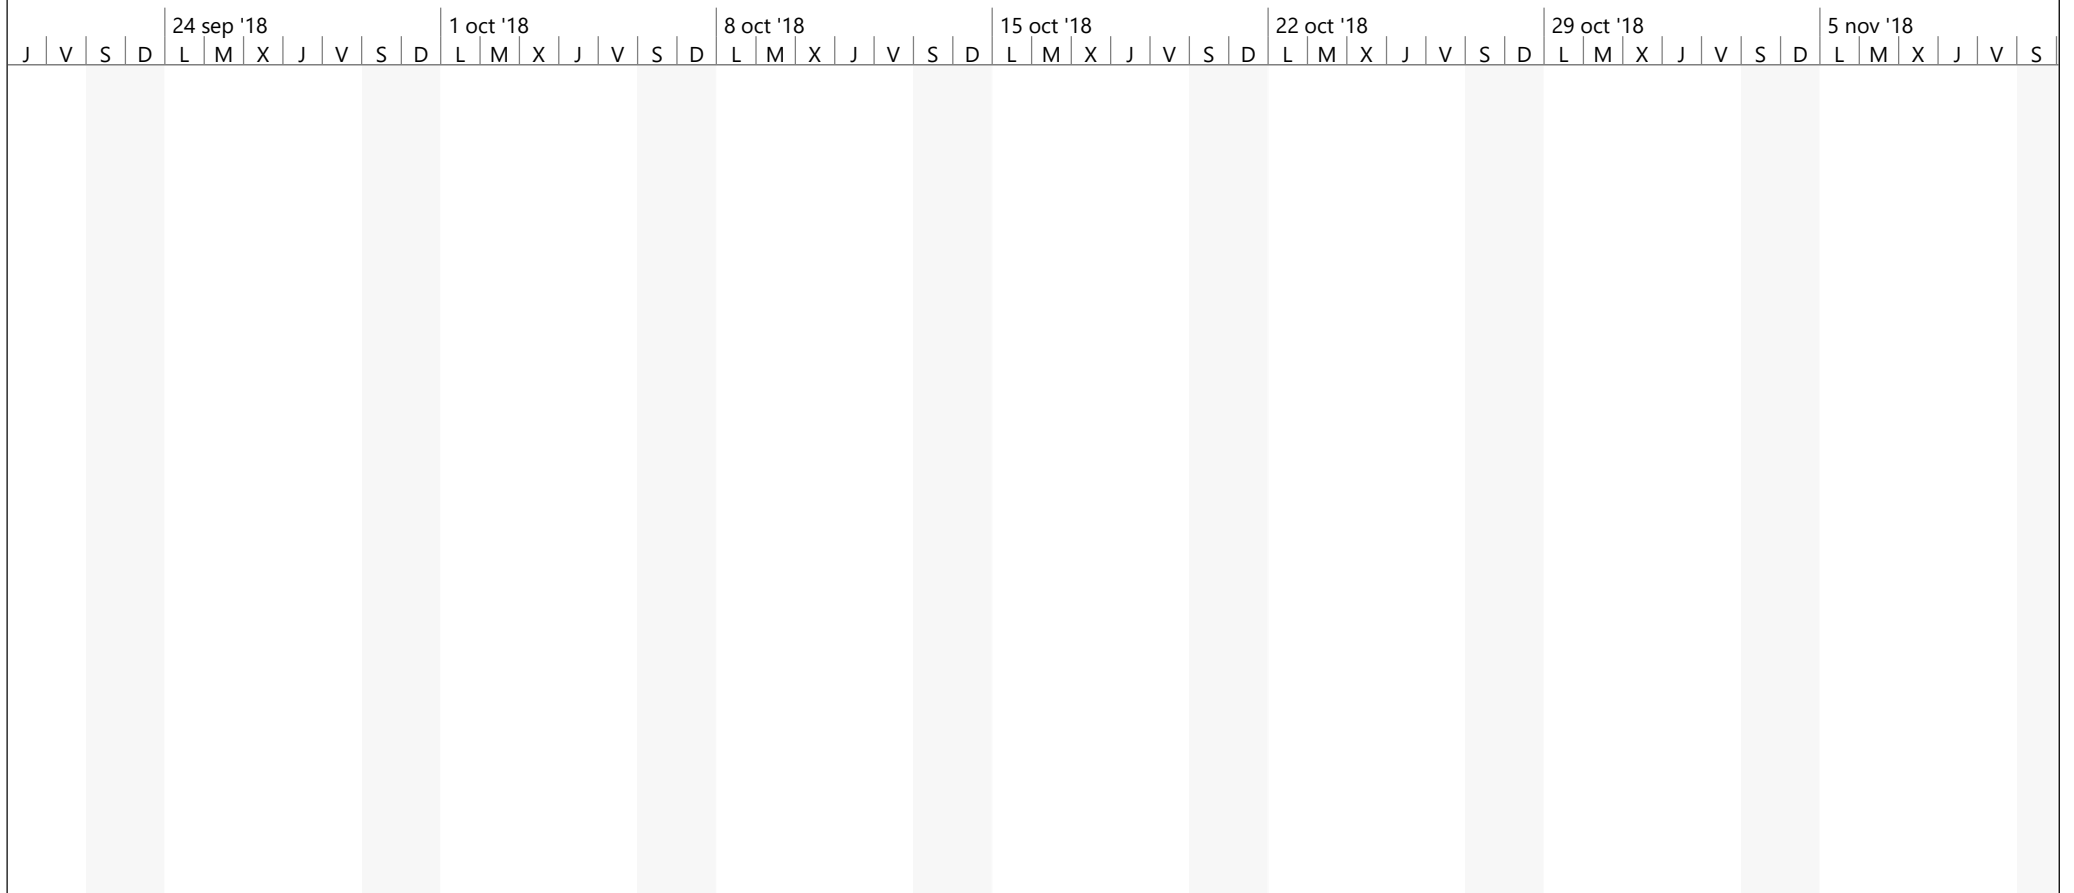

























|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

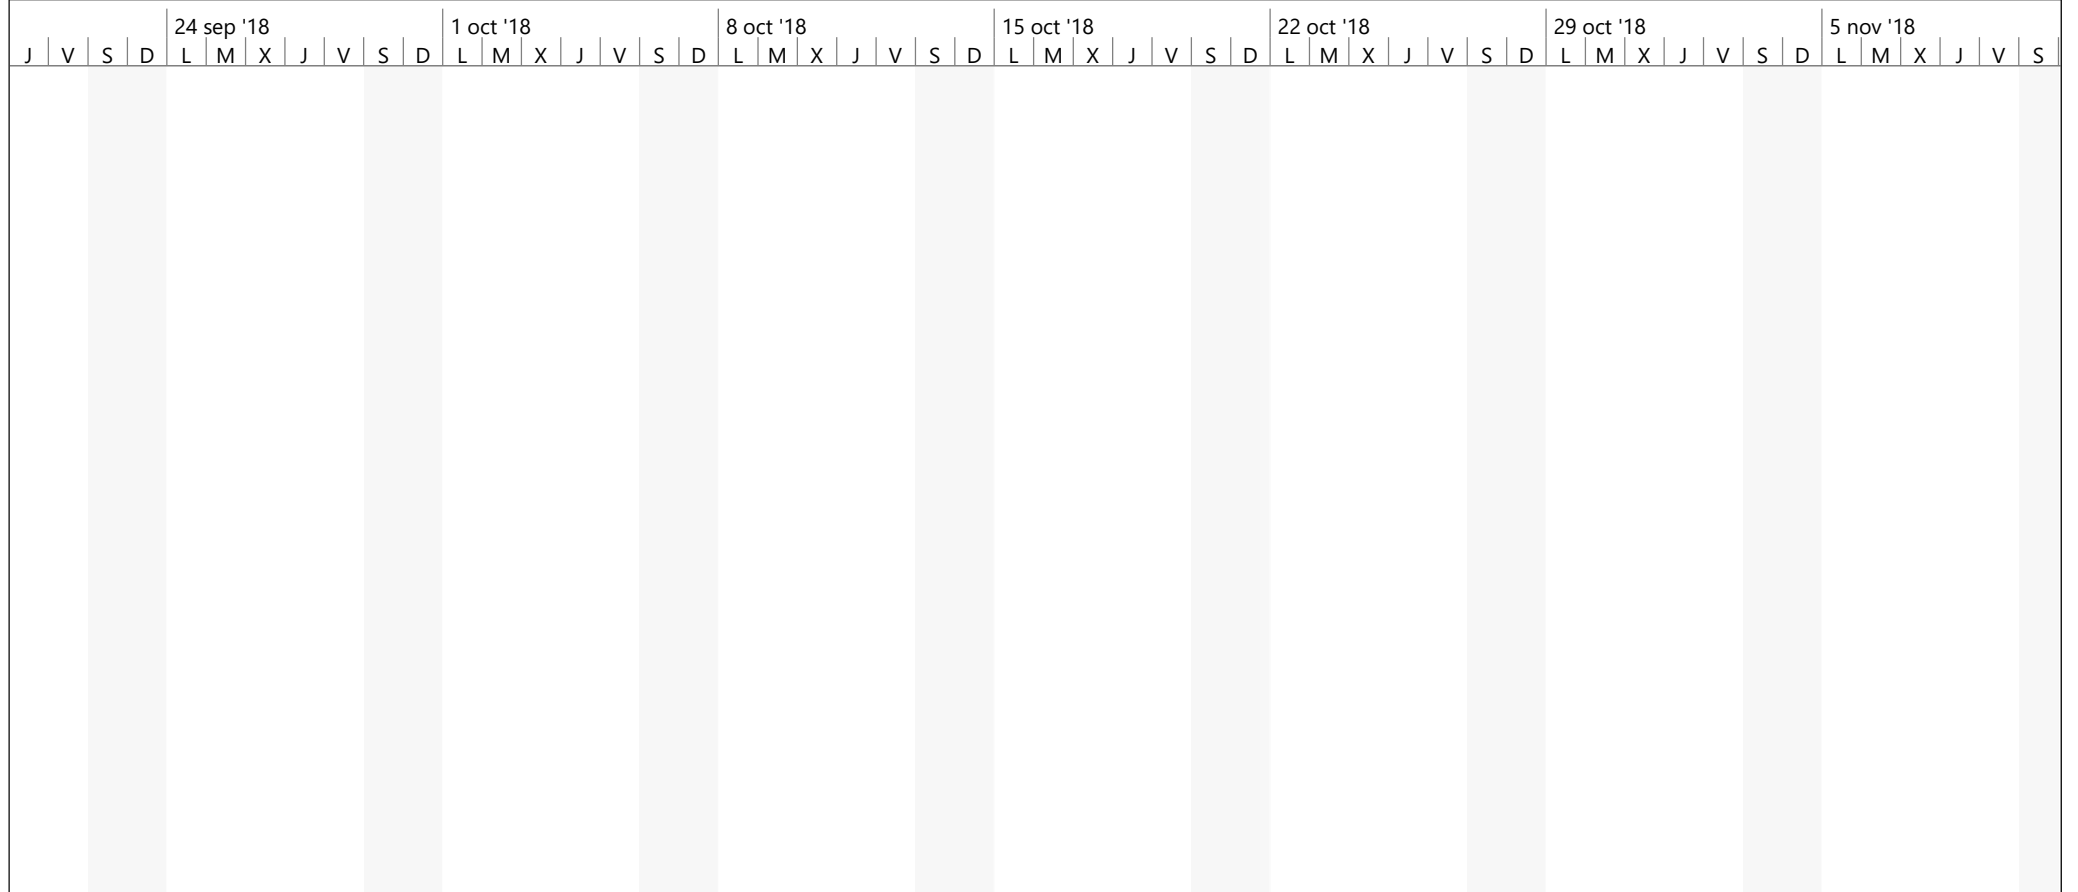

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

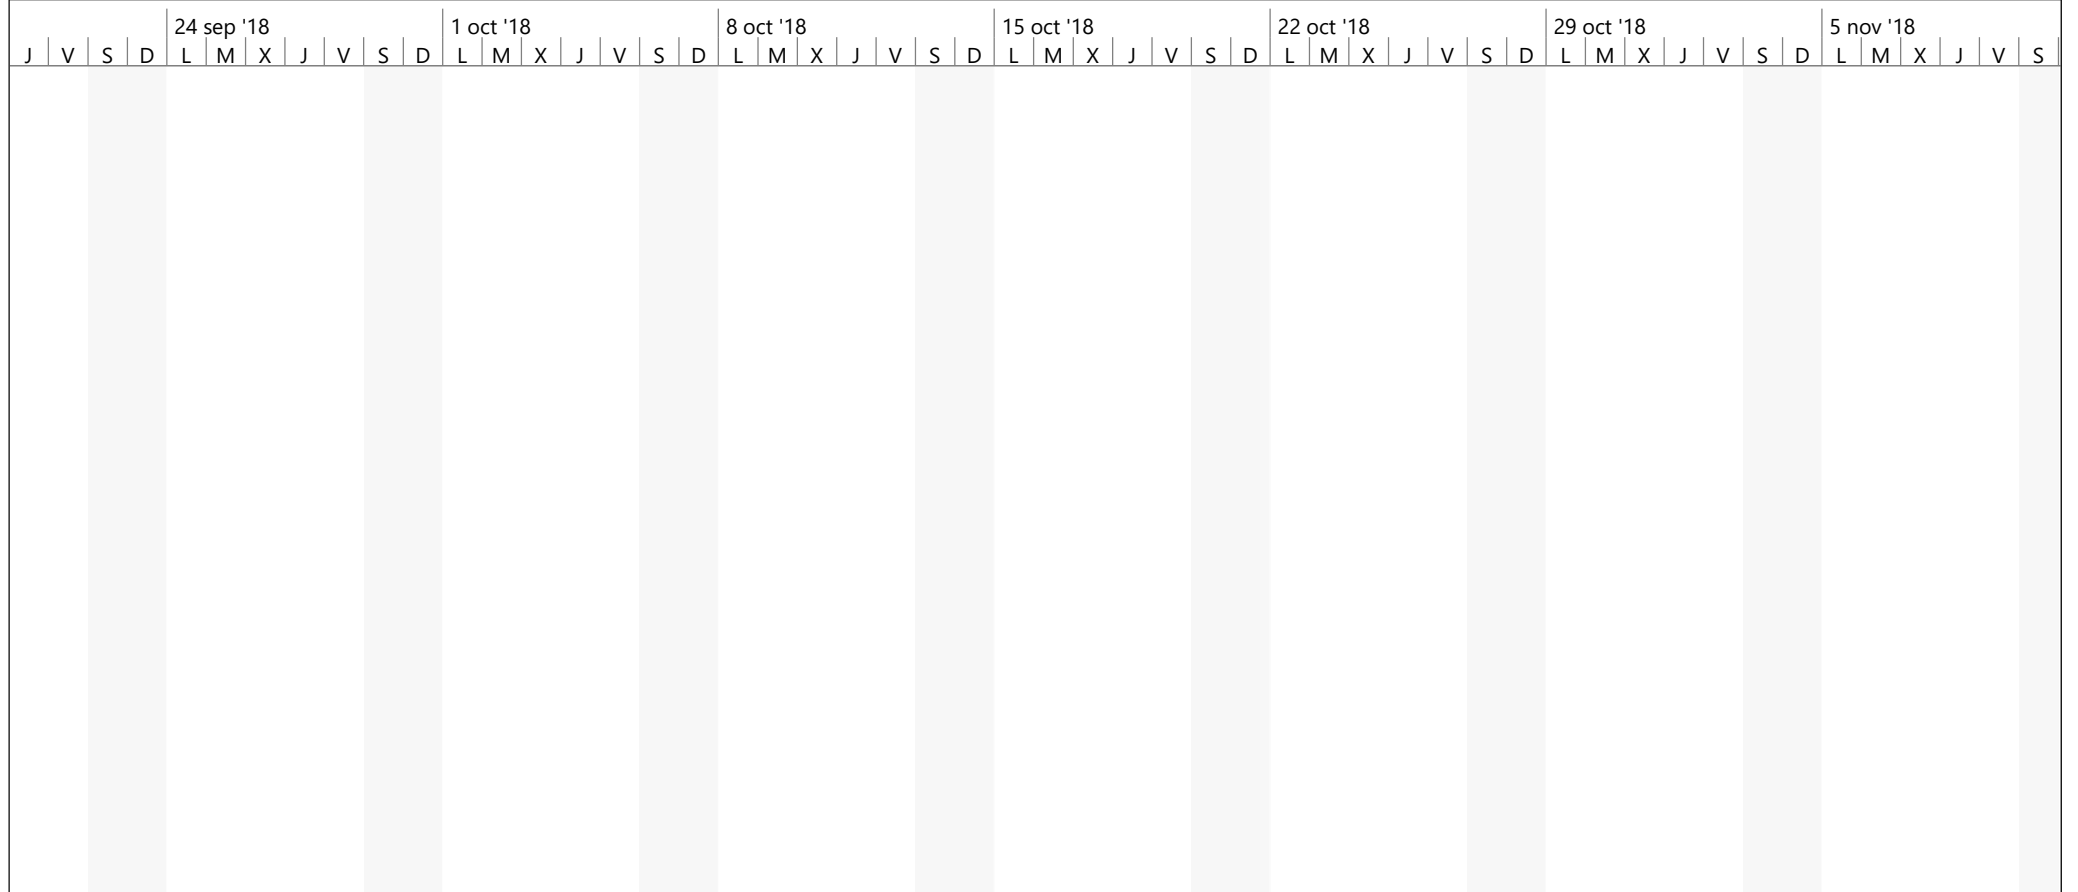


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   |   | 24 sep '18 |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V         | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

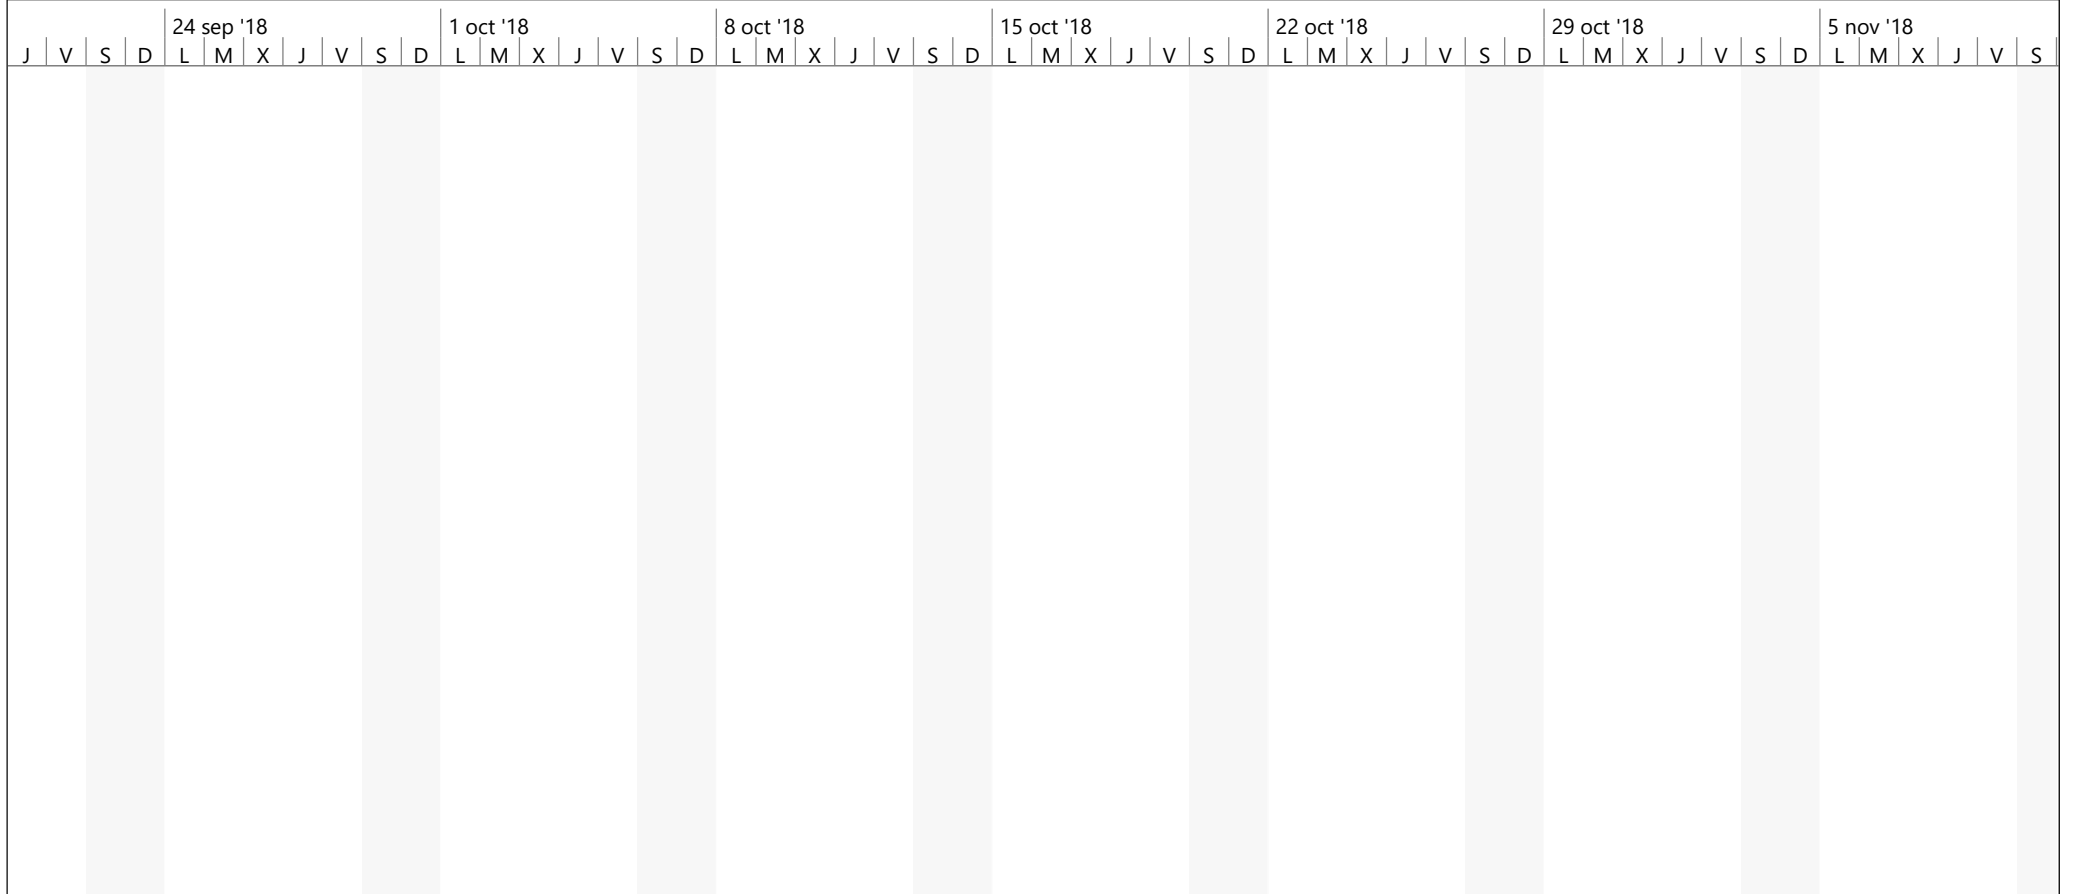


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

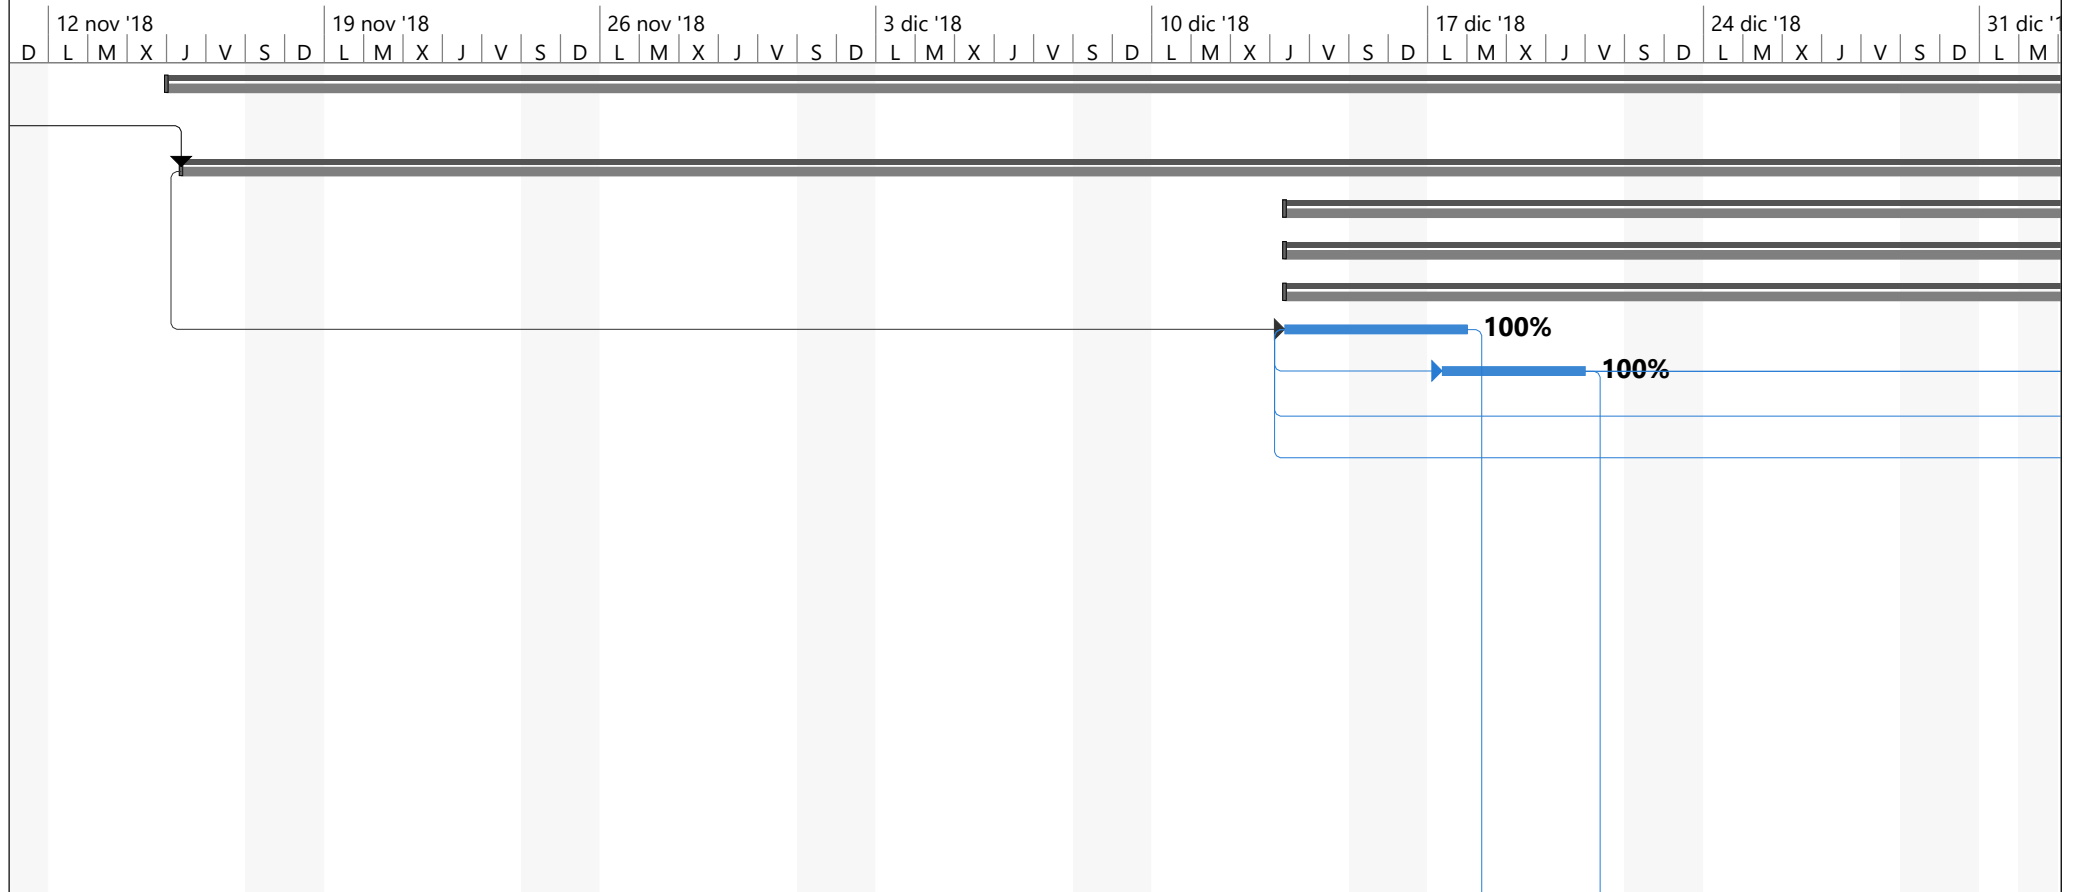

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

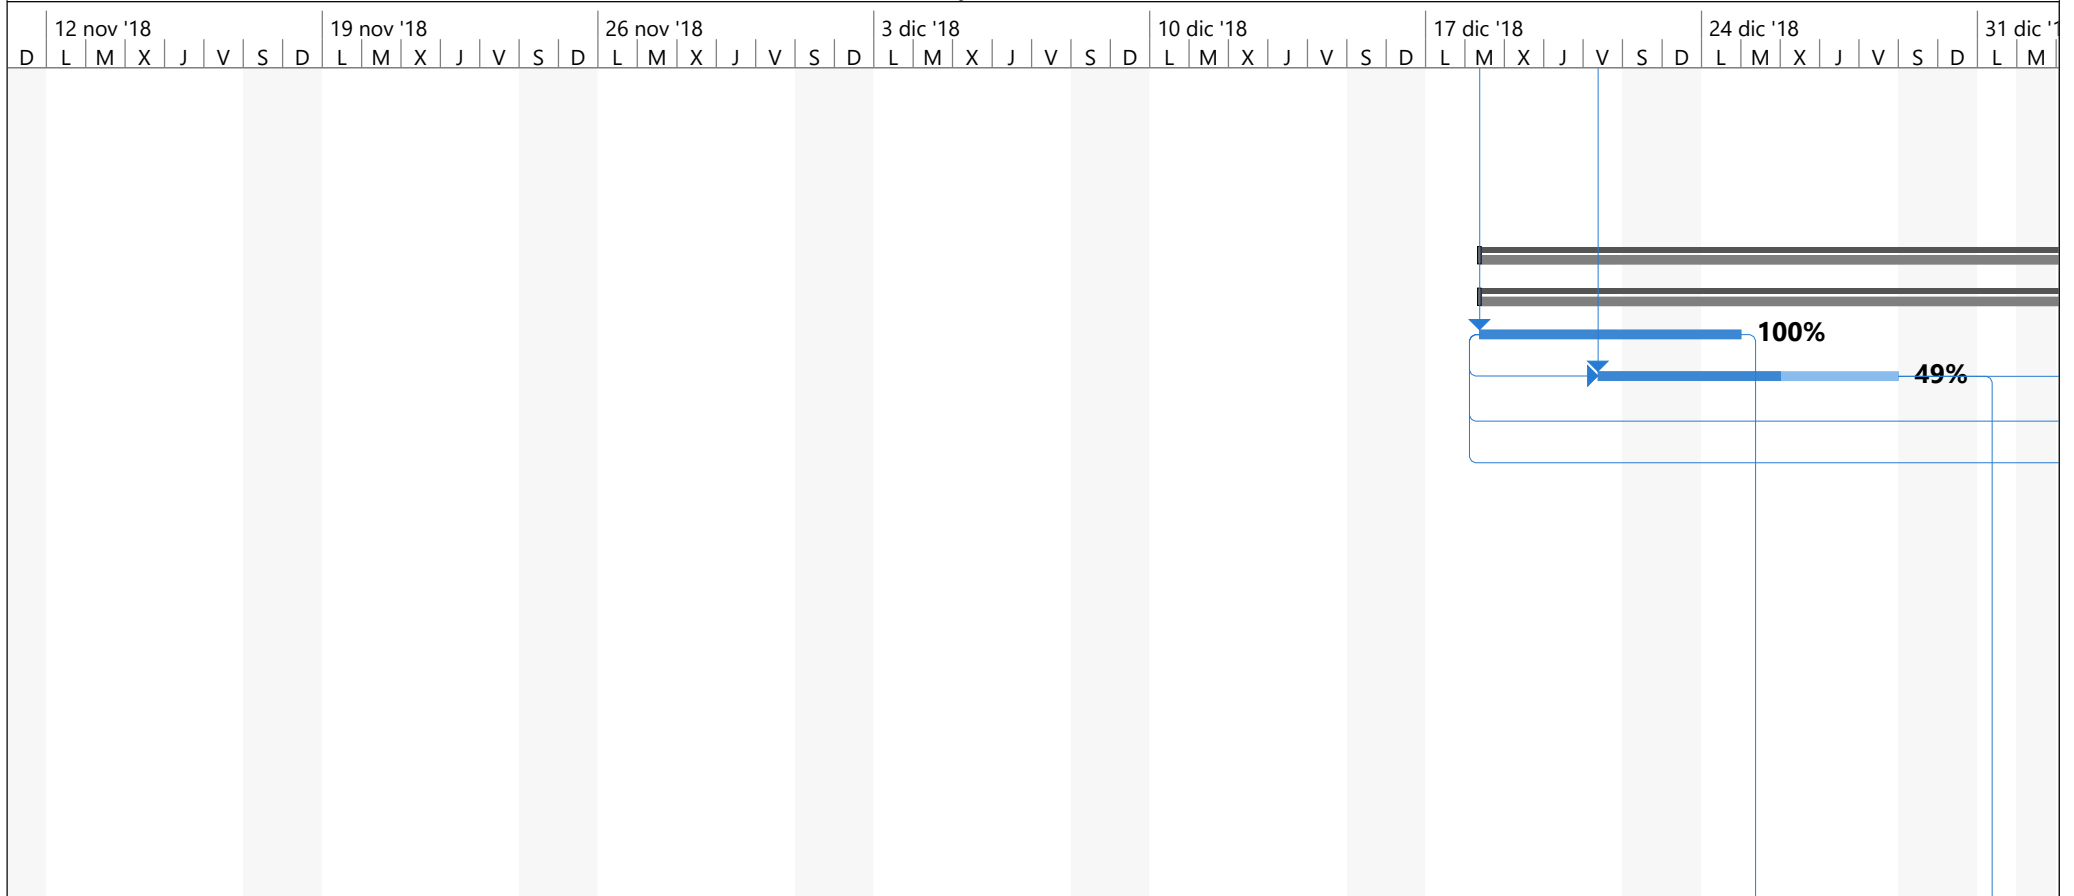

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

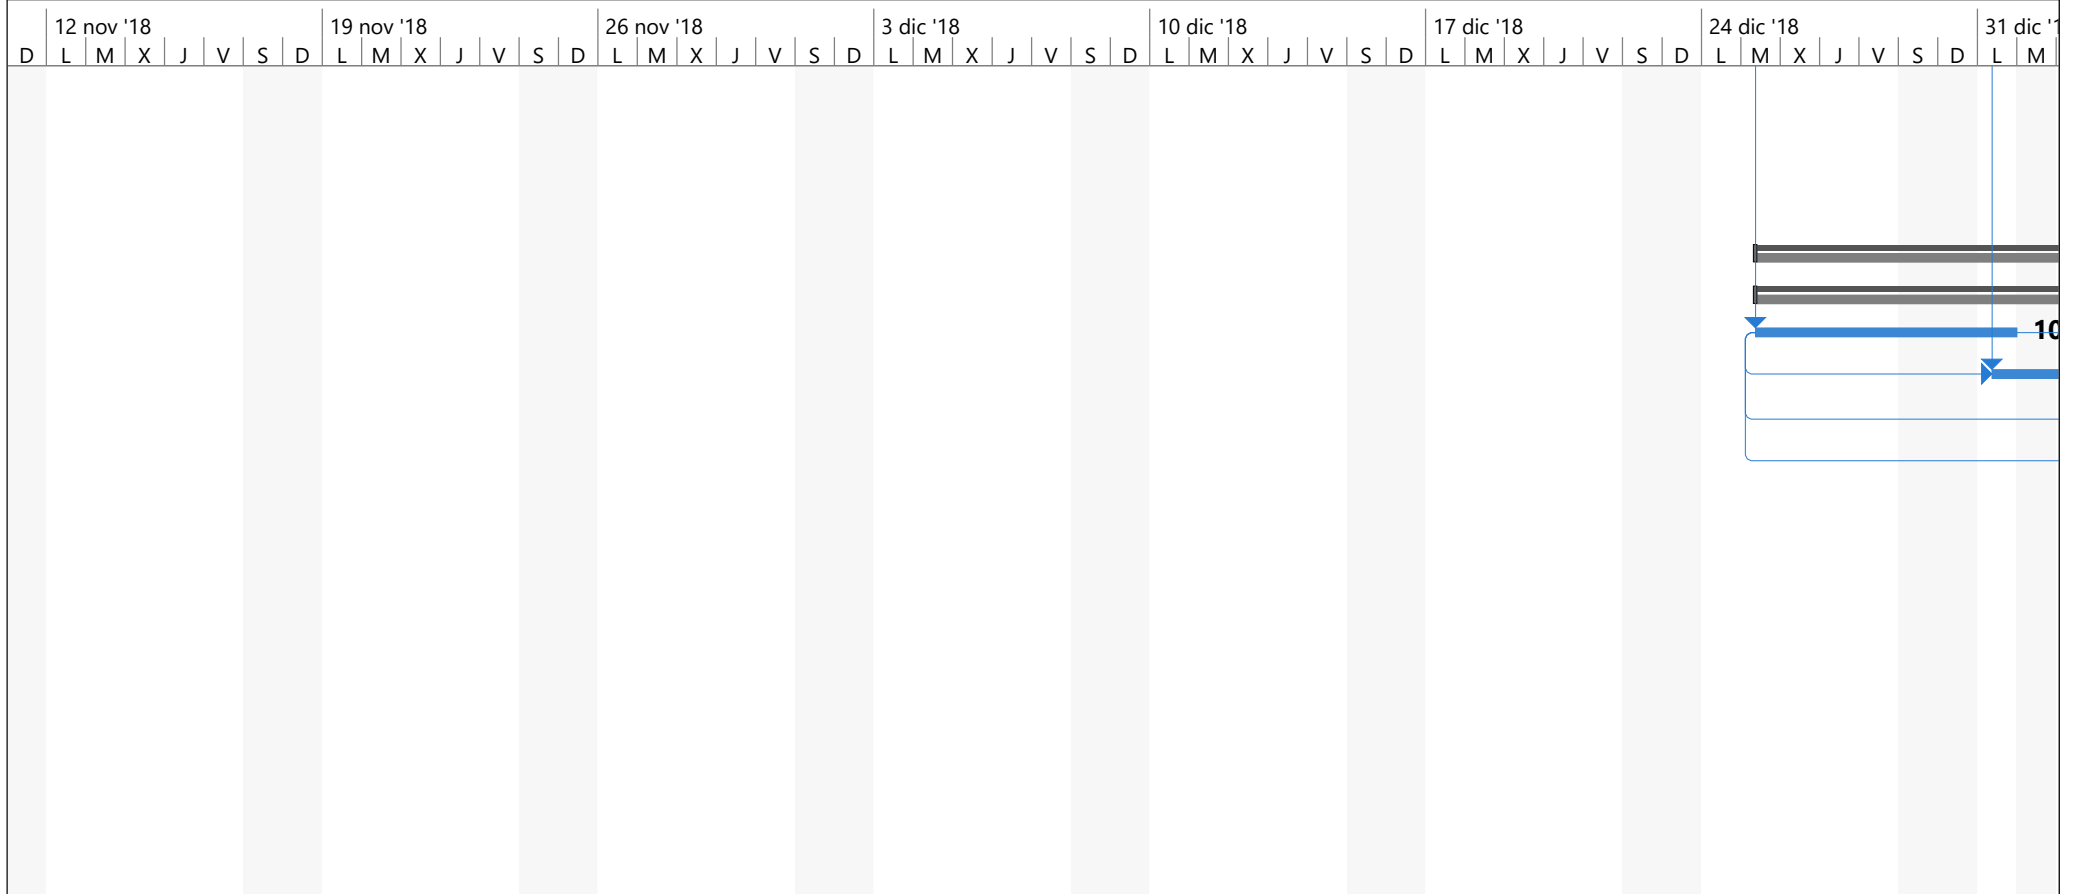

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



























## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

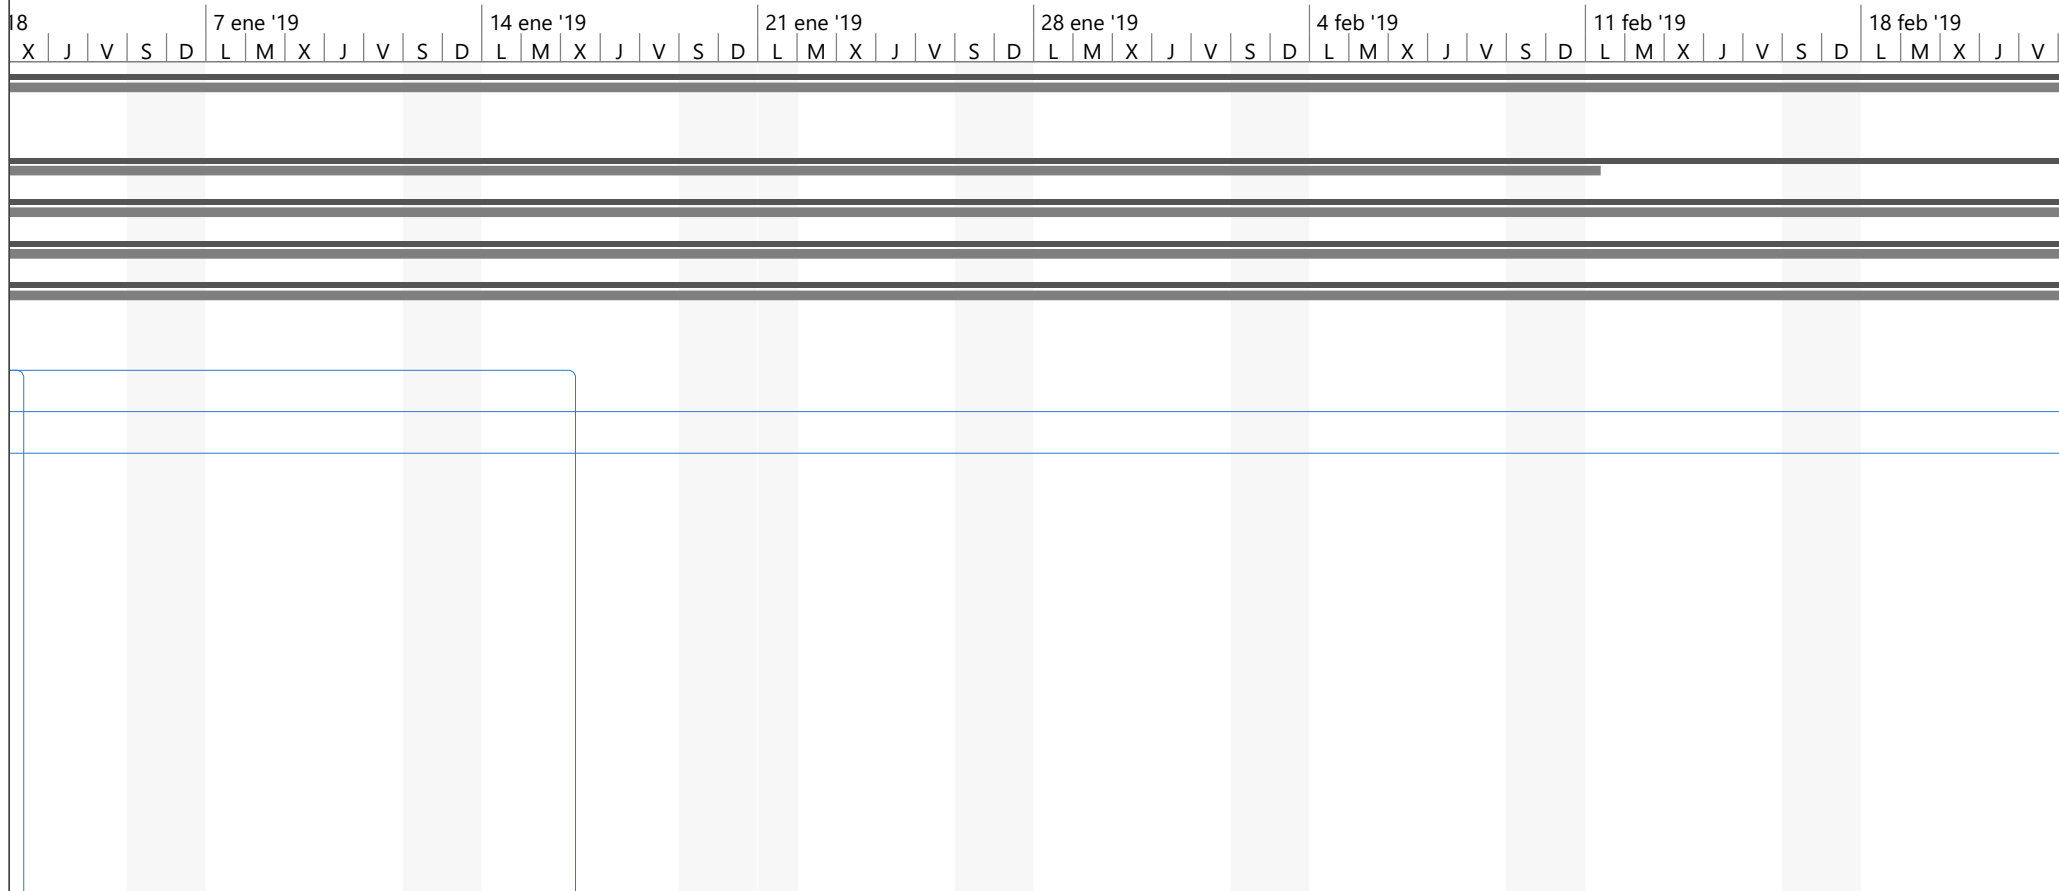


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

| Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020 |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 18                                      |   |   |   |   | 7 ene '19 |   |   |   |   | 14 ene '19 |   |   |   |   | 21 ene '19 |   |   |   |   | 28 ene '19 |   |   |   |   | 4 feb '19 |   |   |   |   | 11 feb '19 |   |   |   |   | 18 feb '19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| X                                       | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M          | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X          | J | V | S | D | L | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



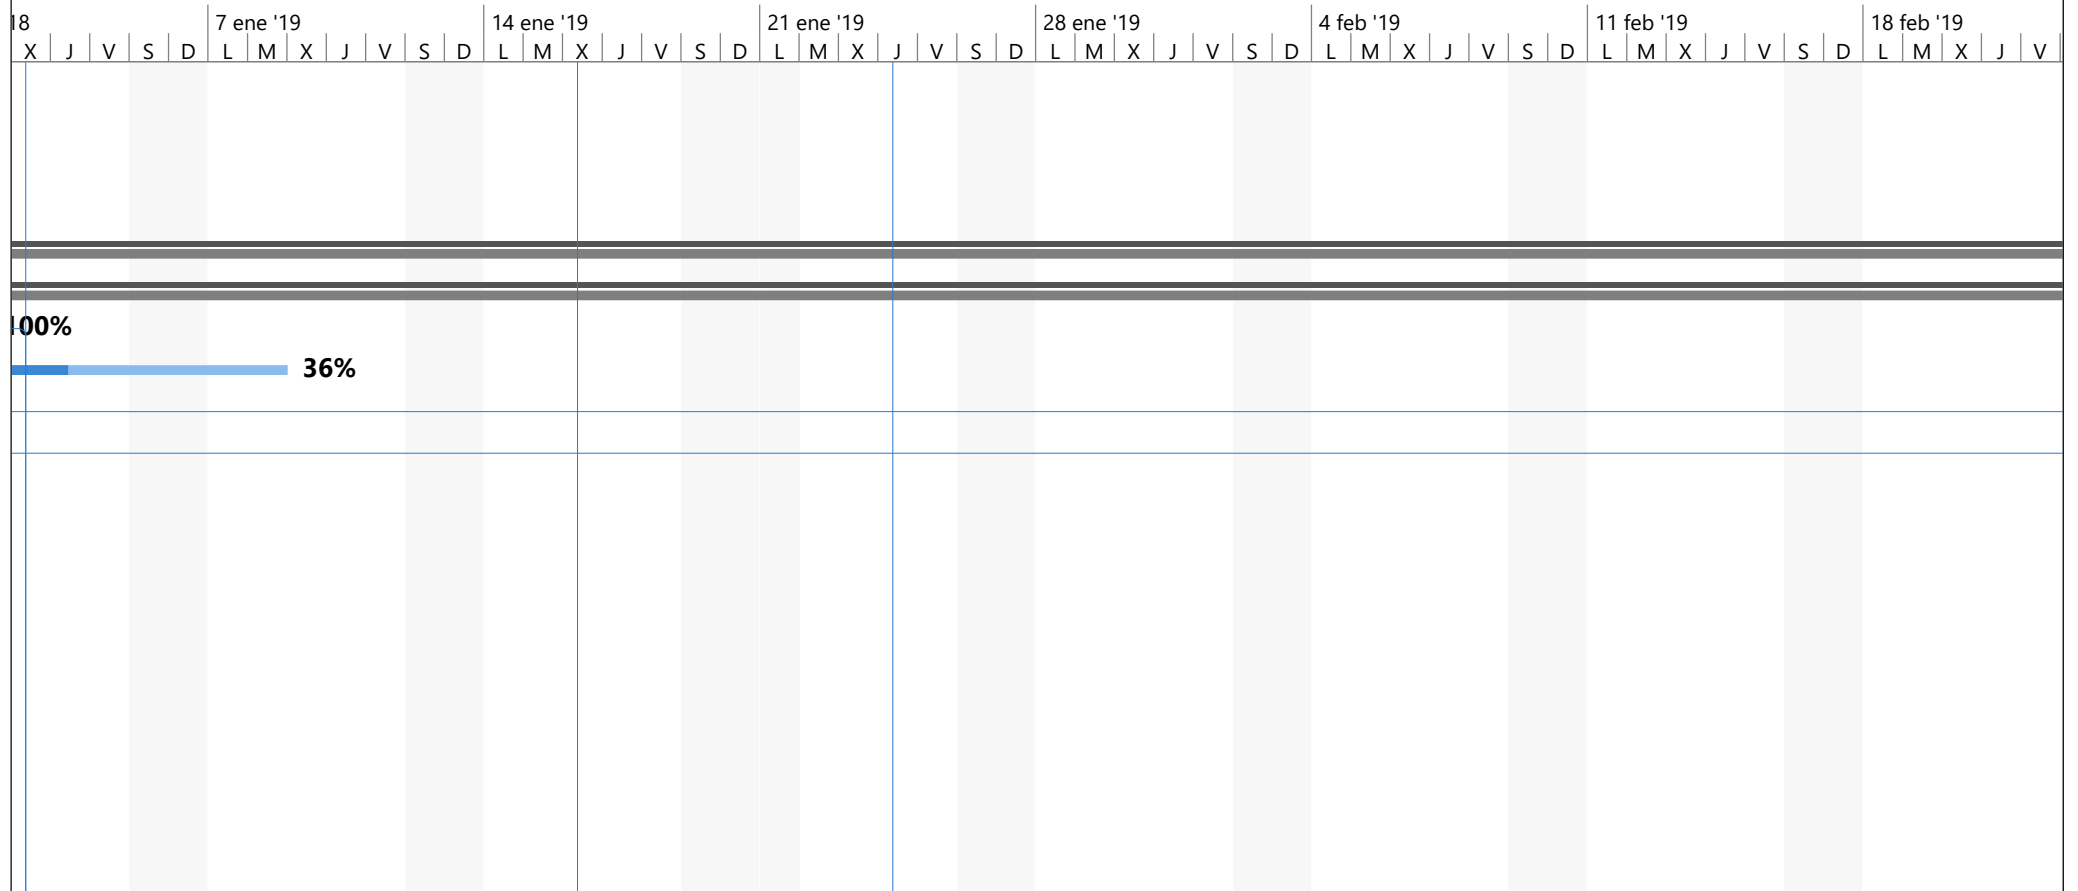





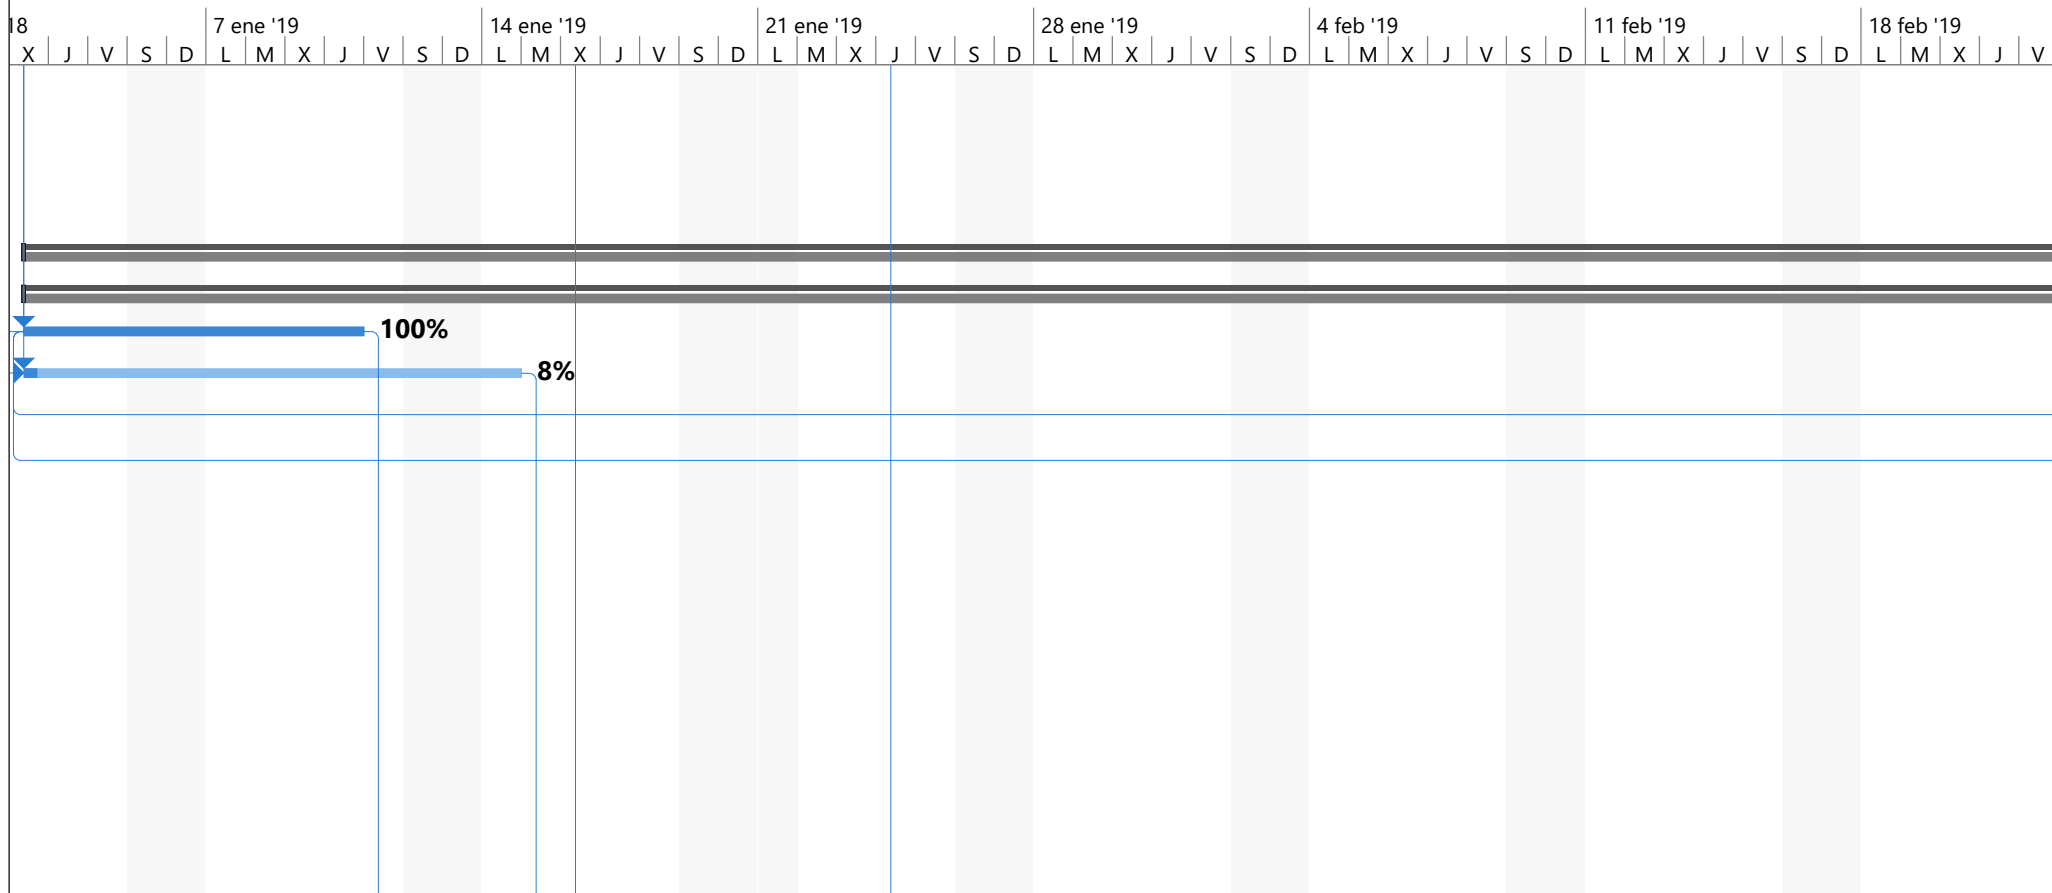















# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020




|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

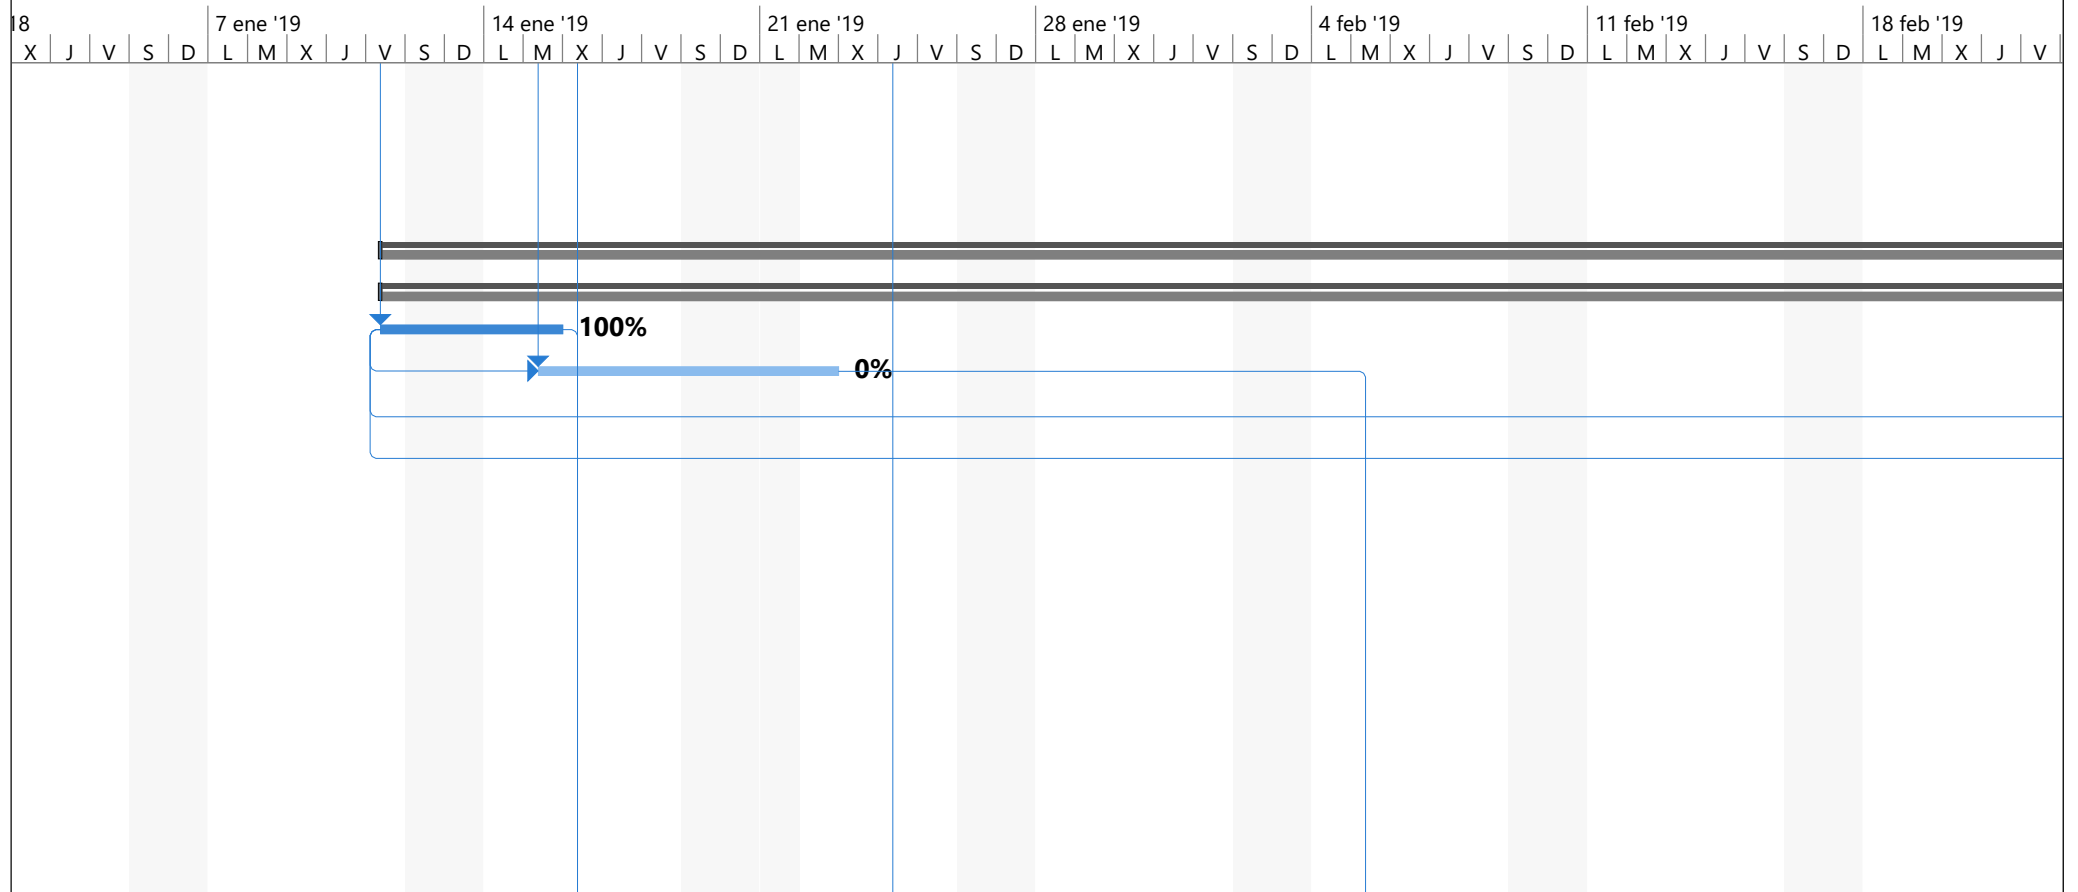

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

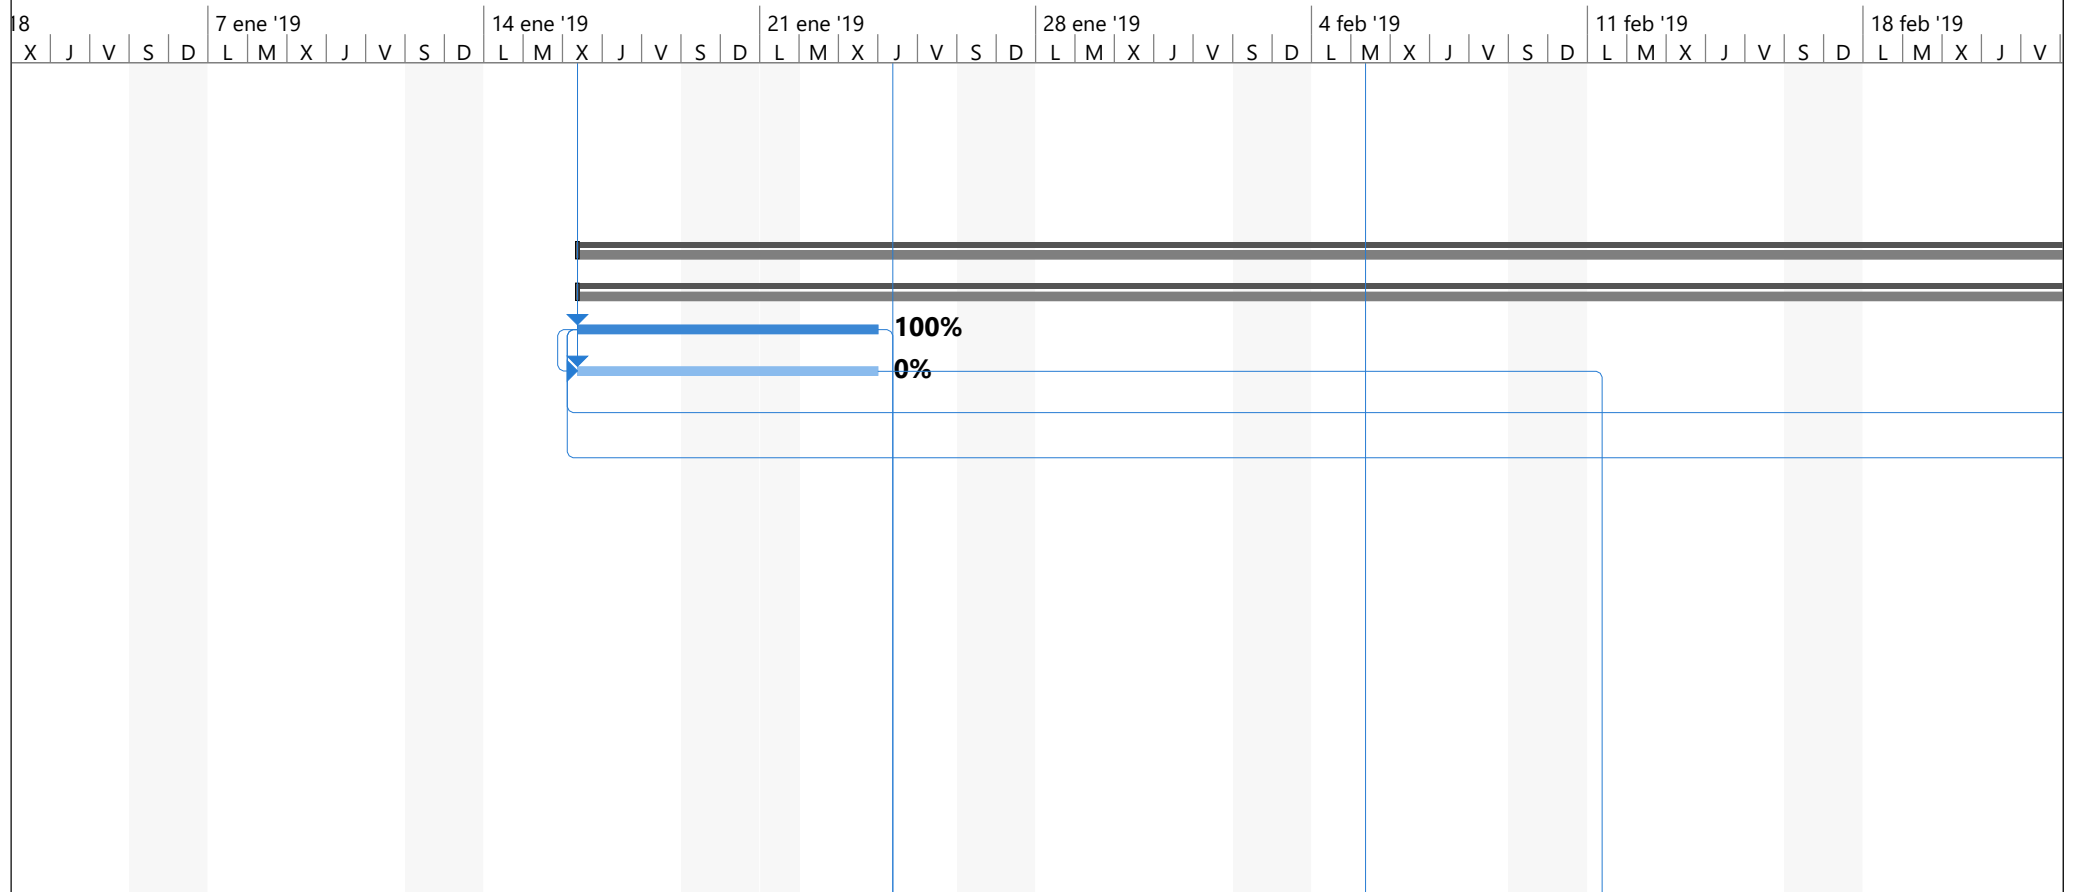

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

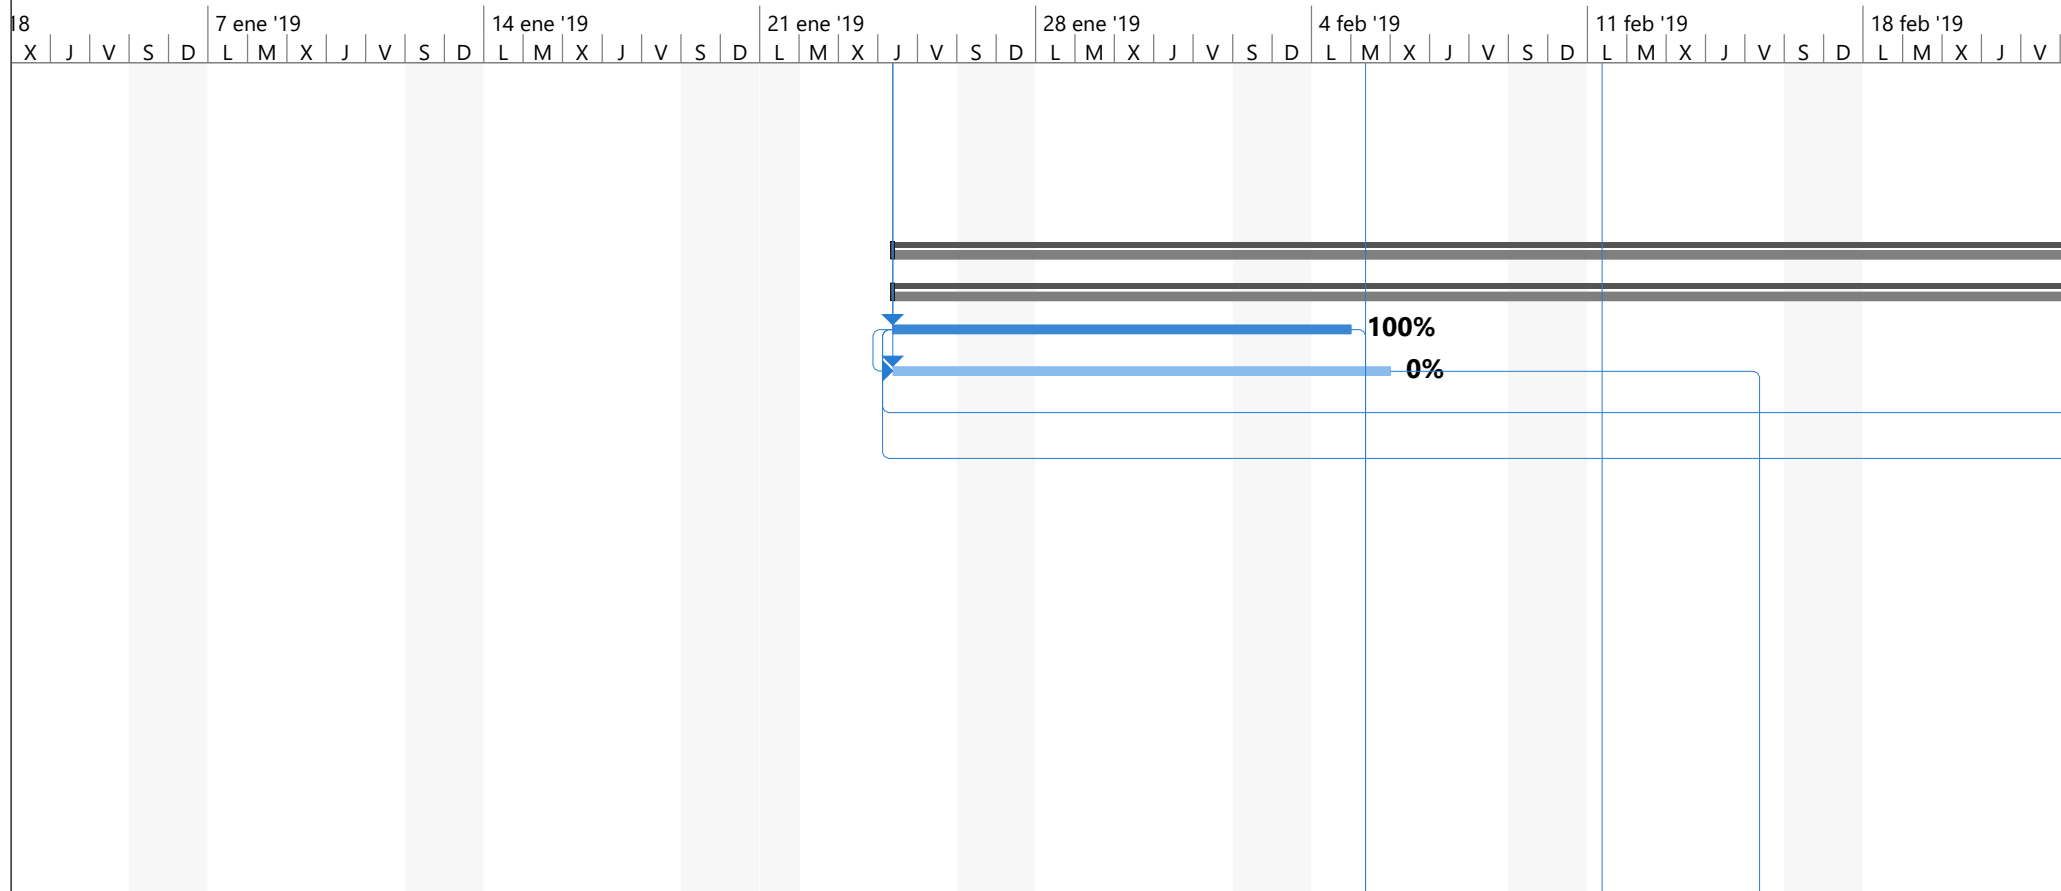


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

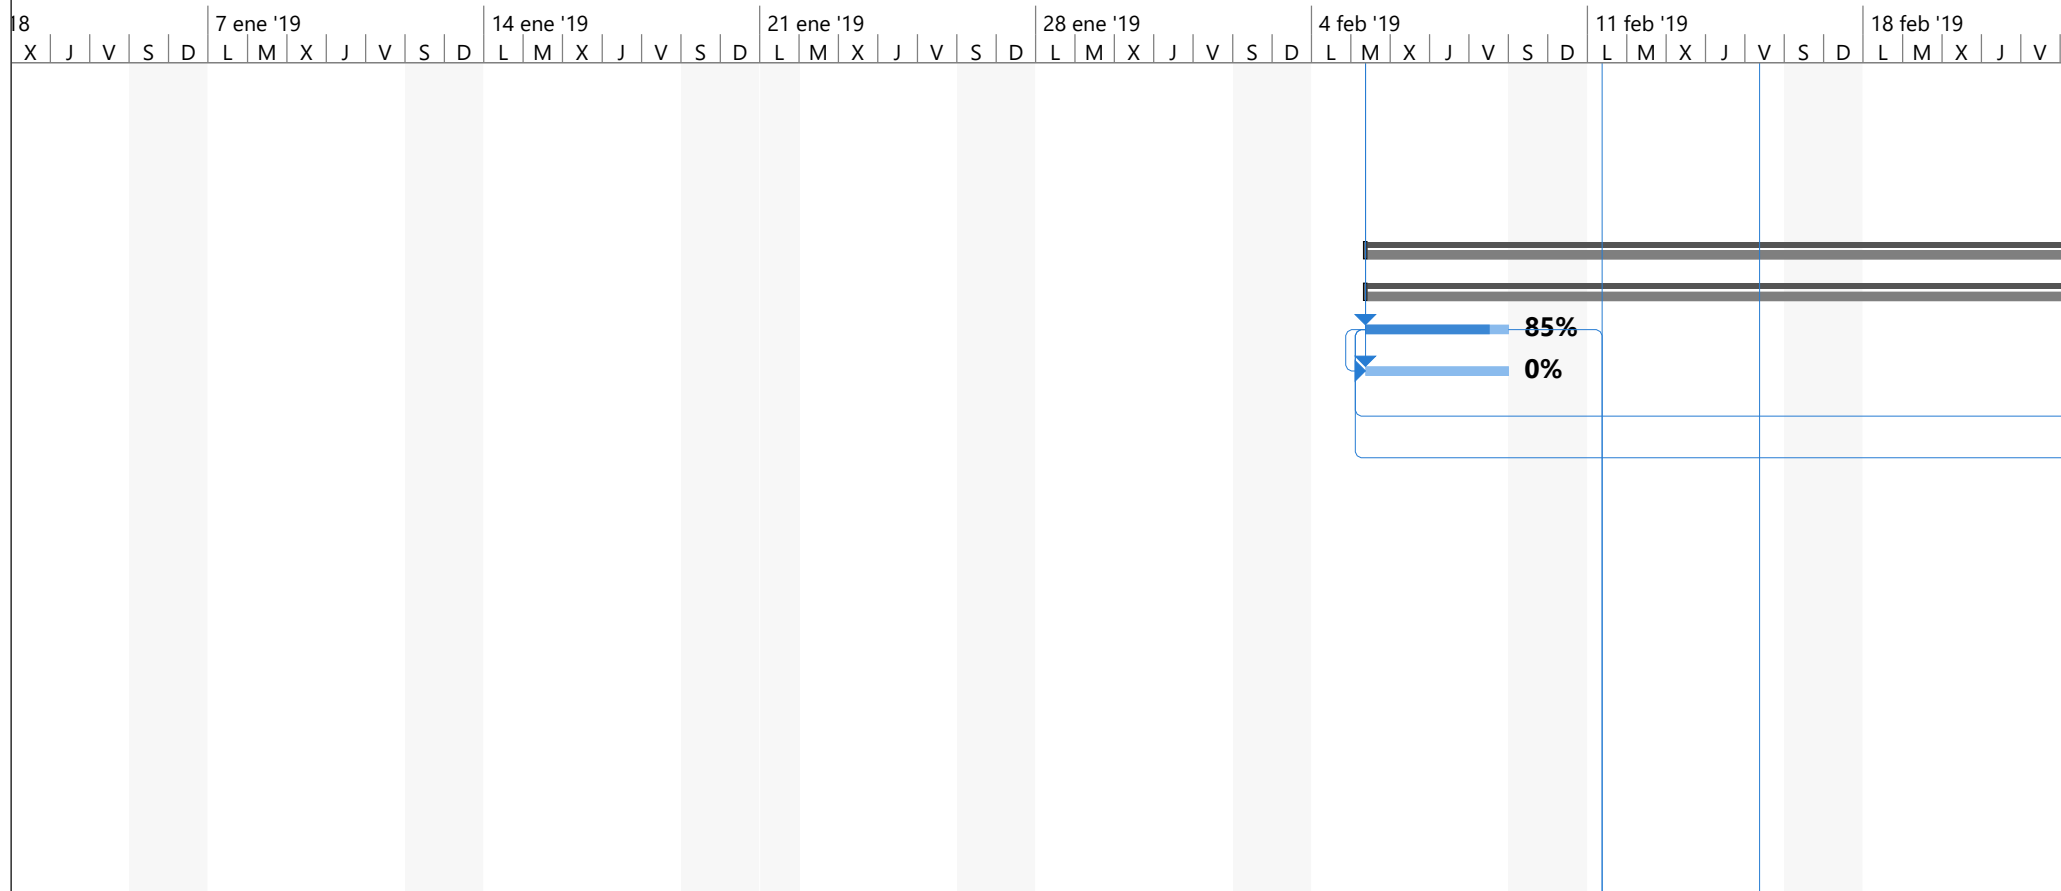

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

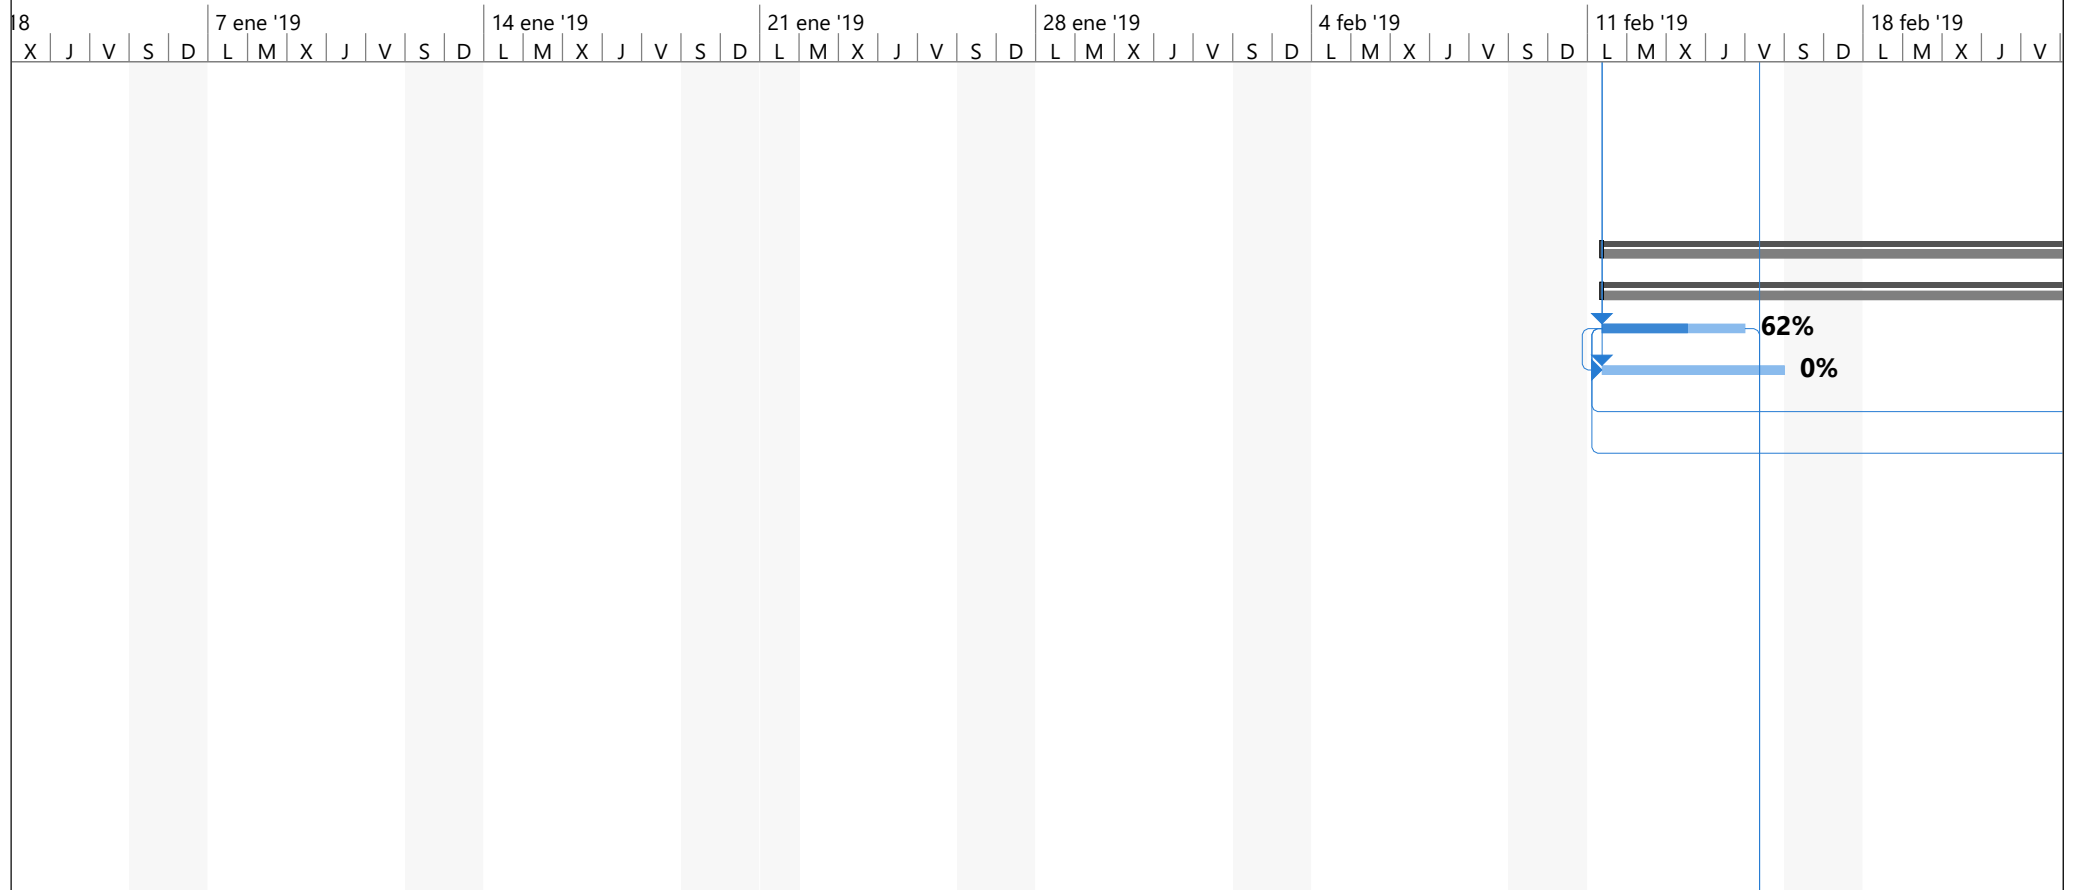

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|    |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |  |  |  |
|----|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|--|--|--|
| 18 |   |   |   |   |   | 7 ene '19 |   |   |   |   | 14 ene '19 |   |   |   |   | 21 ene '19 |   |   |   |   | 28 ene '19 |   |   |   |   | 4 feb '19 |   |   |   |   | 11 feb '19 |   |   |   |   | 18 feb '19 |   |  |  |  |
| X  | J | V | S | D | L | M         | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X          | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J          | V |  |  |  |
|    |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

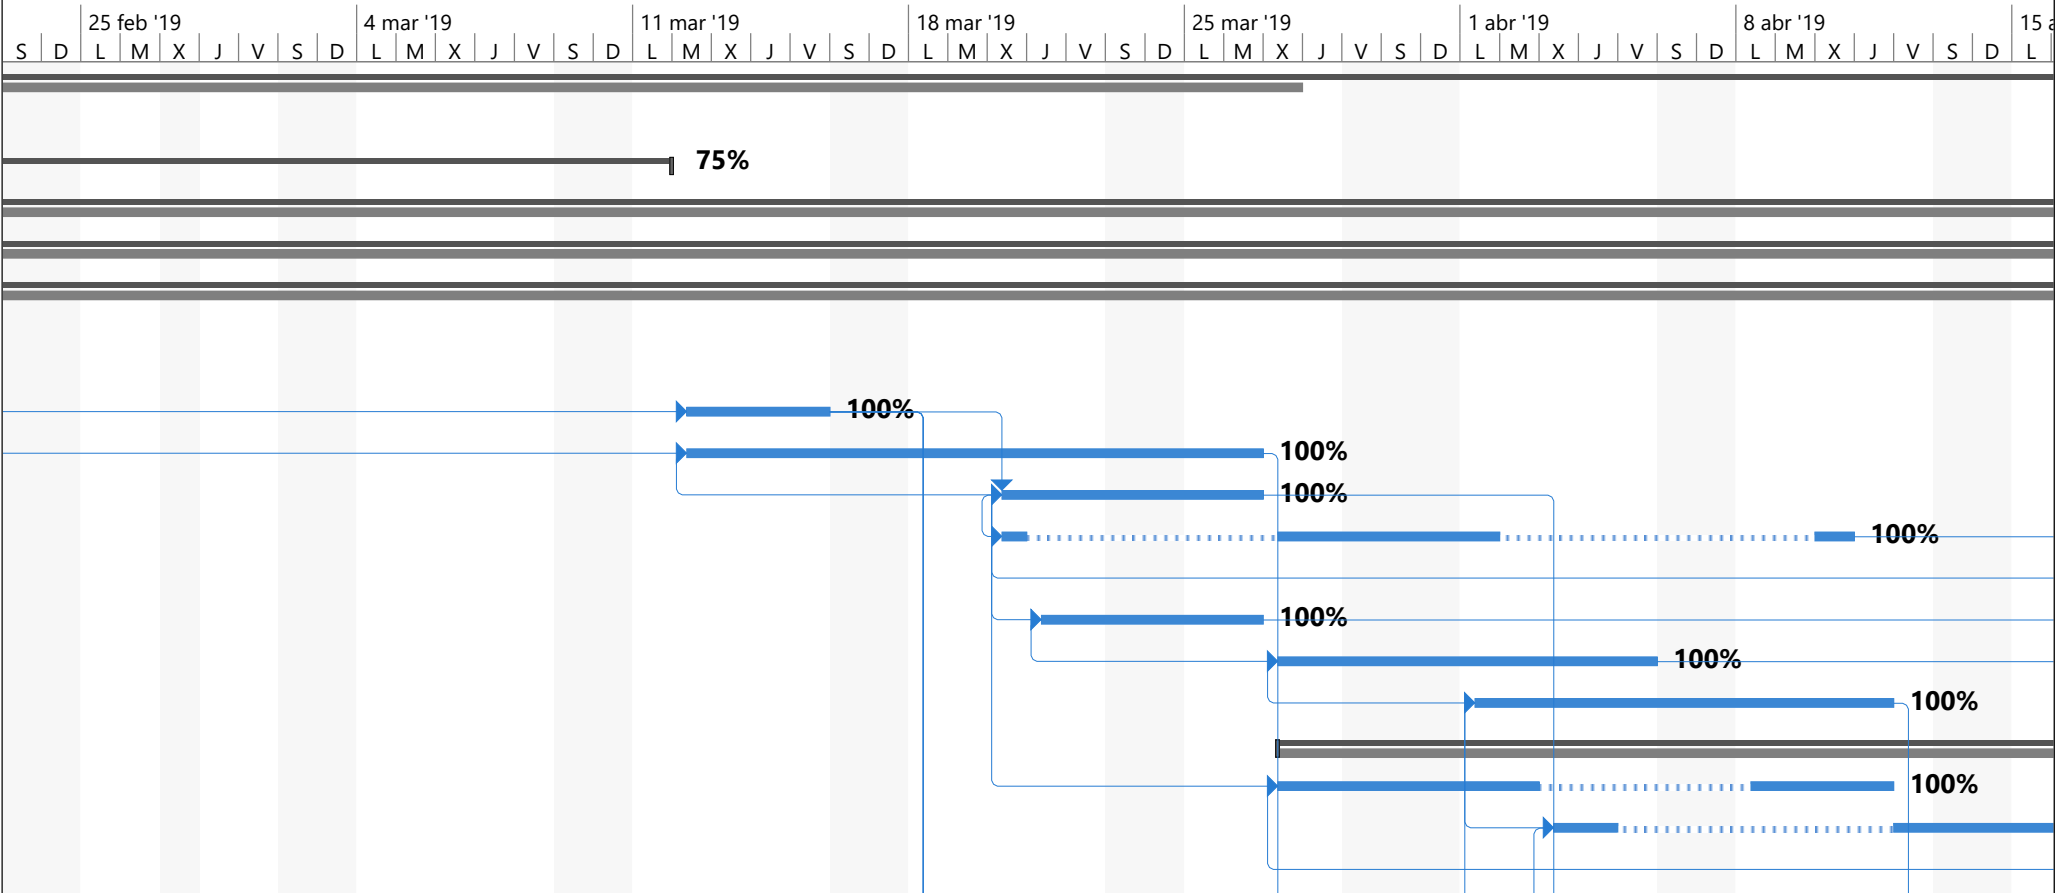


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

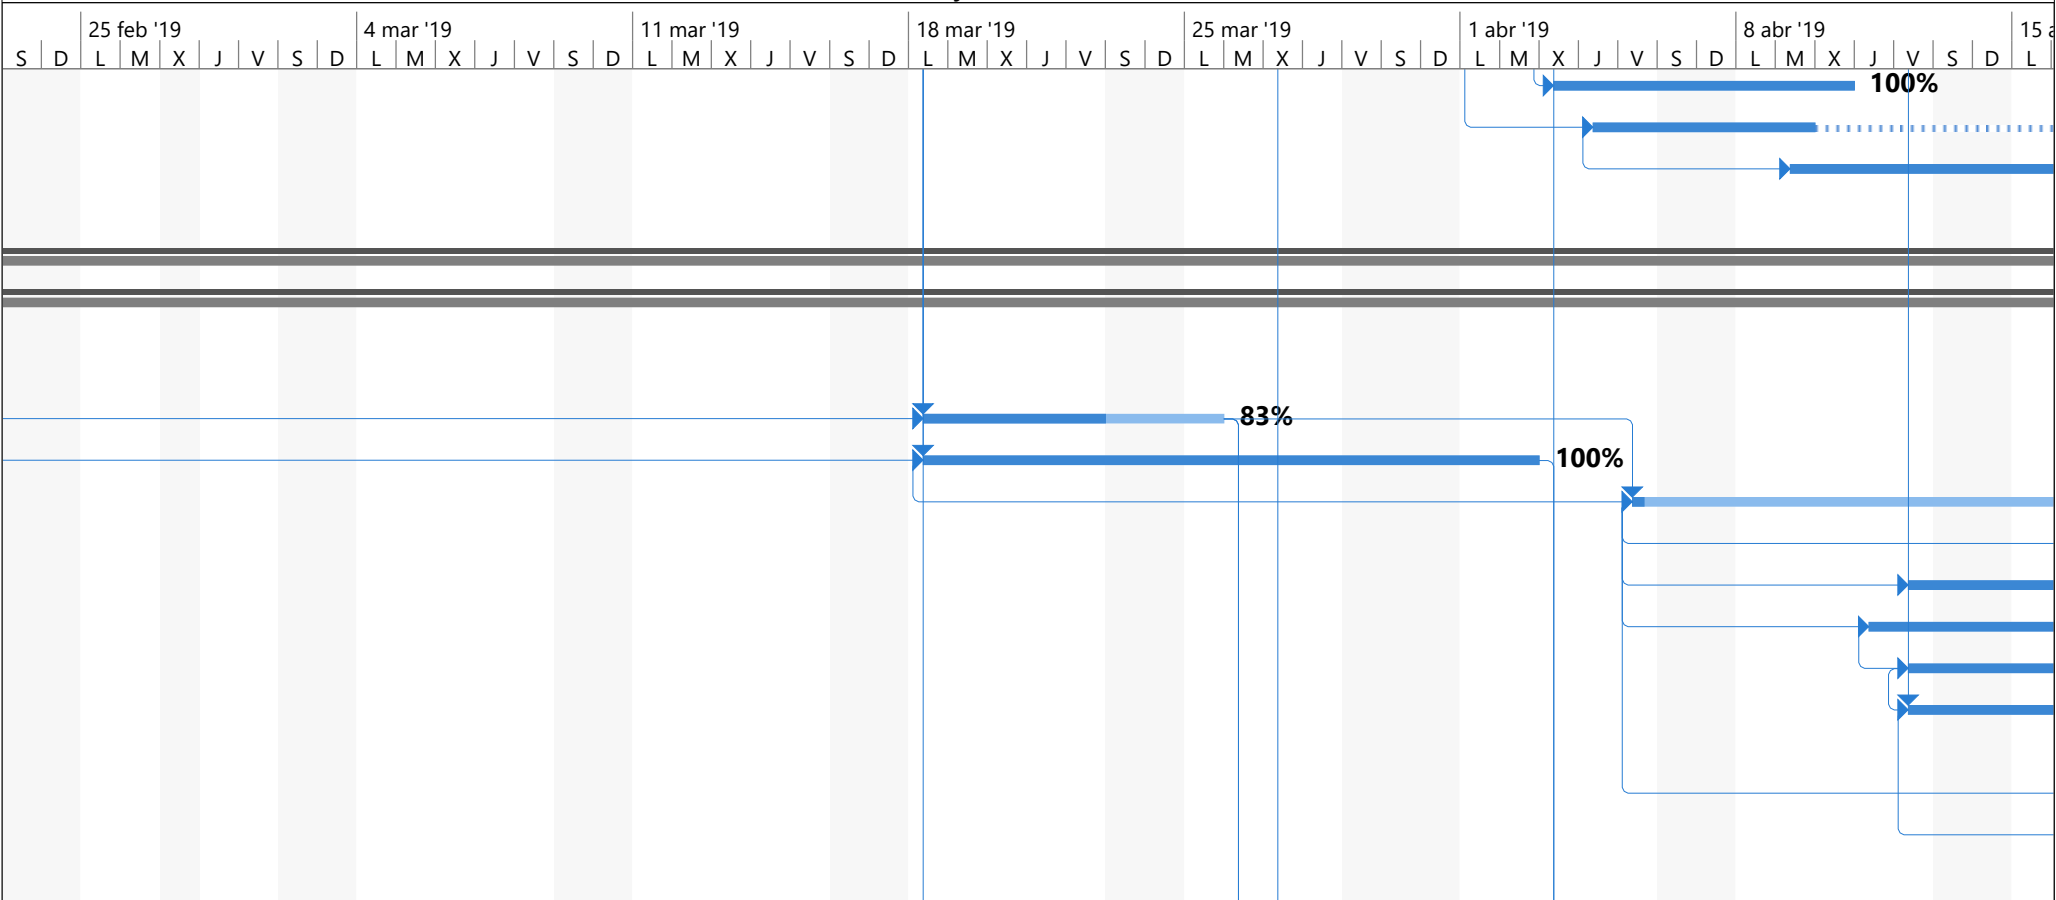

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

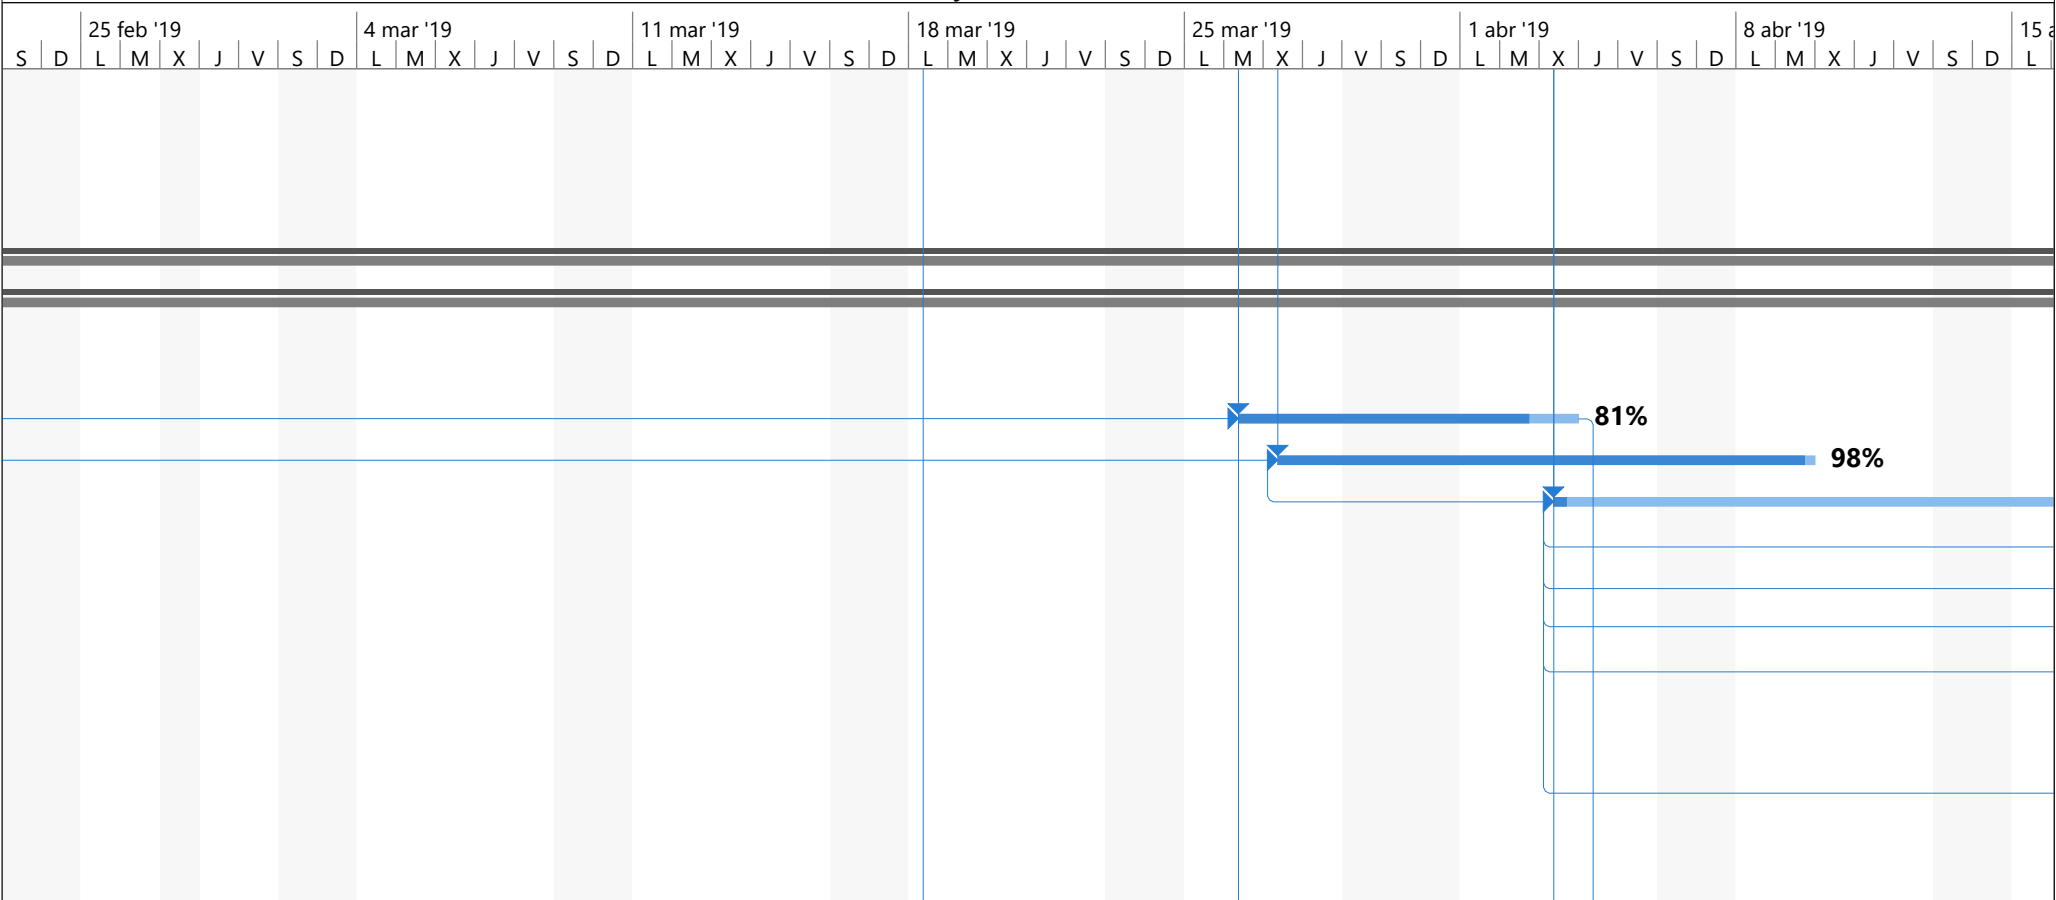

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

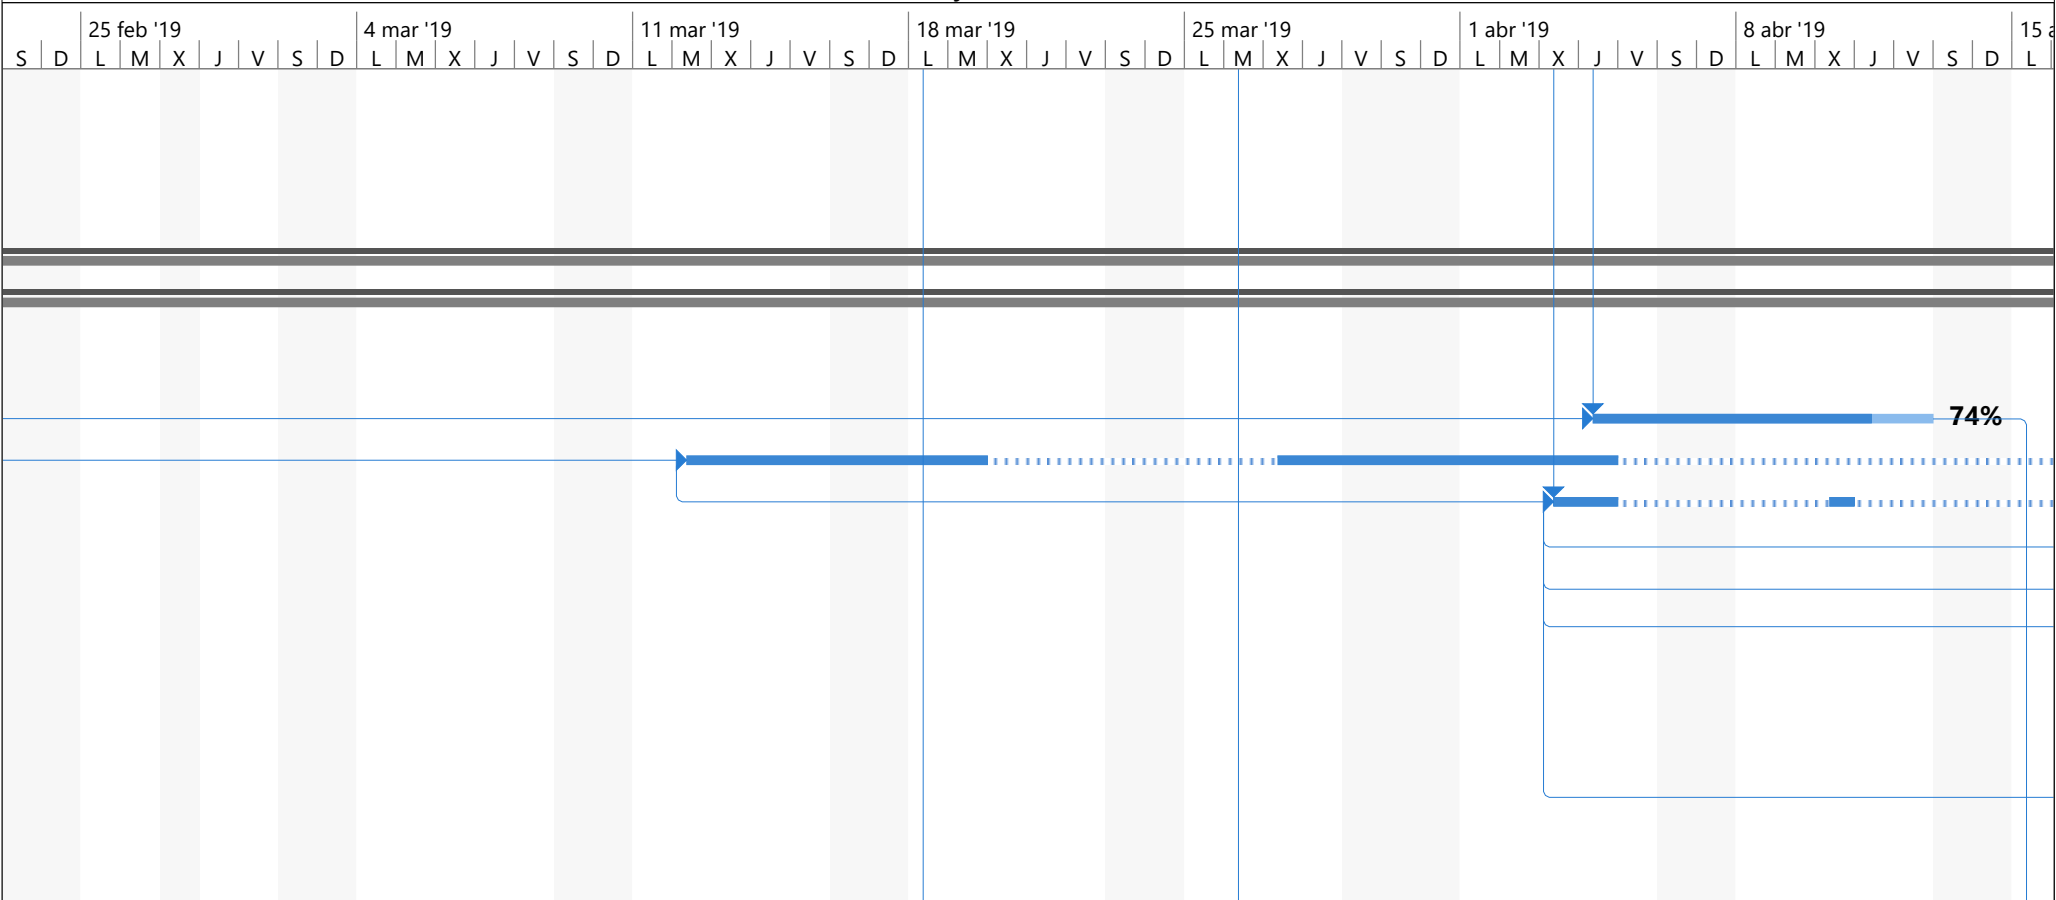


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

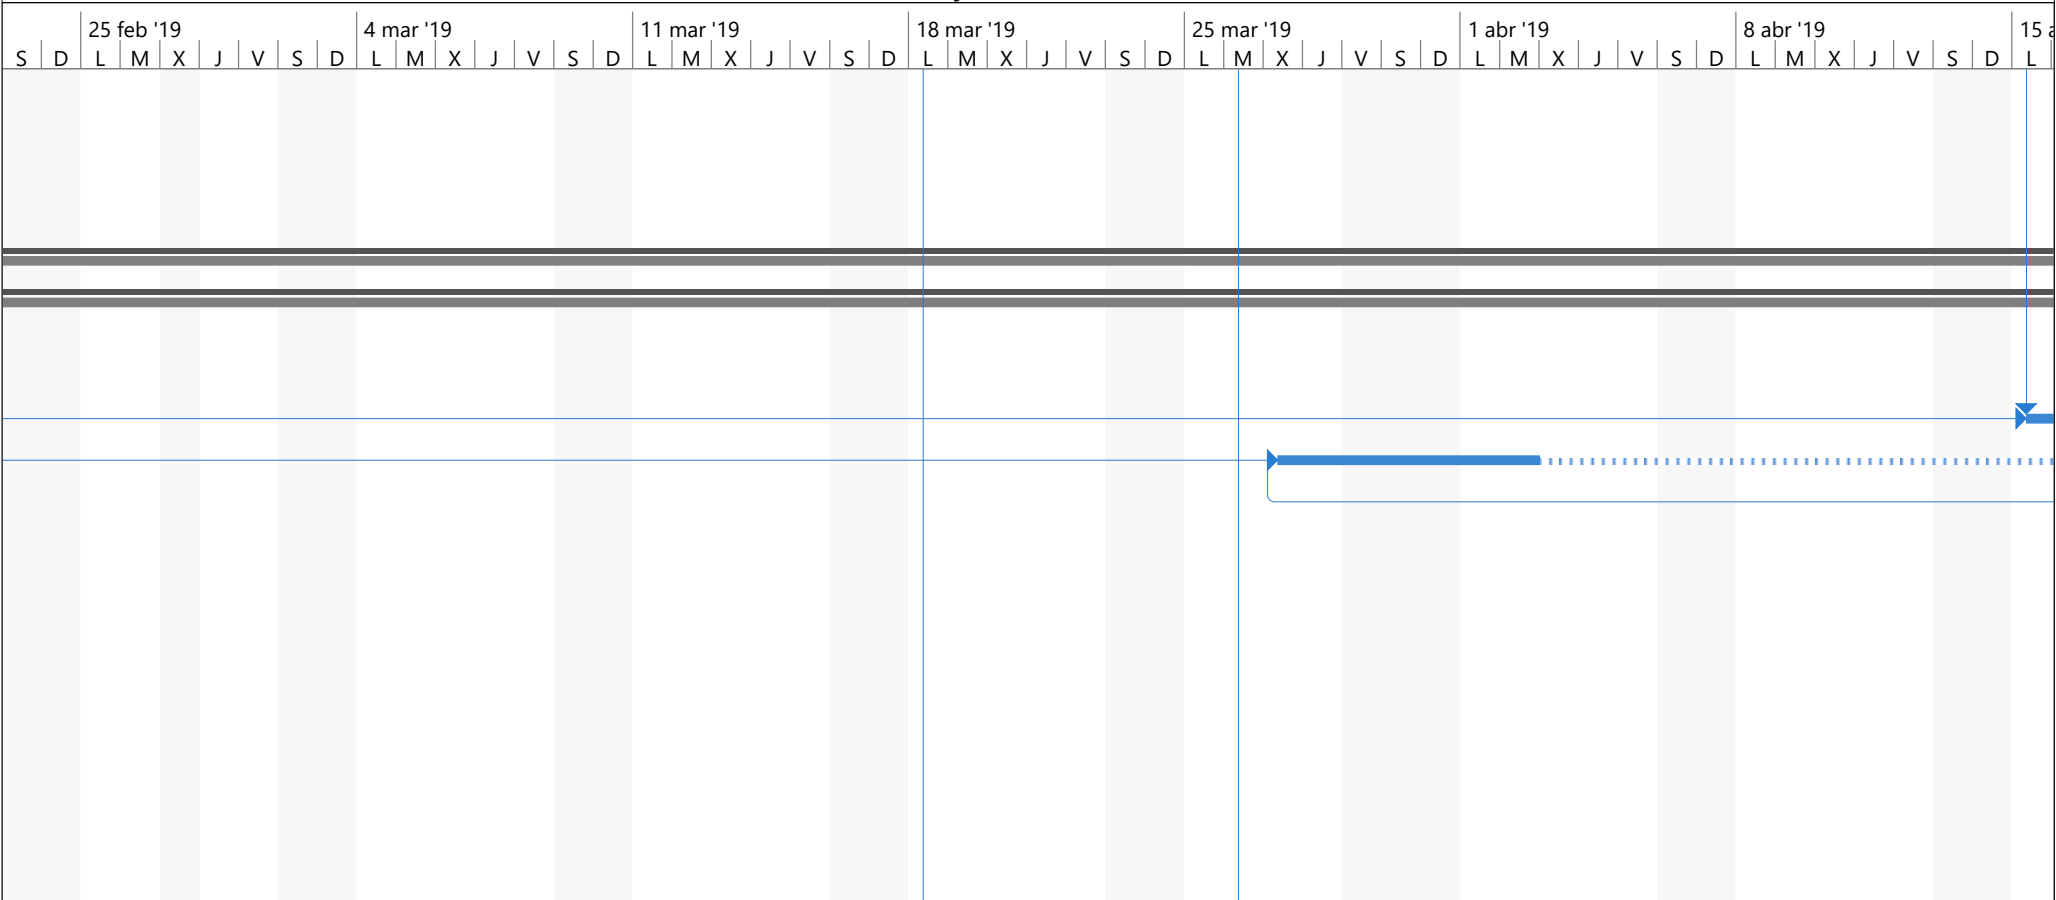


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

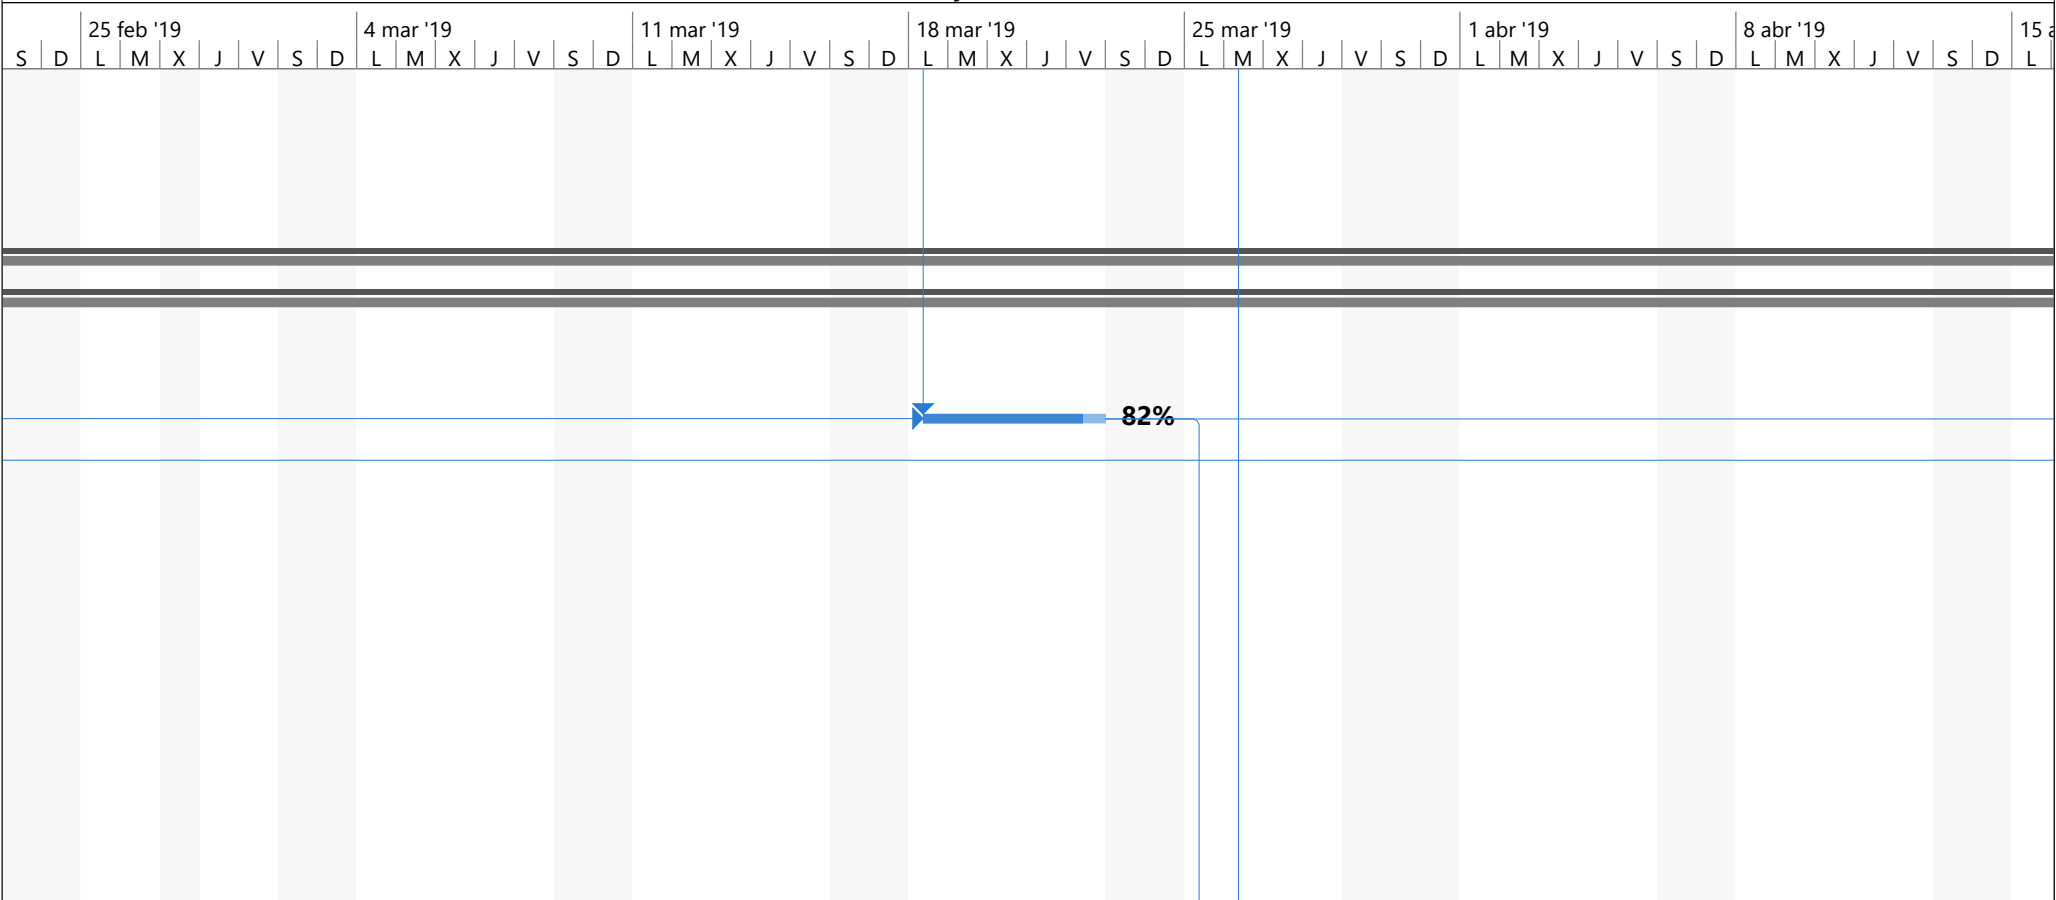

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

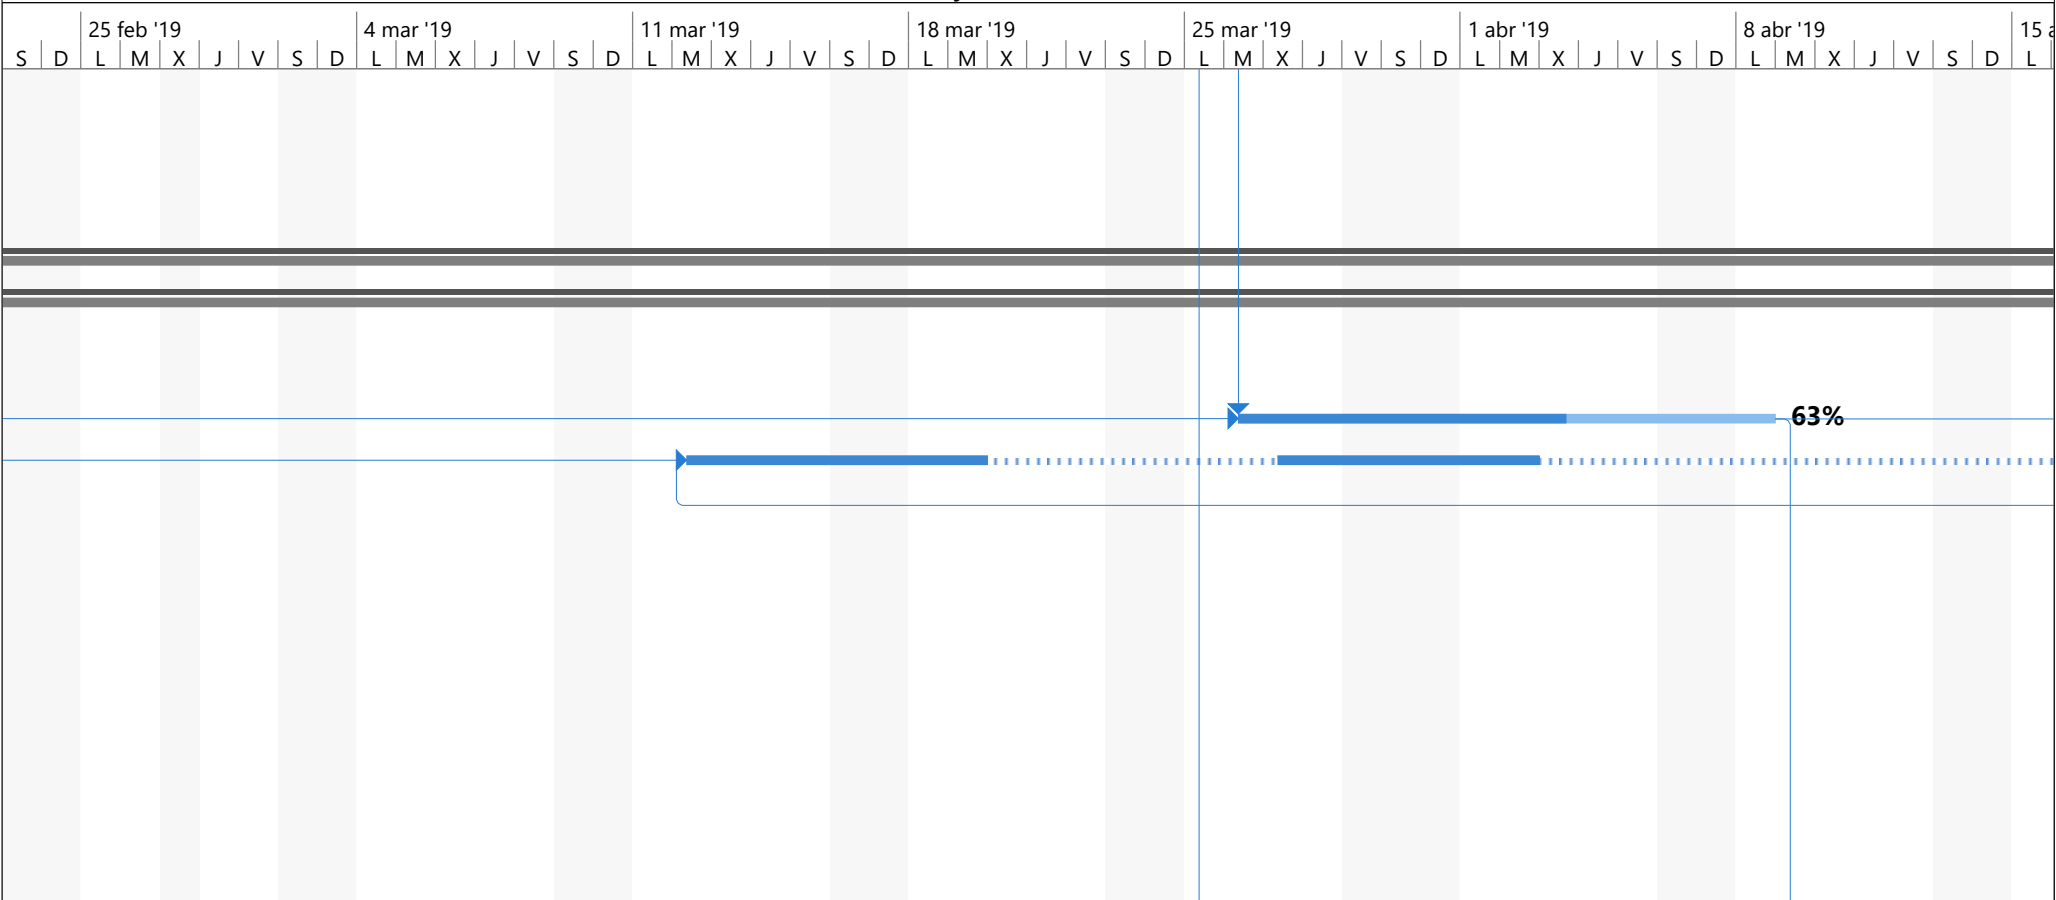


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

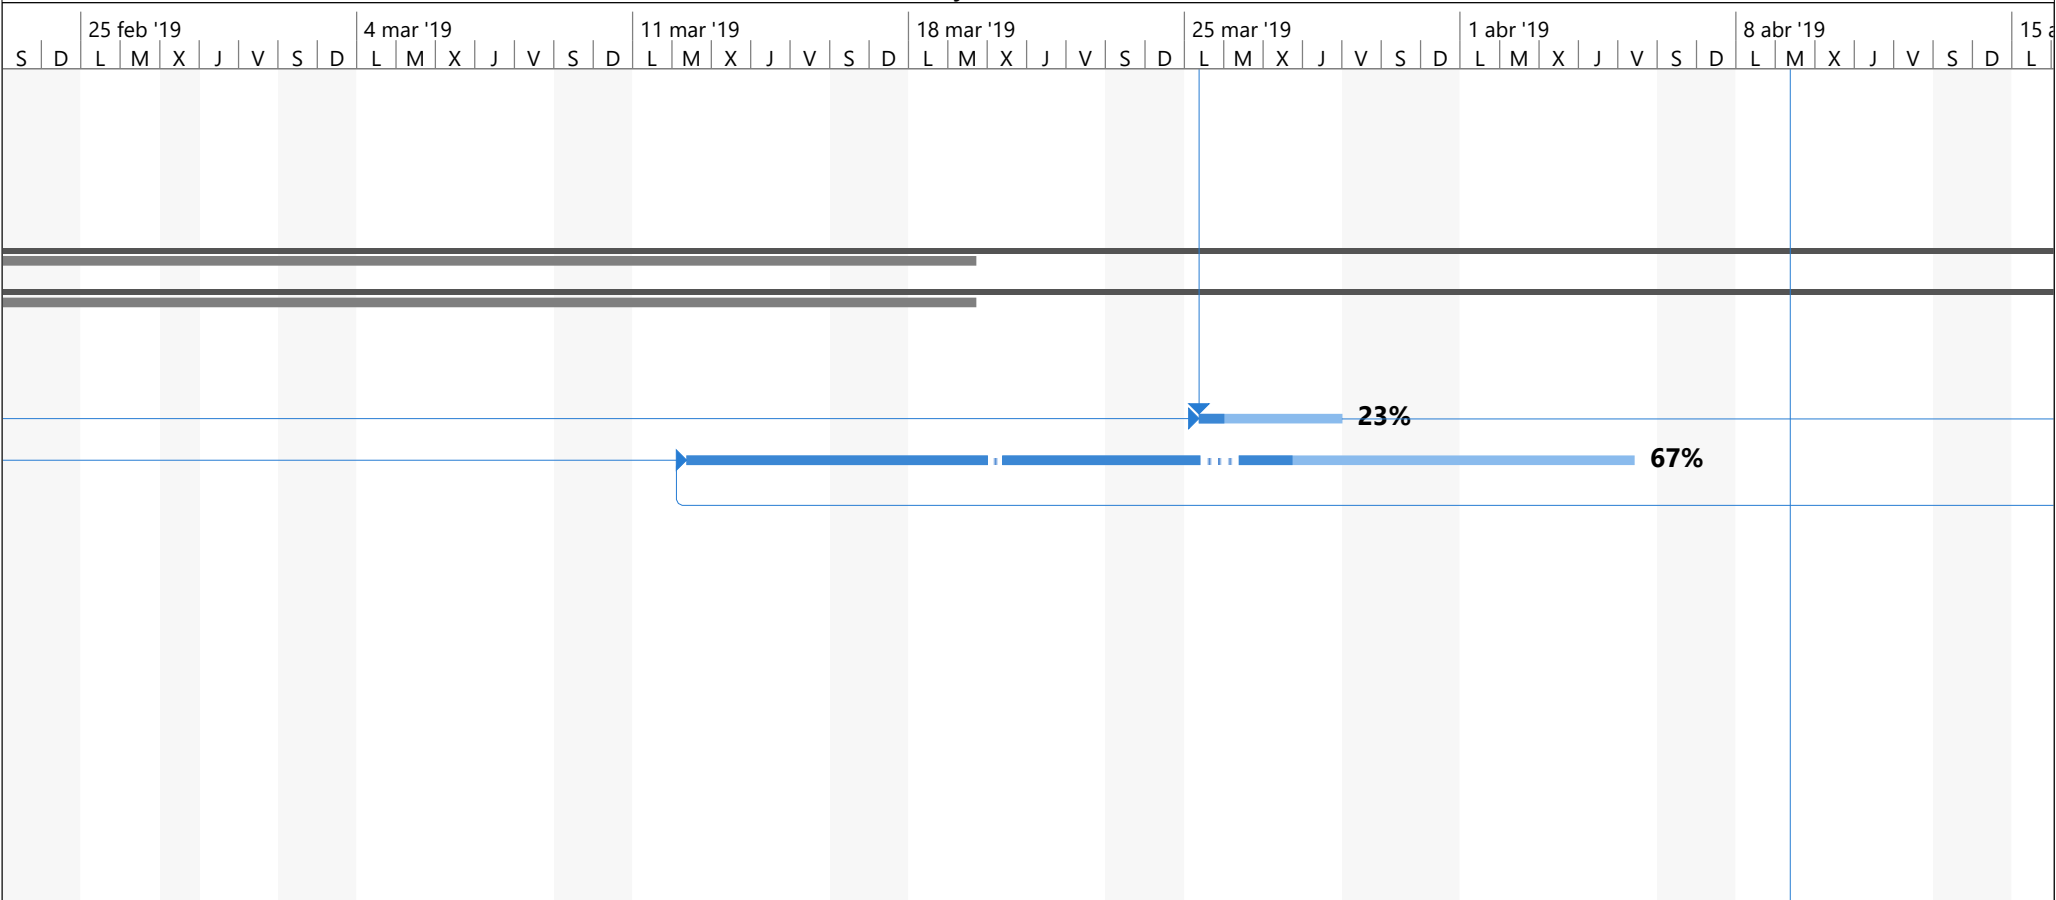

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

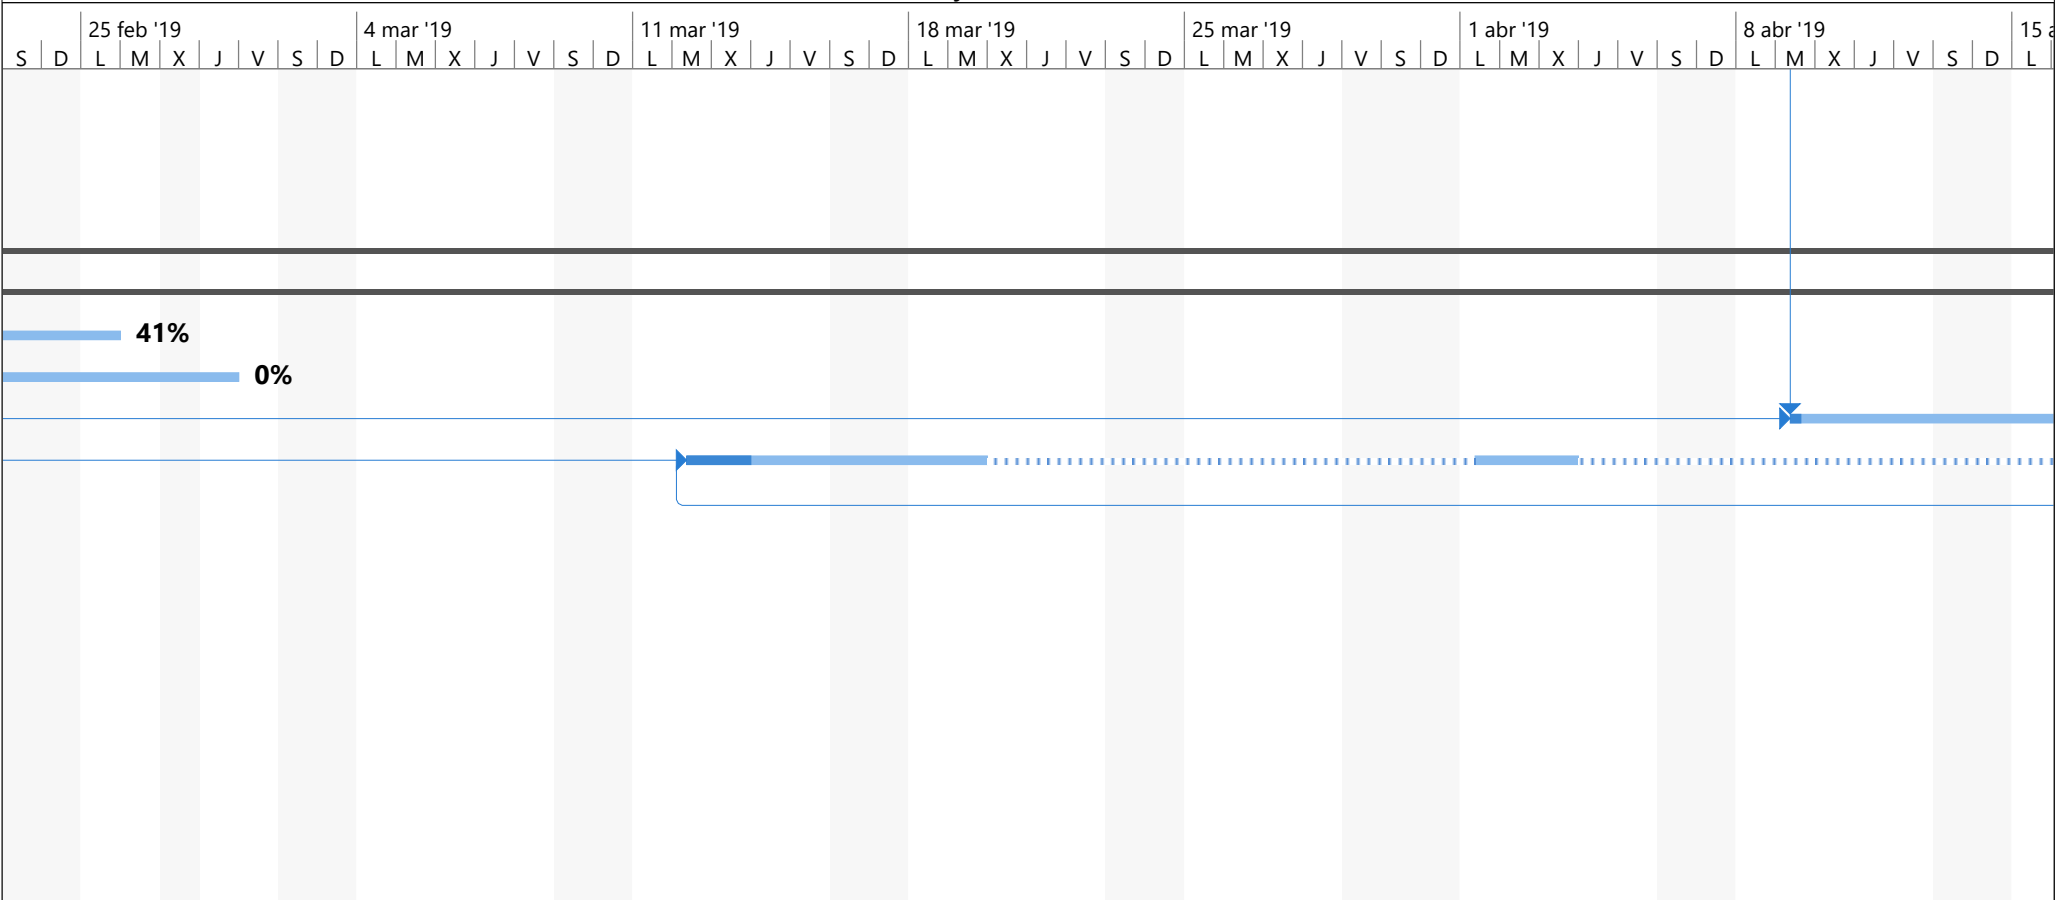

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020


[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

abr '19 22 abr '19 29 abr '19 6 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 3 jun '19  
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

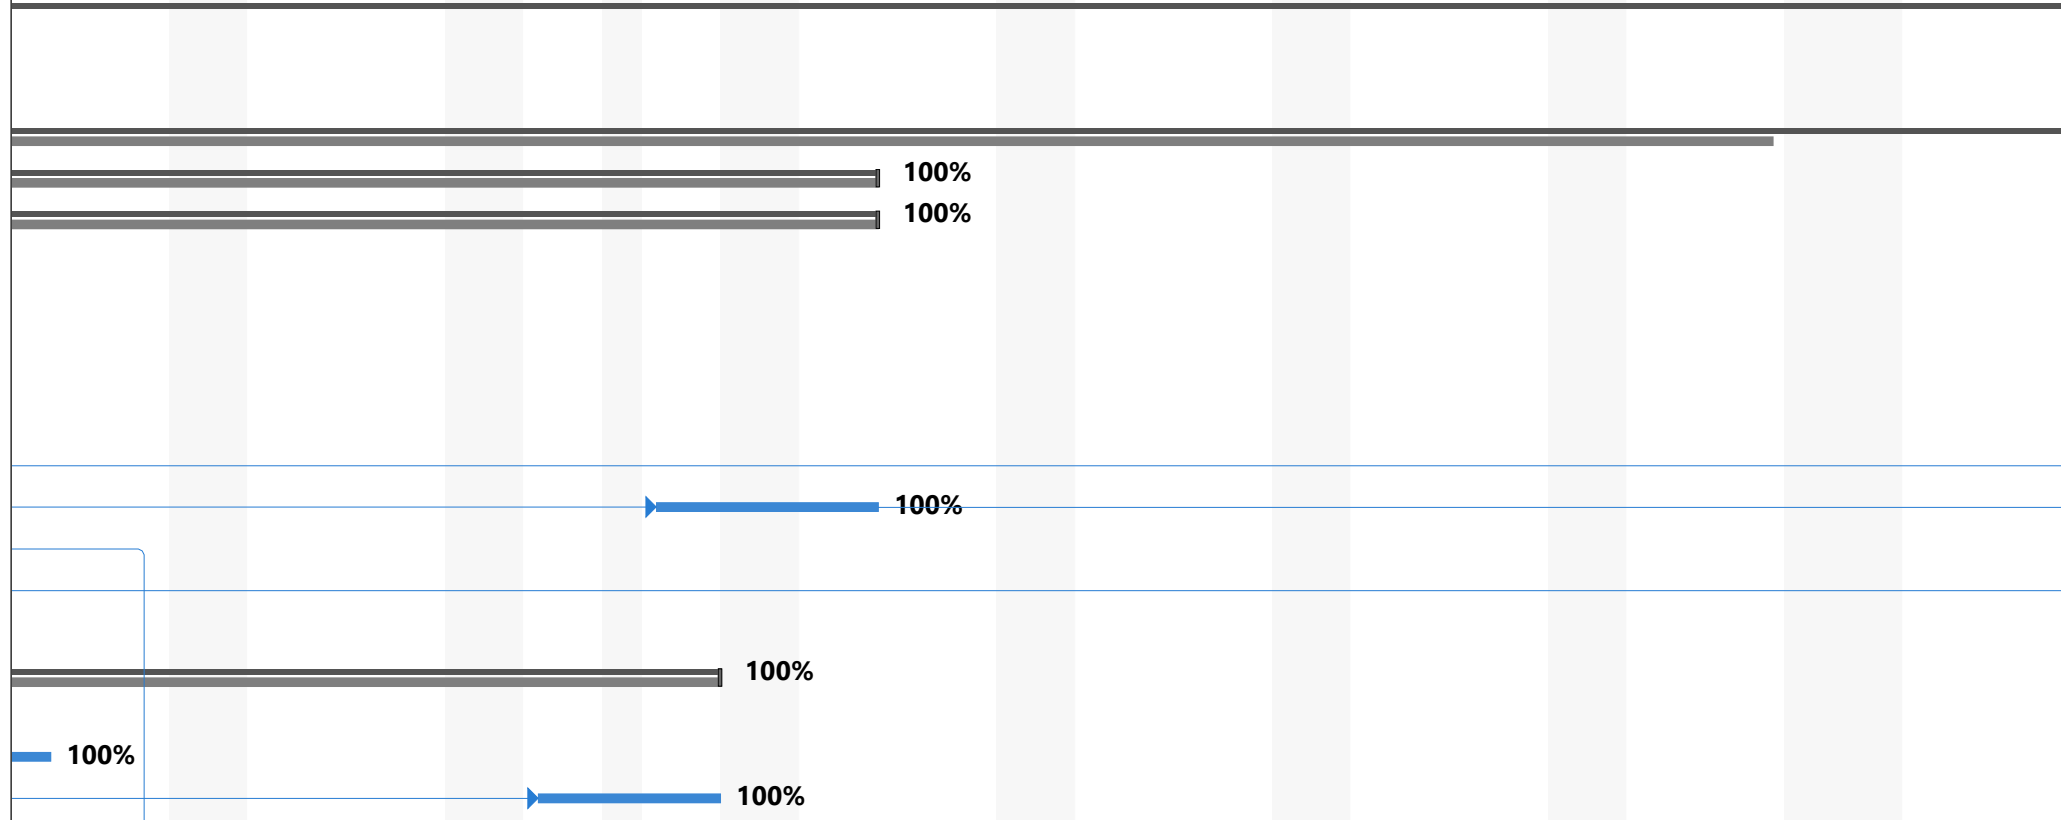


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

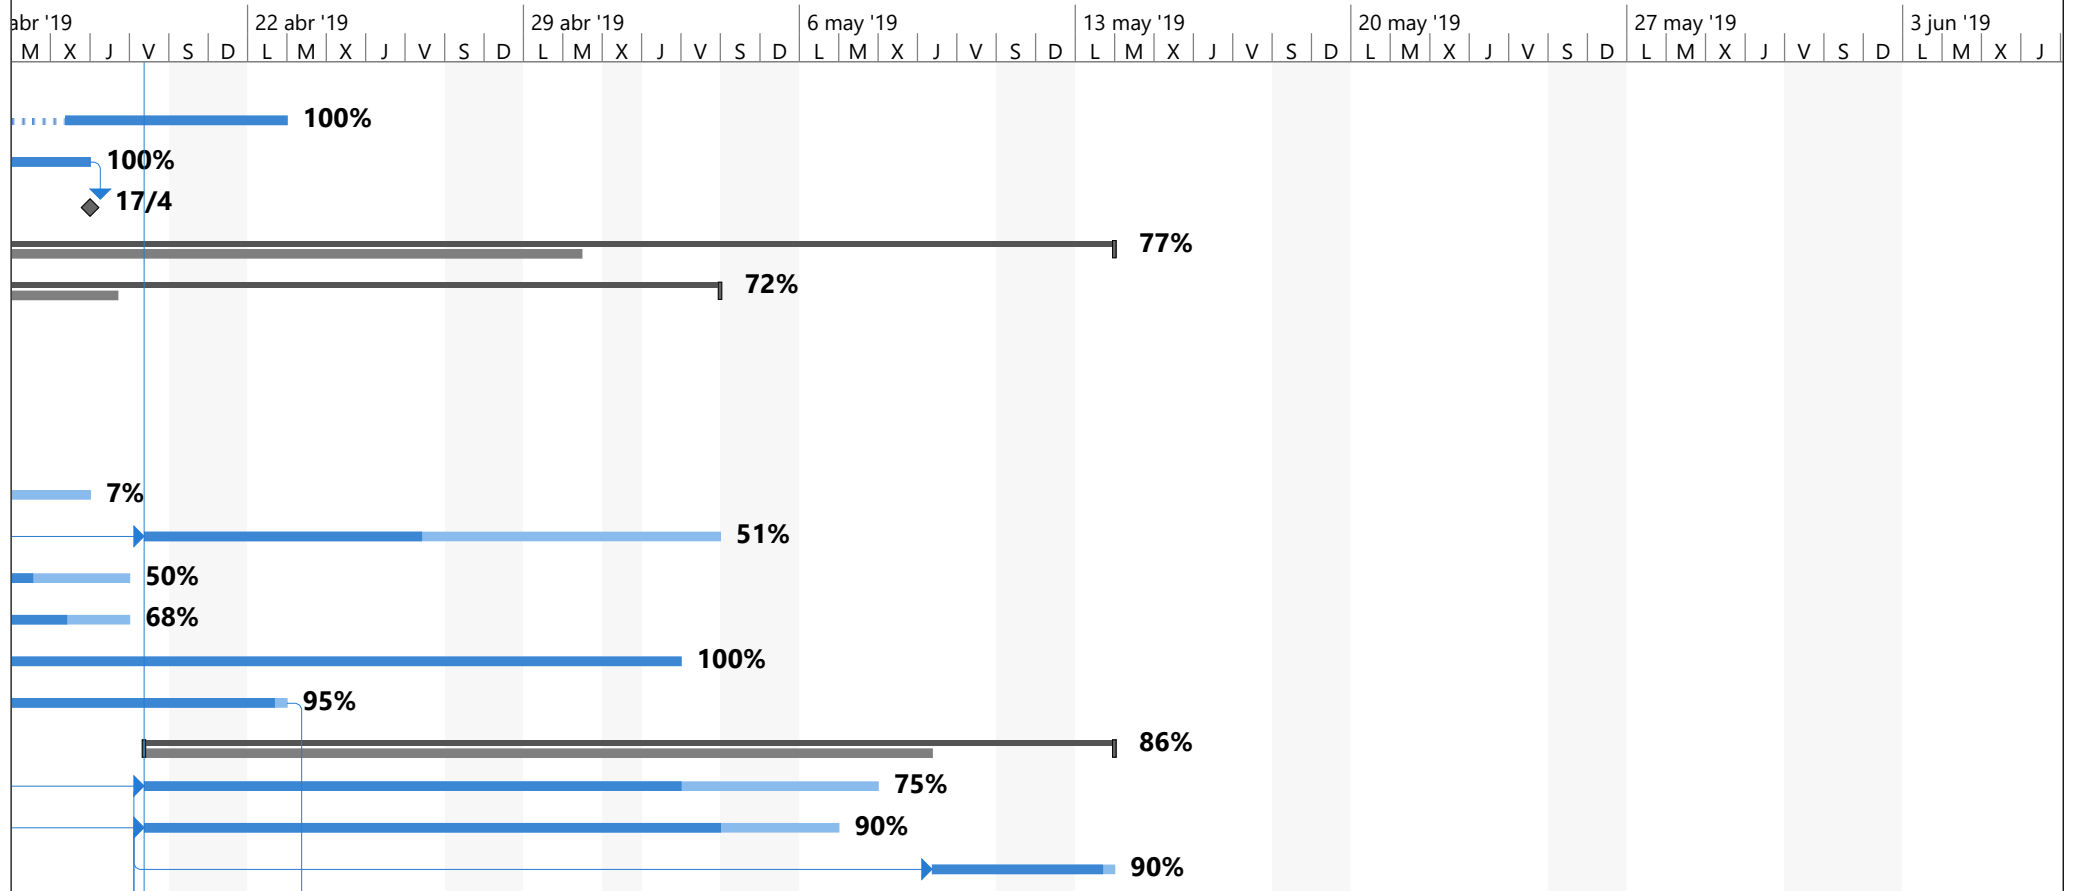


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

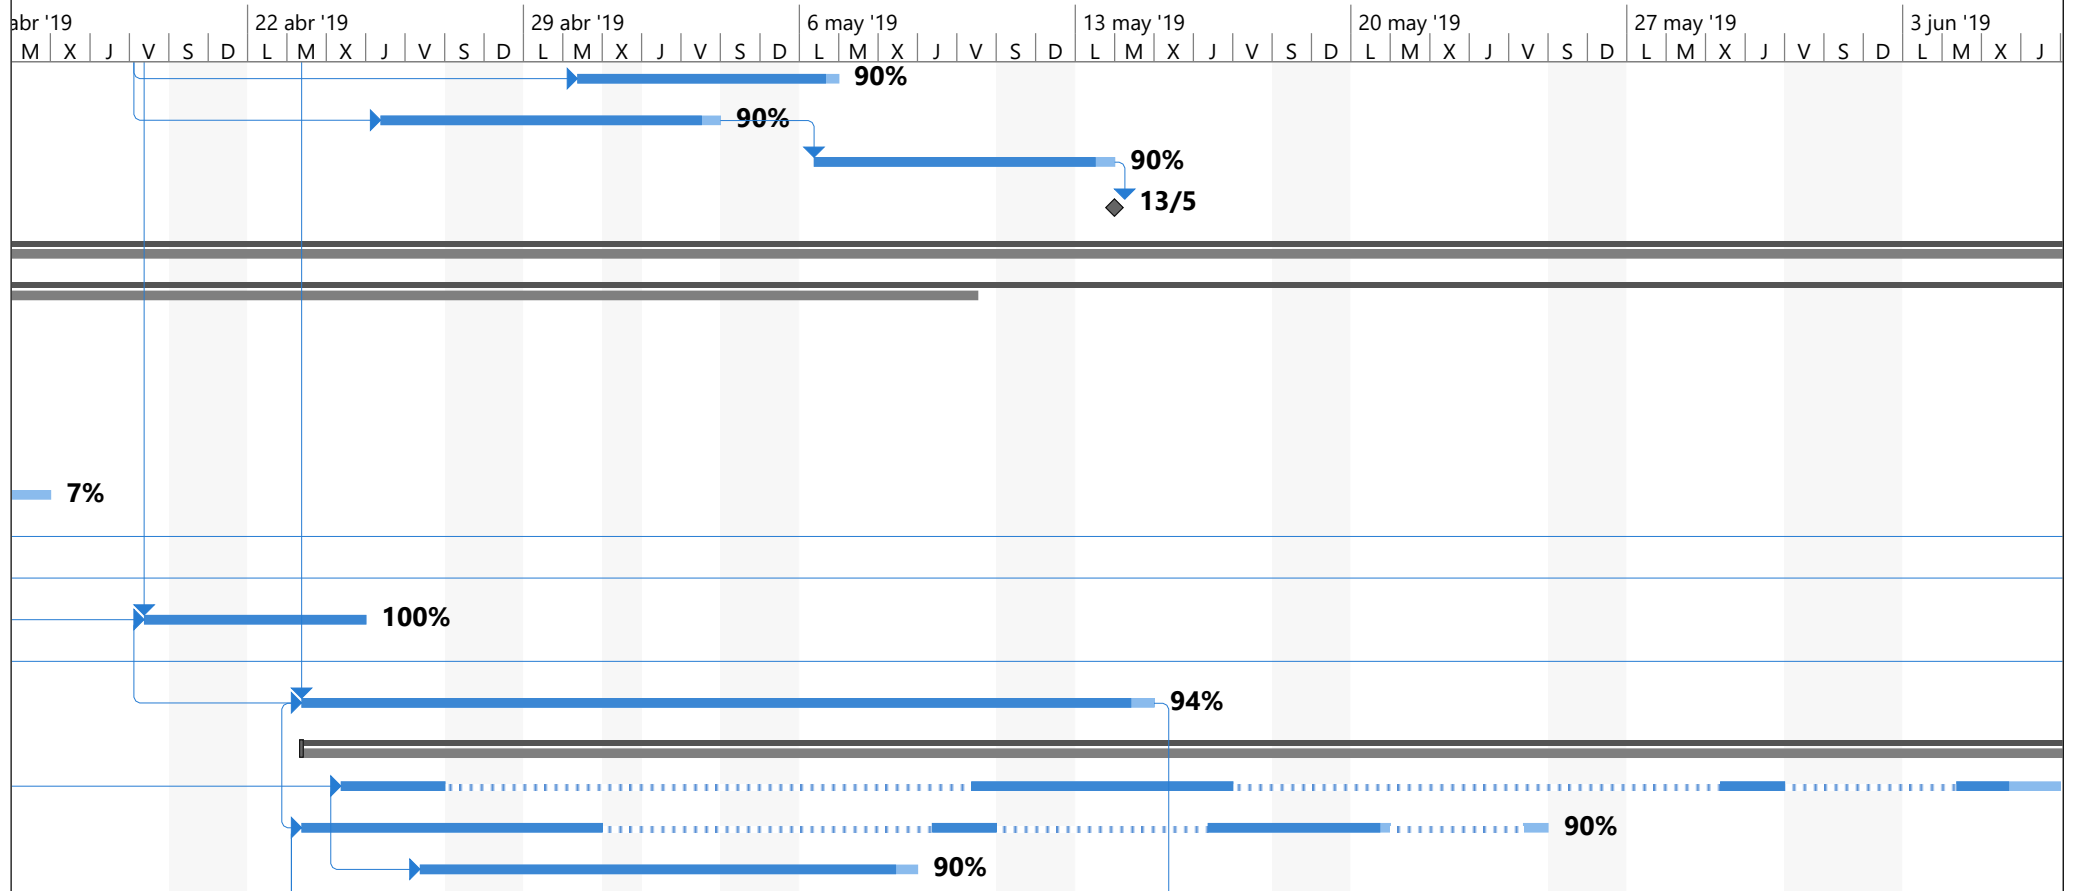


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

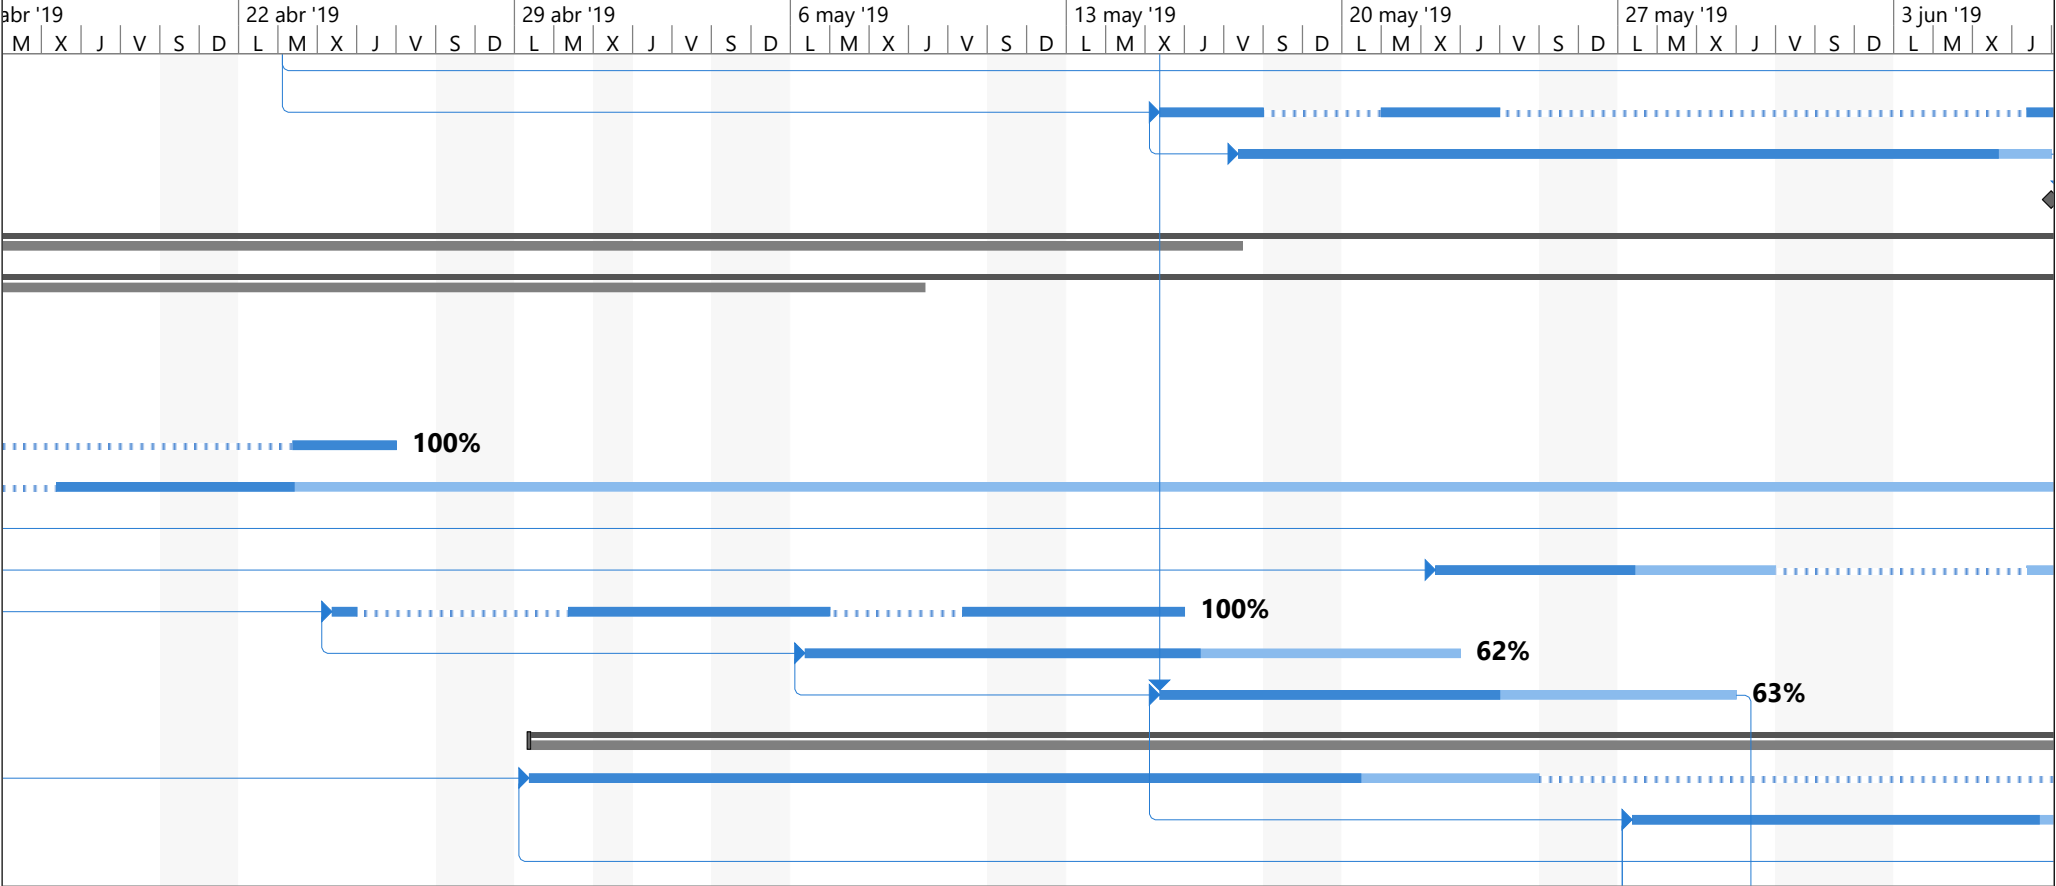


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

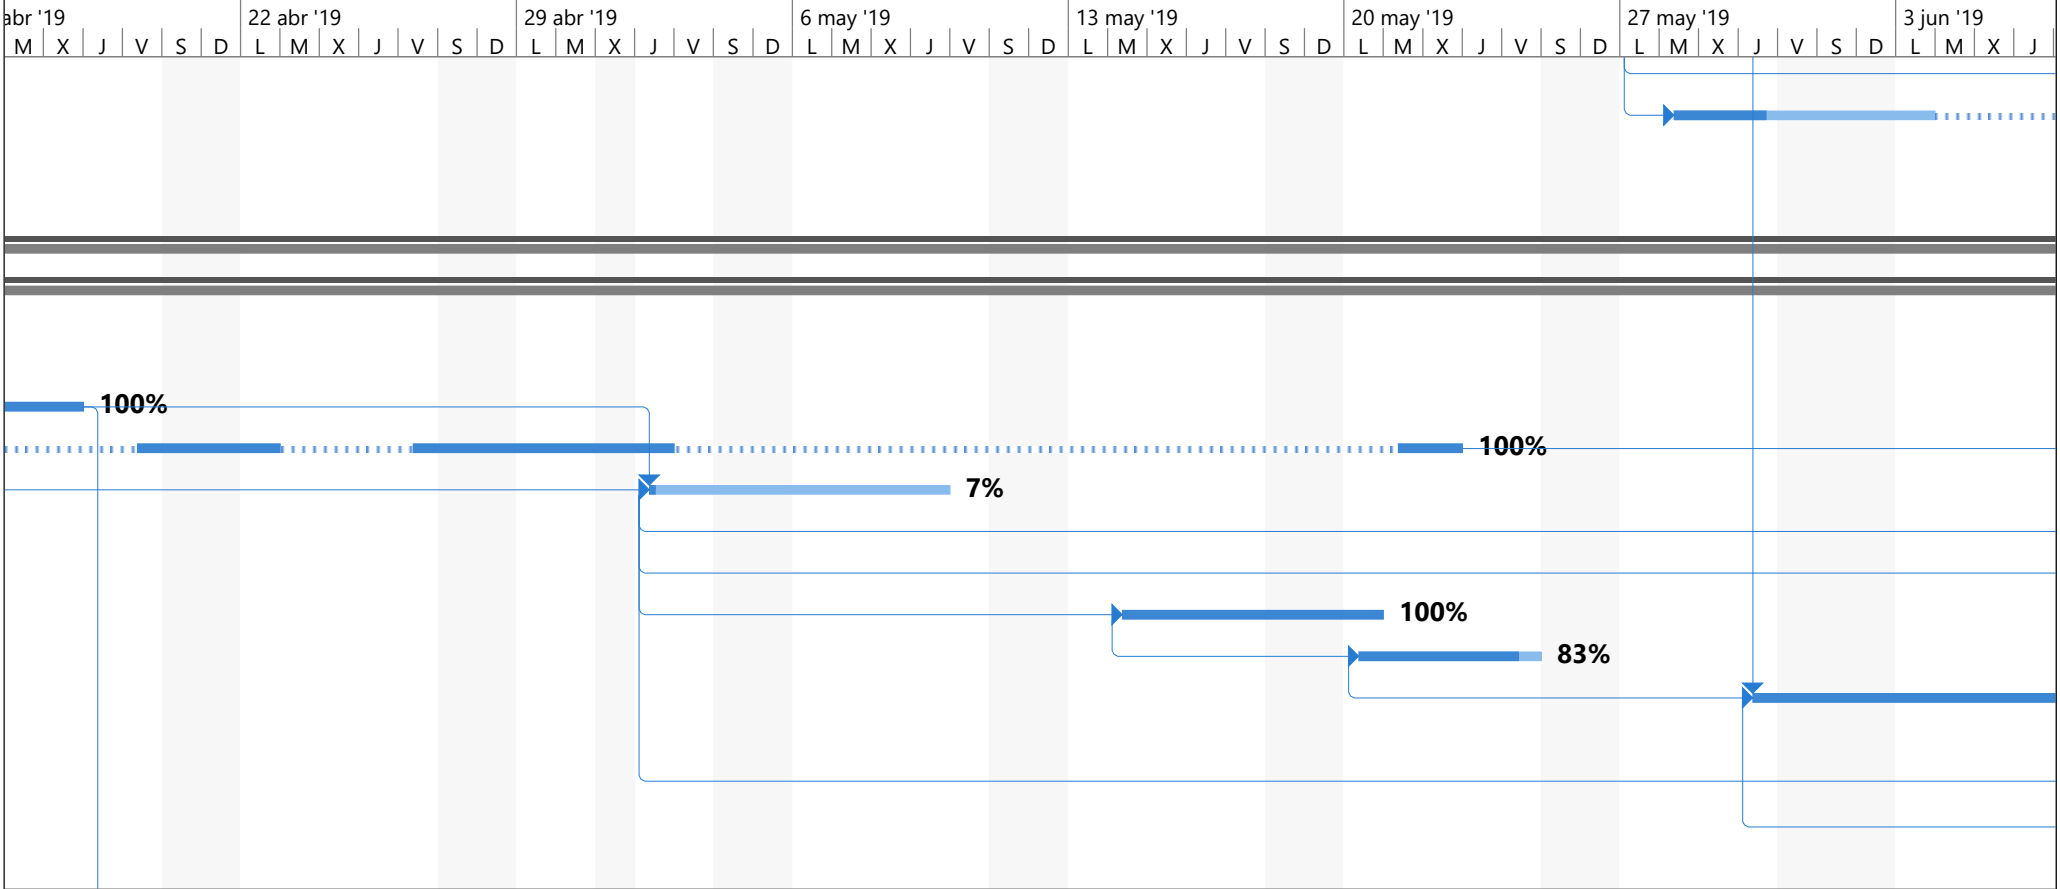


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

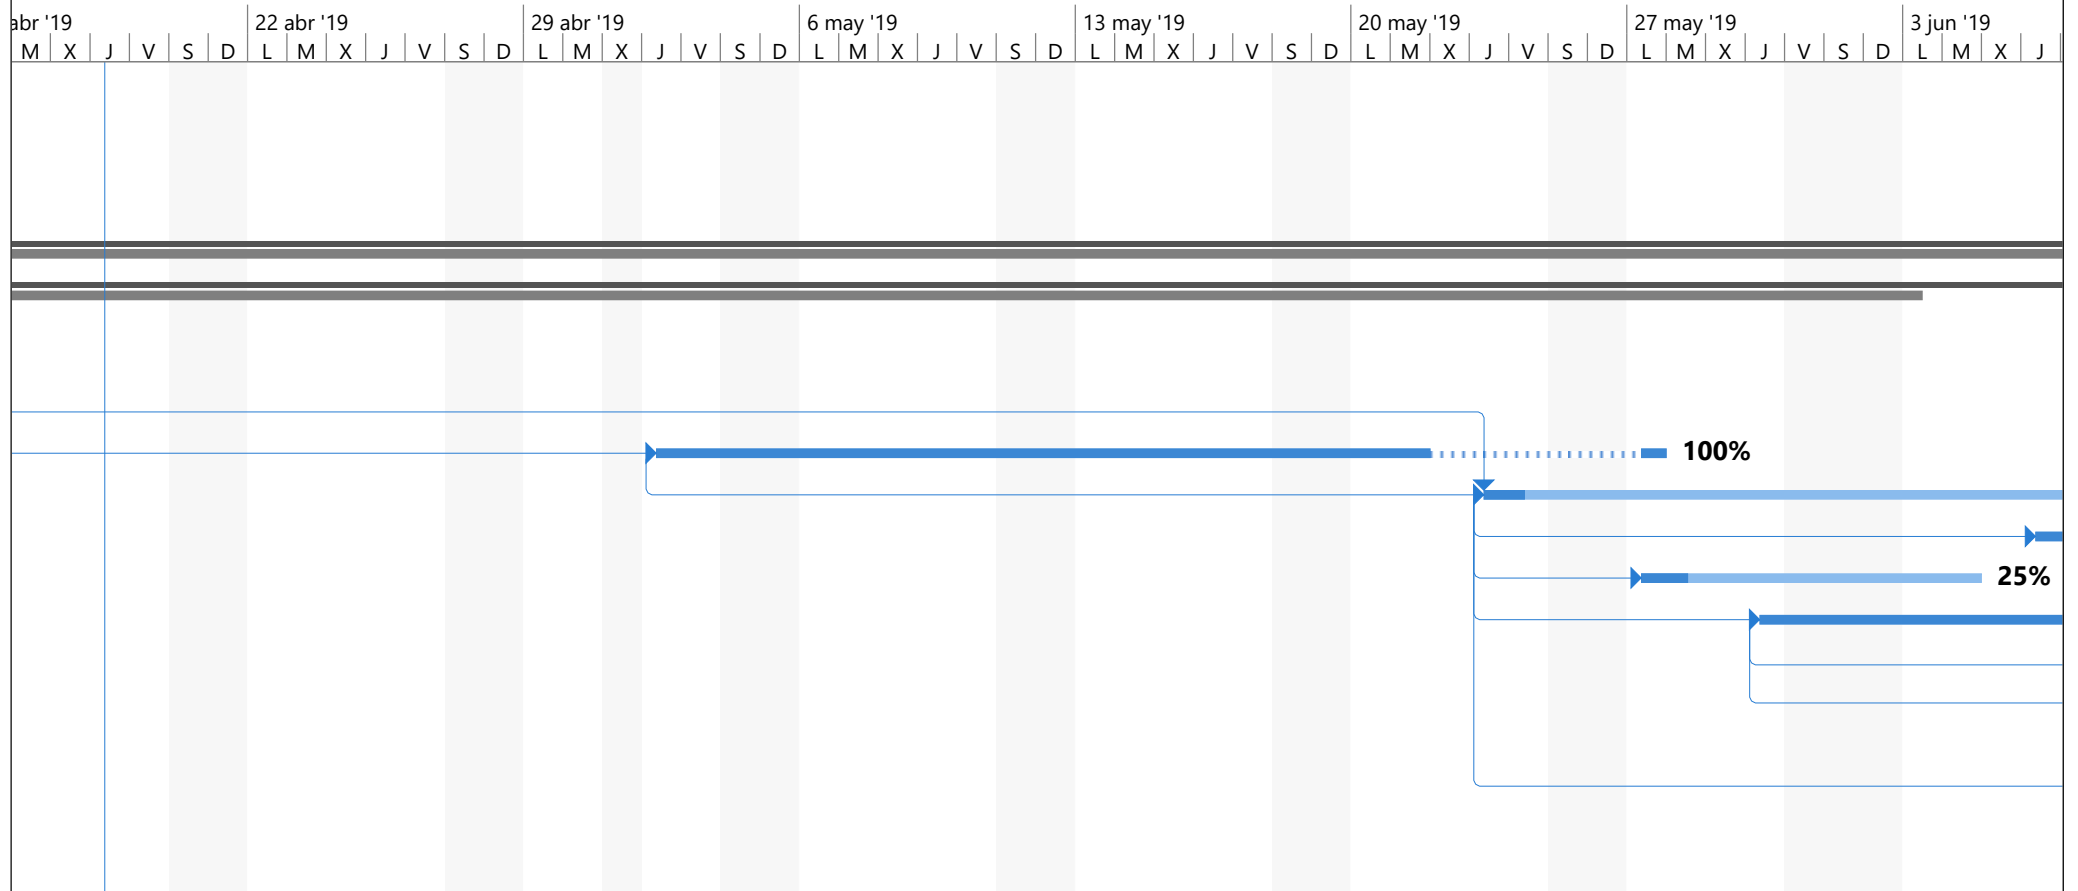


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

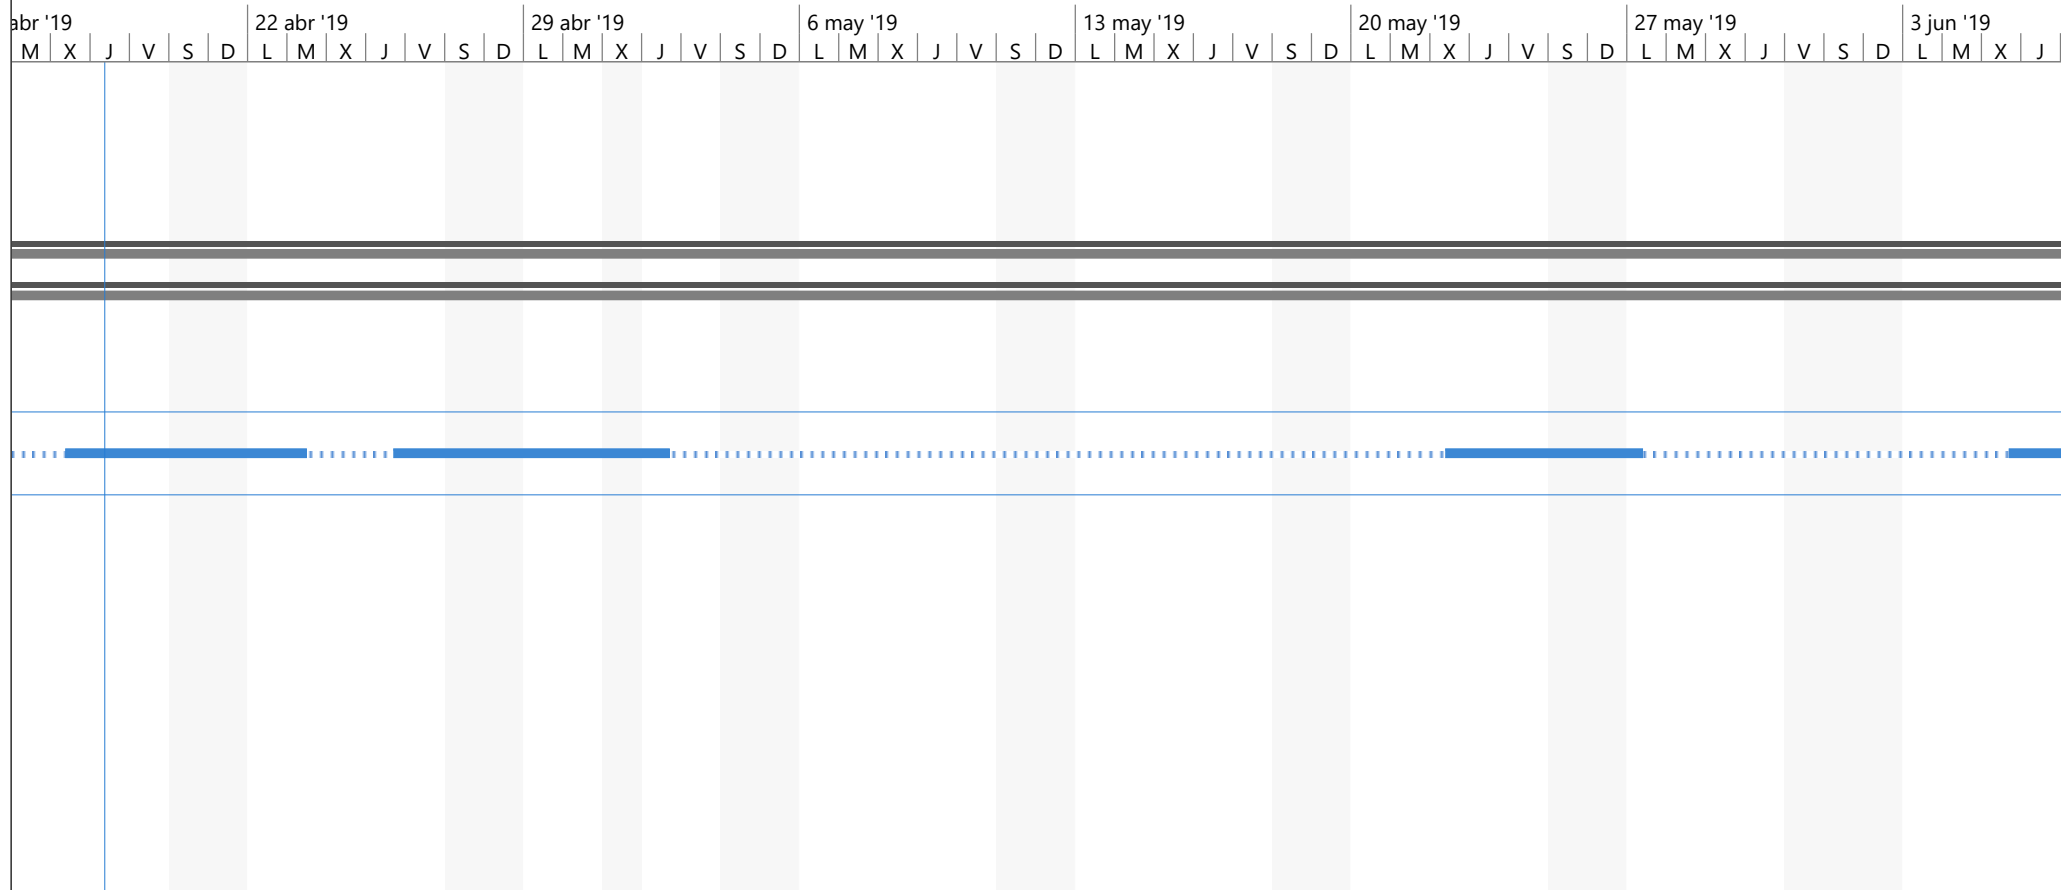

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



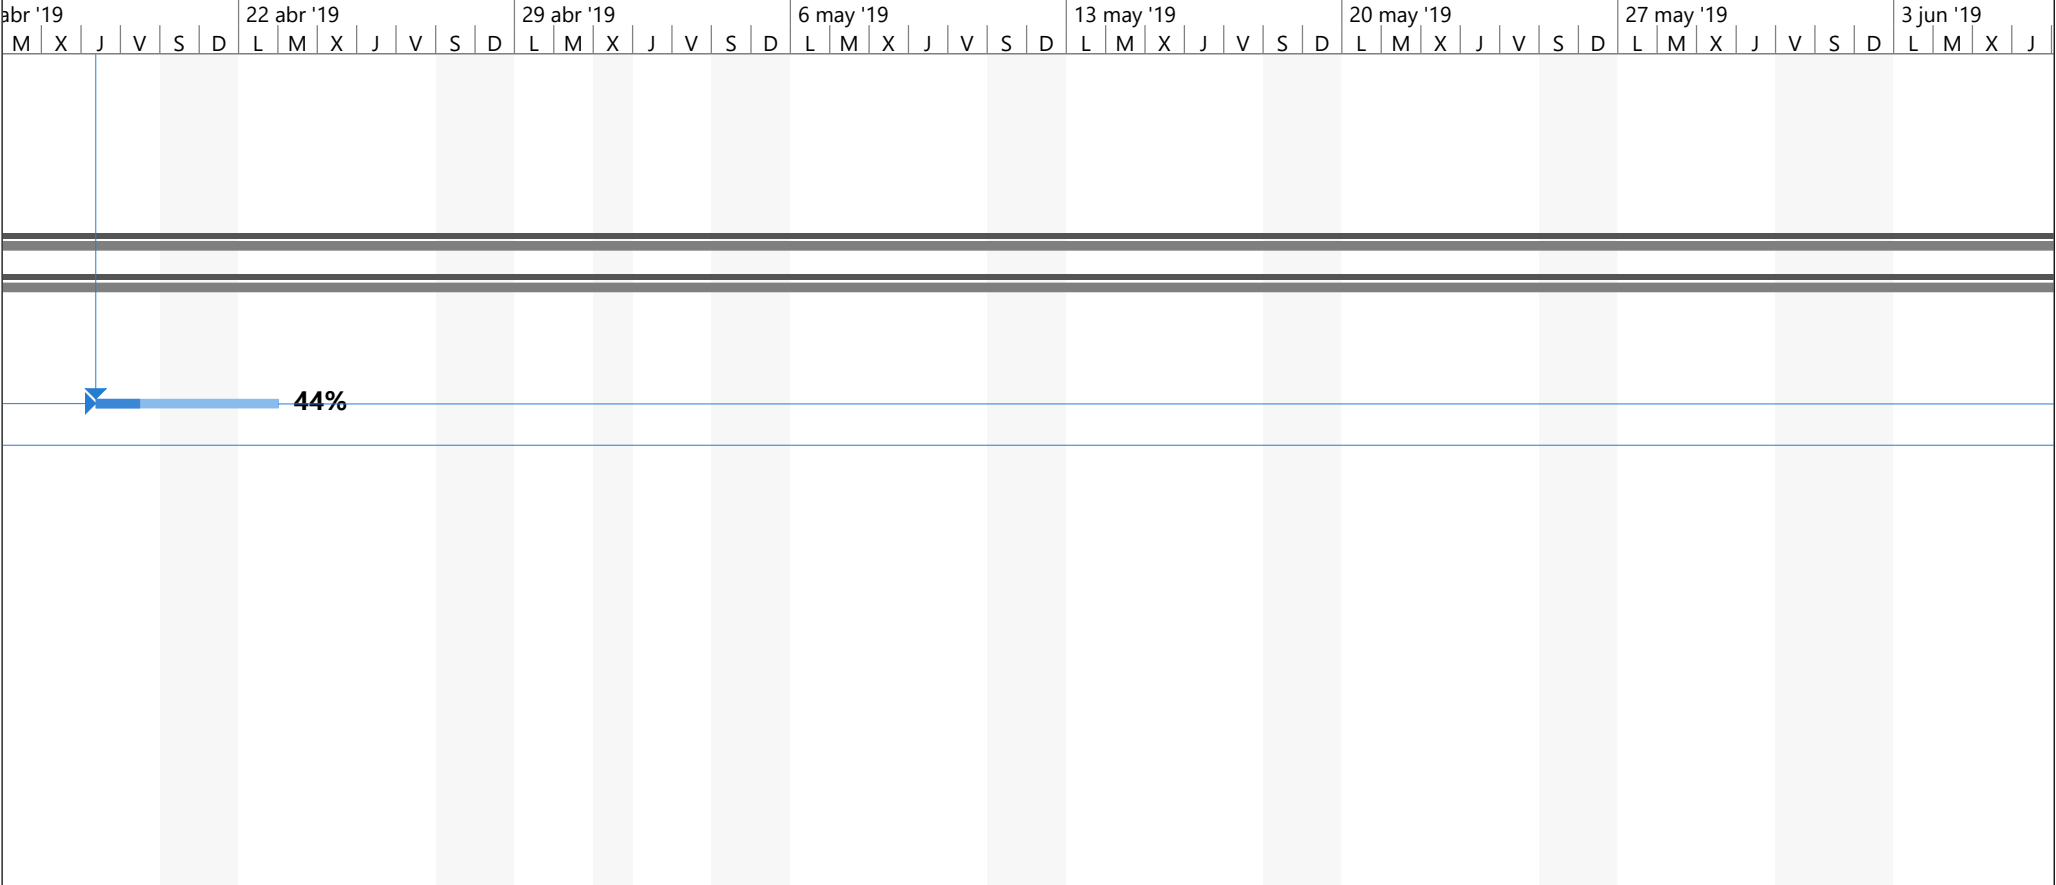





















Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

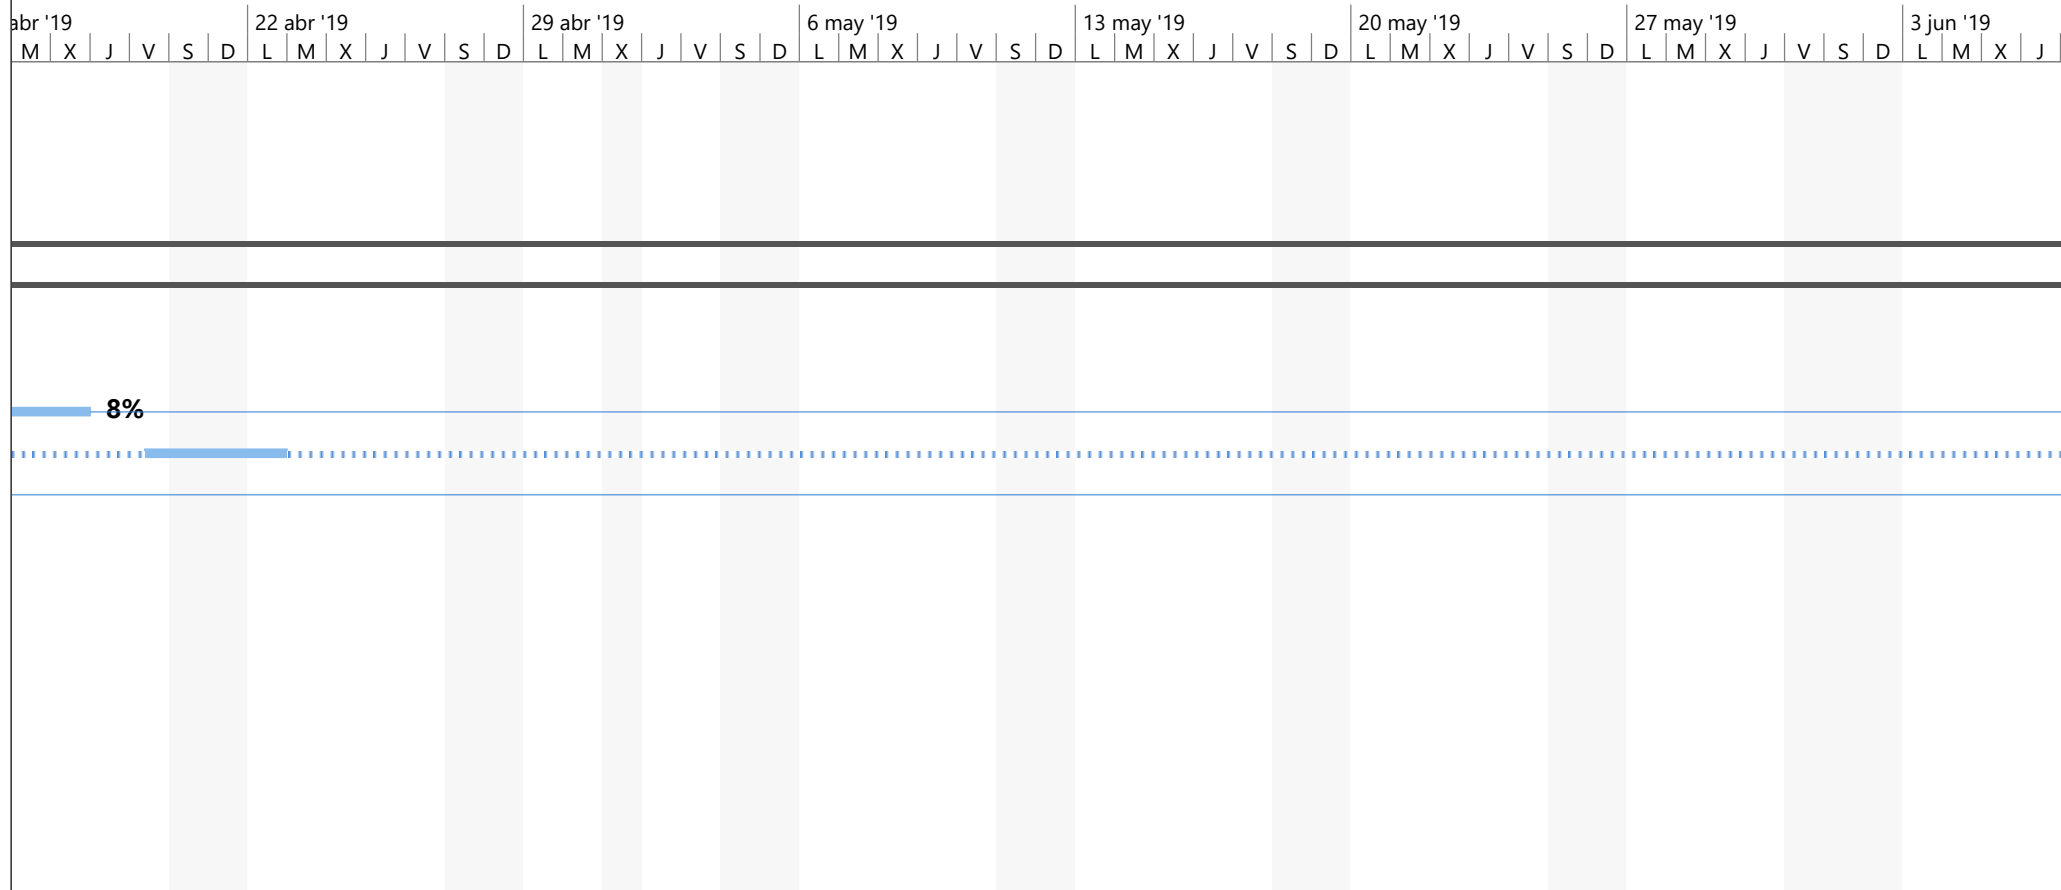










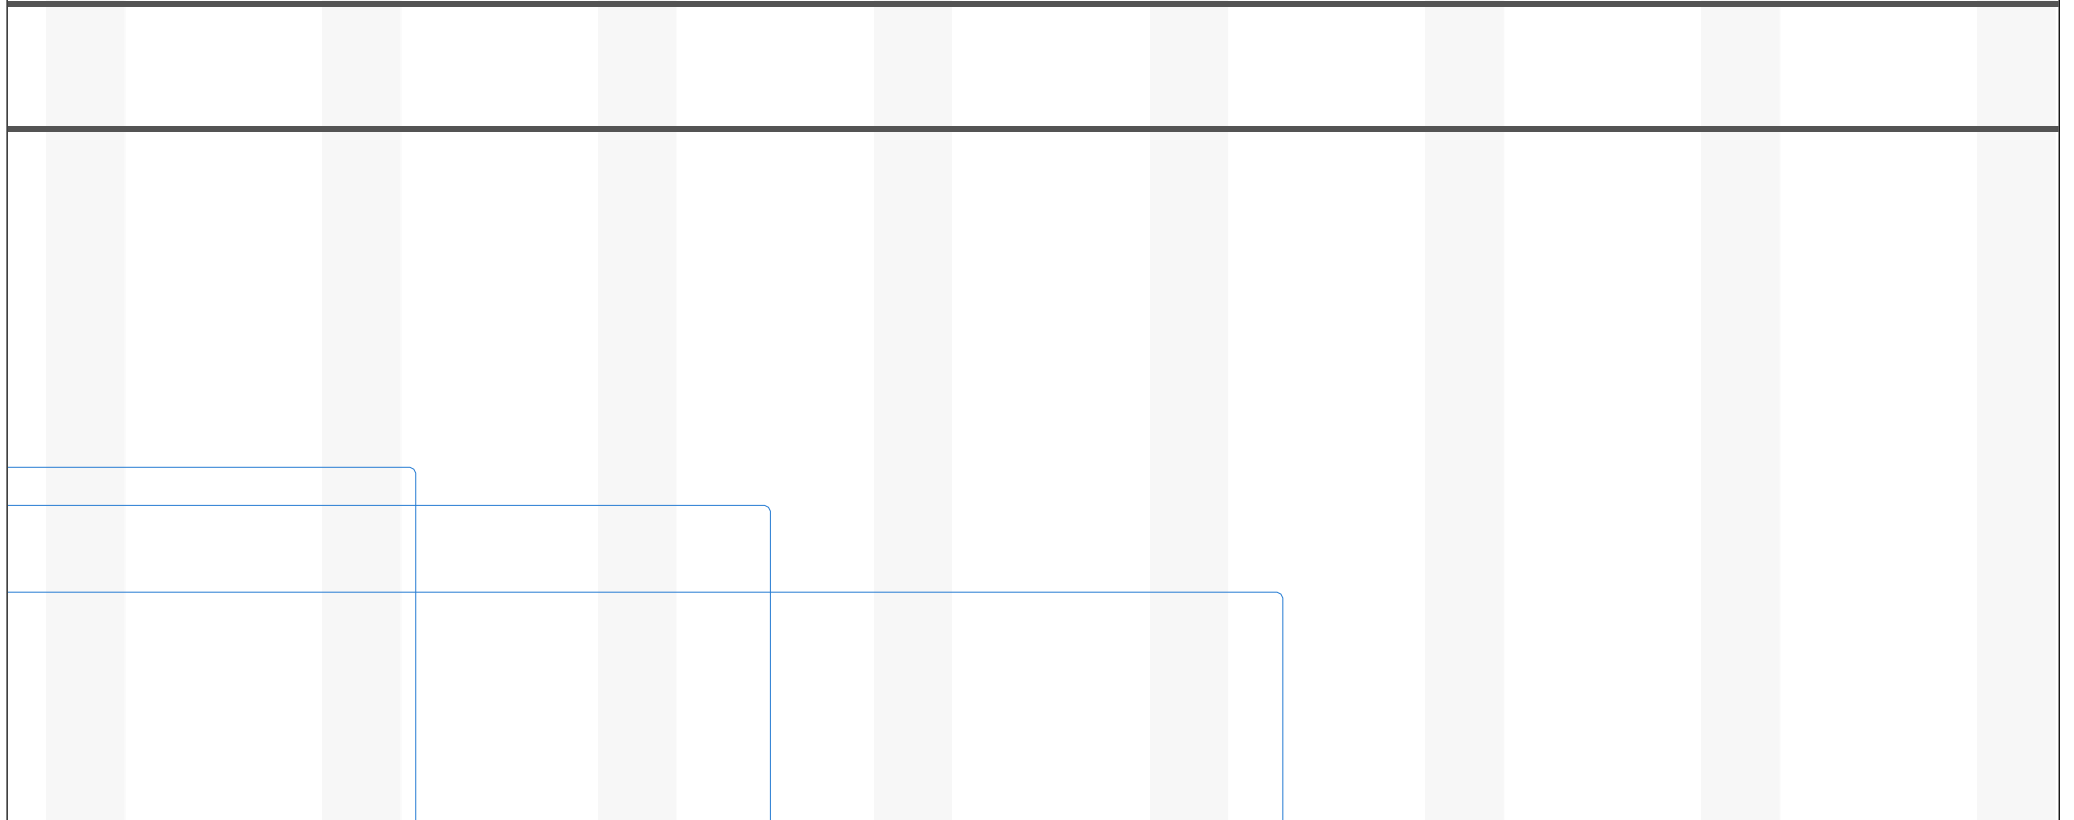















|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

























|   |   |   | 10 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 17 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 24 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 1 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 8 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 15 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 22 jul '19 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |




|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

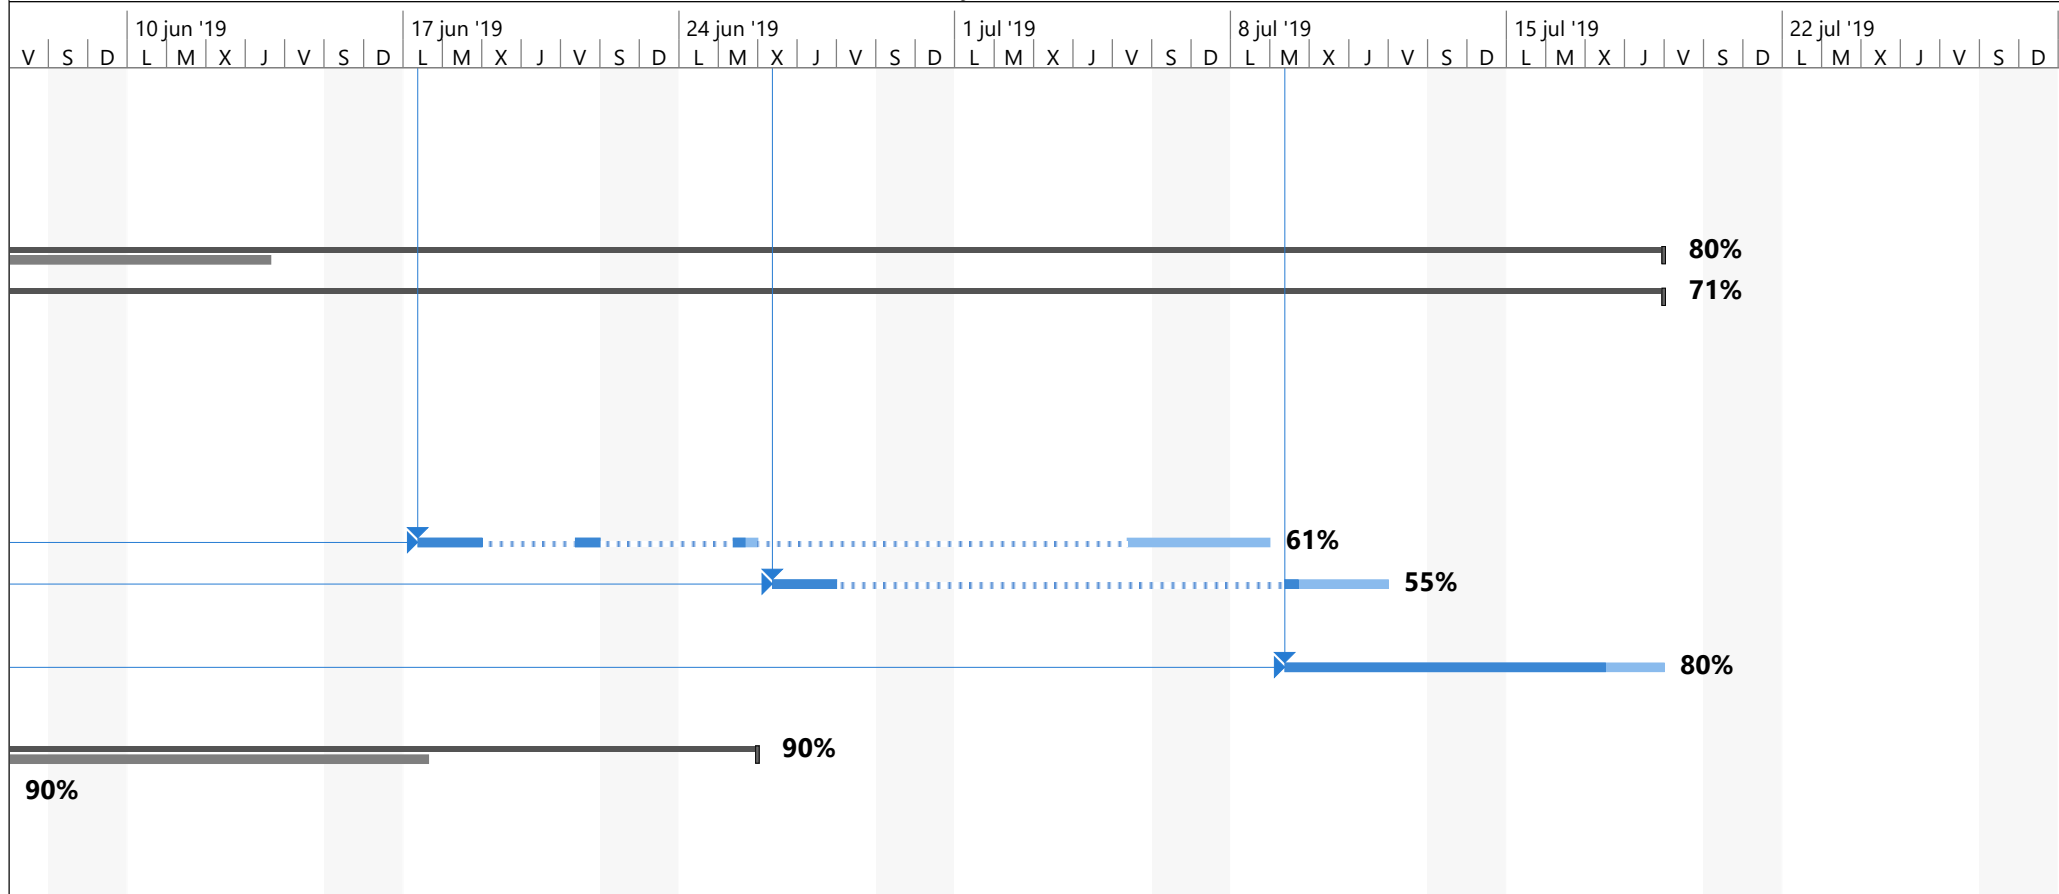


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

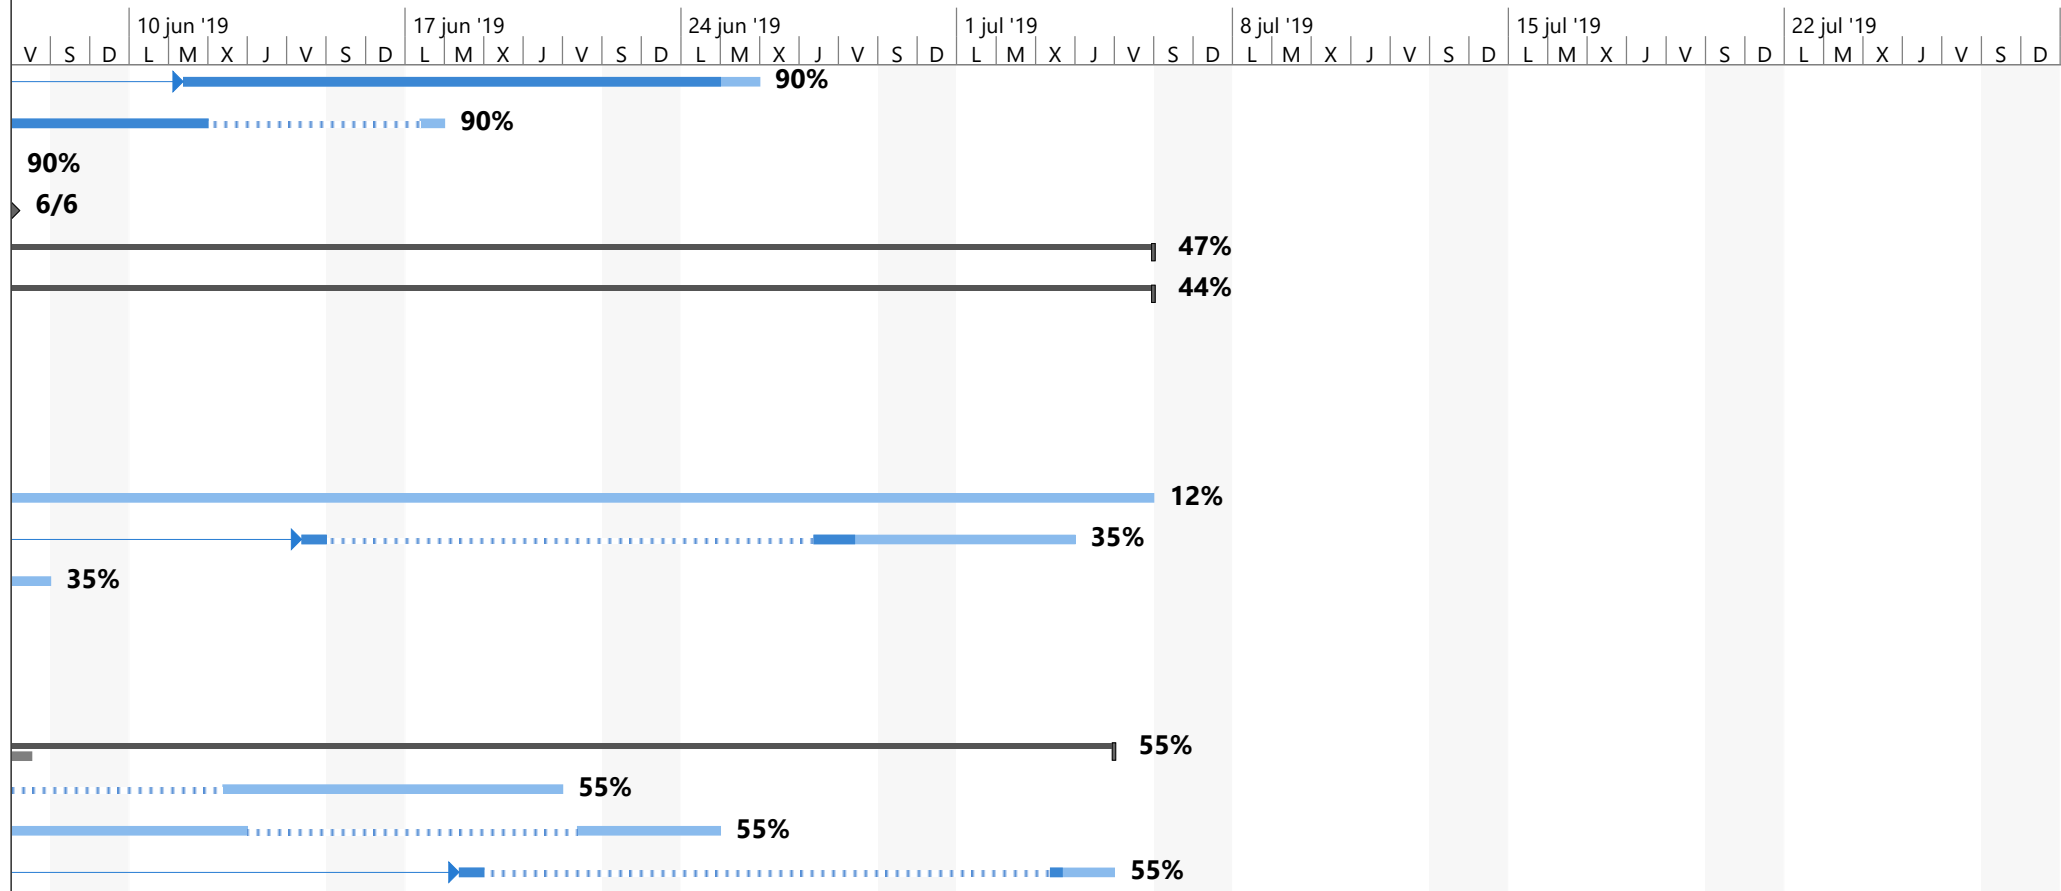

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

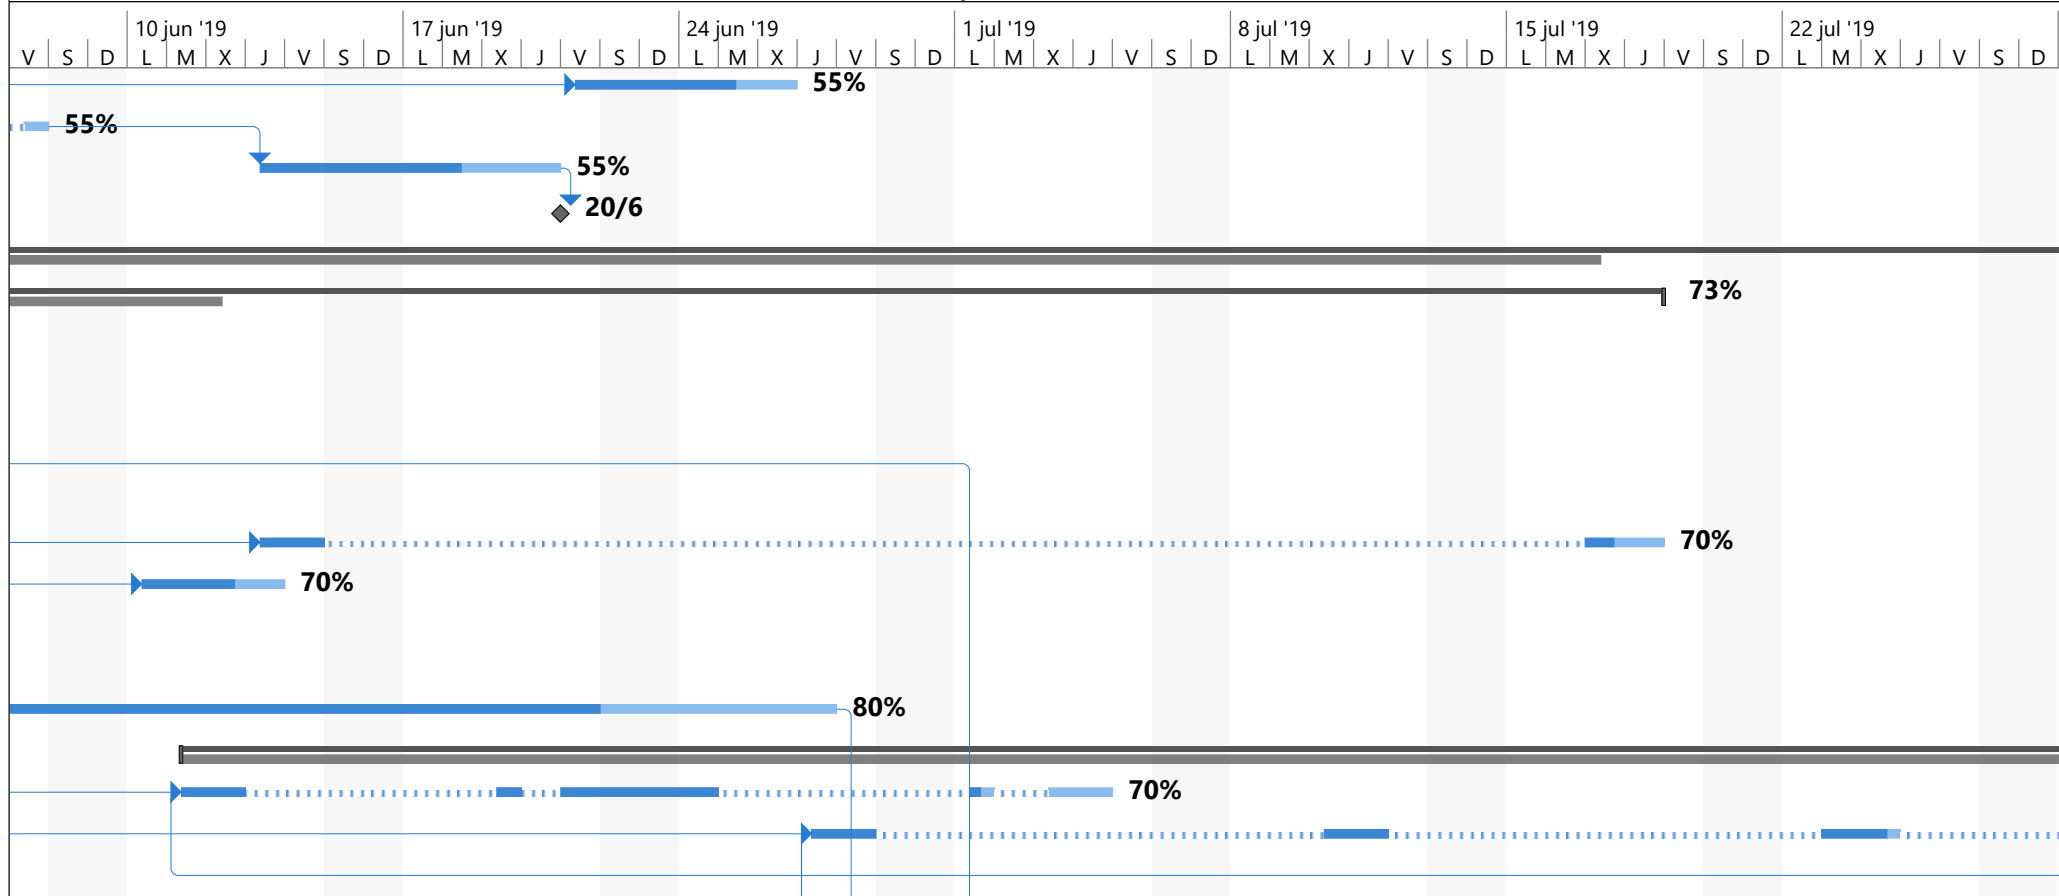


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

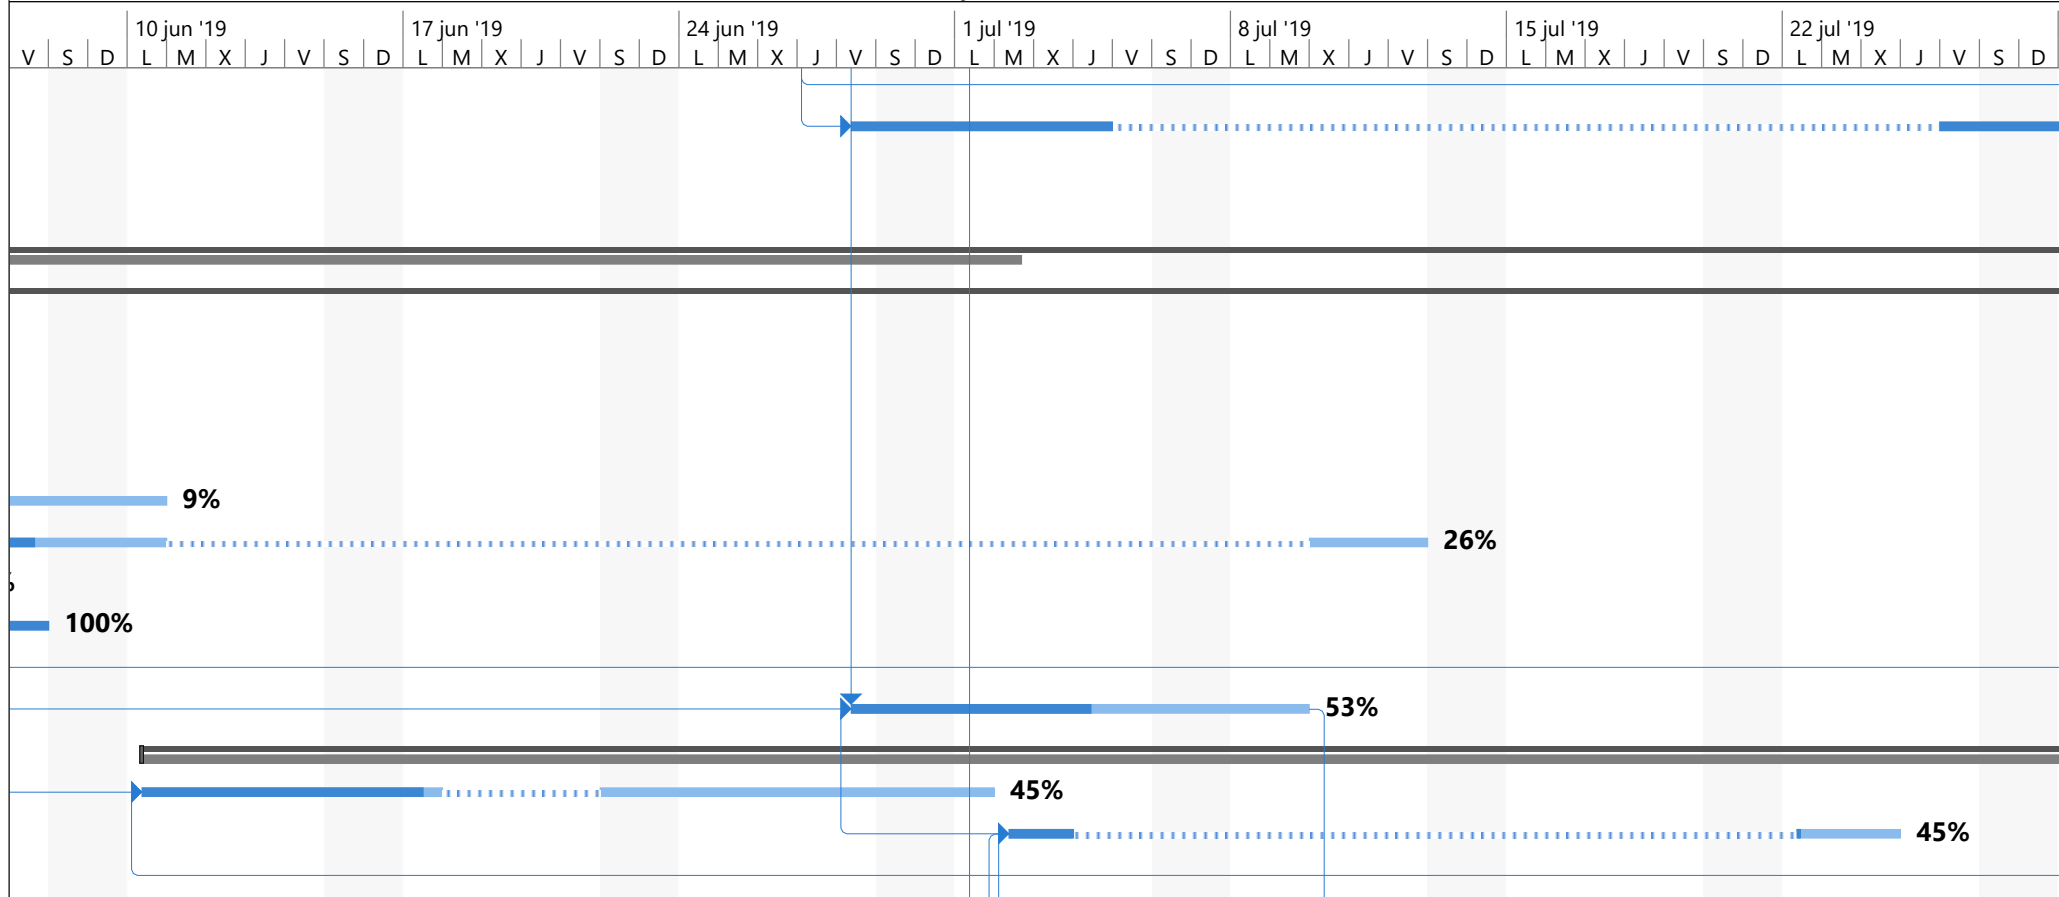

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

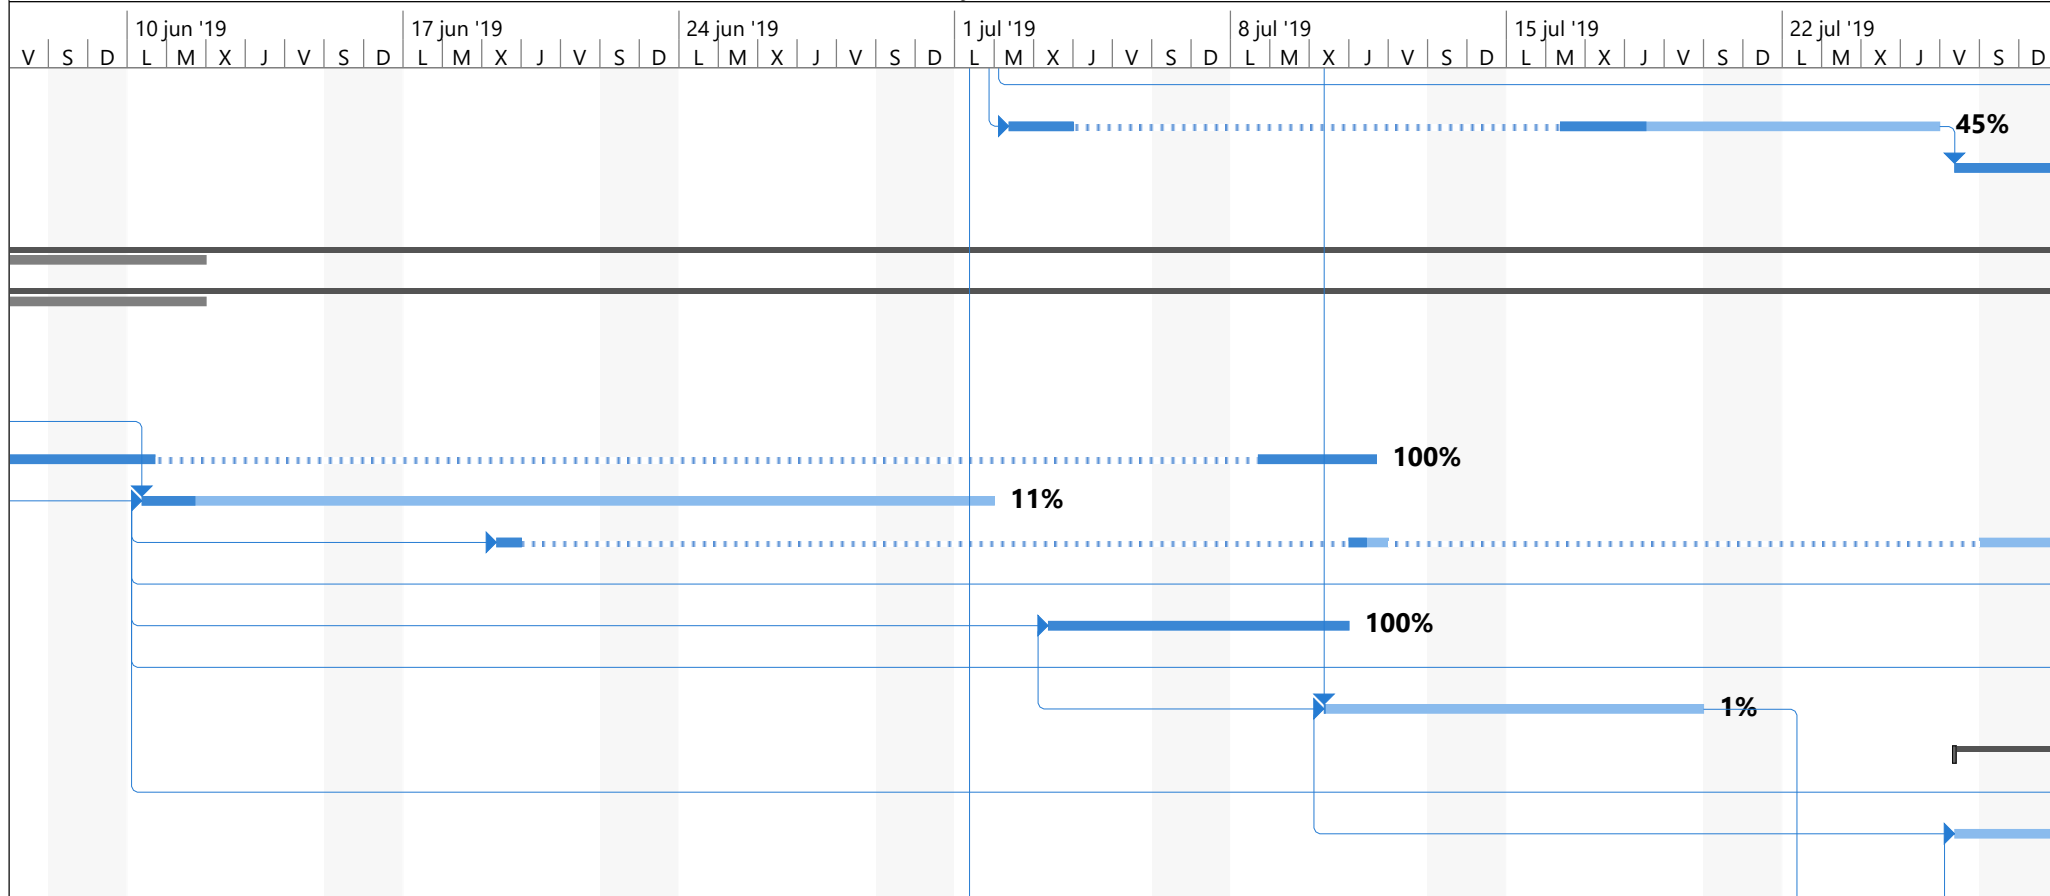


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

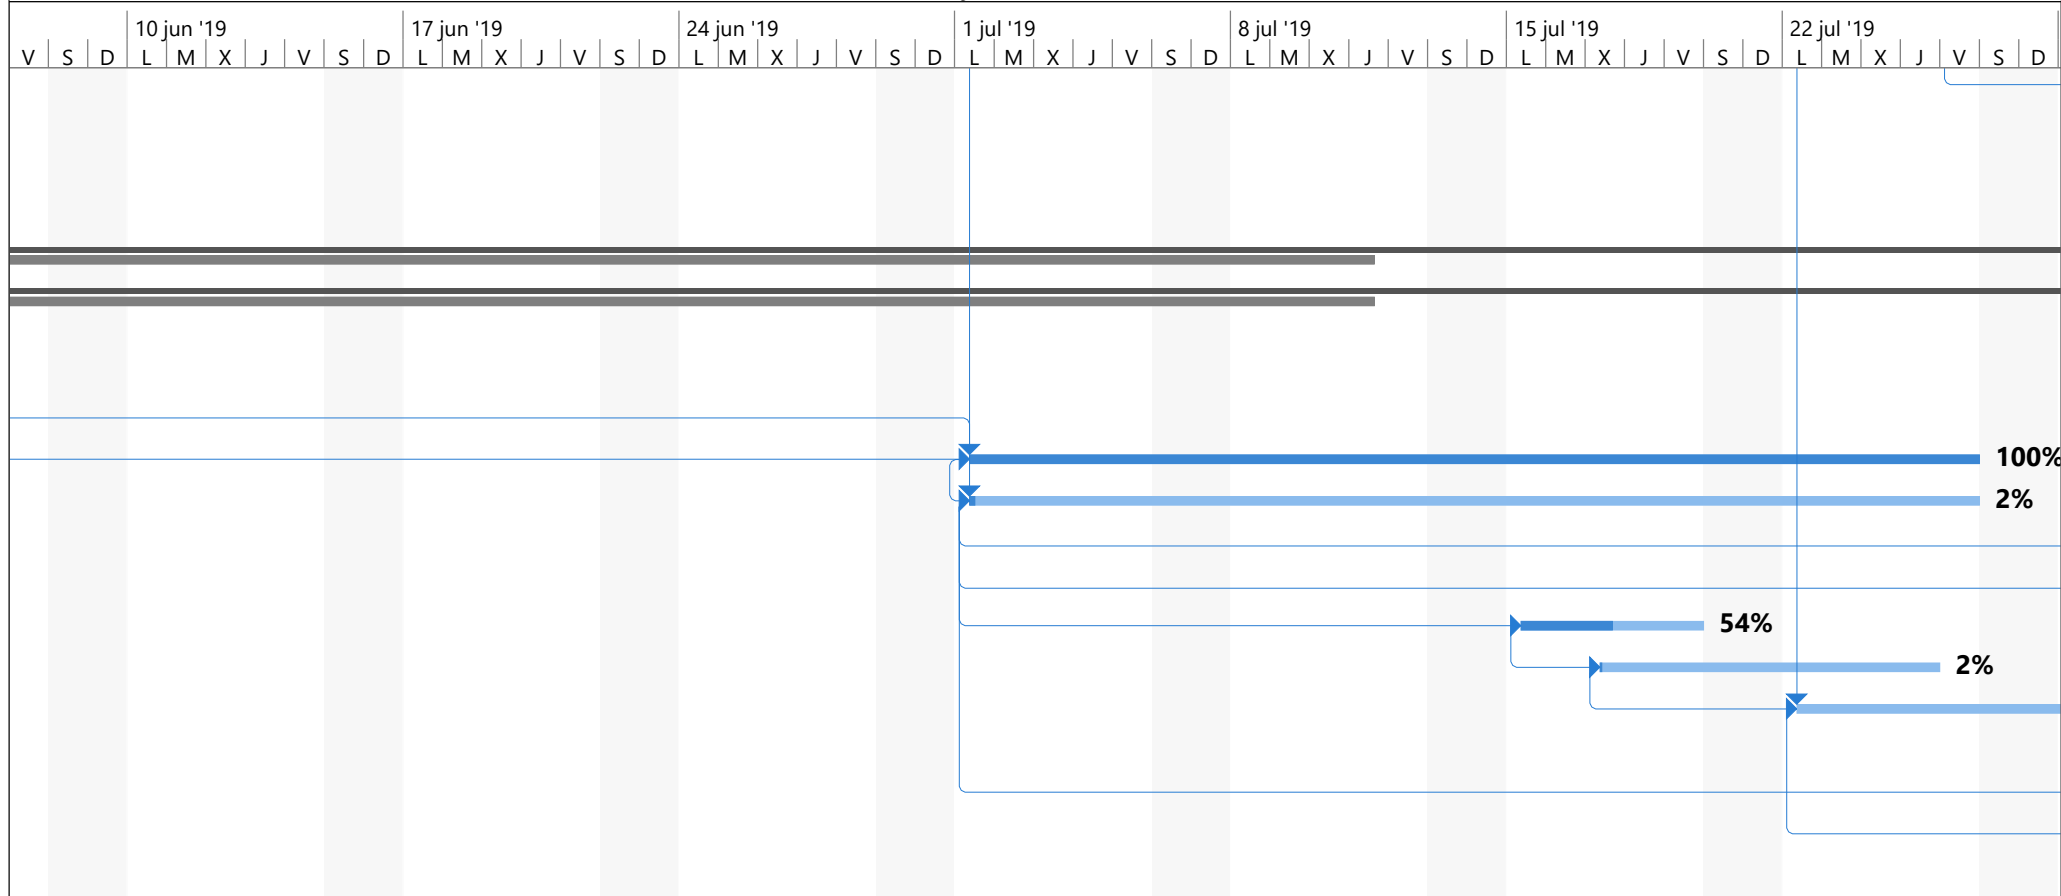


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

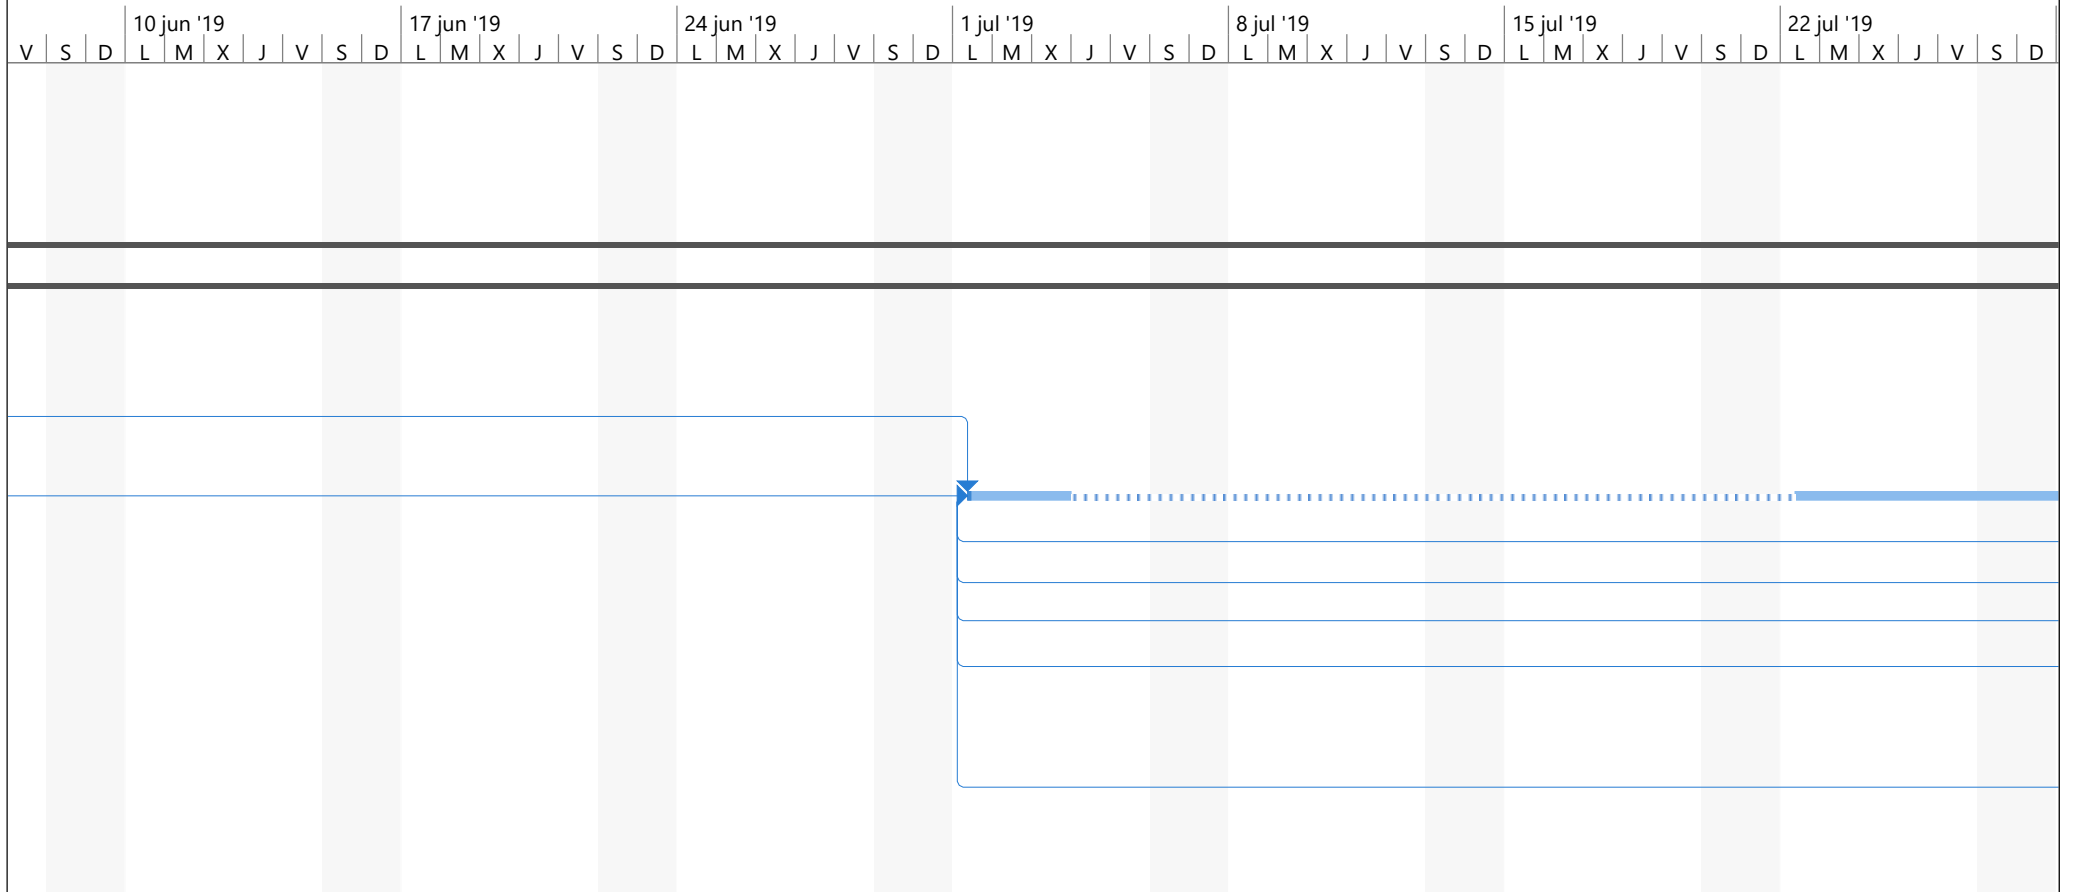

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

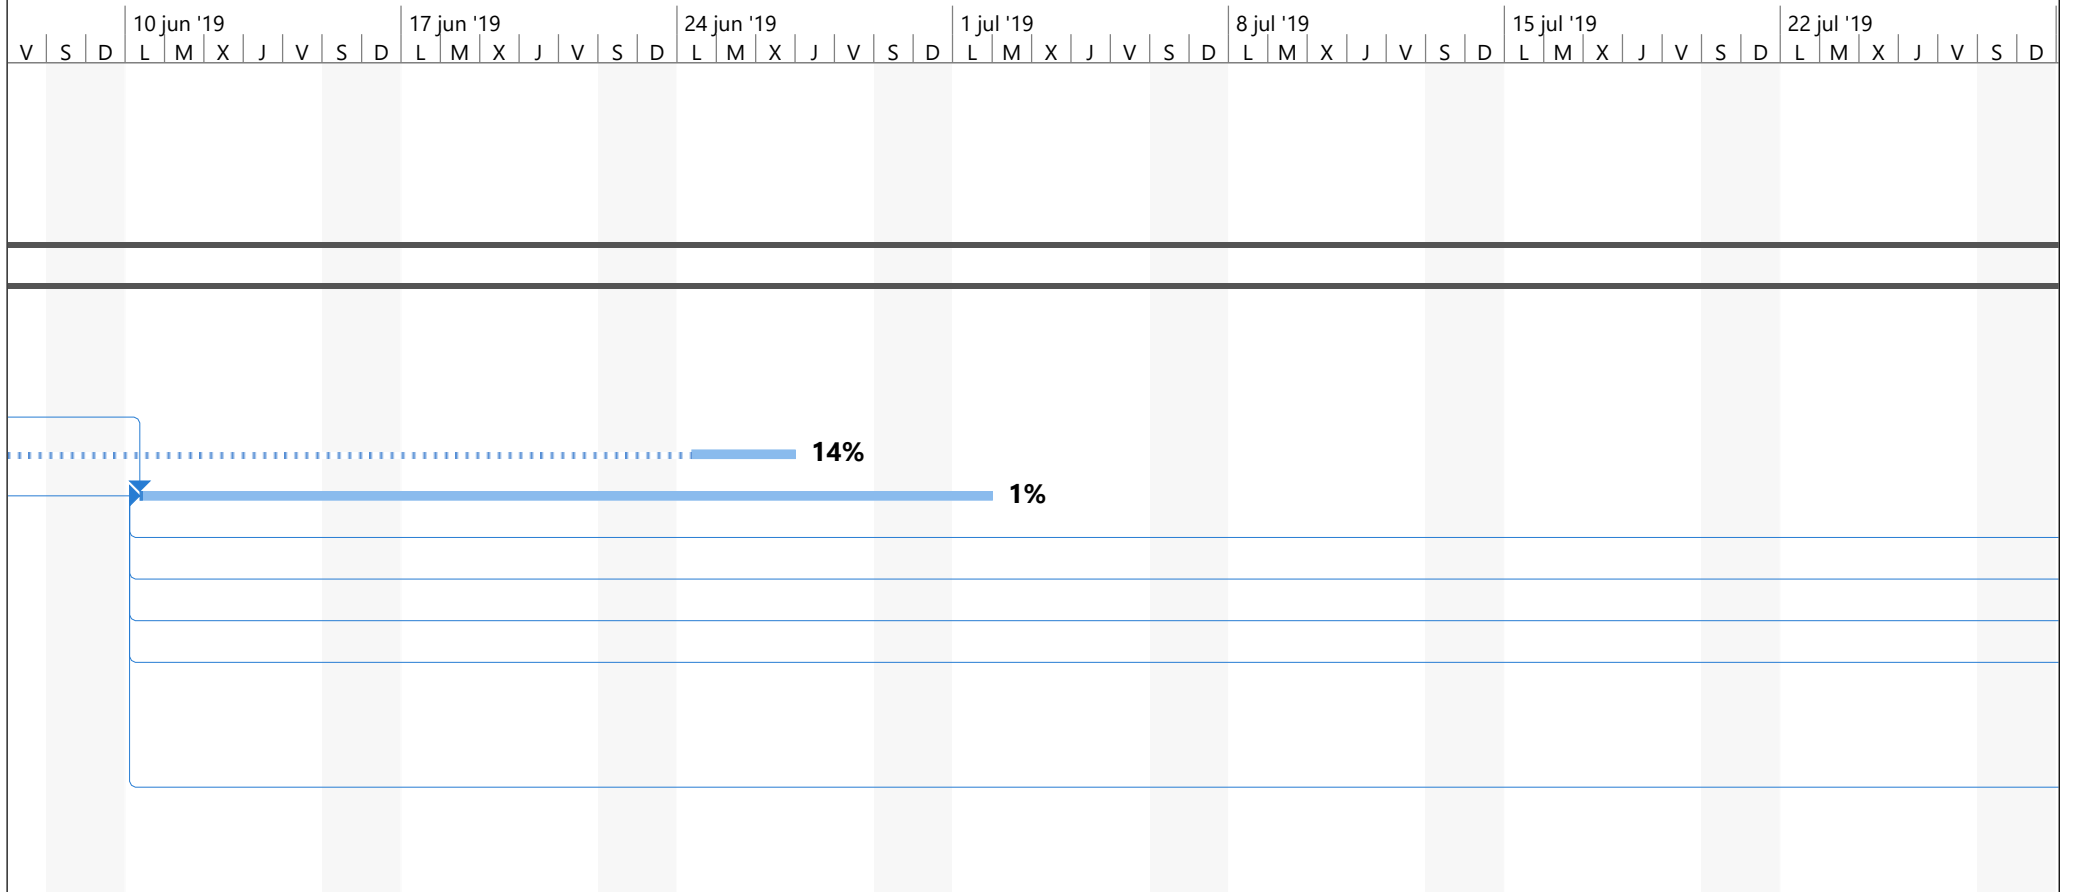


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |









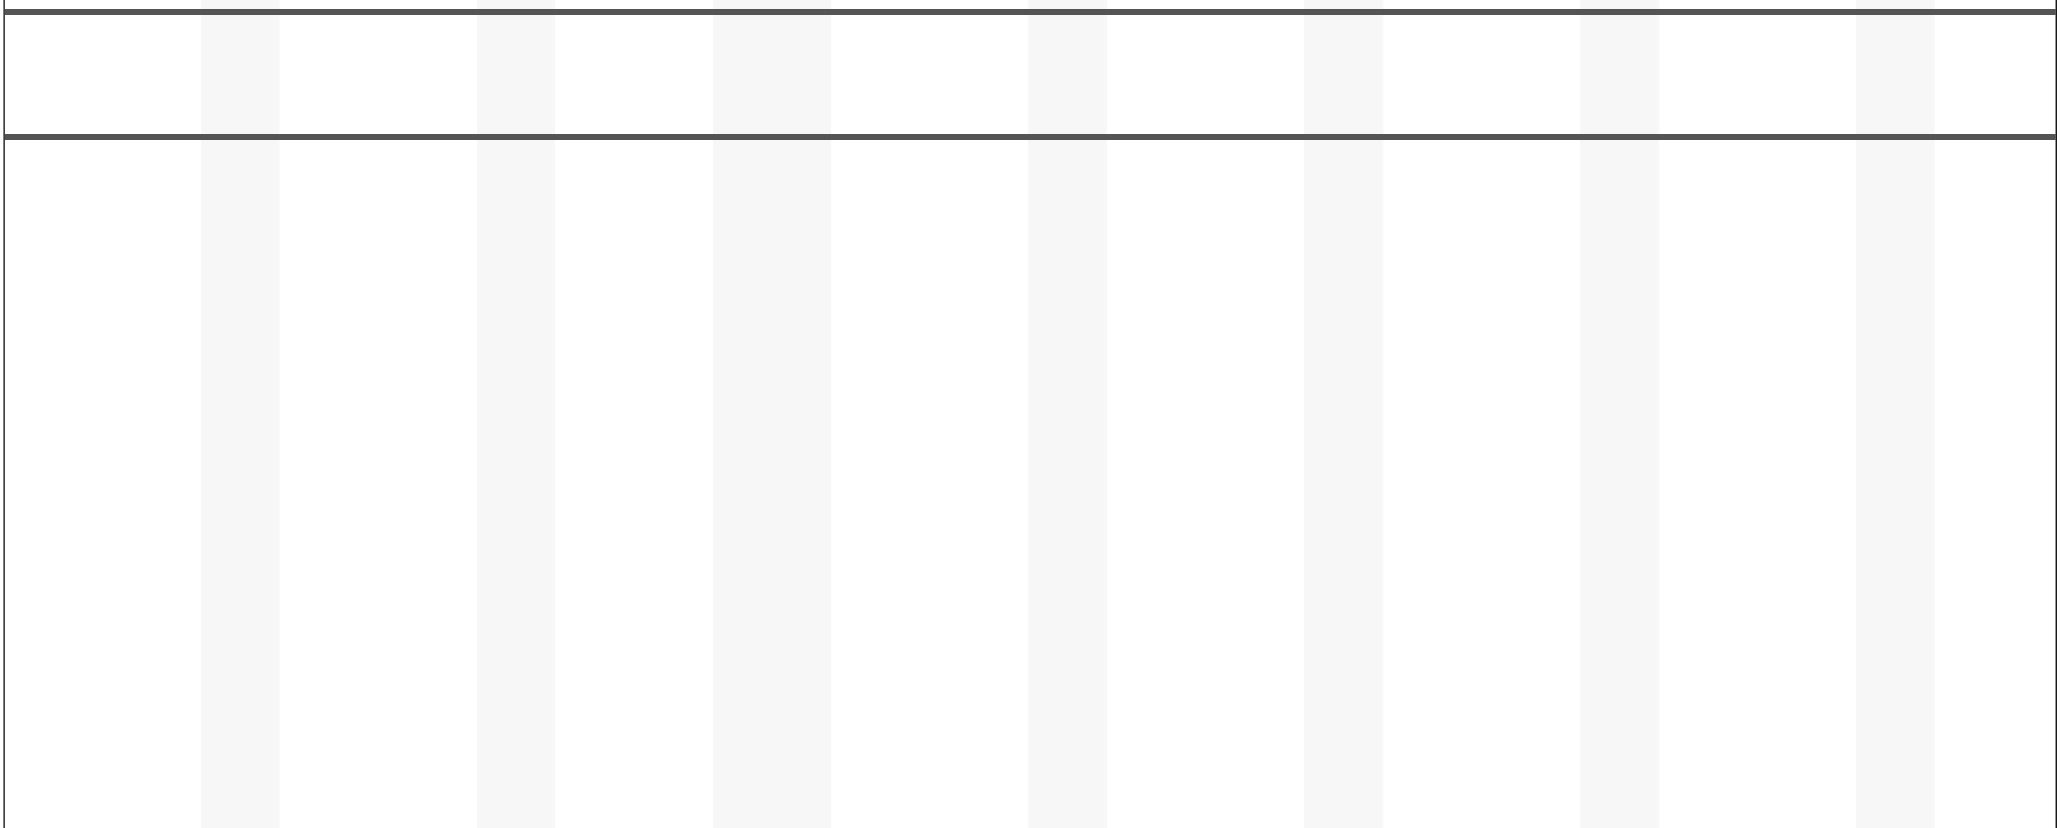















## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



























# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

| 29 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 5 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 12 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 19 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 26 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 2 sep '19 |   |   |  |  |  |  | 9 sep '19 |  |  |  |  |  |  | 16 sep '19 |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |            |  |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

[illegible]


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

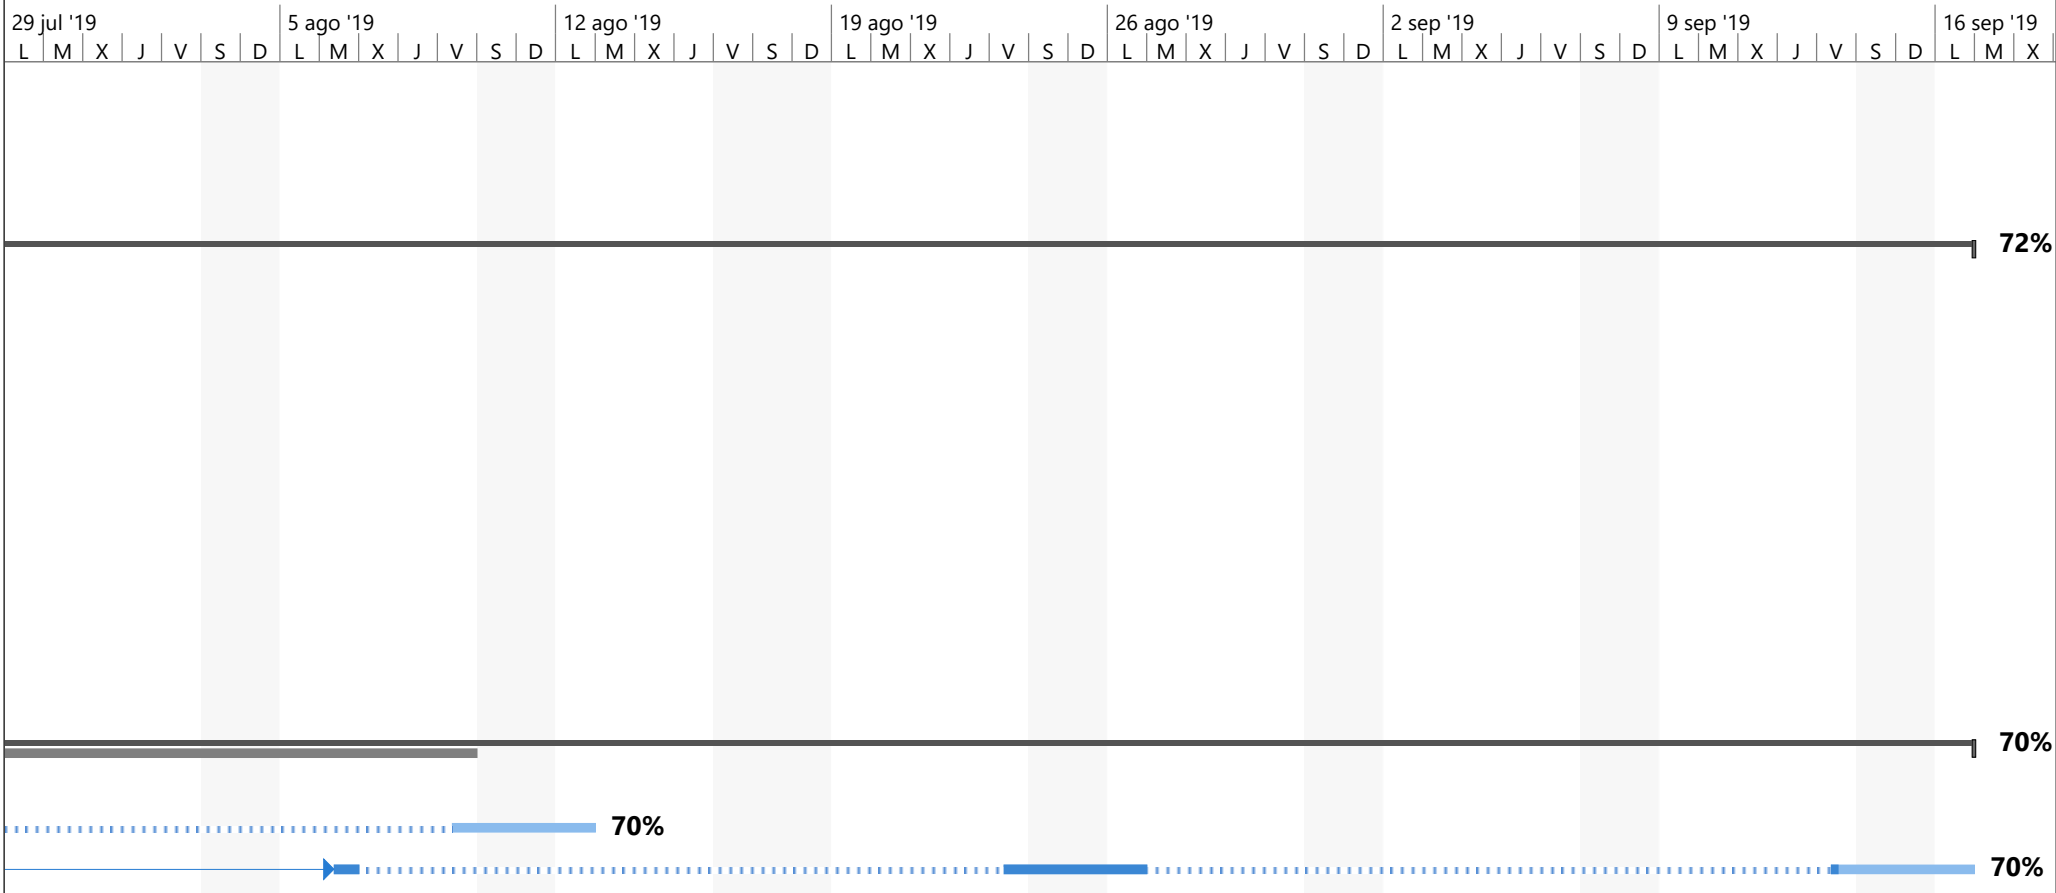


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

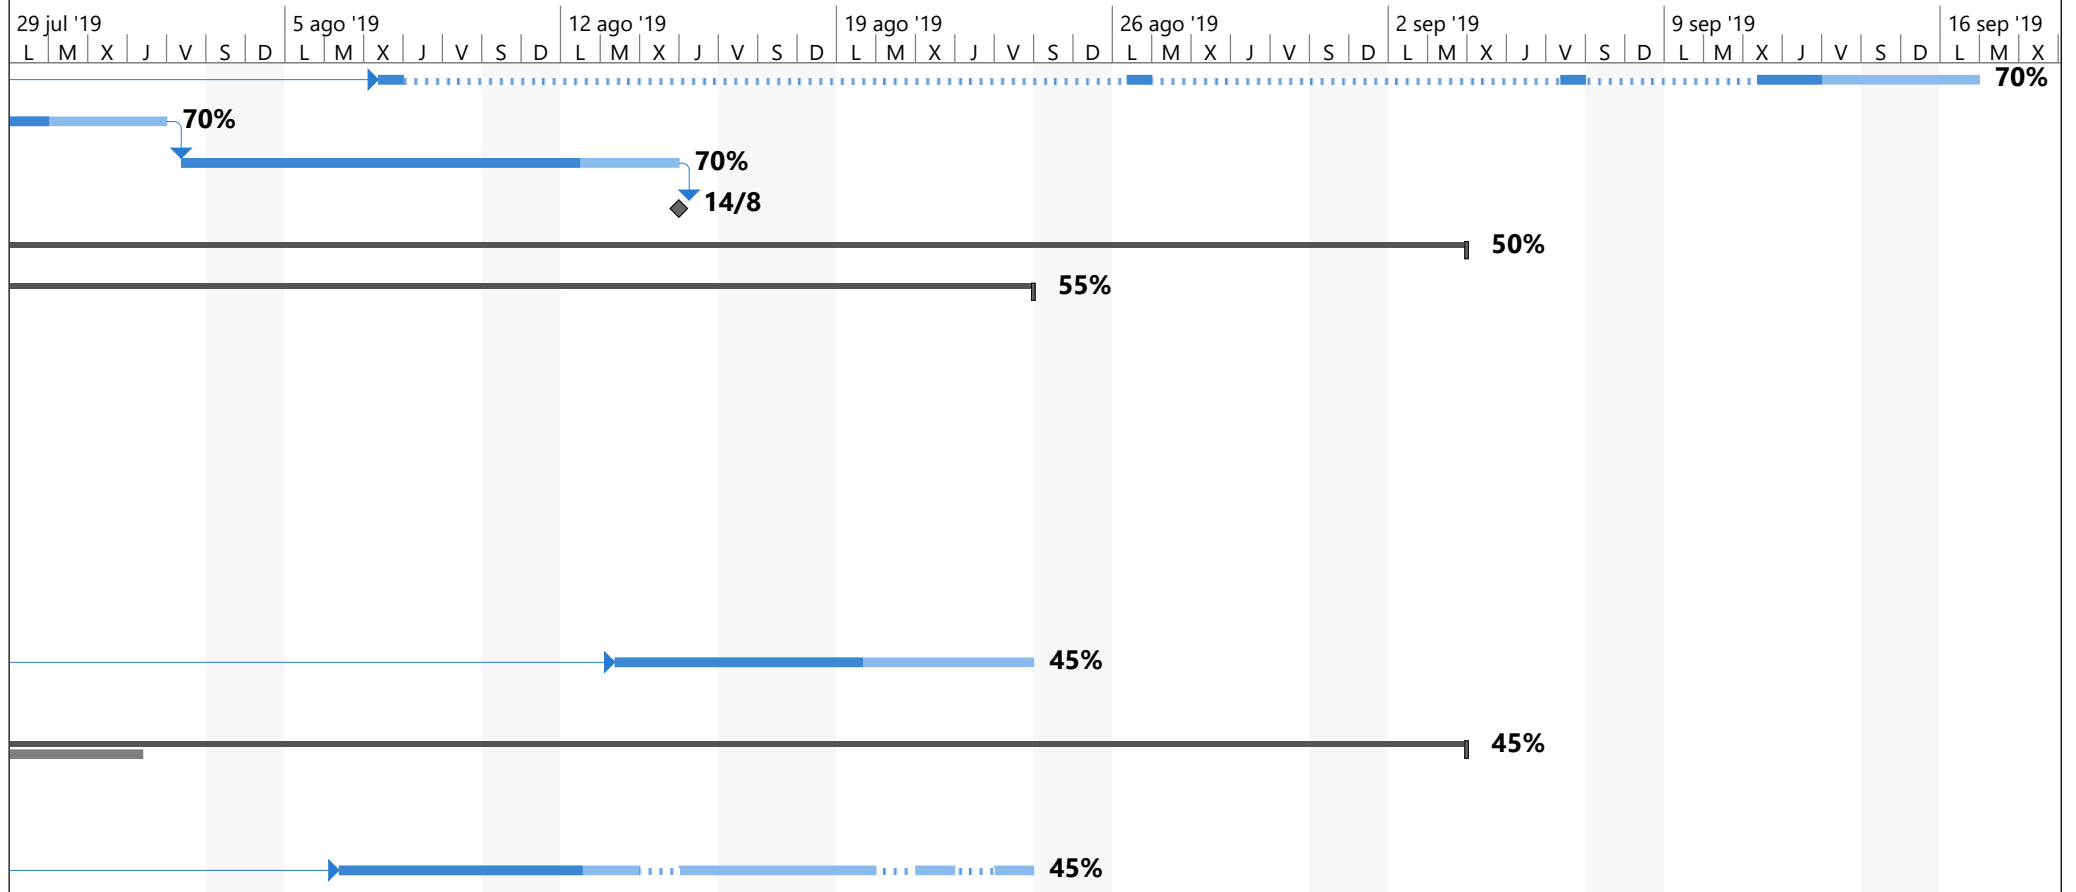


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

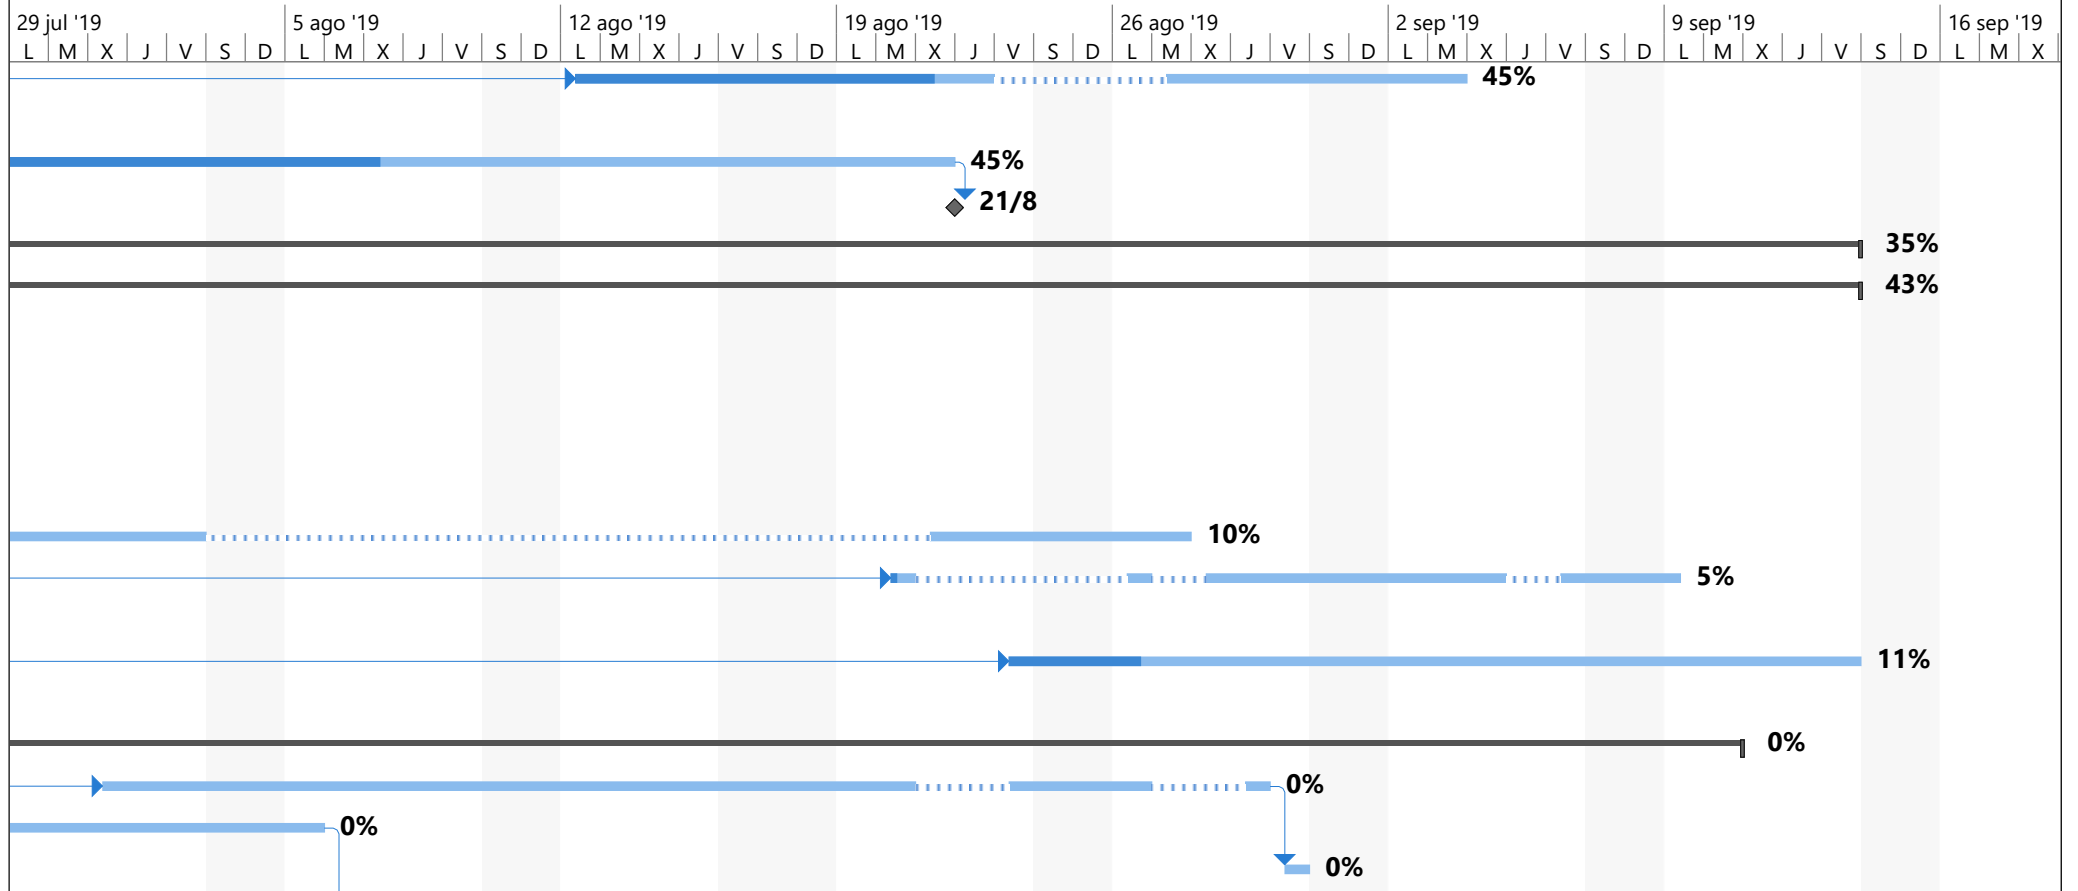


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

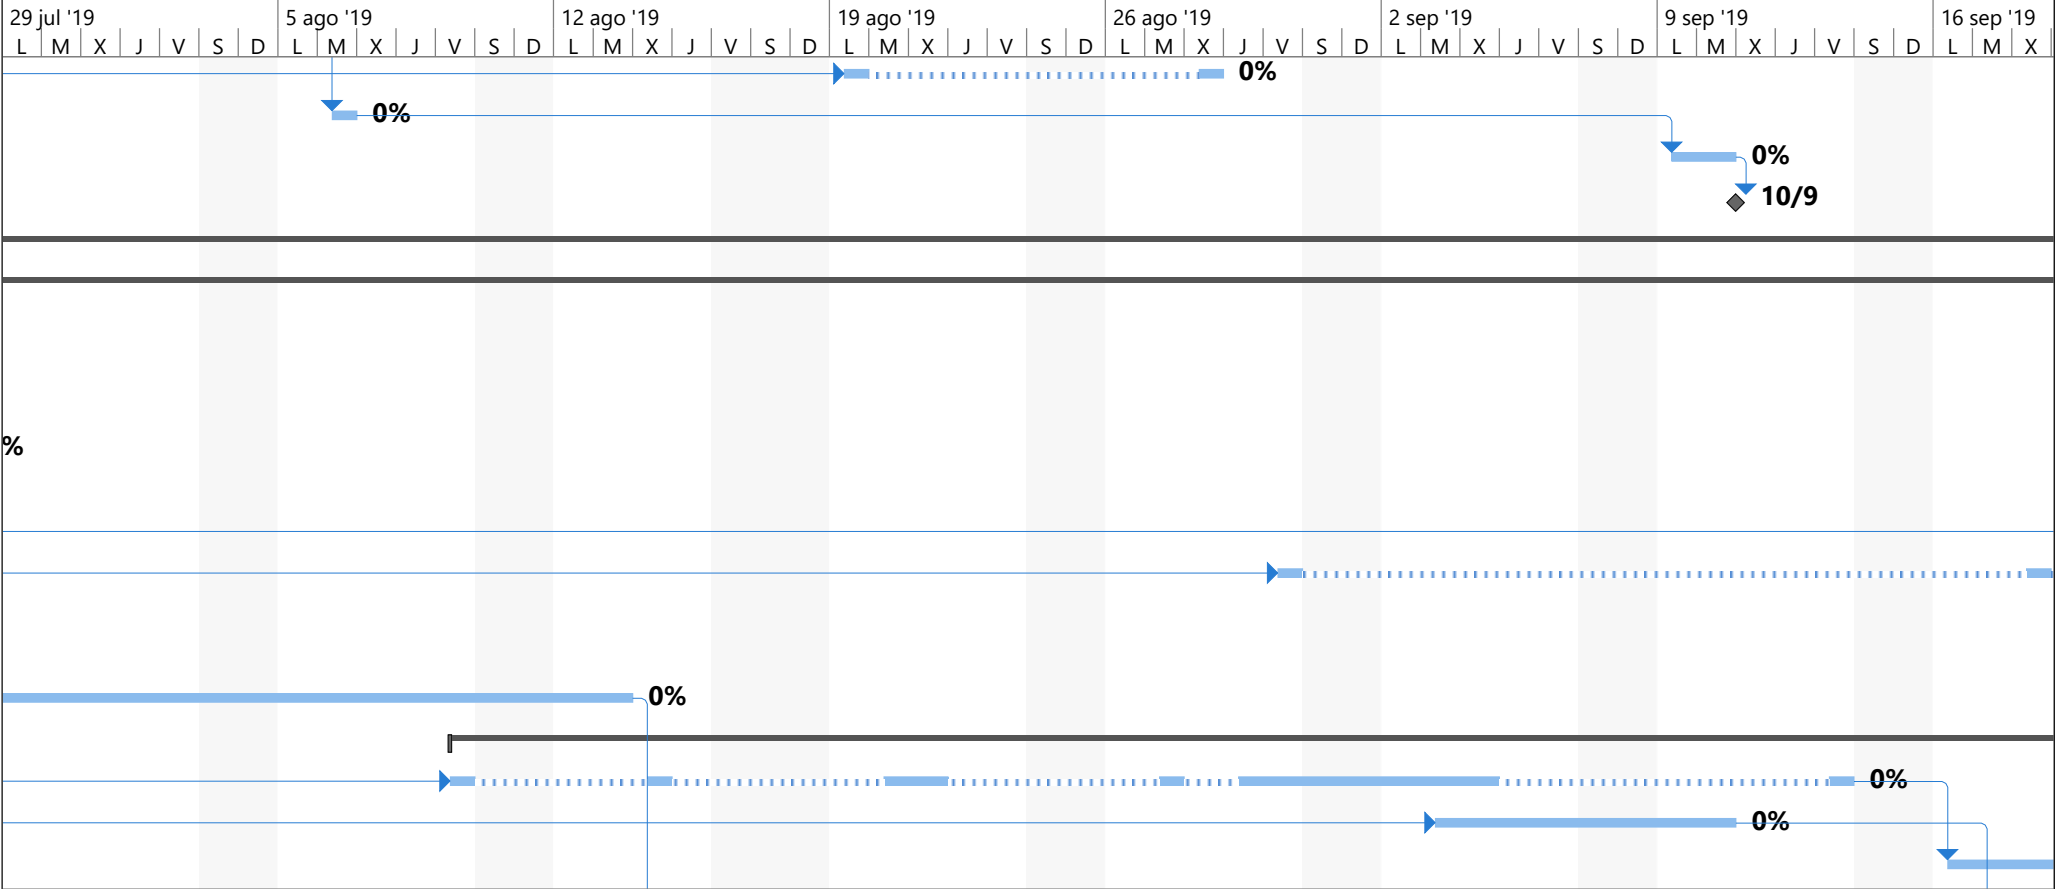


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

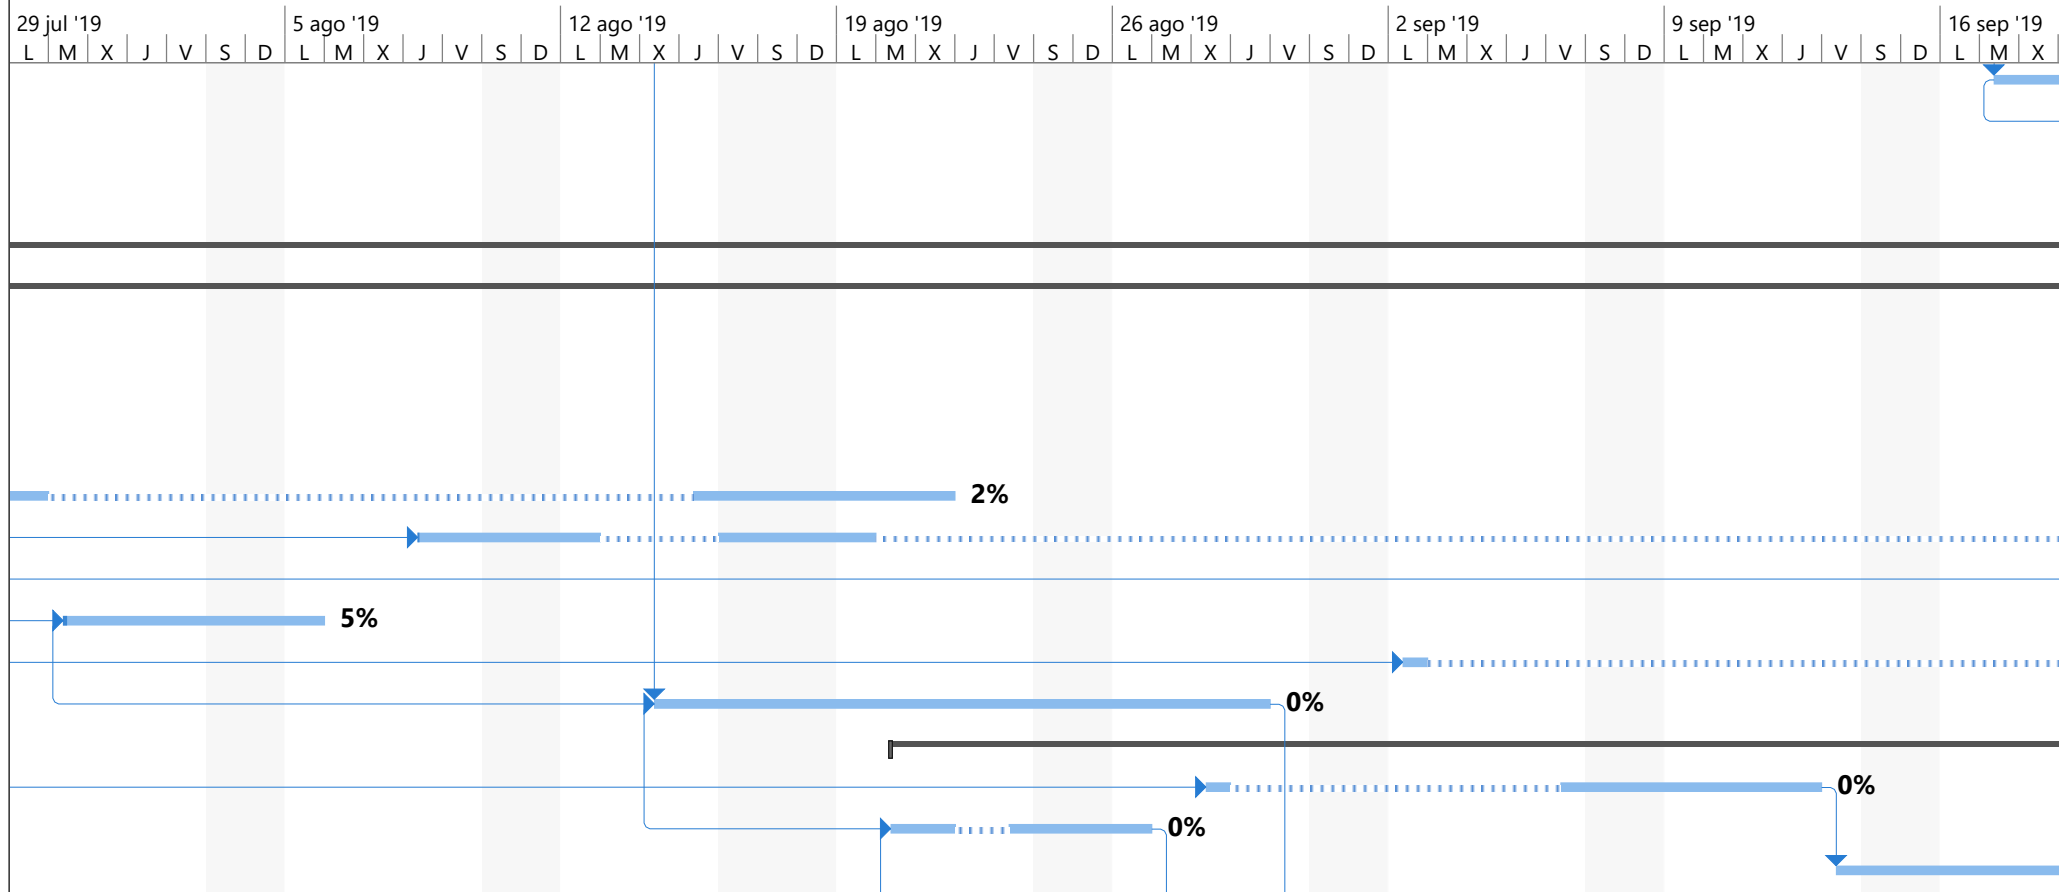

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

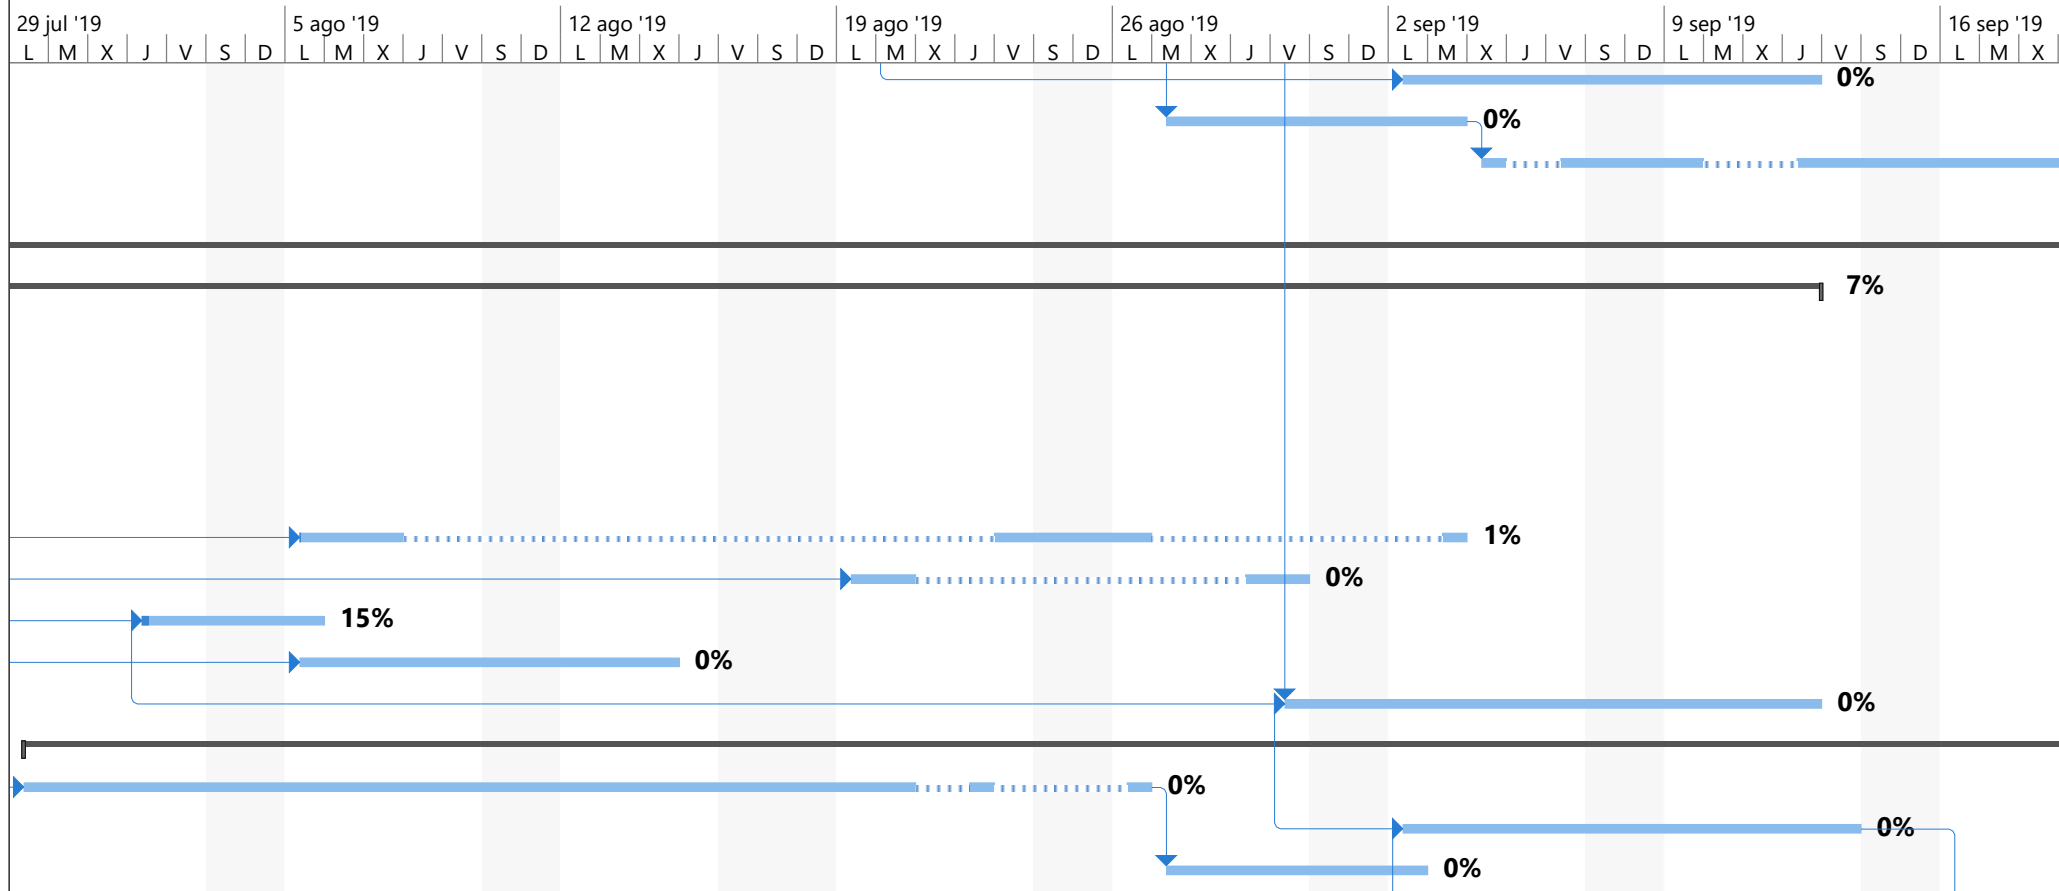

























|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




|                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p align="center">Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




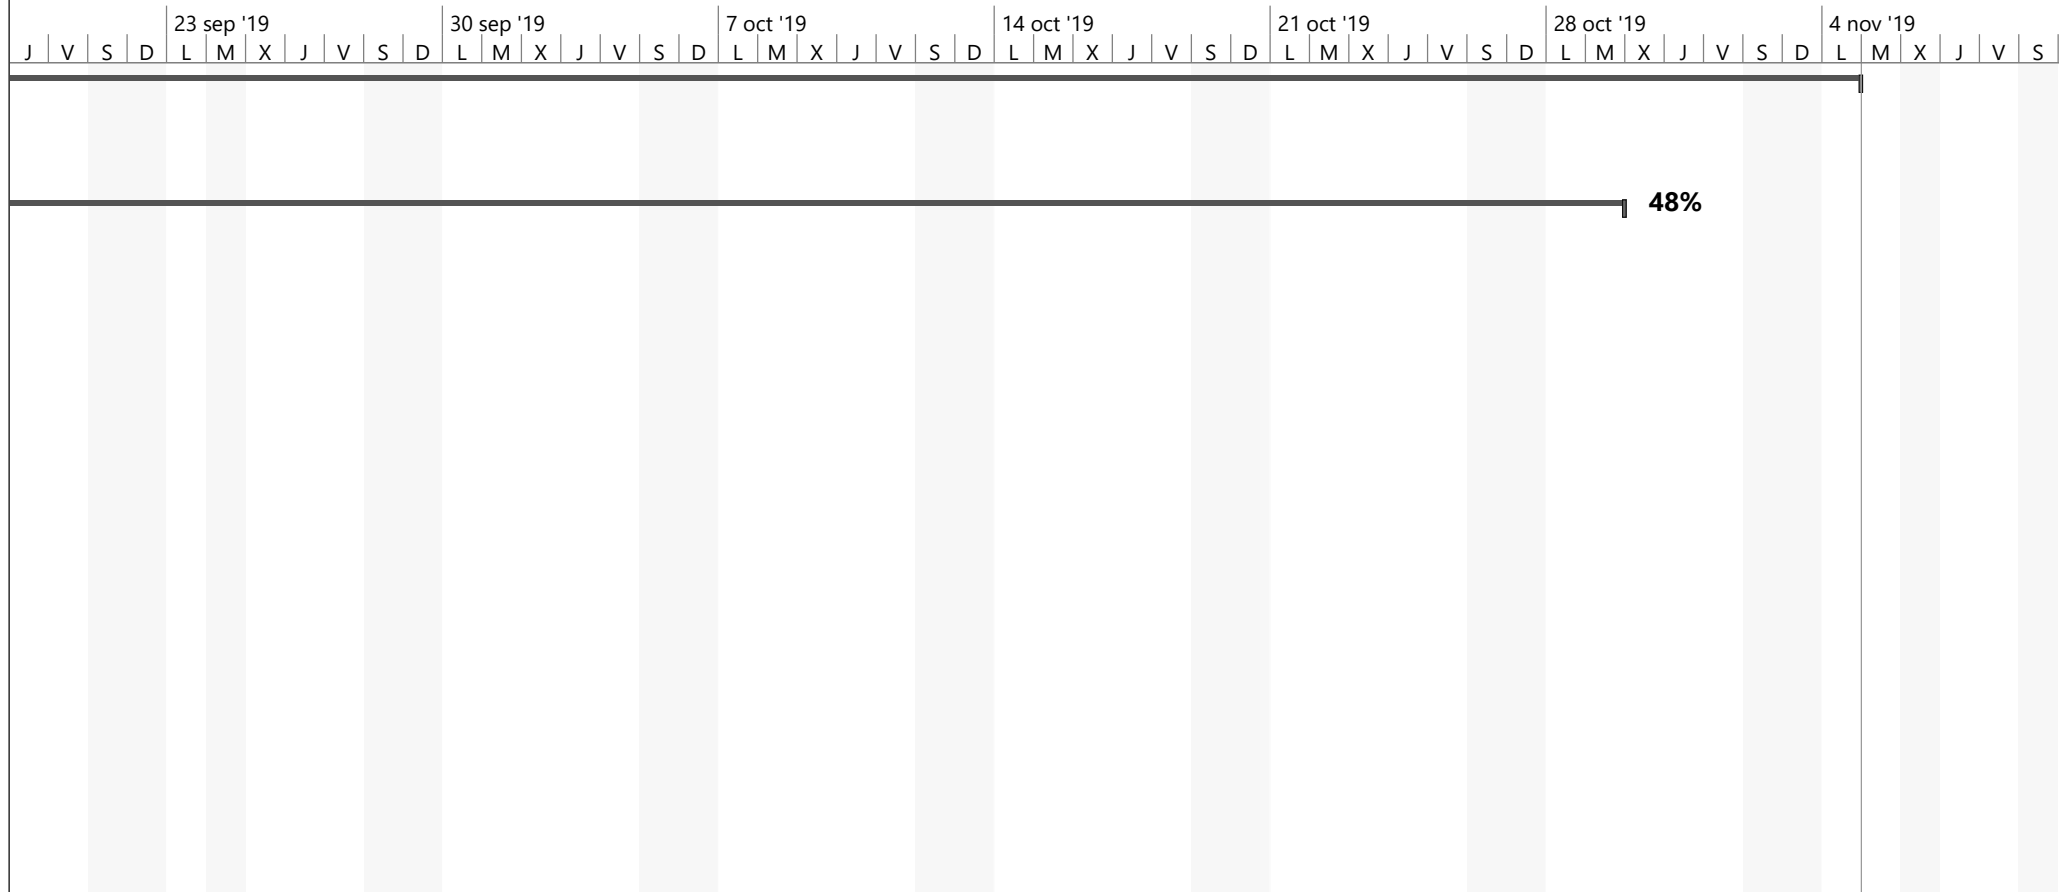




















# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |


|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




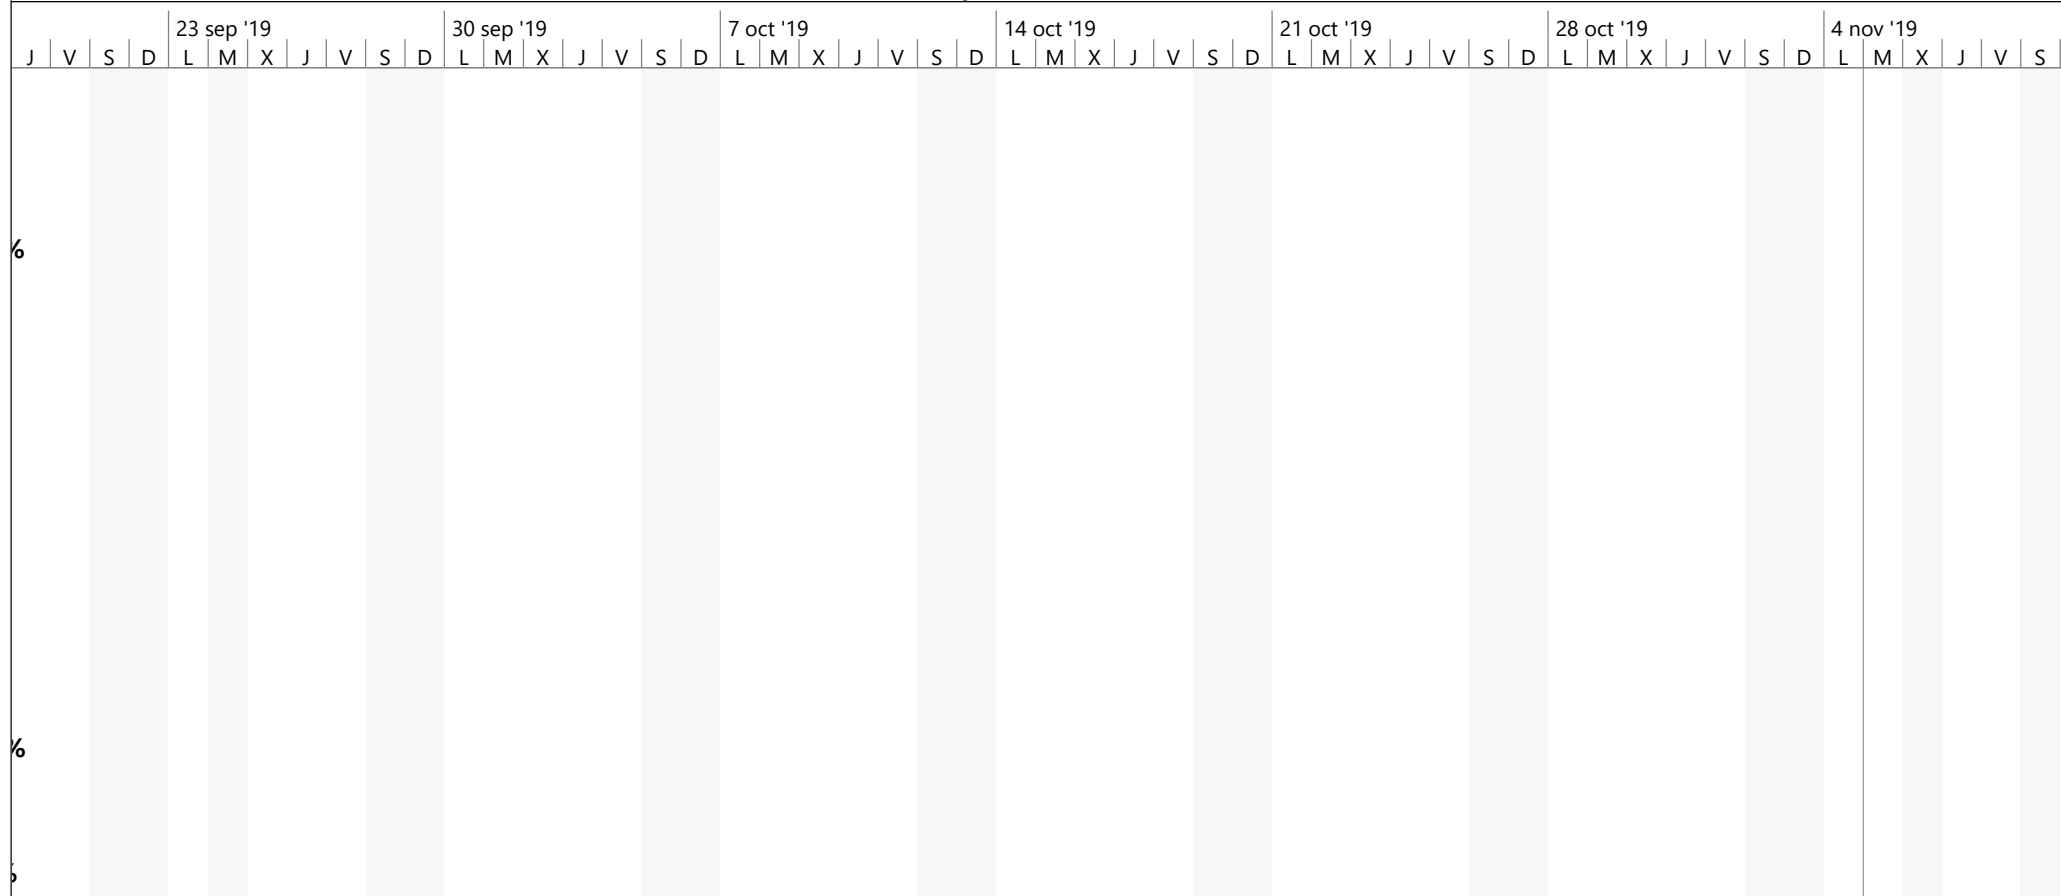




















# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

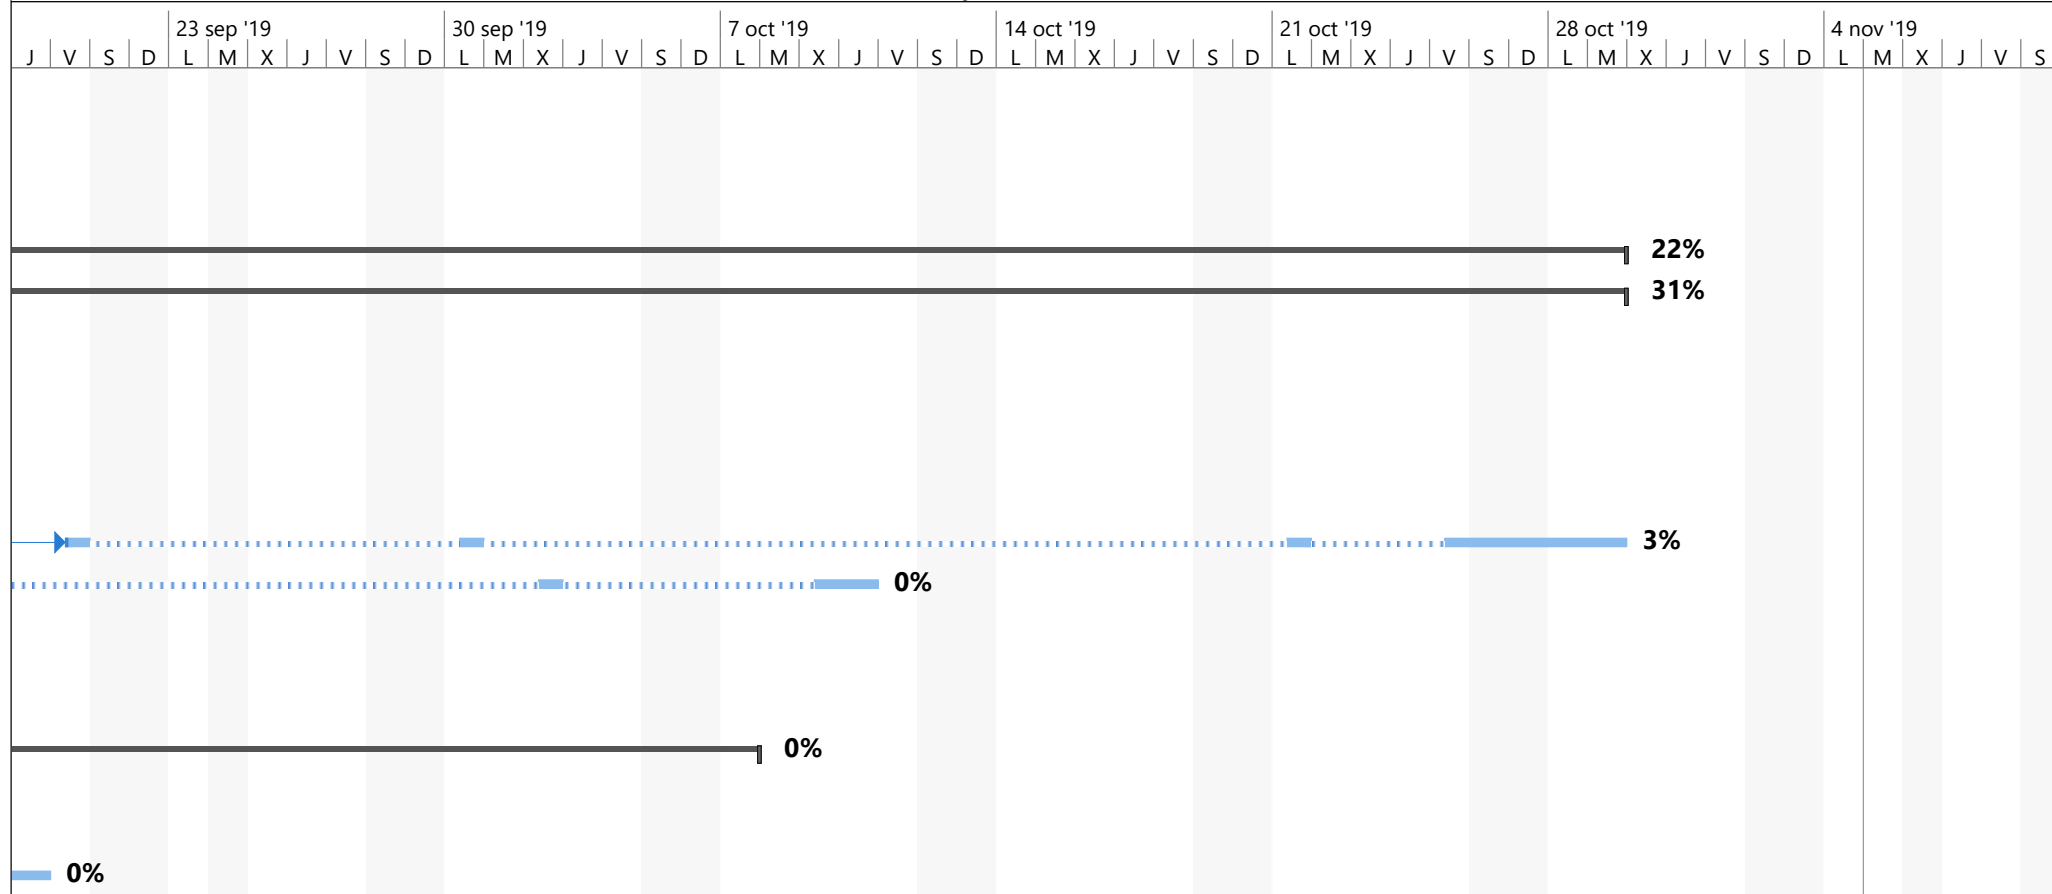


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

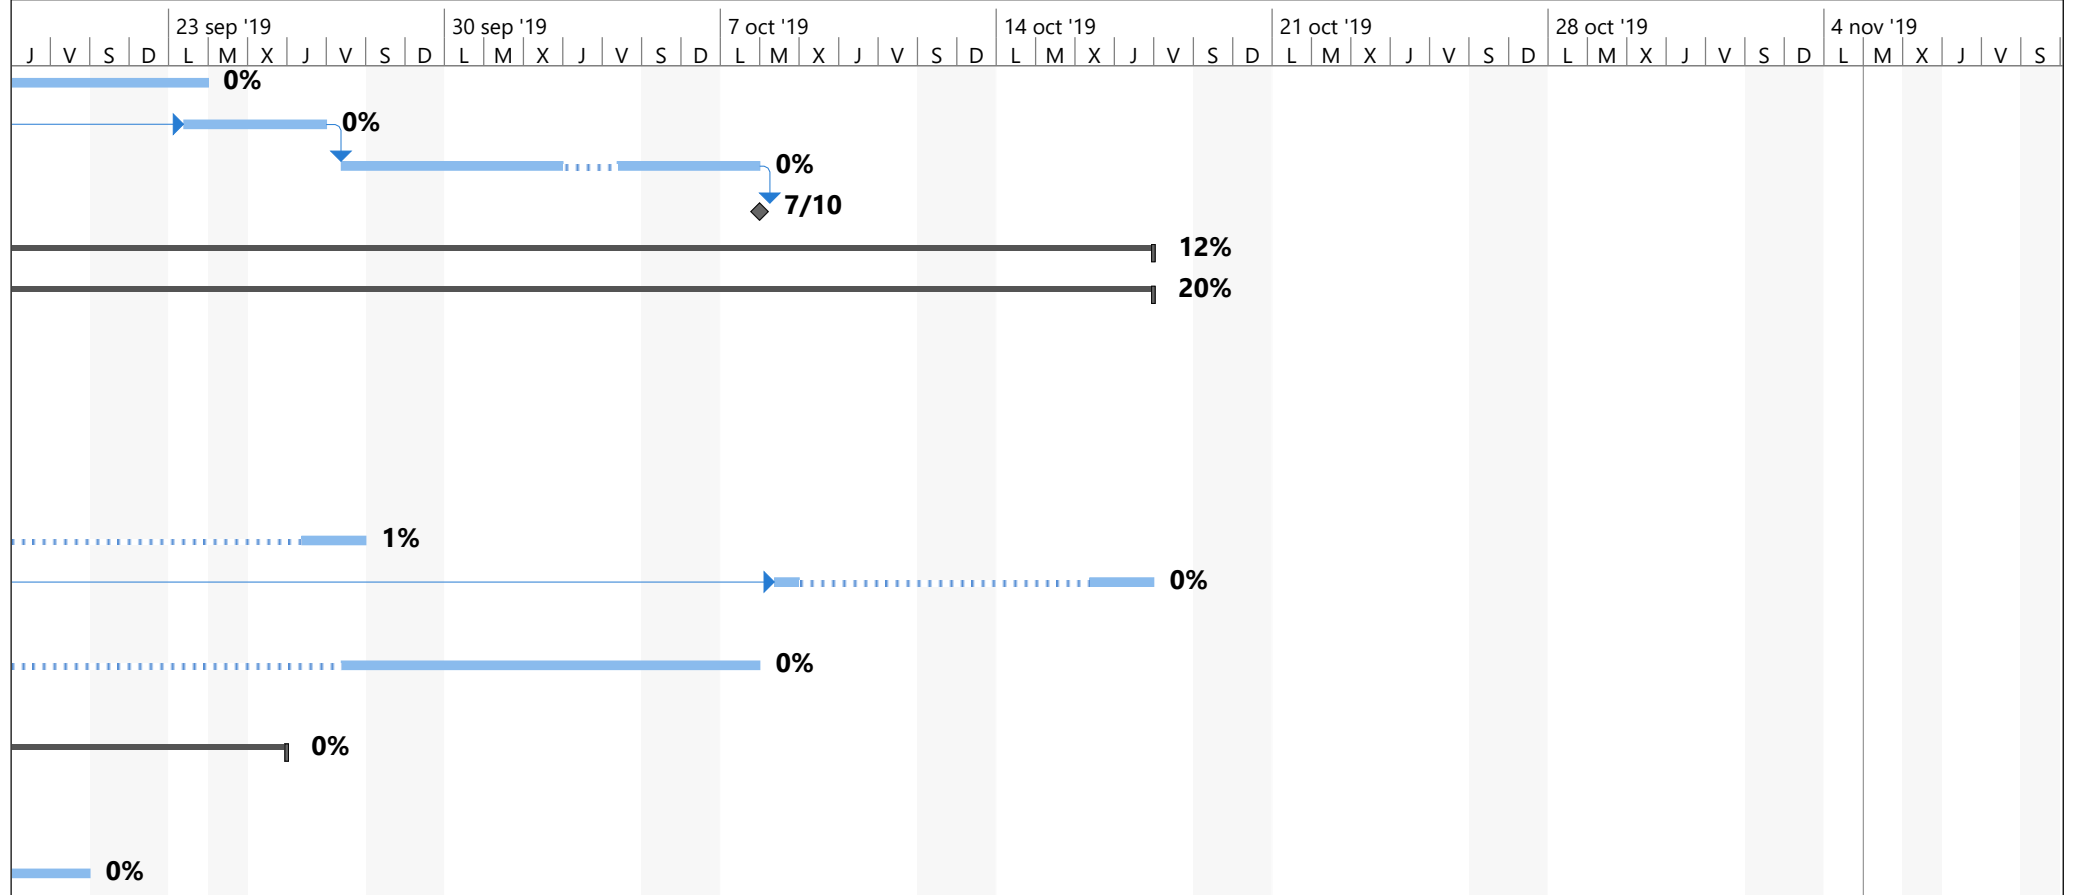


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

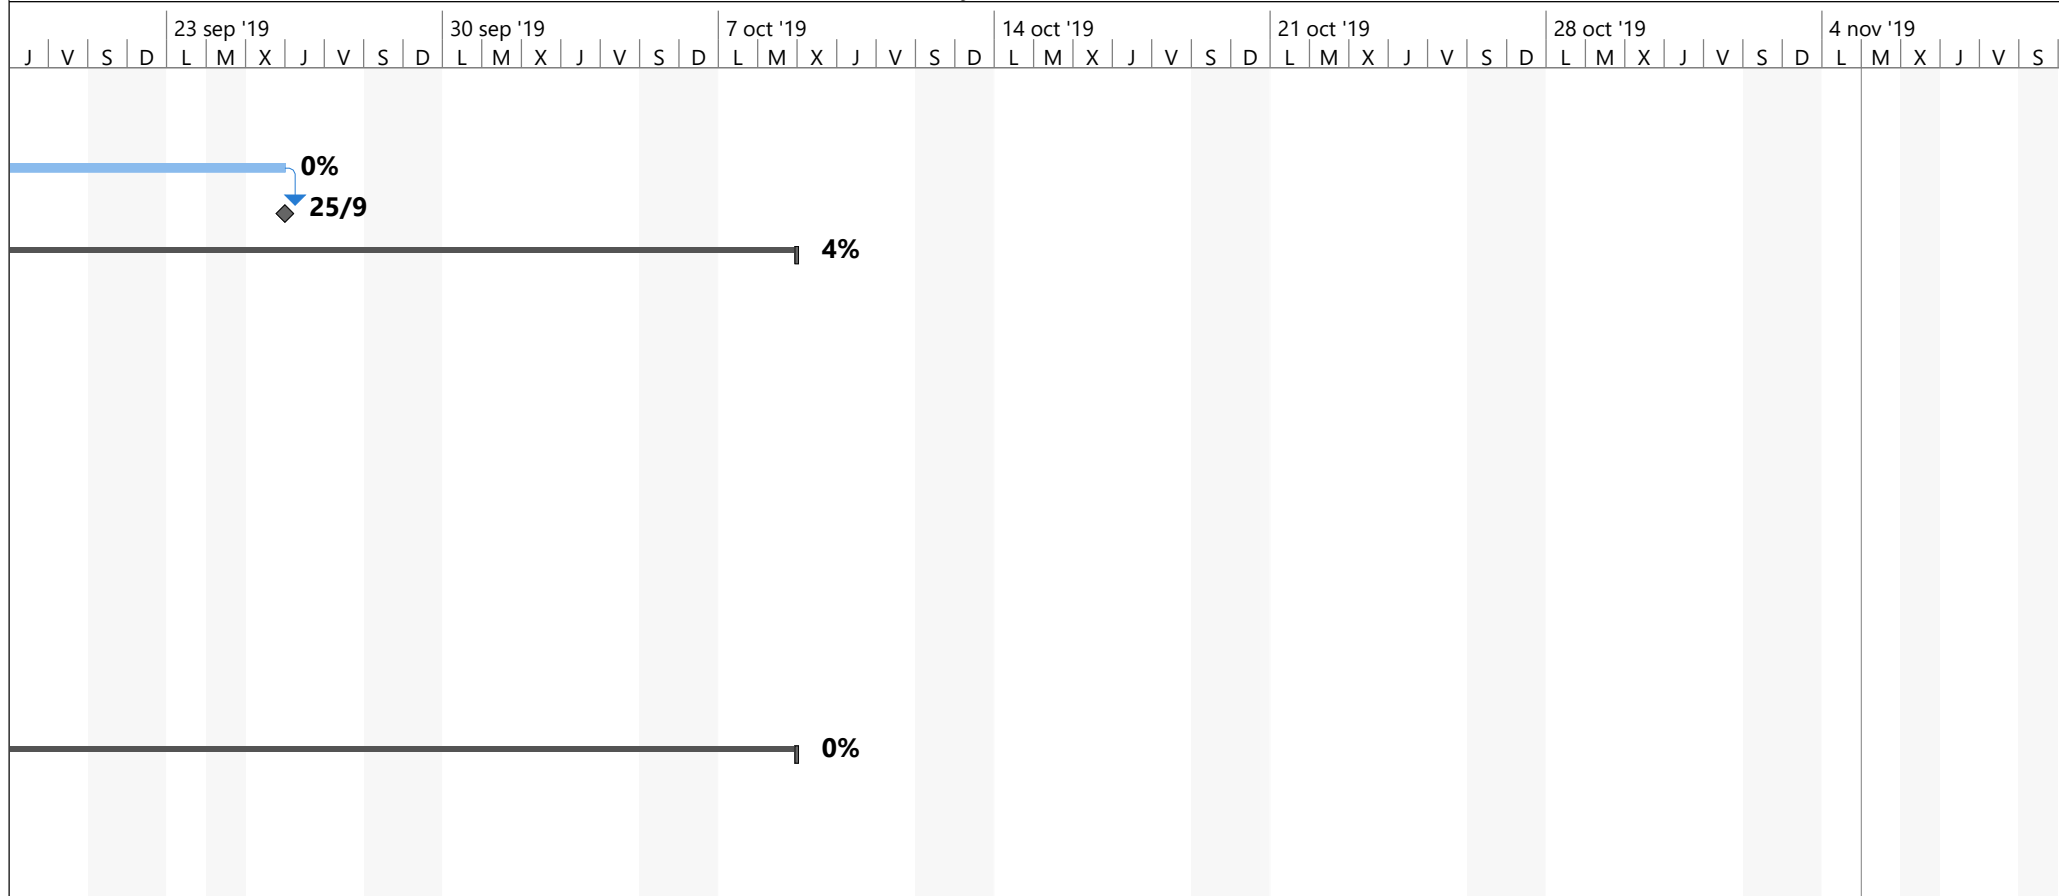

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Abr2020

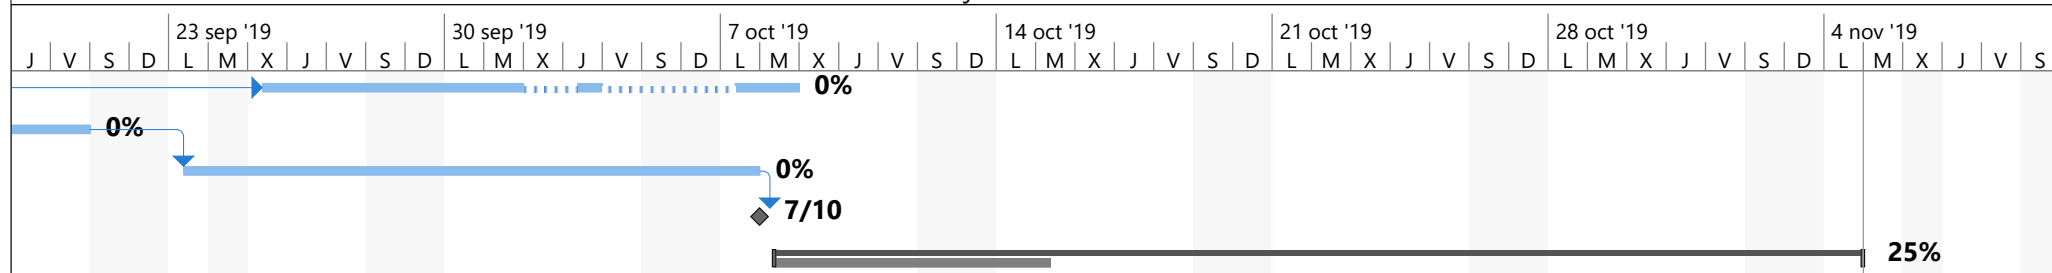

**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana


F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:   



Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen



Fecha límite

