

































































































































Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	V	D	2 abr '18	M	J	S	9 abr '18	L	X	V	16 abr '18	D	M	J	S	23 abr '18	L
1			Rehabilitación de Redes ABAP101	262.88 días	jue 15/11/18																	
2			Adjudicación	0 días	lun 15/10/18																	
3			Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18																	
28			Ejecución	222.75 días	jue 13/12/18																	
29			Polígono 1	101 días	jue 13/12/18																	
30			Instalación	98 días	jue 13/12/18																	
31			Izado de postes	13 días	jue 13/12/18																	
32			Cimentaciones	11 días	mar 18/12/18																	
33			Retenidas	6 días	jue 7/3/19																	
34			Armados de Media y Baja Tensión	9 días	jue 7/3/19																	
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	18 días	lun 11/3/19																	
36			Elementos de Protección y Maniobra	21 días	mié 27/3/19																	
37			Conexiones y Jumpers	8 días	mié 20/3/19																	
38			Transformadores	5 días	mié 20/3/19																	
39			Alumbrado Publico	12 días	vie 22/3/19																	
40			Normalización Suministros	26 días	lun 25/3/19																	
41			Remoción	26 días	jue 28/3/19																	
42			Tendido de Conductor Media Tensión	12 días	jue 28/3/19																	
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	5 días	lun 22/4/19																	
44			Armados de Media Tensión	14 días	mié 3/4/19																	
















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18					9 abr '18			16 abr '18				23 abr '18
						V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L
45			Armados de Baja Tensión	5 días	lun 22/4/19													
46			Transformadores	4 días	mar 23/4/19													
47			Izado de postes	8 días	mar 23/4/19													
48			Cierre de Polígono 1	0 días	jue 2/5/19													
49			Polígono 2	127.88 días	mar 1/1/19													
50			Instalación	120 días	mar 1/1/19													
51			Izado de postes	5 días	mar 1/1/19													
52			Cimentaciones	7 días	mié 2/1/19													
53			Retenidas	5 días	vie 15/3/19													
54			Armados de Media y Baja Tensión	22.88 días	mié 27/3/19													
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	23.88 días	lun 1/4/19													
56			Elementos de Protección y Maniobra	17.13 días	jue 2/5/19													
57			Conexiones y Jumpers	7 días	lun 6/5/19													
58			Transformadores	3 días	mar 16/4/19													
59			Alumbrado Publico	9 días	mar 16/4/19													
60			Normalización Suministros	10 días	mar 30/4/19													
61			Remoción	55.88 días	jue 11/4/19													
62			Tendido de Conductor Media Tensión	15 días	jue 11/4/19													
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	11.88 días	mié 8/5/19													
64			Armados de Media Tensión	17 días	jue 11/4/19													










































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18					9 abr '18			16 abr '18				23 abr '18	
						V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	
65			Armados de Baja Tensión	12 días	mié 8/5/19														
66			Transformadores	8 días	vie 24/5/19														
67			Izado de postes	7 días	vie 24/5/19														
68			Cierre de Polígono 2	0 días	lun 3/6/19														
69			Polígono 3	129 días	mar 8/1/19														
70			Instalación	127 días	mar 8/1/19														
71			Izado de postes	4 días	mar 8/1/19														
72			Cimentaciones	4 días	vie 11/1/19														
73			Retenidas	4 días	vie 22/3/19														
74			Armados de Media y Baja Tensión	5 días	vie 3/5/19														
75			Tendido de Conductor Media y Baja Ter	8 días	mié 8/5/19														
76			Elementos de Protección y Maniobra	15 días	lun 20/5/19														
77			Conexiones y Jumpers	5 días	lun 17/6/19														
78			Transformadores	5 días	jue 16/5/19														
79			Alumbrado Publico	6 días	lun 20/5/19														
80			Normalización Suministros	8 días	mié 22/5/19														
81			Remoción	43 días	mié 8/5/19														
82			Tendido de Conductor Media Tensión	9.18 días	mié 8/5/19														
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	4.41 días	mié 29/5/19														
84			Armados de Media Tensión	16 días	mié 8/5/19														





























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18					9 abr '18			16 abr '18				23 abr '18	
						V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	
85			Armados de Baja Tensión	8 días	mié 26/6/19														
86			Transformadores	4 días	vie 31/5/19														
87			Izado de postes	8 días	mar 4/6/19														
88			Cierre de Polígono 3	0 días	jue 13/6/19														
89			Polígono 4	162 días	lun 14/1/19														
90			Instalación	155.6 días	lun 14/1/19														
91			Izado de postes	3 días	lun 14/1/19														
92			Cimentaciones	2 días	jue 17/1/19														
93			Retenidas	3 días	jue 28/3/19														
94			Armados de Media y Baja Tensión	7 días	lun 17/6/19														
95			Tendido de Conductor Media y Baja Ter	42.88 días	lun 20/5/19														
96			Elementos de Protección y Maniobra	7.88 días	mar 25/6/19														
97			Conexiones y Jumpers	4 días	lun 17/6/19														
98			Transformadores	1 día	mié 17/7/19														
99			Alumbrado Publico	4 días	jue 18/7/19														
100			Normalización Suministros	6 días	lun 22/7/19														
101			Remoción	49 días	jue 20/6/19														
102			Tendido de Conductor Media Tensión	9 días	jue 20/6/19														
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	13 días	lun 29/7/19														
104			Armados de Media Tensión	11.4 días	lun 1/7/19														























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18					9 abr '18			16 abr '18				23 abr '18	
						V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	
105			Armados de Baja Tensión	6 días	mar 20/8/19														
106			Transformadores	6 días	mar 6/8/19														
107			Izado de postes	7 días	mar 6/8/19														
108			Cierre de Polígono 4	0 días	mié 14/8/19														
109			Polígono 5	157.88 días	jue 17/1/19														
110			Instalación	157 días	jue 17/1/19														
111			Izado de postes	3 días	jue 17/1/19														
112			Cimentaciones	5 días	lun 21/1/19														
113			Retenidas	3 días	mar 2/4/19														
114			Armados de Media y Baja Tensión	5 días	mar 9/7/19														
115			Tendido de Conductor Media y Baja Ter	7 días	mié 17/7/19														
116			Elementos de Protección y Maniobra	5 días	lun 22/7/19														
117			Conexiones y Jumpers	5 días	lun 19/8/19														
118			Transformadores	5 días	jue 18/7/19														
119			Alumbrado Publico	6 días	jue 25/7/19														
120			Normalización Suministros	15 días	mar 30/7/19														
121			Remoción	28 días	mié 17/7/19														
122			Tendido de Conductor Media Tensión	7 días	mié 17/7/19														
123			Tendido de Conductor Baja Tensión	9 días	mié 7/8/19														
124			Armados de Media Tensión	16.74 días	mié 17/7/19														









Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18					9 abr '18			16 abr '18				23 abr '18
						V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	
125			Armados de Baja Tensión	13 días	mié 7/8/19													
126			Transformadores	6 días	mar 13/8/19													
127			Izado de postes	7 días	mié 14/8/19													
128			Cierre de Polígono 5	0 días	vie 23/8/19													
129			Polígono 6	194.75 días	mar 22/1/19													
130			Instalación	194.75 días	mar 22/1/19													
131			Izado de postes	14 días	mar 22/1/19													
132			Cimentaciones	10 días	lun 28/1/19													
133			Retenidas	7 días	vie 5/4/19													
134			Armados de Media y Baja Tensión	18 días	lun 29/7/19													
135			Tendido de Conductor Media y Baja Ter	25 días	jue 1/8/19													
136			Elementos de Protección y Maniobra	23 días	jue 1/8/19													
137			Conexiones y Jumpers	9 días	mié 21/8/19													
138			Transformadores	18.25 días	mié 28/8/19													
139			Alumbrado Publico	13 días	vie 30/8/19													
140			Normalización Suministros	28 días	mié 11/9/19													
141			Remoción	30.25 días	lun 26/8/19													
142			Tendido de Conductor Media Tensión	10 días	lun 26/8/19													
143			Tendido de Conductor Baja Tensión	8 días	mar 17/9/19													
144			Armados de Media Tensión	15 días	lun 16/9/19													

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	V	D	2 abr '18	M	J	S	9 abr '18	L	X	V	16 abr '18	D	M	J	S	23 abr '18	L
145			Armados de Baja Tensión	10 días	mar 24/9/19																	
146			Transformadores	5 días	jue 19/9/19																	
147			Izado de postes	6 días	jue 19/9/19																	
148			Cierre de Polígono 6	0 días	vie 27/9/19																	
149			Cierre de Obras	20 días	lun 21/10/19																	
150			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios	1 ms	lun 21/10/19																	
151			Presentación de Cierre de Obras	0 días	lun 18/11/19																	

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

'18		30 abr '18				7 may '18			14 may '18			21 may '18			28 may '18			4 jun '18			11 jun '18			18 jun '18			25 jun '18					
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

'18		30 abr '18				7 may '18			14 may '18			21 may '18			28 may '18			4 jun '18			11 jun '18			18 jun '18			25 jun '18					
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

30 abr '18					7 may '18					14 may '18					21 may '18					28 may '18					4 jun '18					11 jun '18					18 jun '18					25 jun '18				
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

'18			30 abr '18				7 may '18				14 may '18				21 may '18				28 may '18				4 jun '18				11 jun '18				18 jun '18				25 jun '18		
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

24 abr '18		30 abr '18				7 may '18				14 may '18				21 may '18				28 may '18				4 jun '18				11 jun '18				18 jun '18				25 jun '18			
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

18		30 abr '18				7 may '18				14 may '18				21 may '18				28 may '18				4 jun '18				11 jun '18				18 jun '18				25 jun '18			
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020























30 abr '18					7 may '18					14 may '18					21 may '18					28 may '18					4 jun '18					11 jun '18					18 jun '18					25 jun '18				
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J												



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

		2 jul '18			9 jul '18			16 jul '18			23 jul '18			30 jul '18			6 ago '18			13 ago '18			20 ago '18			27 ago '18						
J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

		2 jul '18			9 jul '18			16 jul '18			23 jul '18			30 jul '18			6 ago '18			13 ago '18			20 ago '18			27 ago '18		
J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

		2 jul '18			9 jul '18			16 jul '18			23 jul '18			30 jul '18			6 ago '18			13 ago '18			20 ago '18			27 ago '18						
J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

		2 jul '18			9 jul '18			16 jul '18			23 jul '18			30 jul '18			6 ago '18			13 ago '18			20 ago '18			27 ago '18						
J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

		2 jul '18					9 jul '18					16 jul '18					23 jul '18					30 jul '18					6 ago '18					13 ago '18					20 ago '18					27 ago '18				
J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V														



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

























3 sep '18					10 sep '18		17 sep '18					24 sep '18		1 oct '18					8 oct '18			15 oct '18				22 oct '18			29 oct '18			
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S

◆ 15/10

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

3 sep '18					10 sep '18		17 sep '18					24 sep '18			1 oct '18					8 oct '18			15 oct '18					22 oct '18			29 oct '18				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

3 sep '18					10 sep '18					17 sep '18					24 sep '18					1 oct '18					8 oct '18					15 oct '18					22 oct '18					29 oct '18				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

3 sep '18					10 sep '18		17 sep '18					24 sep '18			1 oct '18					8 oct '18			15 oct '18					22 oct '18			29 oct '18				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

3 sep '18					10 sep '18		17 sep '18					24 sep '18			1 oct '18					8 oct '18			15 oct '18					22 oct '18			29 oct '18				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

3 sep '18					10 sep '18		17 sep '18					24 sep '18			1 oct '18					8 oct '18			15 oct '18					22 oct '18			29 oct '18				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S			


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

3 sep '18					10 sep '18		17 sep '18					24 sep '18		1 oct '18					8 oct '18			15 oct '18					22 oct '18			29 oct '18				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

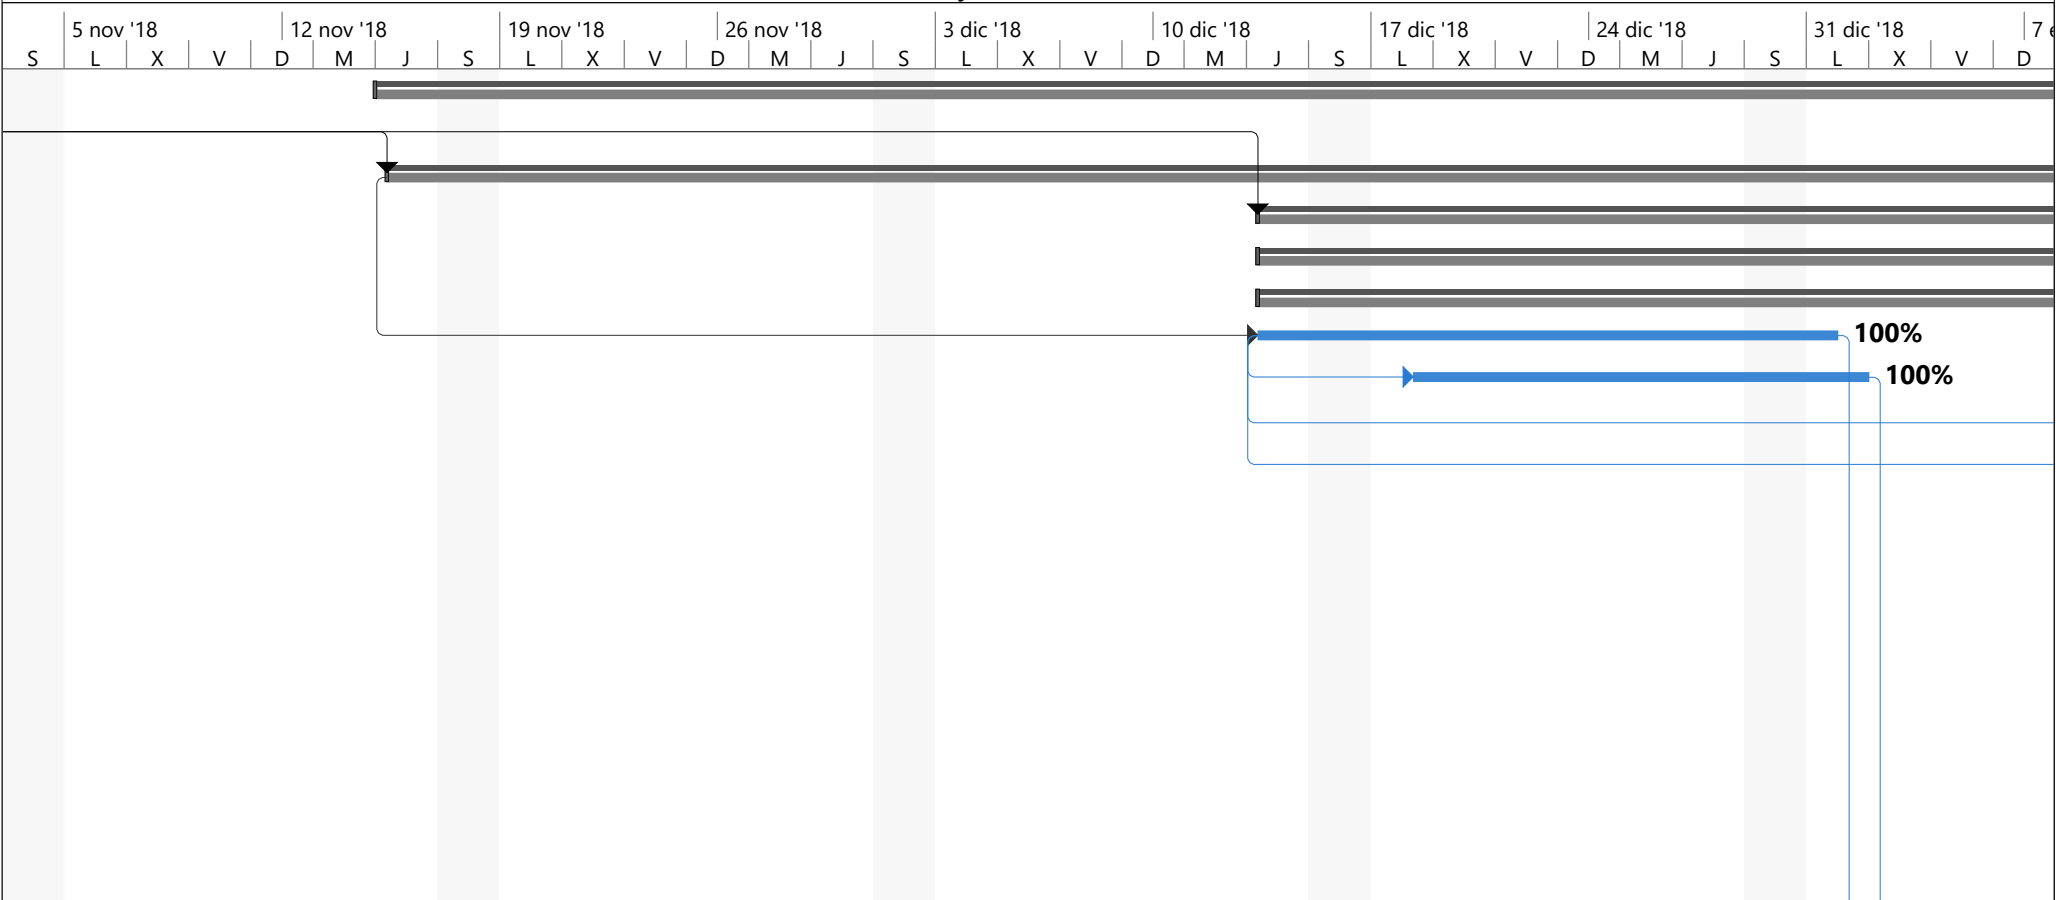

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

S	5 nov '18				12 nov '18				19 nov '18				26 nov '18				3 dic '18				10 dic '18				17 dic '18				24 dic '18				31 dic '18				7 e
S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	L	X	V	D	

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

S	5 nov '18				12 nov '18				19 nov '18				26 nov '18				3 dic '18				10 dic '18				17 dic '18				24 dic '18				31 dic '18				7 e
S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	L	X	V	D	7 e

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

S	5 nov '18				12 nov '18				19 nov '18				26 nov '18				3 dic '18				10 dic '18				17 dic '18				24 dic '18				31 dic '18				7 e
S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	L	X	V	D	7 e

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

























S	5 nov '18				12 nov '18				19 nov '18				26 nov '18				3 dic '18				10 dic '18				17 dic '18				24 dic '18				31 dic '18				7 ene '19
S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	L	X	V	D	S

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

S	5 nov '18				12 nov '18				19 nov '18				26 nov '18				3 dic '18				10 dic '18				17 dic '18				24 dic '18				31 dic '18				7 ene '19
S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	L	X	V	D	S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

7 ene '19				14 ene '19			21 ene '19				28 ene '19			4 feb '19				11 feb '19				18 feb '19				25 feb '19			4 mar '19				11 mar '19
D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	

100%

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica




Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

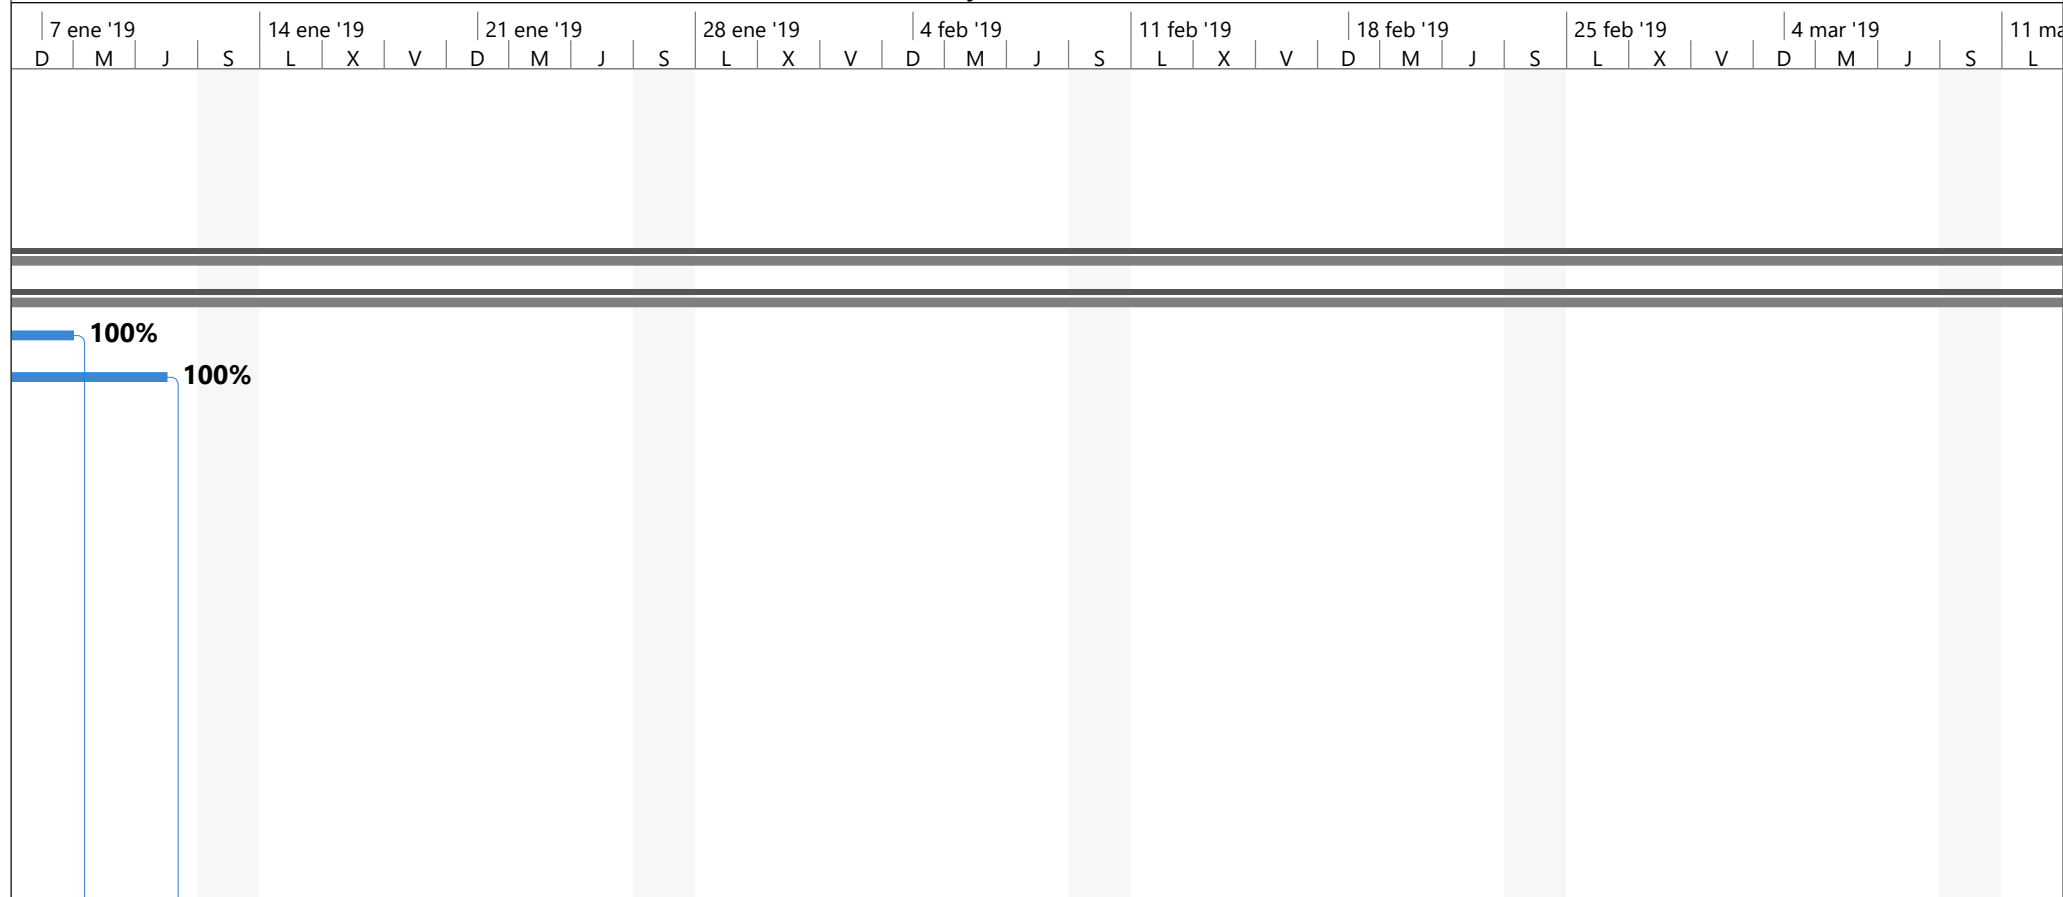


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

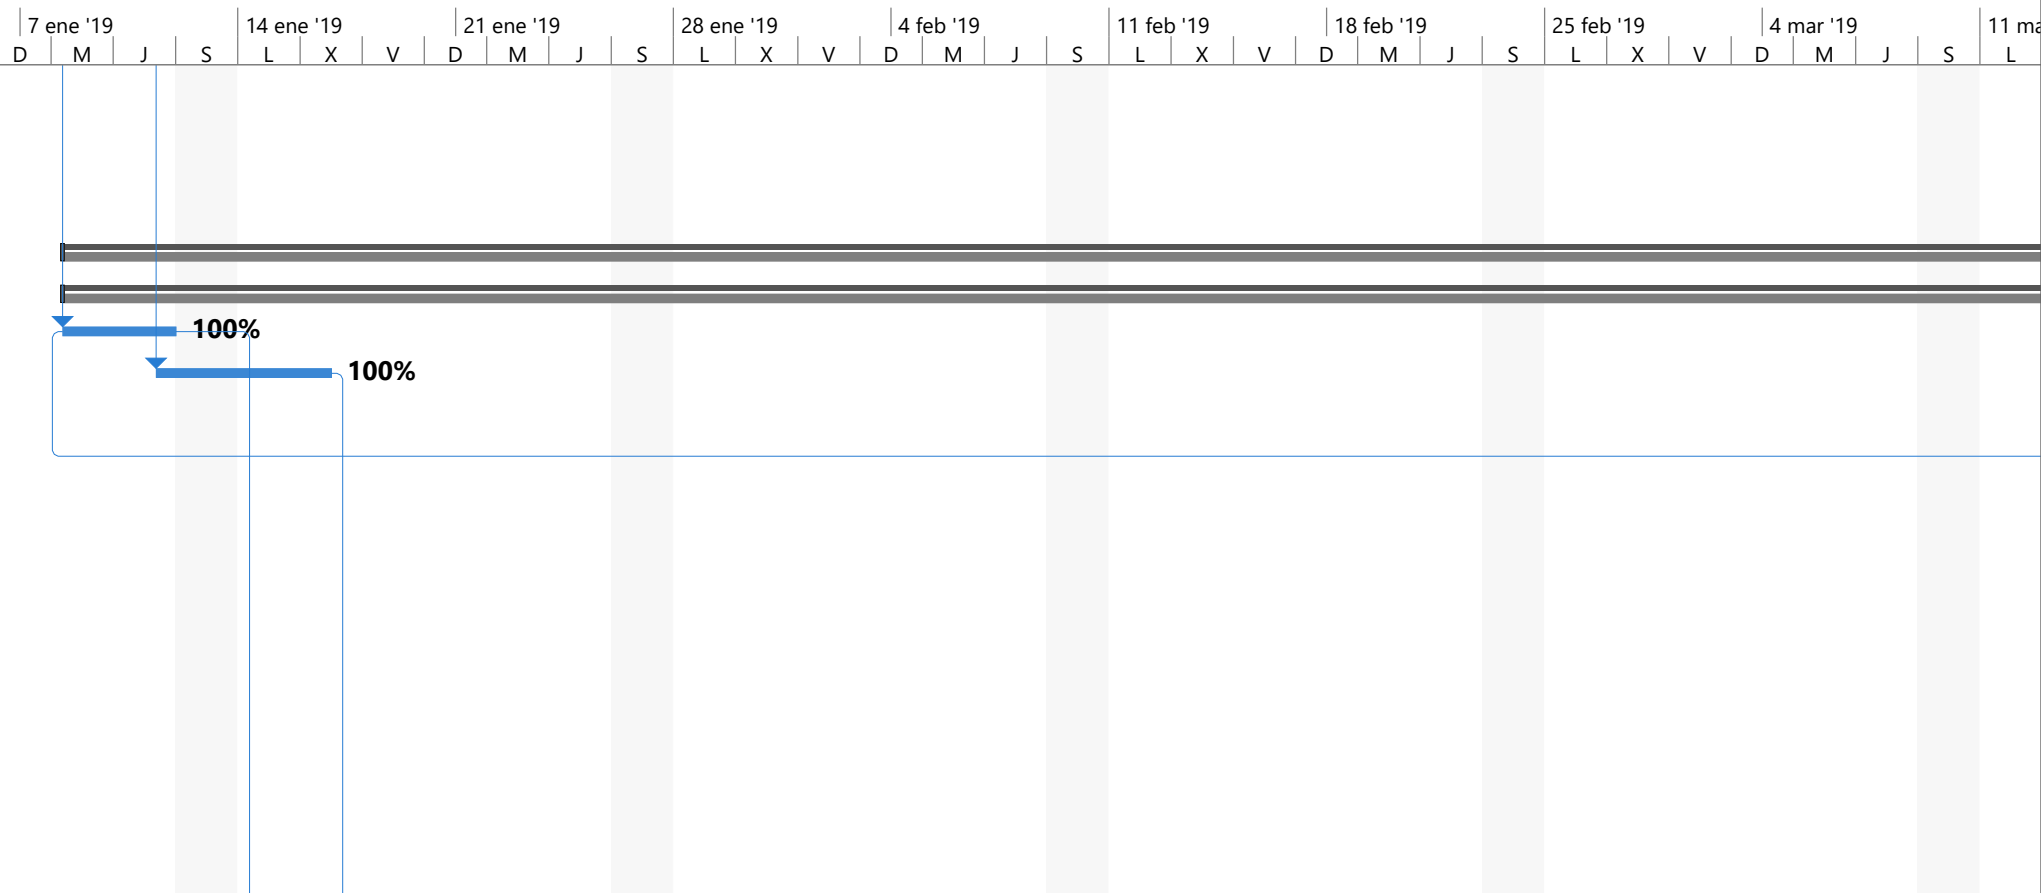


Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

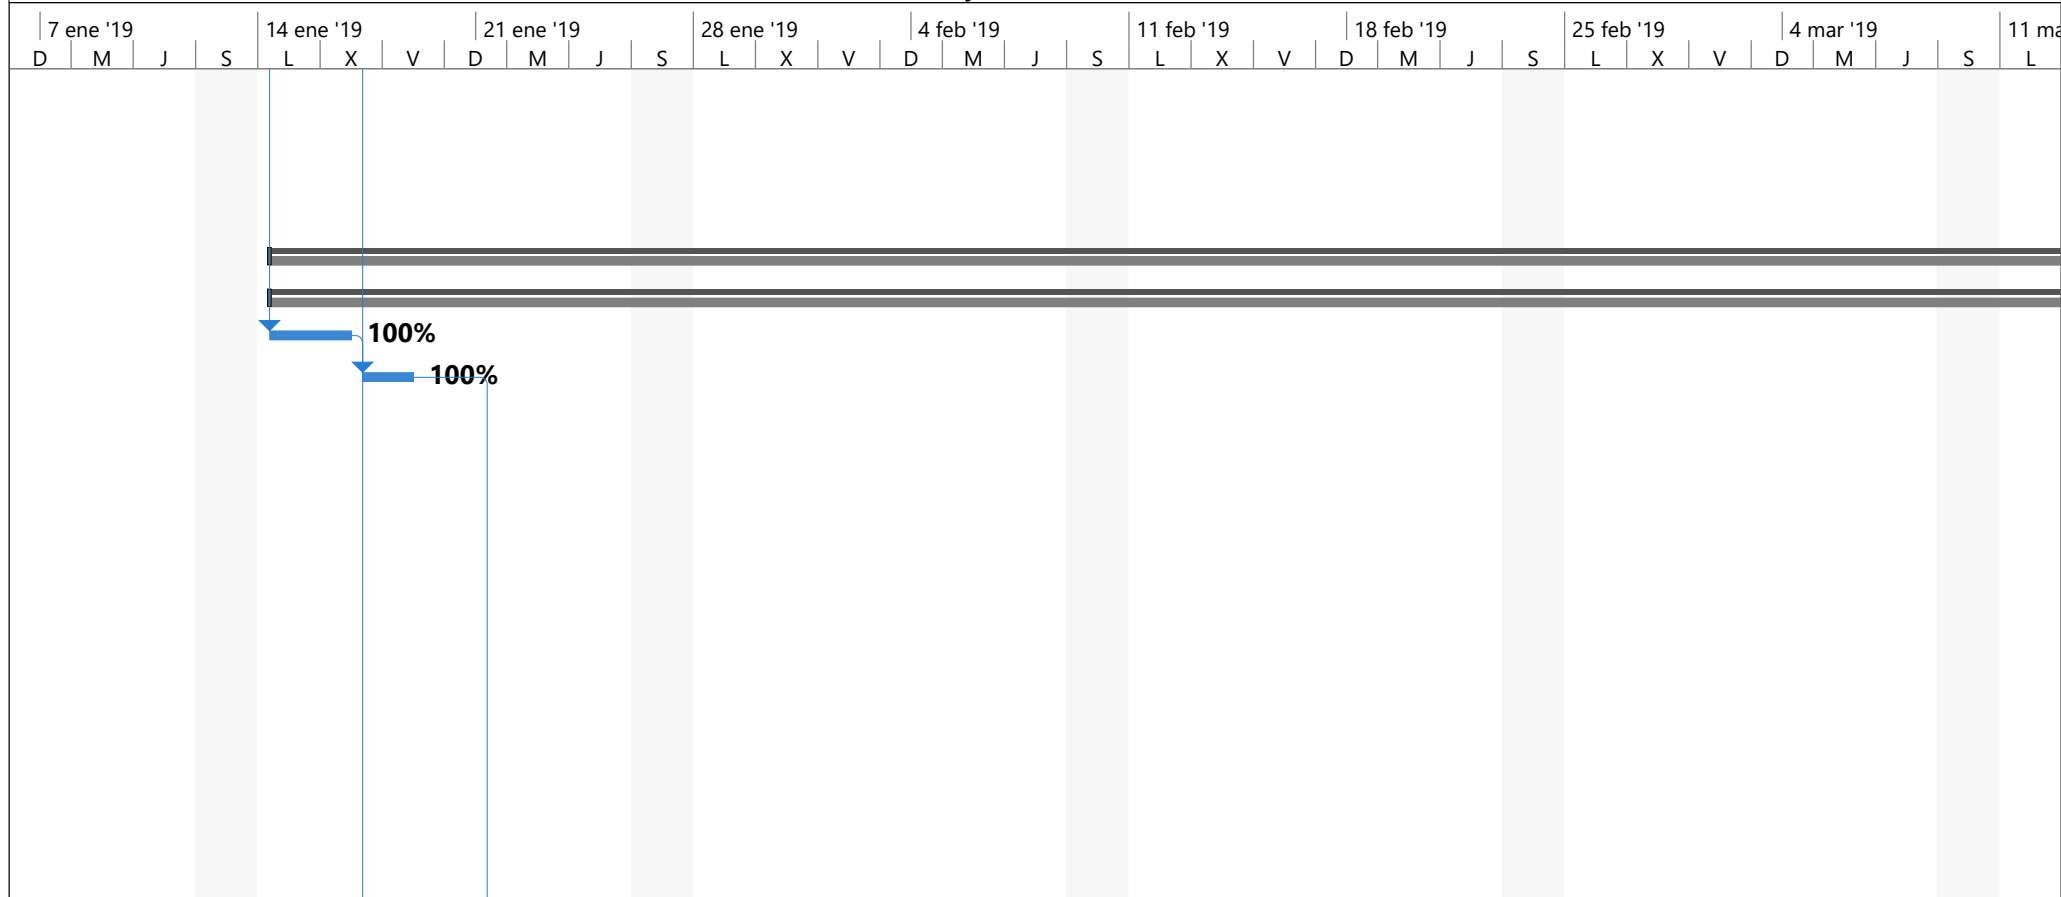


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

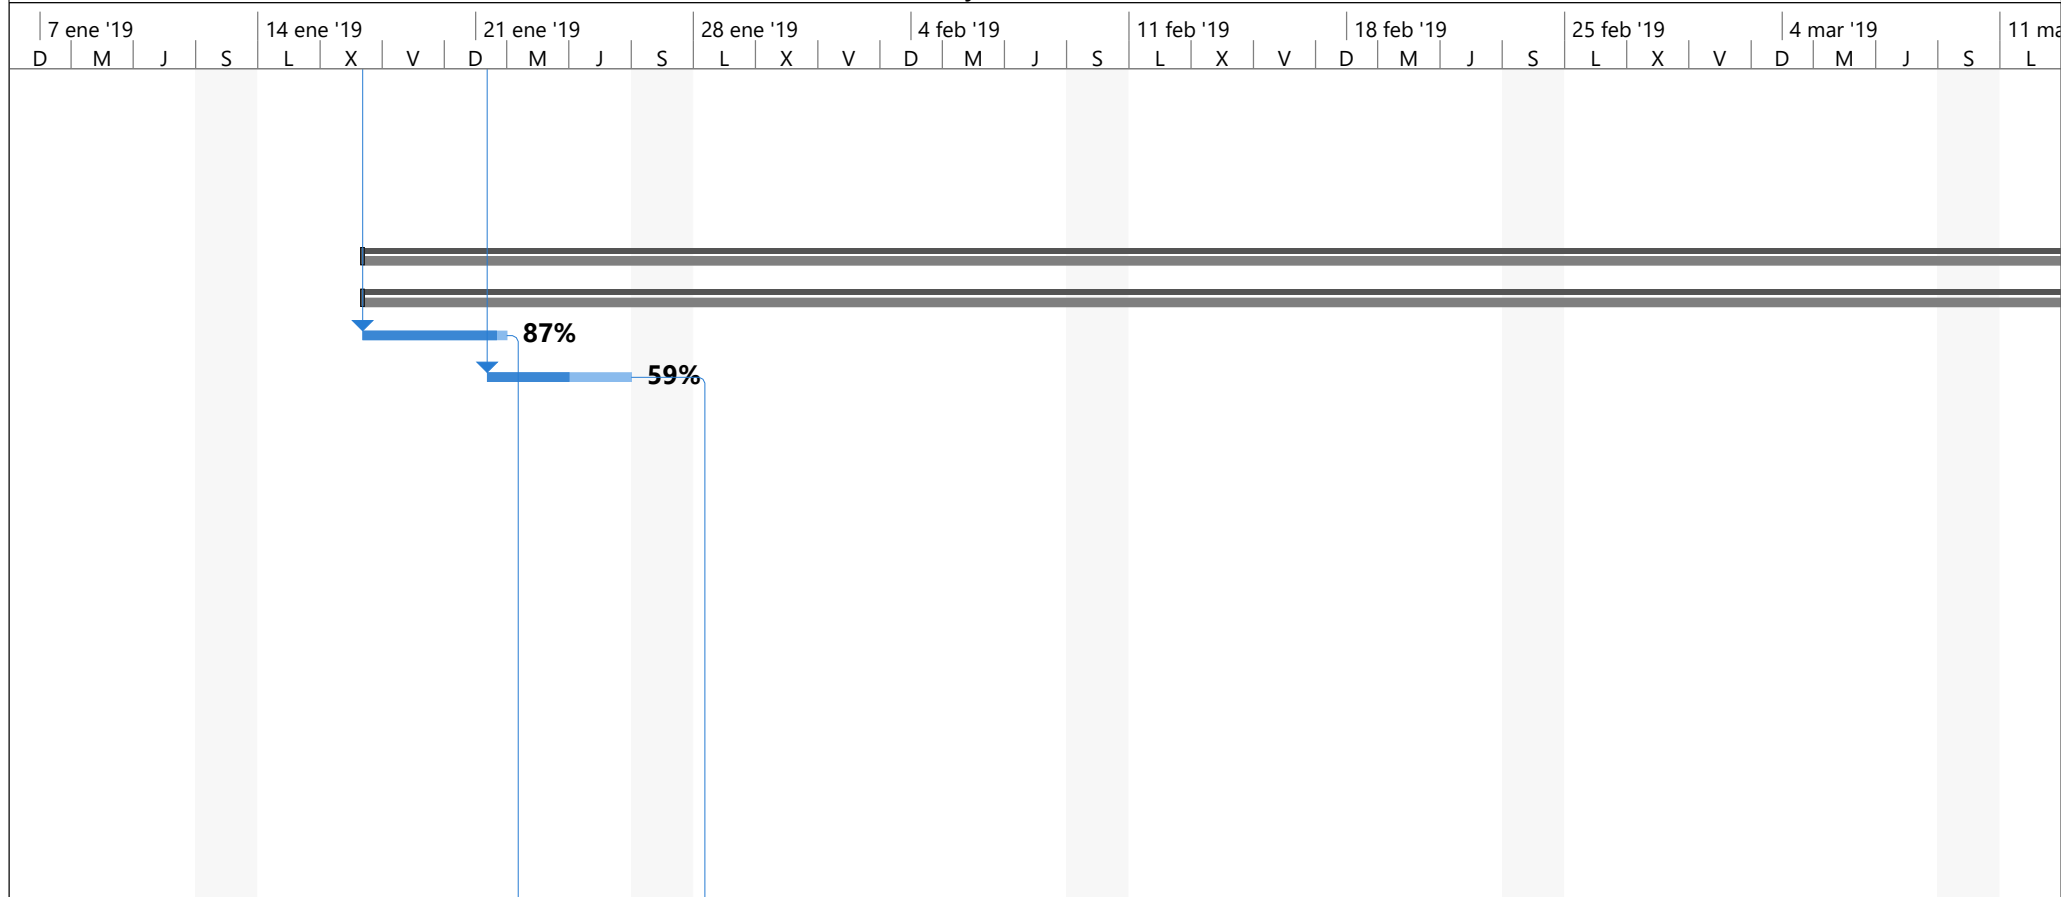

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

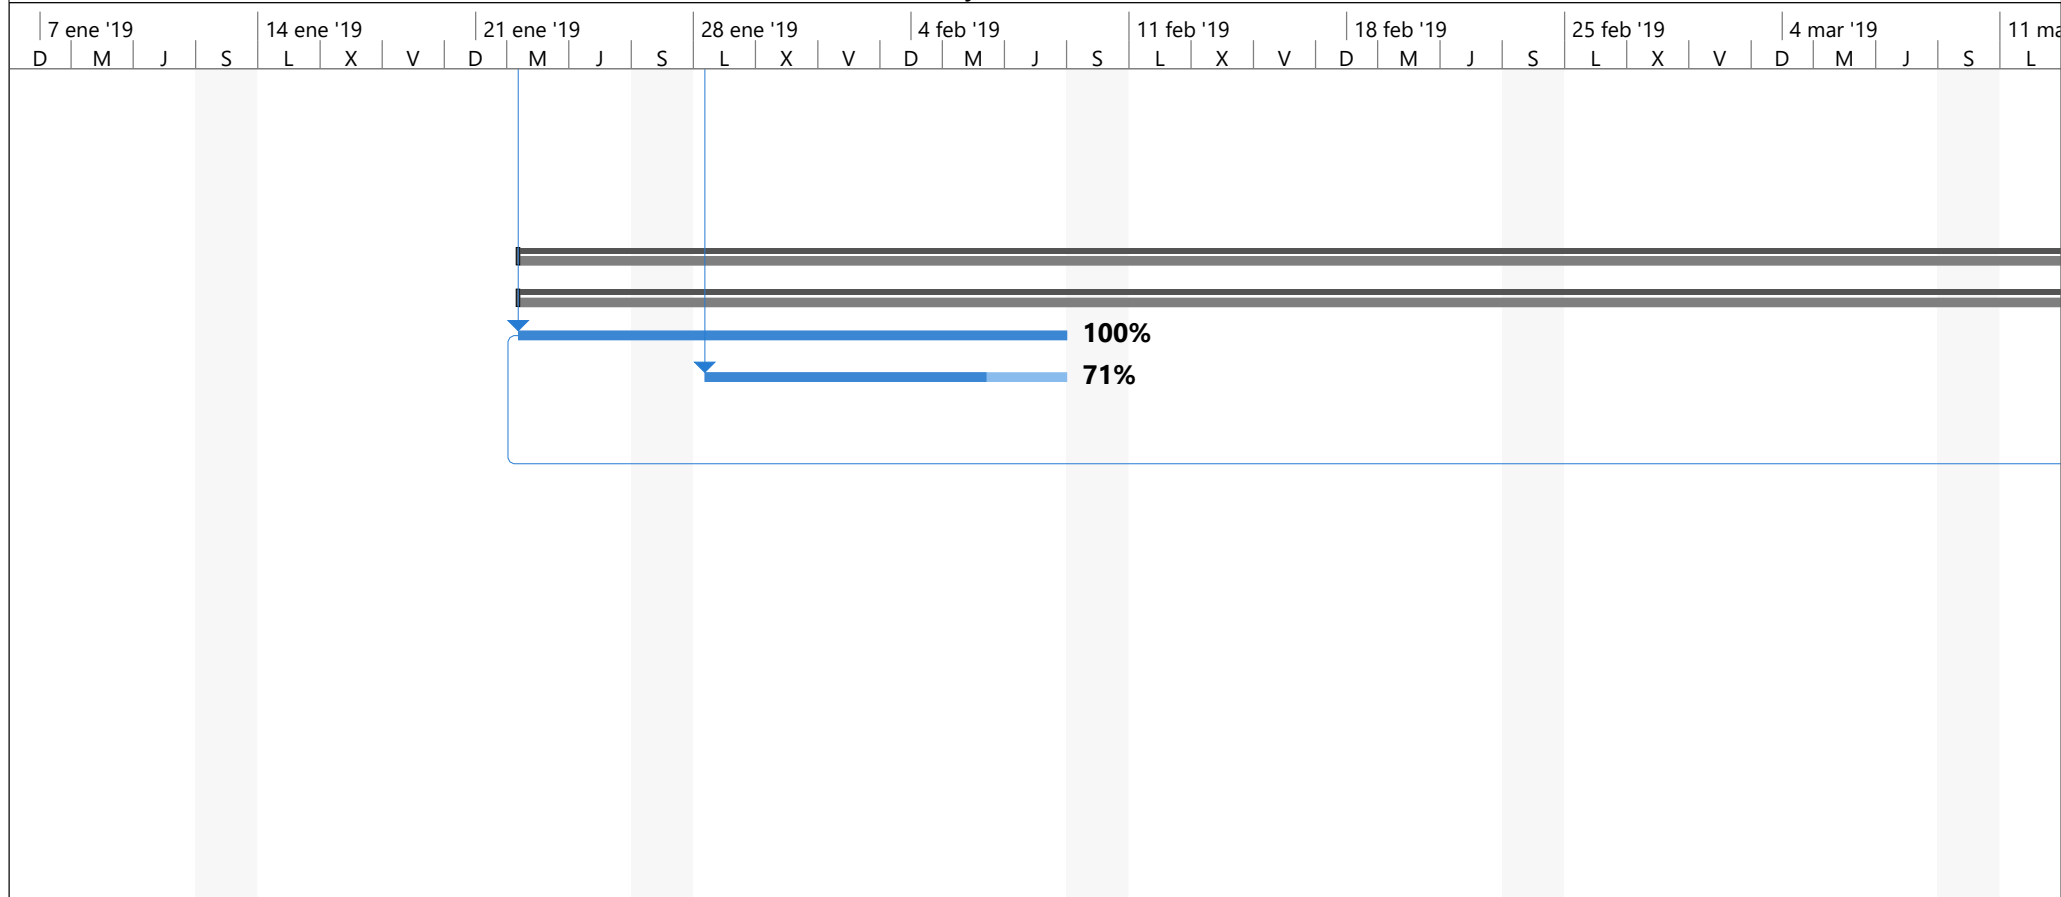


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

7 ene '19				14 ene '19			21 ene '19				28 ene '19			4 feb '19				11 feb '19			18 feb '19				25 feb '19			4 mar '19				11 ma
D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen




Fecha límite




Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

11 mar '19				18 mar '19				25 mar '19				1 abr '19				8 abr '19				15 abr '19				22 abr '19				29 abr '19				6 may '19				13 may '19	
L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	

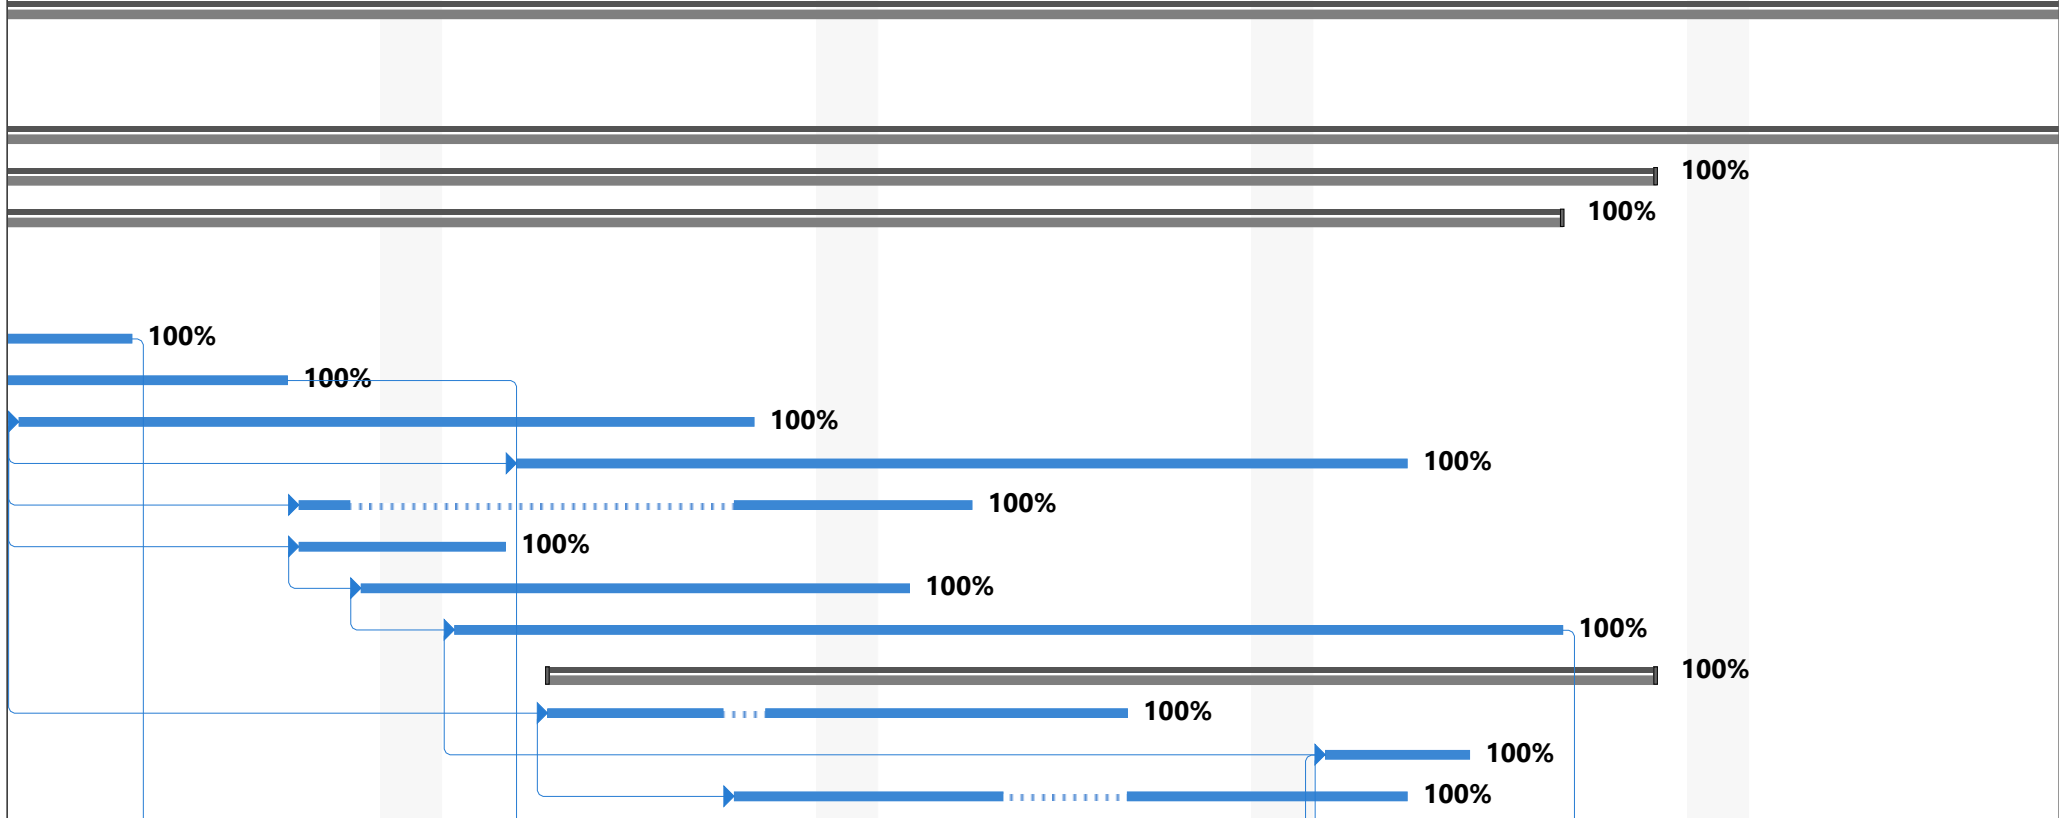


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

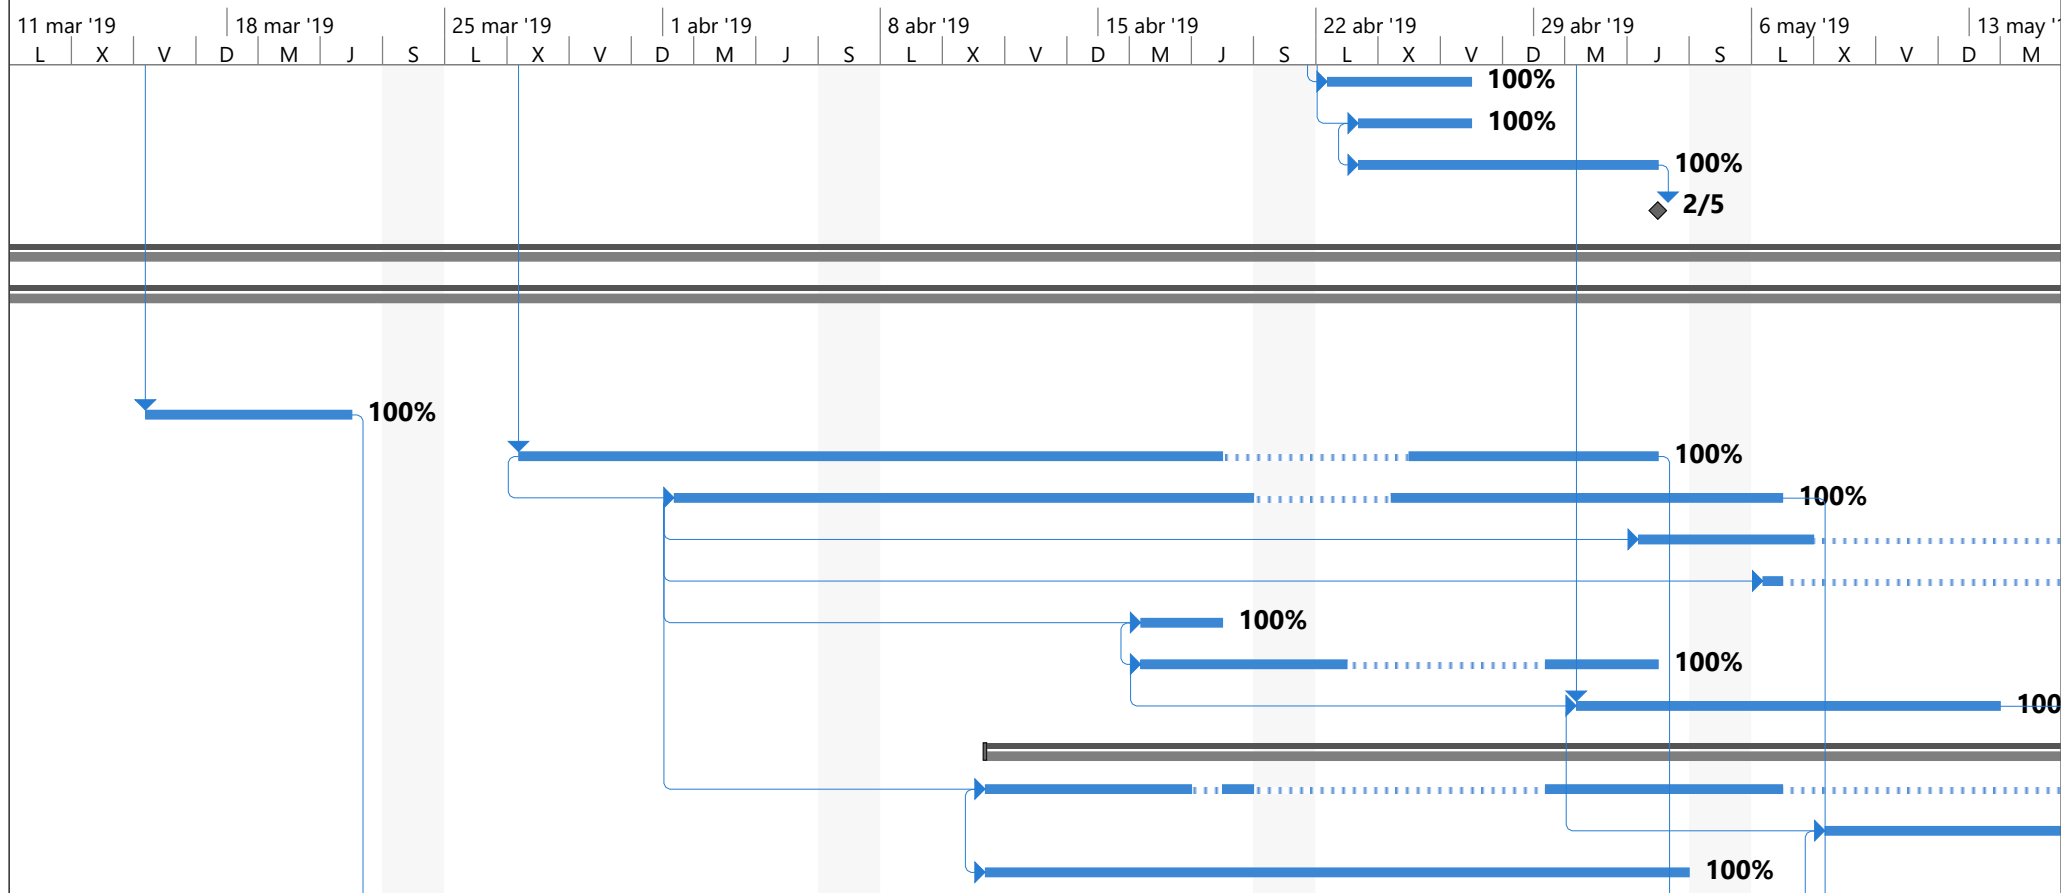

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

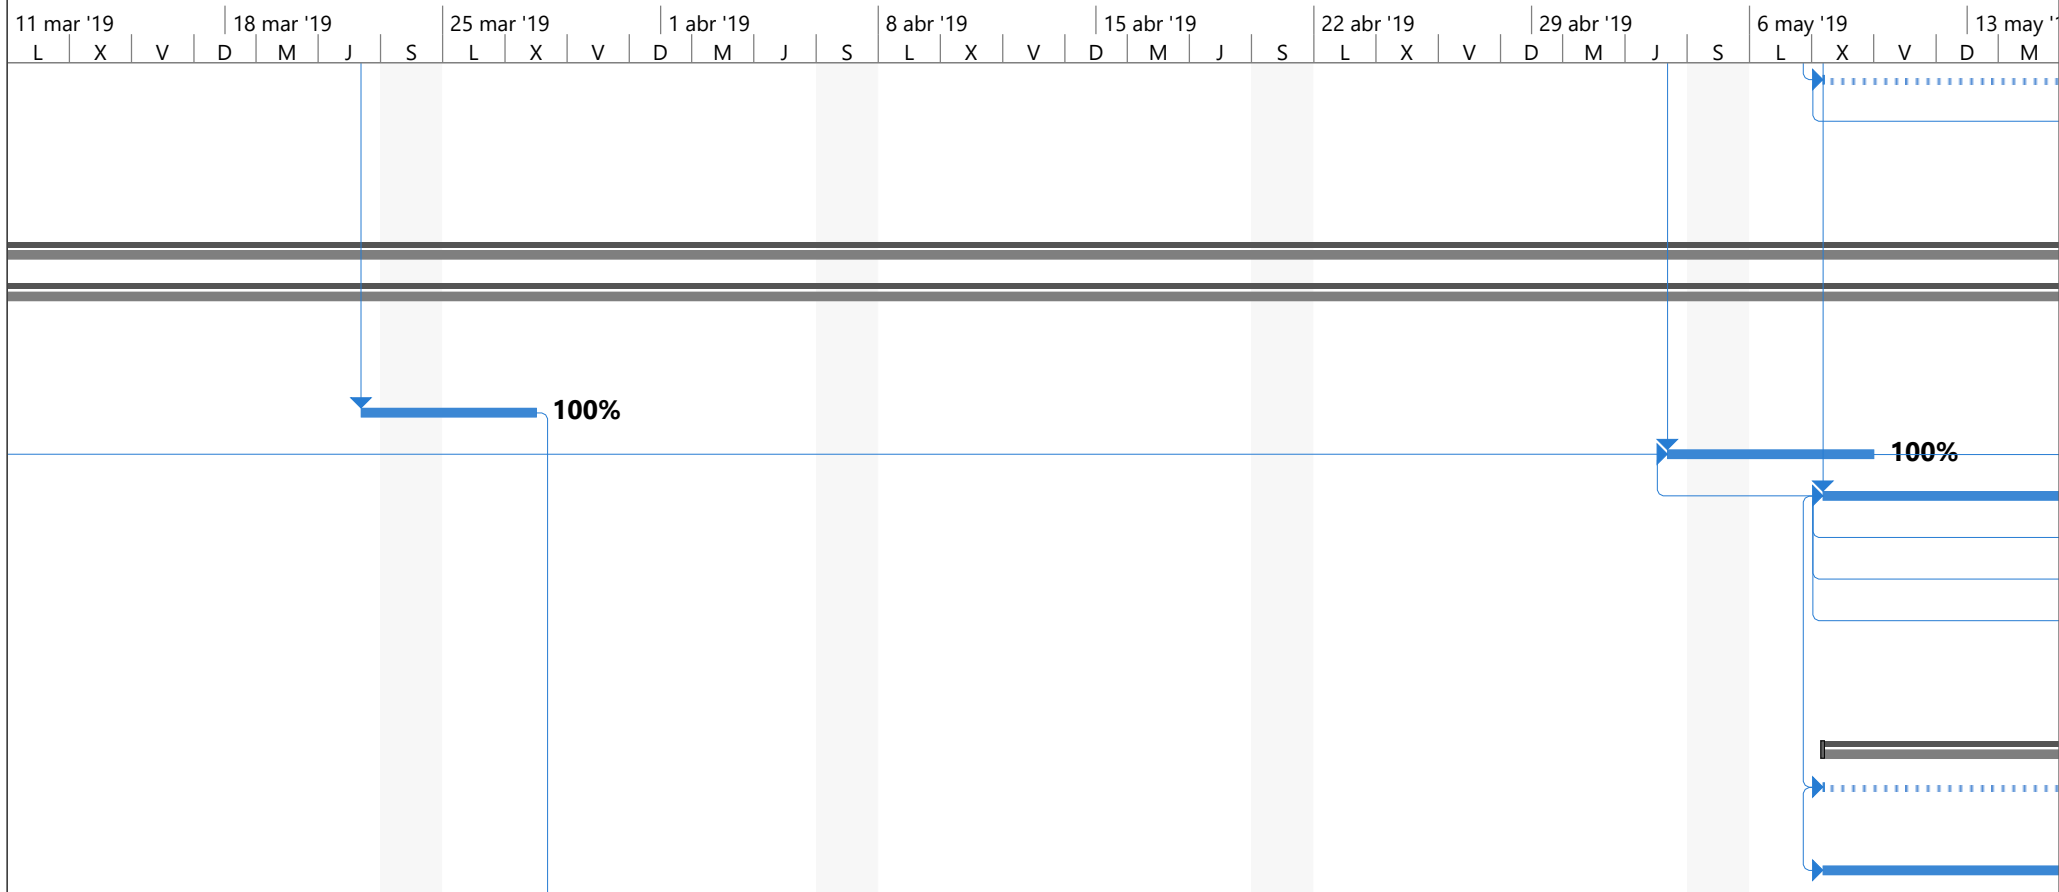


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

11 mar '19				18 mar '19				25 mar '19				1 abr '19				8 abr '19				15 abr '19				22 abr '19				29 abr '19				6 may '19				13 may '19			
L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S	

100%

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

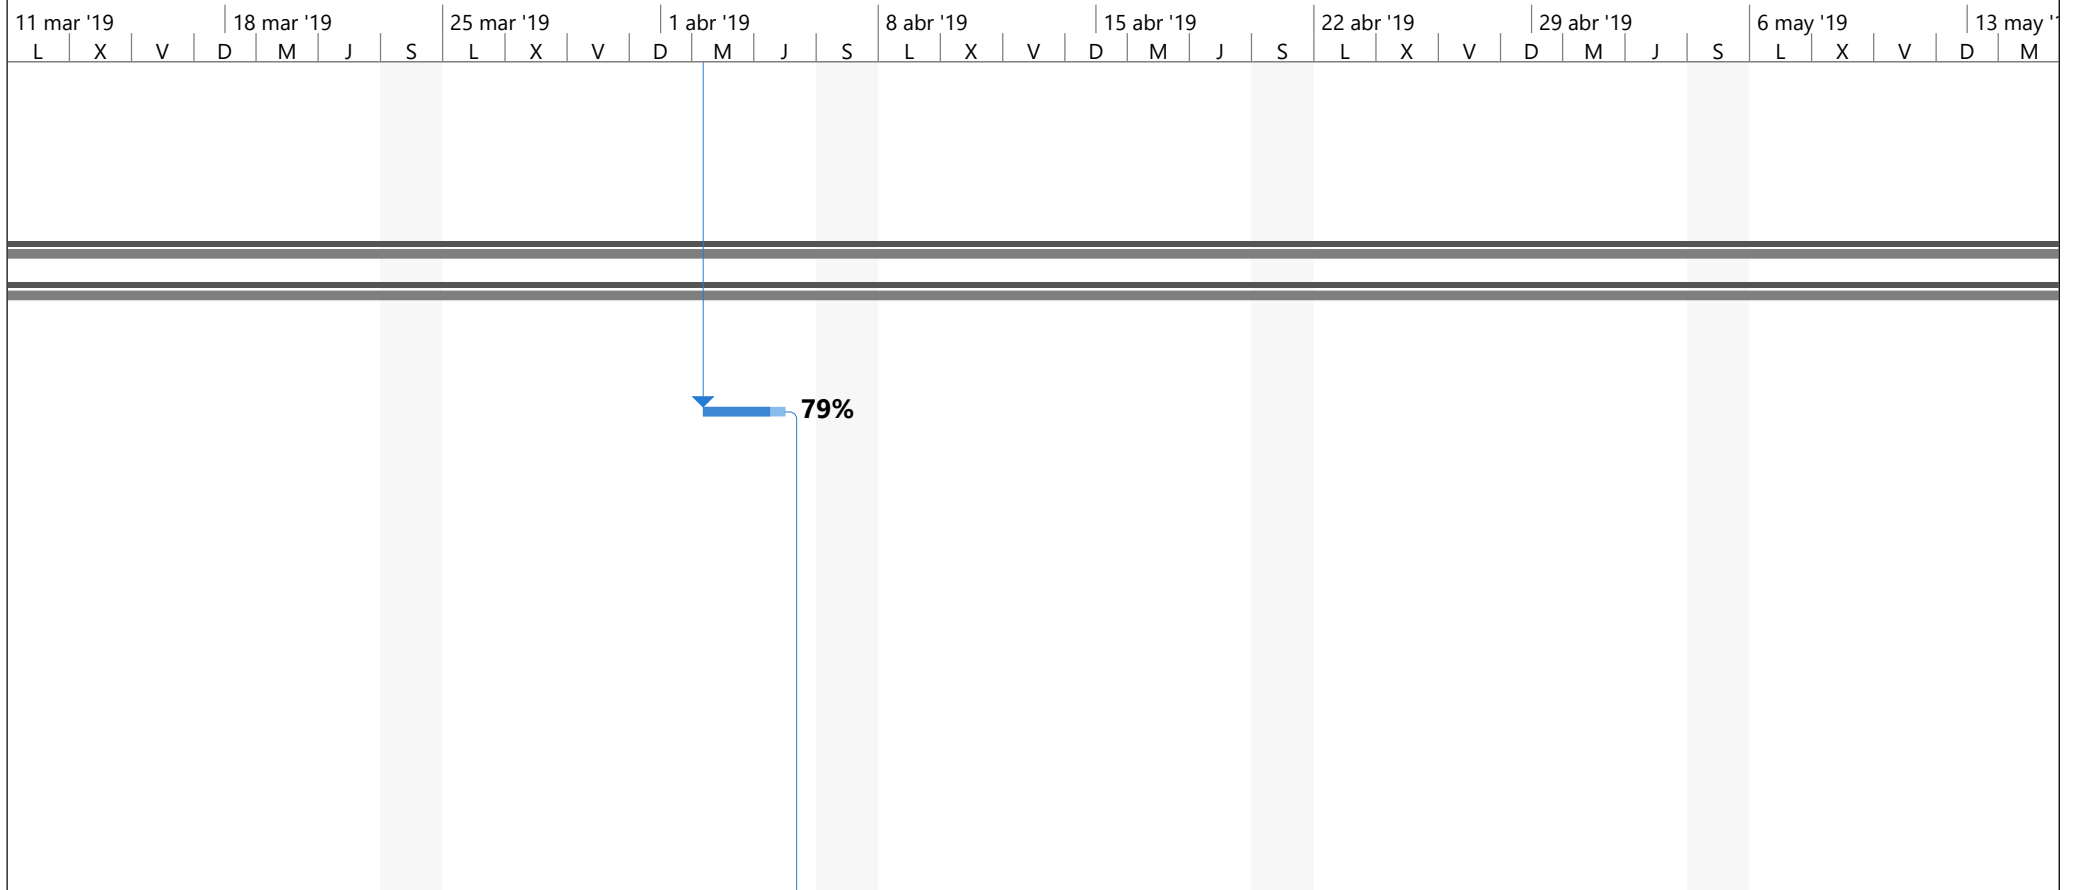

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

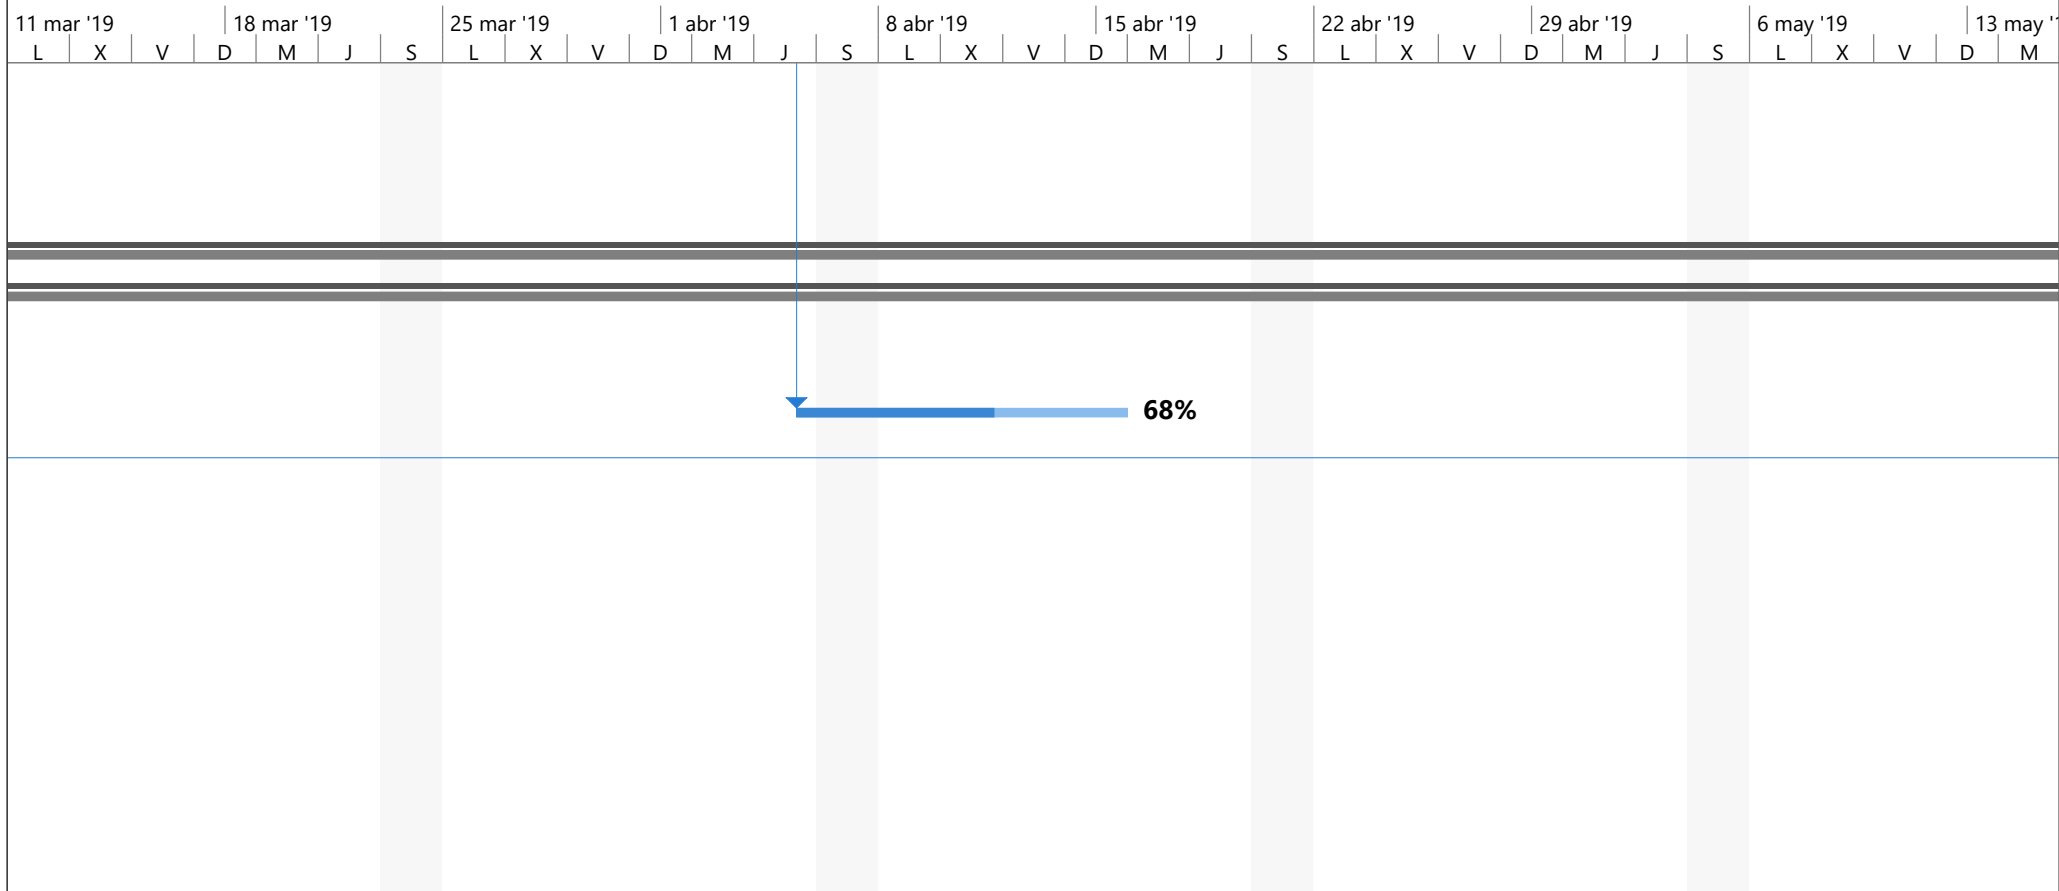

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020


11 mar '19				18 mar '19				25 mar '19				1 abr '19				8 abr '19				15 abr '19				22 abr '19				29 abr '19				6 may '19				13 may '19			
L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M			



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

may '19			20 may '19			27 may '19			3 jun '19			10 jun '19			17 jun '19			24 jun '19			1 jul '19			8 jul '19			15 jul '19	
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	S	L	X

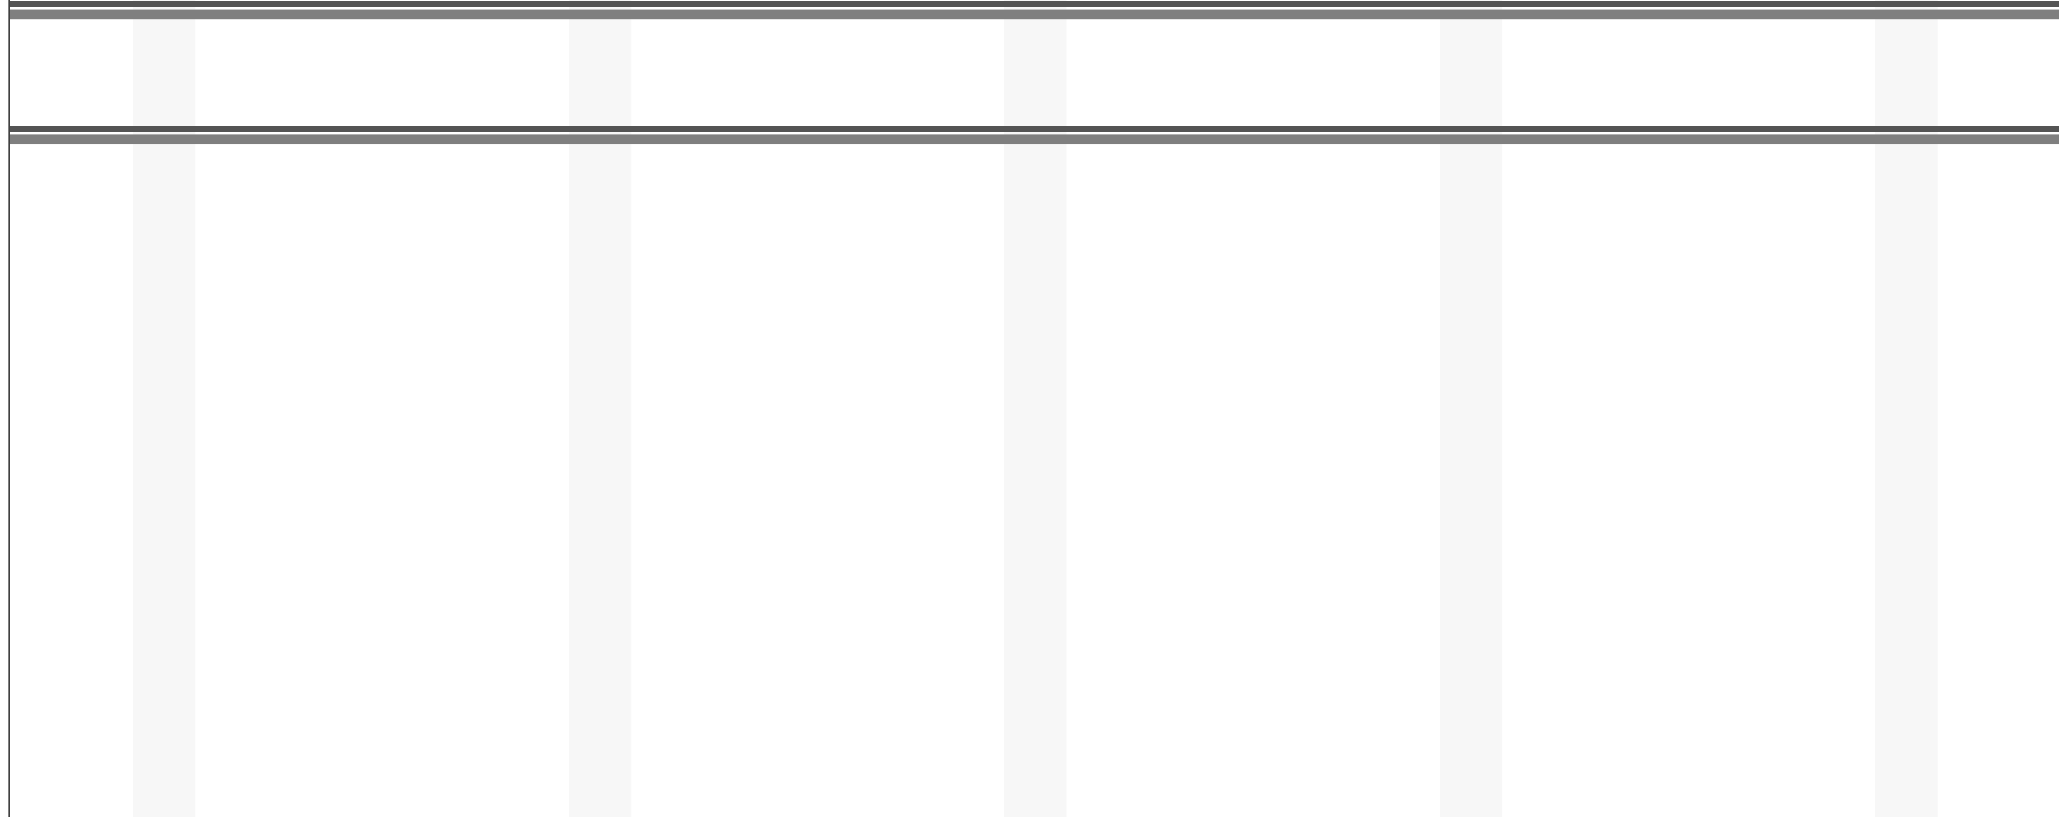


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

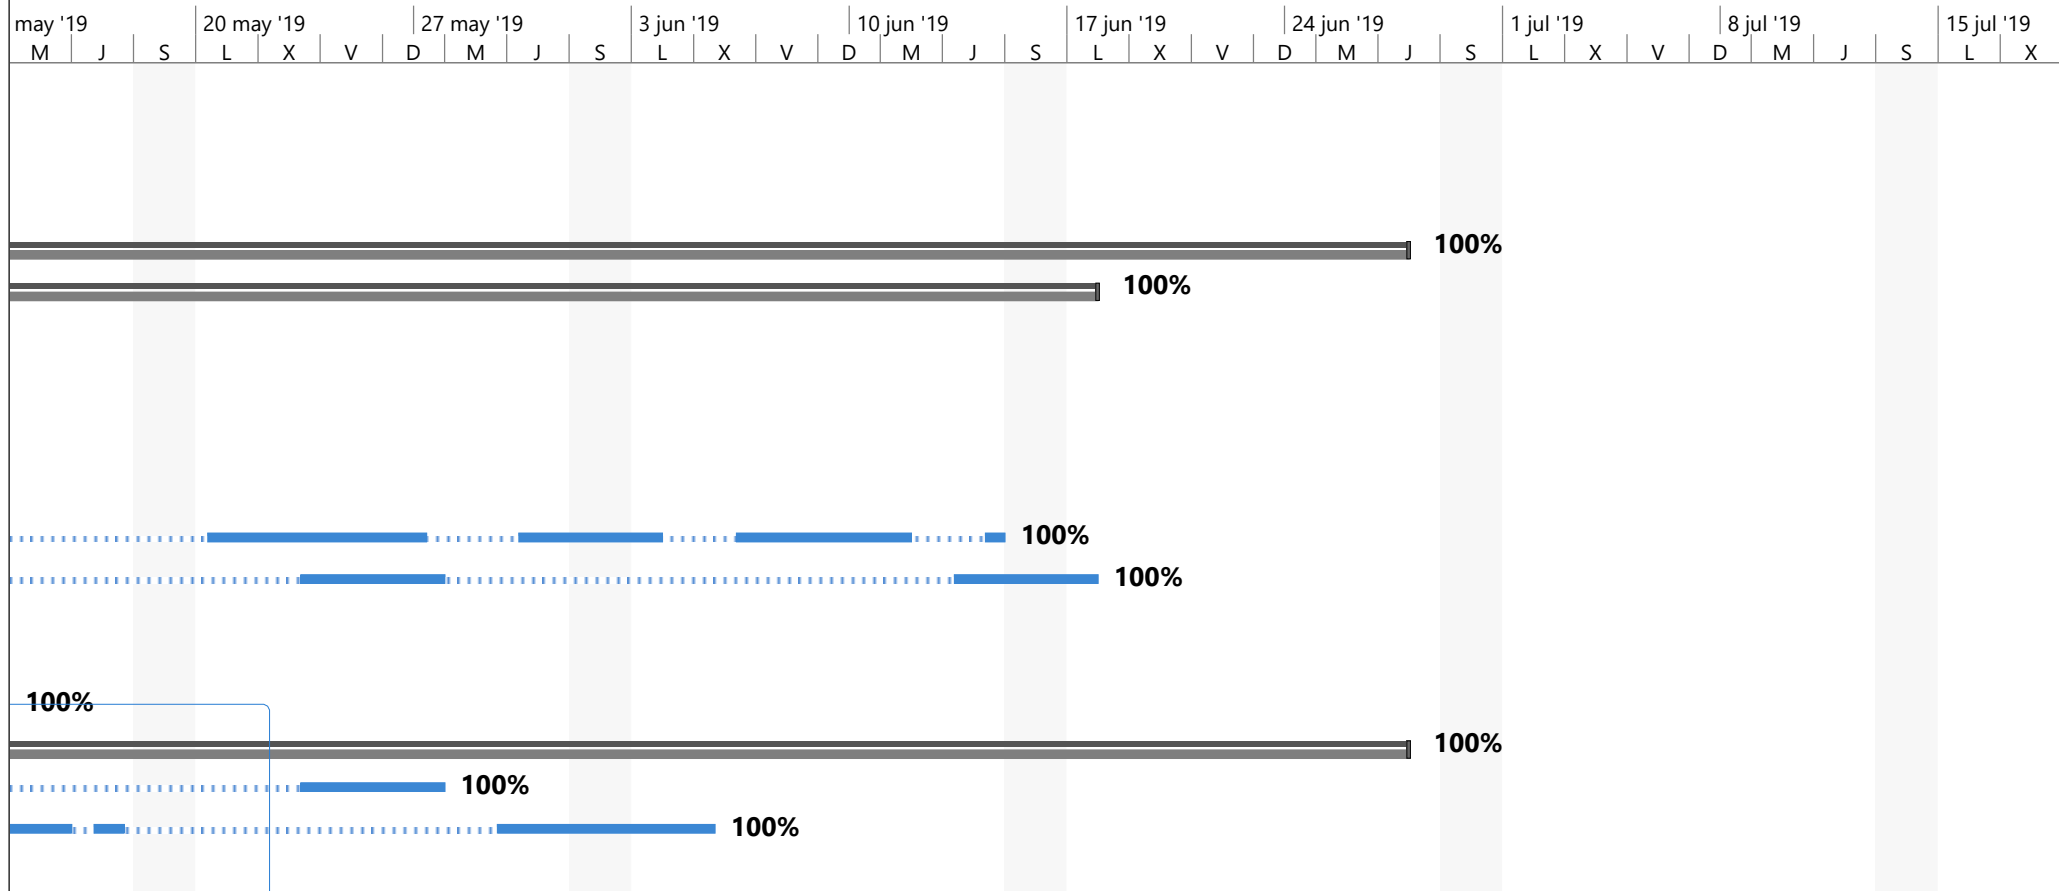


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

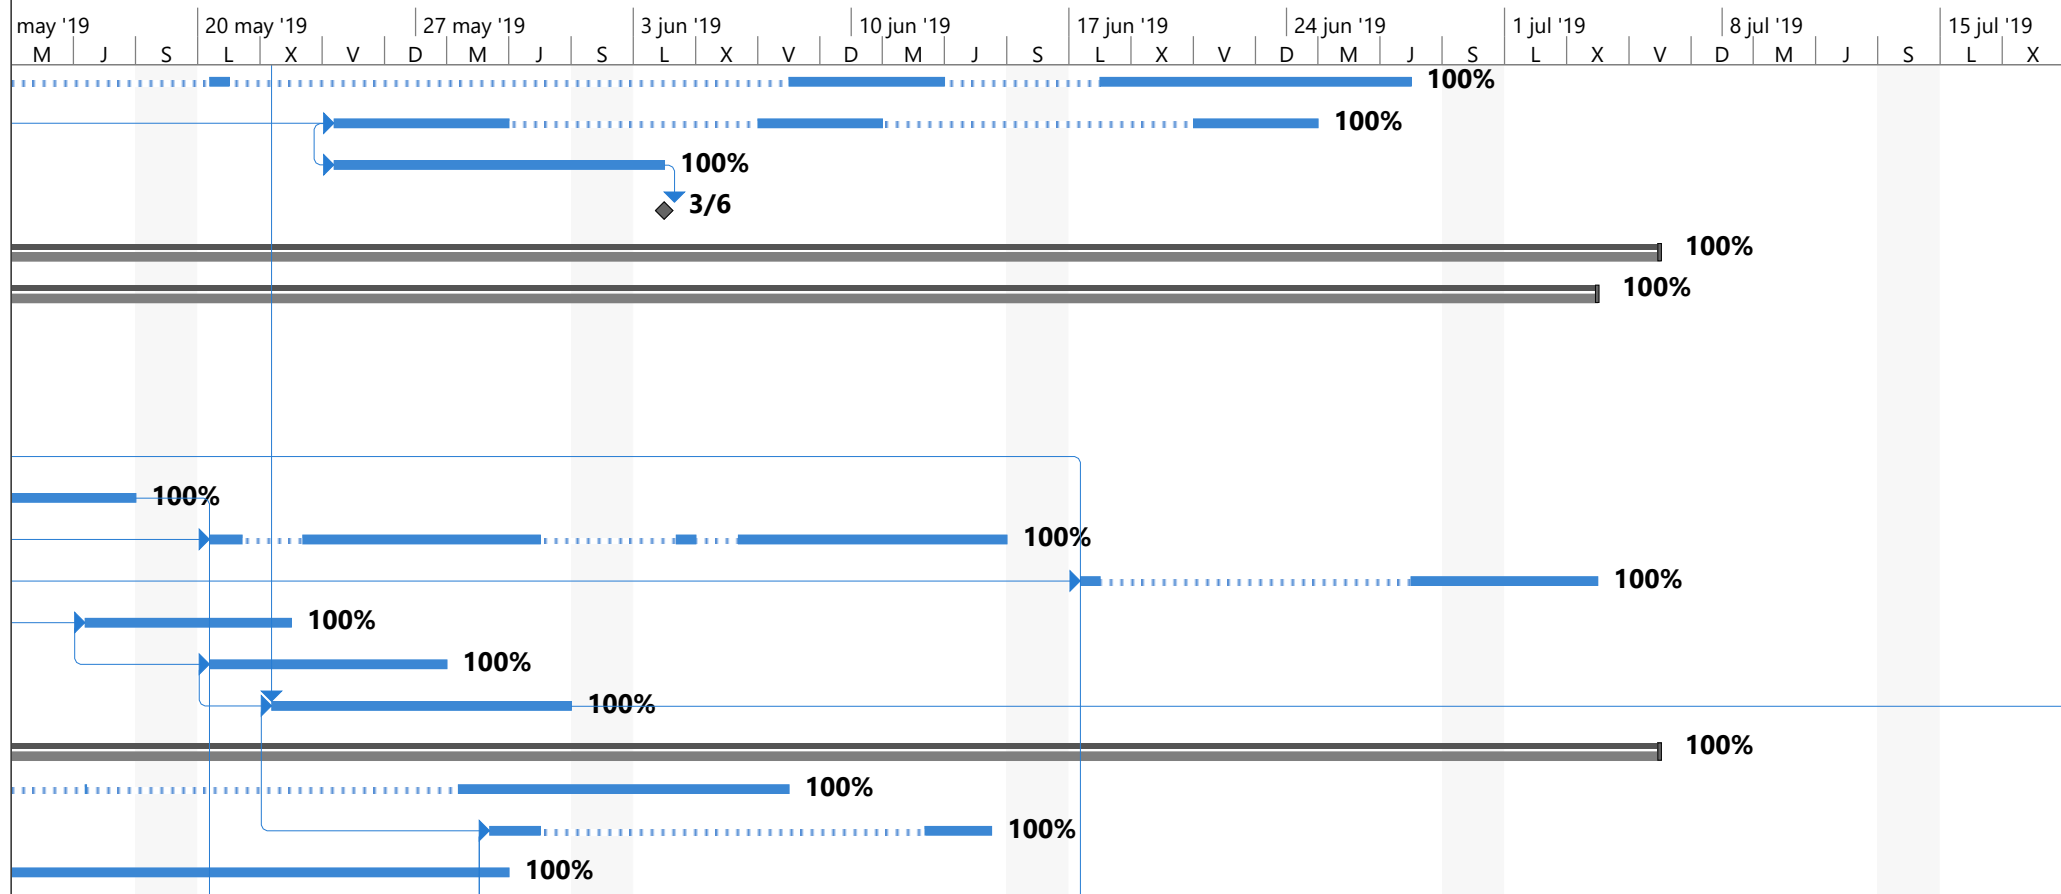


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

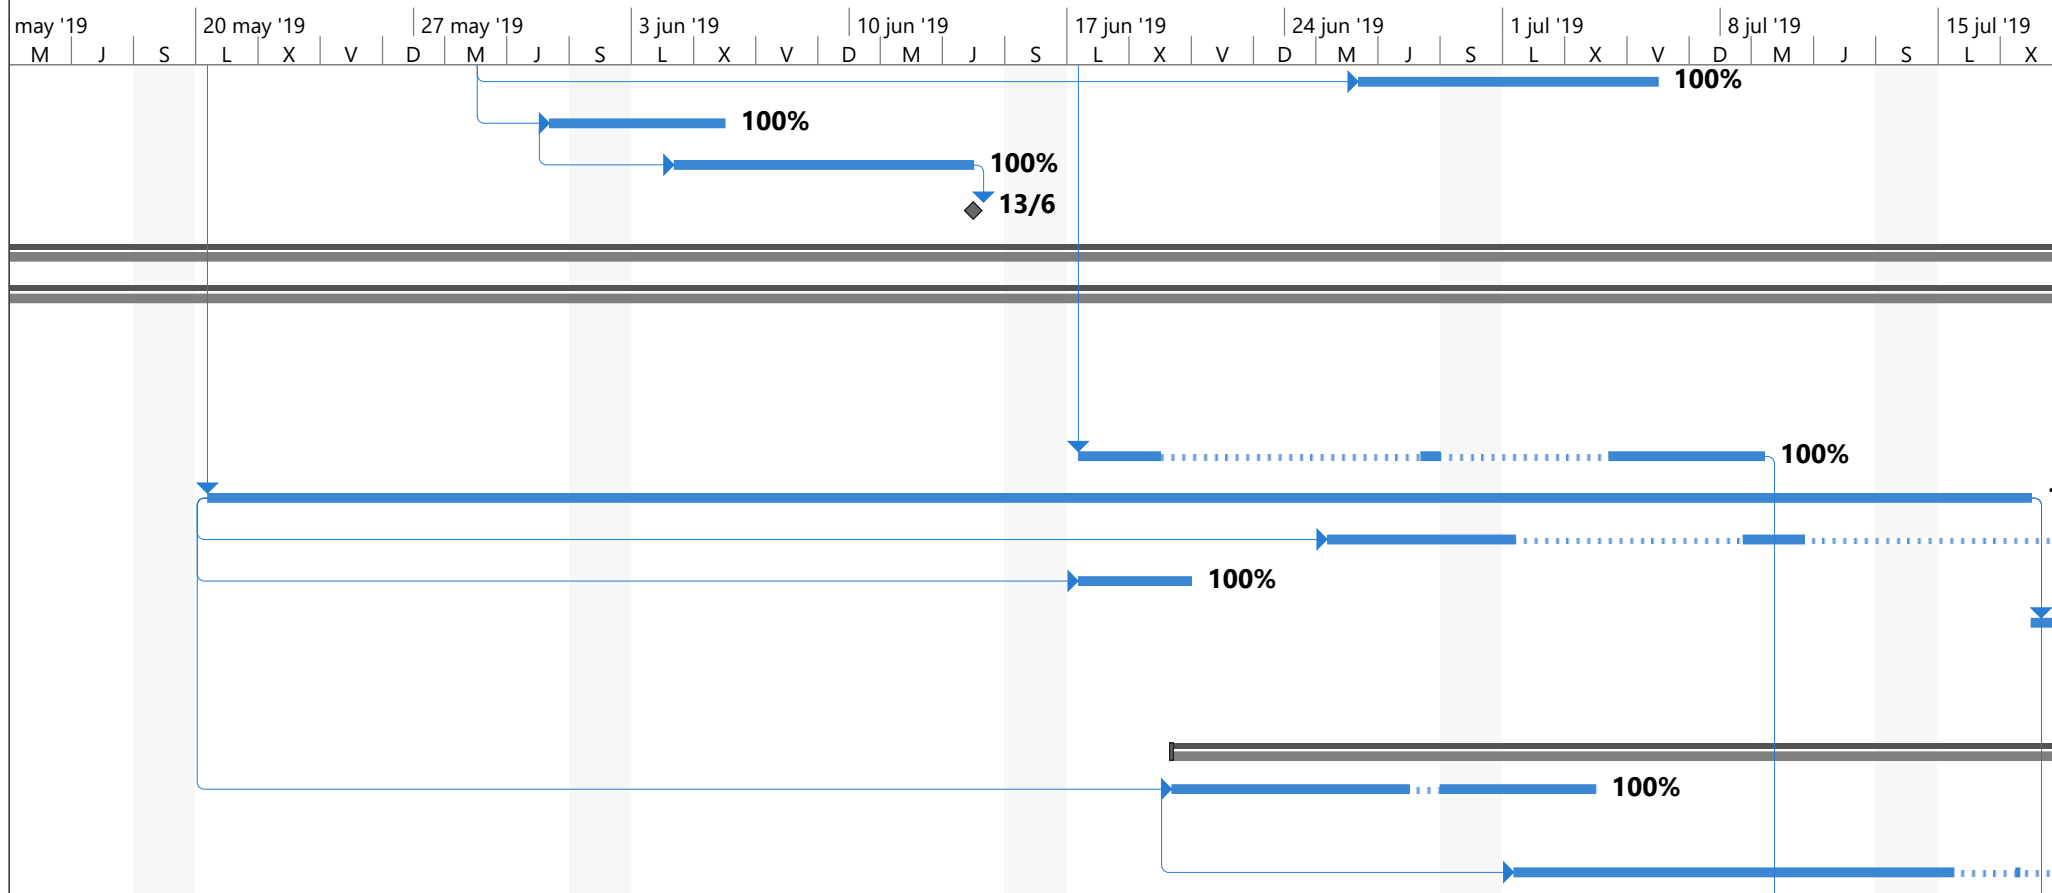

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

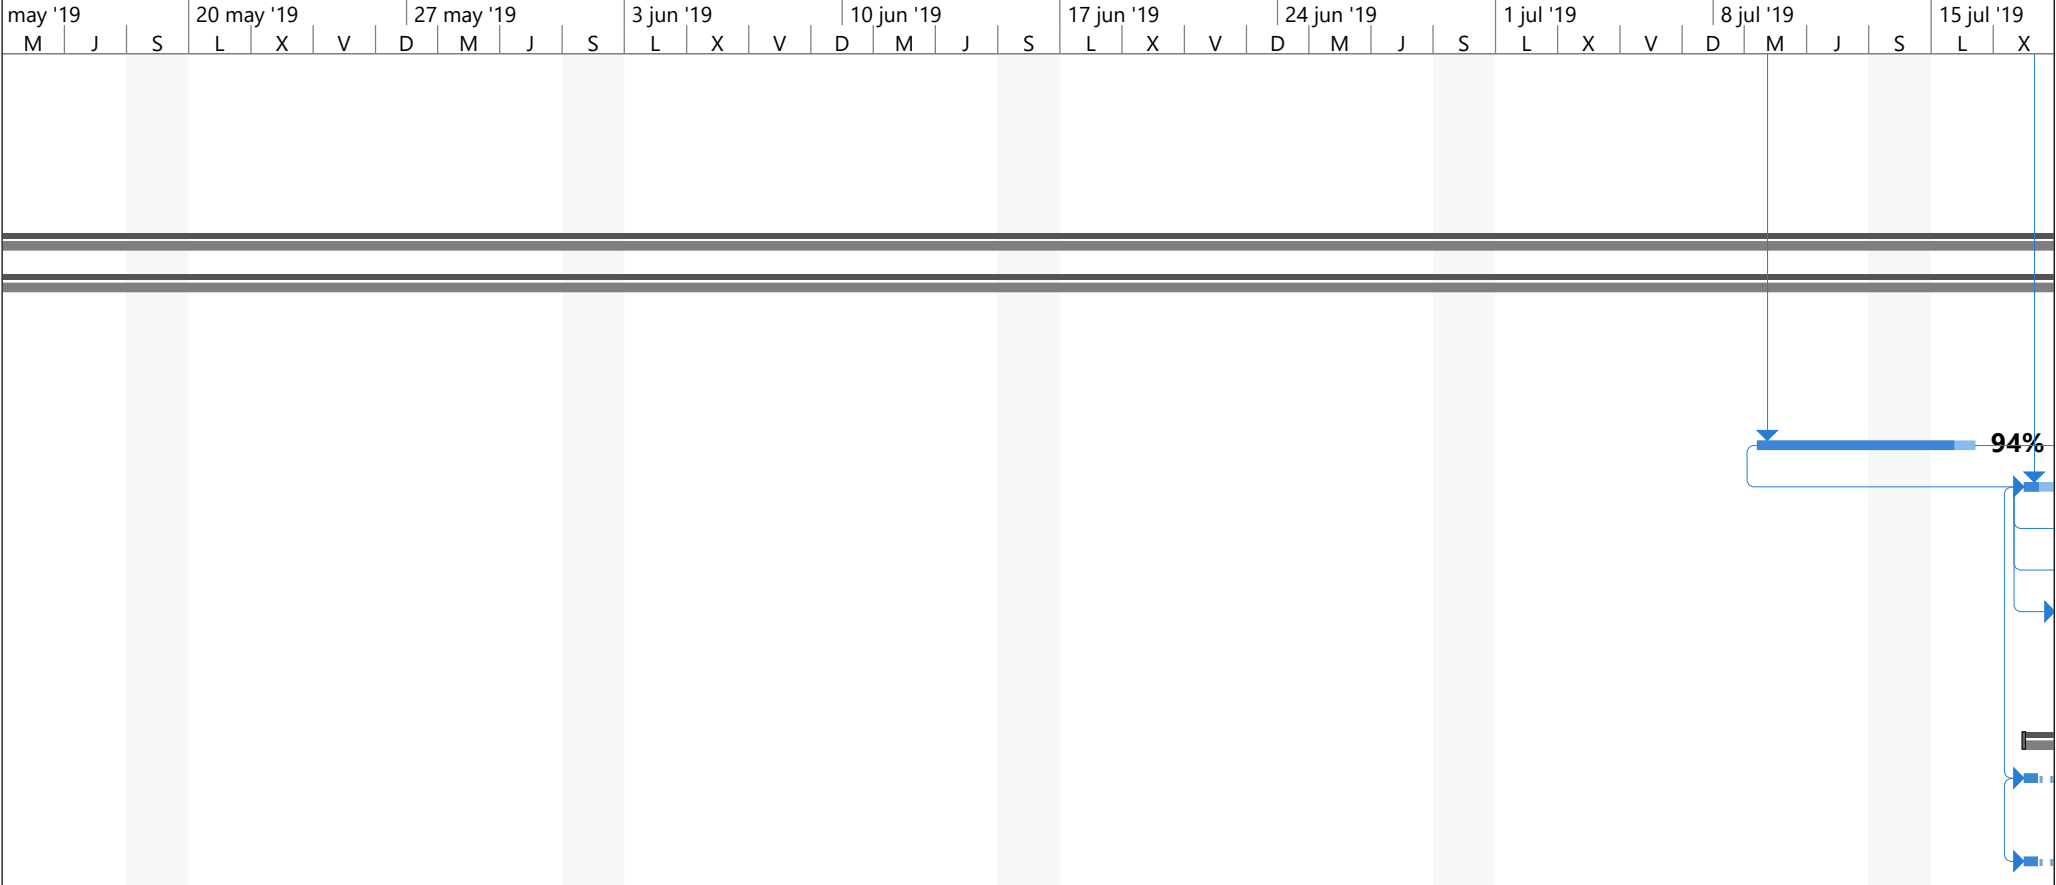


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

may '19			20 may '19			27 may '19			3 jun '19			10 jun '19			17 jun '19			24 jun '19			1 jul '19			8 jul '19			15 jul '19					
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020





















22 jul '19							29 jul '19							5 ago '19							12 ago '19							19 ago '19							26 ago '19							2 sep '19							9 sep '19							16 sep '19						
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J																							



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020


'19			22 jul '19				29 jul '19			5 ago '19				12 ago '19			19 ago '19			26 ago '19			2 sep '19				9 sep '19			16 sep '19			
X	V	D	M	J	S		L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020																																														
'19		22 jul '19					29 jul '19					5 ago '19					12 ago '19					19 ago '19					26 ago '19					2 sep '19					9 sep '19					16 sep '19				
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J														


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

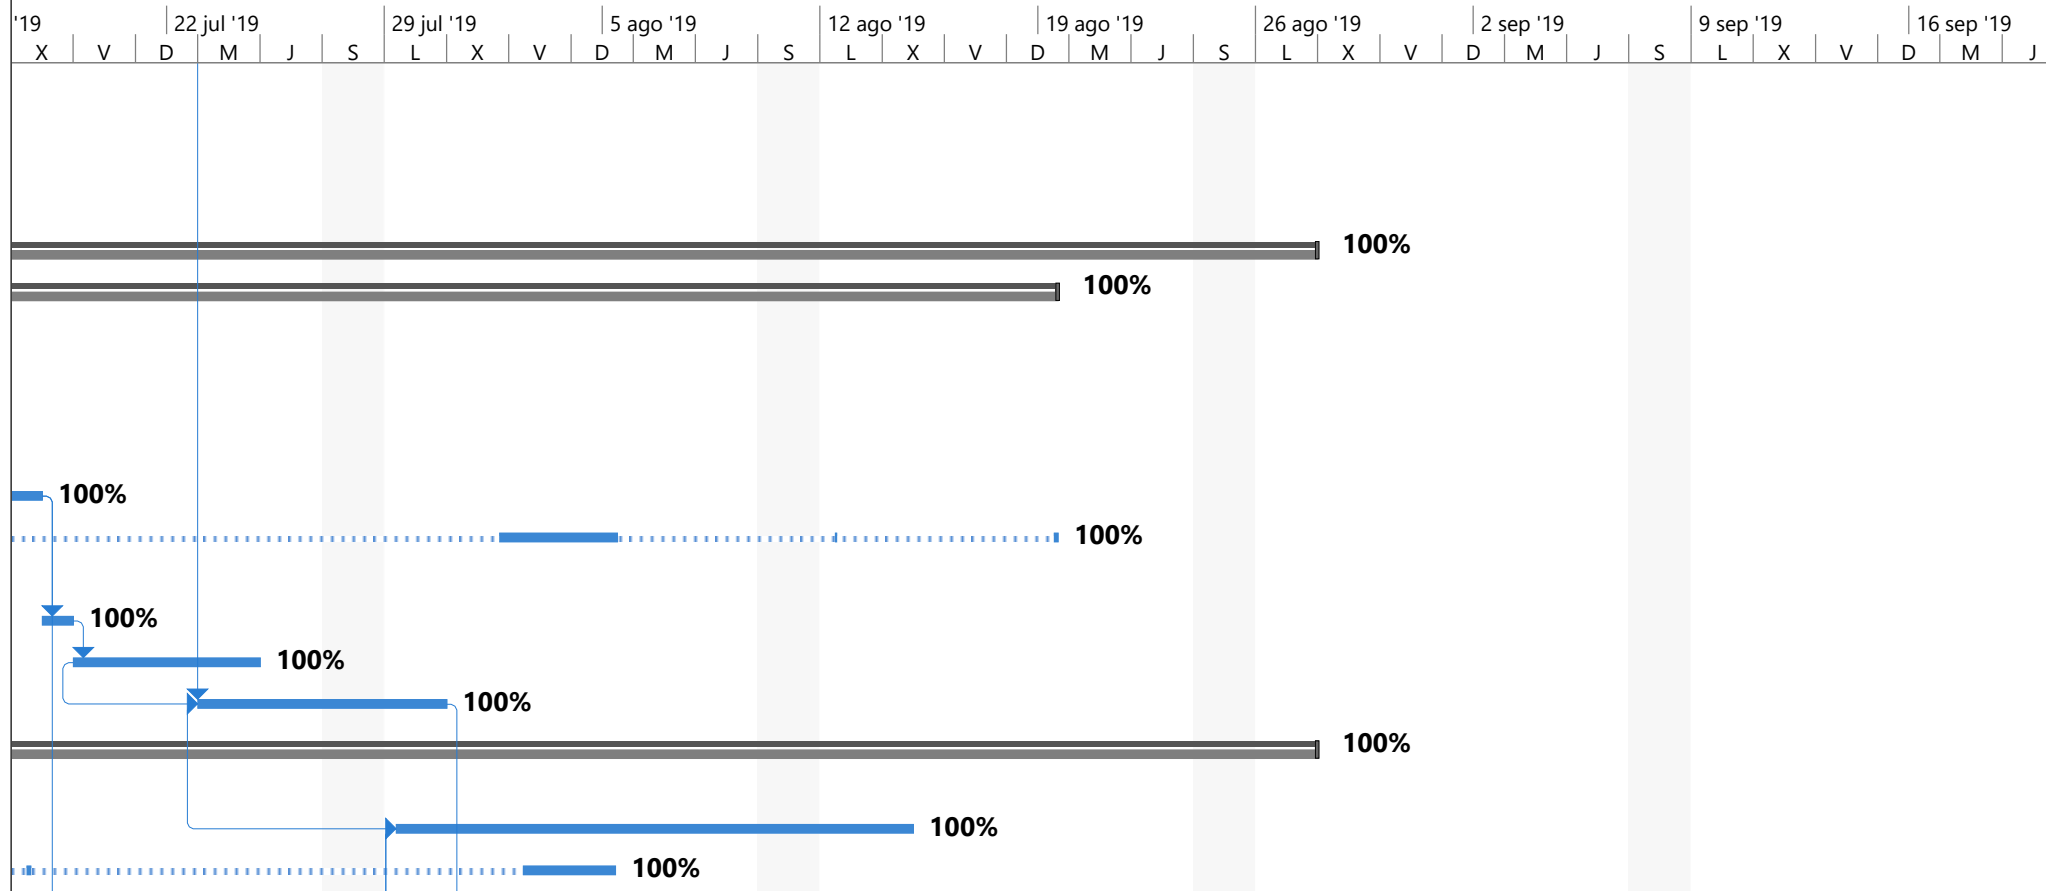


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

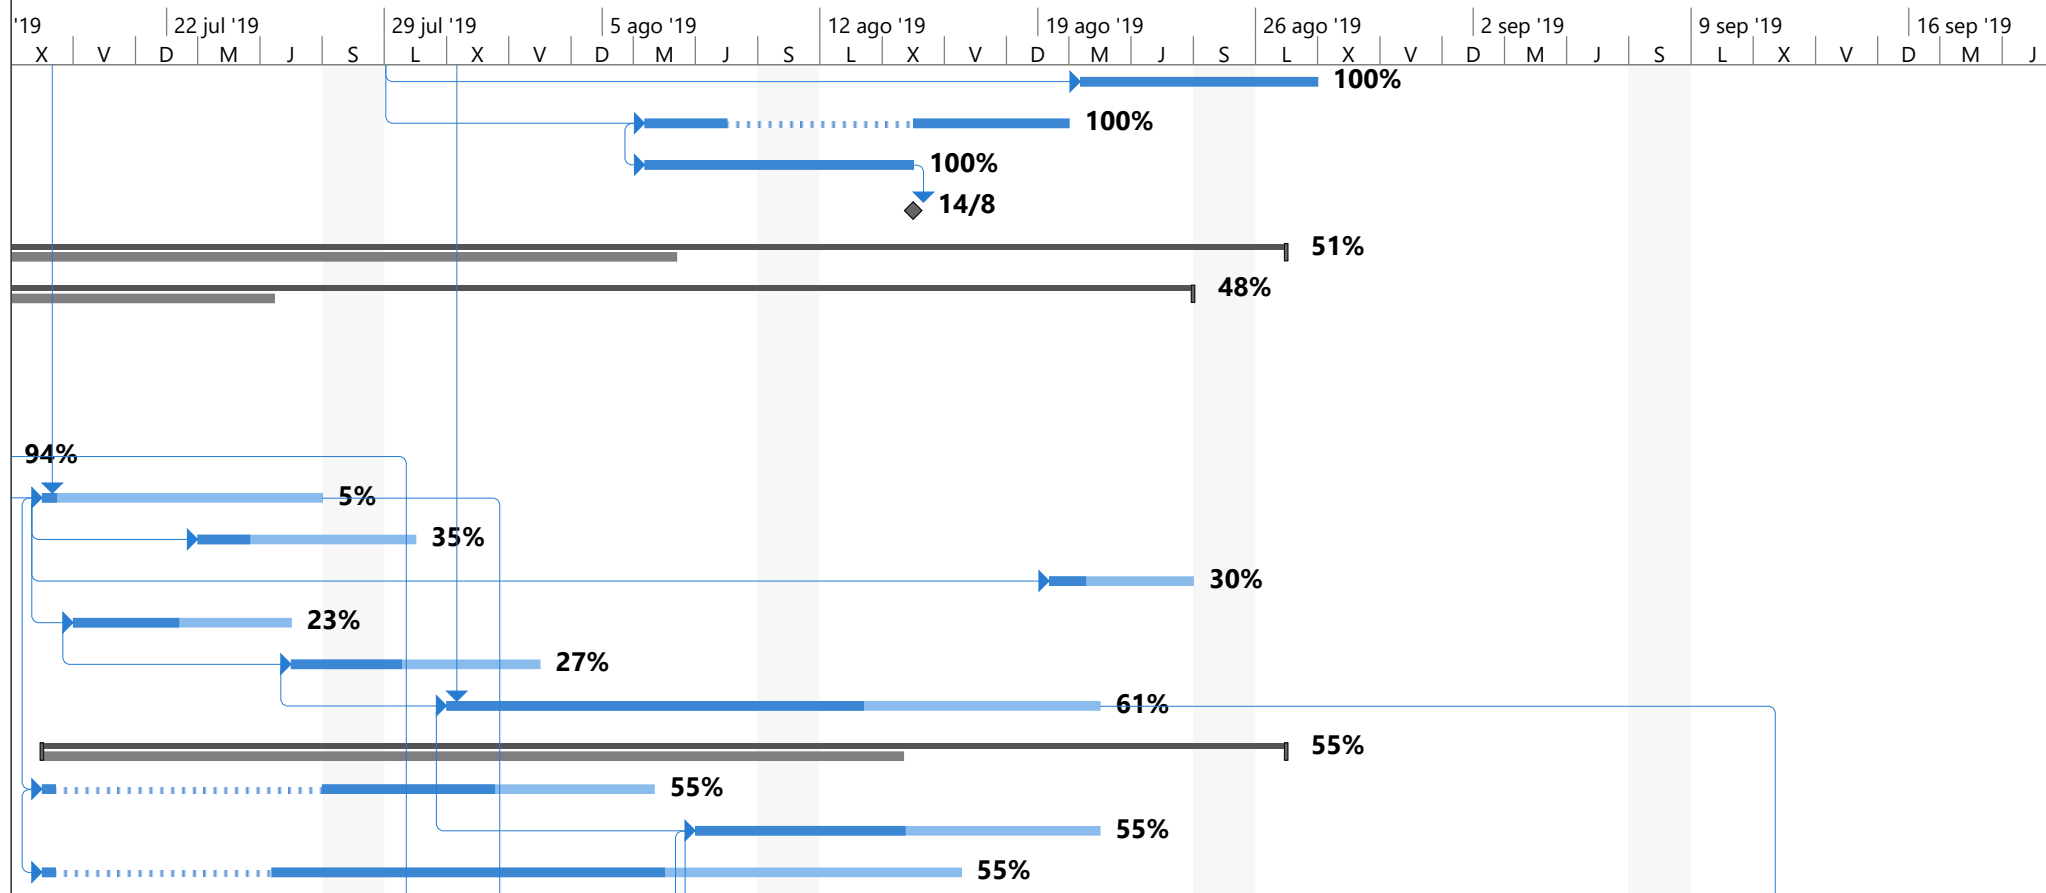

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

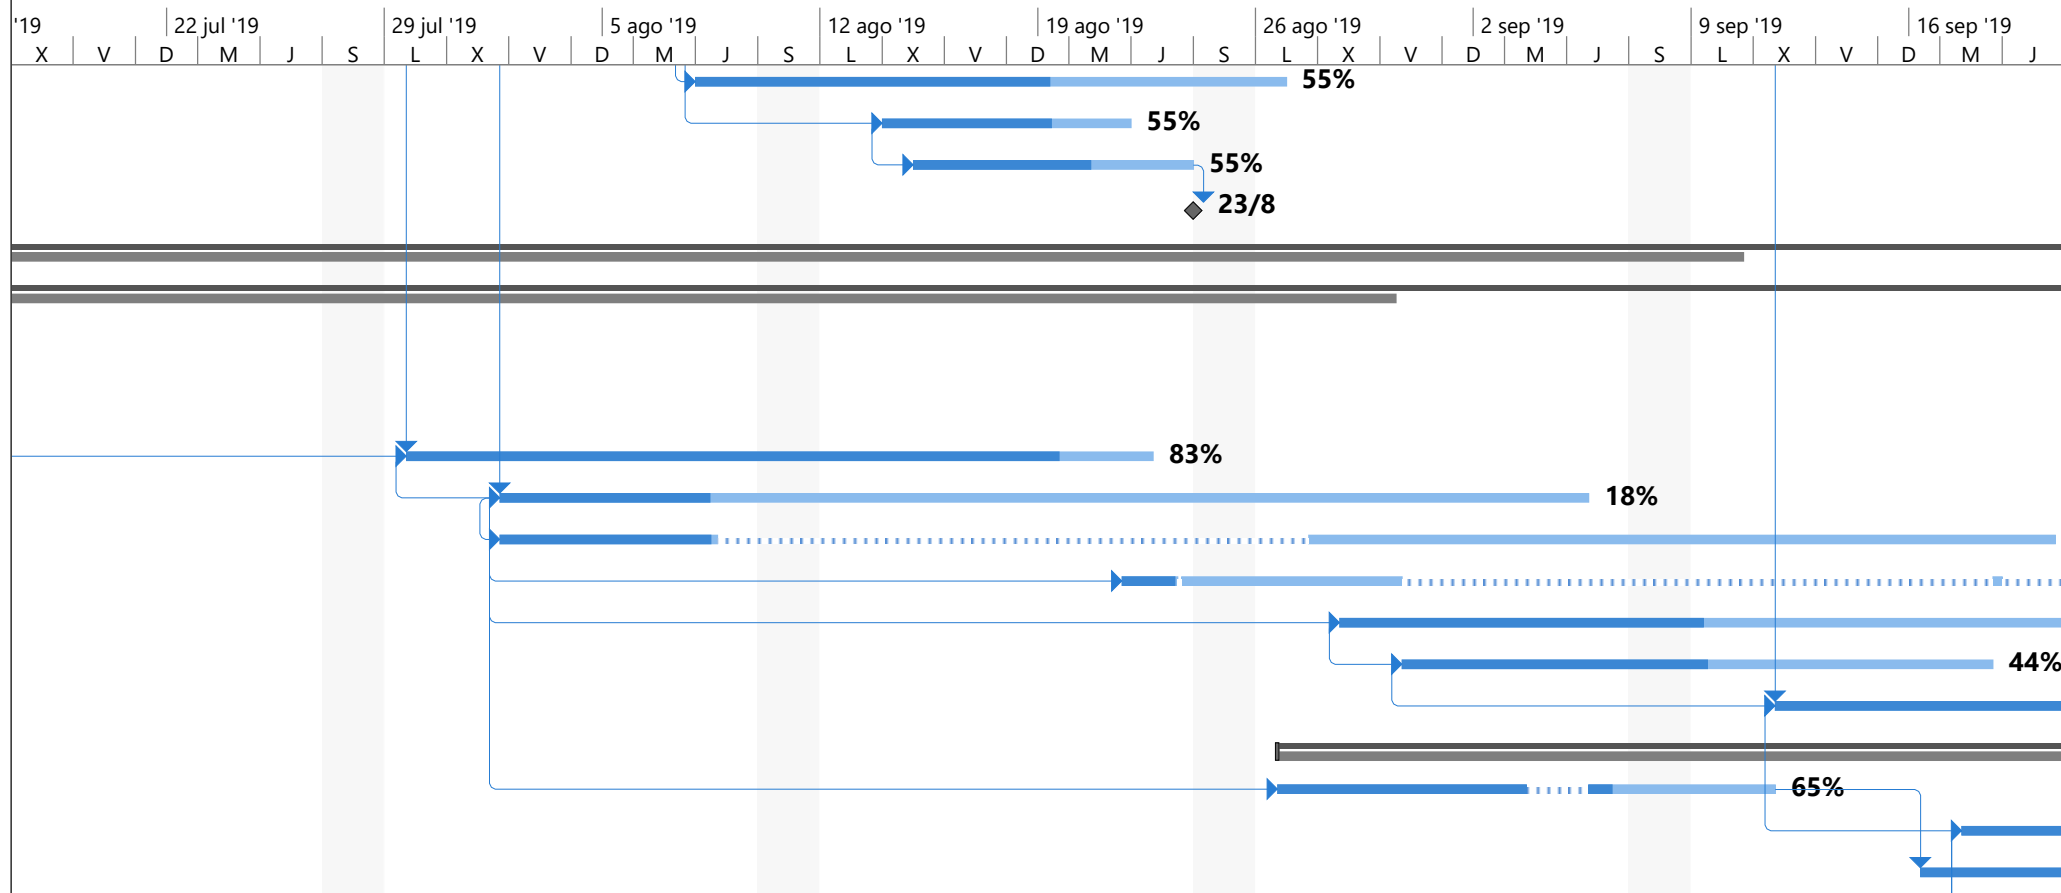

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

22 jul '19							29 jul '19							5 ago '19							12 ago '19							19 ago '19							26 ago '19							2 sep '19							9 sep '19							16 sep '19						
X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	L	X	V	D	M	J																								



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

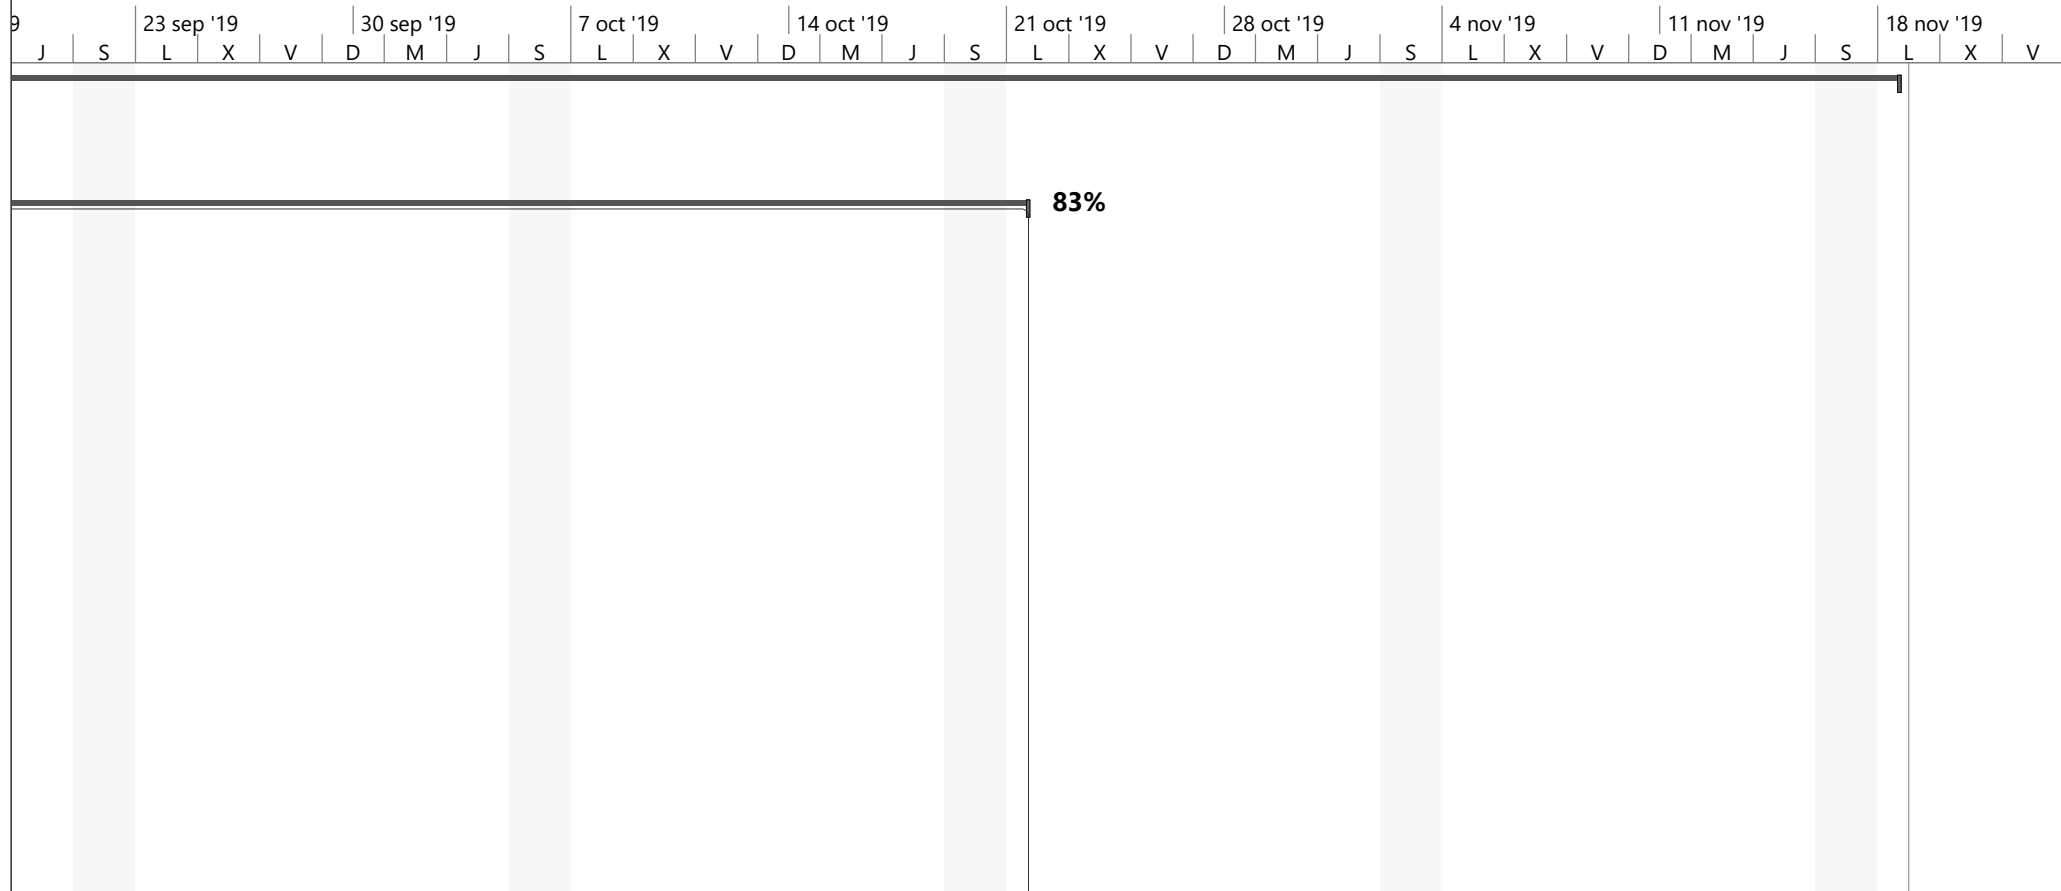

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	













Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

9	J	S	23 sep '19			30 sep '19			7 oct '19			14 oct '19			21 oct '19			28 oct '19			4 nov '19			11 nov '19			18 nov '19		
	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	













Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

9	J	S	23 sep '19			30 sep '19			7 oct '19			14 oct '19			21 oct '19			28 oct '19			4 nov '19			11 nov '19			18 nov '19				
	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

















Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

9	J	S	23 sep '19			30 sep '19			7 oct '19			14 oct '19			21 oct '19			28 oct '19			4 nov '19			11 nov '19			18 nov '19				
	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

9	J	S	23 sep '19			30 sep '19			7 oct '19			14 oct '19			21 oct '19			28 oct '19			4 nov '19			11 nov '19			18 nov '19				
	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

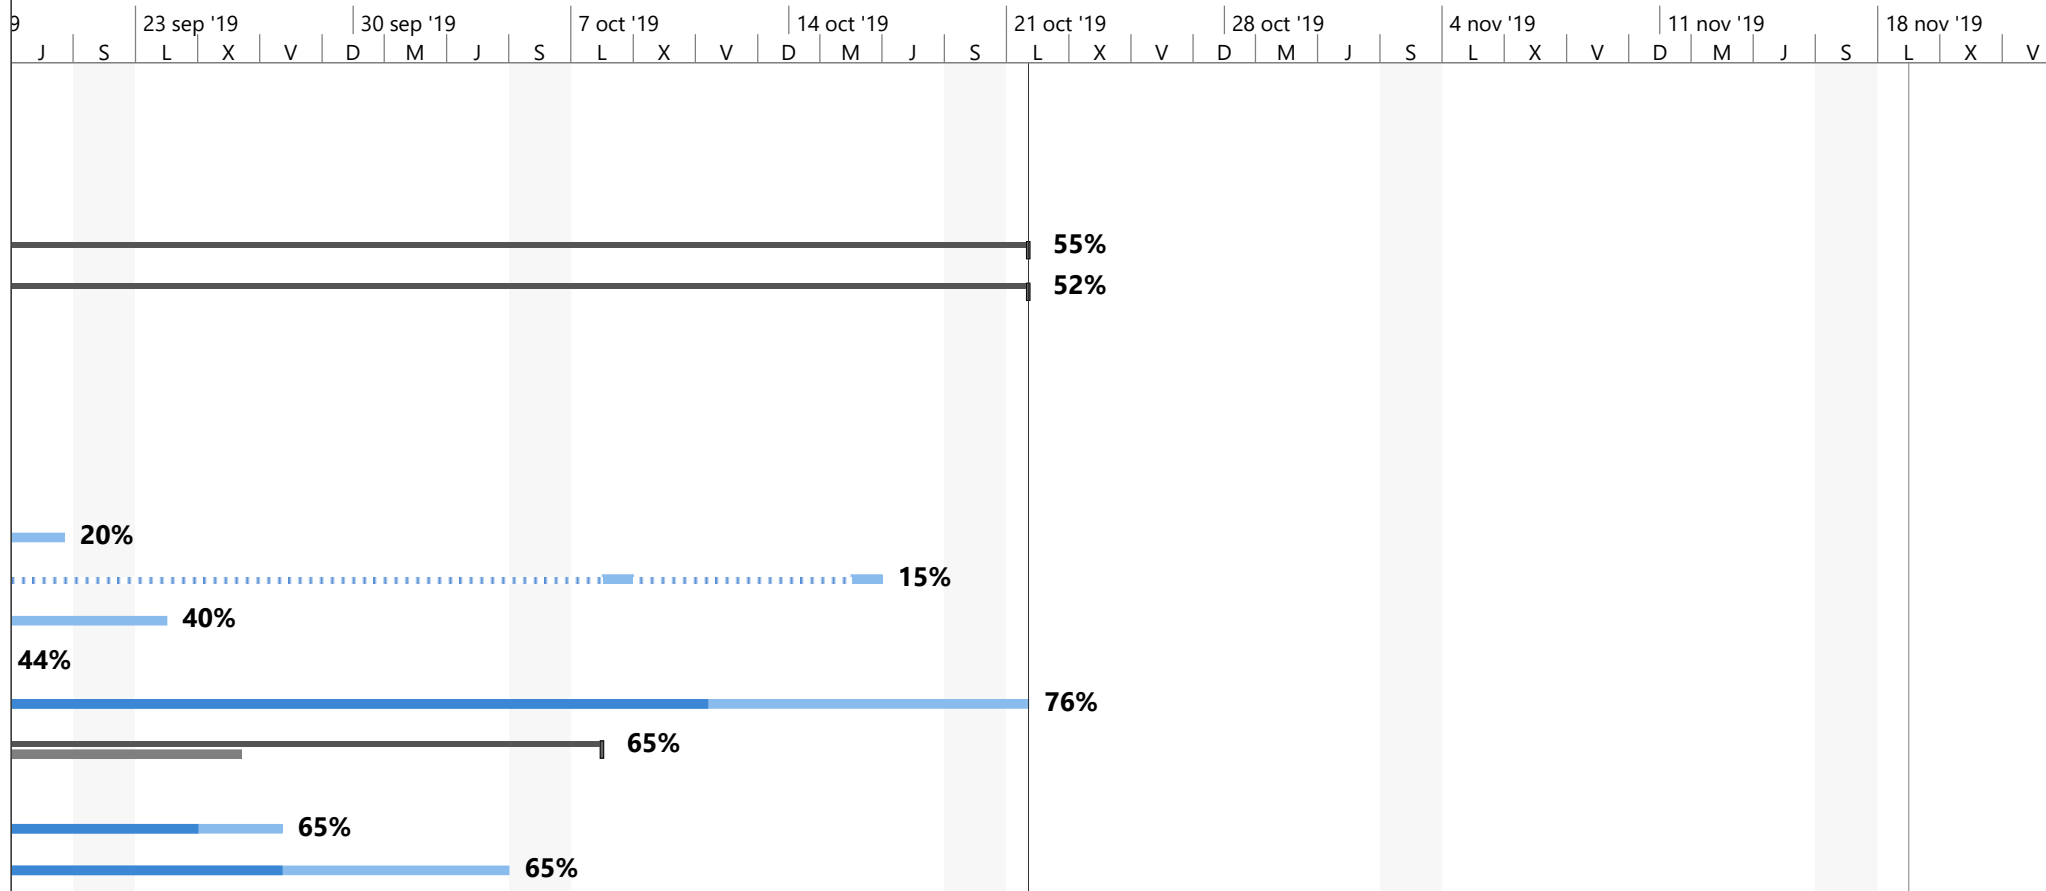

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




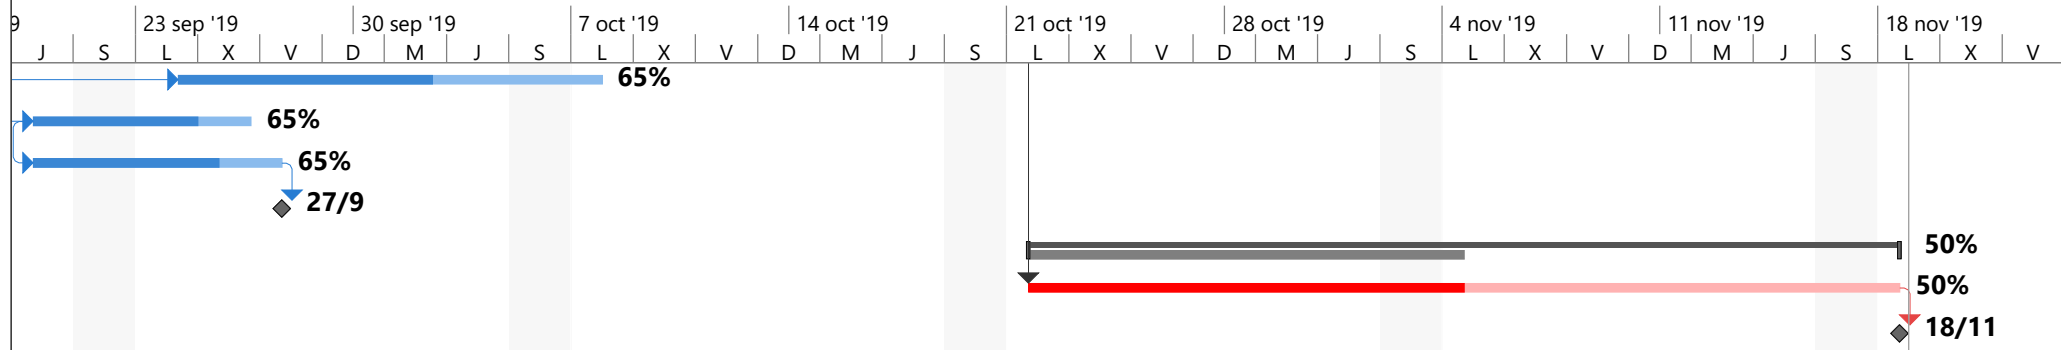




















Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020


25 nov '19					2 dic '19			9 dic '19					16 dic '19			23 dic '19					30 dic '19			6 ene '20					13 ene '20			20 ene '20				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

25 nov '19					2 dic '19			9 dic '19					16 dic '19			23 dic '19					30 dic '19			6 ene '20					13 ene '20			20 ene '20				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen




Fecha límite



Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

25 nov '19					2 dic '19			9 dic '19					16 dic '19			23 dic '19					30 dic '19			6 ene '20					13 ene '20			20 ene '20				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen



Fecha límite



Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

























25 nov '19					2 dic '19			9 dic '19					16 dic '19			23 dic '19					30 dic '19			6 ene '20					13 ene '20			20 ene '20				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

25 nov '19					2 dic '19			9 dic '19					16 dic '19			23 dic '19					30 dic '19			6 ene '20					13 ene '20			20 ene '20				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

25 nov '19					2 dic '19			9 dic '19					16 dic '19			23 dic '19					30 dic '19			6 ene '20					13 ene '20			20 ene '20				
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución ABAP101 Jun2020

25 nov '19					2 dic '19				9 dic '19				16 dic '19				23 dic '19				30 dic '19				6 ene '20				13 ene '20				20 ene '20			
V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S				



Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorste Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorste.com.do P: www.edenorste.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
