









































































Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	6 jul '20												13 jul '20						
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D				
1			Rehabilitación de Redes SABY102	191.88 días	mar 7/7/20																			
2			Ejecución	171.88 días	mar 7/7/20																			
3			Polígono 1	118.88 días	mar 7/7/20																			
4			Instalación	118.88 días	mar 7/7/20																			
5			Excavaciones	24 días	mar 7/7/20																			
6			Izado de postes	28 días	jue 9/7/20																			
7			Cimentaciones	6 días	mié 12/8/20																			
8			Retenidas	25 días	jue 30/7/20																			
9			Armados MT y BT	29 días	jue 6/8/20																			
10			Tendido de Conductor MT y BT	24 días	jue 20/8/20																			
11			Conexiones y Jumpers	36 días	jue 3/9/20																			
12			Puesta a Tierra	36 días	jue 3/9/20																			
13			Transformadores	28 días	jue 17/9/20																			
14			Alumbrado Público	28 días	lun 21/9/20																			
15			Totalizadores	1 día	jue 1/10/20																			
16			Acometida	35 días	jue 29/10/20																			
17			Finalizacion del Poligono 1	1 día	jue 17/12/20																			
18			Remoción	30 días	jue 29/10/20																			
19			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	30 días	jue 29/10/20																			
20			Armados de Media y Baja Tensión	30 días	jue 29/10/20																			





Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	6 jul '20							13 jul '20							
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
21			Transformadores	30 días	jue 29/10/20															
22			Remocion de postes	30 días	jue 29/10/20															
23			Polígono 2	147.88 días	lun 10/8/20															
24			Instalación	143 días	lun 10/8/20															
25			Excavaciones	46 días	lun 10/8/20															
26			Izado de postes	55 días	mar 18/8/20															
27			Cimentaciones	10 días	jue 22/10/20															
28			Retenidas	49 días	jue 3/9/20															
29			Armados MT y BT	54 días	mié 16/9/20															
30			Tendido de Conductor MT y BT	48 días	vie 9/10/20															
31			Conexiones y Jumpers	43 días	vie 23/10/20															
32			Puesta a Tierra	43 días	vie 23/10/20															
33			Transformadores	13 días	vie 4/12/20															
34			Alumbrado Público	34 días	jue 5/11/20															
35			Totalizadores	1 día	jue 24/12/20															
36			Acometida	45 días	jue 24/12/20															
37			Remoción	50 días	mié 23/12/20															
38			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	45 días	mié 23/12/20															
39			Armados de Media y Baja Tensión	45 días	mié 23/12/20															
40			Transformadores	45 días	mié 23/12/20															


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	6 jul '20														13 jul '20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41			Remocion de postes	45 días	mié 23/12/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

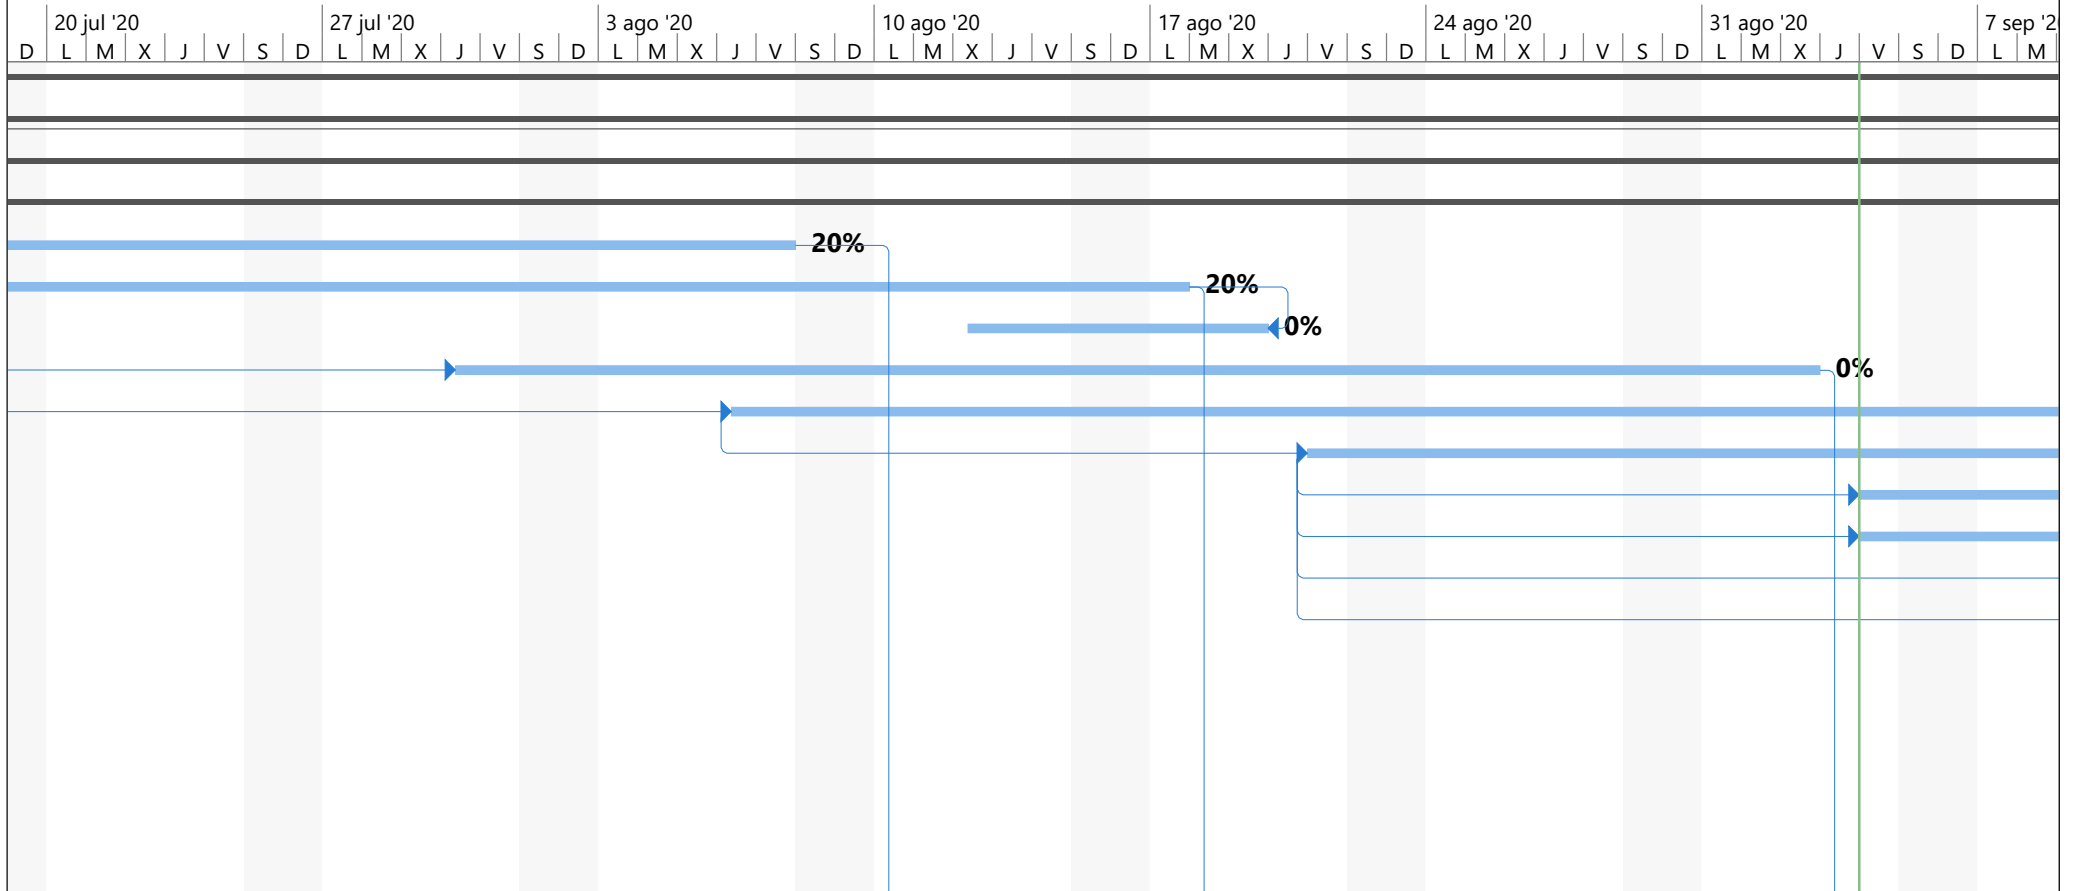

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




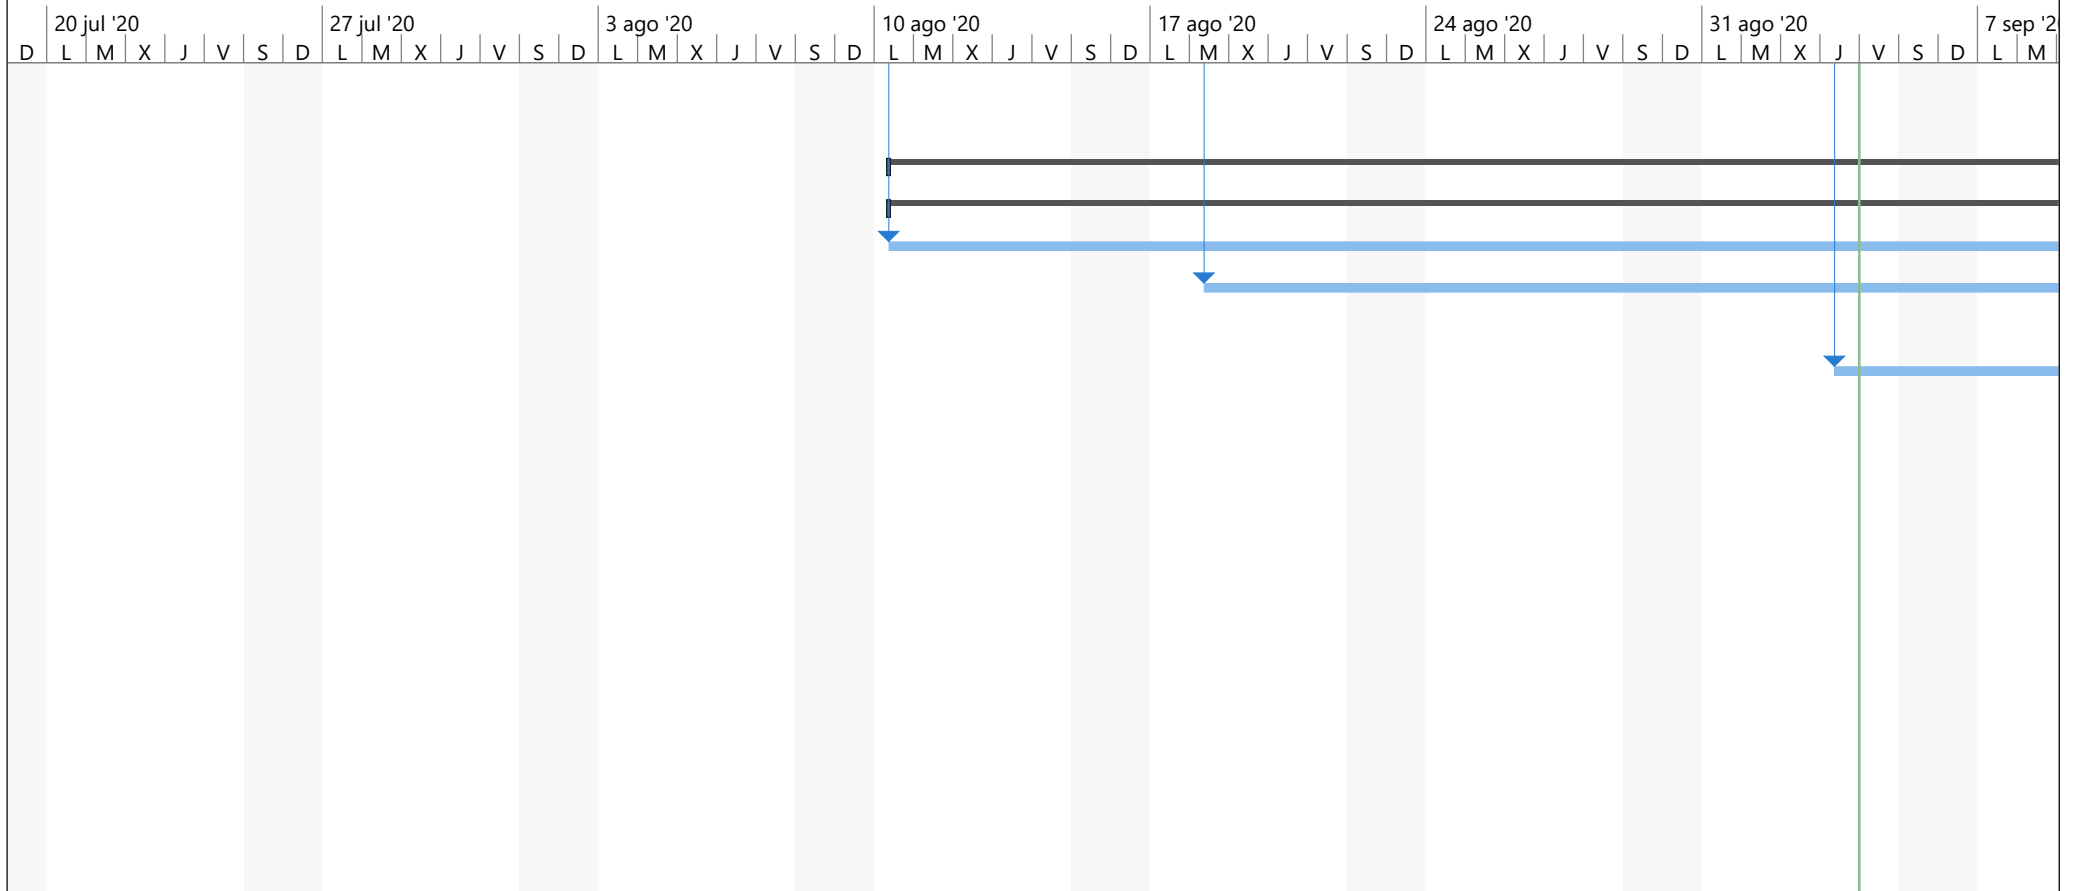




















Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución Saby102 Ago2020

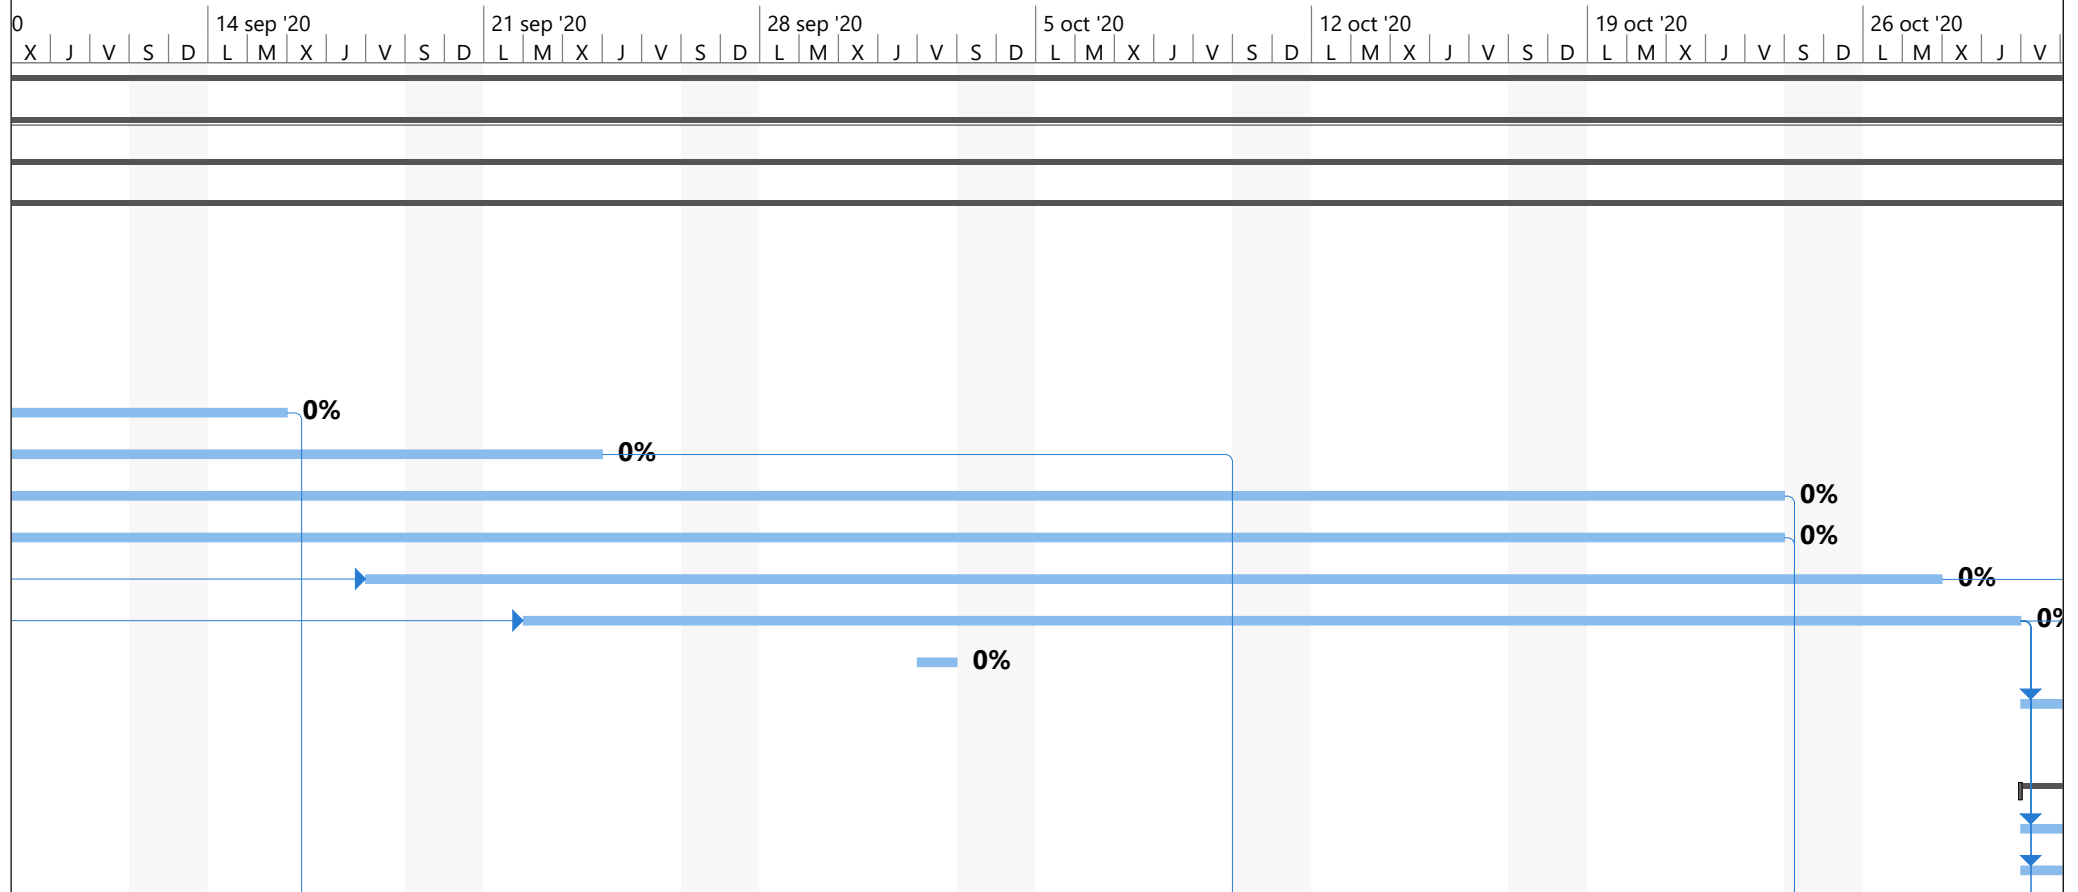

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

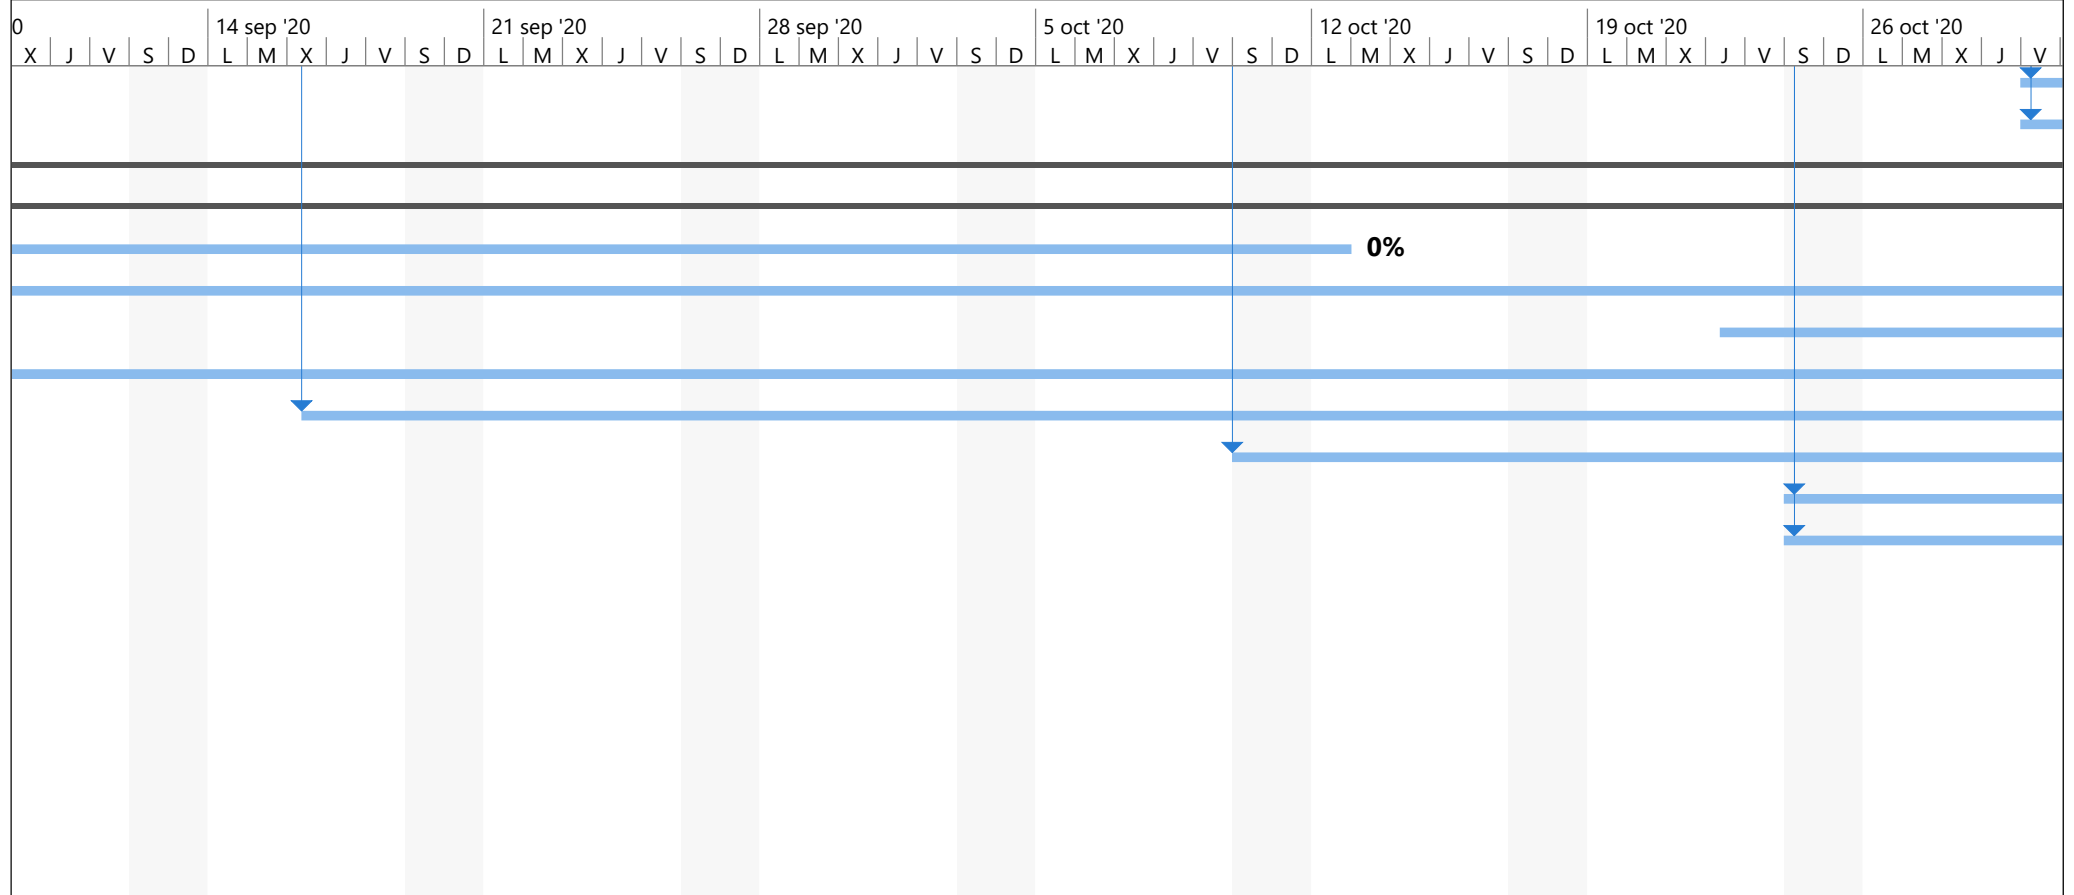

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

0						14 sep '20					21 sep '20					28 sep '20					5 oct '20					12 oct '20					19 oct '20					26 oct '20				
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

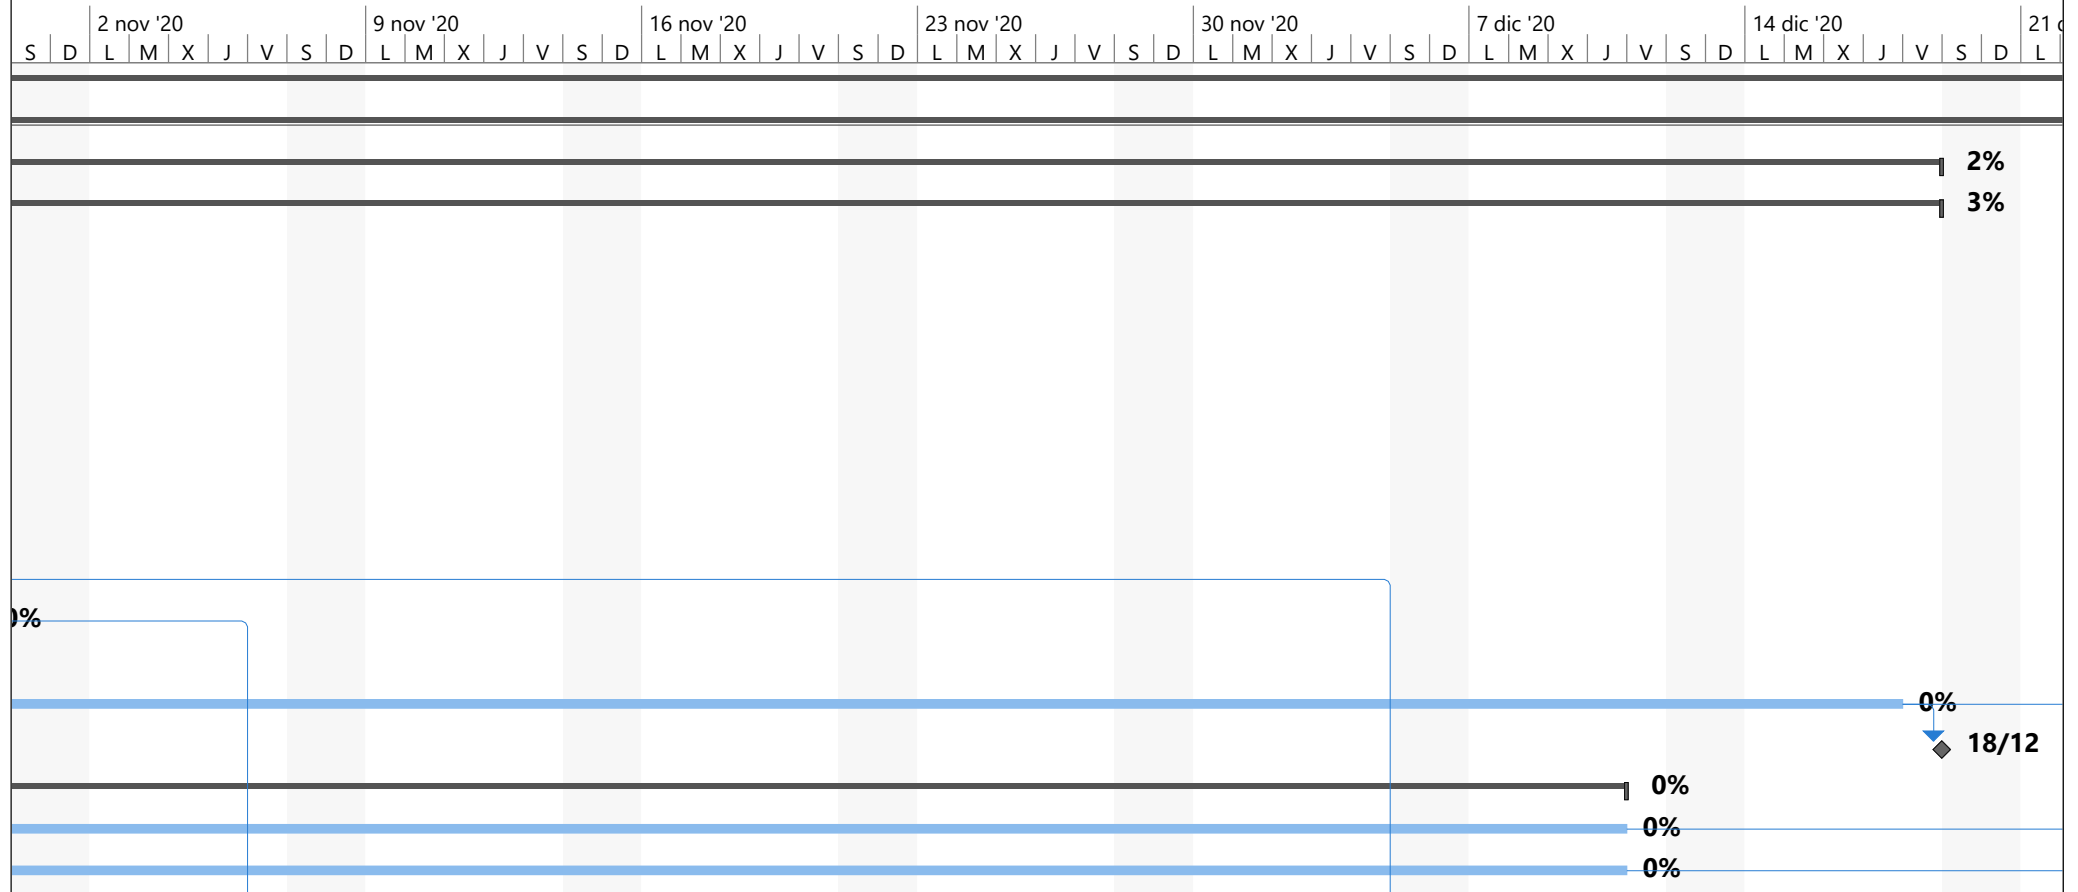

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

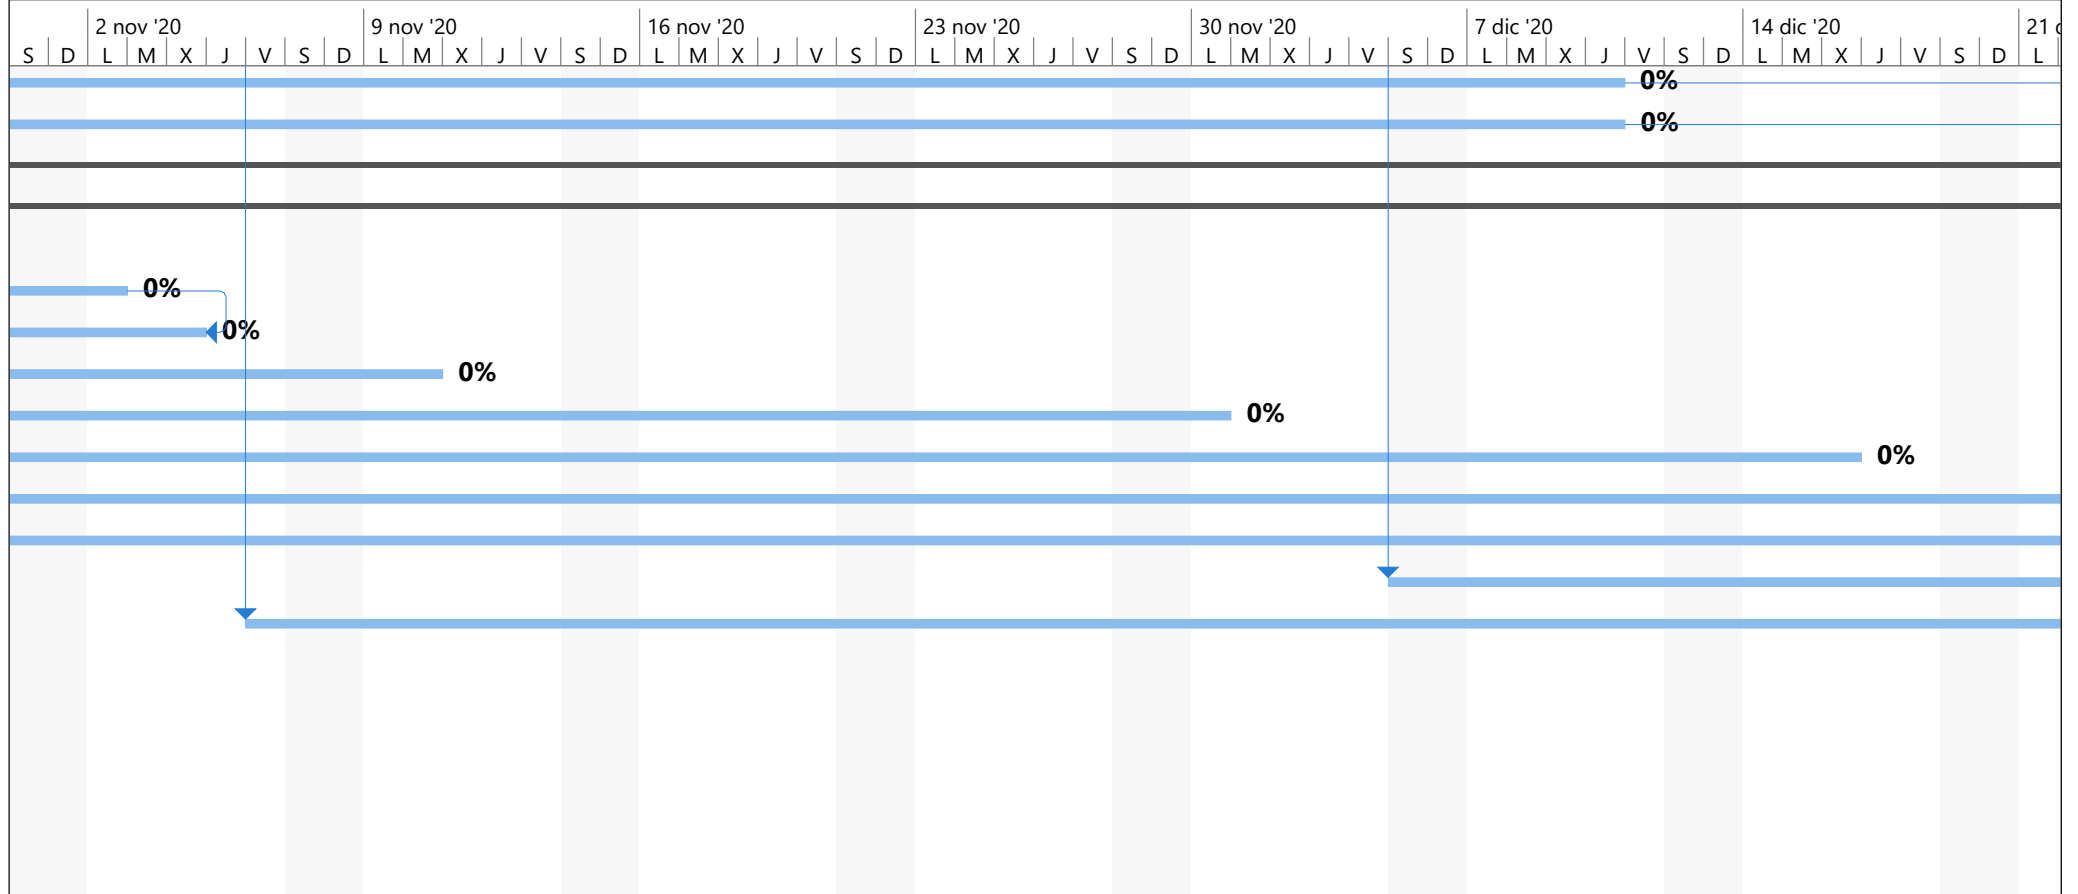

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

		2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20							30 nov '20							7 dic '20							14 dic '20							21 dic '20
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

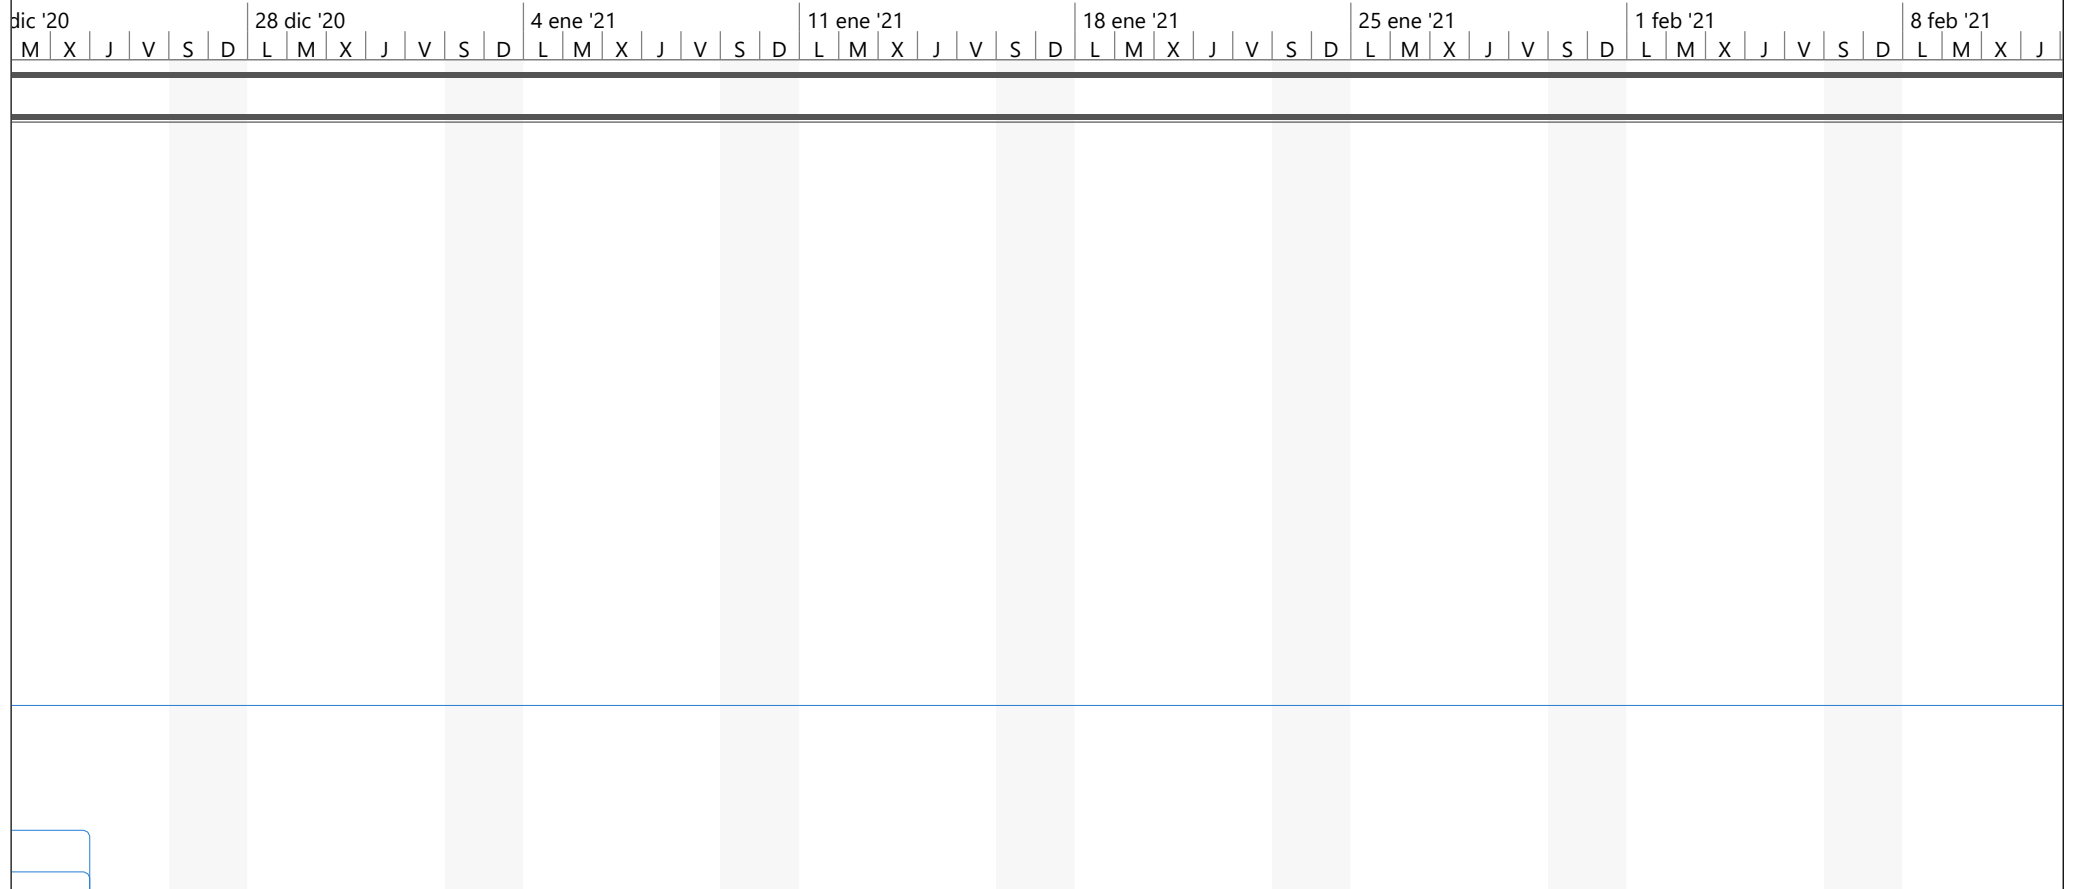

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

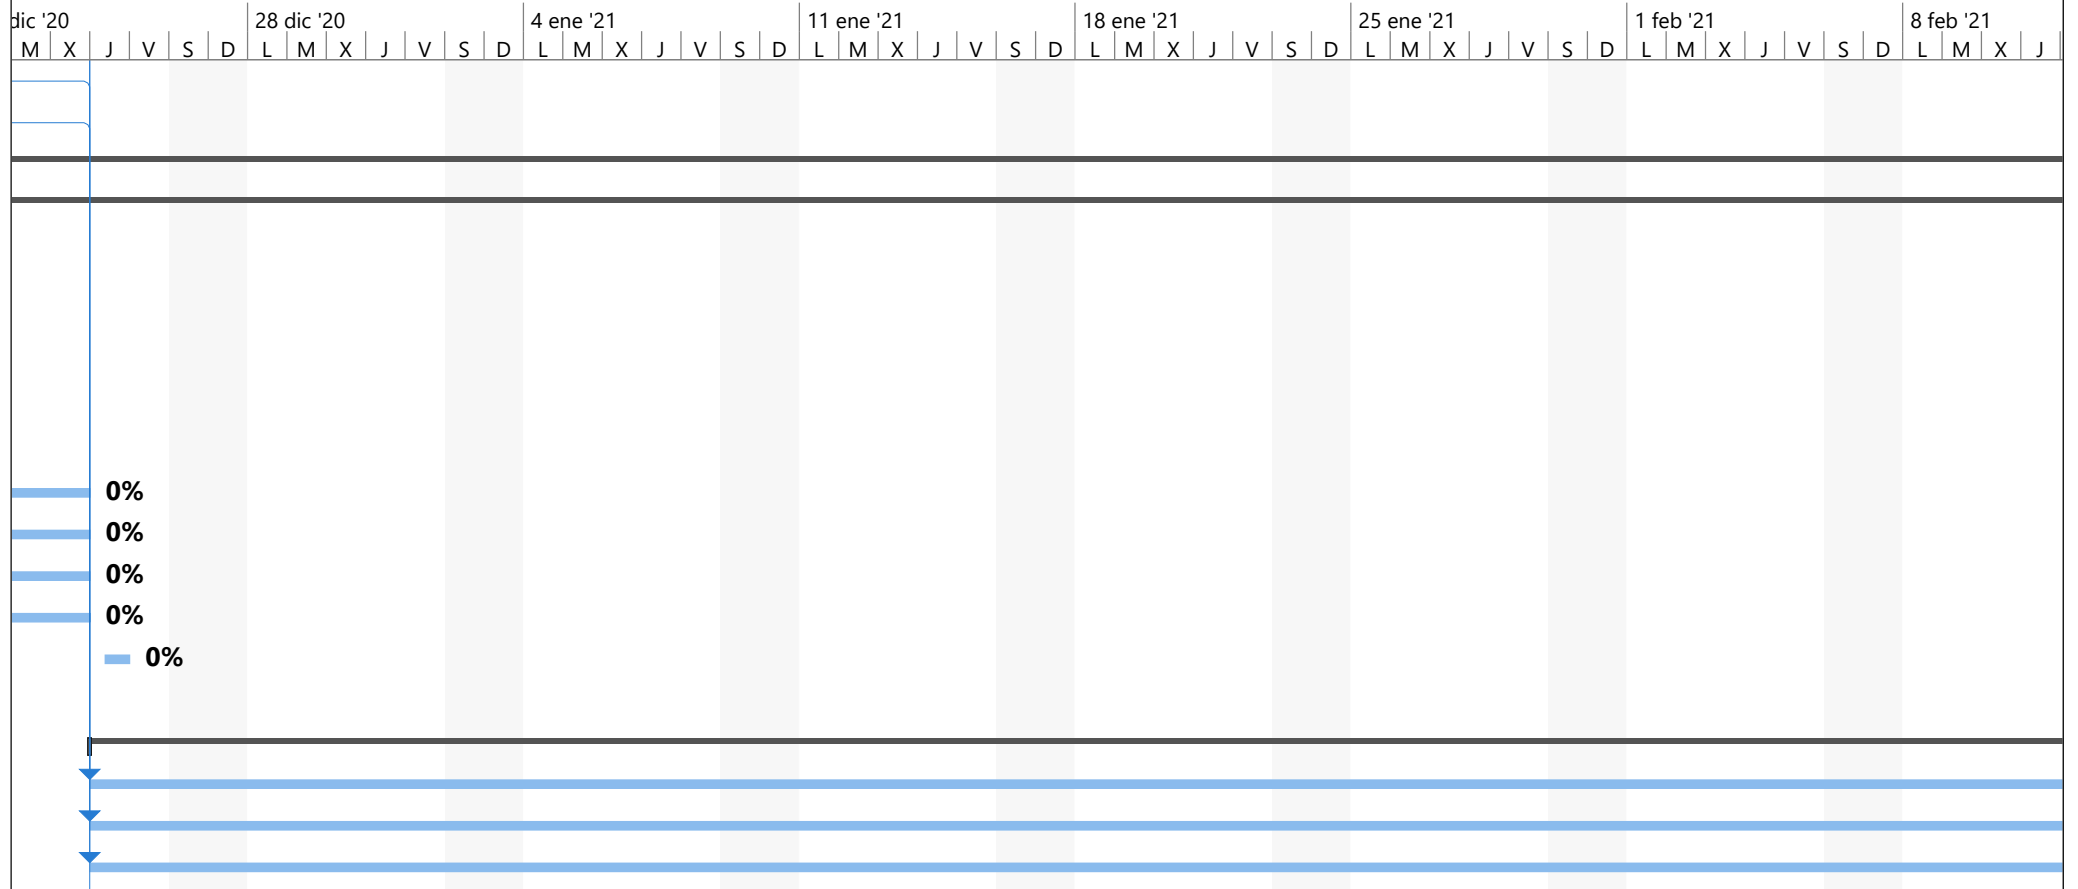


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020


dic '20 28 dic '20 4 ene '21 11 ene '21 18 ene '21 25 ene '21 1 feb '21 8 feb '21

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

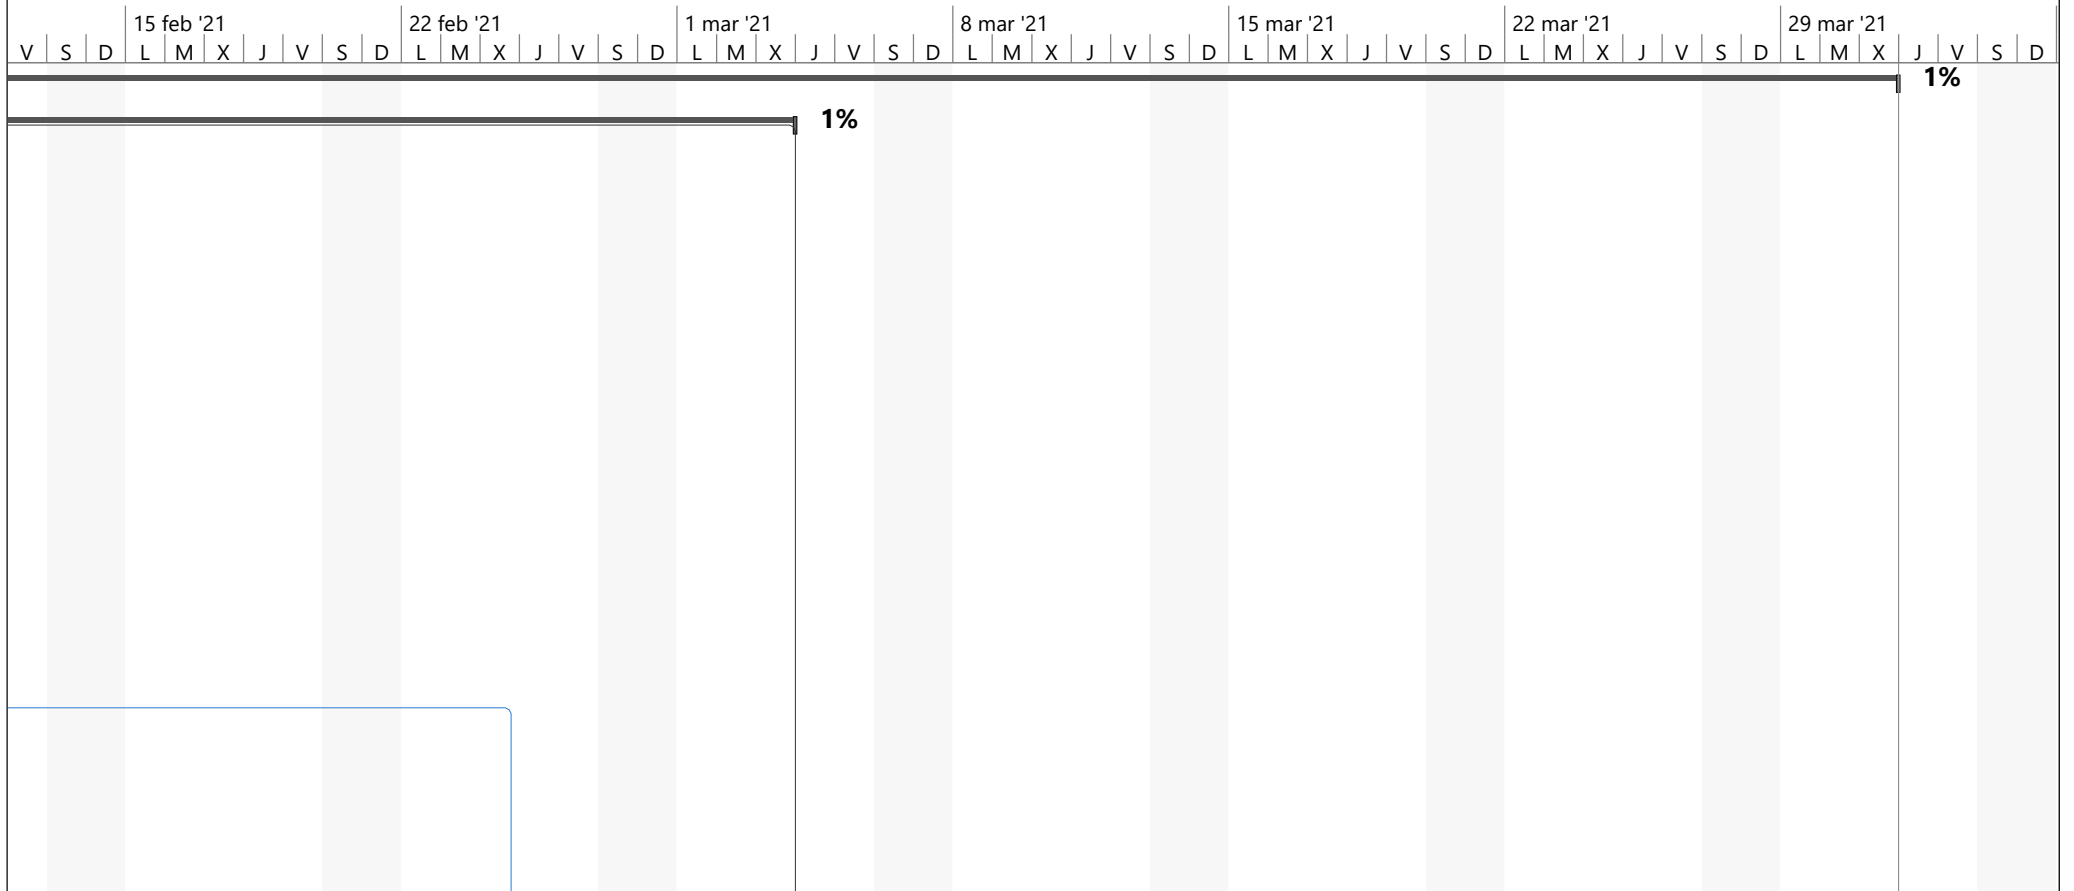


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020

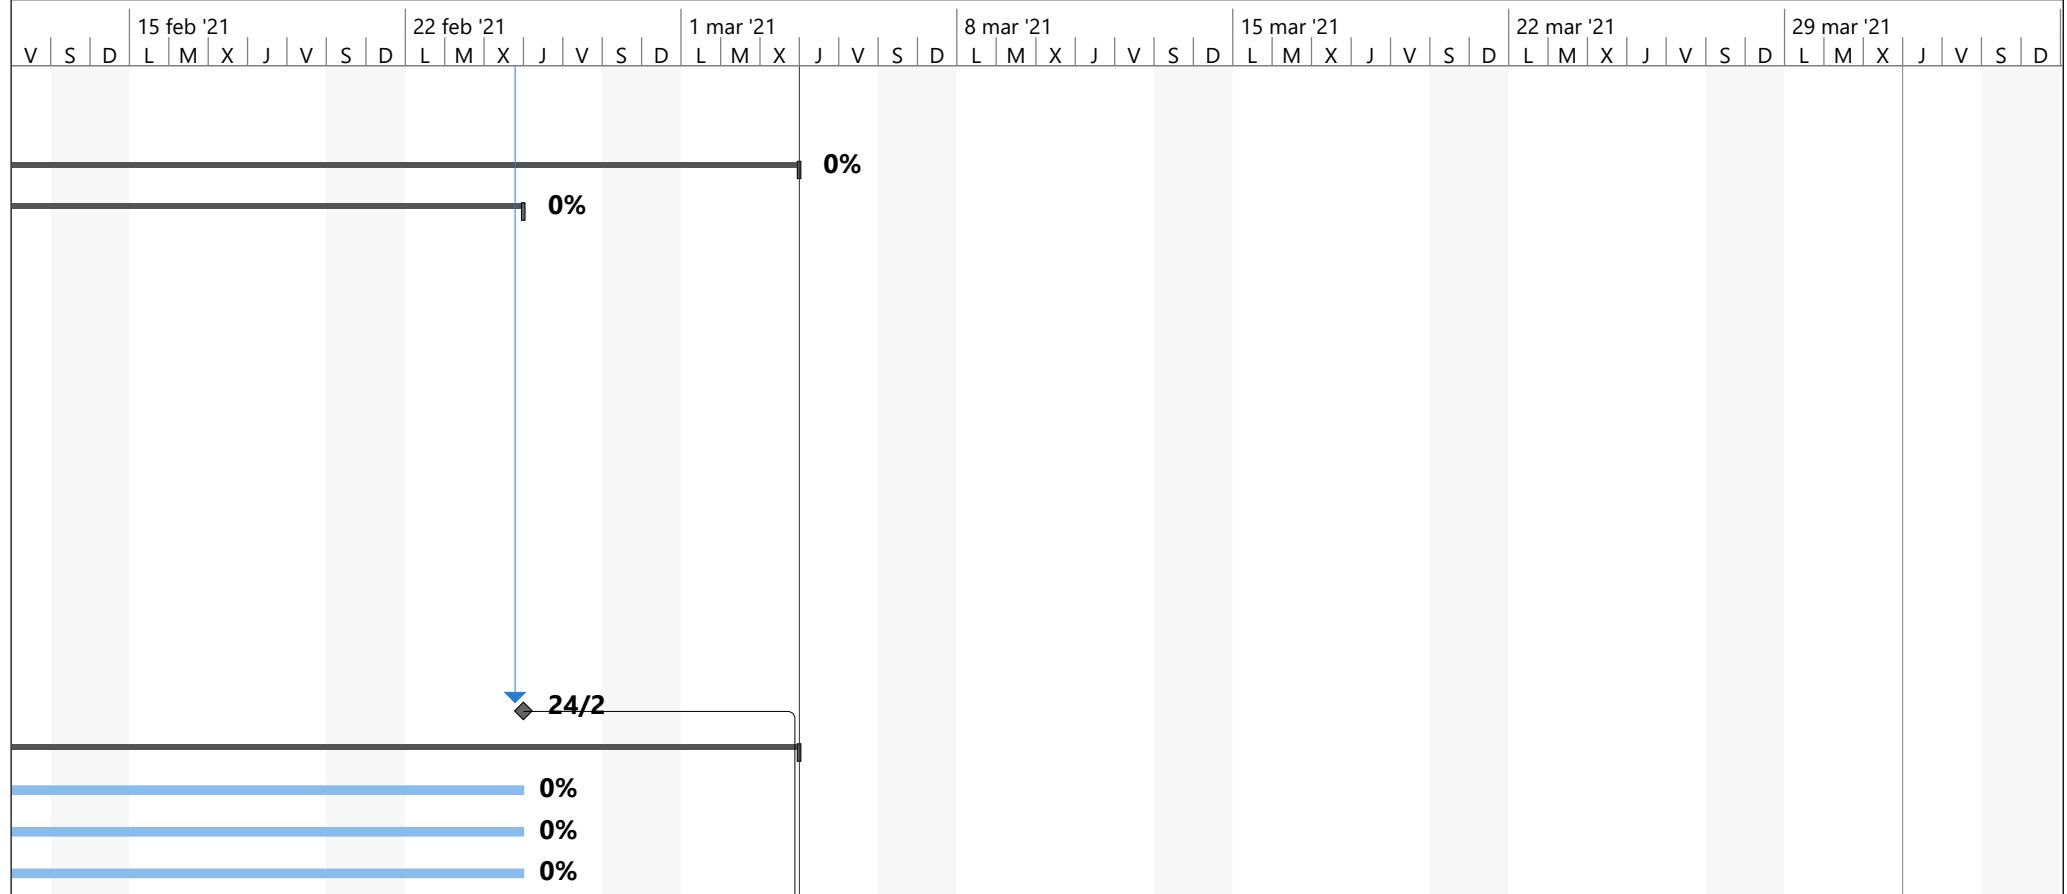

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución SABY102 Ago2020



Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
























Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
