























































































































Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18					
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	
1			Rehabilitación de Redes GALL103	285.13 días	jue 15/11/18																				
2			Adjudicación	0 días	jue 20/9/18																				
3			Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18																				
28			Ejecución	245 días	jue 13/12/18																				
29			Polígono 1	117 días	jue 13/12/18																				
30			Instalación	116 días	jue 13/12/18																				
31			Izado de postes	7 días	jue 13/12/18																				
32			Cimentaciones	20 días	vie 14/12/18																				
33			Retenidas	8 días	jue 7/3/19																				
34			Armados de Media y Baja Tensión	14 días	jue 7/3/19																				
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	7 días	mié 13/3/19																				
36			Elementos de Protección y Maniobra	12 días	mar 9/4/19																				
37			Conexiones y Jumpers	19 días	lun 15/4/19																				
38			Transformadores	15 días	jue 21/3/19																				
39			Alumbrado Publico	10 días	lun 25/3/19																				
40			Normalización Suministros	39 días	mié 27/3/19																				
41			Remoción	45 días	lun 25/3/19																				
42			Tendido de Conductor Media Tensión	16 días	lun 25/3/19																				
43			Tendido de Conductor Baja Tensión	7 días	vie 10/5/19																				
44			Armados de Media Tensión	2 días	jue 28/3/19																				










































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18					
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	
45			Armados de Baja Tensión	2 días	vie 17/5/19																				
46			Transformadores	8 días	mié 15/5/19																				
47			Izado de postes	2 días	jue 23/5/19																				
48			Cierre de Polígono 1	0 días	vie 24/5/19																				
49			Polígono 2	141 días	lun 24/12/18																				
50			Instalación	141 días	lun 24/12/18																				
51			Izado de postes	4 días	lun 24/12/18																				
52			Cimentaciones	12 días	vie 11/1/19																				
53			Retenidas	6 días	mar 19/3/19																				
54			Armados de Media y Baja Tensión	19 días	jue 25/4/19																				
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	14.88 días	mié 1/5/19																				
56			Elementos de Protección y Maniobra	7 días	jue 6/6/19																				
57			Conexiones y Jumpers	15 días	vie 24/5/19																				
58			Transformadores	7 días	vie 3/5/19																				
59			Alumbrado Publico	15 días	jue 16/5/19																				
60			Normalización Suministros	35 días	mar 21/5/19																				
61			Remoción	32.88 días	jue 16/5/19																				
62			Tendido de Conductor Media Tensión	22 días	jue 16/5/19																				
63			Tendido de Conductor Baja Tensión	18 días	vie 31/5/19																				
64			Armados de Media Tensión	3 días	mar 4/6/19																				
































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18					
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	
65			Armados de Baja Tensión	2 días	vie 14/6/19																				
66			Transformadores	16.88 días	vie 7/6/19																				
67			Izado de postes	2 días	lun 17/6/19																				
68			Cierre de Polígono 2	0 días	mar 18/6/19																				
69			Polígono 3	179 días	vie 28/12/18																				
70			Instalación	175 días	vie 28/12/18																				
71			Izado de postes	25 días	vie 28/12/18																				
72			Cimentaciones	20 días	mar 29/1/19																				
73			Retenidas	8 días	mié 27/3/19																				
74			Armados de Media y Baja Tensión	16 días	vie 24/5/19																				
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	20 días	vie 31/5/19																				
76			Elementos de Protección y Maniobra	21 días	lun 1/7/19																				
77			Conexiones y Jumpers	12 días	mar 30/7/19																				
78			Transformadores	49 días	vie 14/6/19																				
79			Alumbrado Publico	0 días	lun 3/6/19																				
80			Normalización Suministros	36 días	mar 9/7/19																				
81			Remoción	67 días	mar 4/6/19																				
82			Tendido de Conductor Media Tensión	20 días	mar 4/6/19																				
83			Tendido de Conductor Baja Tensión	4 días	jue 29/8/19																				
84			Armados de Media Tensión	1 día	mar 11/6/19																				









Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18					
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	
85			Armados de Baja Tensión	1 día	lun 2/9/19																				
86			Transformadores	3 días	lun 2/9/19																				
87			Izado de postes	1 día	mié 4/9/19																				
88			Cierre de Polígono 3	0 días	mié 4/9/19																				
89			Polígono 4	209 días	vie 1/2/19																				
90			Instalación	197 días	vie 1/2/19																				
91			Izado de postes	28 días	vie 1/2/19																				
92			Cimentaciones	23 días	mar 26/2/19																				
93			Retenidas	7 días	lun 8/4/19																				
94			Armados de Media y Baja Tensión	25 días	vie 28/6/19																				
95			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	50 días	mar 2/7/19																				
96			Elementos de Protección y Maniobra	23 días	mar 10/9/19																				
97			Conexiones y Jumpers	13 días	jue 15/8/19																				
98			Transformadores	34.88 días	vie 30/8/19																				
99			Alumbrado Publico	22 días	mié 4/9/19																				
100			Normalización Suministros	46 días	lun 2/9/19																				
101			Remoción	52 días	mar 10/9/19																				
102			Tendido de Conductor Media Tensión	32 días	mar 10/9/19																				
103			Tendido de Conductor Baja Tensión	6 días	mar 5/11/19																				
104			Armados de Media Tensión	2 días	jue 7/11/19																				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18													
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J									
105			Armados de Baja Tensión	2 días	mié 13/11/19																												
106			Transformadores	4 días	mié 13/11/19																												
107			Izado de postes	2 días	mar 19/11/19																												
108			Cierre de Polígono 4	0 días	mié 20/11/19																												
109			Cierre de Obras	20 días	jue 21/11/19																												
110			Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualiza	1 ms	jue 21/11/19																												
111			Presentación de Cierre de Obras	0 días	mié 18/12/19																												


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

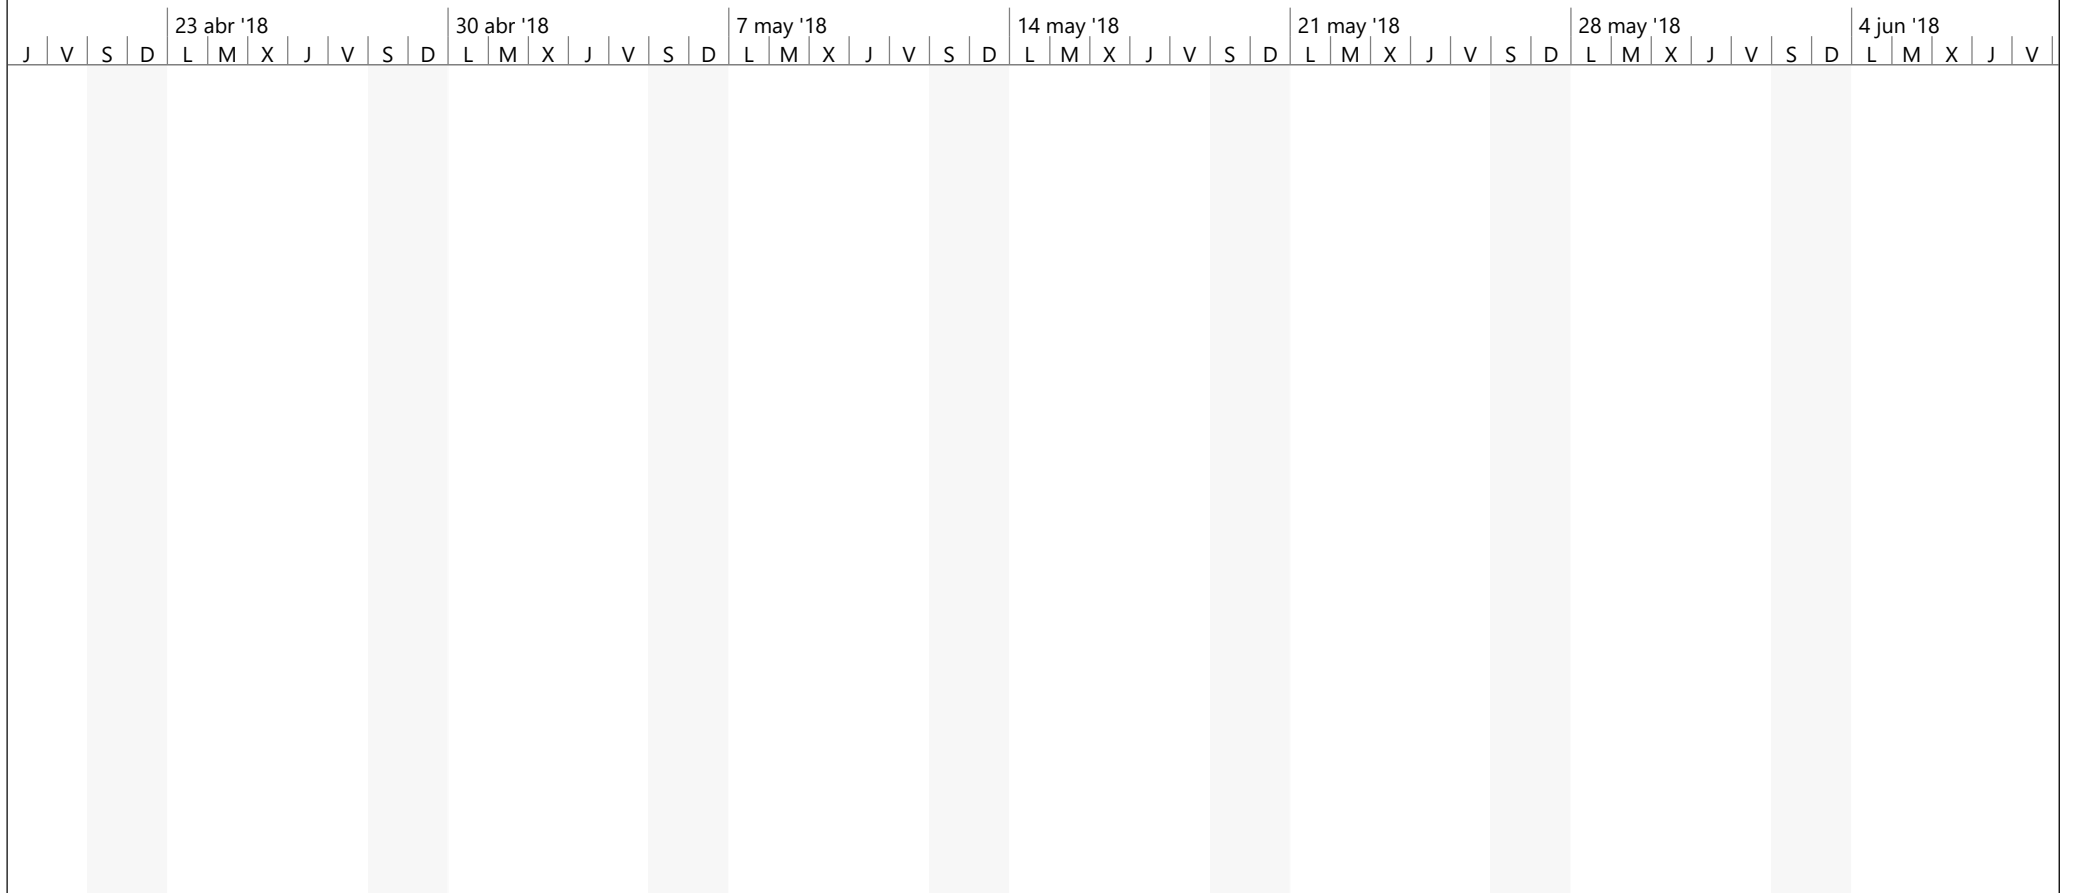


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

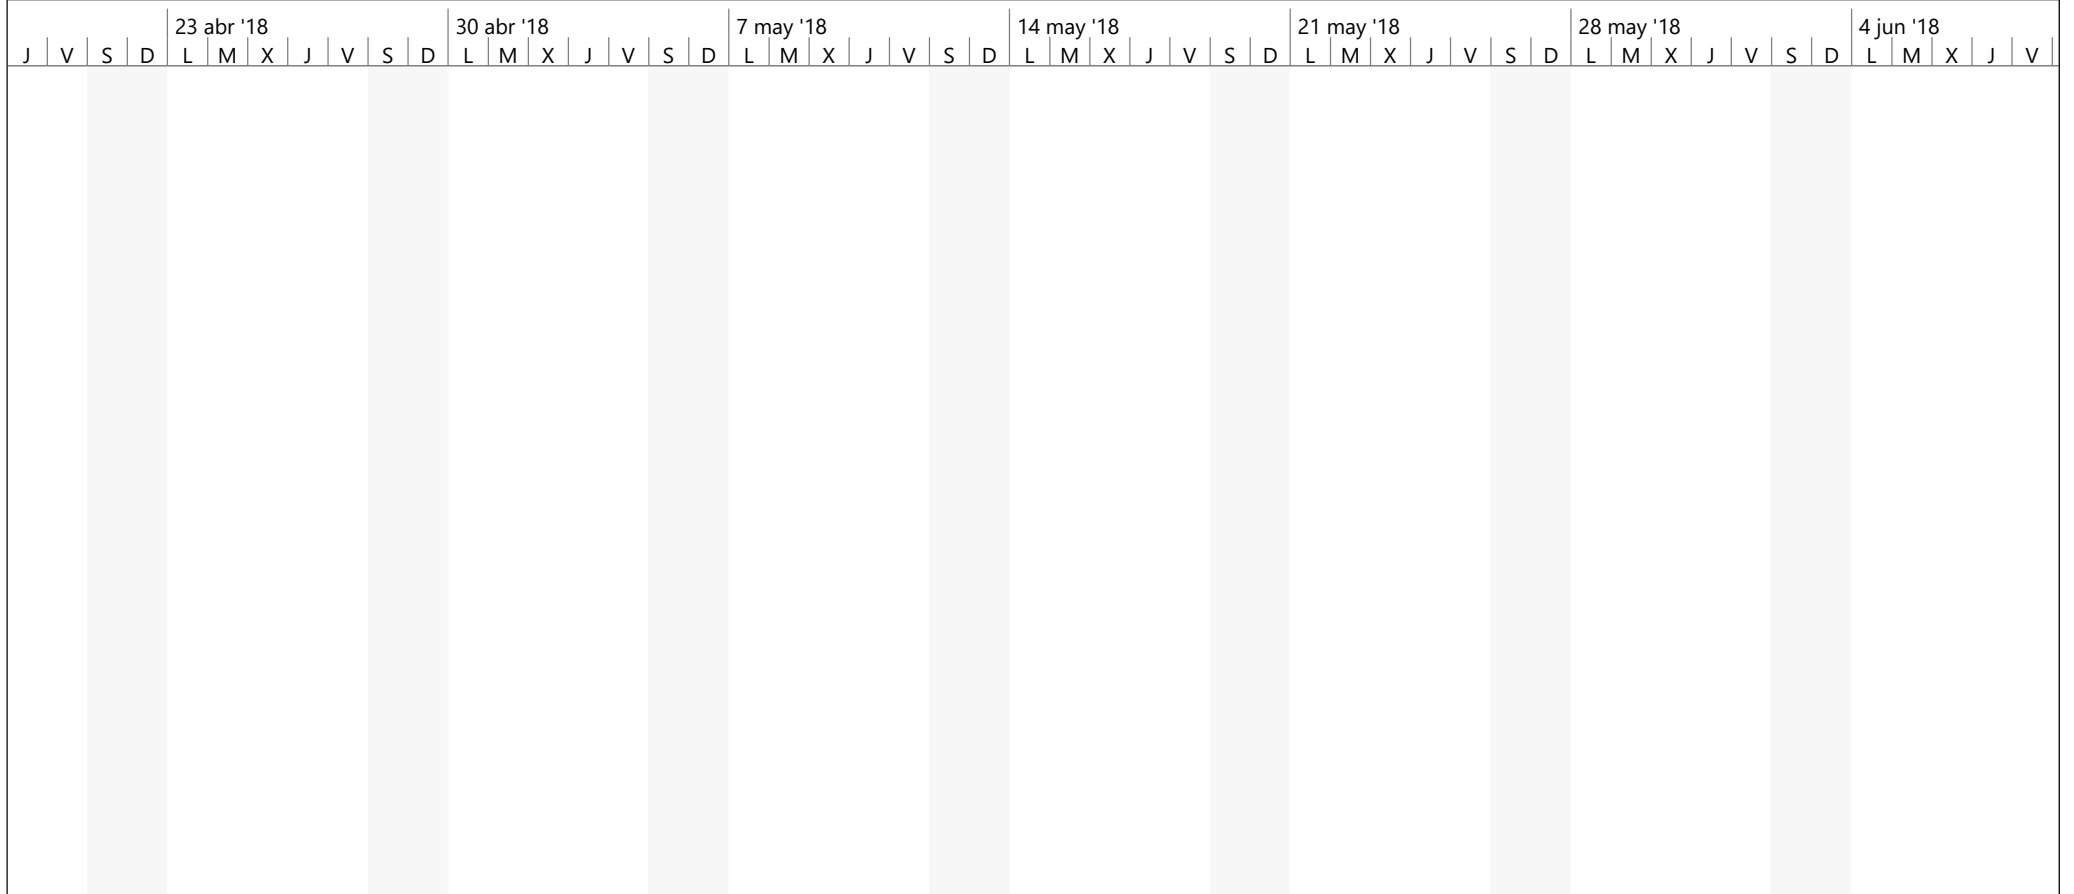

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

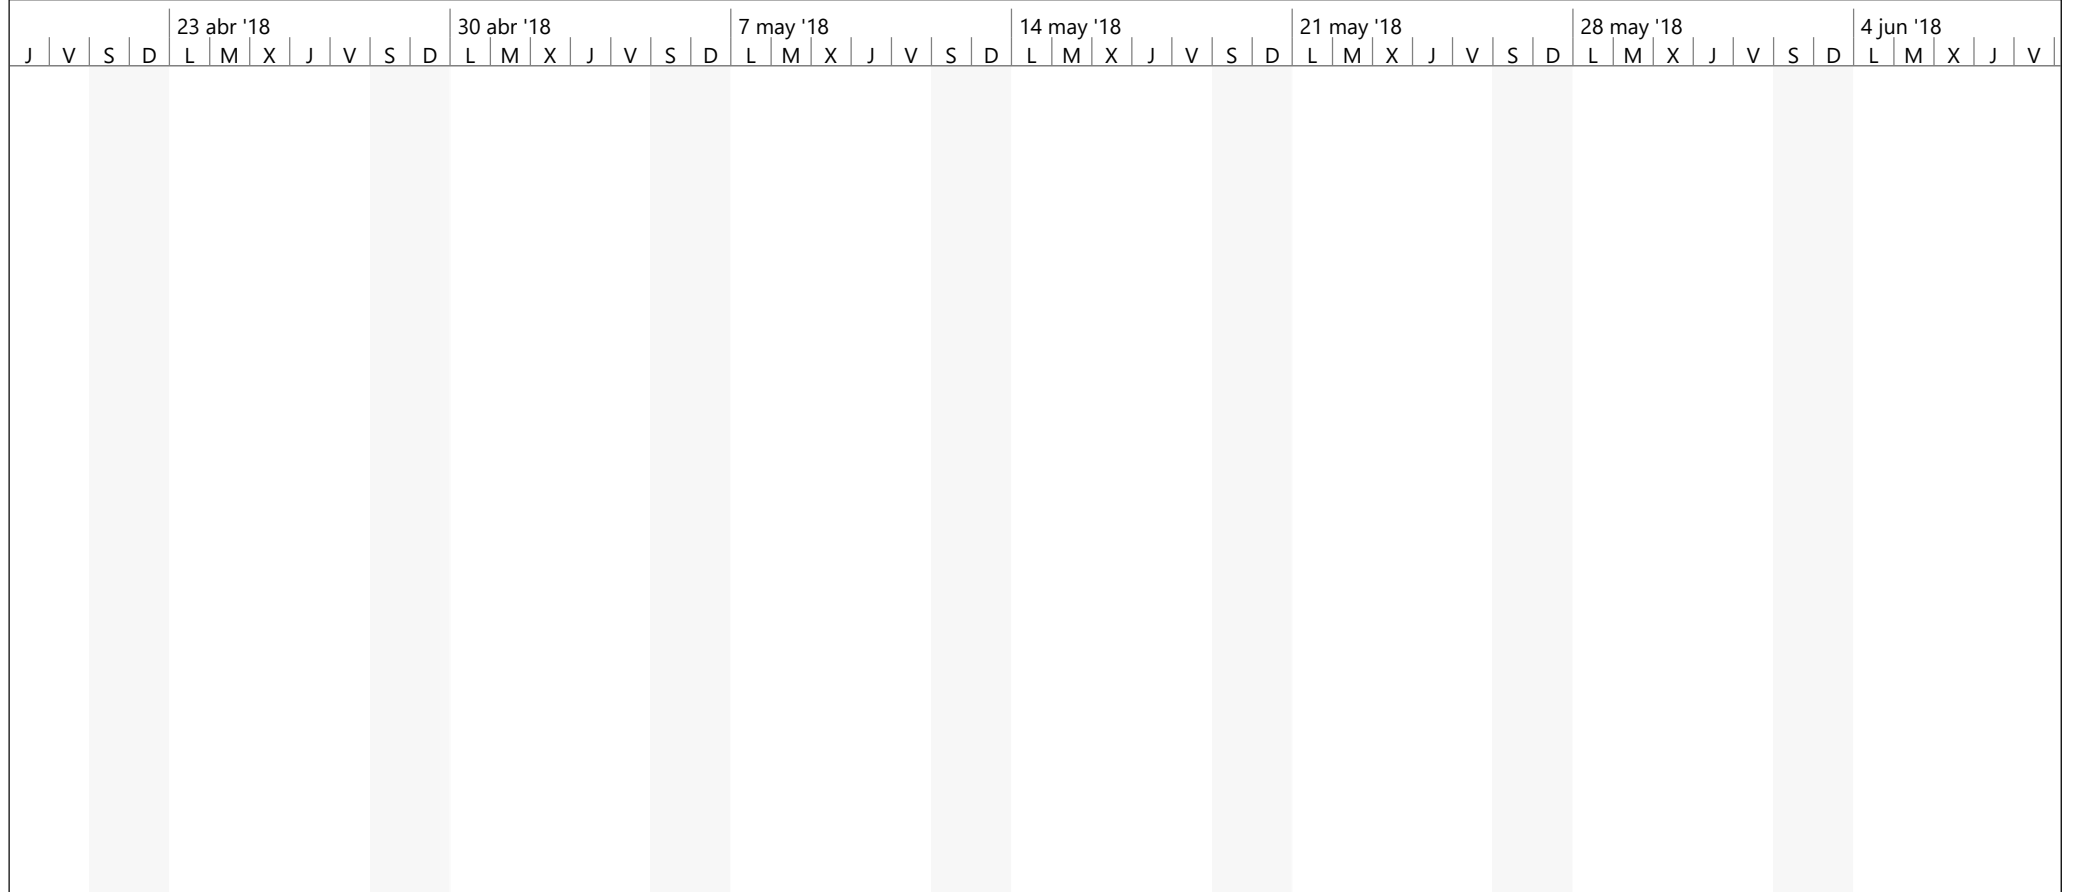

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

























				23 abr '18				30 abr '18				7 may '18				14 may '18				21 may '18				28 may '18				4 jun '18			
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

30 jul '18 6 ago '18 13 ago '18 20 ago '18 27 ago '18 3 sep '18 10 sep '18 17 sep '18

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

18					24 sep '18					1 oct '18					8 oct '18					15 oct '18					22 oct '18					29 oct '18					5 nov '18								
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J							
◆ 20/9																																											

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

18					24 sep '18					1 oct '18					8 oct '18					15 oct '18					22 oct '18					29 oct '18					5 nov '18				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

18					24 sep '18					1 oct '18					8 oct '18					15 oct '18					22 oct '18					29 oct '18					5 nov '18				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

18					24 sep '18					1 oct '18					8 oct '18					15 oct '18					22 oct '18					29 oct '18					5 nov '18				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

18					24 sep '18					1 oct '18					8 oct '18					15 oct '18					22 oct '18					29 oct '18					5 nov '18			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

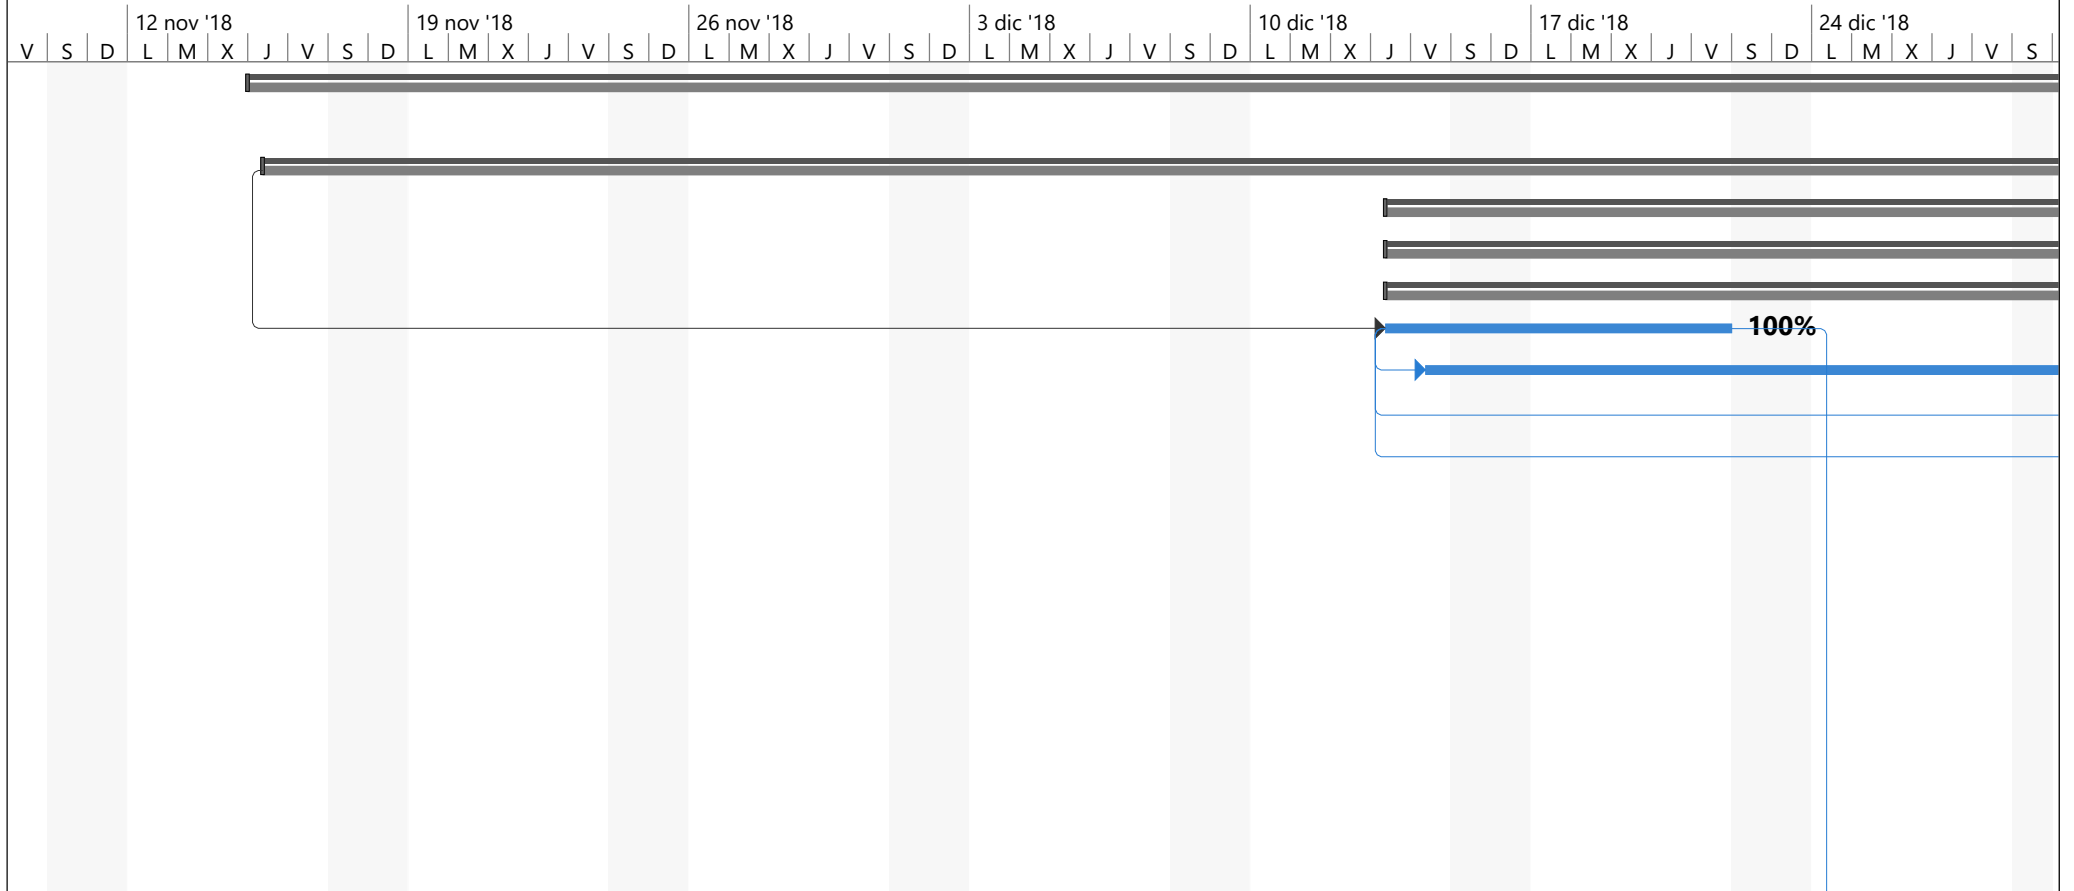


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

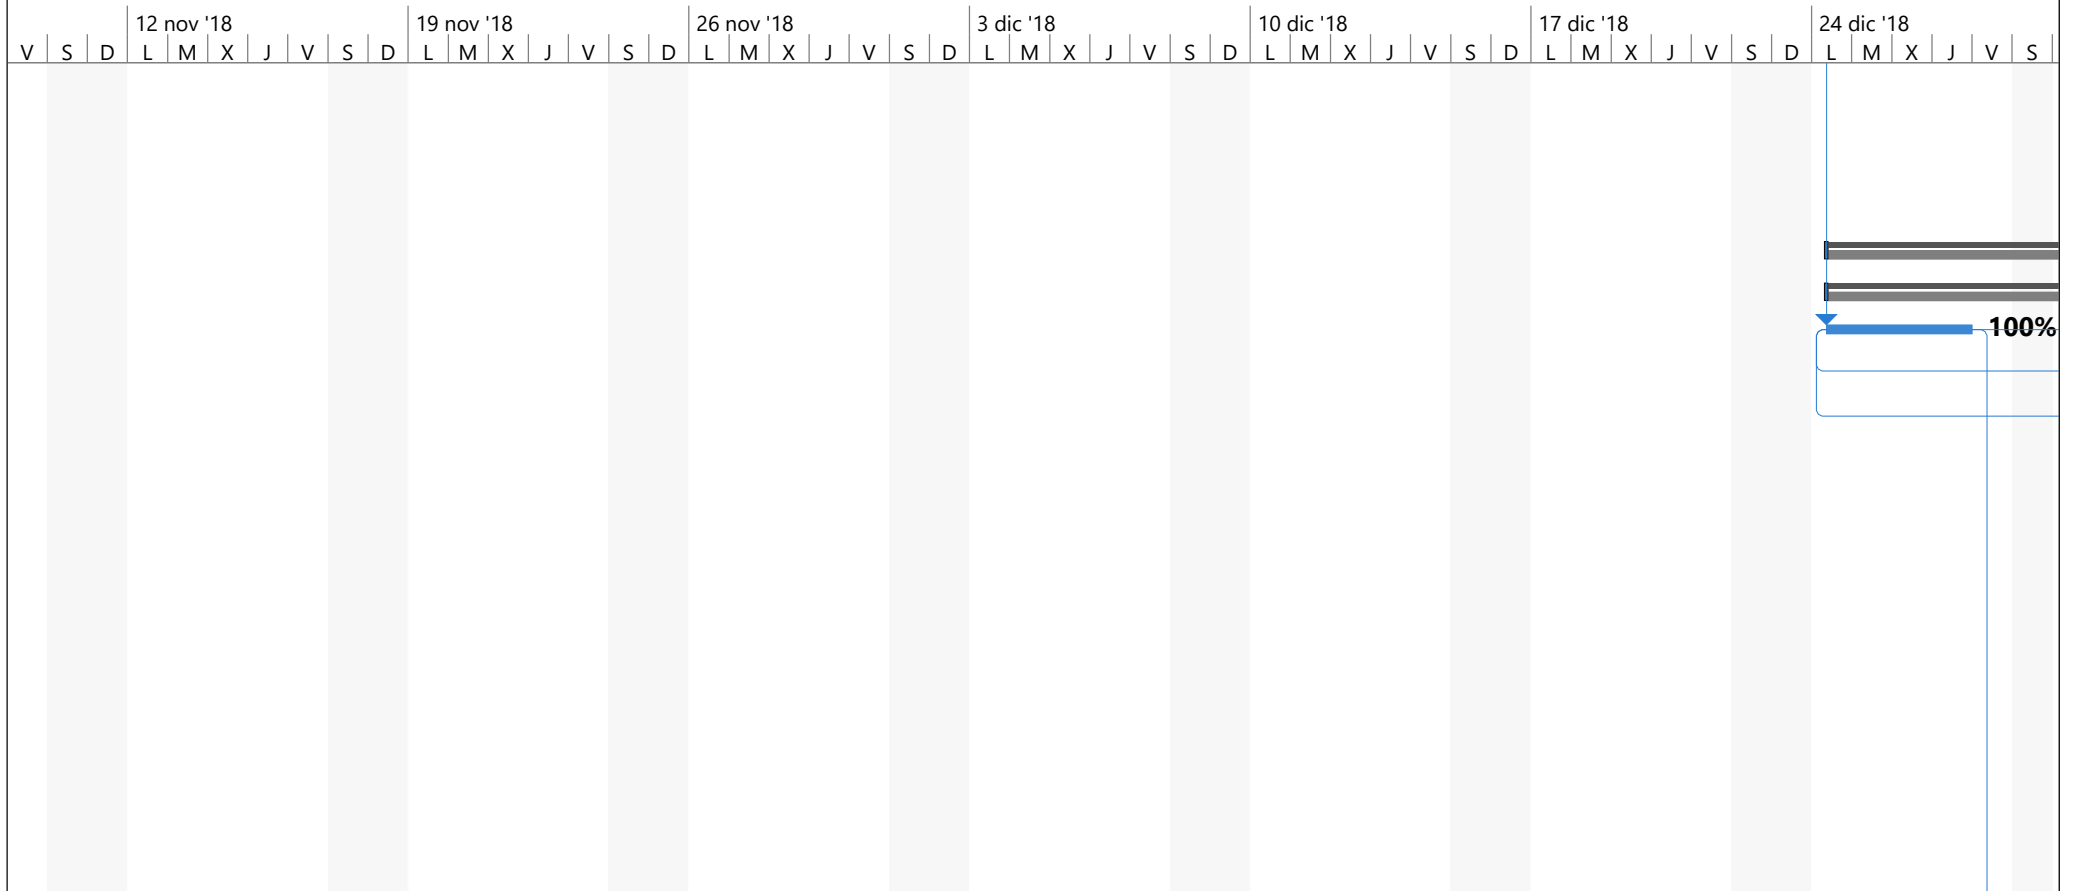

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

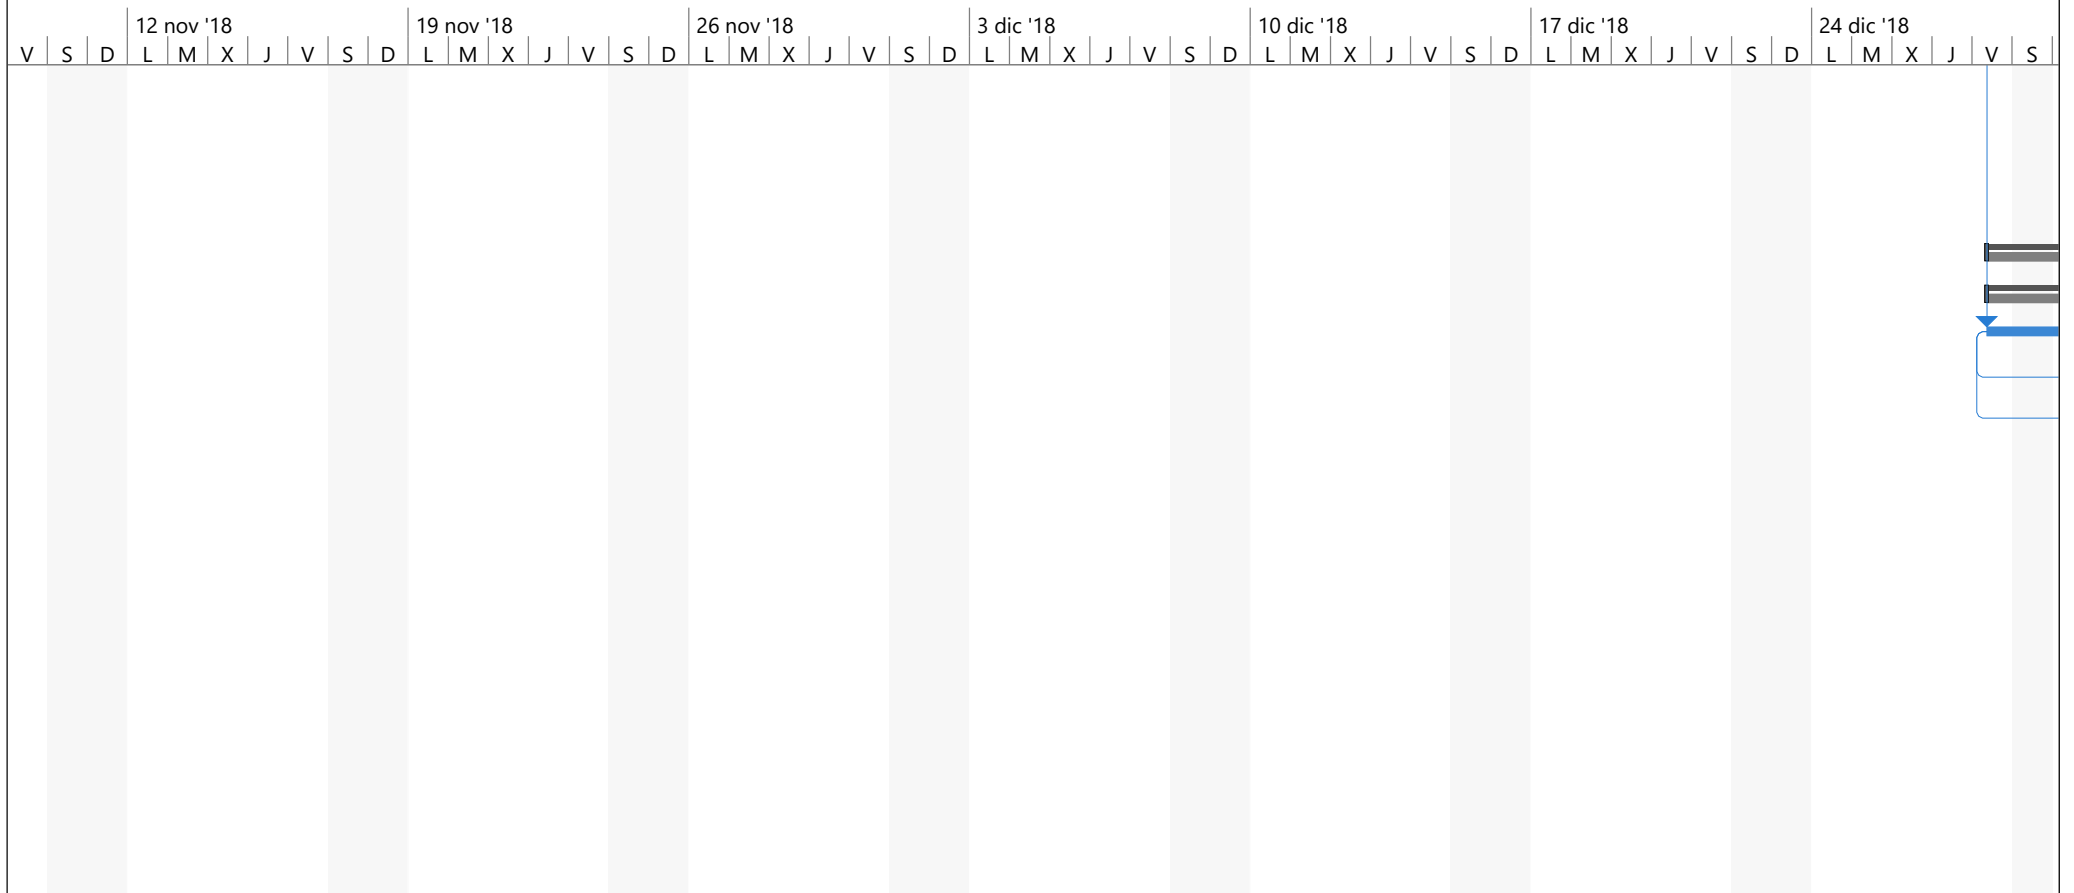

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

V	S	D	12 nov '18						S	D	19 nov '18						S	D	26 nov '18						S	D	3 dic '18						S	D	10 dic '18						S	D	17 dic '18						S	D	24 dic '18						S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

31 dic '18 7 ene '19 14 ene '19 21 ene '19 28 ene '19 4 feb '19 11 feb '19 18 fe

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

100%

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

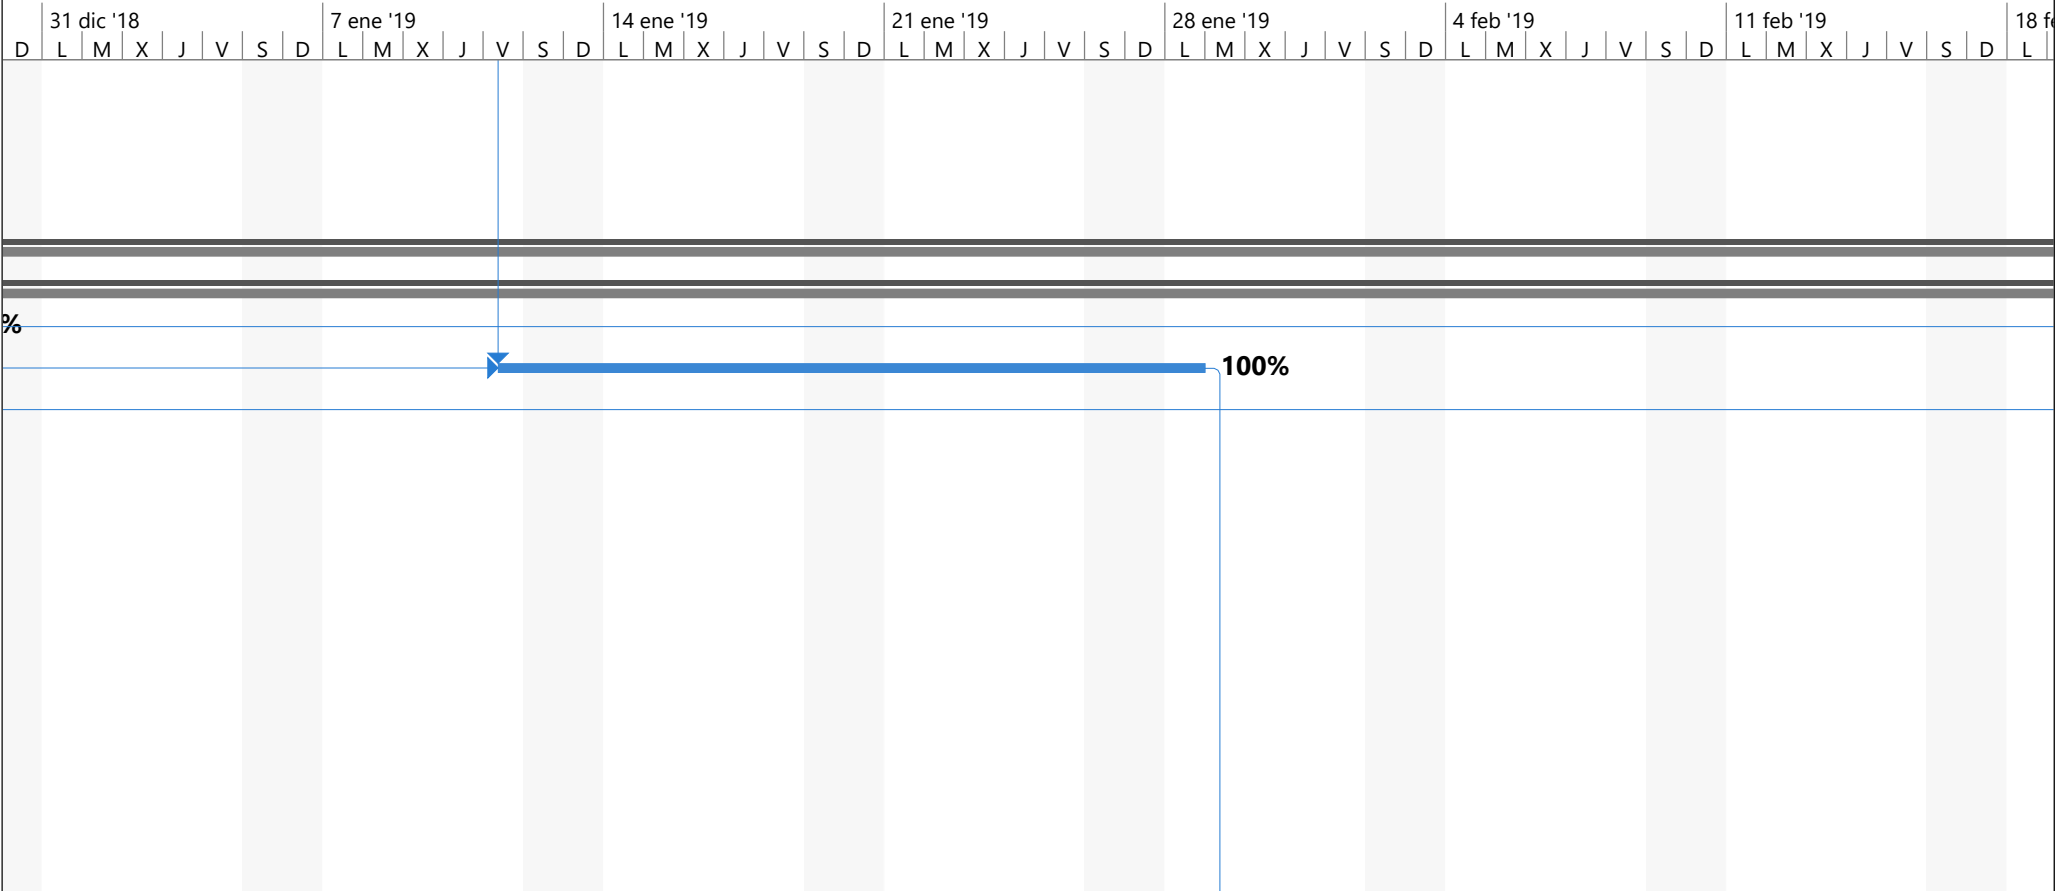


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

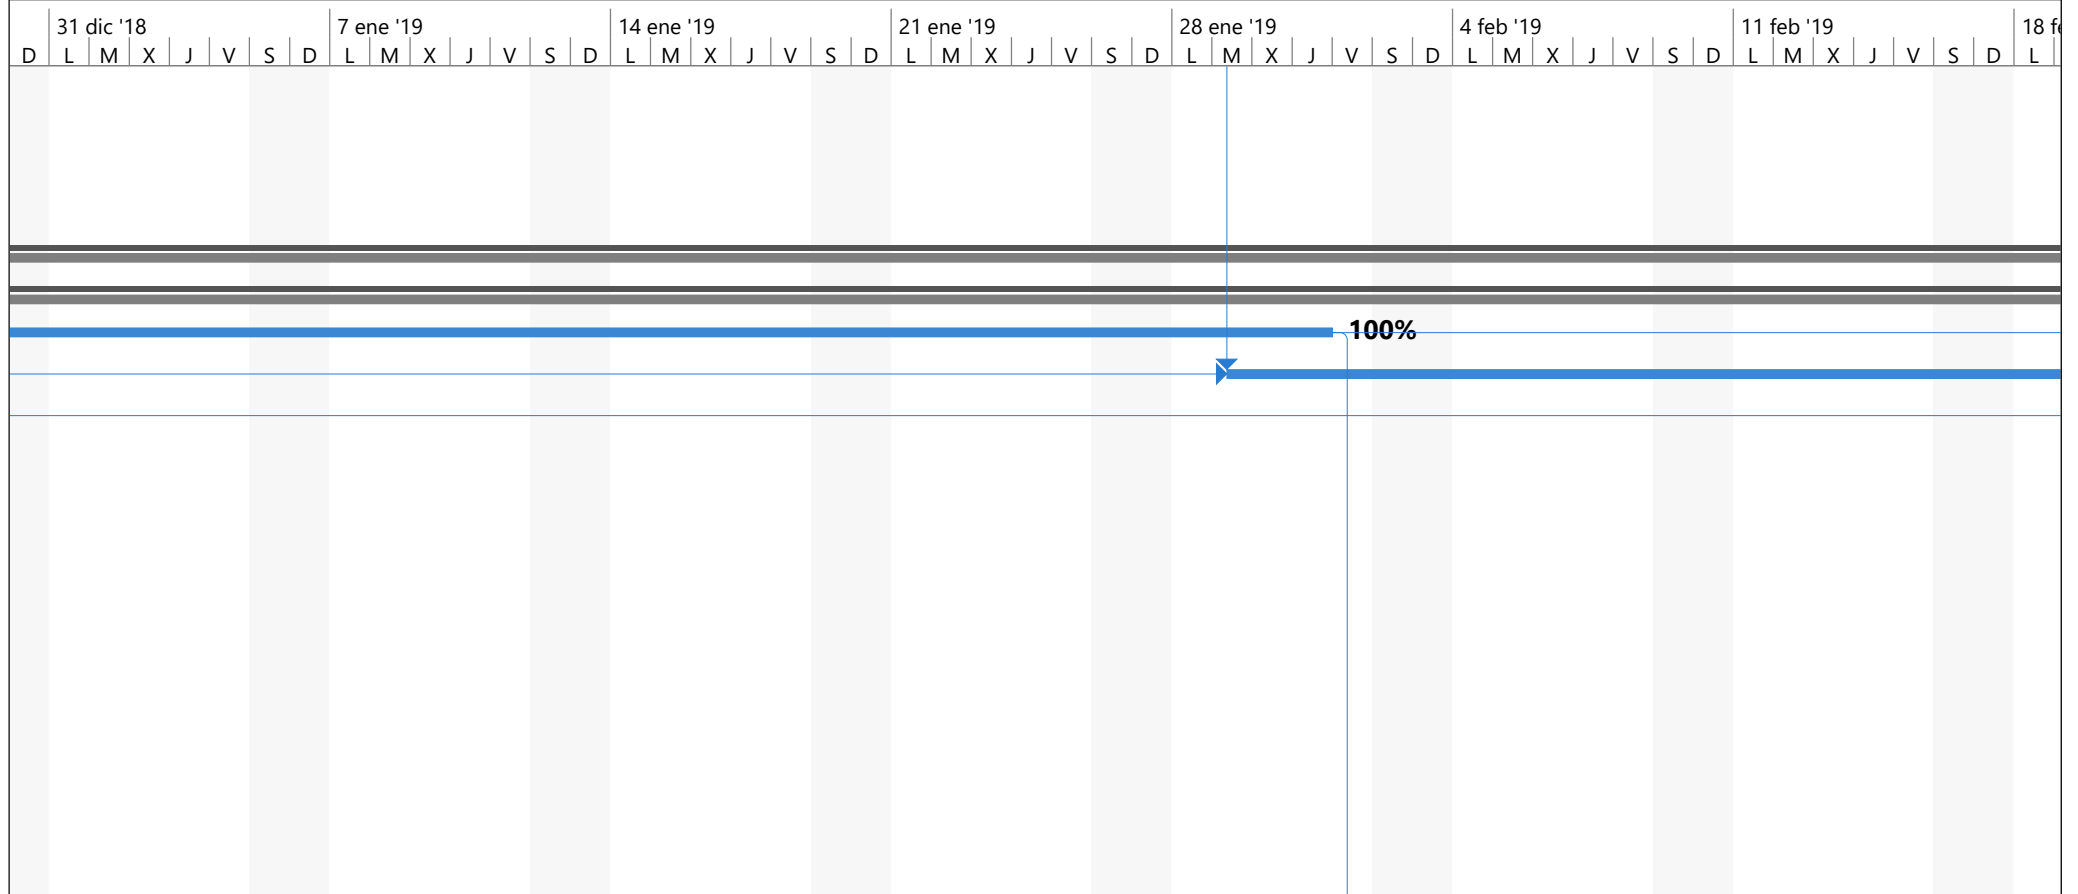

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



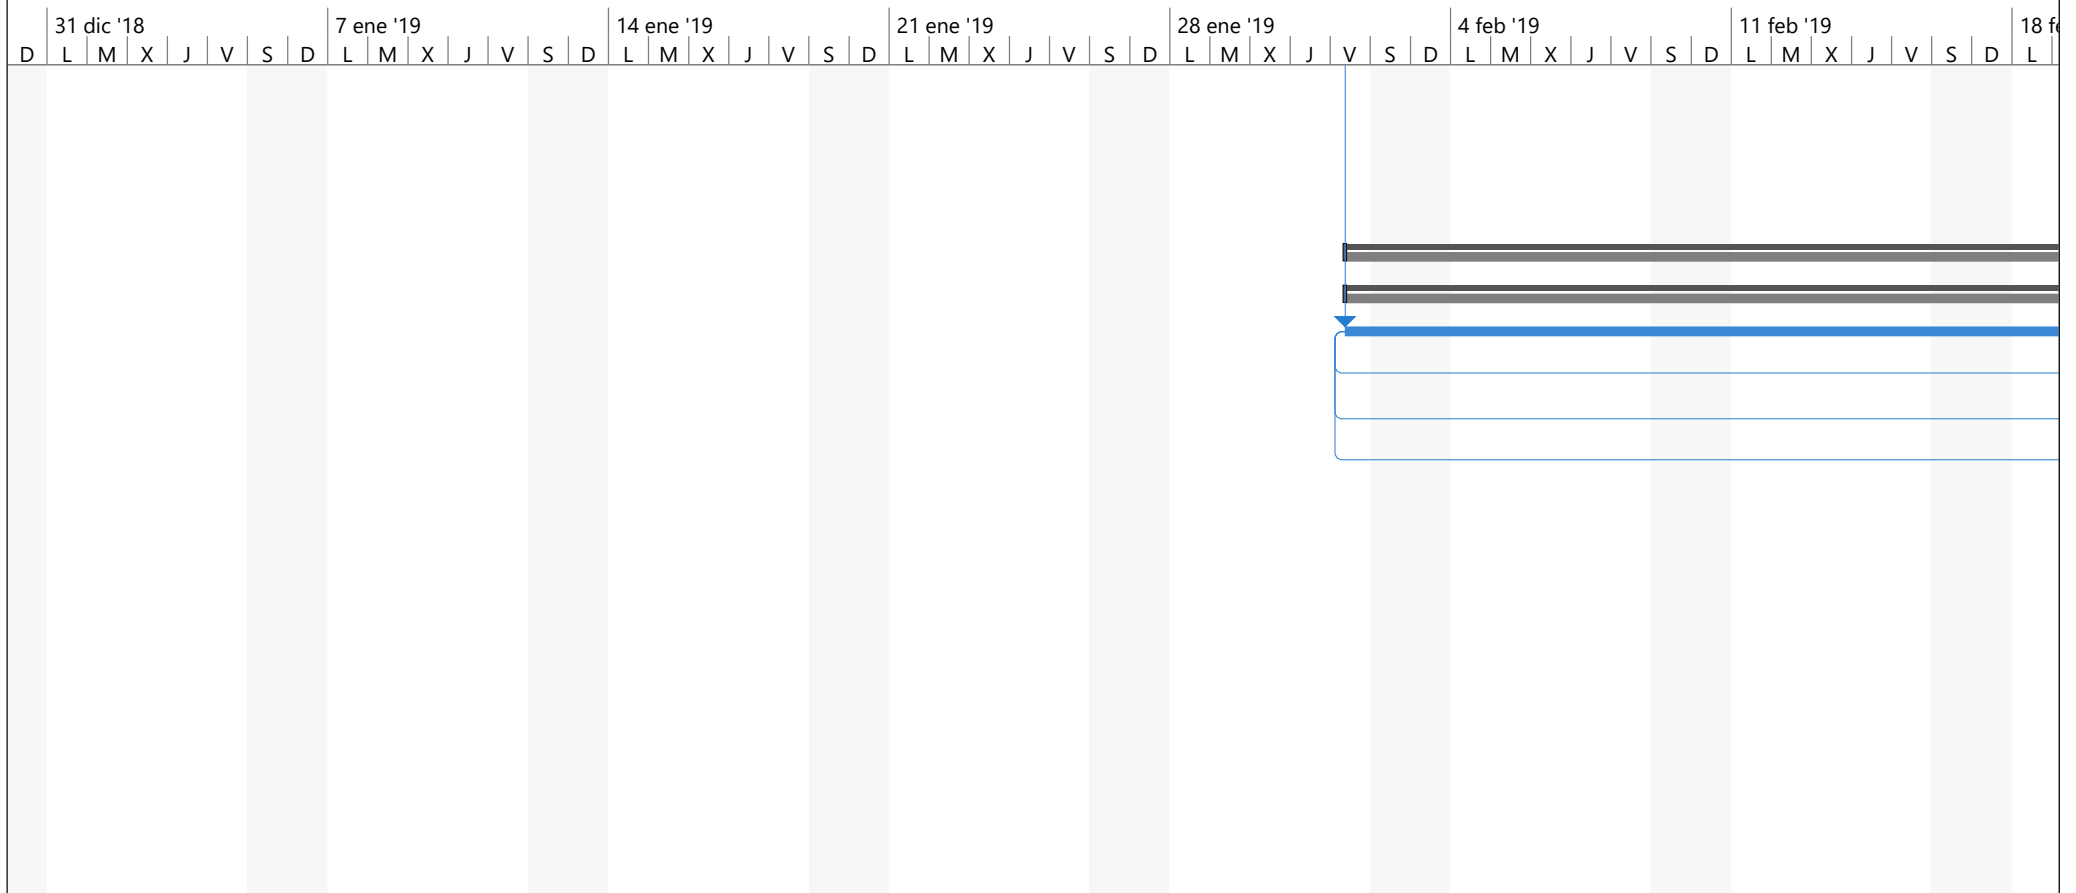





















Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

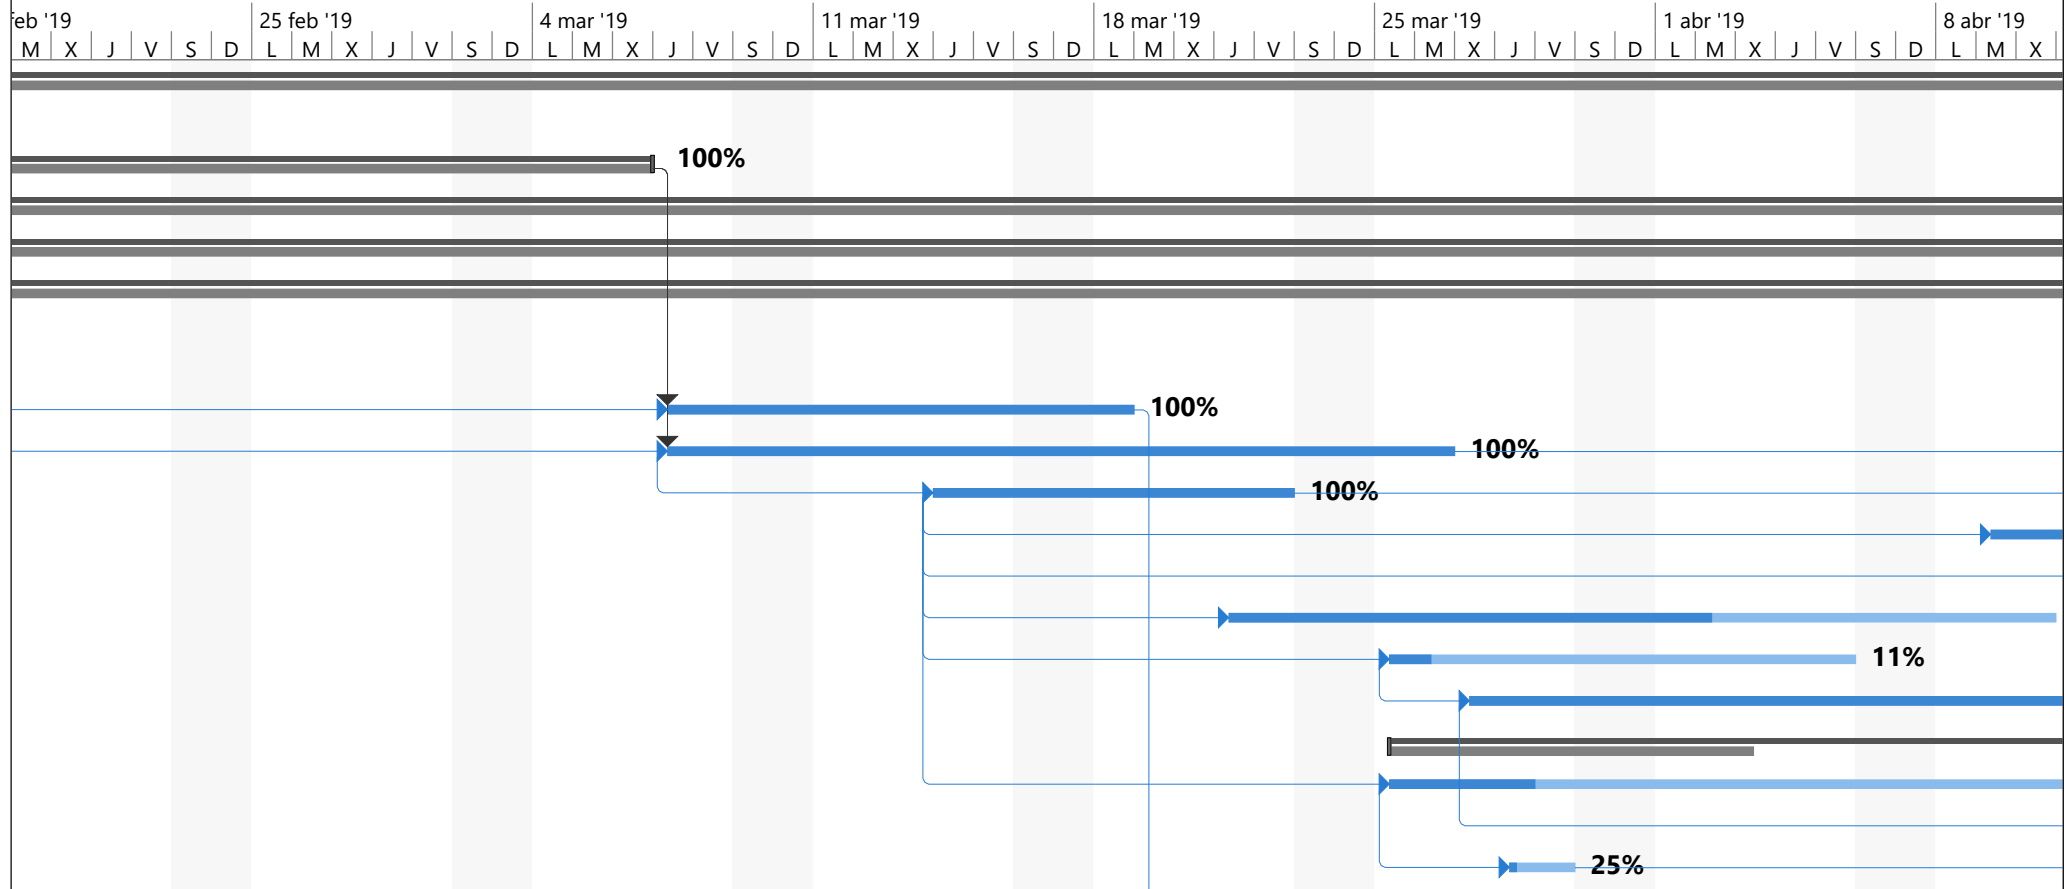


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



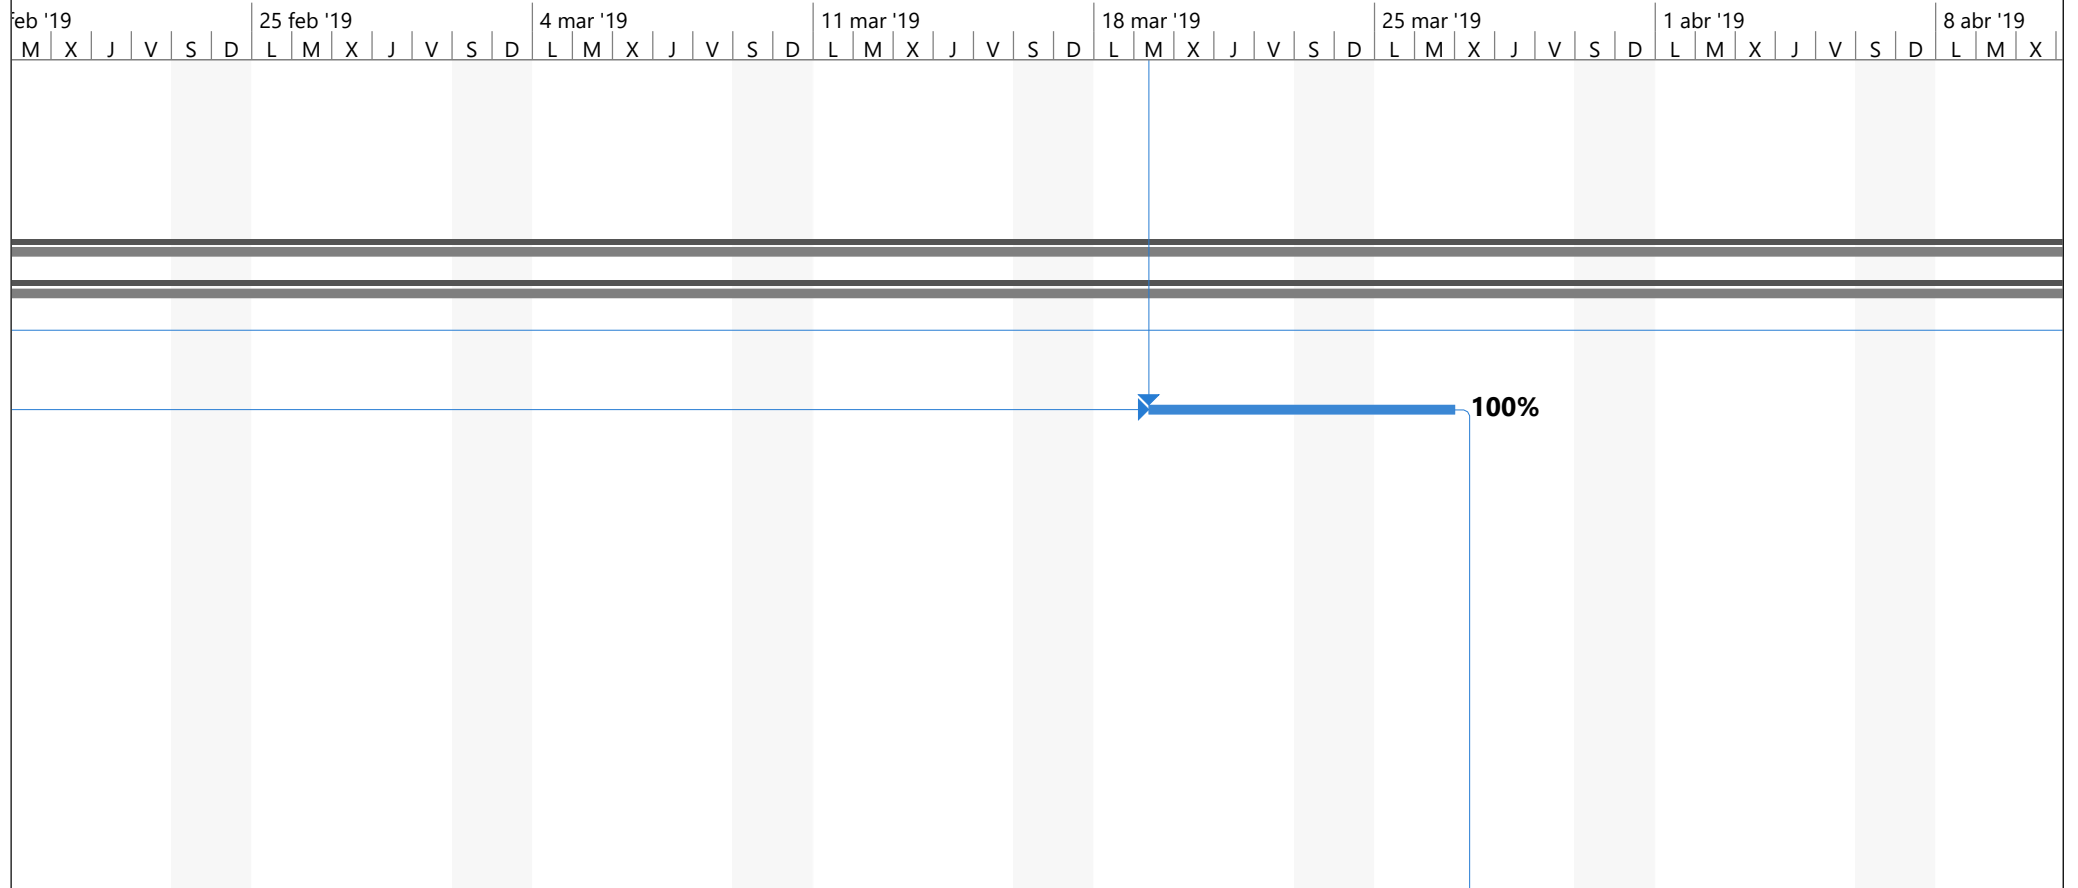





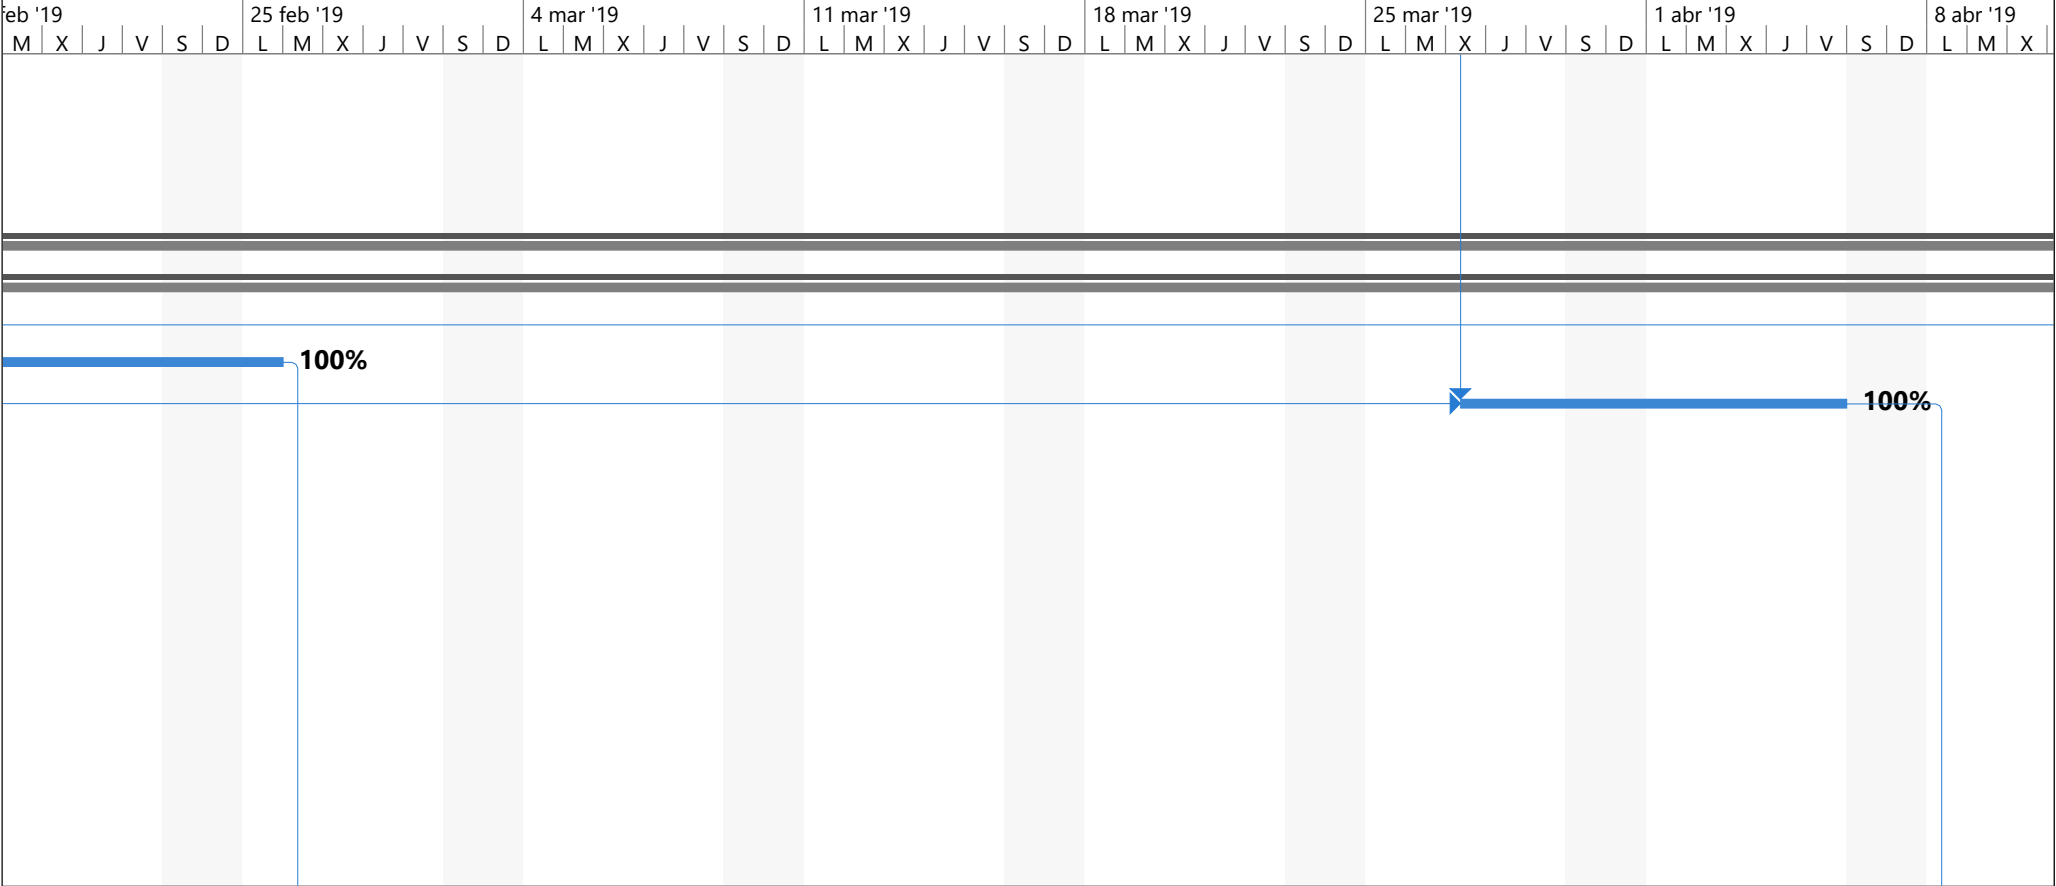















Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

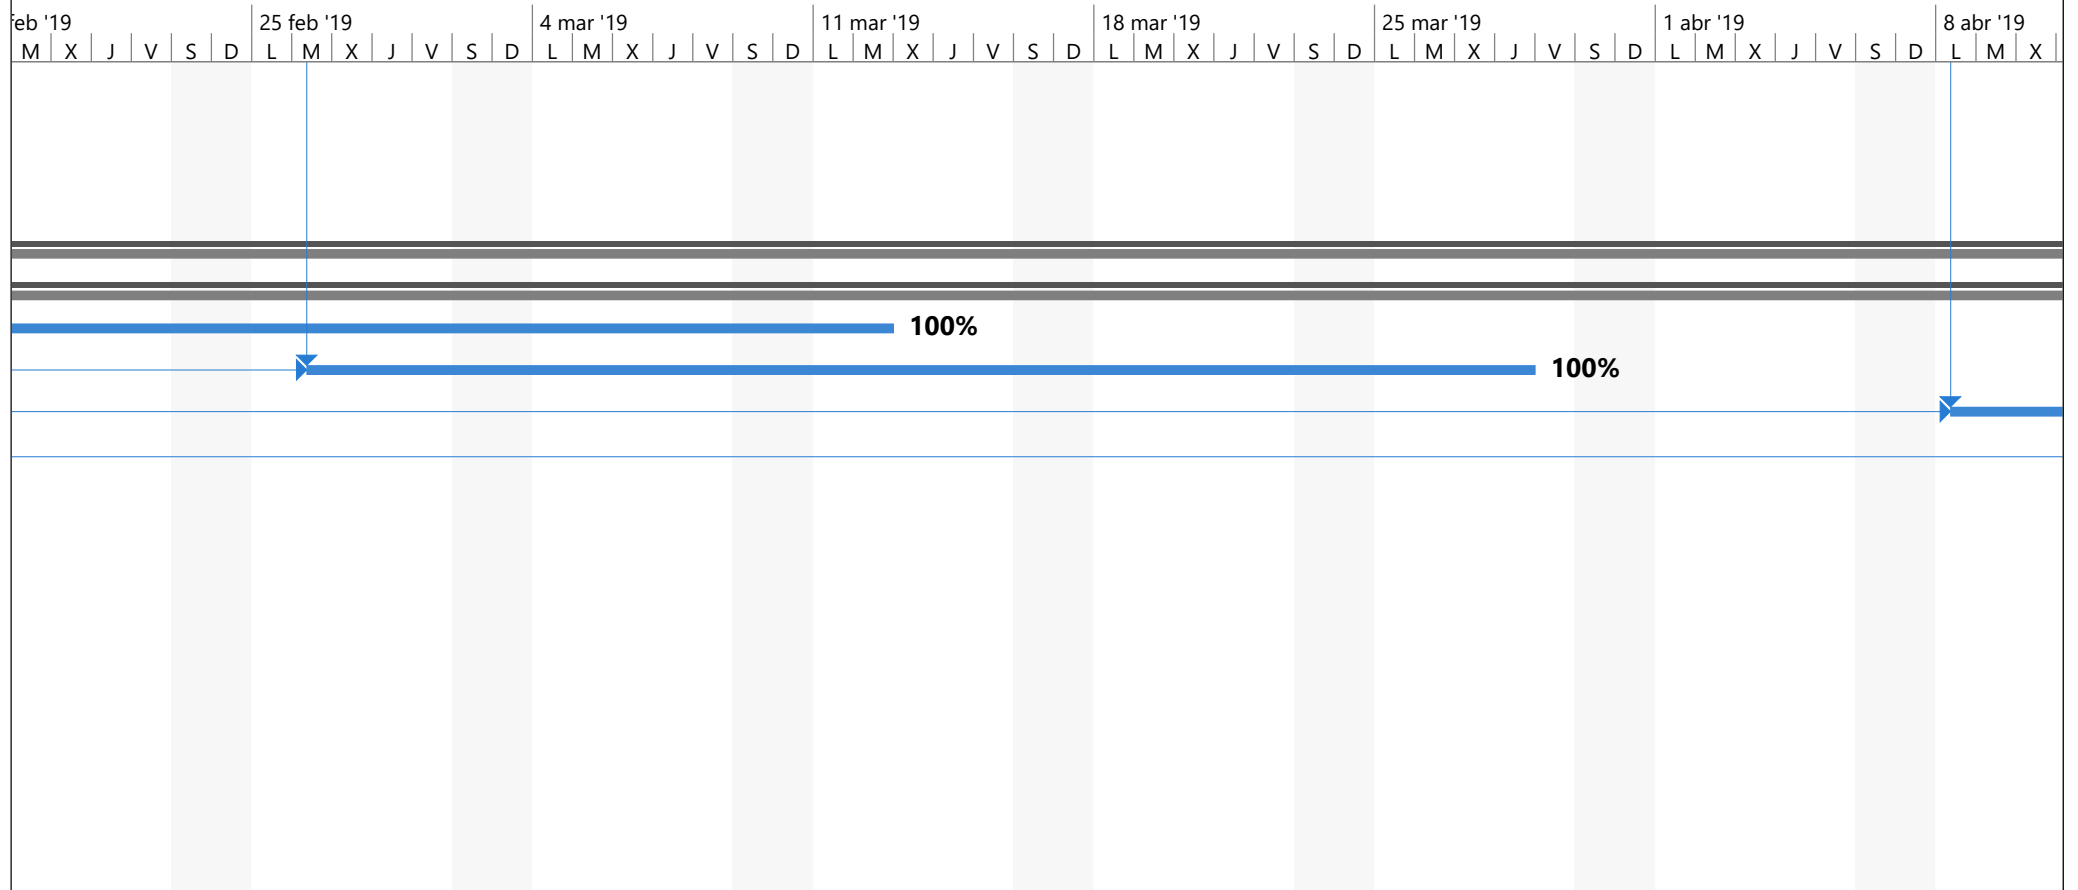

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

feb '19	M	X	J	V	S	D	25 feb '19	L	M	X	J	V	S	D	4 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	11 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	18 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	25 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	1 abr '19	L	M	X	J	V	S	D	8 abr '19	L	M	X
---------	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

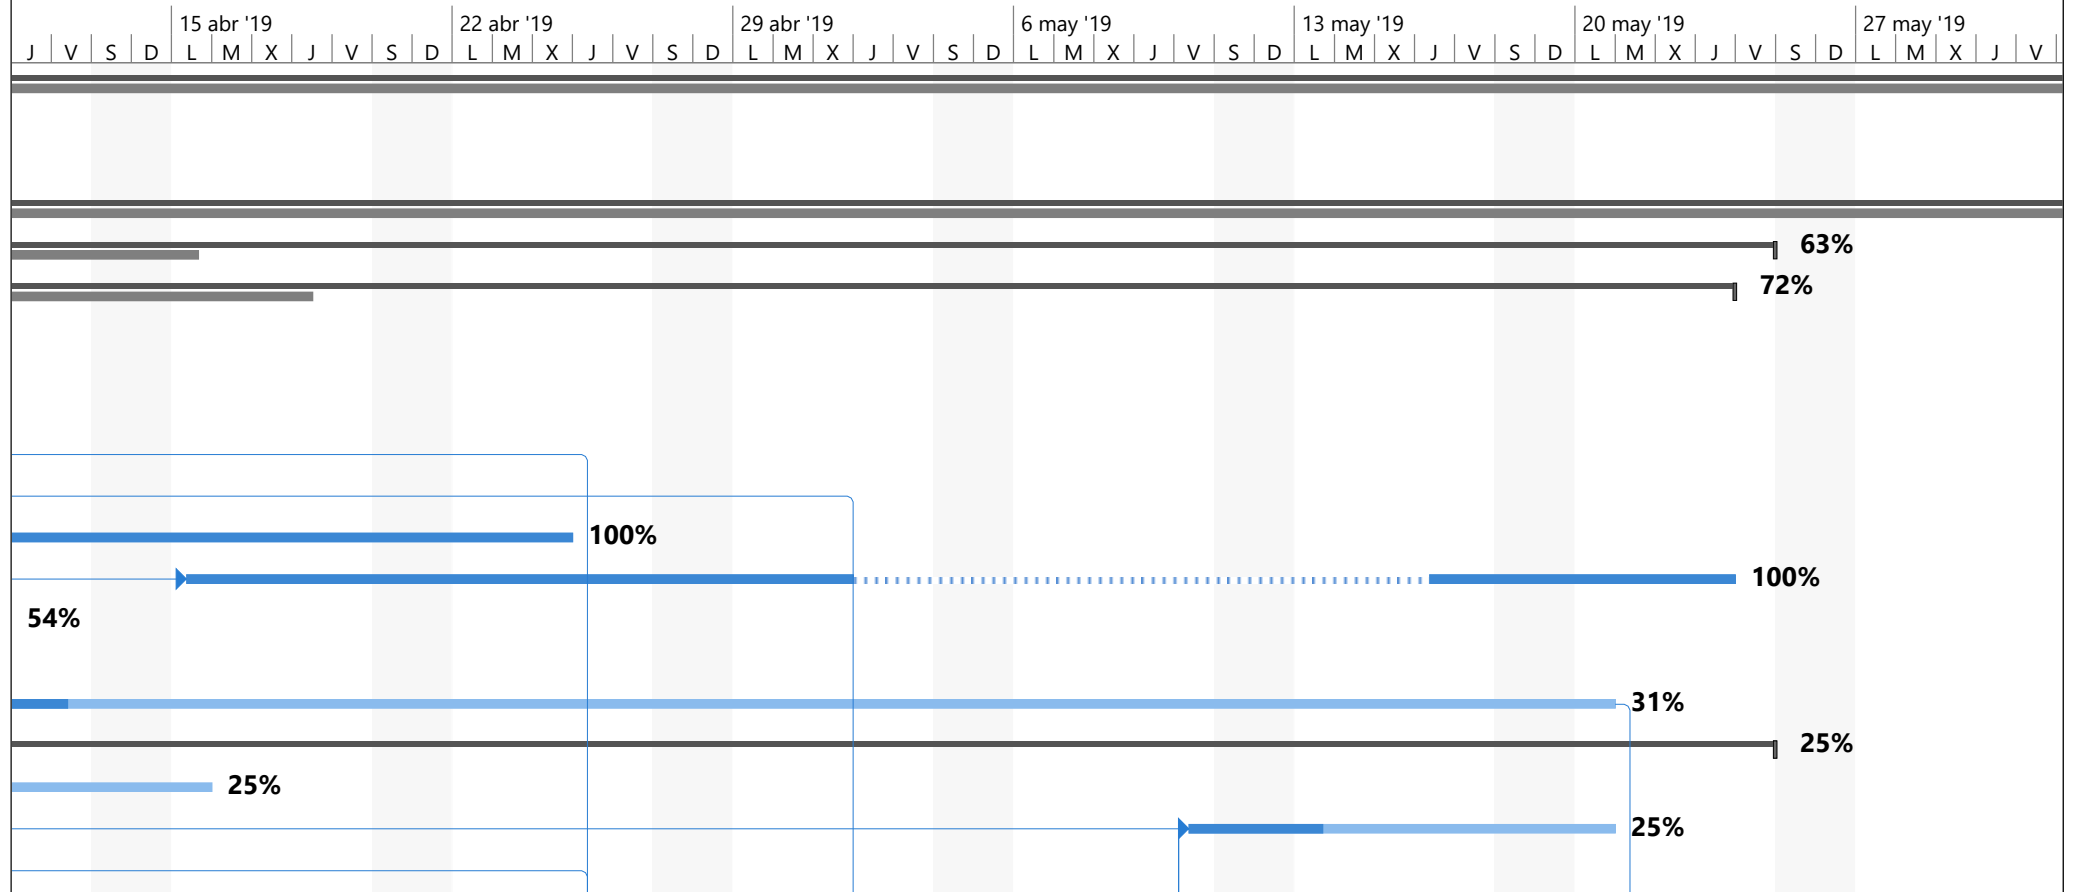


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

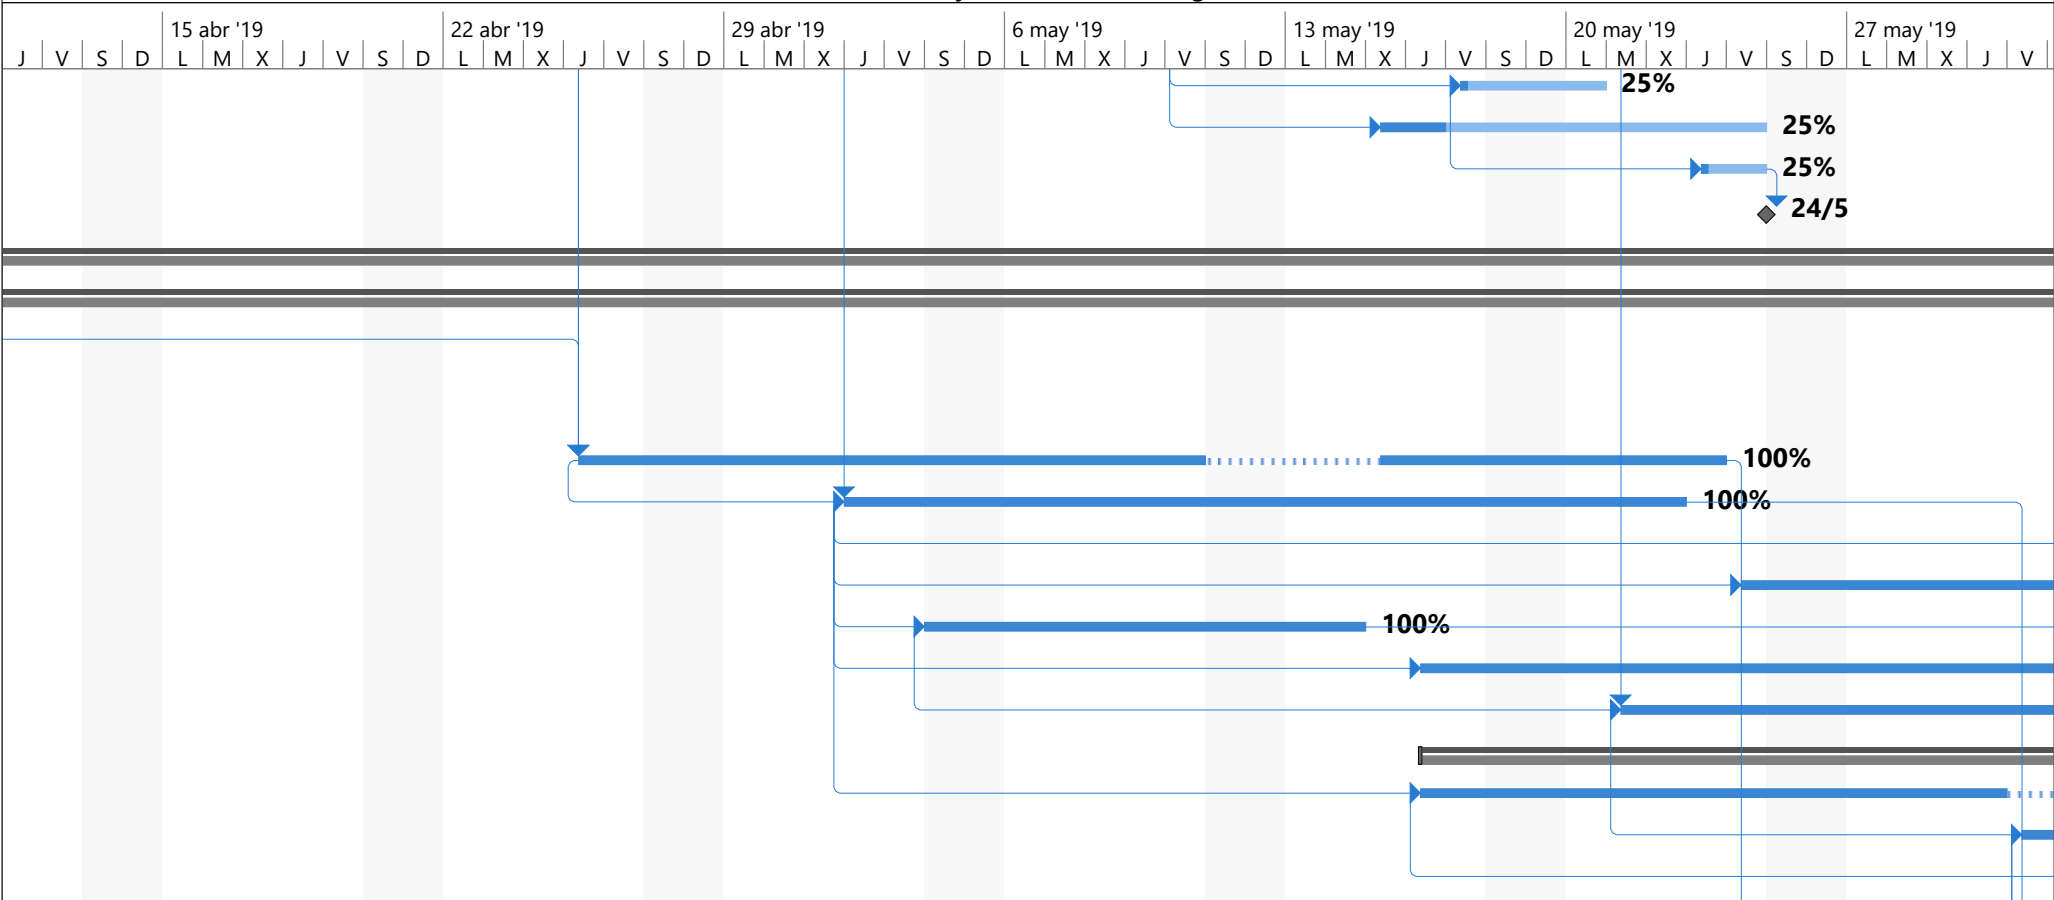


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

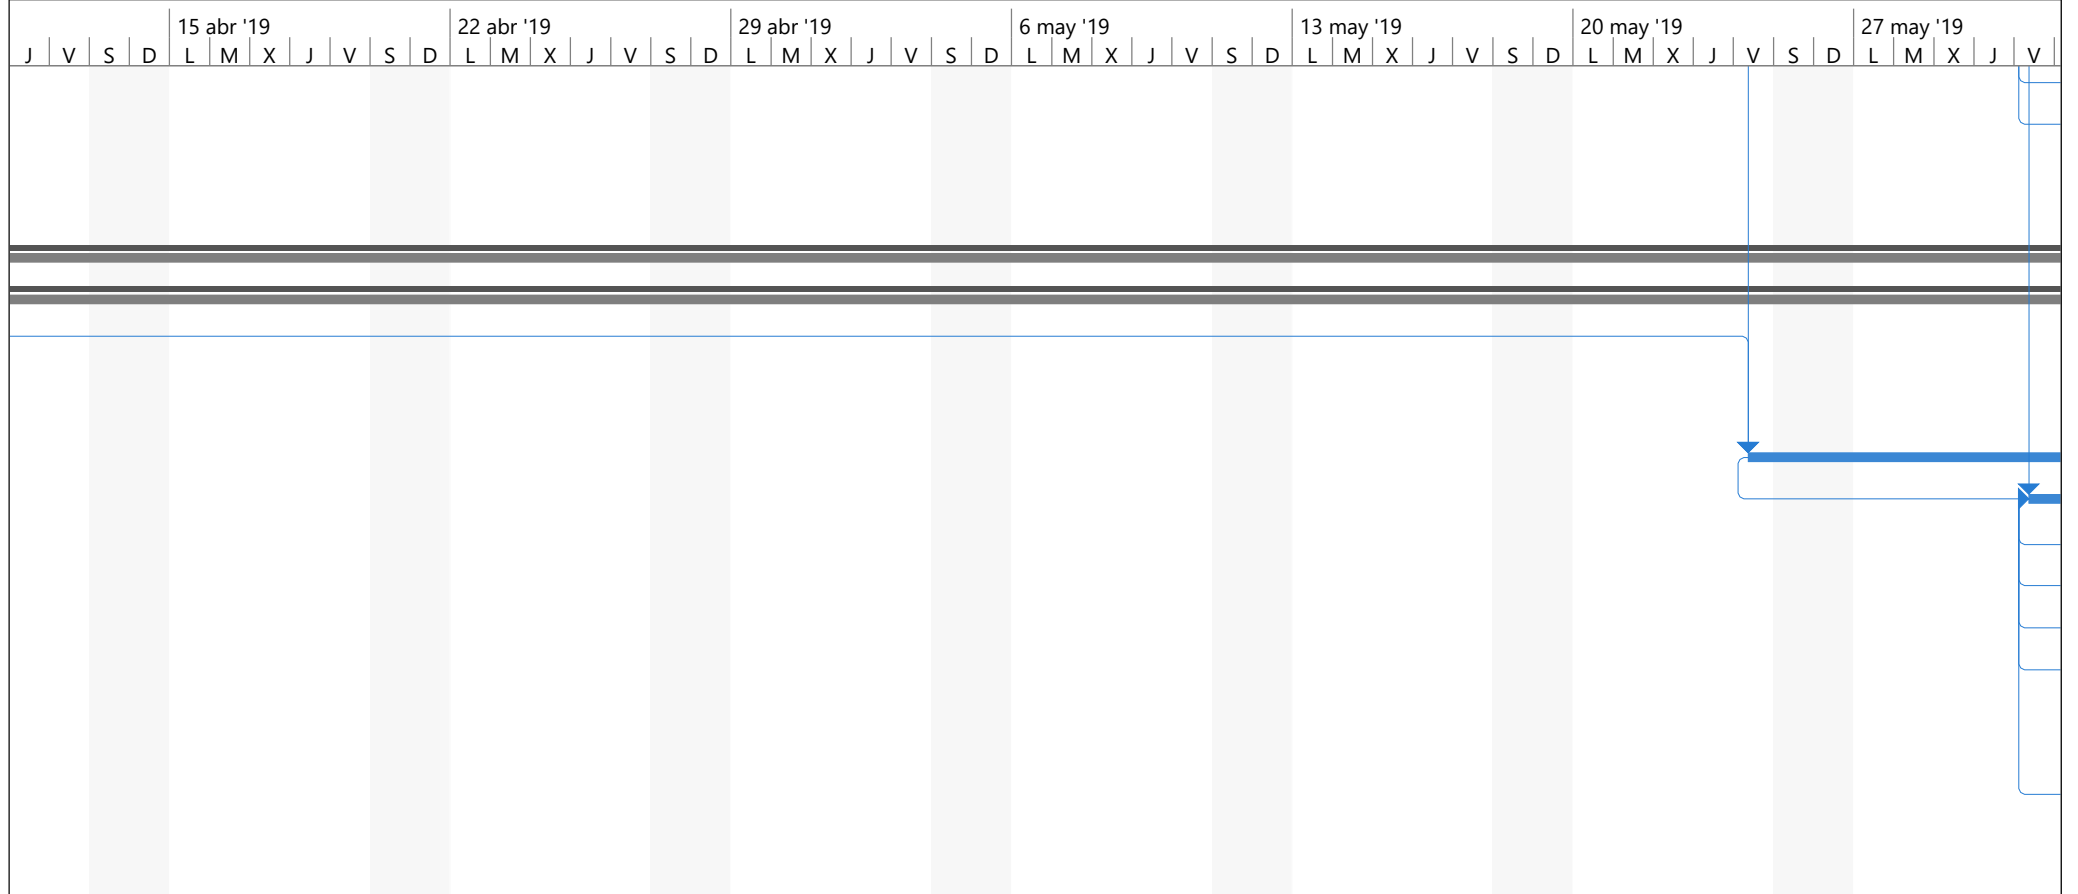

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

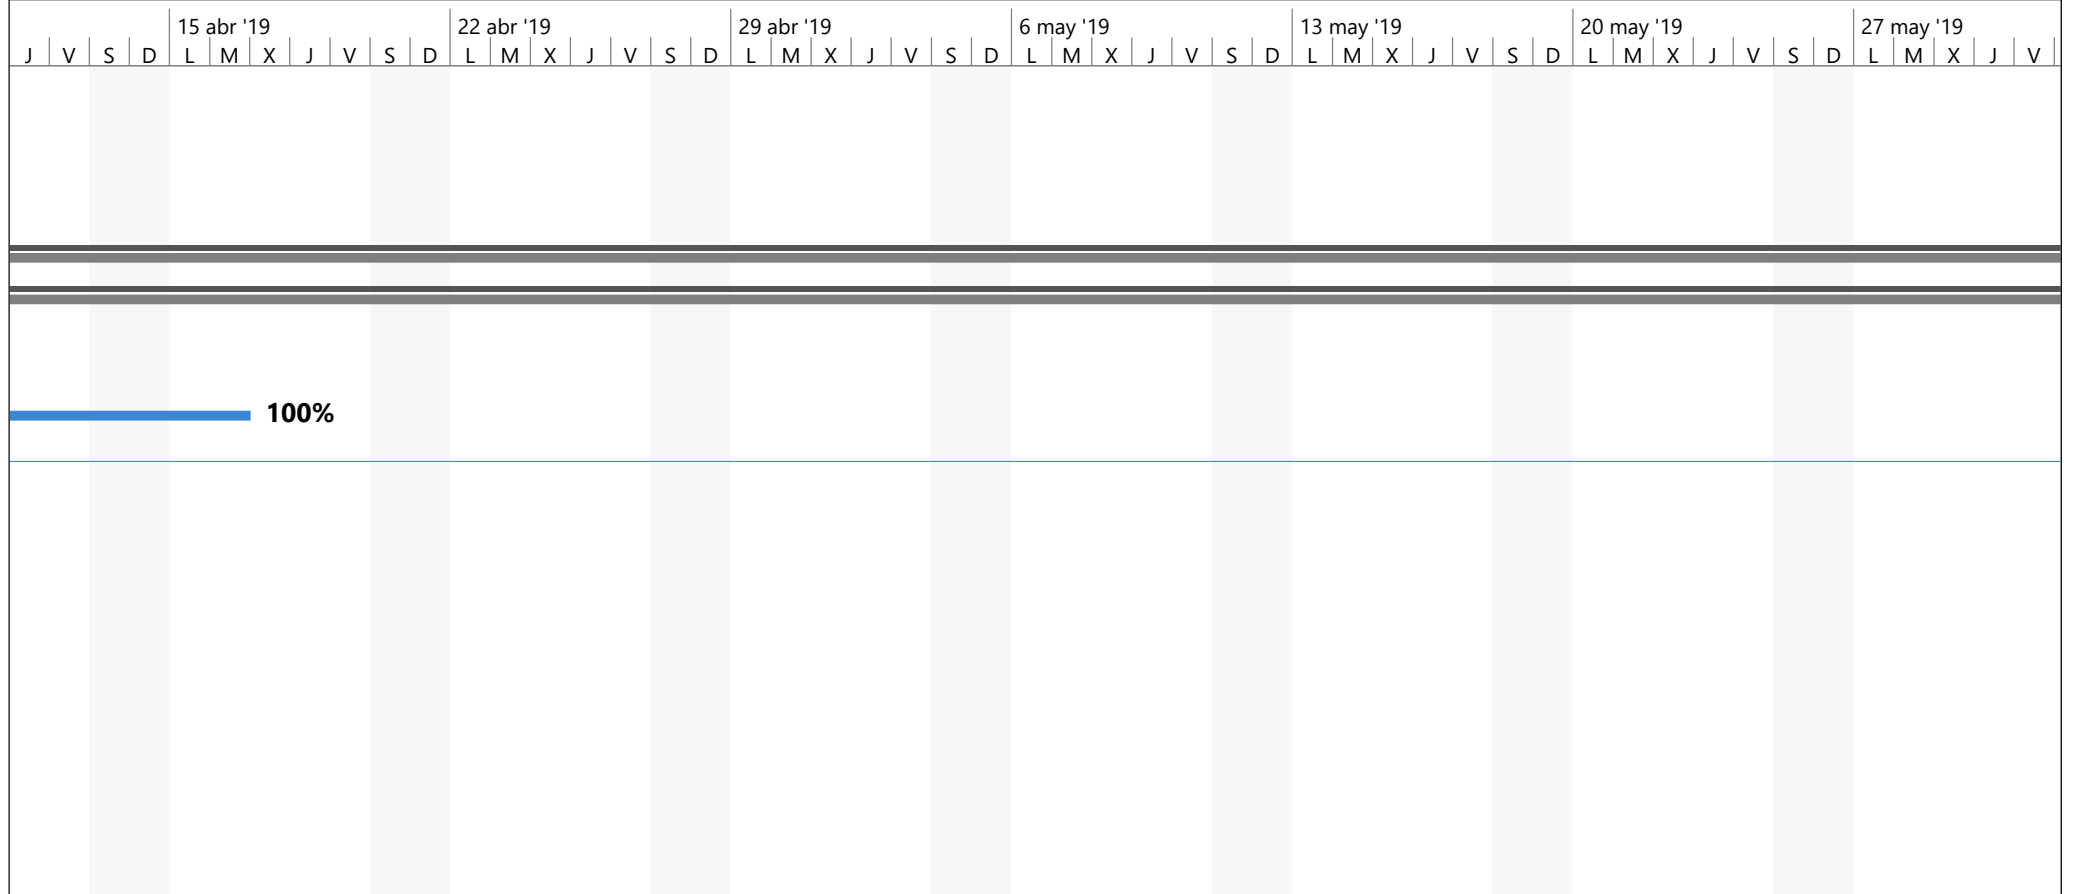

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

				15 abr '19								22 abr '19								29 abr '19								6 may '19								13 may '19								20 may '19								27 may '19			
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D			




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	









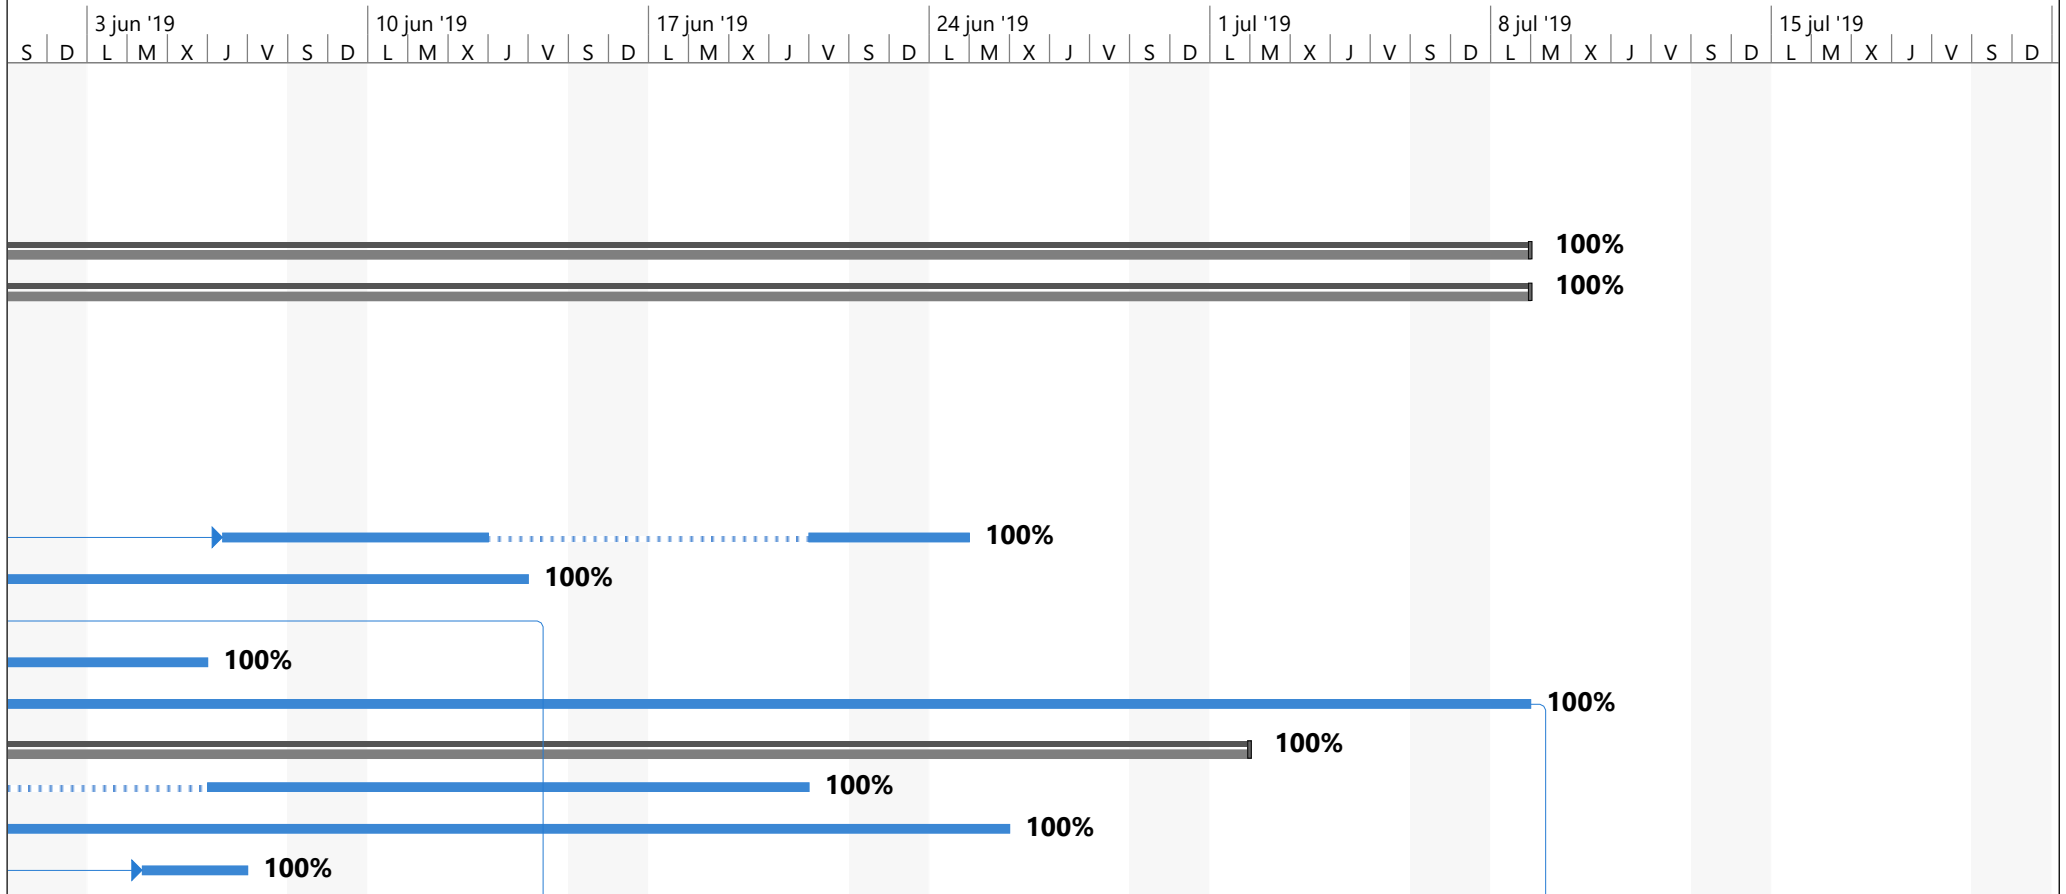















Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



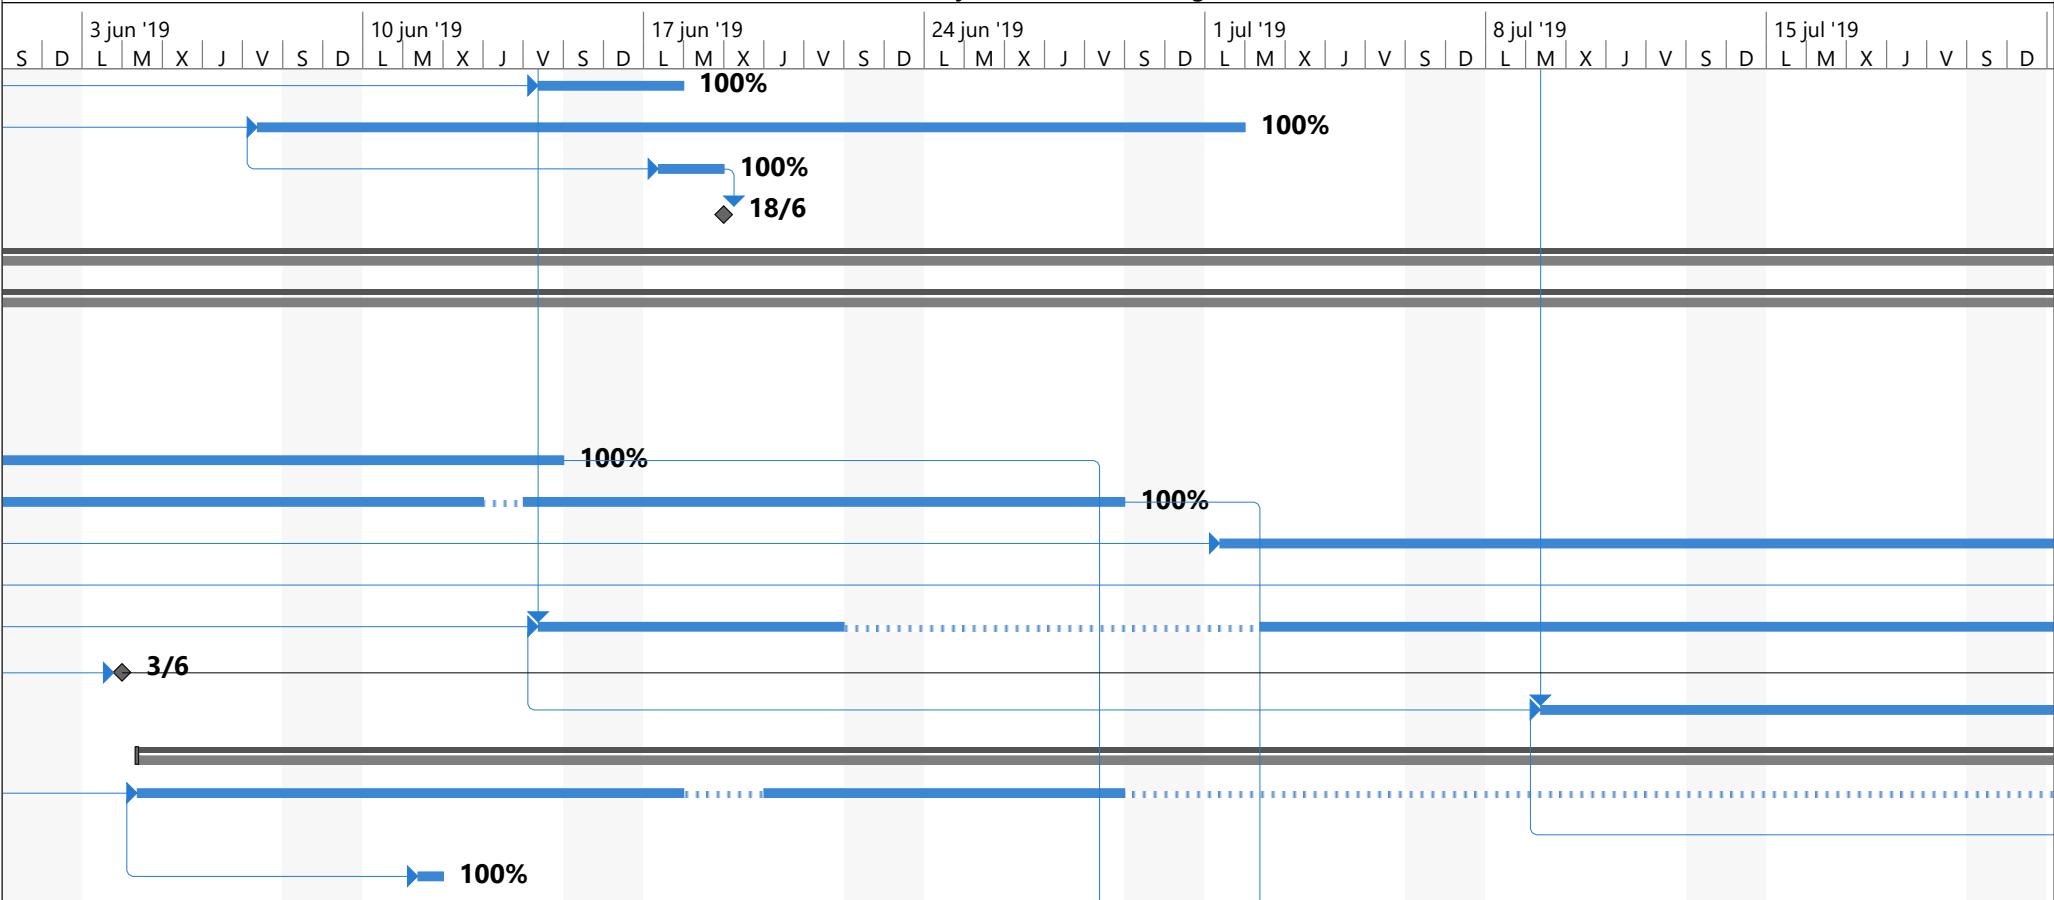





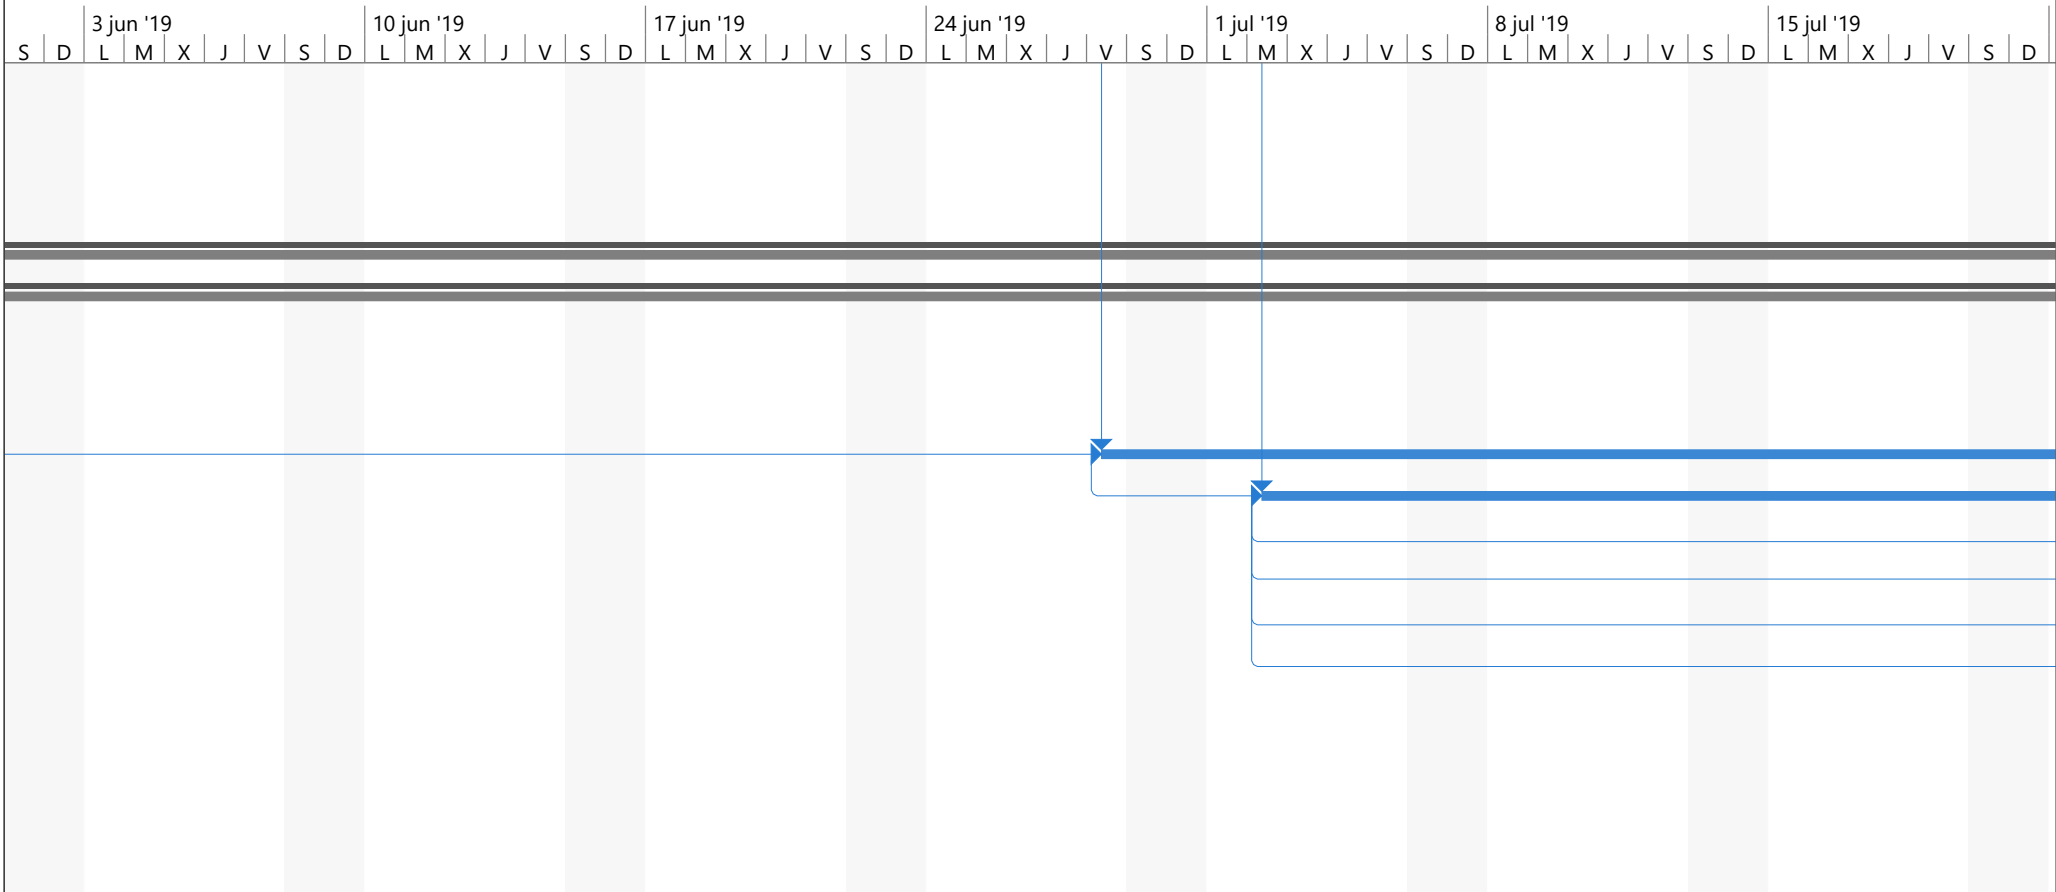















Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020


S	D	3 jun '19					10 jun '19					17 jun '19					24 jun '19					1 jul '19					8 jul '19					15 jul '19													
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D		



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

22 jul '19							29 jul '19							5 ago '19							12 ago '19							19 ago '19							26 ago '19							2 sep '19							9 sep '19		
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M								

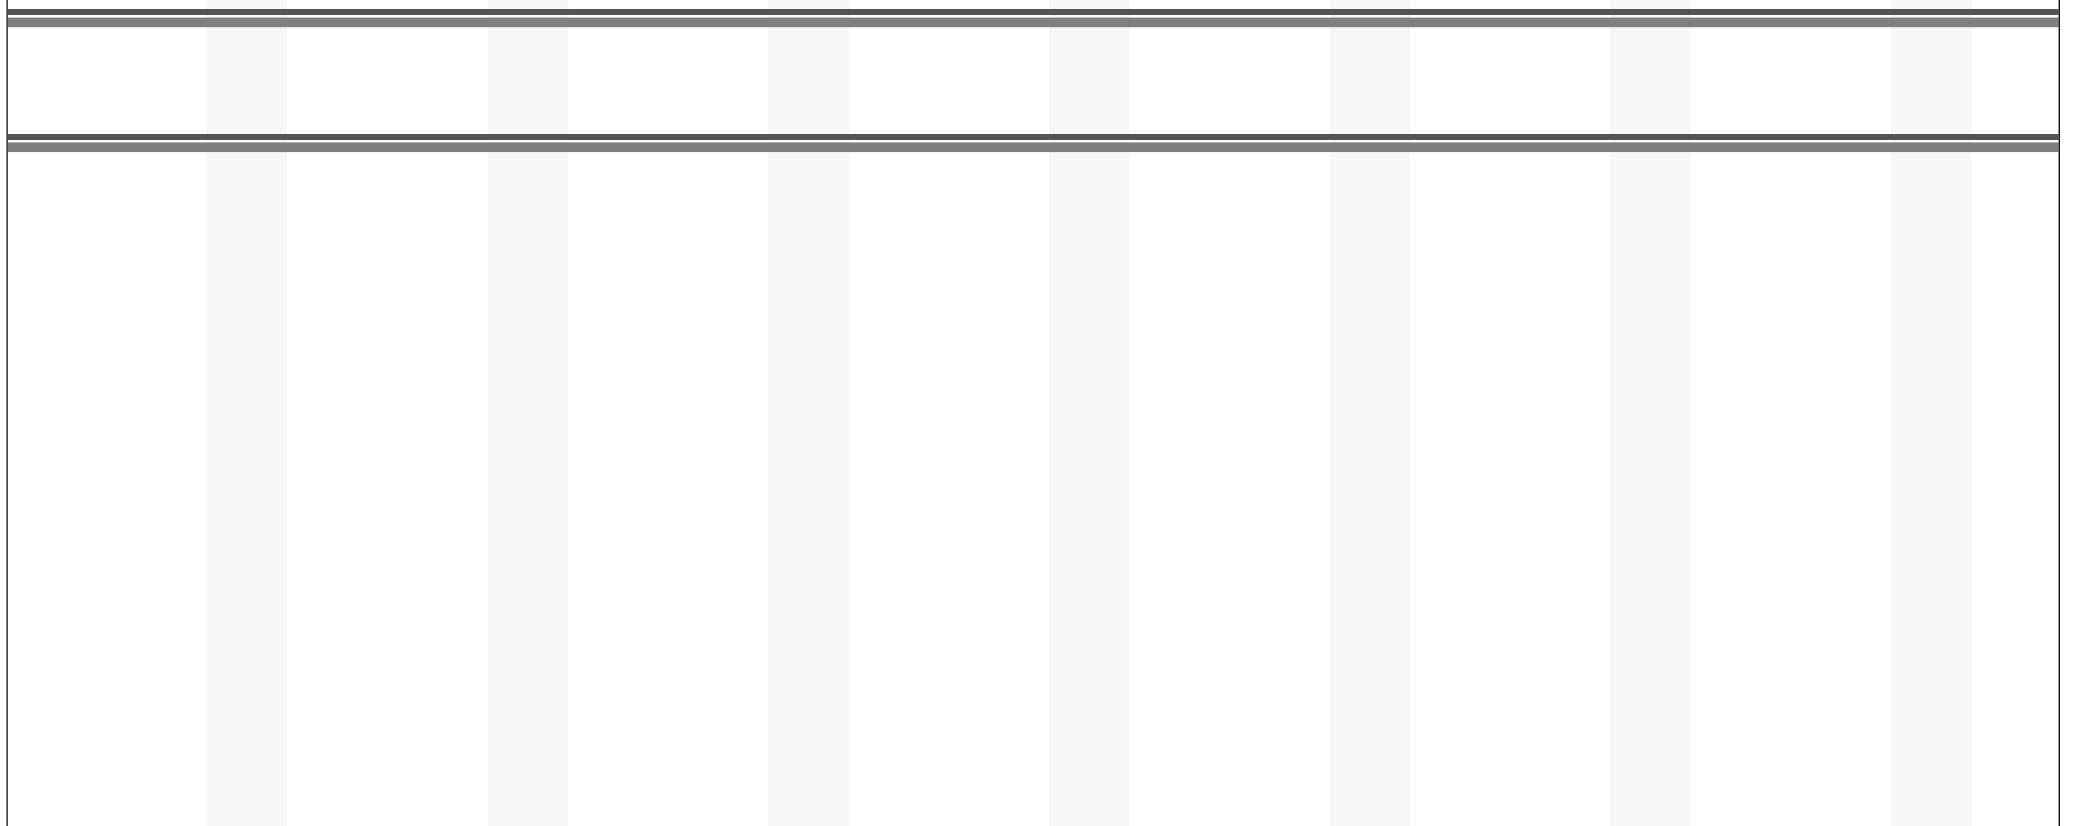


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

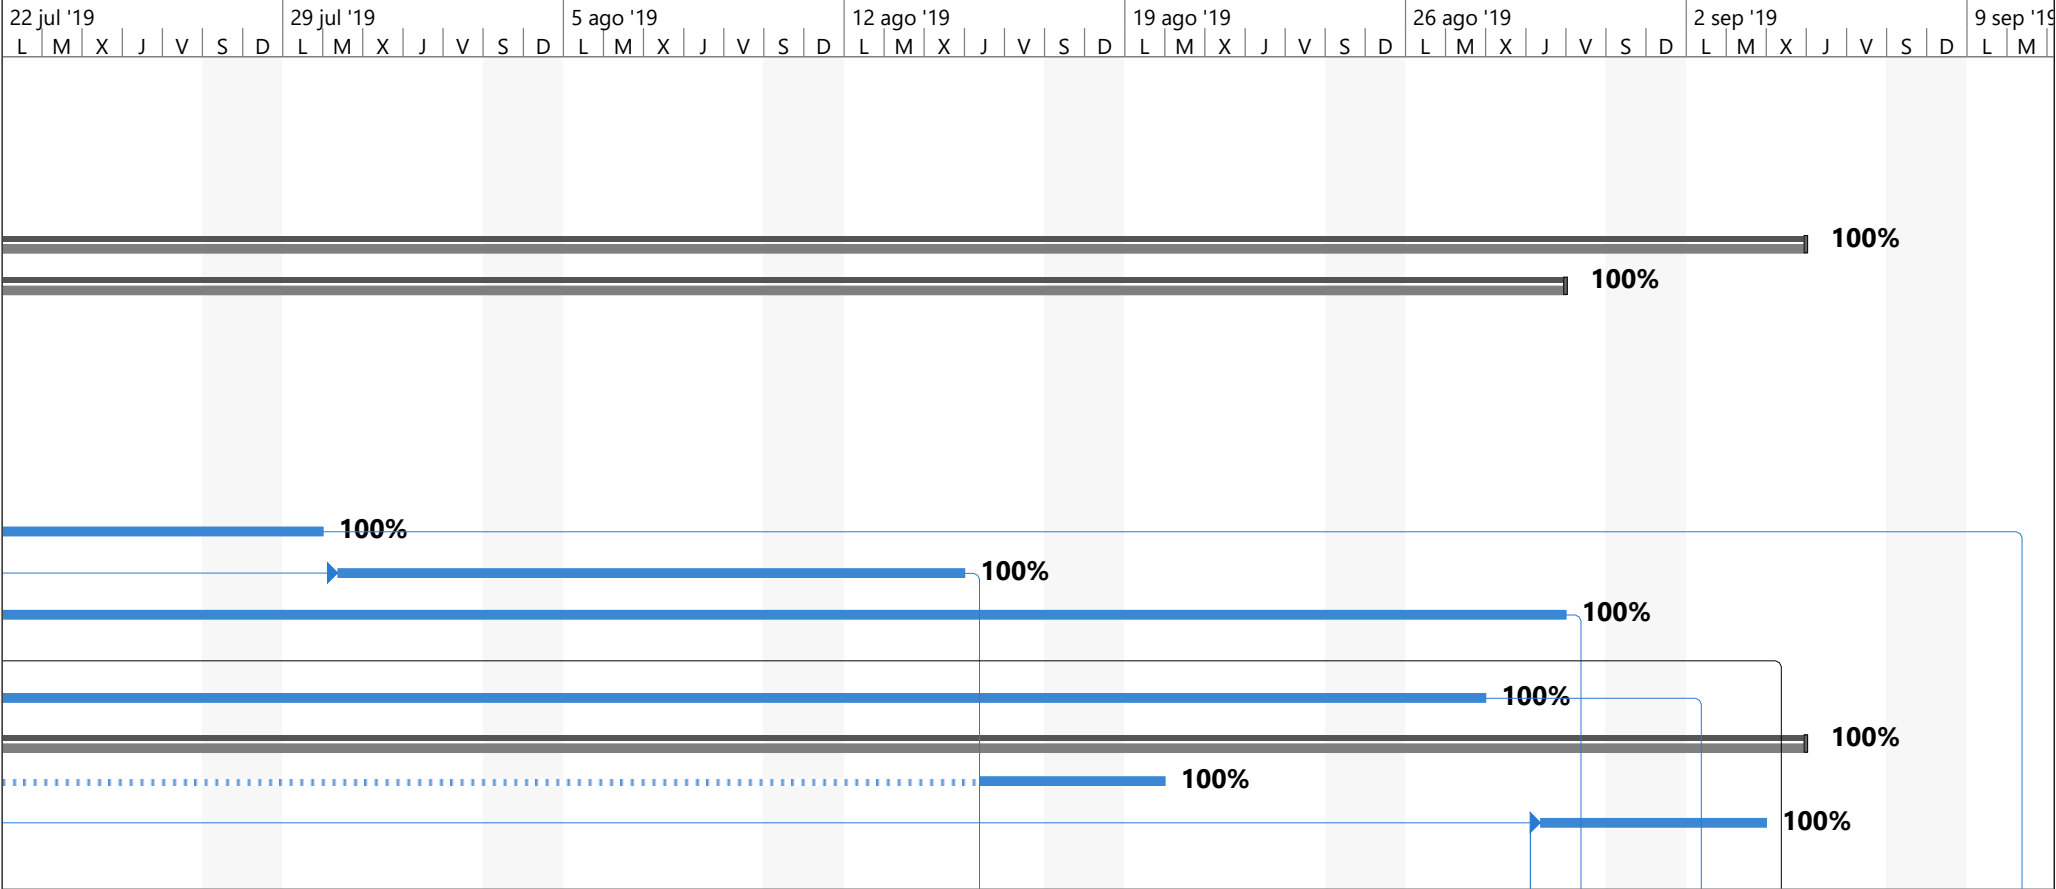

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

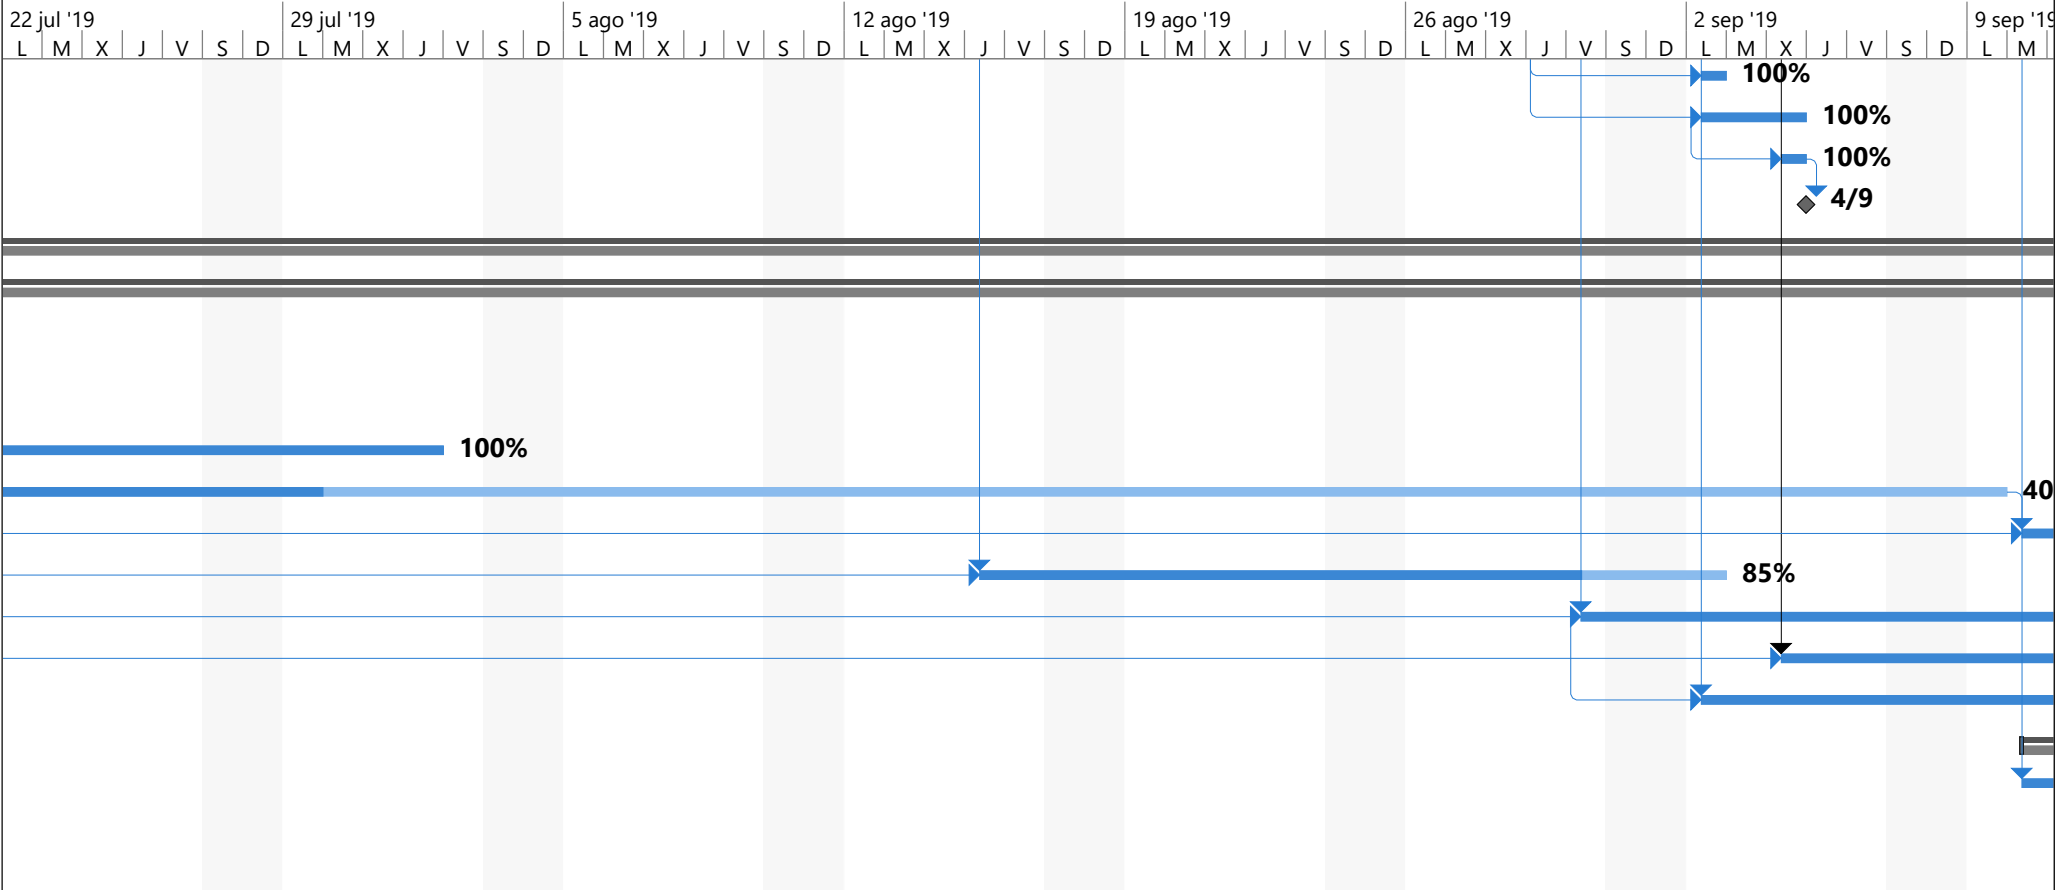

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

22 jul '19							29 jul '19							5 ago '19							12 ago '19							19 ago '19							26 ago '19							2 sep '19							9 sep '19						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

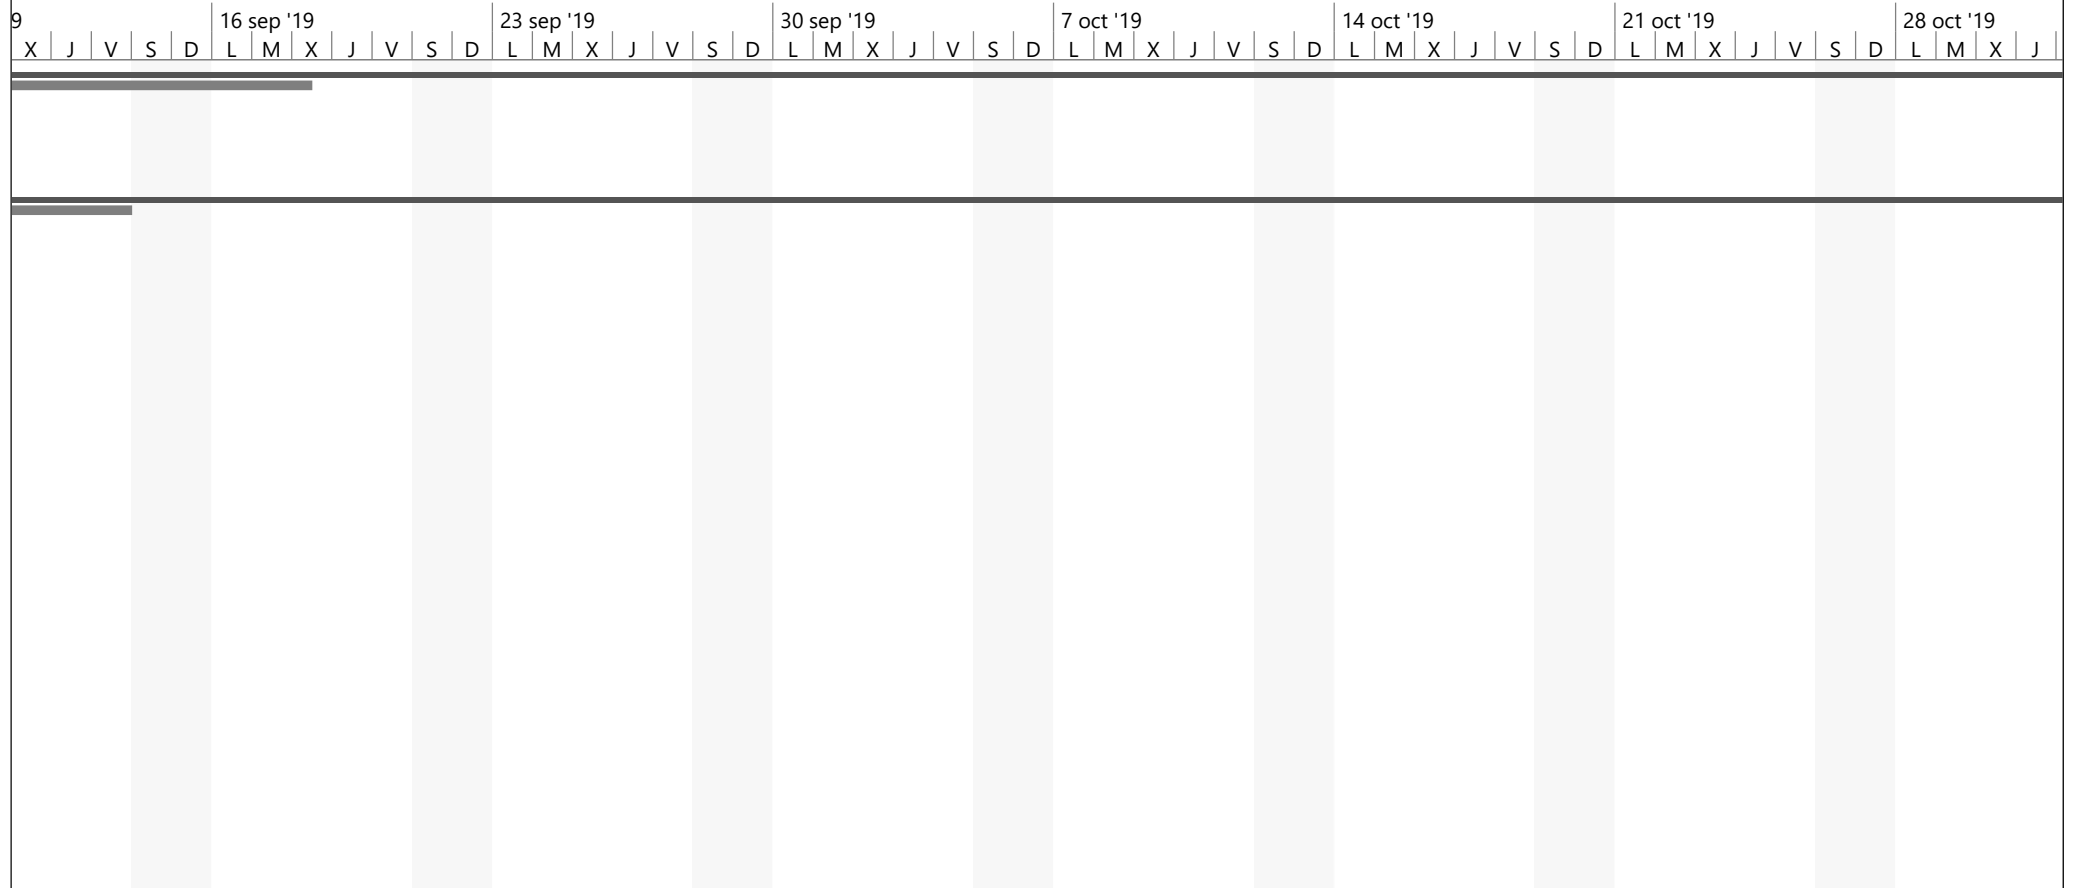

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

9					16 sep '19					23 sep '19					30 sep '19					7 oct '19					14 oct '19					21 oct '19					28 oct '19			
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

9					16 sep '19					23 sep '19					30 sep '19					7 oct '19					14 oct '19					21 oct '19					28 oct '19				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

Task	Start Date	End Date	Completion Status
Task 1	2019-09-09	2019-09-23	10%
Task 2	2019-09-09	2019-10-07	84%
Task 3	2019-09-09	2019-10-28	100%
Task 4	2019-09-09	2019-10-07	94%
Task 5	2019-10-07	2019-10-28	Planned (Dotted line)

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

9 X J V S D 16 sep '19 L M X J V S D 23 sep '19 L M X J V S D 30 sep '19 L M X J V S D 7 oct '19 L M X J V S D 14 oct '19 L M X J V S D 21 oct '19 L M X J V S D 28 oct '19 L M X J



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




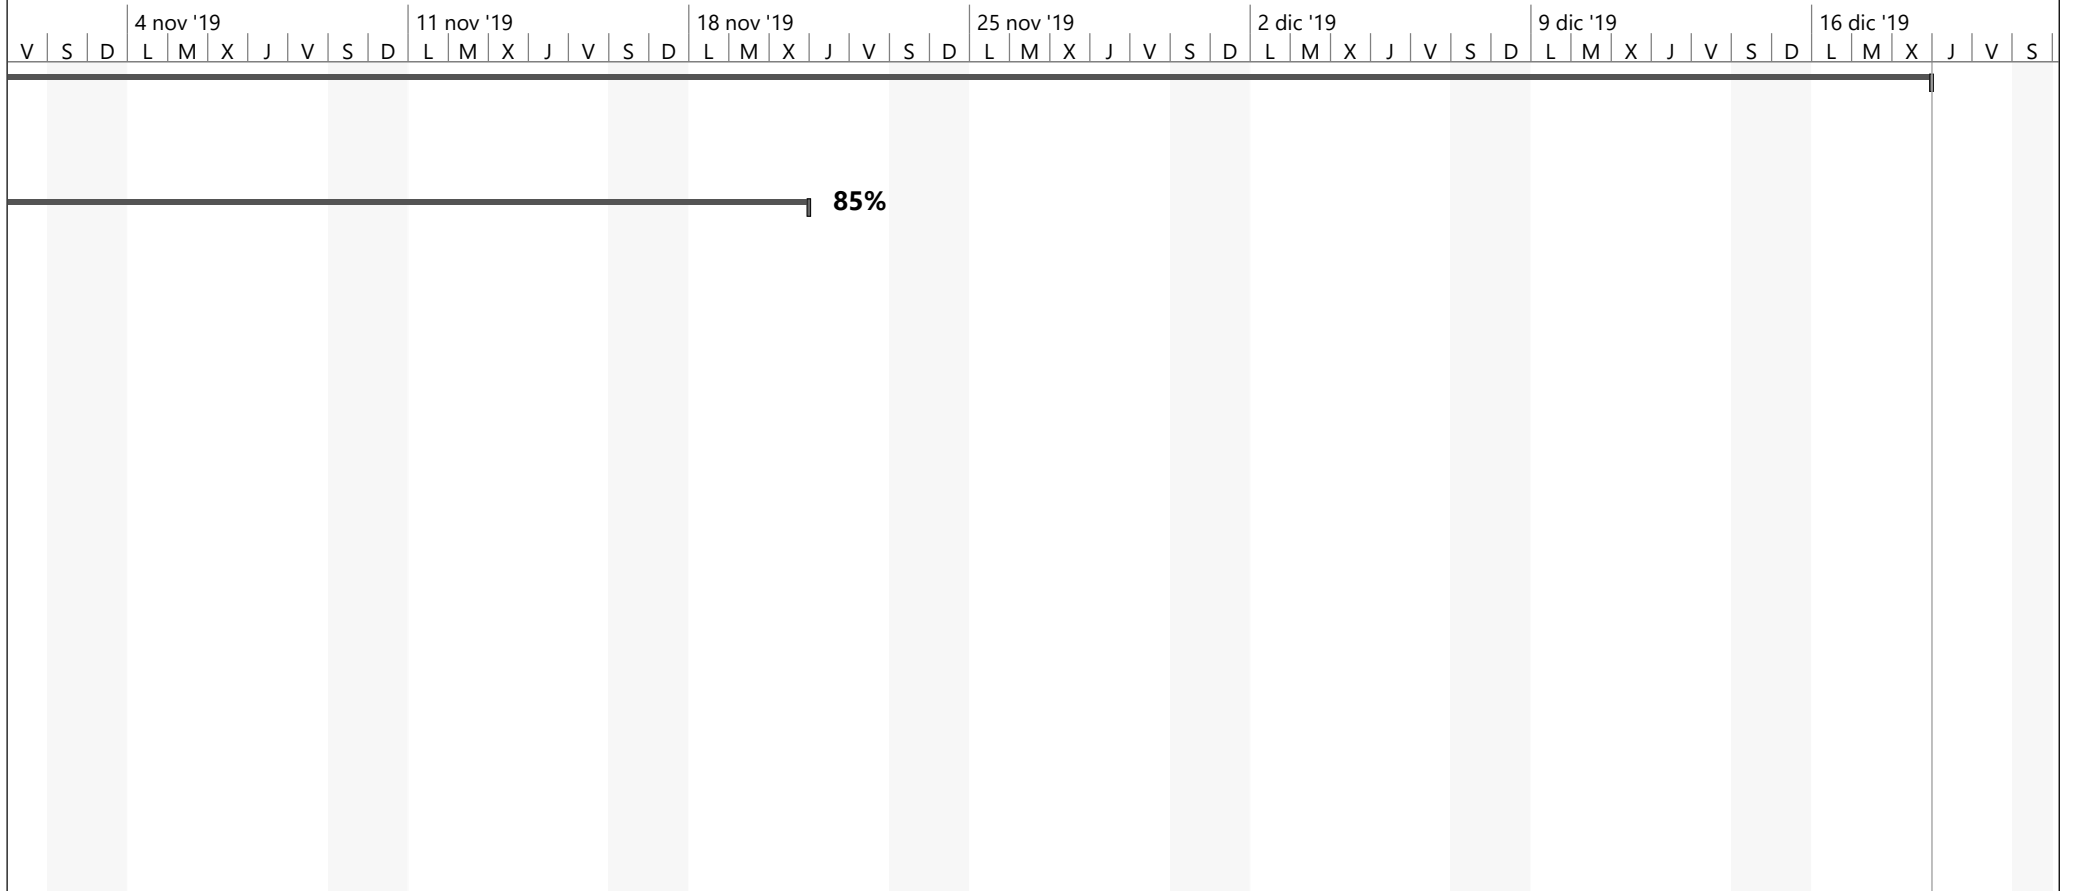




















Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

			4 nov '19							11 nov '19							18 nov '19							25 nov '19							2 dic '19							9 dic '19							16 dic '19						
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S								


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	











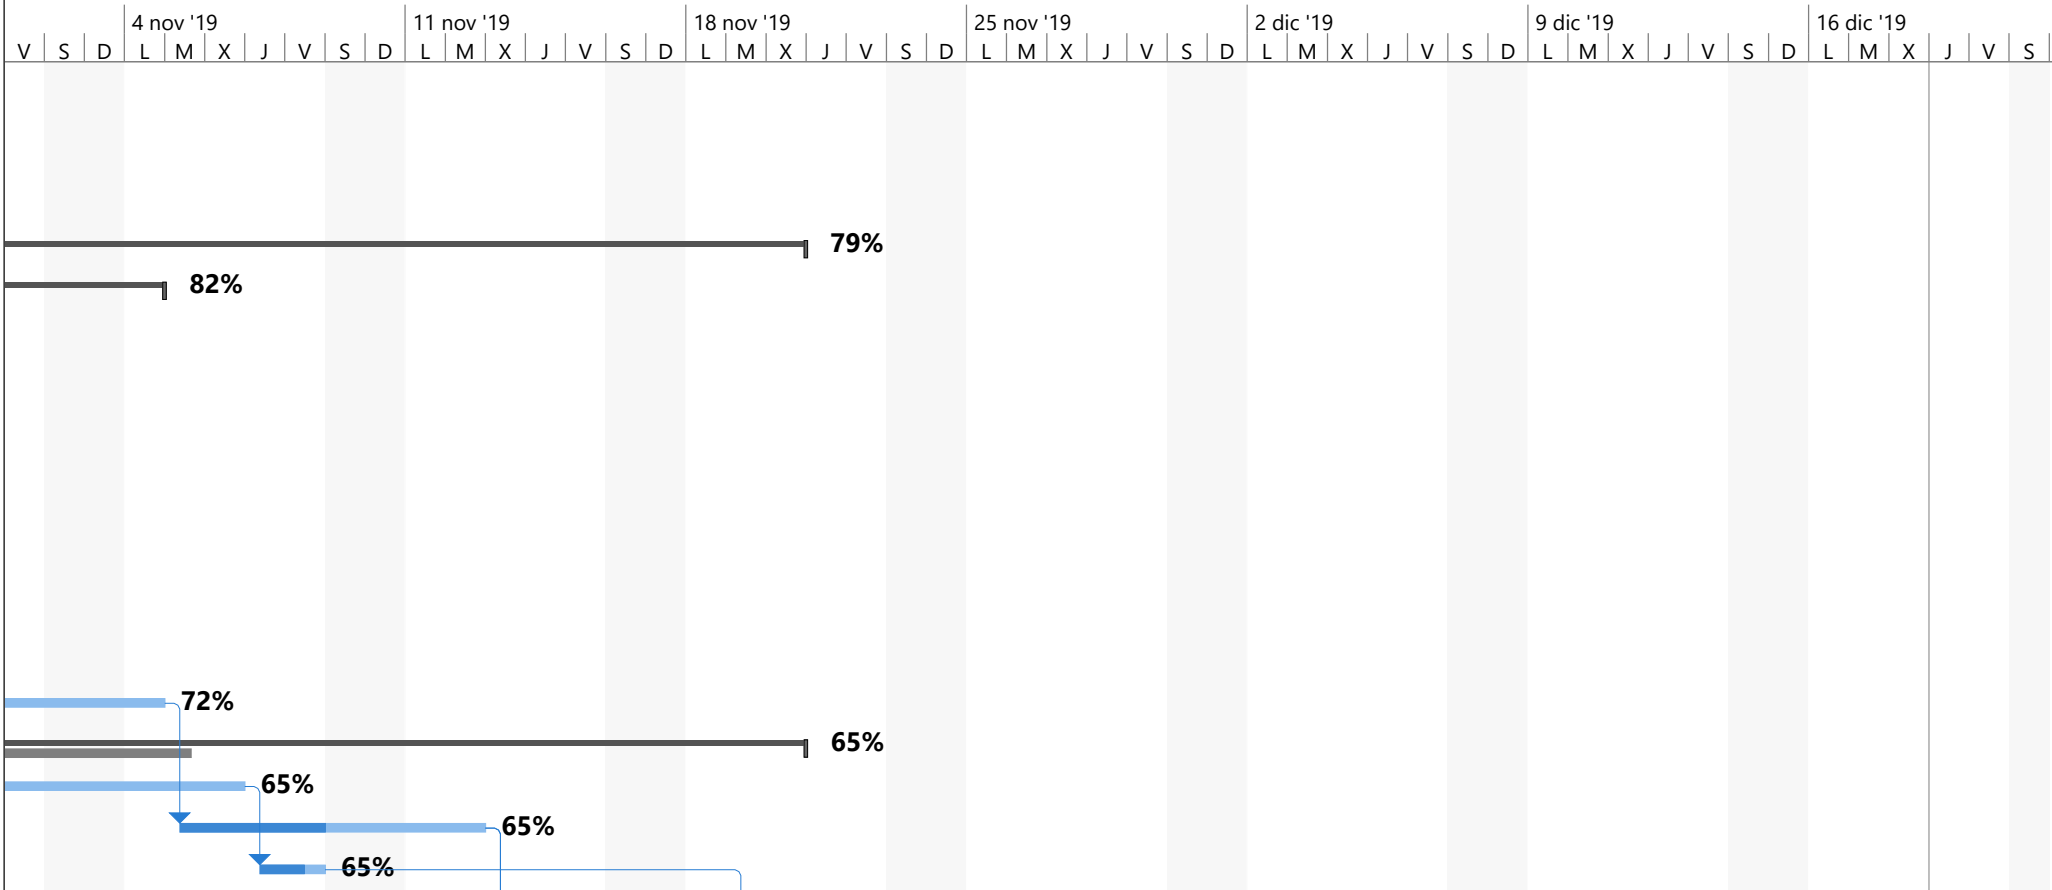













Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

			4 nov '19							11 nov '19							18 nov '19							25 nov '19							2 dic '19							9 dic '19							16 dic '19						
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S								


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecucion GALL103 Ago2020

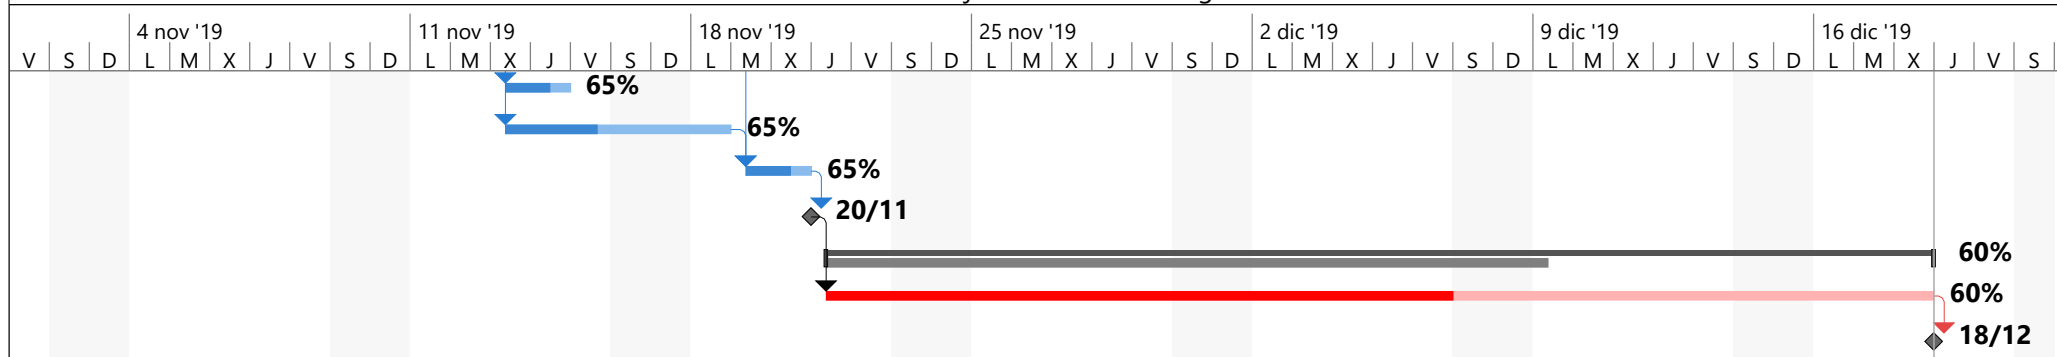

Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana


F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División




Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen



Fecha límite

