










































































































Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | 6 jul '20 | | | | | | | | | | | | 13 jul '20 | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | | | | |
| 1 | |  | Rehabilitación de Redes SABY102 | 191.88 días | mar 7/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |  | Ejecución | 171.88 días | mar 7/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |  | Polígono 1 | 118.88 días | mar 7/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | Instalación | 118.88 días | mar 7/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  |  | Excavaciones | 24 días | mar 7/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | |  | Izado de postes | 28 días | jue 9/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  |  | Cimentaciones | 6 días | mié 12/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 |  |  | Retenidas | 25 días | jue 30/7/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  |  | Armados MT y BT | 29 días | jue 6/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 |  |  | Tendido de Conductor MT y BT | 24 días | jue 20/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 |  |  | Conexiones y Jumpers | 36 días | jue 3/9/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 |  |  | Puesta a Tierra | 36 días | jue 3/9/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  |  | Transformadores | 28 días | jue 17/9/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 |  |  | Alumbrado Público | 28 días | lun 21/9/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 |  |  | Totalizadores | 1 día | jue 1/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 |  |  | Acometida | 35 días | jue 29/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | |  | Finalizacion del Poligono 1 | 1 día | jue 17/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | |  | Remoción | 30 días | jue 29/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 30 días | jue 29/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 30 días | jue 29/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |








| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | 6 jul '20 | | | | | | | 13 jul '20 | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| 21 |  |  | Transformadores | 30 días | jue 29/10/20 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 |  |  | Remocion de postes | 30 días | jue 29/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 |  |  | Polígono 2 | 147.88 días | lun 10/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 |  |  | Instalación | 143 días | lun 10/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 |  |  | Excavaciones | 46 días | lun 10/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 |  |  | Izado de postes | 55 días | mar 18/8/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 |  |  | Cimentaciones | 10 días | jue 22/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 |  |  | Retenidas | 49 días | jue 3/9/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 |  |  | Armados MT y BT | 54 días | mié 16/9/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 |  |  | Tendido de Conductor MT y BT | 48 días | vie 9/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 |  |  | Conexiones y Jumpers | 43 días | vie 23/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 |  |  | Puesta a Tierra | 43 días | vie 23/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 |  |  | Transformadores | 13 días | vie 4/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 |  |  | Alumbrado Público | 34 días | jue 5/11/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 |  |  | Totalizadores | 1 día | jue 24/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 |  |  | Acometida | 45 días | jue 24/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 |  |  | Remoción | 50 días | mié 23/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 45 días | mié 23/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 45 días | mié 23/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 |  |  | Transformadores | 45 días | mié 23/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | <div> <div>6 jul '20</div> <div> <div>D</div> <div>L</div> <div>M</div> <div>X</div> <div>J</div> <div>V</div> <div>S</div> <div>D</div> </div> <div>13 jul '20</div> <div> <div>L</div> <div>M</div> <div>X</div> <div>J</div> <div>V</div> <div>S</div> <div>D</div> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 41 |  |  | Remocion de postes | 45 días | mié 23/12/20 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | |  | Cierre de Obras | 20 días | mié 3/3/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | |  | Planos As-Built, Listado de Bienes y Servicios Actualizados | 1 ms | mié 3/3/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | |  | Presentación de Cierre de Obras | 0 días | mié 31/3/21 | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

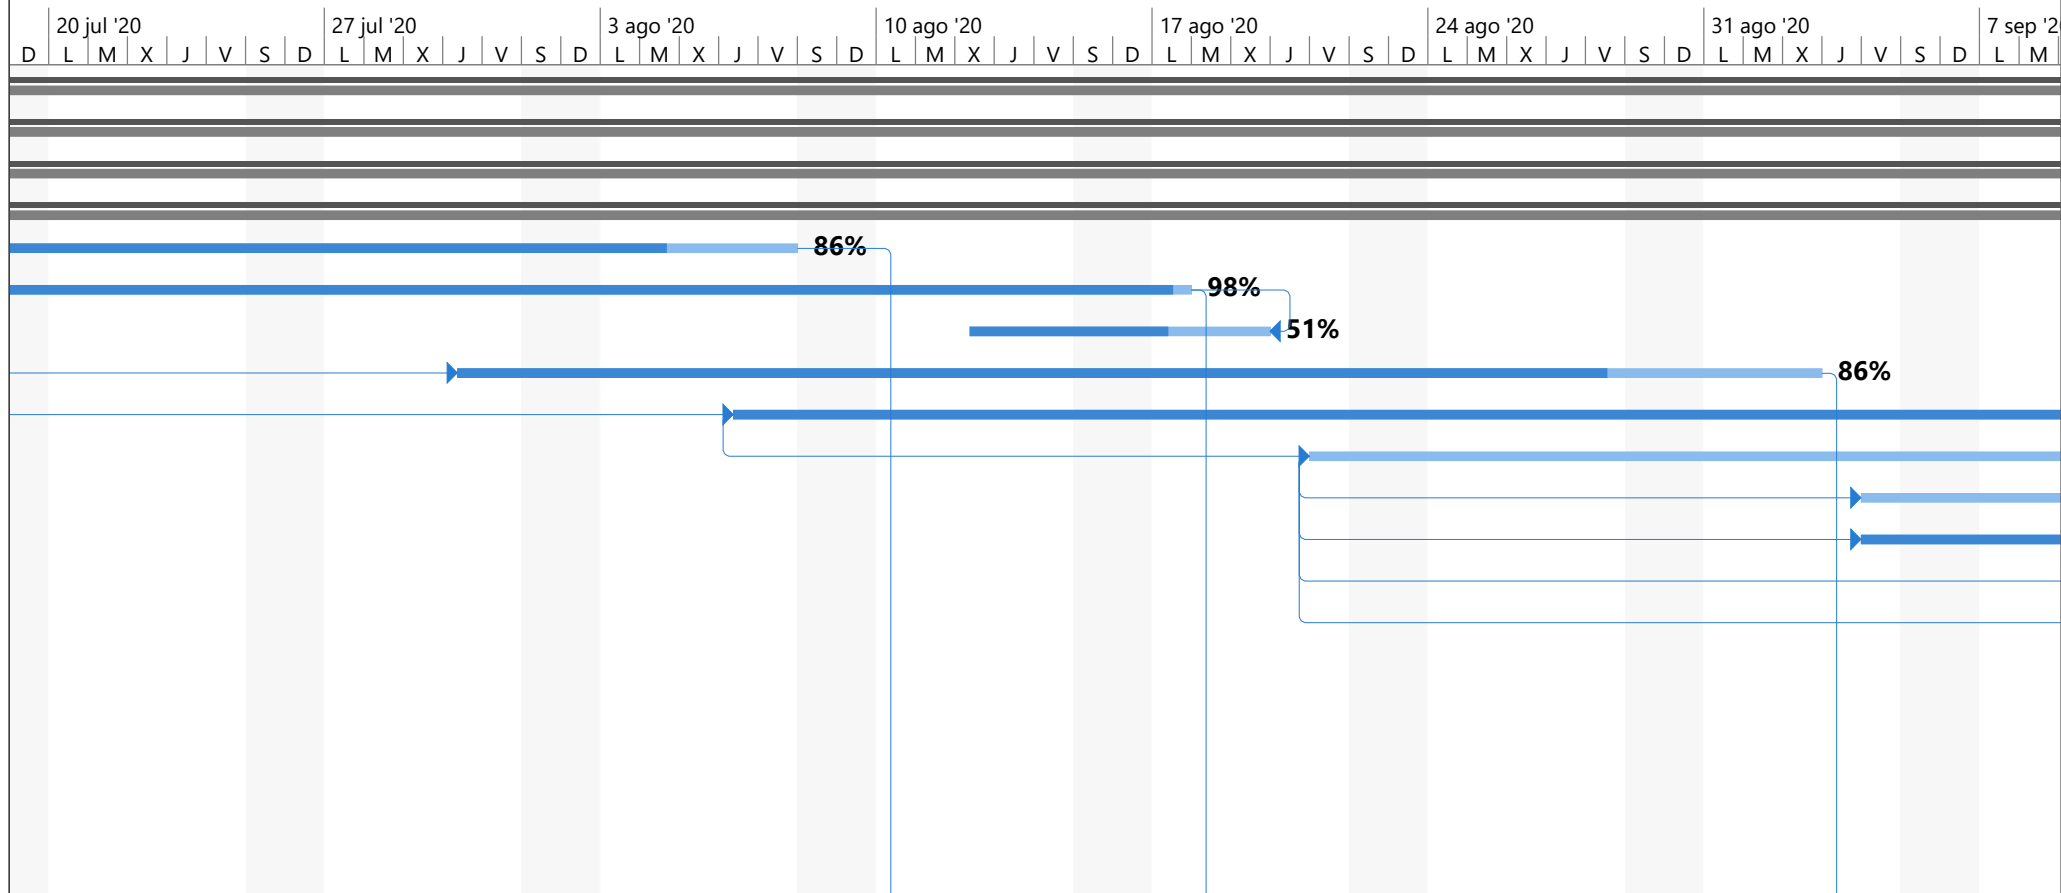

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

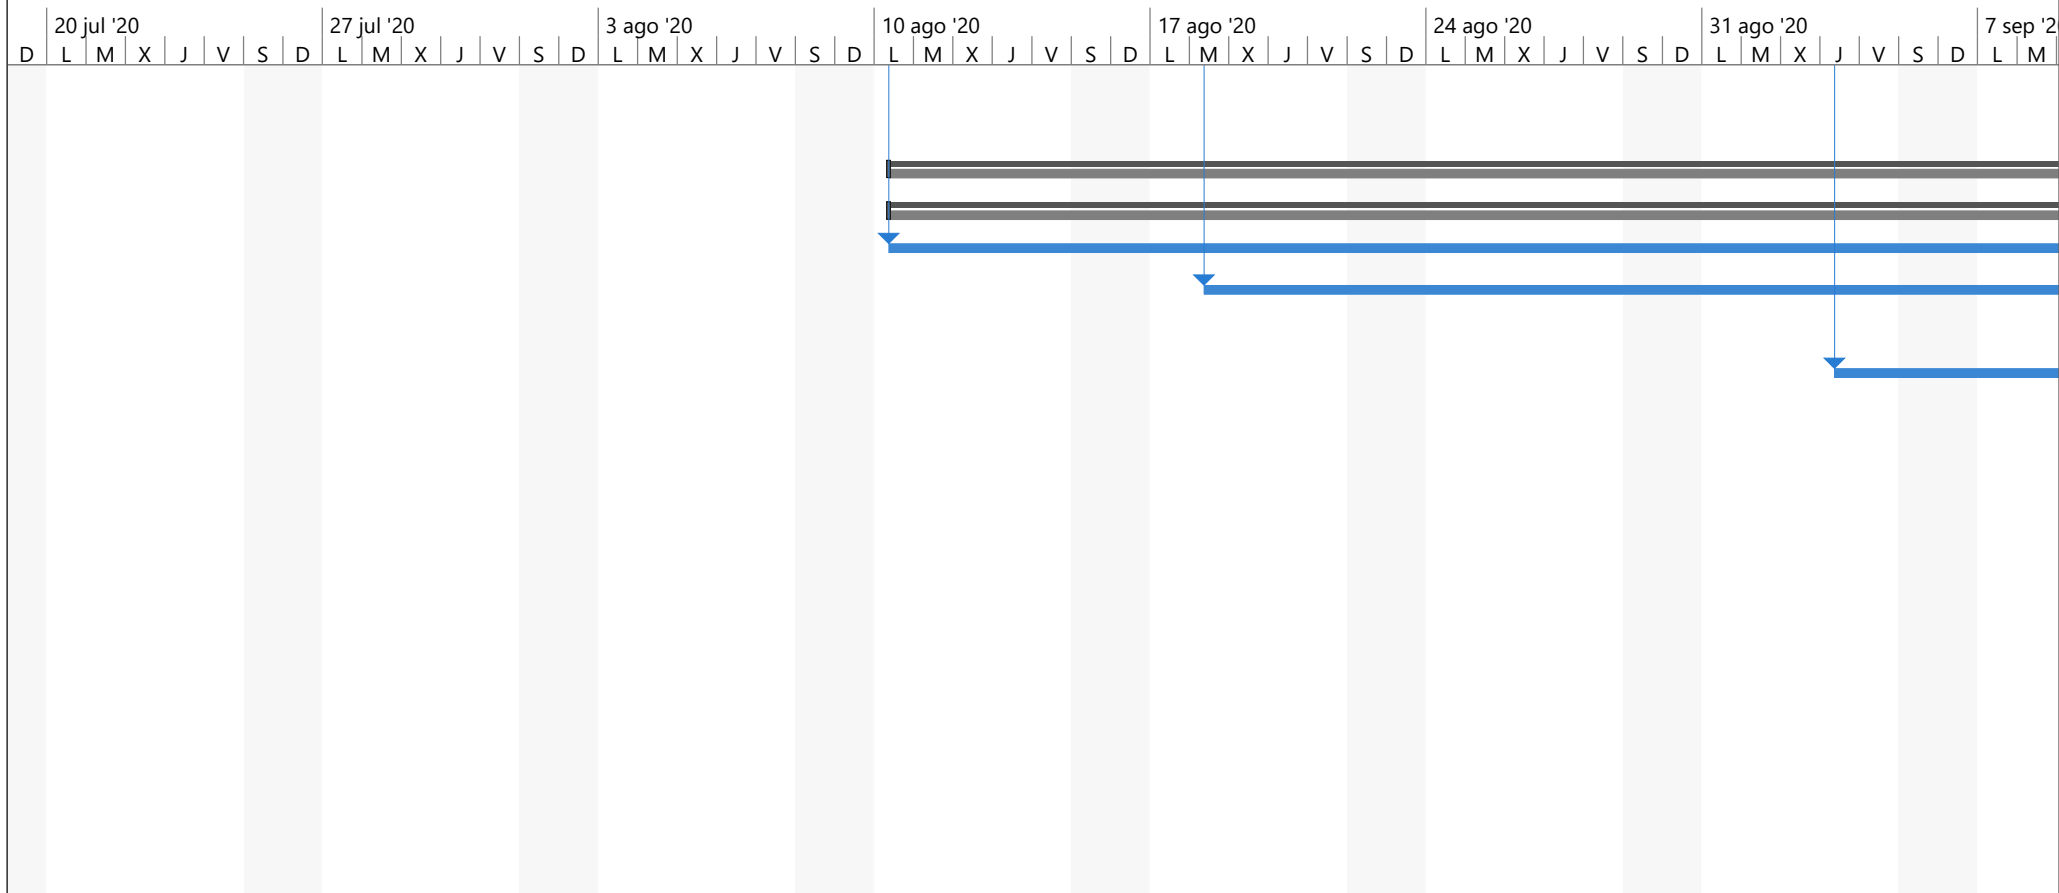

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

























| 20 jul '20 | | | | | | | 27 jul '20 | | | | | | | 3 ago '20 | | | | | | | 10 ago '20 | | | | | | | 17 ago '20 | | | | | | | 24 ago '20 | | | | | | | 31 ago '20 | | | | | | | 7 sep '20 | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|-----------|--|--|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

| Task Type | Percentage |
|-----------|------------|
| Blue | 85% |
| Orange | 0% |
| Green | 0% |
| Red | 71% |
| Blue | 71% |
| Orange | 65% |
| Green | 0% |
| Red | 0% |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

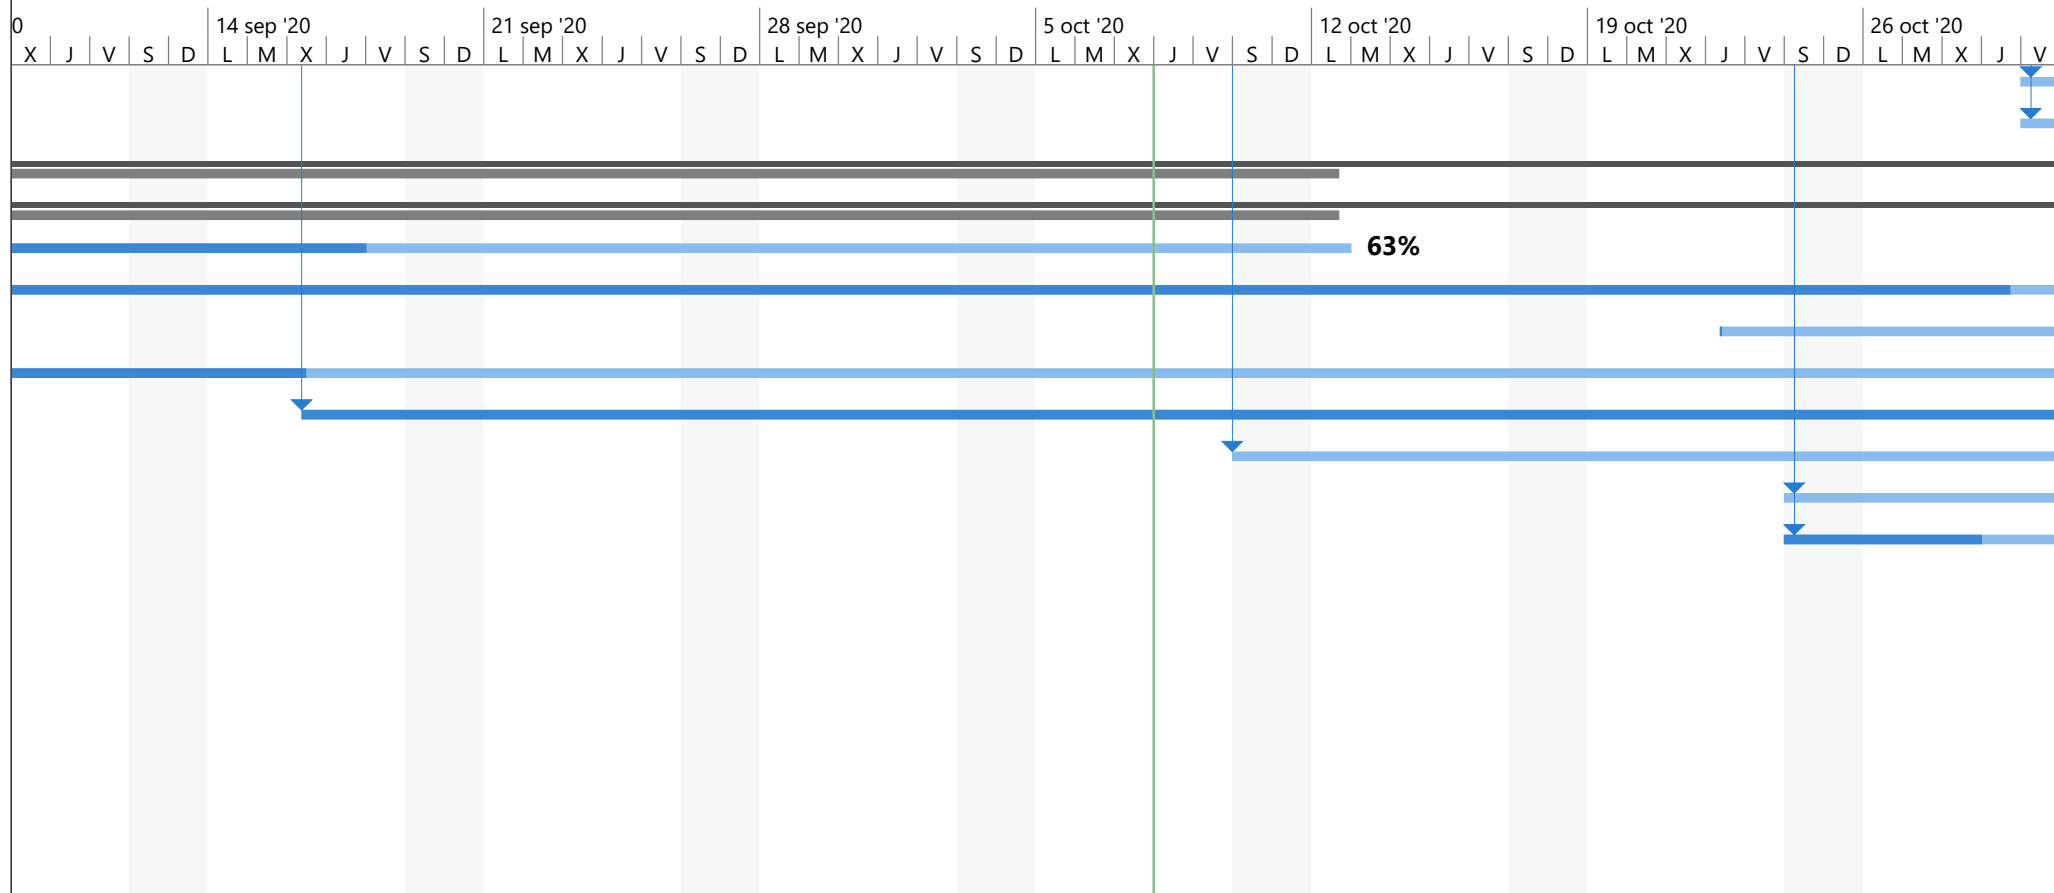

























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

| 0 | | | | | | 14 sep '20 | | | | | 21 sep '20 | | | | | 28 sep '20 | | | | | 5 oct '20 | | | | | 12 oct '20 | | | | | 19 oct '20 | | | | | 26 oct '20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|
| | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

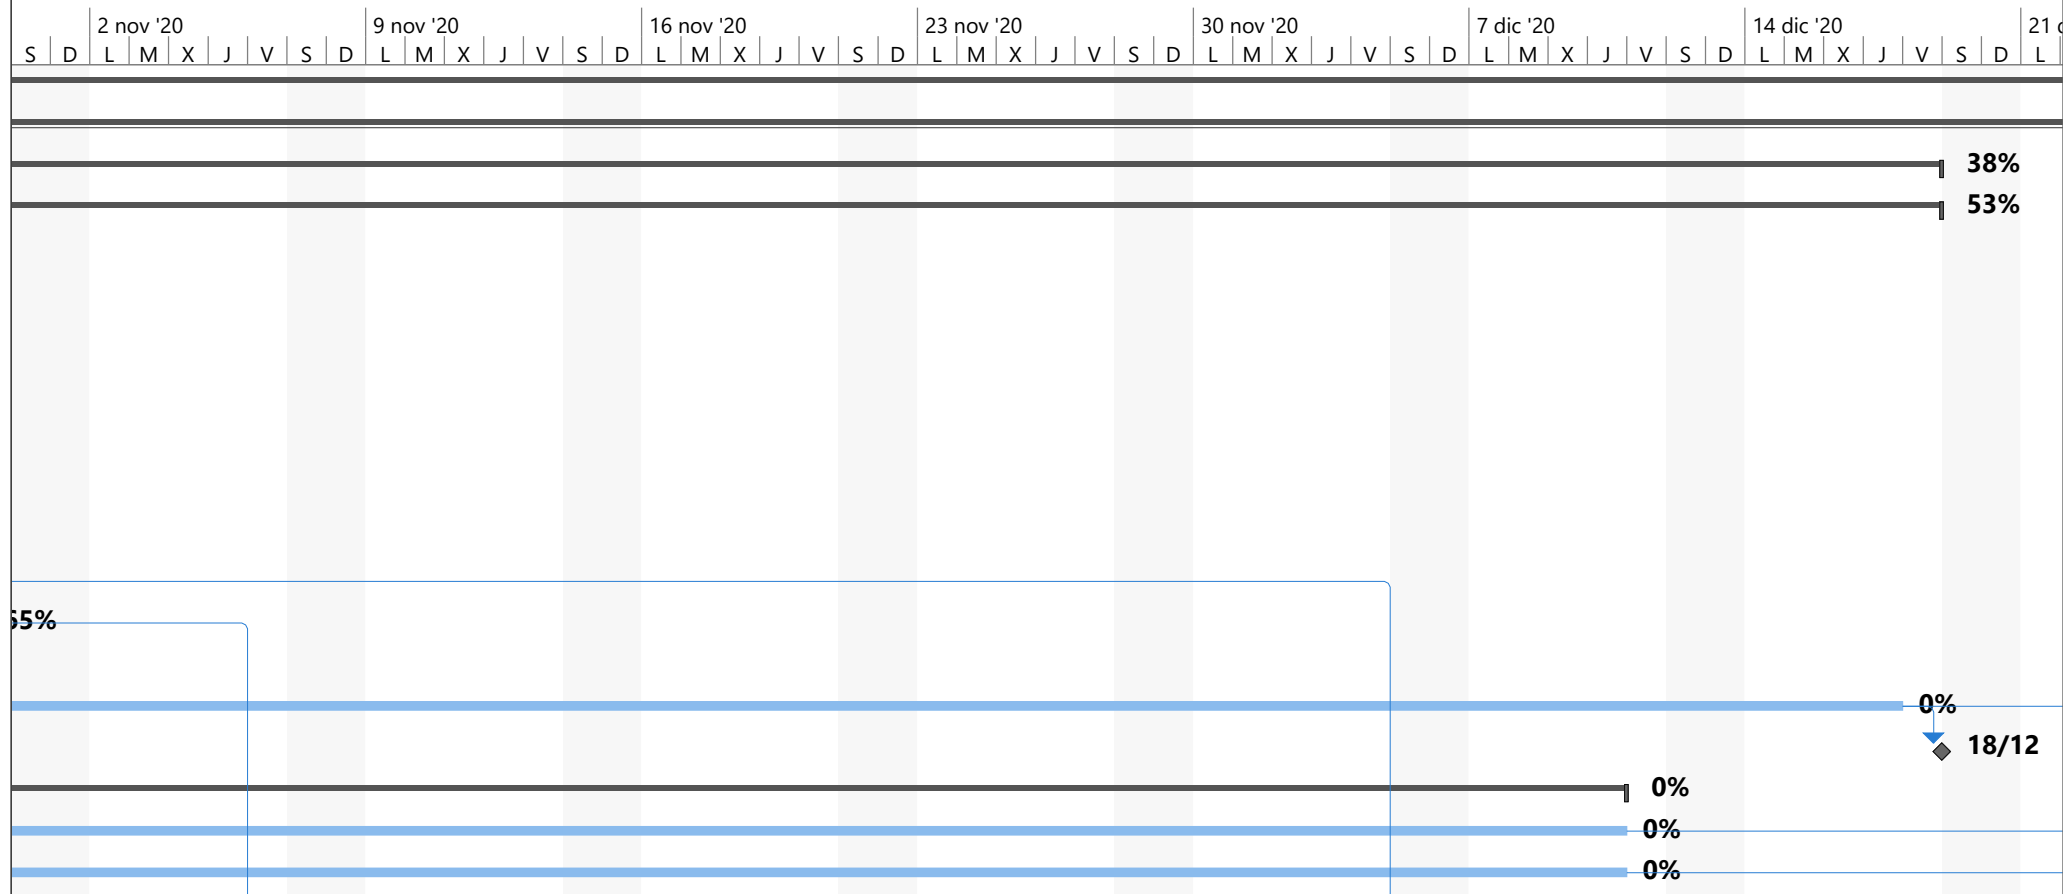

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

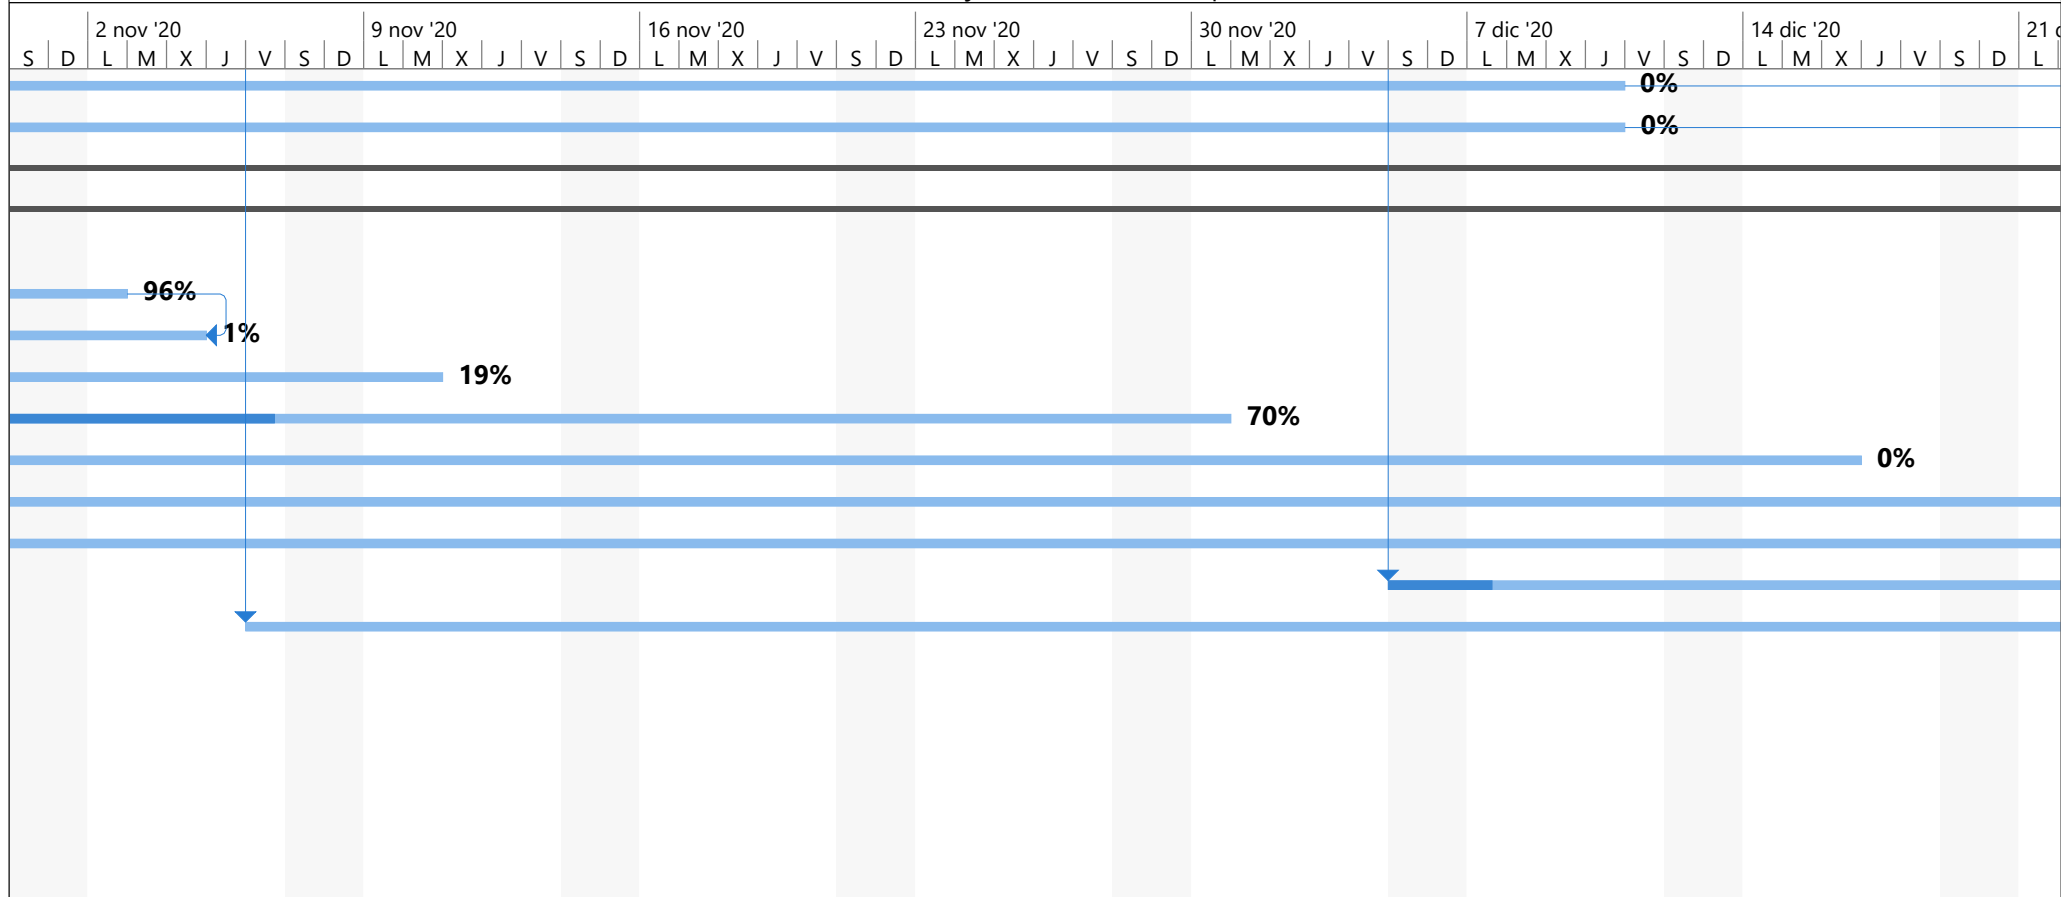

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

| | | 2 nov '20 | | | | | | | 9 nov '20 | | | | | | | 16 nov '20 | | | | | | | 23 nov '20 | | | | | | | 30 nov '20 | | | | | | | 7 dic '20 | | | | | | | 14 dic '20 | | | | | | | 21 dic '20 |
|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

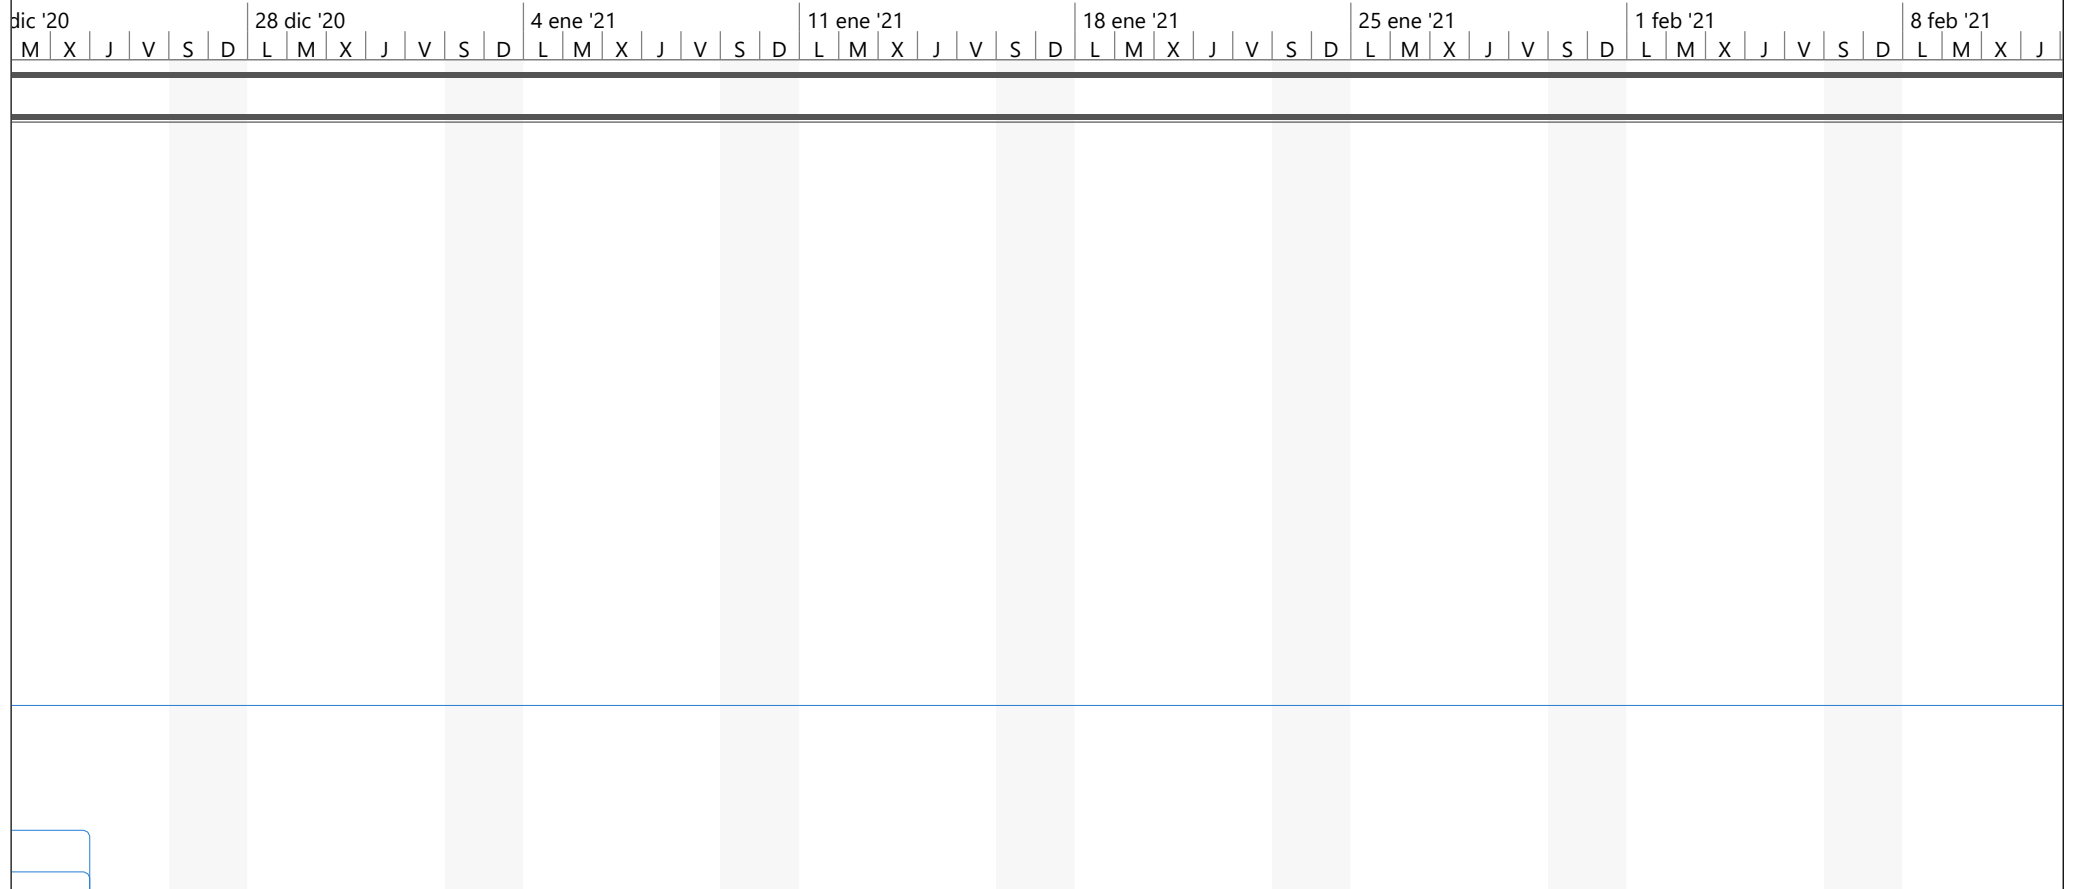

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

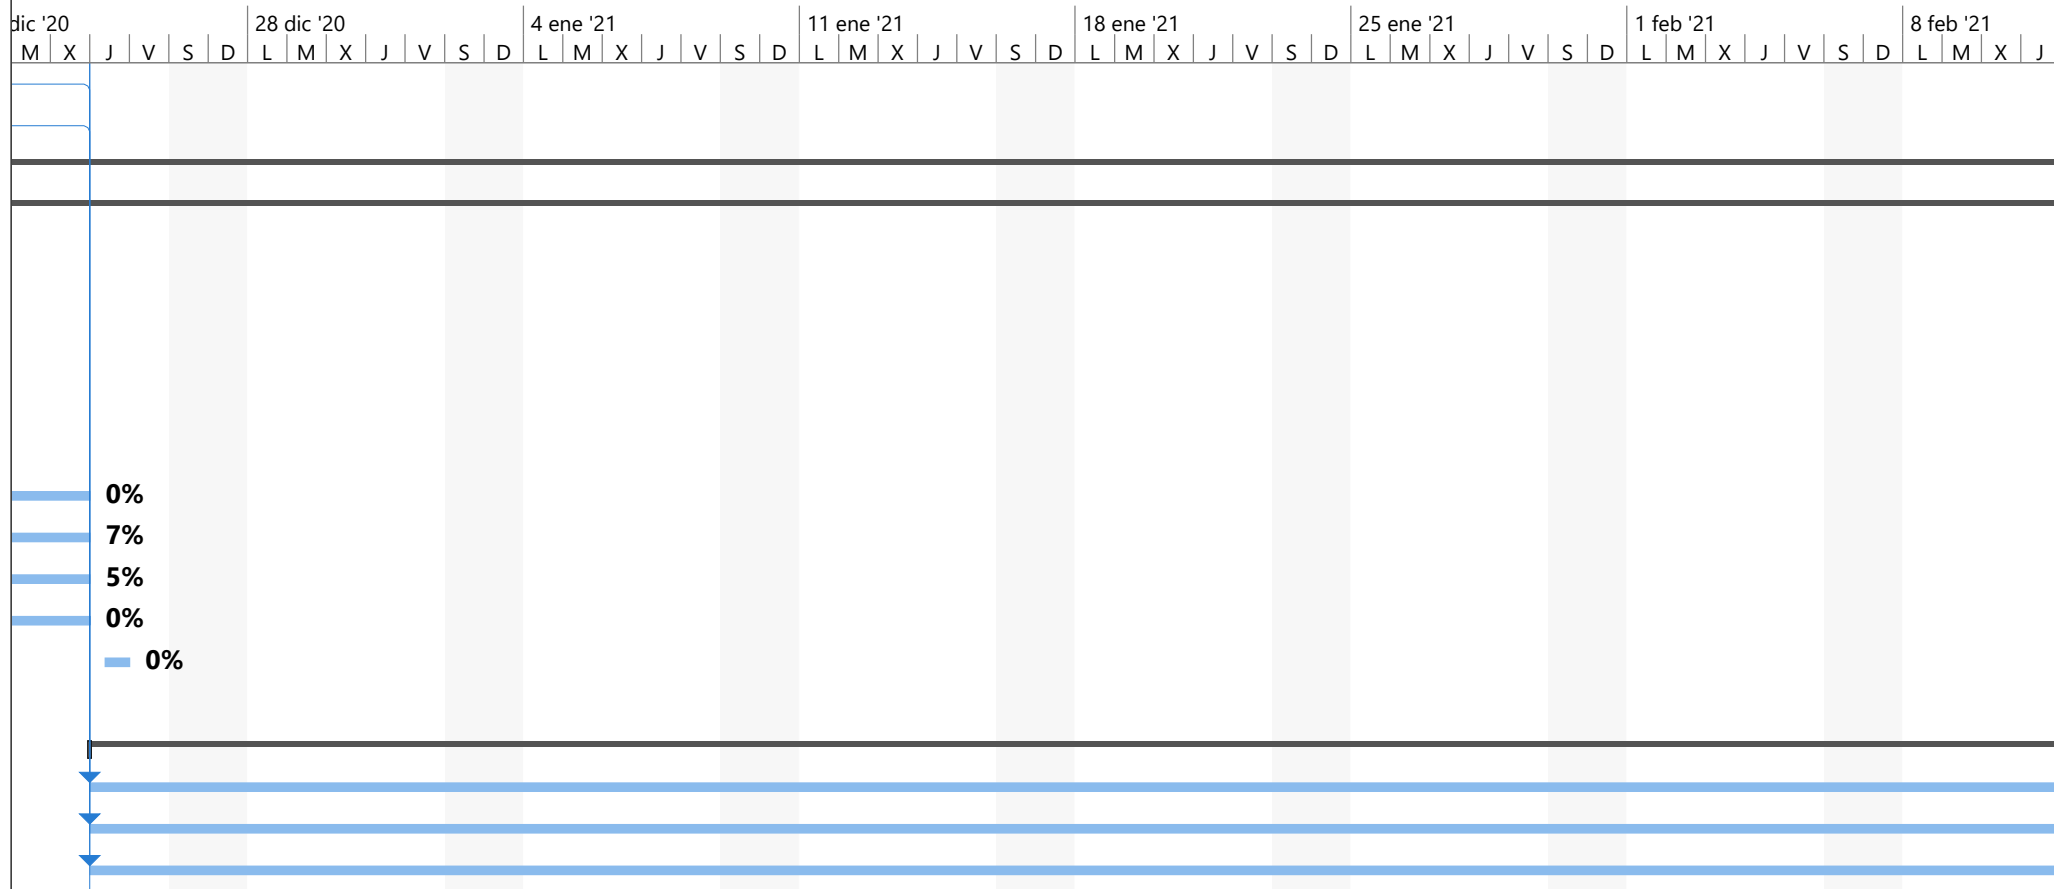


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020


dic '20 28 dic '20 4 ene '21 11 ene '21 18 ene '21 25 ene '21 1 feb '21 8 feb '21

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

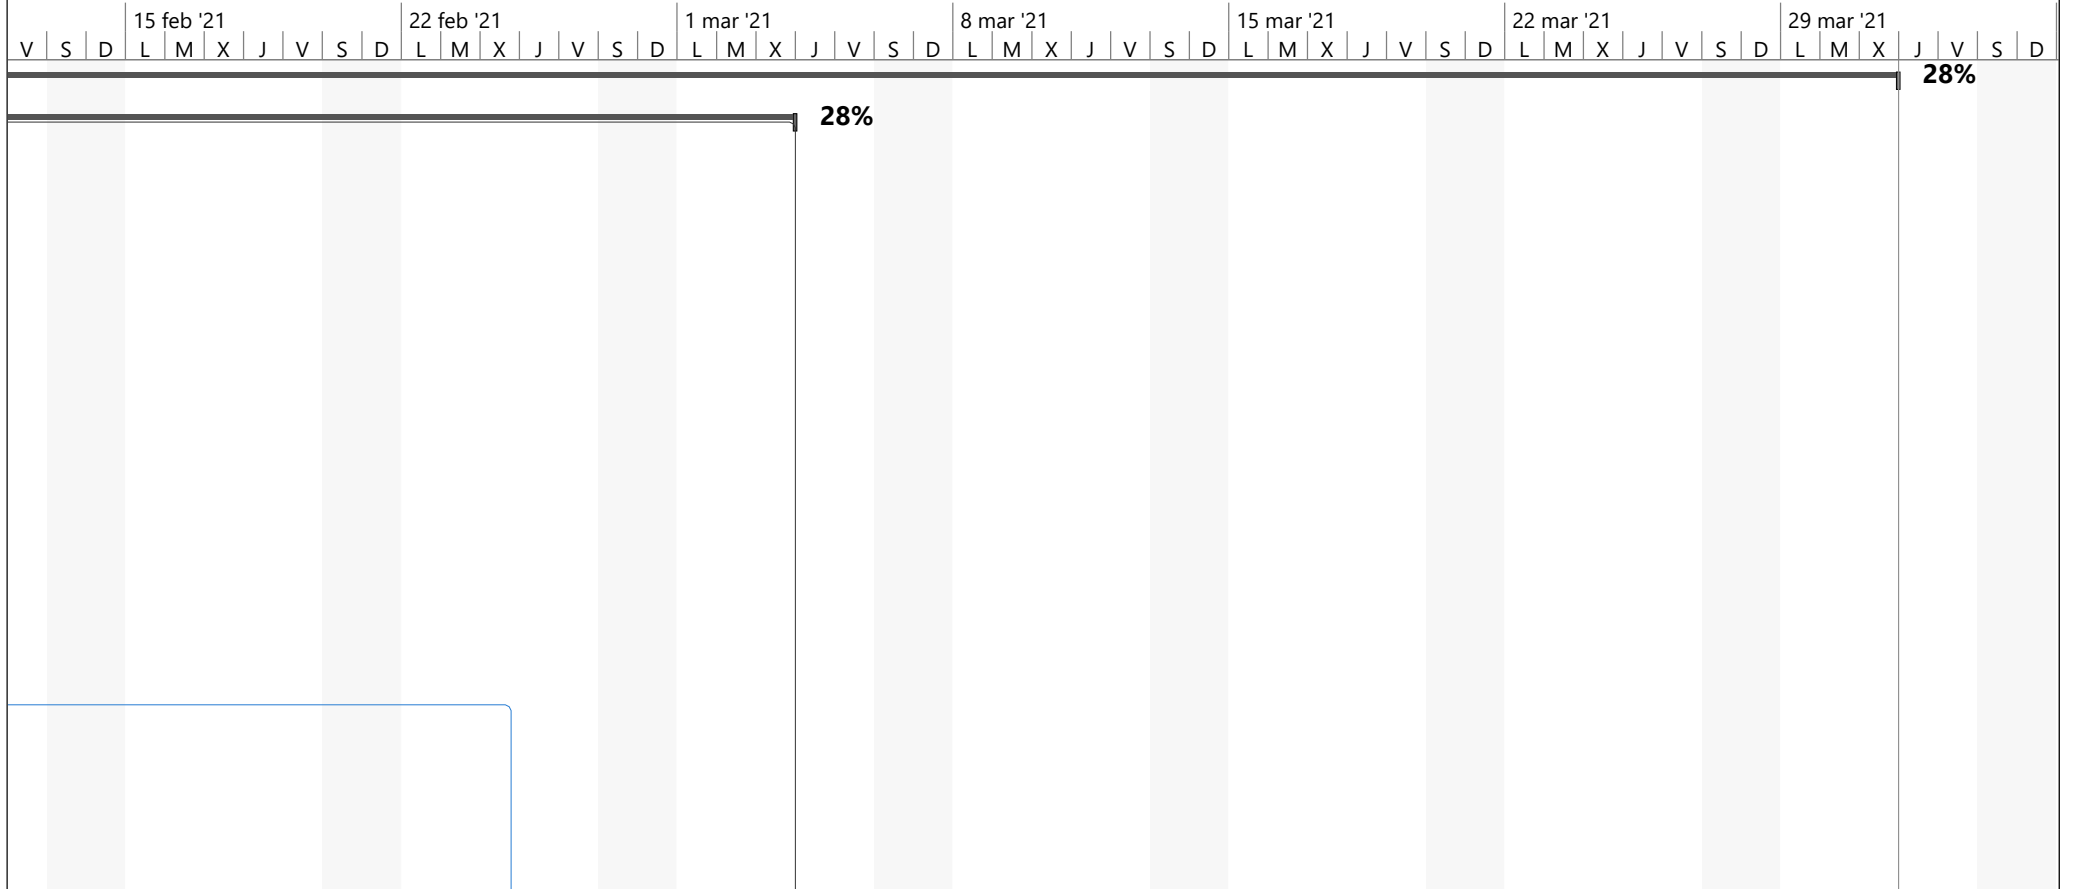


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020

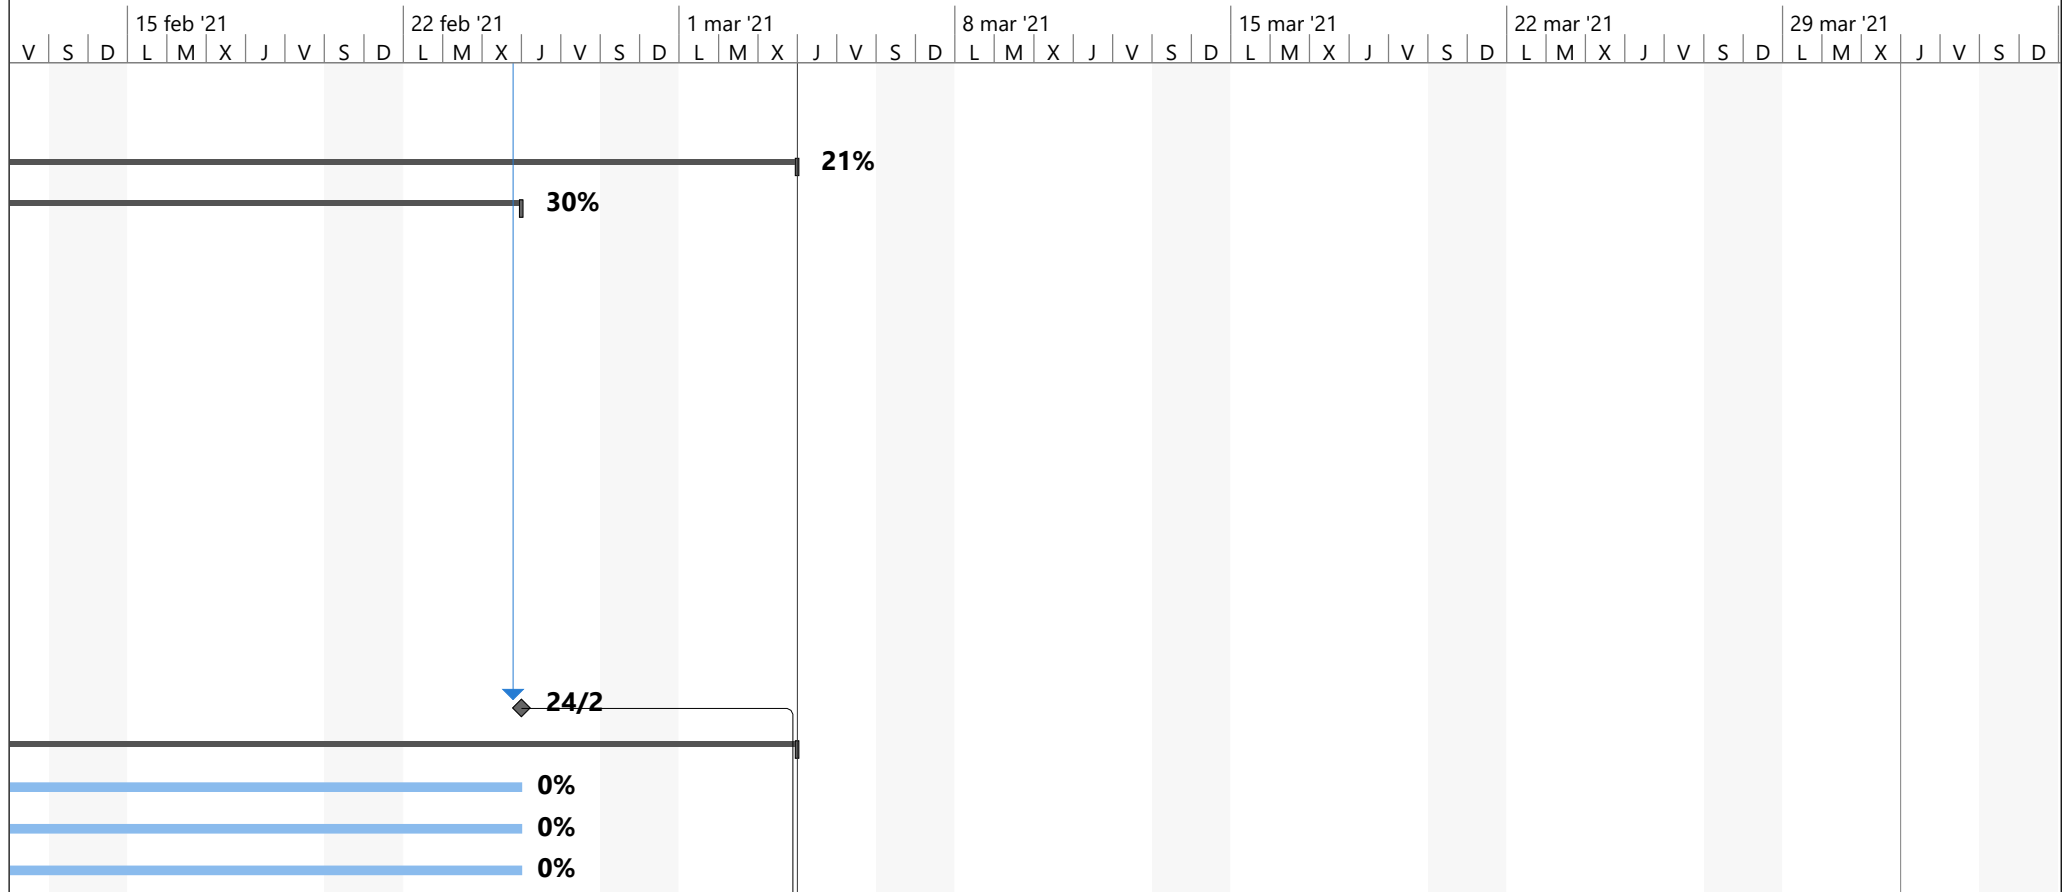

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución SABY102 Sep2020



Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenoriente Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |
