













































































# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	un '20 M X J V S D	6 jul '20 L M X J V S
0			<b>Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020</b>	<b>338 días</b>	<b>lun 21/9/20</b>	<b>mié 5/1/22</b>		
1			<b>Rehabilitación de Redes LOTE 10</b>	<b>338 días</b>	<b>lun 21/9/20</b>	<b>mié 5/1/22</b>		
2			<b>Ejecución</b>	<b>318 días</b>	<b>lun 21/9/20</b>	<b>mié 8/12/21</b>		
3			<b>Polígono 1</b>	<b>153 días</b>	<b>lun 21/9/20</b>	<b>mié 21/4/21</b>		
4			<b>Instalación</b>	<b>153 días</b>	<b>lun 21/9/20</b>	<b>mié 21/4/21</b>		
5			Excavaciones	51 días	lun 21/9/20	lun 30/11/20		
6			Izado de postes	48 días	mié 23/9/20	vie 27/11/20		
7			Cimentaciones	13 días	vie 13/11/20	mar 1/12/20		
8			Retenidas	25 días	jue 29/10/20	mié 2/12/20		
9			Armados MT y BT	42 días	jue 29/10/20	vie 25/12/20		
10			Tendido de Conductor MT y BT	40 días	jue 12/11/20	mié 6/1/21		
11			Conexiones y Jumpers	27 días	jue 3/12/20	vie 8/1/21		
12			Puesta a Tierra	27 días	jue 3/12/20	vie 8/1/21		
13			Transformadores	19 días	vie 25/12/20	mié 20/1/21		
14			Alumbrado Público	23 días	lun 28/12/20	mié 27/1/21		
15			Acometida	75 días	mar 5/1/21	lun 19/4/21		
16			Finalizacion del Poligono 1	2 días	mar 20/4/21	mié 21/4/21		
17			<b>Remoción</b>	<b>52 días</b>	<b>lun 4/1/21</b>	<b>mié 17/3/21</b>		
18			Tendido de Media y Baja Tensión	52 días	lun 4/1/21	mié 17/3/21		
19			Armados de Media y Baja Tensión	52 días	lun 4/1/21	mié 17/3/21		




























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	un '20 M X J V S D	6 jul '20 L M X J V S
20			Transformadores	52 días	lun 4/1/21	mié 17/3/21		
21			Remocion de postes	52 días	lun 4/1/21	mié 17/3/21		
22			<b>Polígono 2</b>	<b>156 días</b>	<b>mar 1/12/20</b>	<b>mar 6/7/21</b>		
23			<b>Instalación</b>	<b>156 días</b>	<b>mar 1/12/20</b>	<b>mar 6/7/21</b>		
24			Excavaciones	52 días	mar 1/12/20	mié 10/2/21		
25			Izado de postes	48 días	lun 7/12/20	mié 10/2/21		
26			Cimentaciones	14 días	mar 26/1/21	vie 12/2/21		
27			Retenidas	26 días	vie 8/1/21	vie 12/2/21		
28			Armados MT y BT	40 días	lun 28/12/20	vie 19/2/21		
29			Tendido de Conductor MT y BT	36 días	jue 7/1/21	jue 25/2/21		
30			Conexiones y Jumpers	22 días	lun 1/2/21	mar 2/3/21		
31			Puesta a Tierra	22 días	lun 1/2/21	mar 2/3/21		
32			Transformadores	18 días	jue 11/2/21	lun 8/3/21		
33			Alumbrado Público	31 días	jue 18/2/21	jue 1/4/21		
34			Acometida	55 días	mar 20/4/21	lun 5/7/21		
35			Finalizacion del Poligono 2	1 día	mar 6/7/21	mar 6/7/21		
36			<b>Remoción</b>	<b>50 días</b>	<b>mié 17/3/21</b>	<b>mié 26/5/21</b>		
37			Tendido de Media y Baja Tensión	50 días	mié 17/3/21	mié 26/5/21		
38			Armados de Media y Baja Tensión	50 días	mié 17/3/21	mié 26/5/21		
39			Transformadores	50 días	mié 17/3/21	mié 26/5/21		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	jun '20	7 jul '20
							M X J V S D	L M X J V S
40			Remocion de postes	50 días	mié 17/3/21	mié 26/5/21		
41			<b>Polígono 3</b>	<b>124 días</b>	<b>jue 11/2/21</b>	<b>mar 3/8/21</b>		
42			<b>Instalación</b>	<b>124 días</b>	<b>jue 11/2/21</b>	<b>mar 3/8/21</b>		
43			Excavaciones	17 días	jue 11/2/21	vie 5/3/21		
44			Izado de postes	16 días	lun 15/2/21	lun 8/3/21		
45			Cimentaciones	5 días	jue 4/3/21	mié 10/3/21		
46			Retenidas	9 días	mar 2/3/21	vie 12/3/21		
47			Armados MT y BT	14 días	lun 22/2/21	jue 11/3/21		
48			Tendido de Conductor MT y BT	15 días	vie 5/3/21	jue 25/3/21		
49			Conexiones y Jumpers	9 días	mié 24/3/21	lun 5/4/21		
50			Puesta a Tierra	6 días	mié 24/3/21	mié 31/3/21		
51			Transformadores	5 días	mar 6/4/21	lun 12/4/21		
52			Alumbrado Público	10 días	vie 2/4/21	jue 15/4/21		
53			Acometida	20 días	mar 6/7/21	lun 2/8/21		
54			Finalizacion del Poligono 3	1 día	mar 3/8/21	mar 3/8/21		
55			<b>Remoción</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 26/5/21</b>	<b>mié 16/6/21</b>		
56			Tendido de Media y Baja Tensión	15 días	mié 26/5/21	mié 16/6/21		
57			Armados de Media y Baja Tensión	15 días	mié 26/5/21	mié 16/6/21		
58			Transformadores	15 días	mié 26/5/21	mié 16/6/21		
59			Remocion de postes	15 días	mié 26/5/21	mié 16/6/21		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	jun '20	7 jul '20
							M X J V S D	L M X J V S
60			<b>Polígono 4</b>	<b>148 días</b>	<b>lun 8/3/21</b>	<b>mié 29/9/21</b>		
61			<b>Instalación</b>	<b>148 días</b>	<b>lun 8/3/21</b>	<b>mié 29/9/21</b>		
62			Excavaciones	16 días	lun 8/3/21	lun 29/3/21		
63			Izado de postes	14 días	mar 9/3/21	vie 26/3/21		
64			Cimentaciones	10 días	mié 17/3/21	mar 30/3/21		
65			Retenidas	9 días	lun 22/3/21	jue 1/4/21		
66			Armados MT y BT	13 días	vie 12/3/21	mar 30/3/21		
67			Tendido de Conductor MT y BT	19 días	vie 2/4/21	mié 28/4/21		
68			Conexiones y Jumpers	10 días	mar 20/4/21	lun 3/5/21		
69			Puesta a Tierra	10 días	jue 22/4/21	mié 5/5/21		
70			Transformadores	7 días	mar 4/5/21	mié 12/5/21		
71			Alumbrado Público	9 días	vie 7/5/21	mié 19/5/21		
72			Totalizadores	4 días	jue 13/5/21	mar 18/5/21		
73			Acometida	40 días	mar 3/8/21	lun 27/9/21		
74			Finalizacion del Poligono 4	2 días	mar 28/9/21	mié 29/9/21		
75			<b>Remoción</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 3/8/21</b>	<b>lun 27/9/21</b>		
76			Tendido de Media y Baja Tensión	40 días	mar 3/8/21	lun 27/9/21		
77			Armados de Media y Baja Tensión	40 días	mar 3/8/21	lun 27/9/21		
78			Transformadores	40 días	mar 3/8/21	lun 27/9/21		
79			Remocion de postes	40 días	mar 3/8/21	lun 27/9/21		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	un '20 M X J V S D	6 jul '20 L M X J V S
80			<b>Polígono 5</b>	<b>183 días</b>	<b>lun 29/3/21</b>	<b>mié 8/12/21</b>		
81			<b>Instalación</b>	<b>183 días</b>	<b>lun 29/3/21</b>	<b>mié 8/12/21</b>		
82			Excavaciones	26 días	mar 30/3/21	mar 4/5/21		
83			Izado de postes	24 días	lun 29/3/21	jue 29/4/21		
84			Cimentaciones	13 días	jue 15/4/21	lun 3/5/21		
85			Retenidas	14 días	vie 23/4/21	mié 12/5/21		
86			Armados MT y BT	21 días	mié 14/4/21	mié 12/5/21		
87			Tendido de Conductor MT y BT	27 días	jue 29/4/21	vie 4/6/21		
88			Conexiones y Jumpers	15 días	jue 20/5/21	mié 9/6/21		
89			Puesta a Tierra	15 días	lun 24/5/21	vie 11/6/21		
90			Transformadores	13 días	jue 3/6/21	lun 21/6/21		
91			Alumbrado Público	15 días	jue 10/6/21	mié 30/6/21		
92			Acometida	50 días	mar 28/9/21	lun 6/12/21		
93			Finalizacion del Poligono 5	2 días	mar 7/12/21	mié 8/12/21		
94			<b>Remoción</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 7/9/21</b>	<b>lun 15/11/21</b>		
95			Tendido de Media y Baja Tensión	50 días	mar 28/9/21	lun 6/12/21		
96			Armados de Media y Baja Tensión	50 días	mar 28/9/21	lun 6/12/21		
97			Transformadores	50 días	mar 28/9/21	lun 6/12/21		
98			Remocion de postes	50 días	mar 28/9/21	lun 6/12/21		
99			<b>Cierre de Obras</b>	<b>20 días</b>	<b>jue 9/12/21</b>	<b>mié 5/1/22</b>		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]





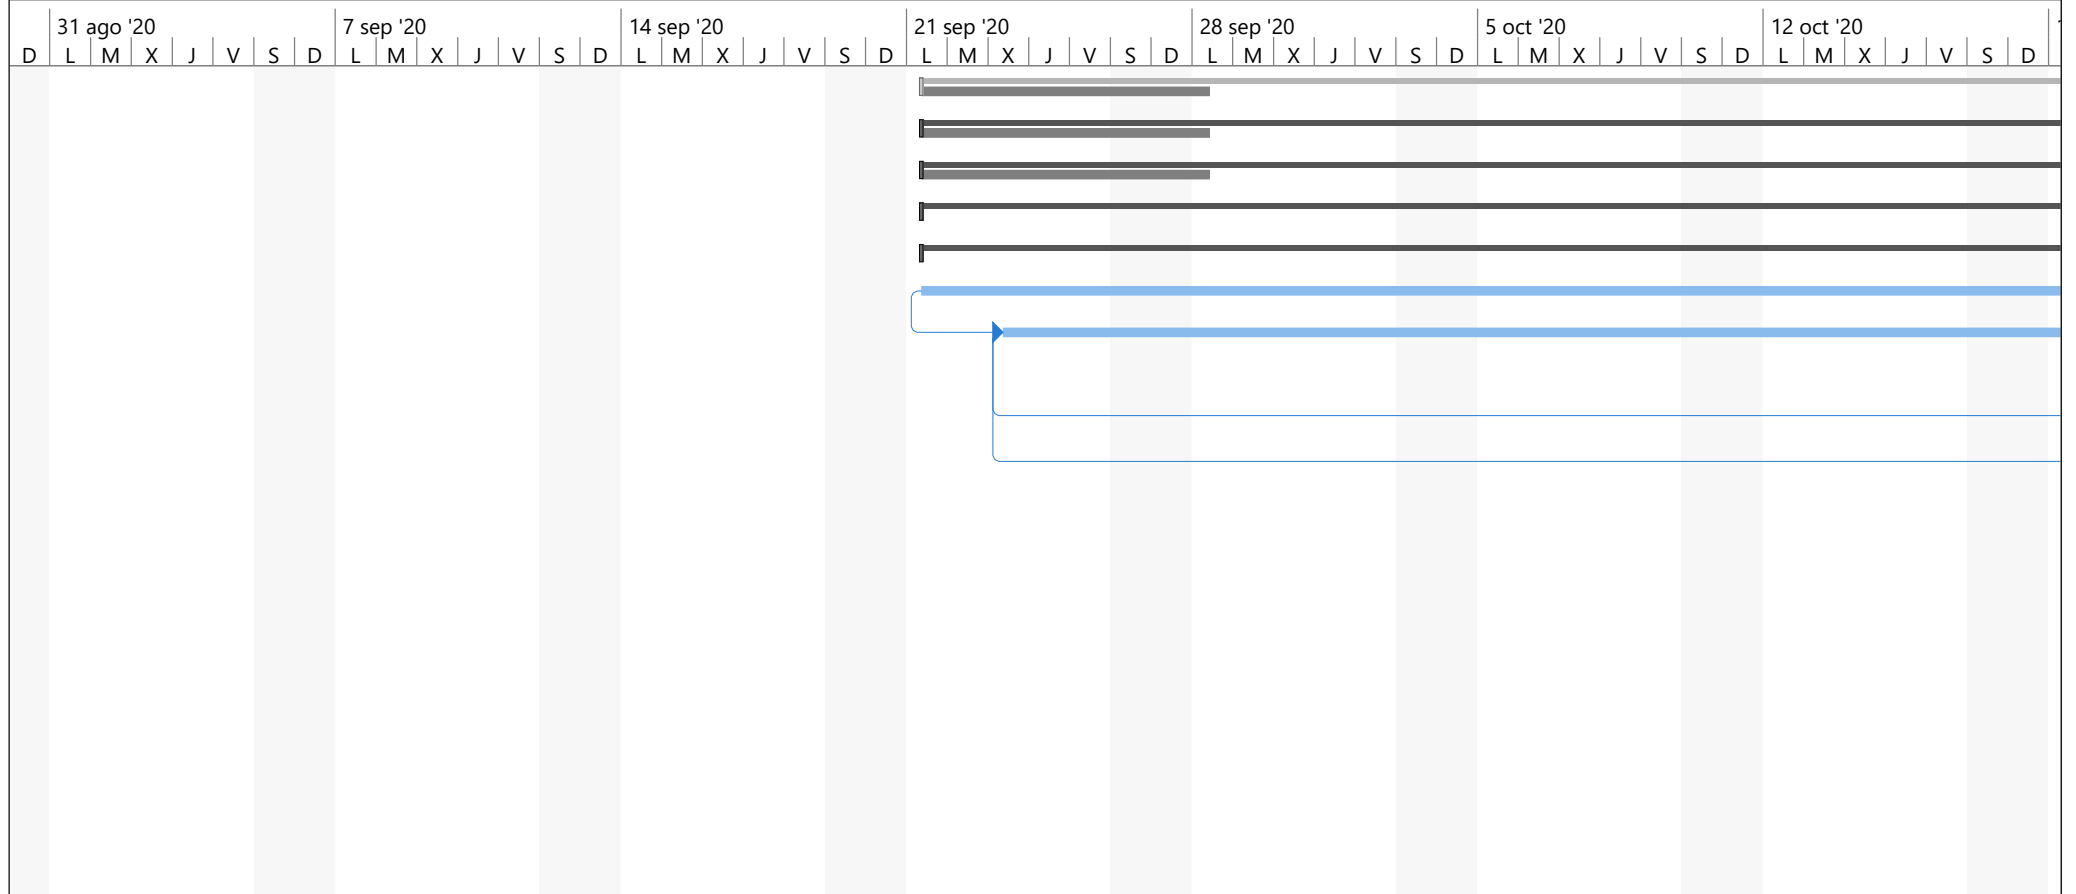



















Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020



























## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

31 ago '20							7 sep '20							14 sep '20							21 sep '20							28 sep '20							5 oct '20							12 oct '20							1
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	1						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

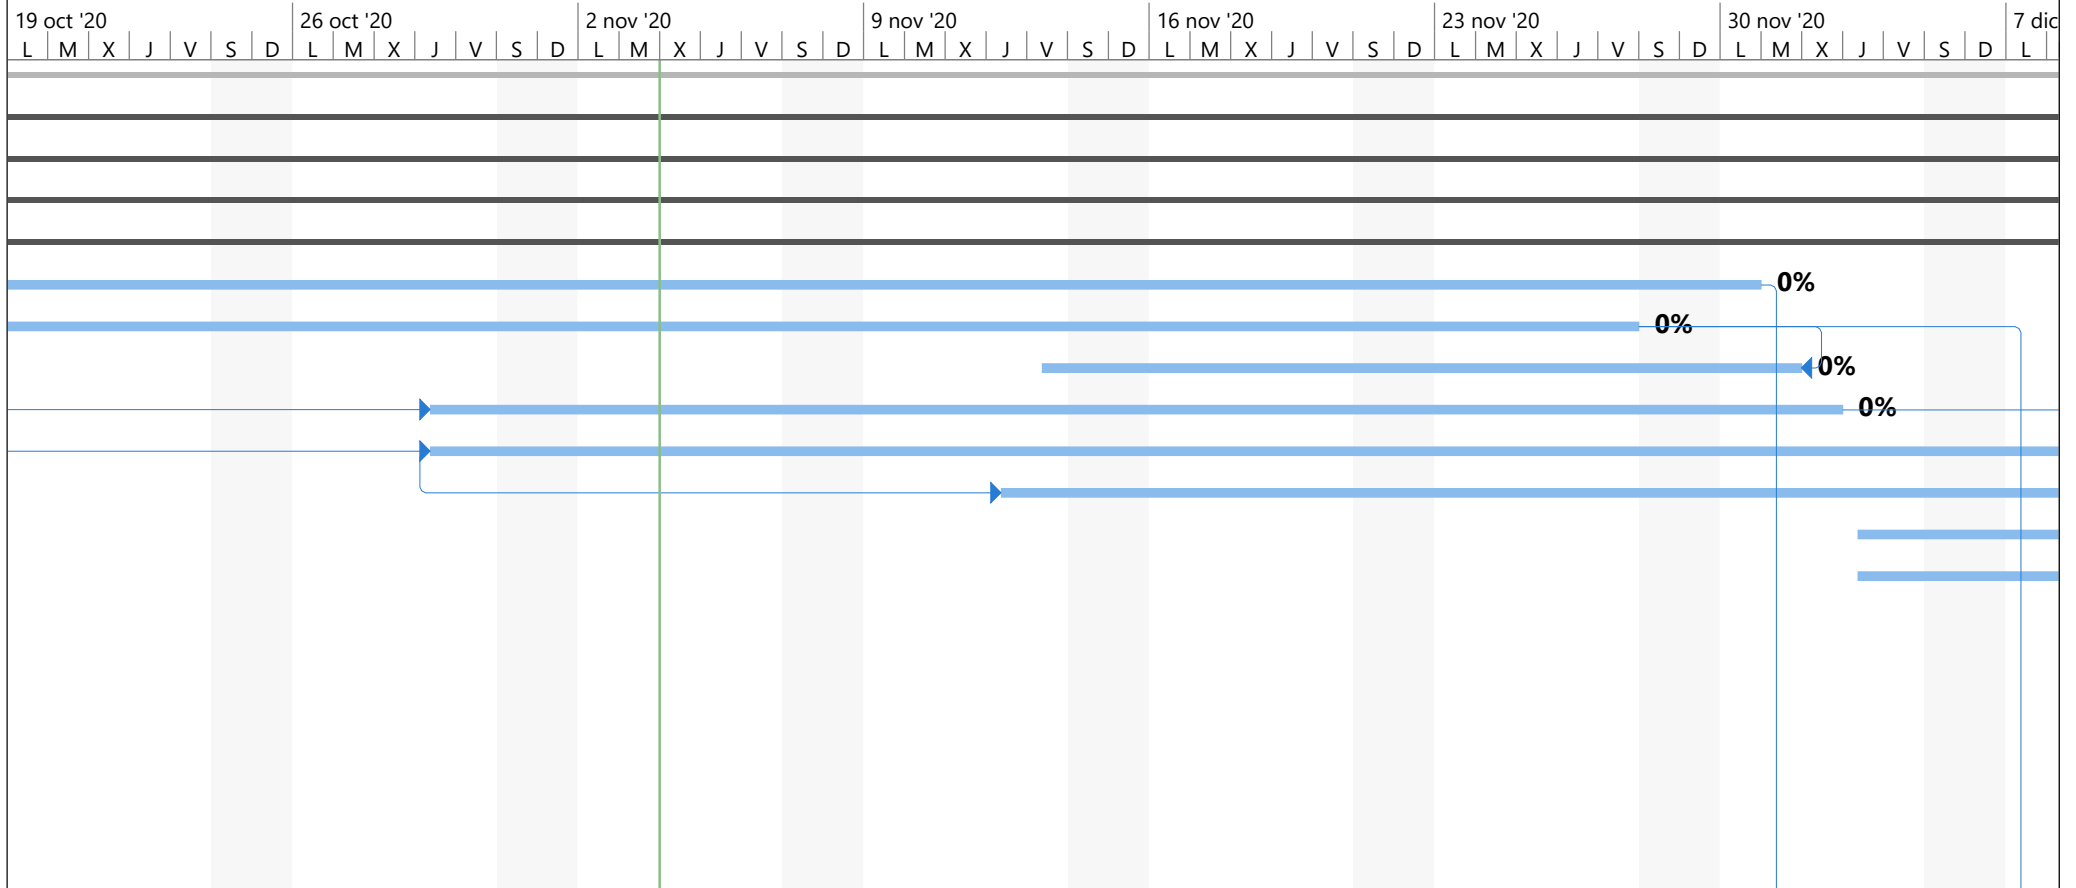

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	






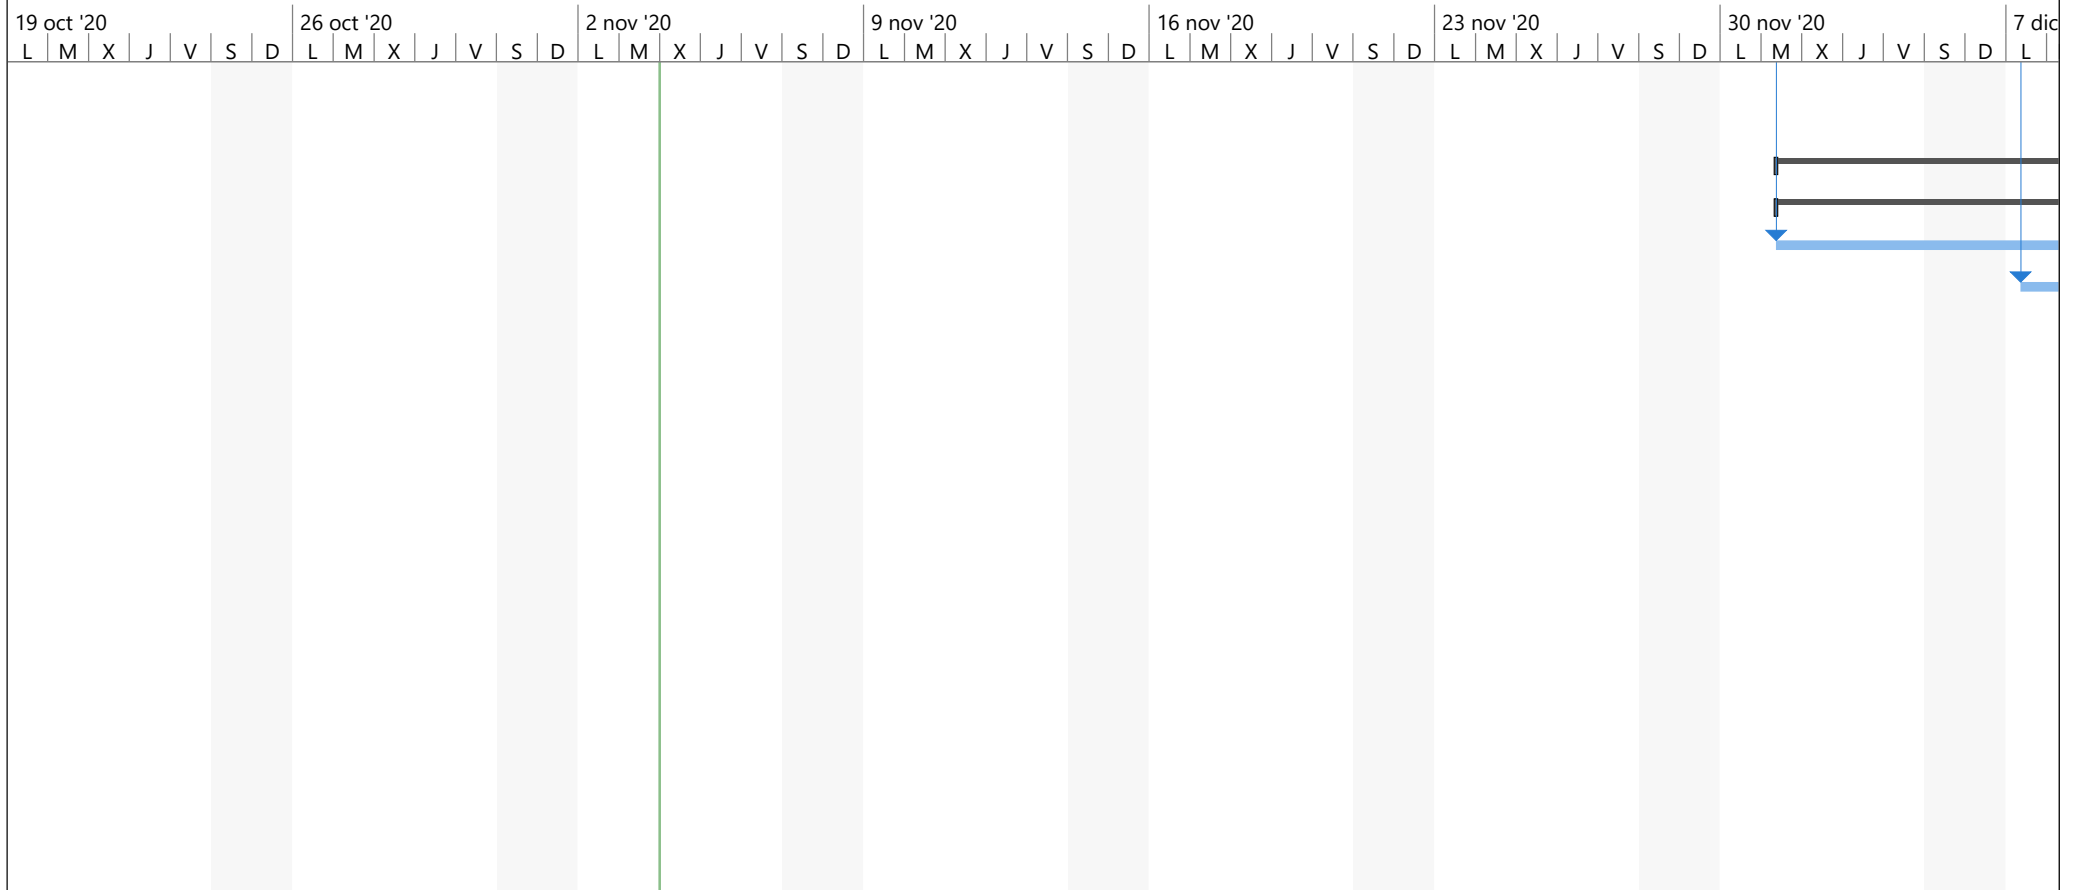




















# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

19 oct '20							26 oct '20							2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20							30 nov '20							7 dic	
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L								

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

19 oct '20							26 oct '20							2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20							30 nov '20							7 dic
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

19 oct '20							26 oct '20							2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20							30 nov '20							7 dic
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

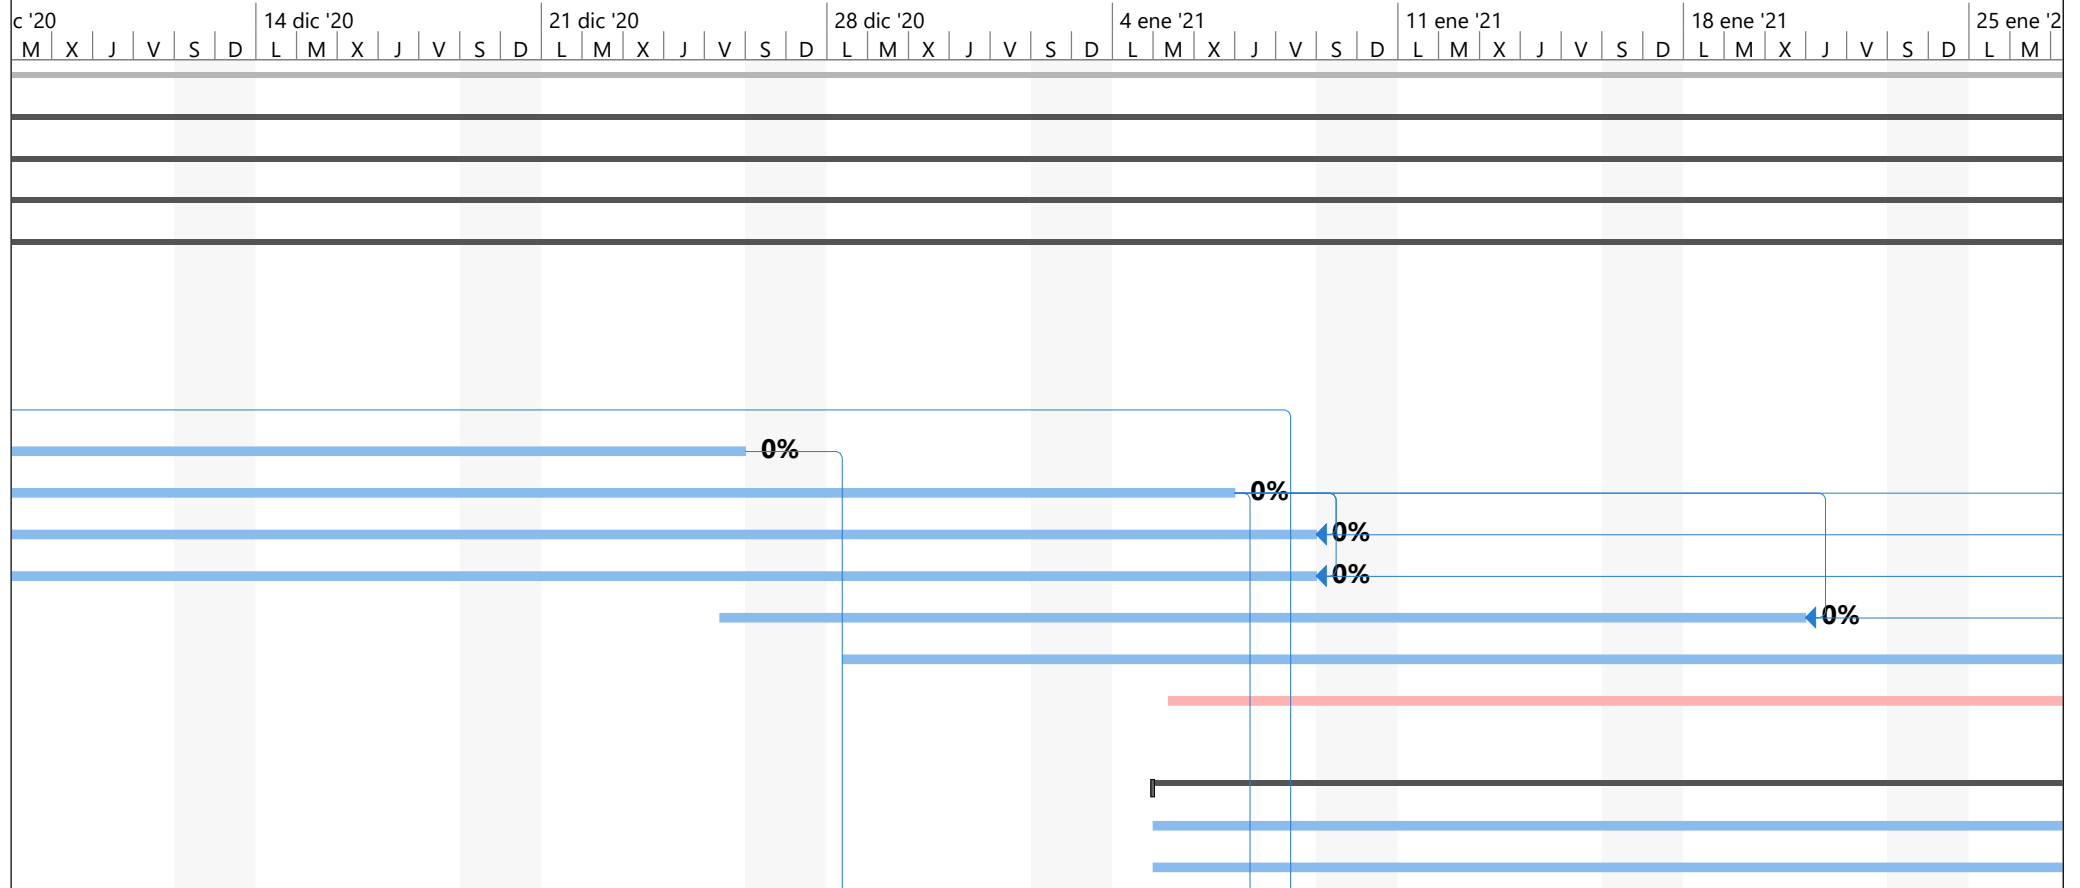

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

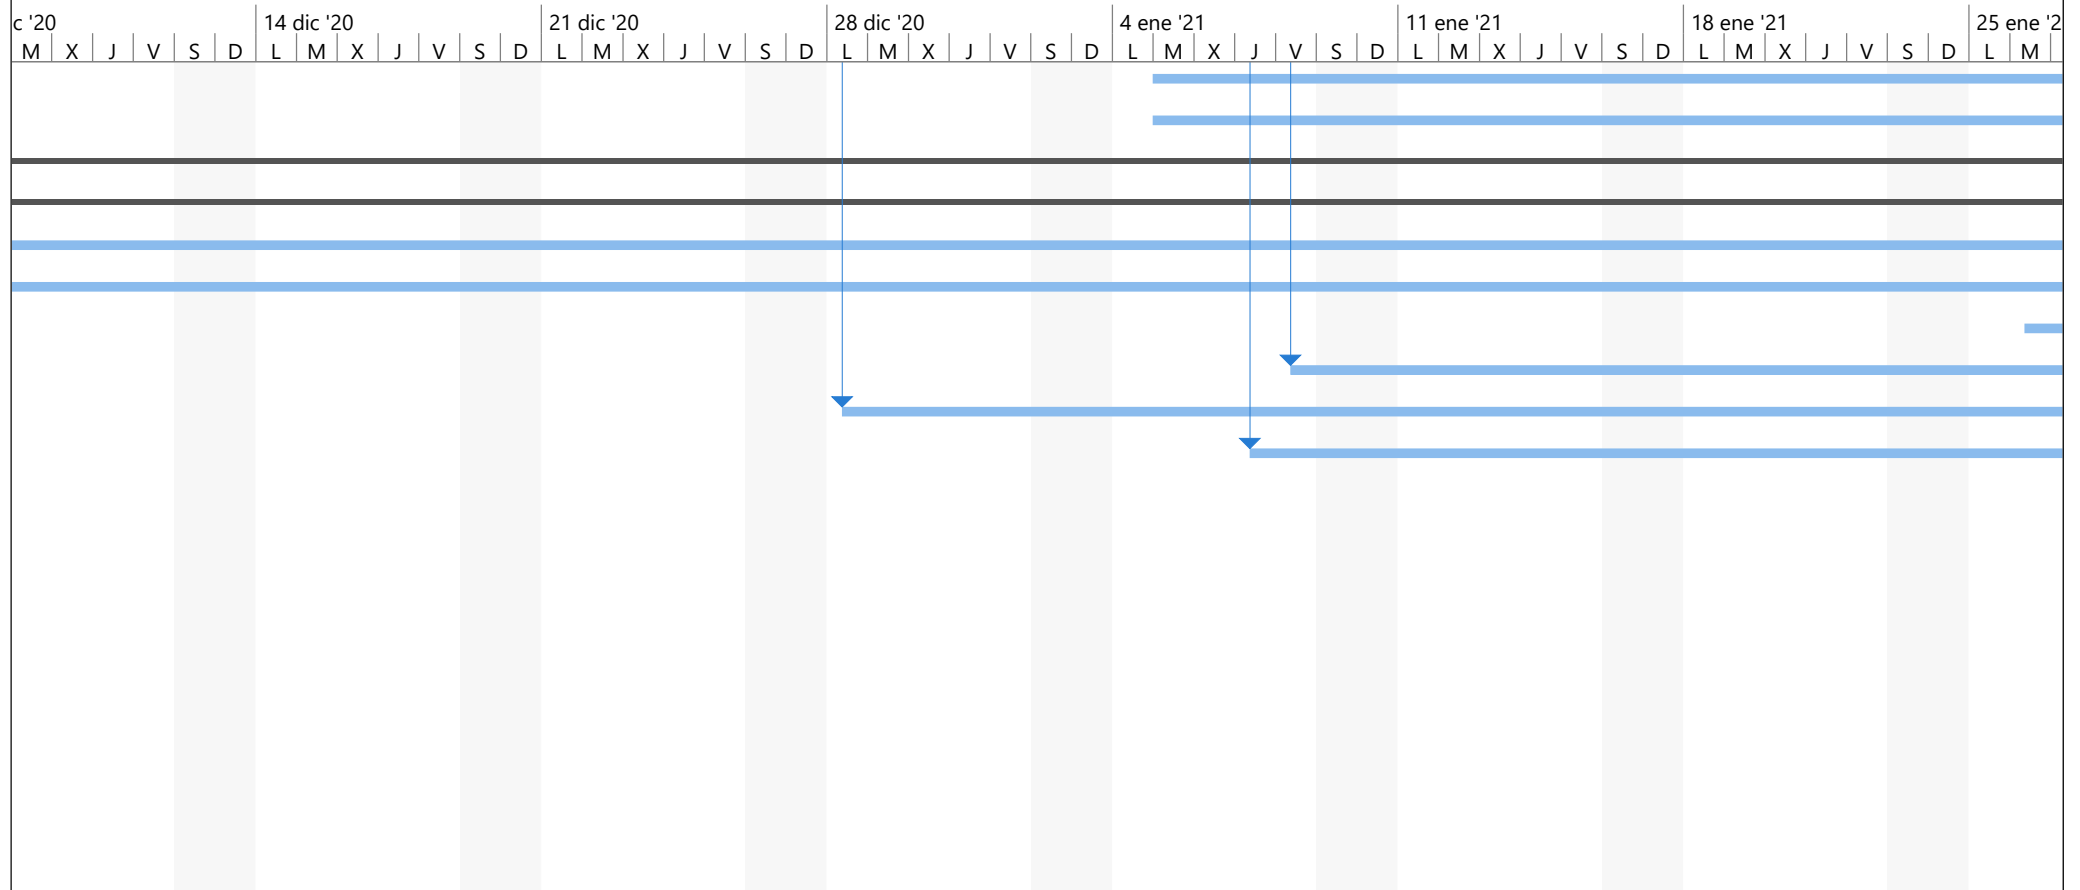

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	









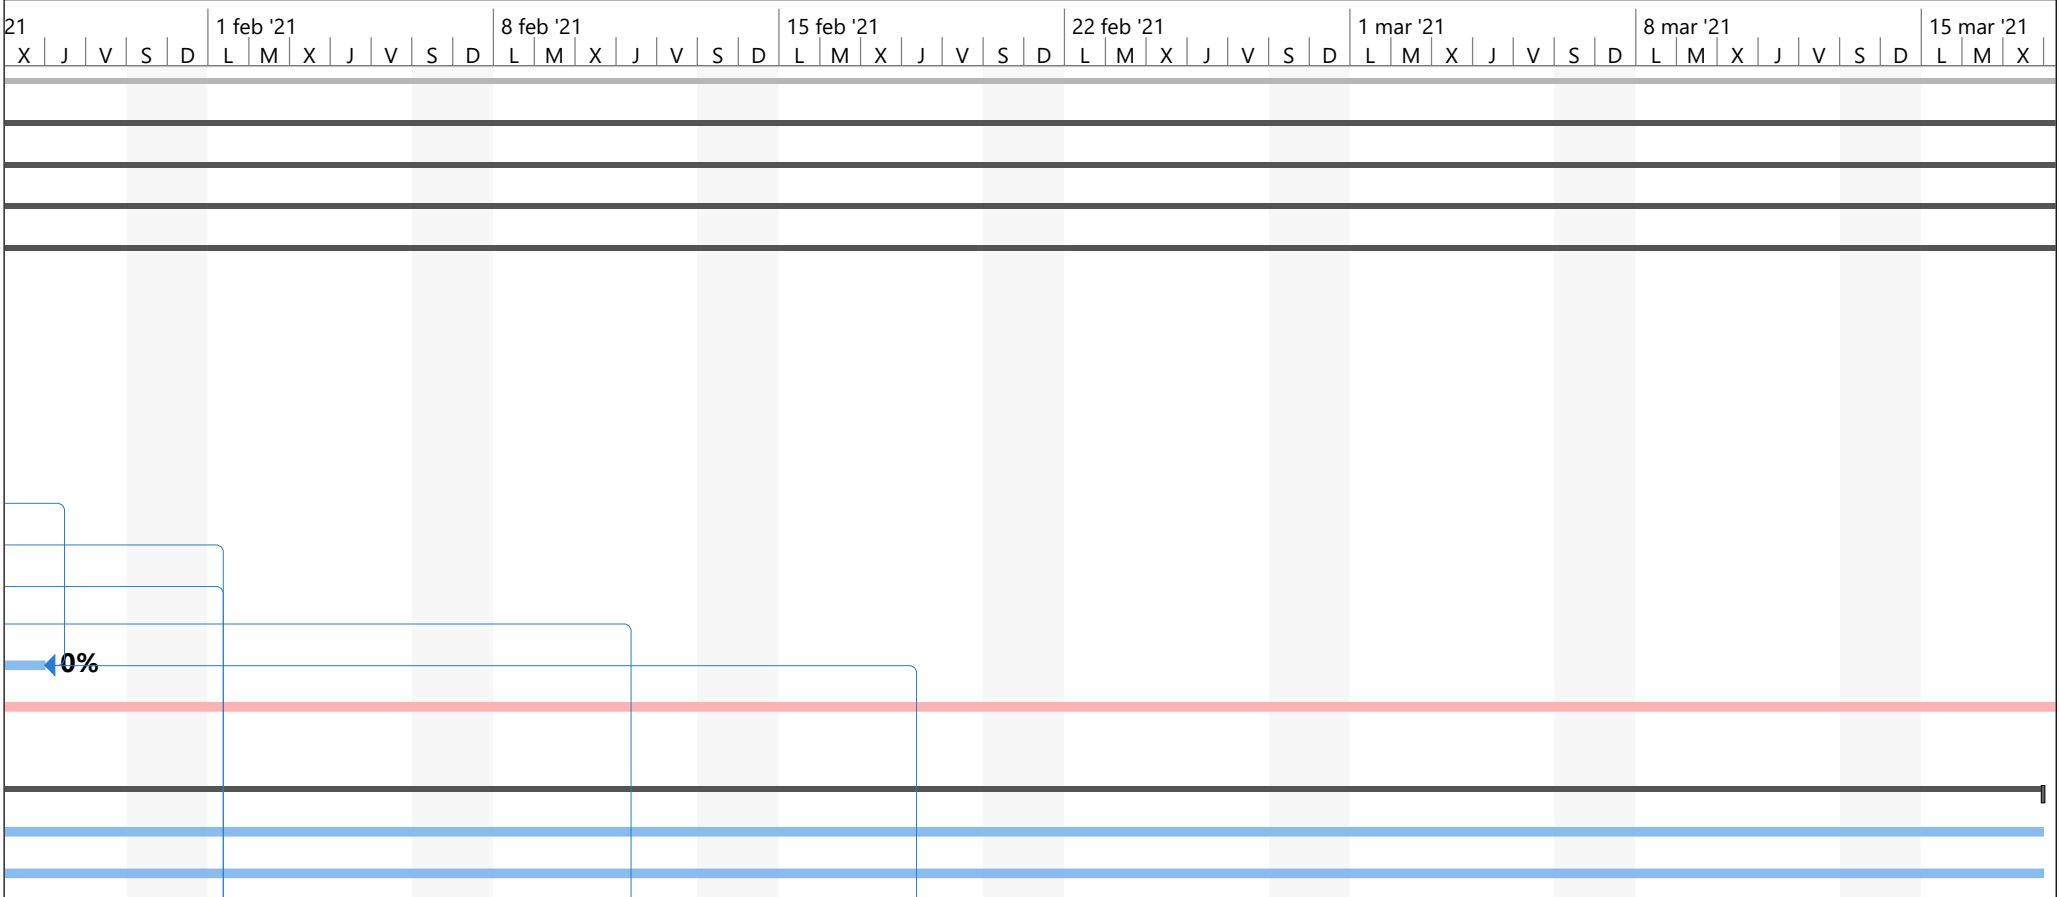

















[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

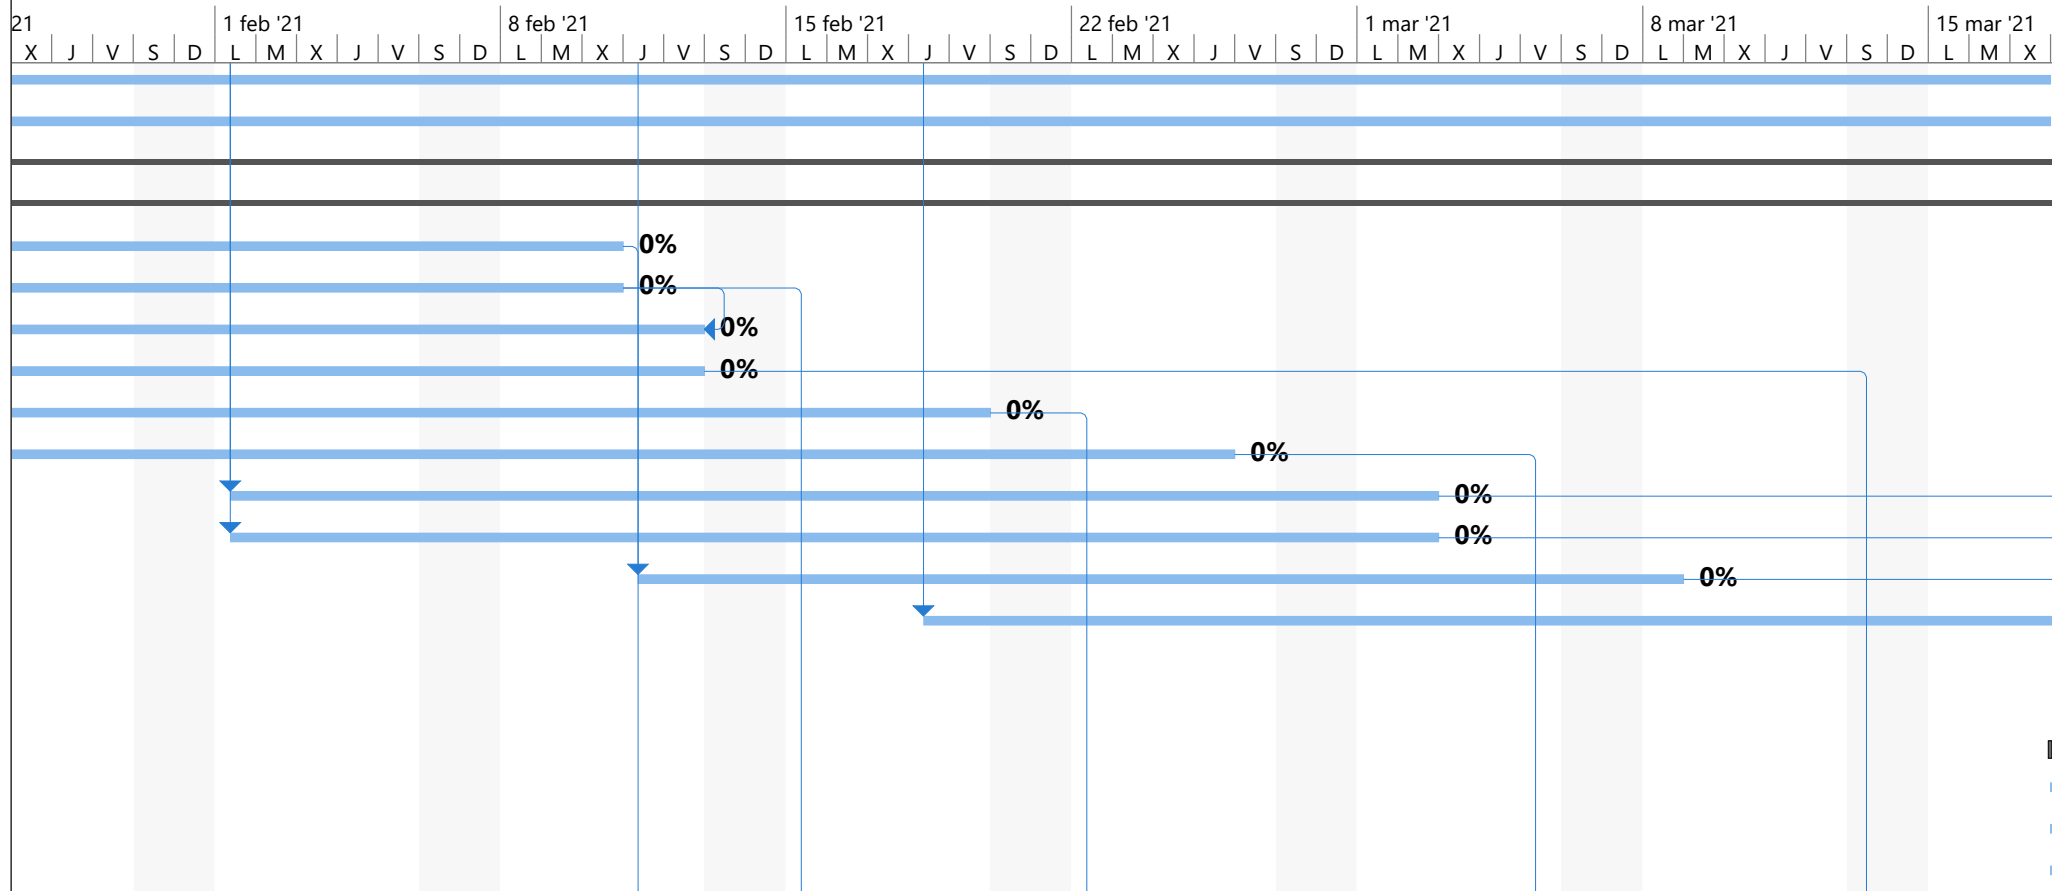


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

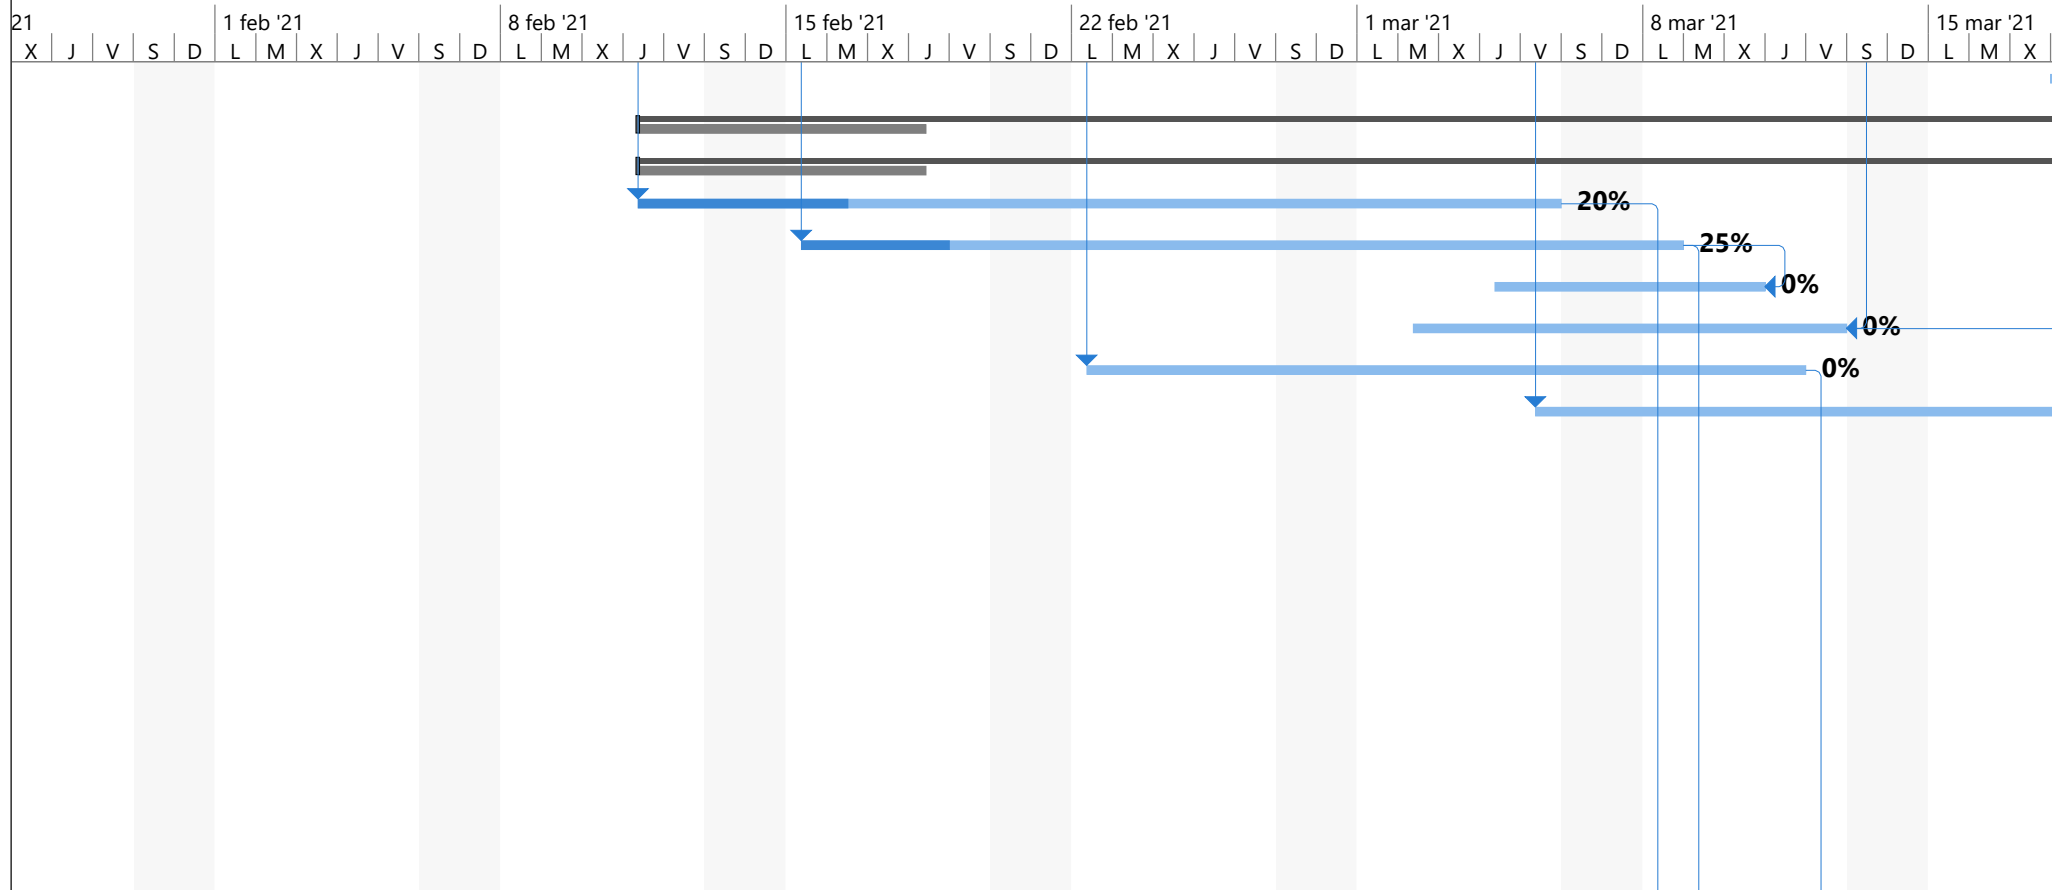

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




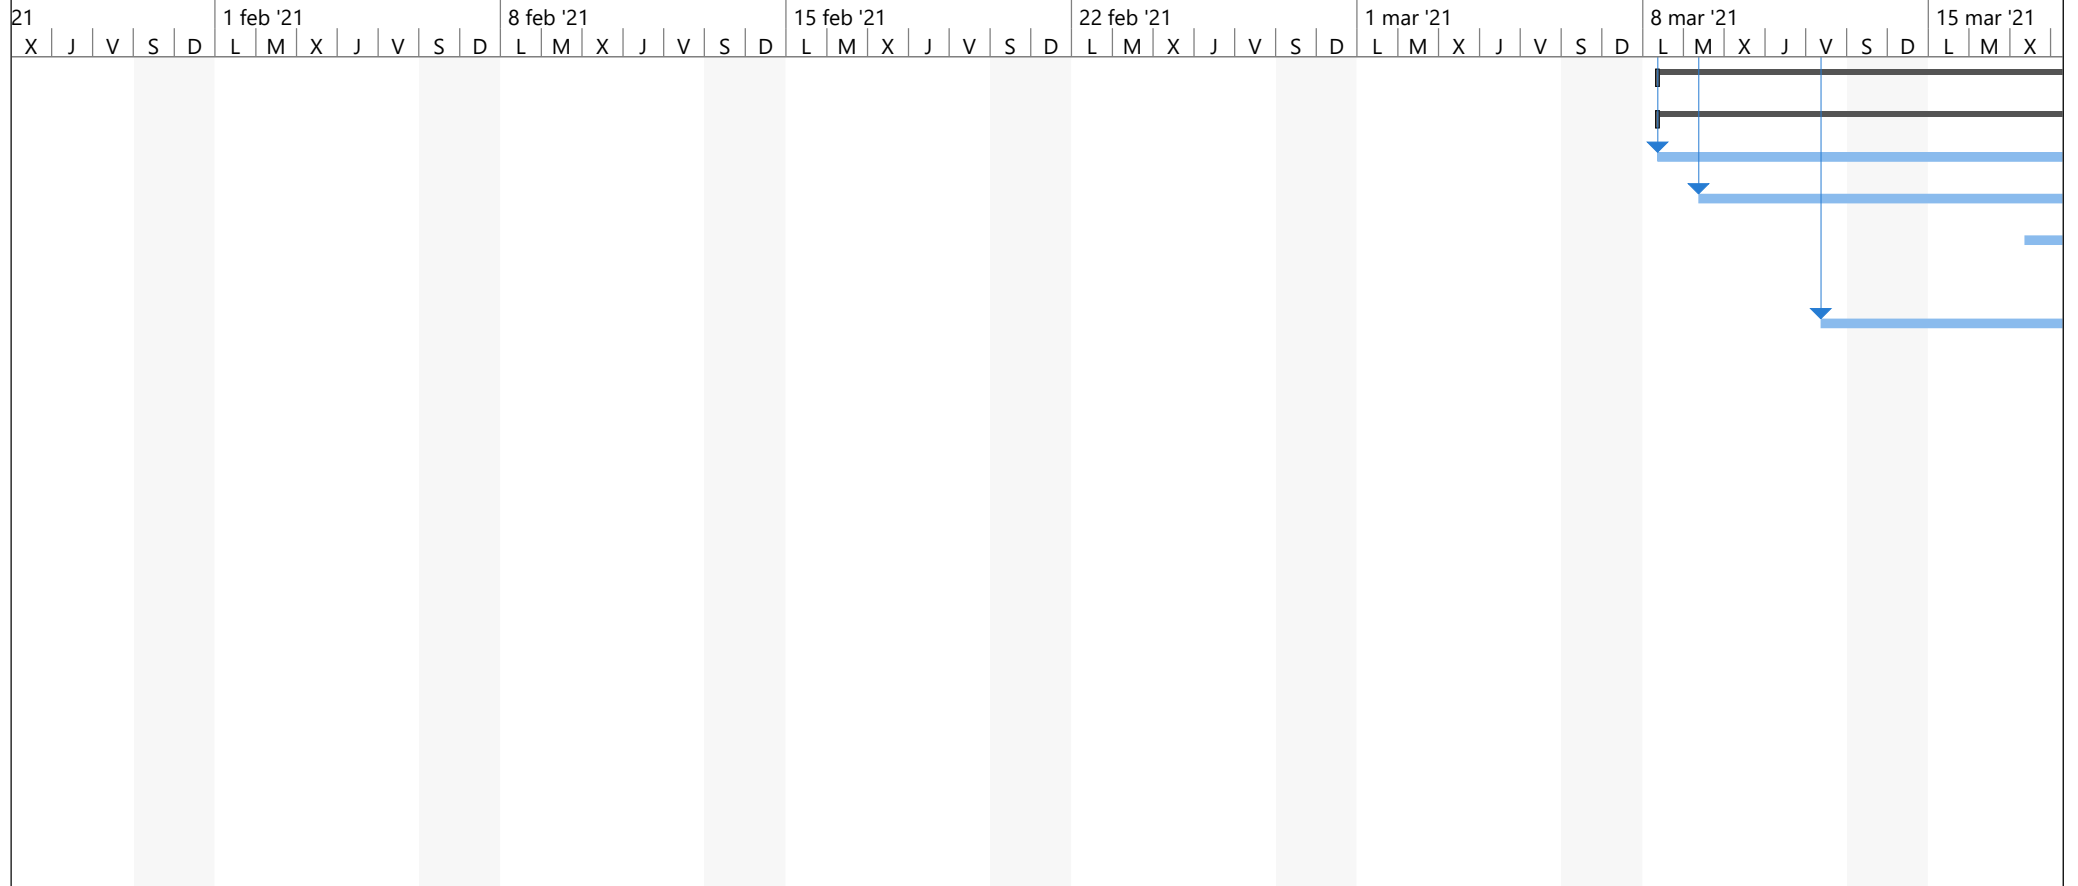




















# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

21	1 feb '21					8 feb '21					15 feb '21					22 feb '21					1 mar '21					8 mar '21					15 mar '21				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

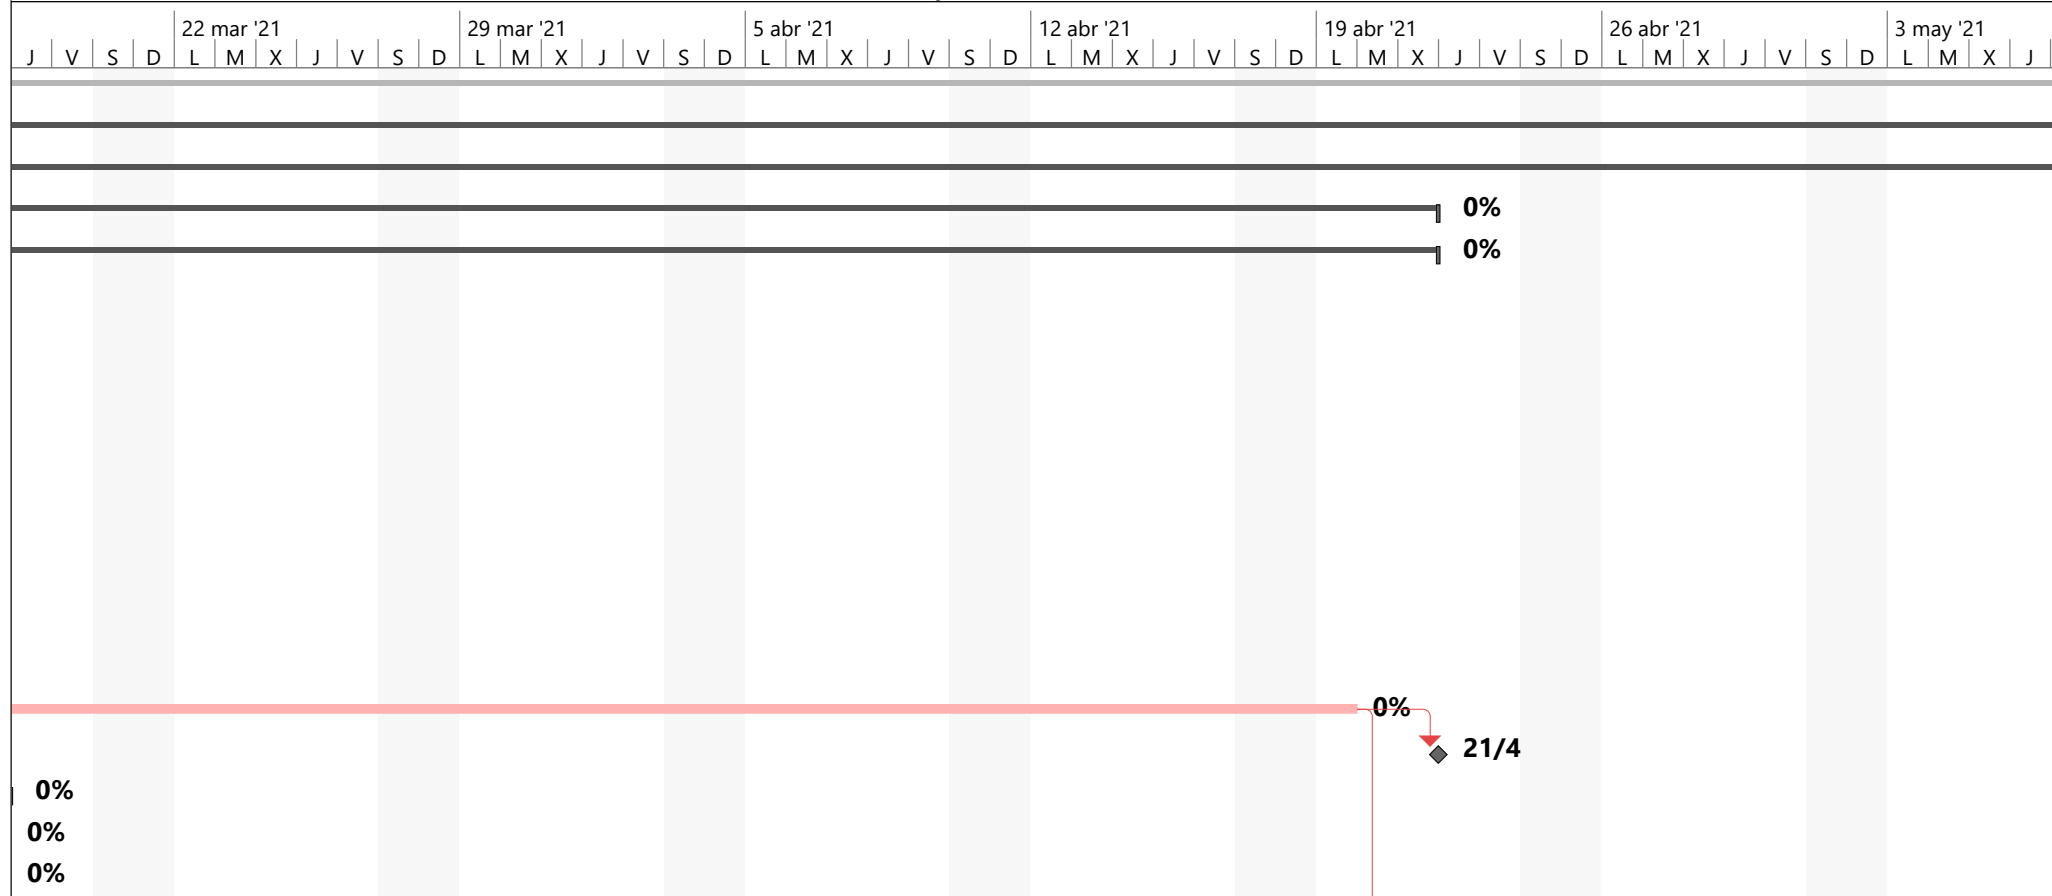

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

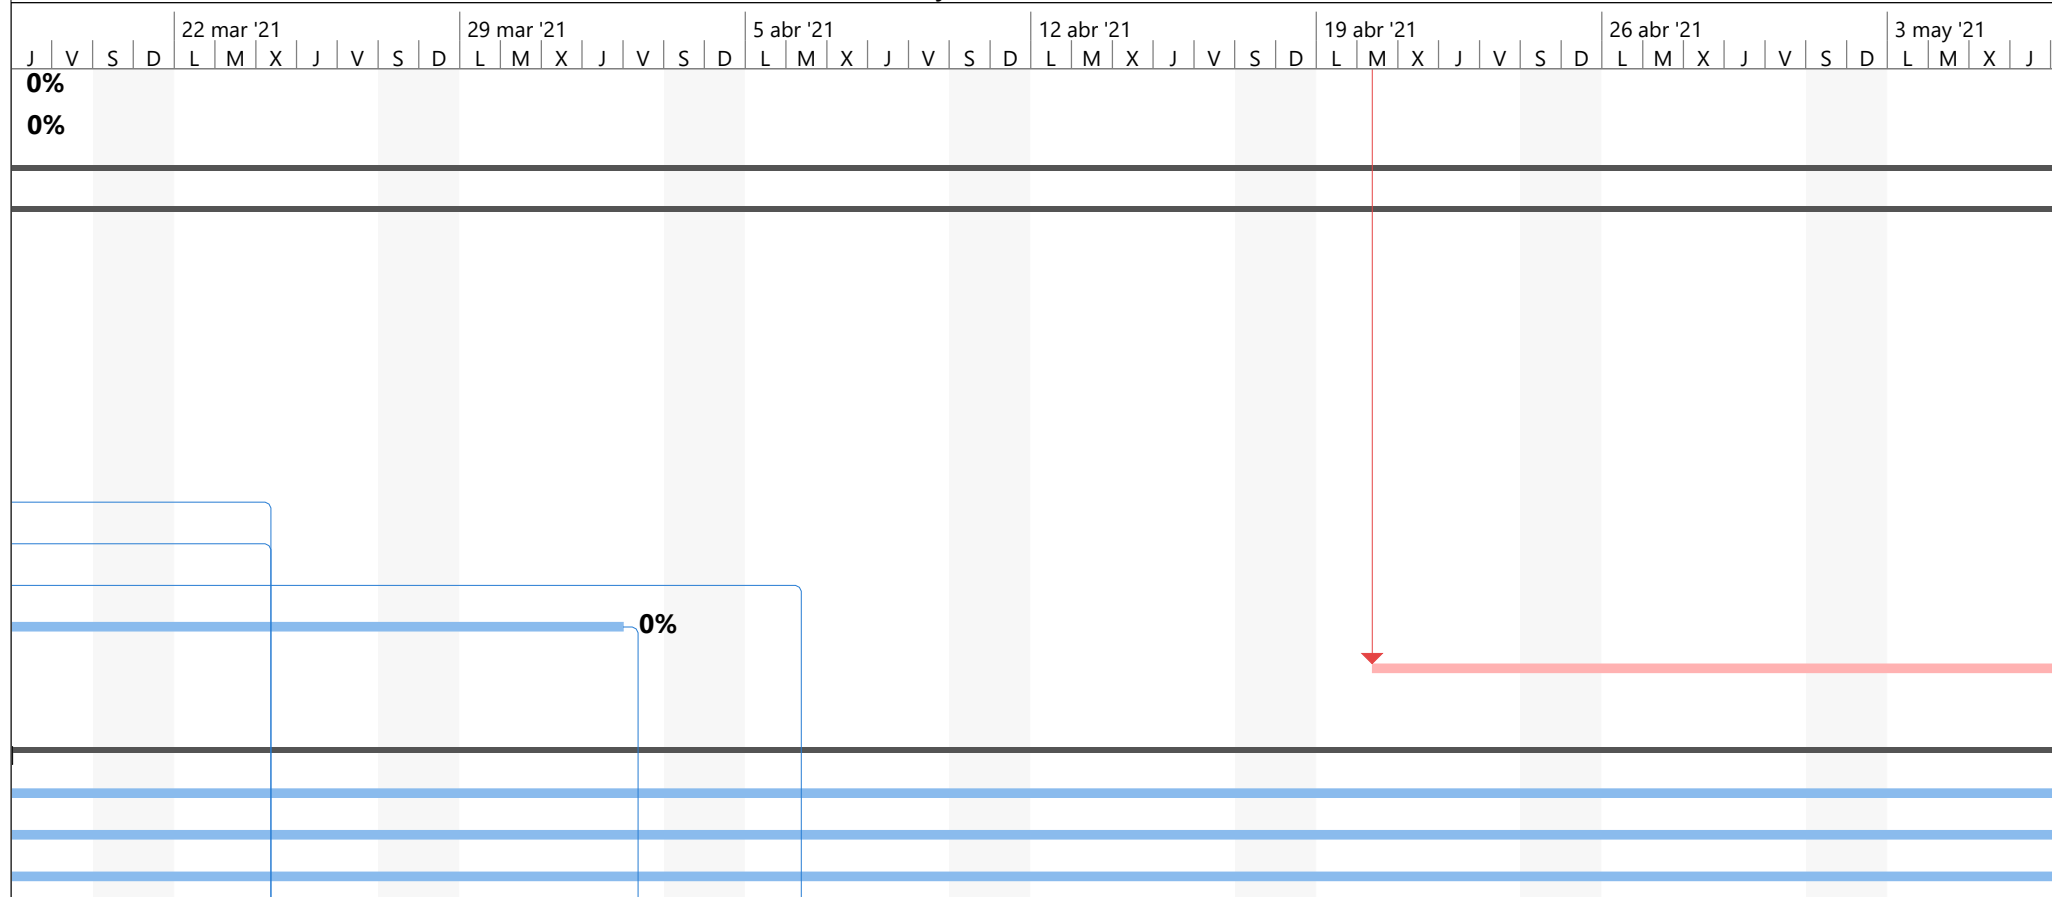

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

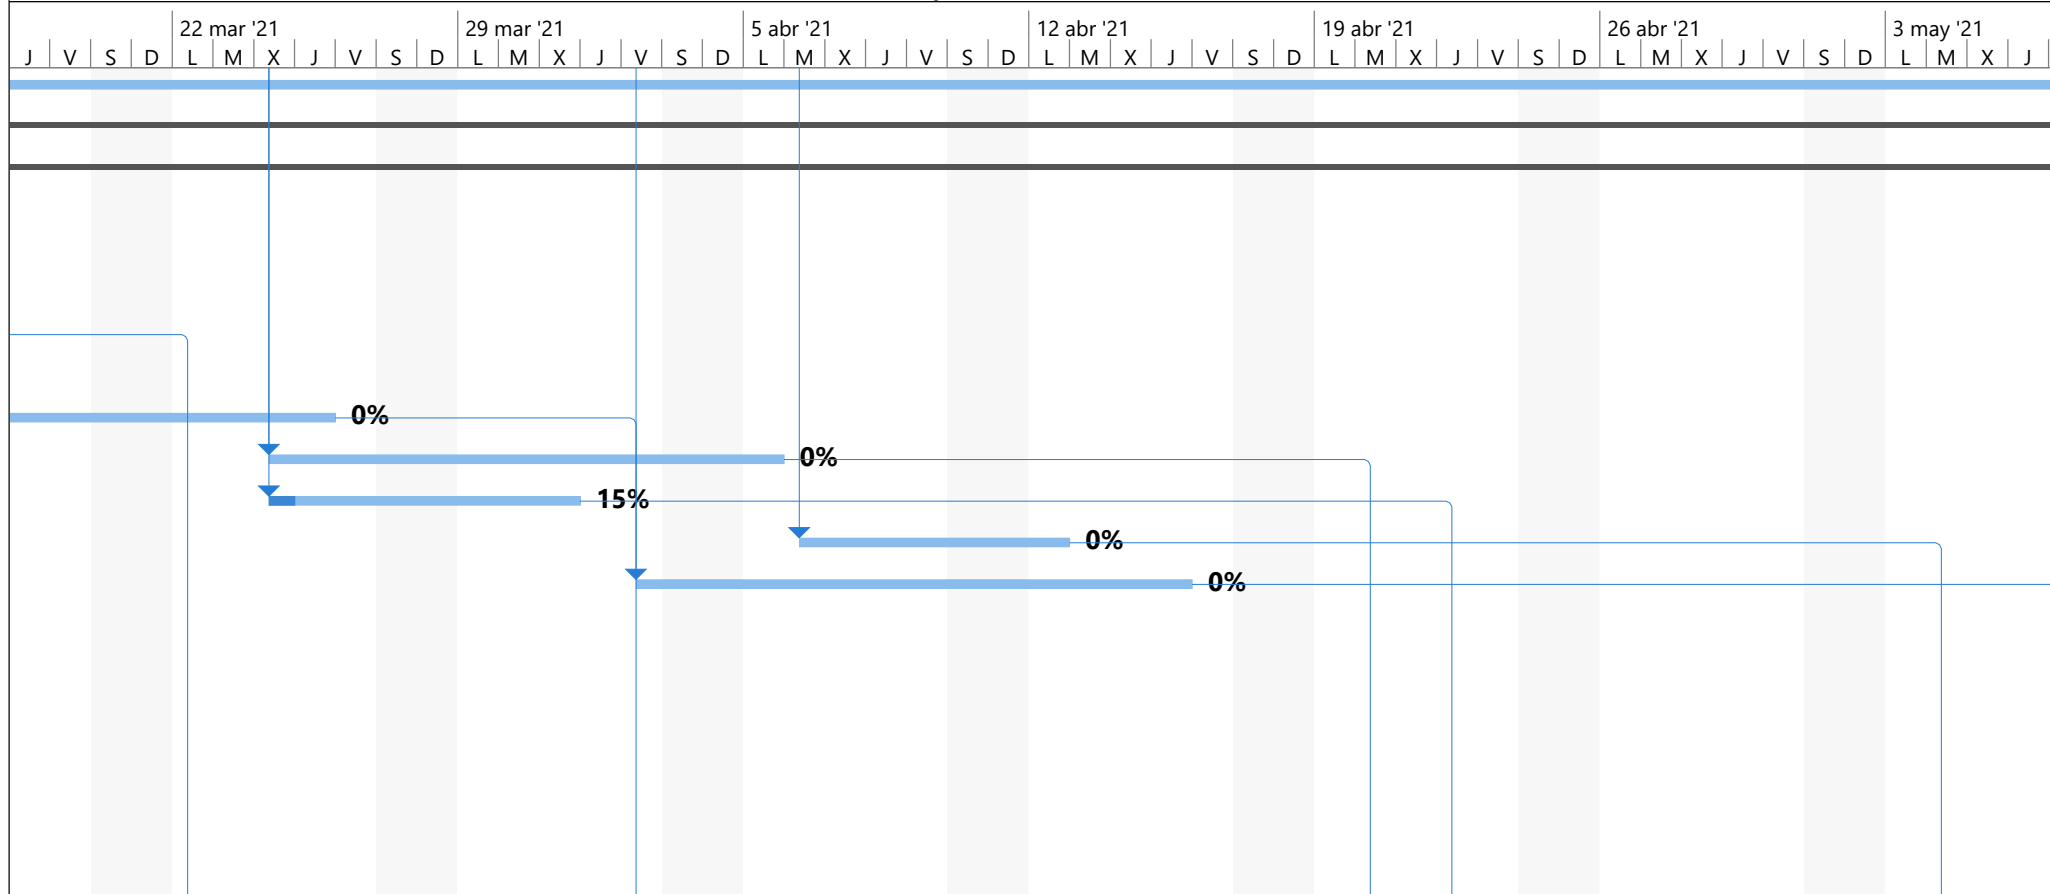


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

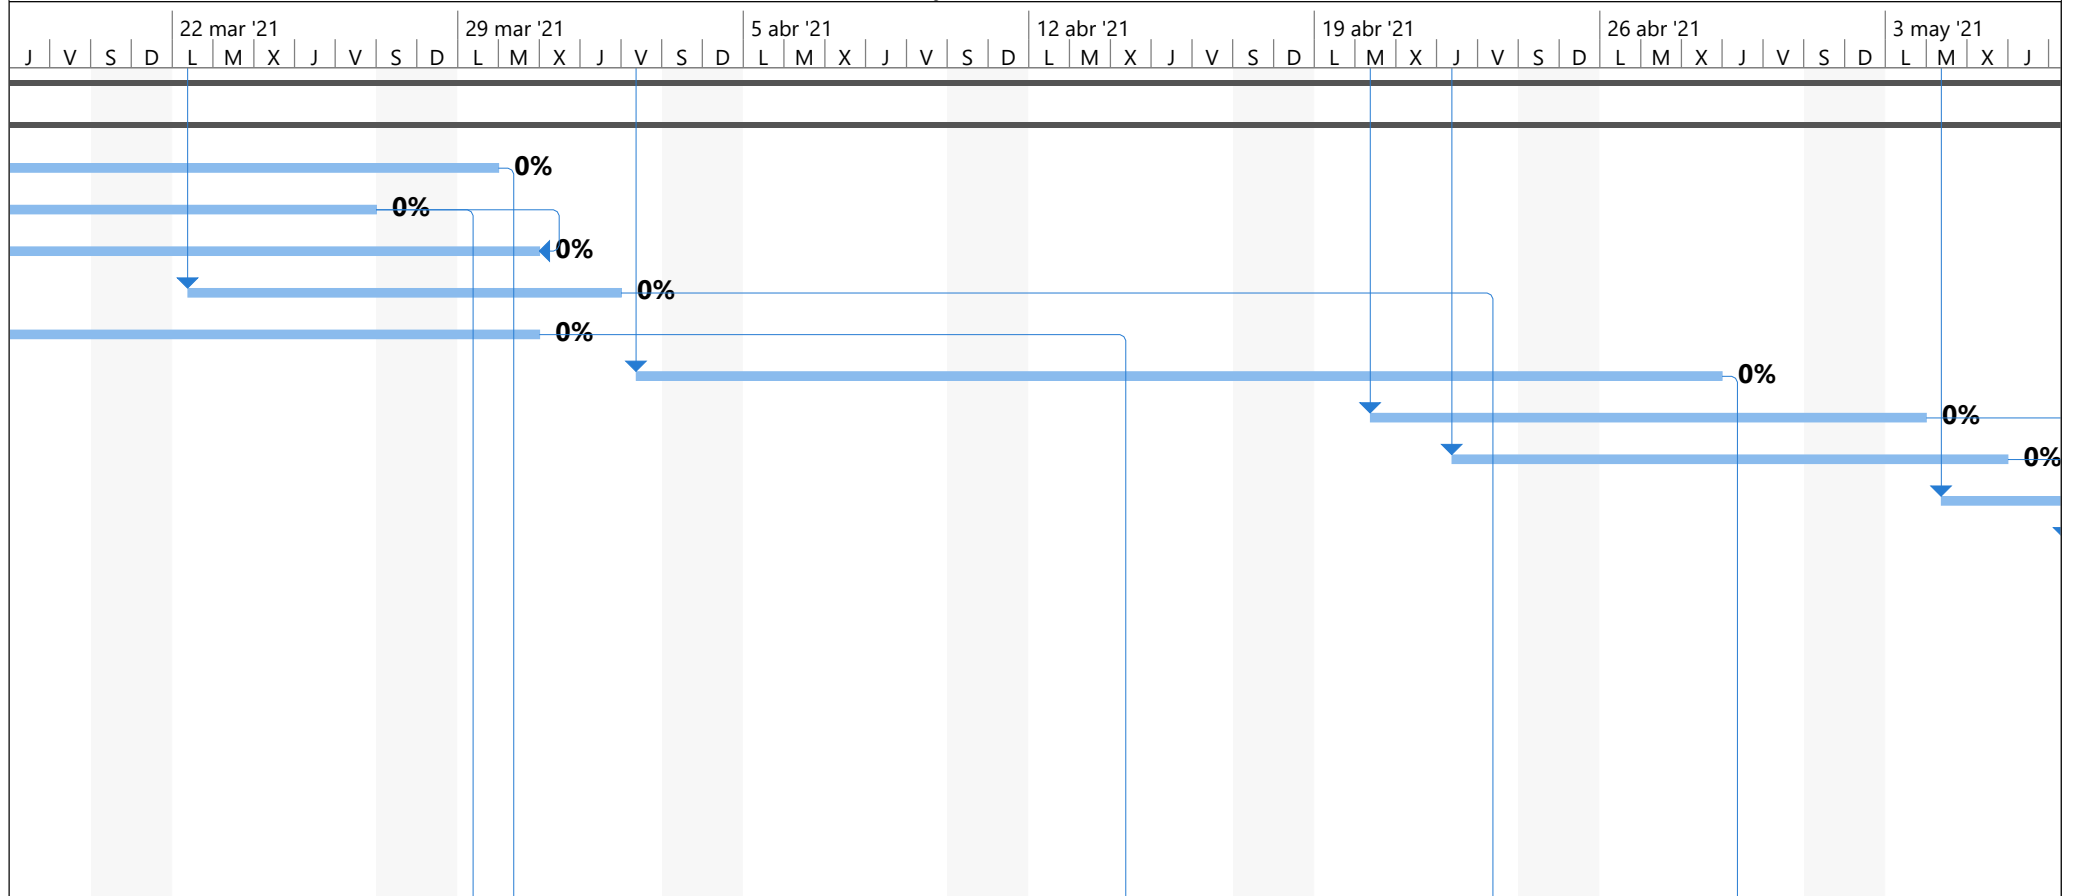

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

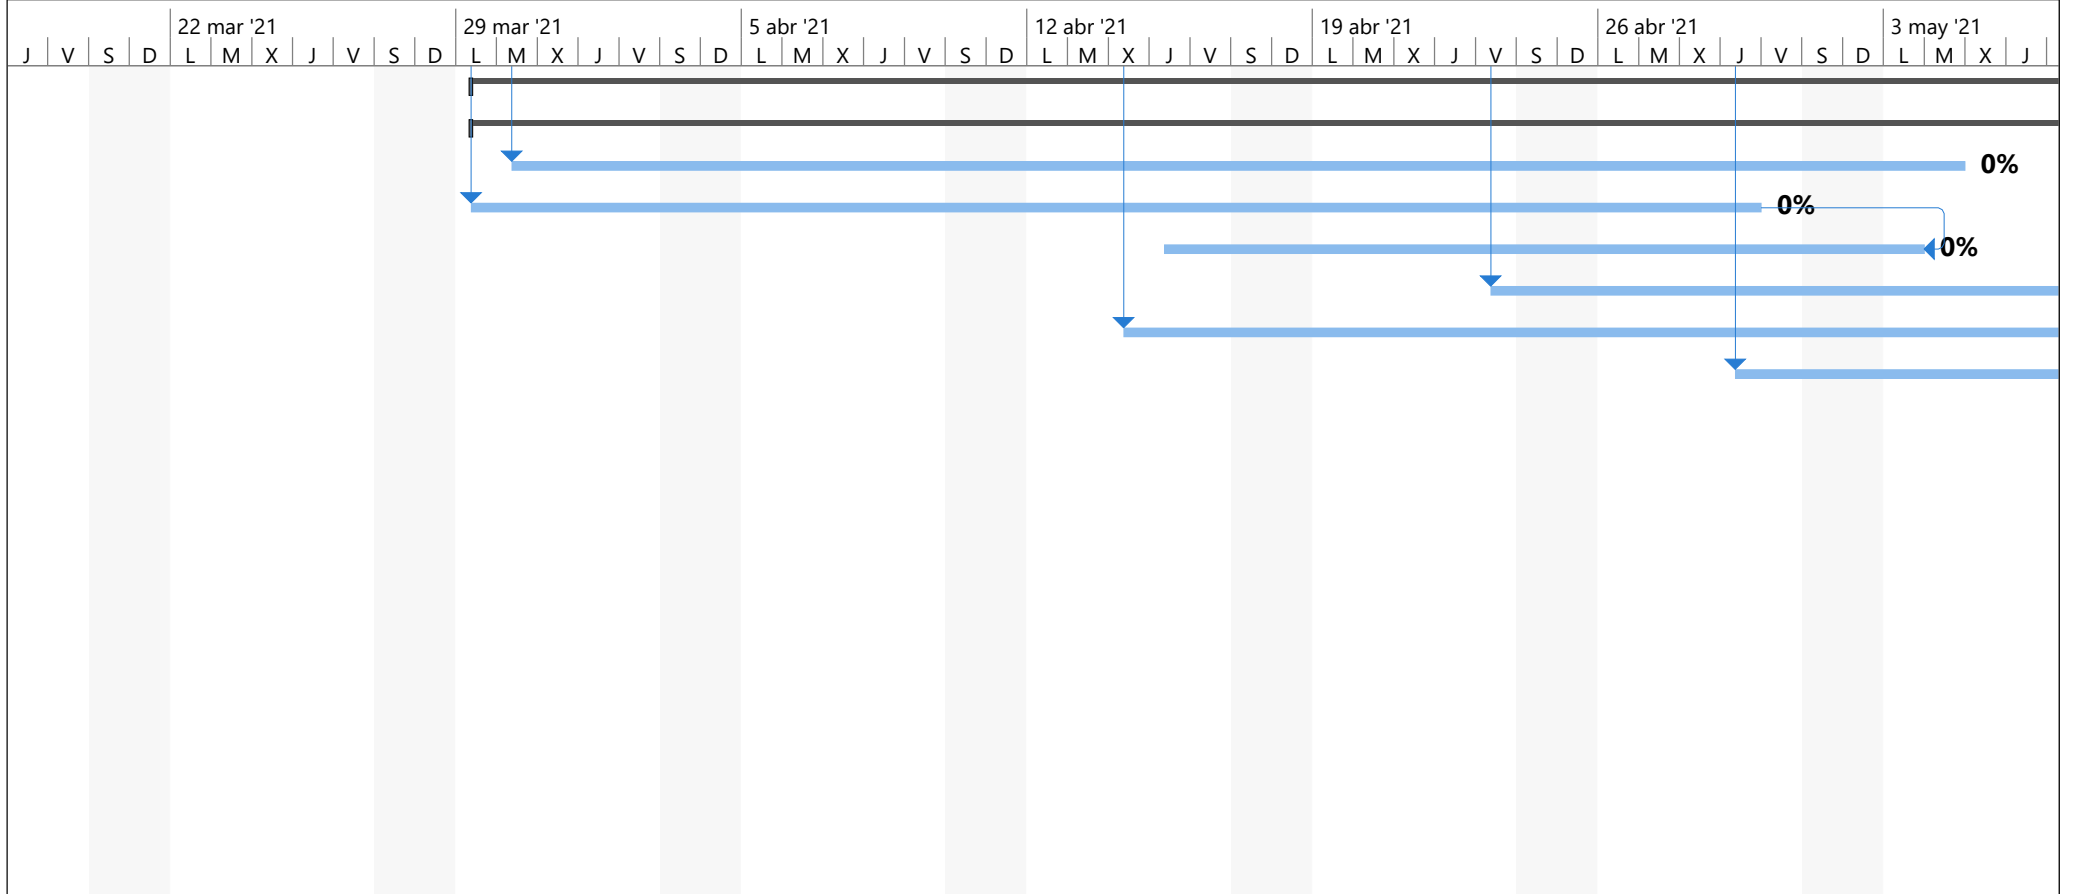


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

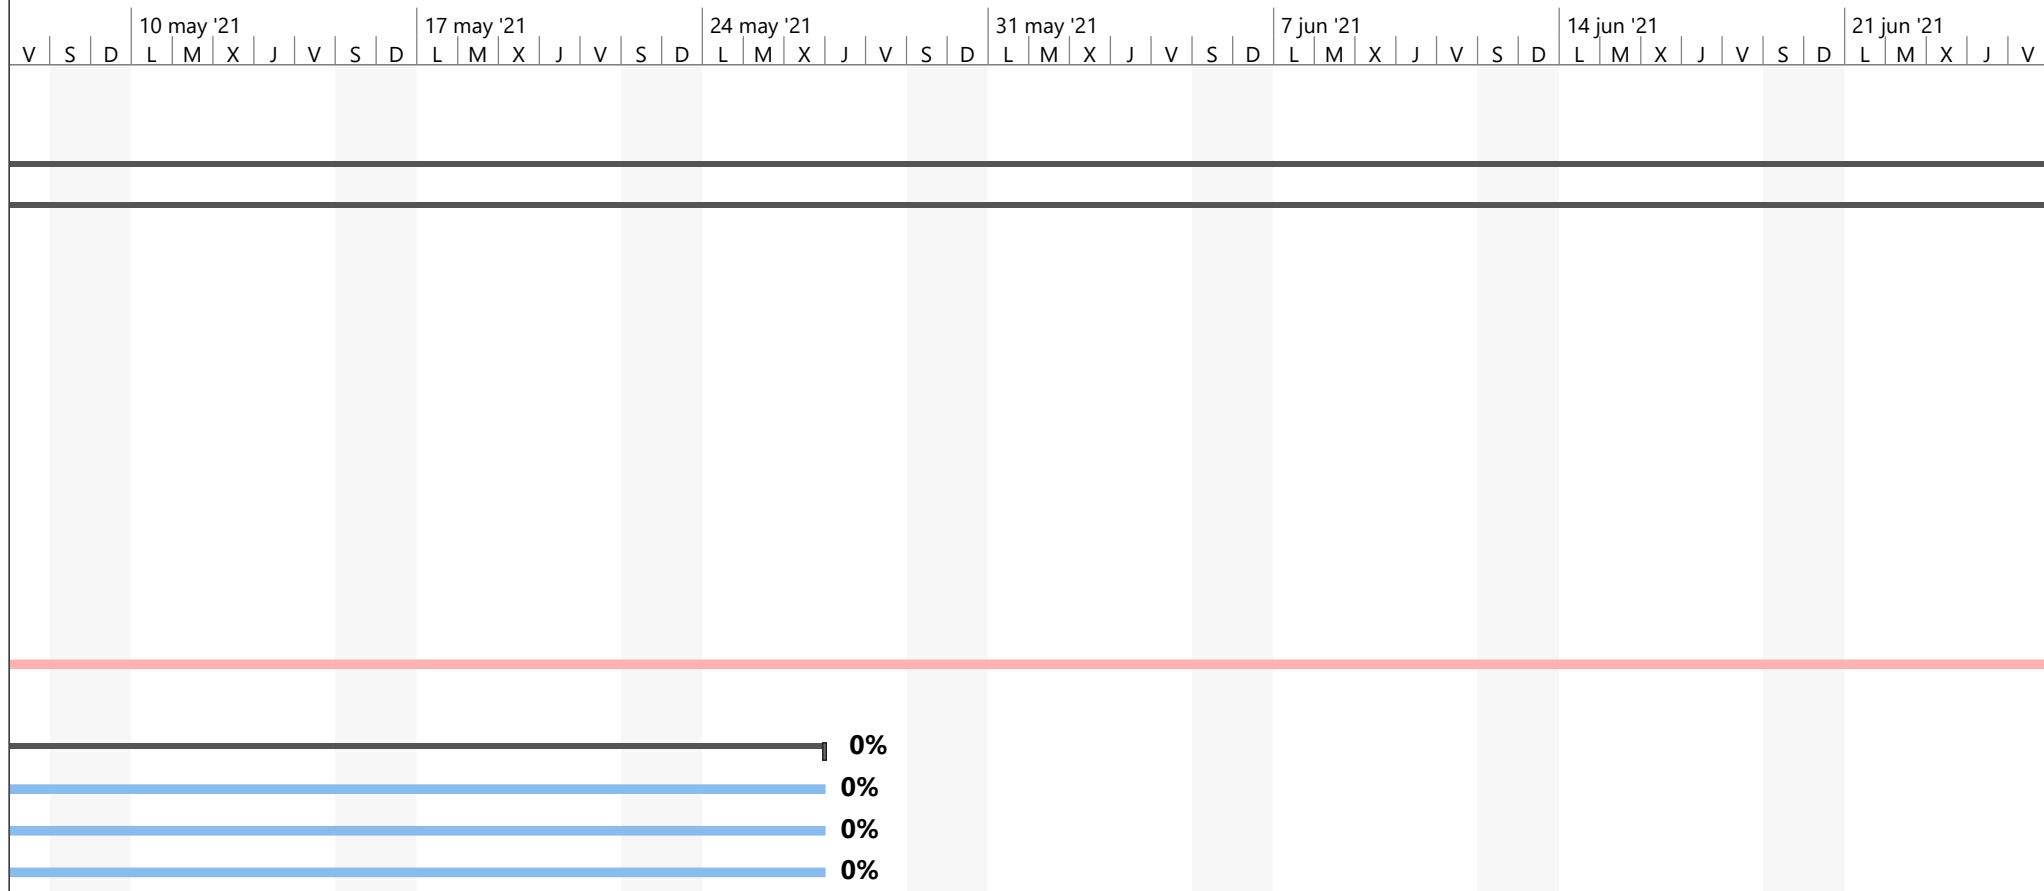


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

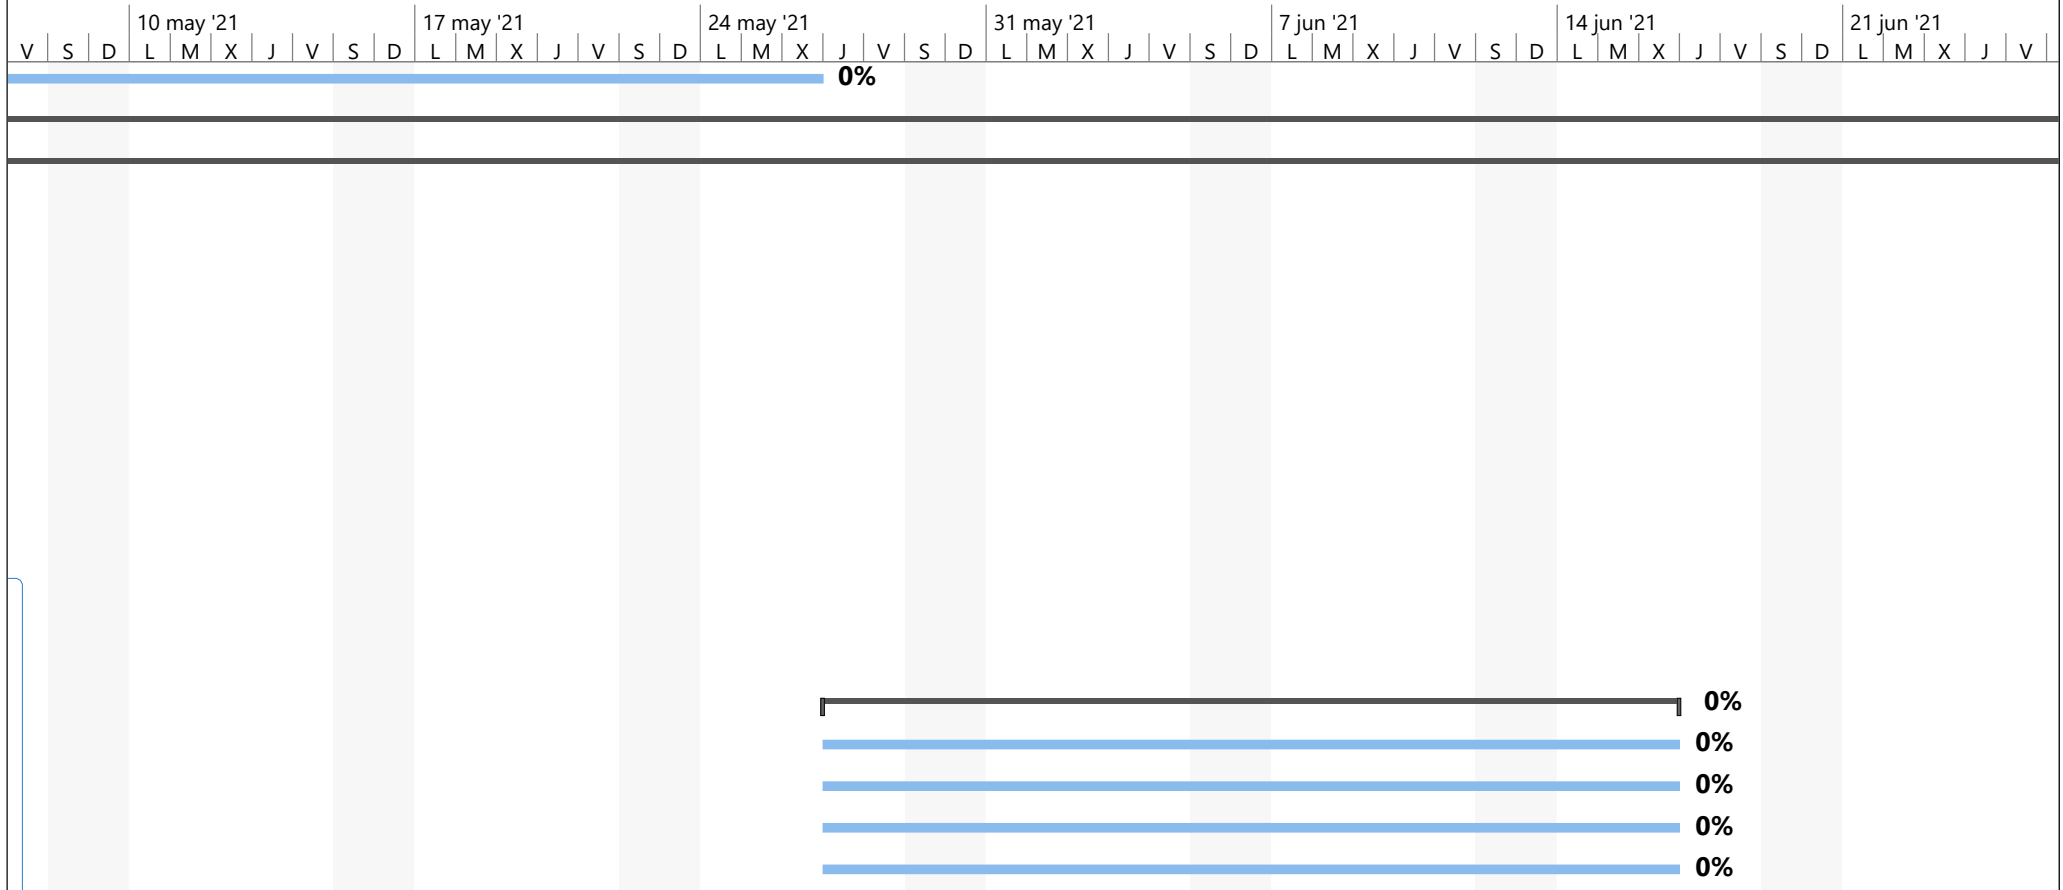


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

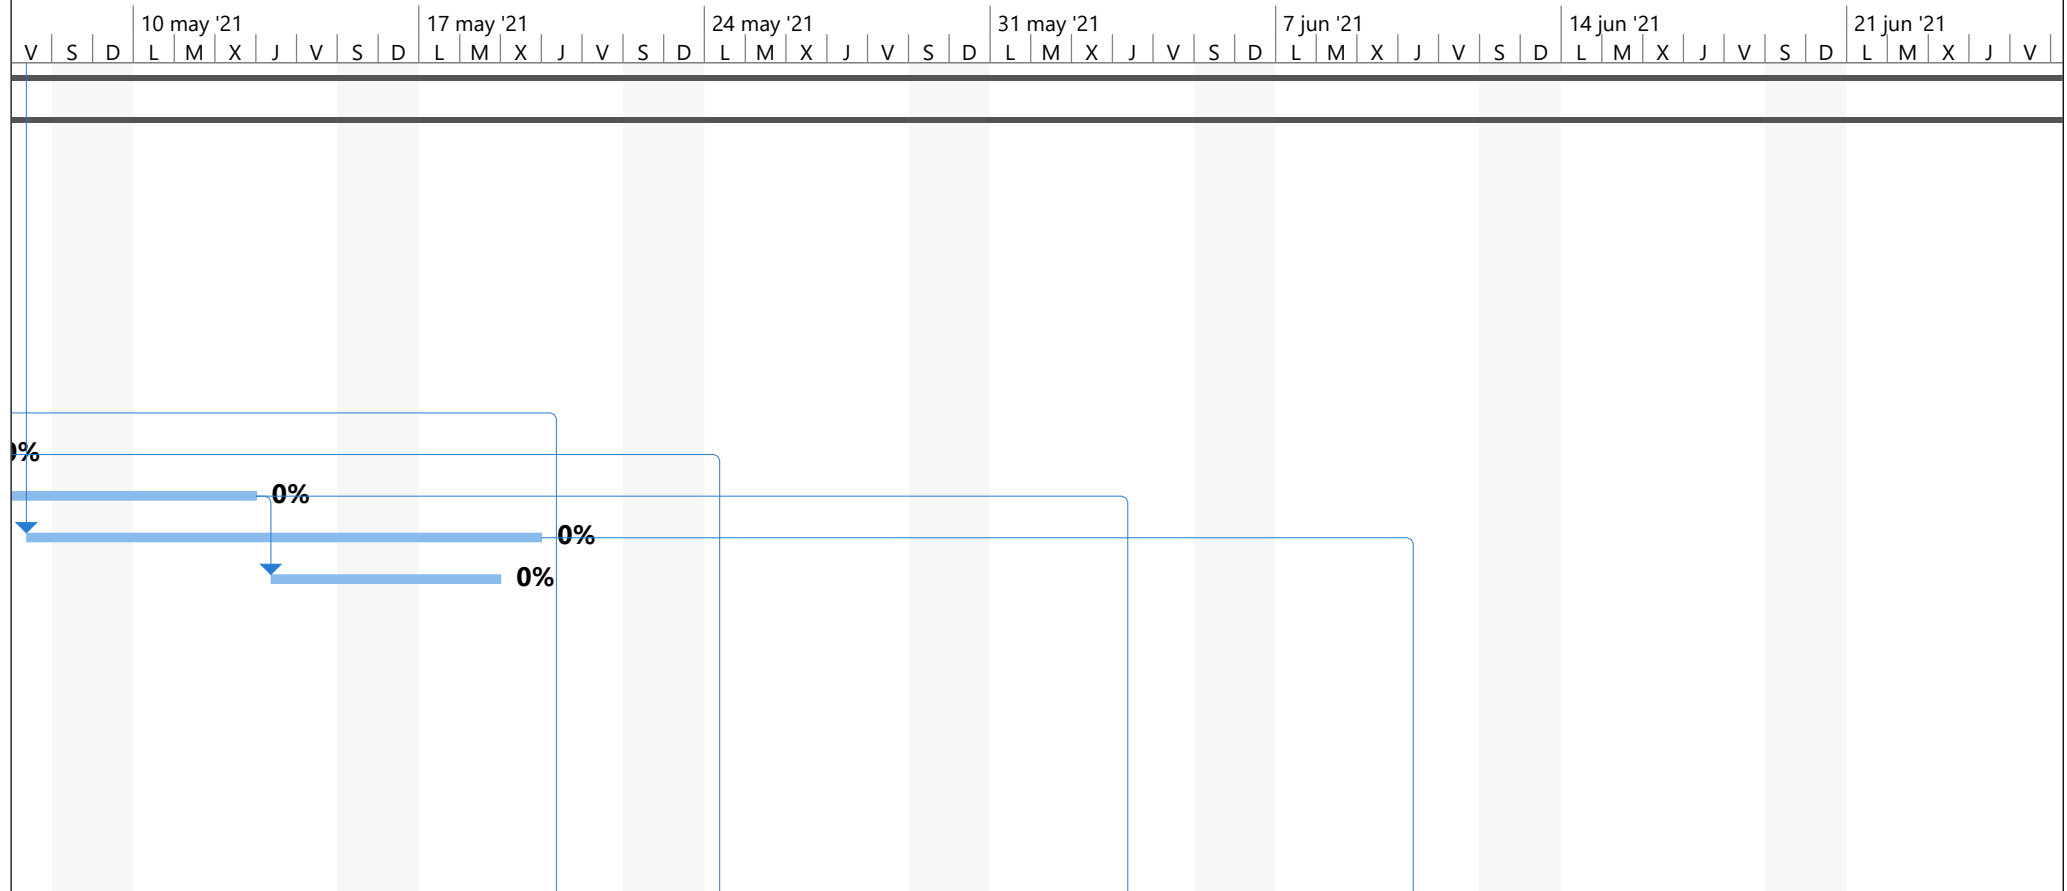

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

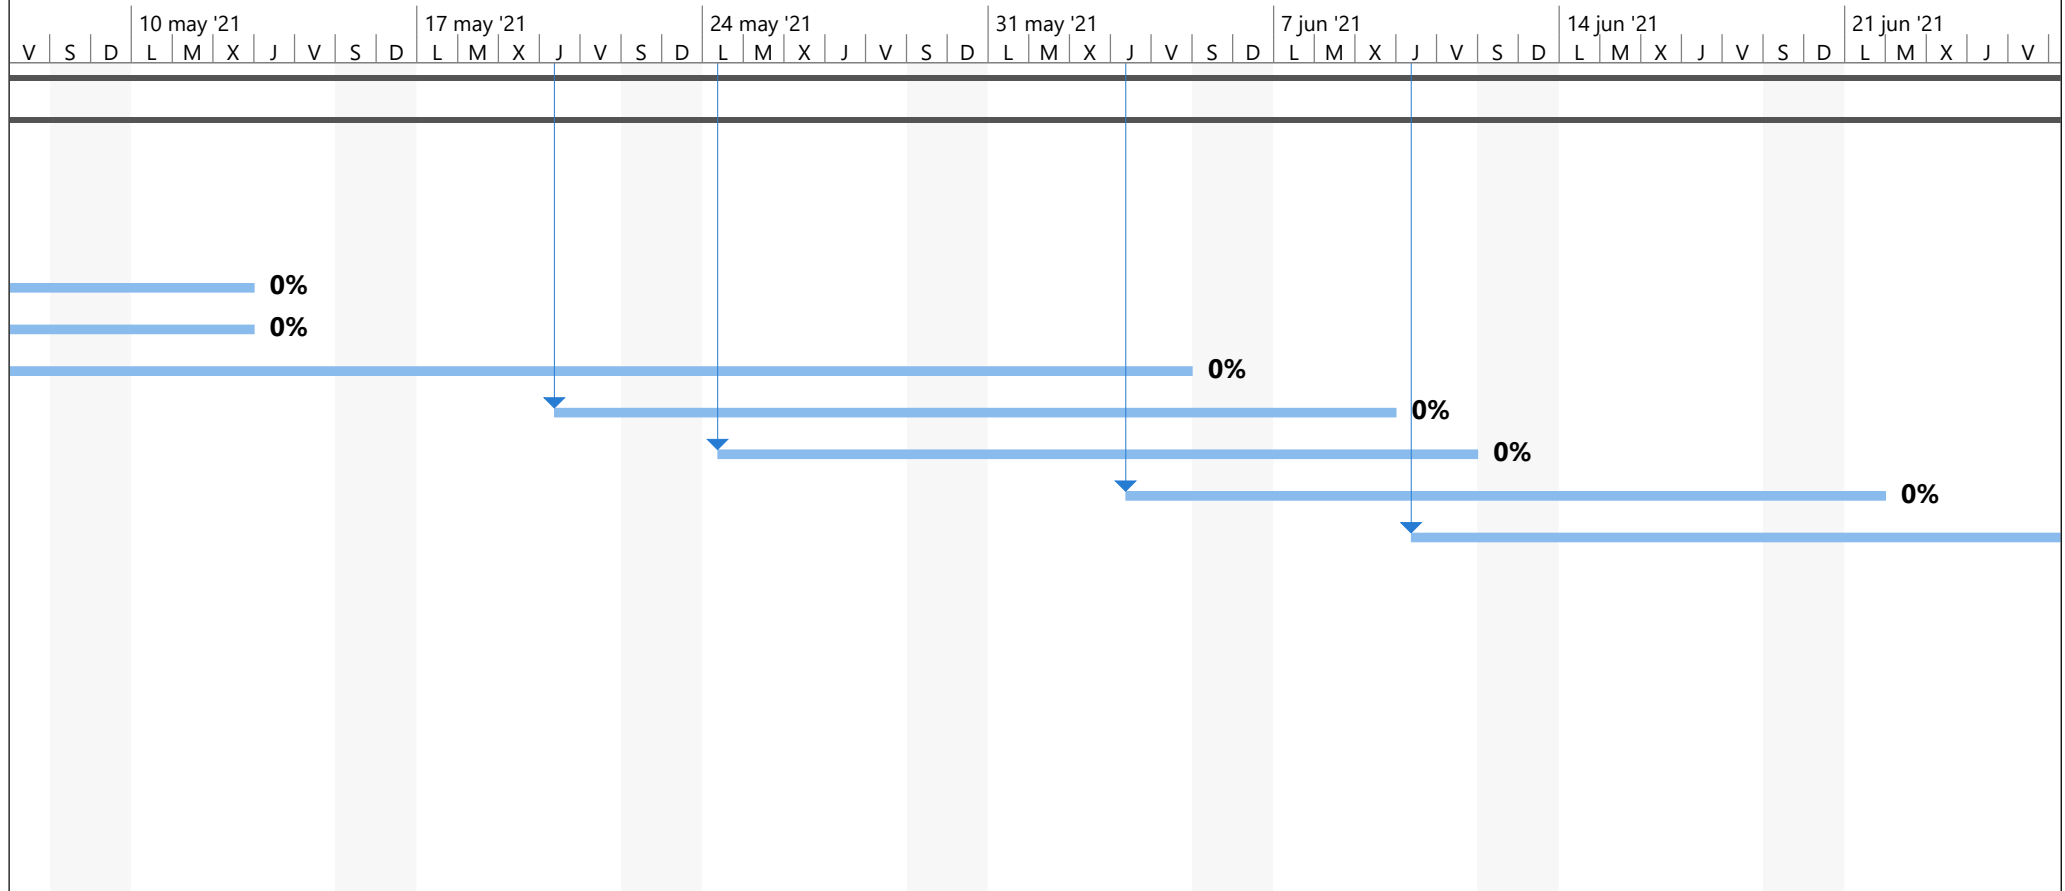

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

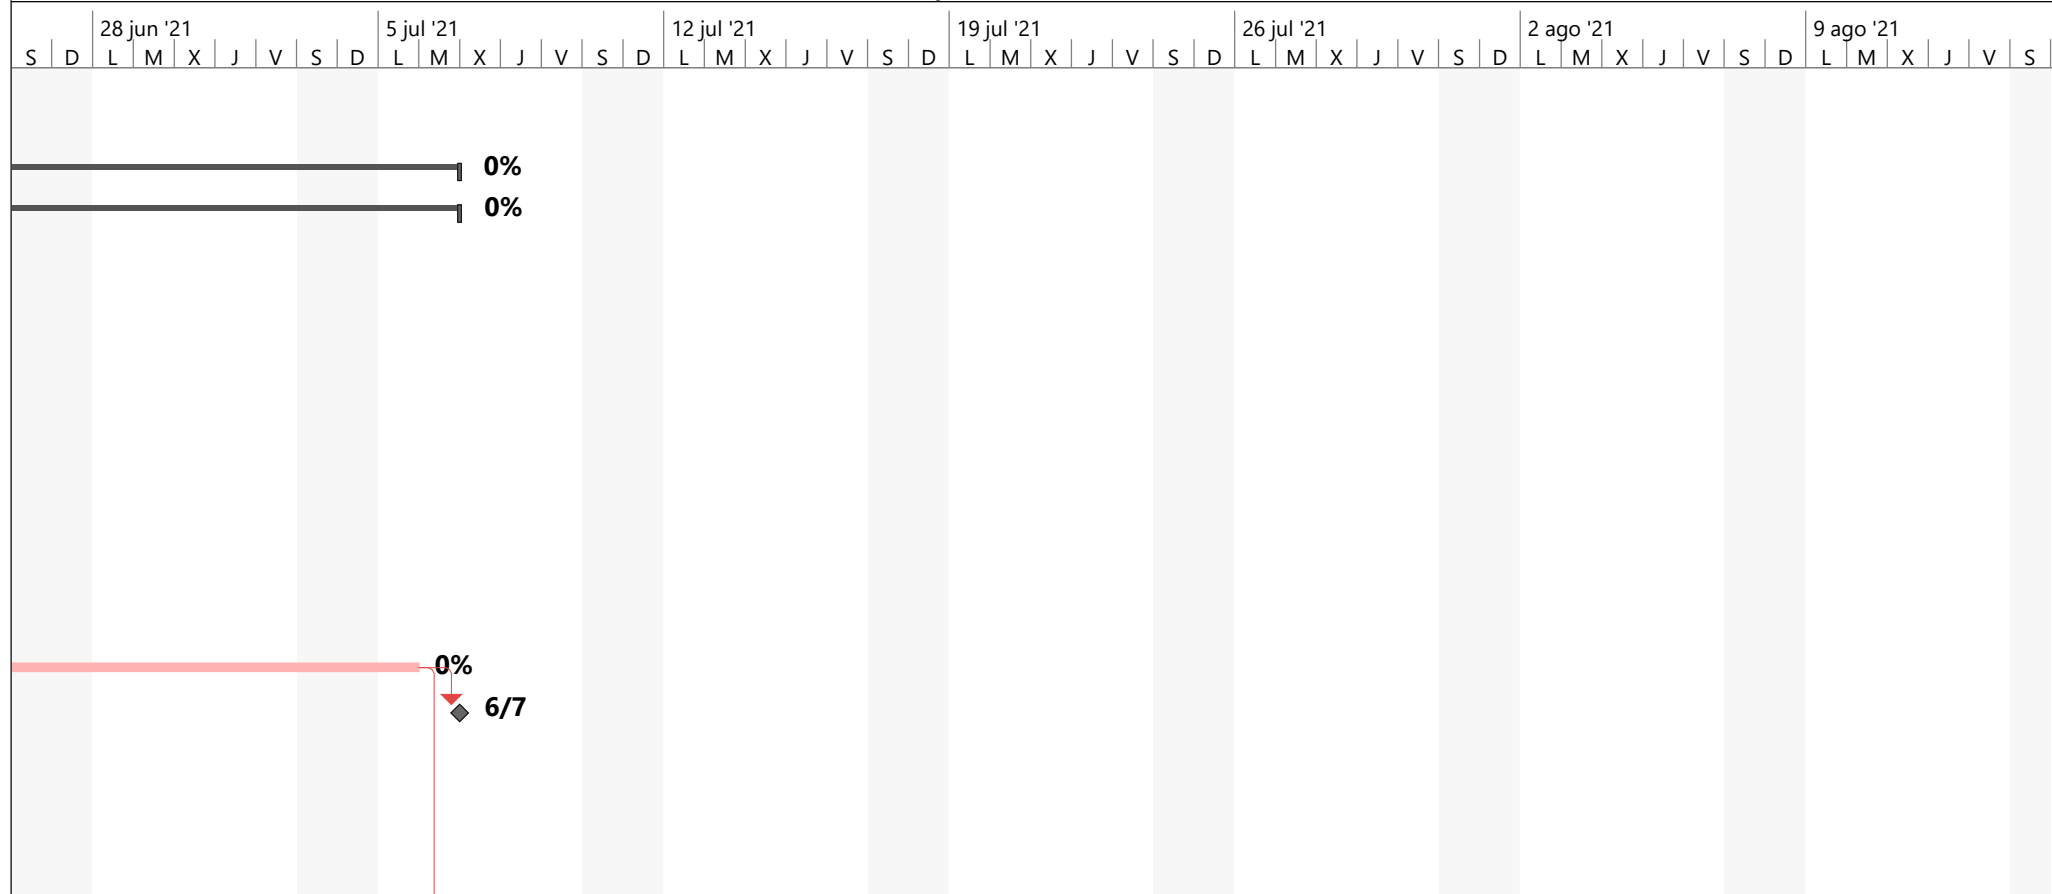


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



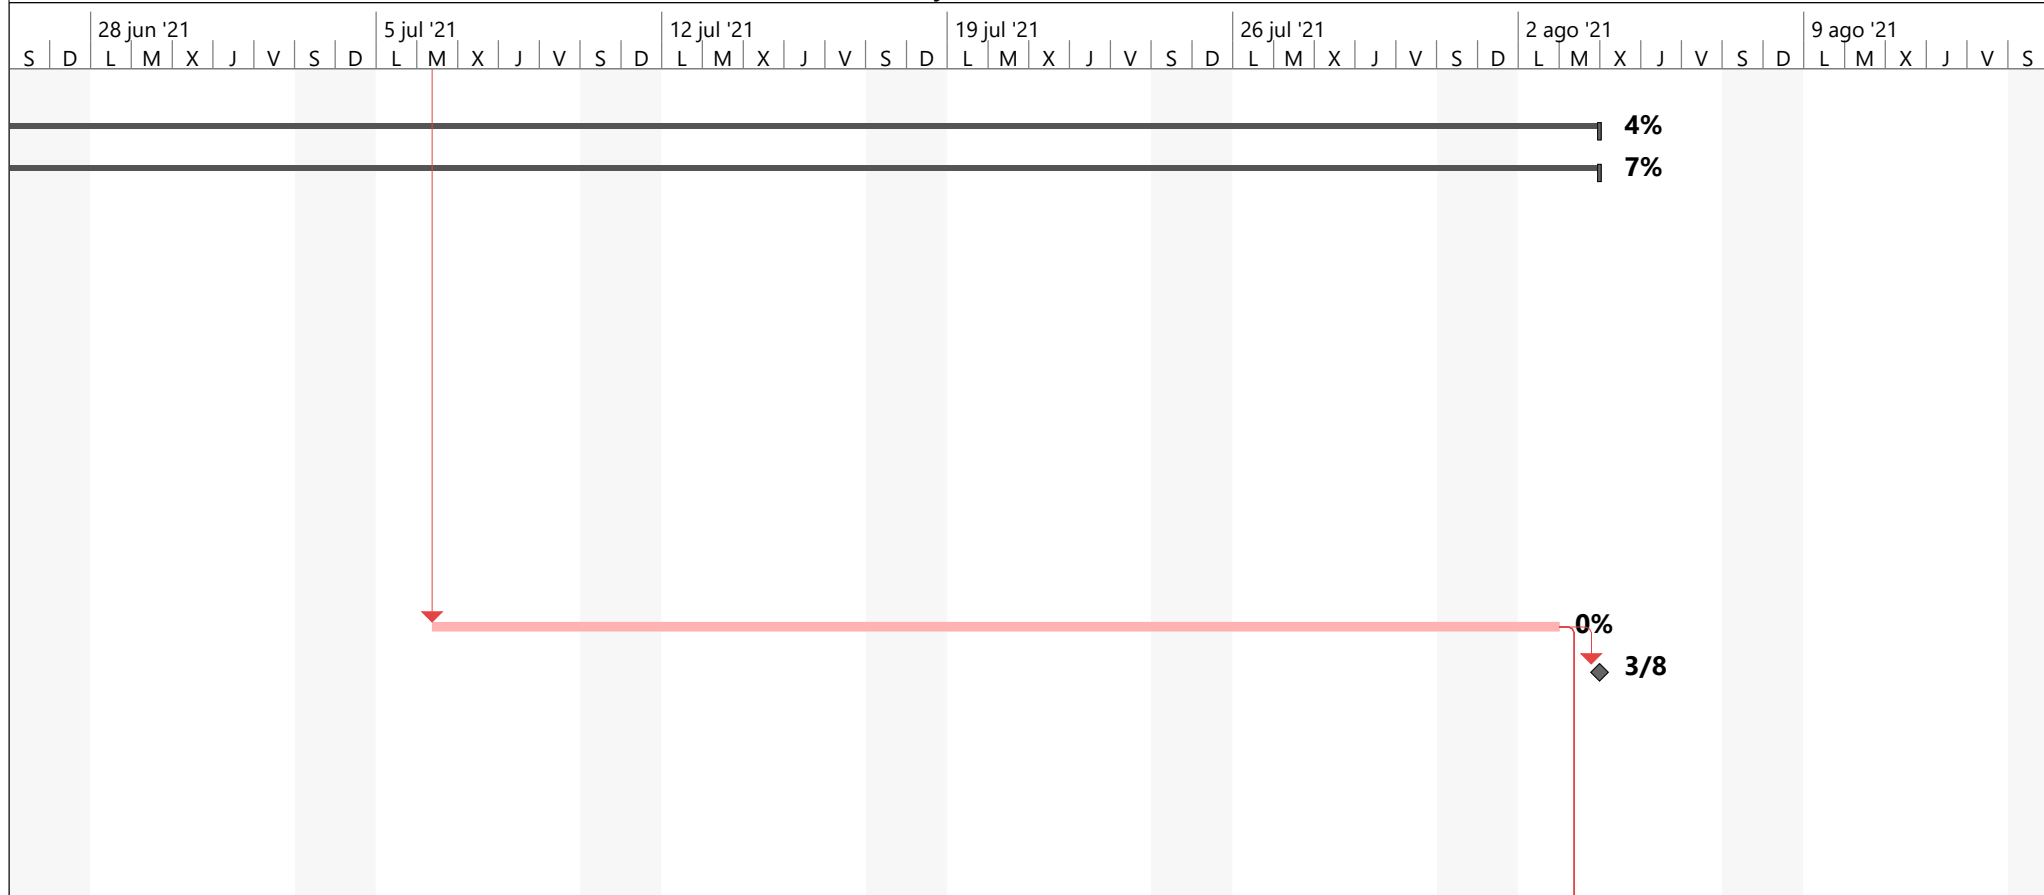





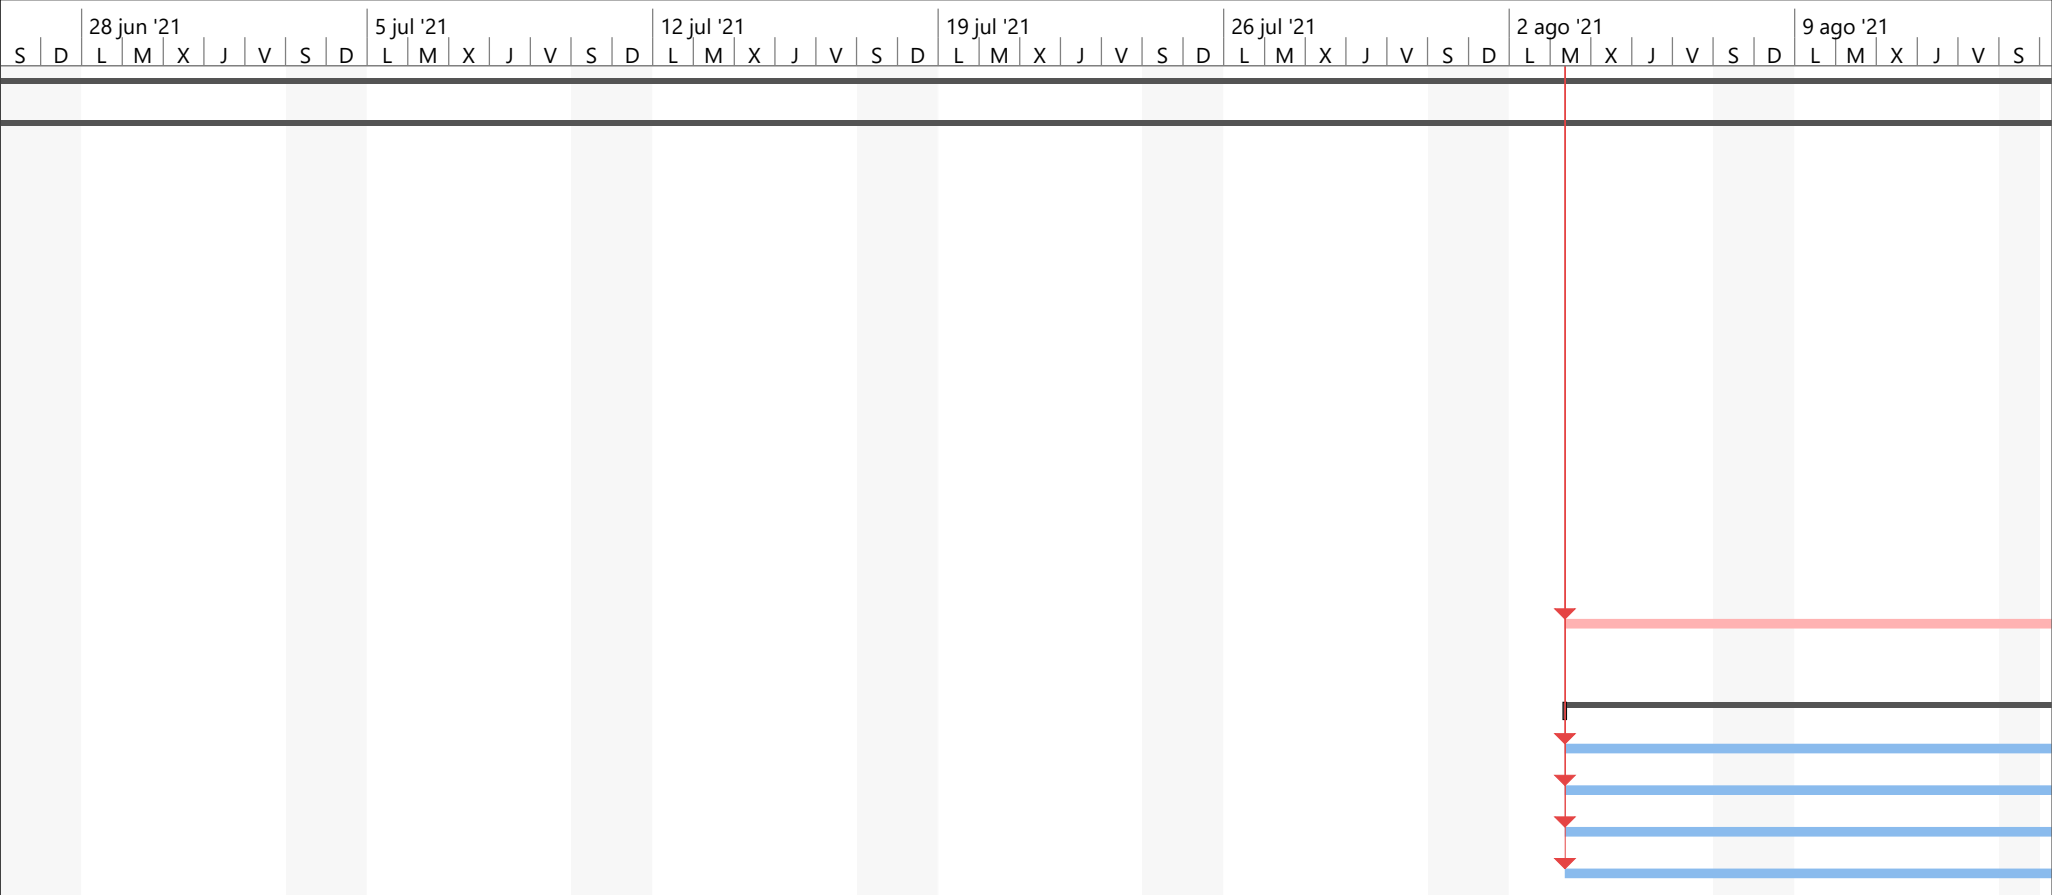















# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020



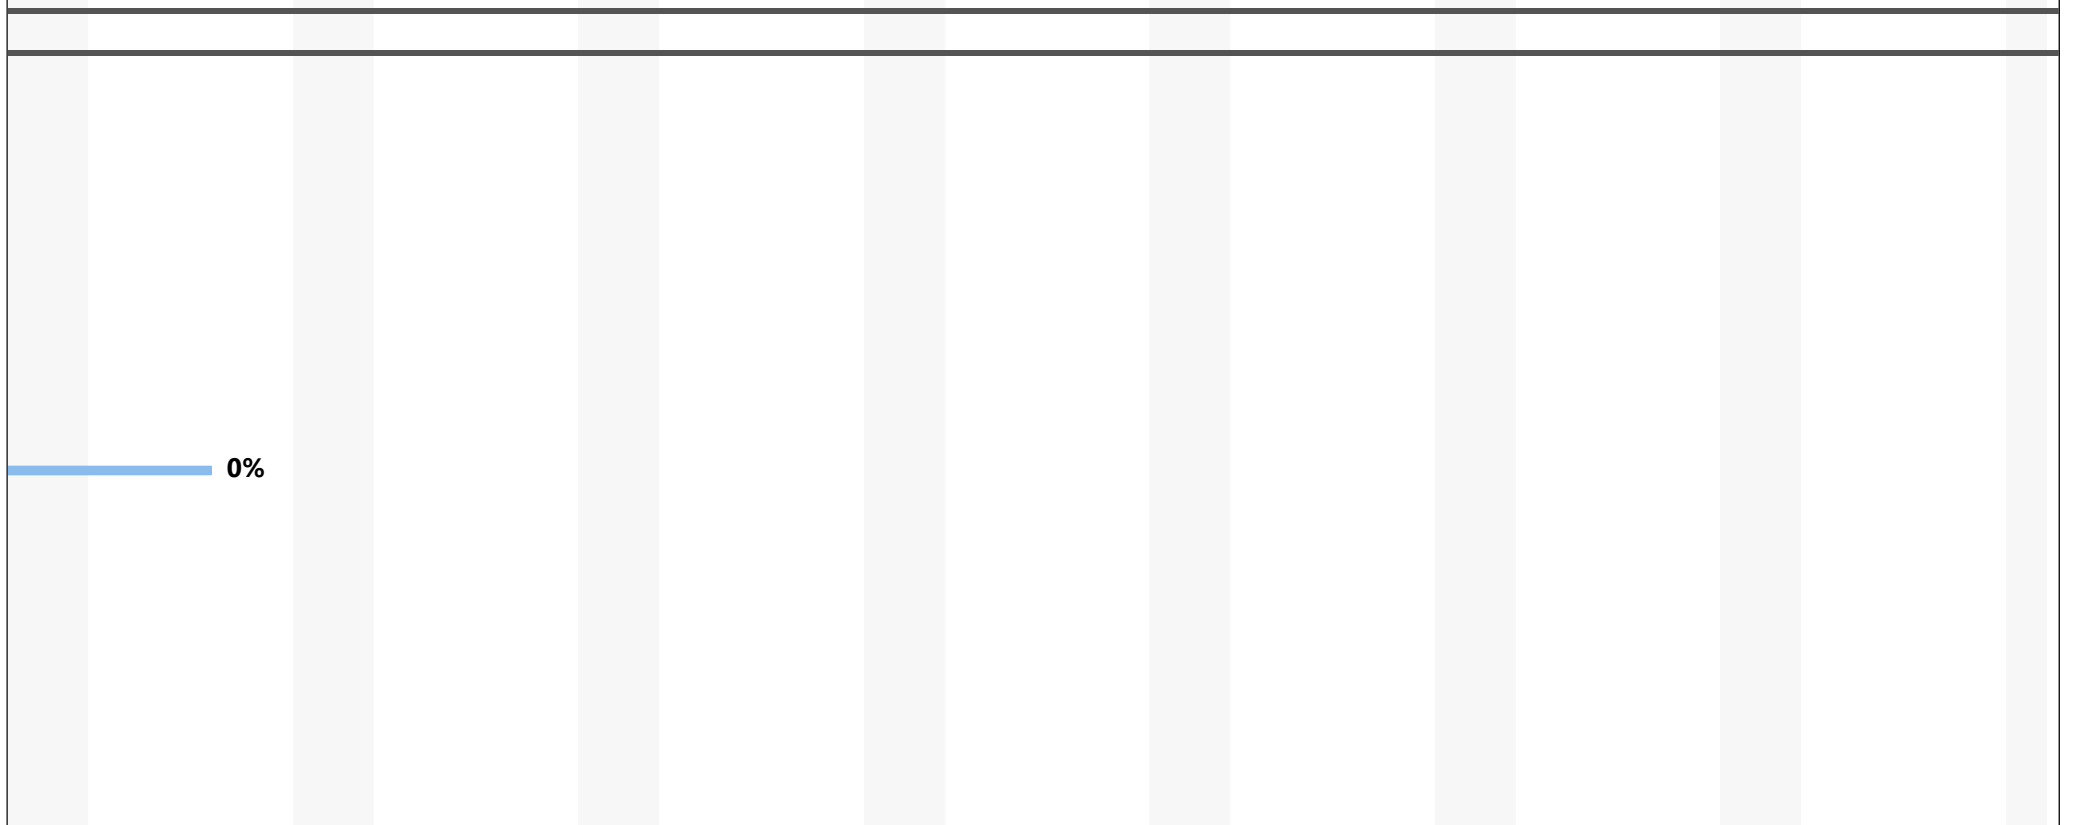





















		28 jun '21							5 jul '21							12 jul '21							19 jul '21							26 jul '21							2 ago '21							9 ago '21						
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

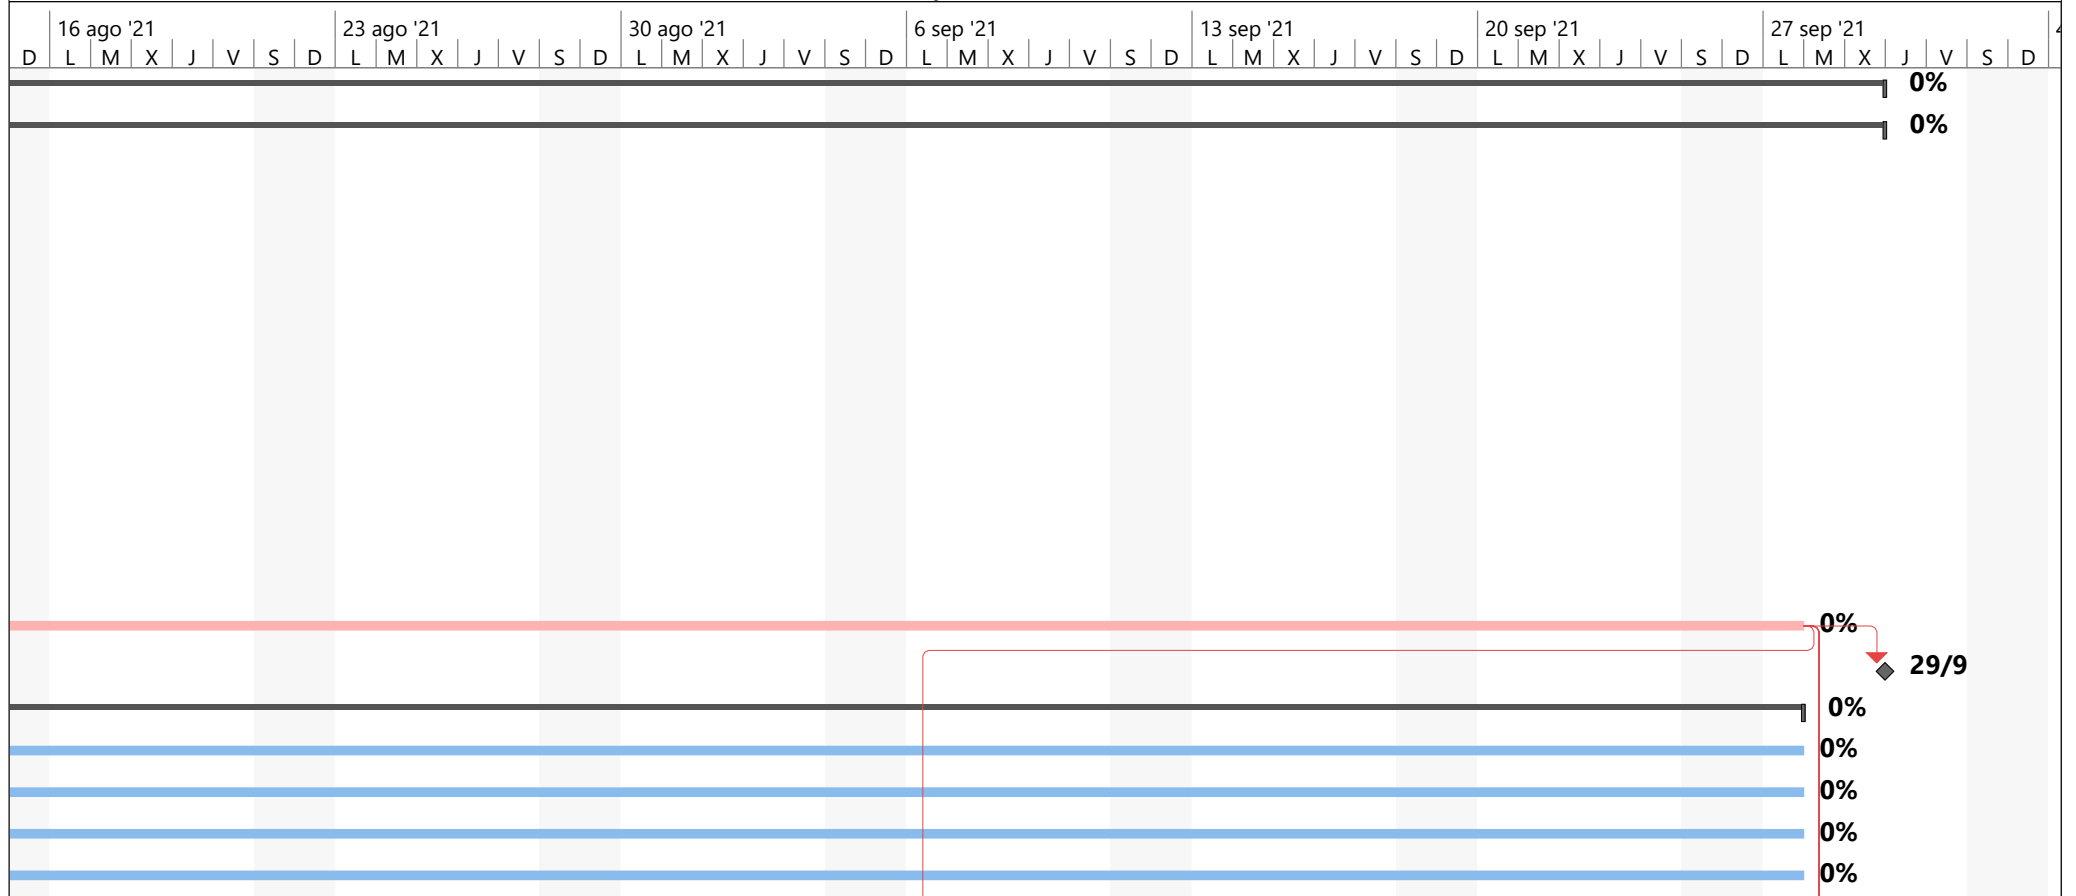

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

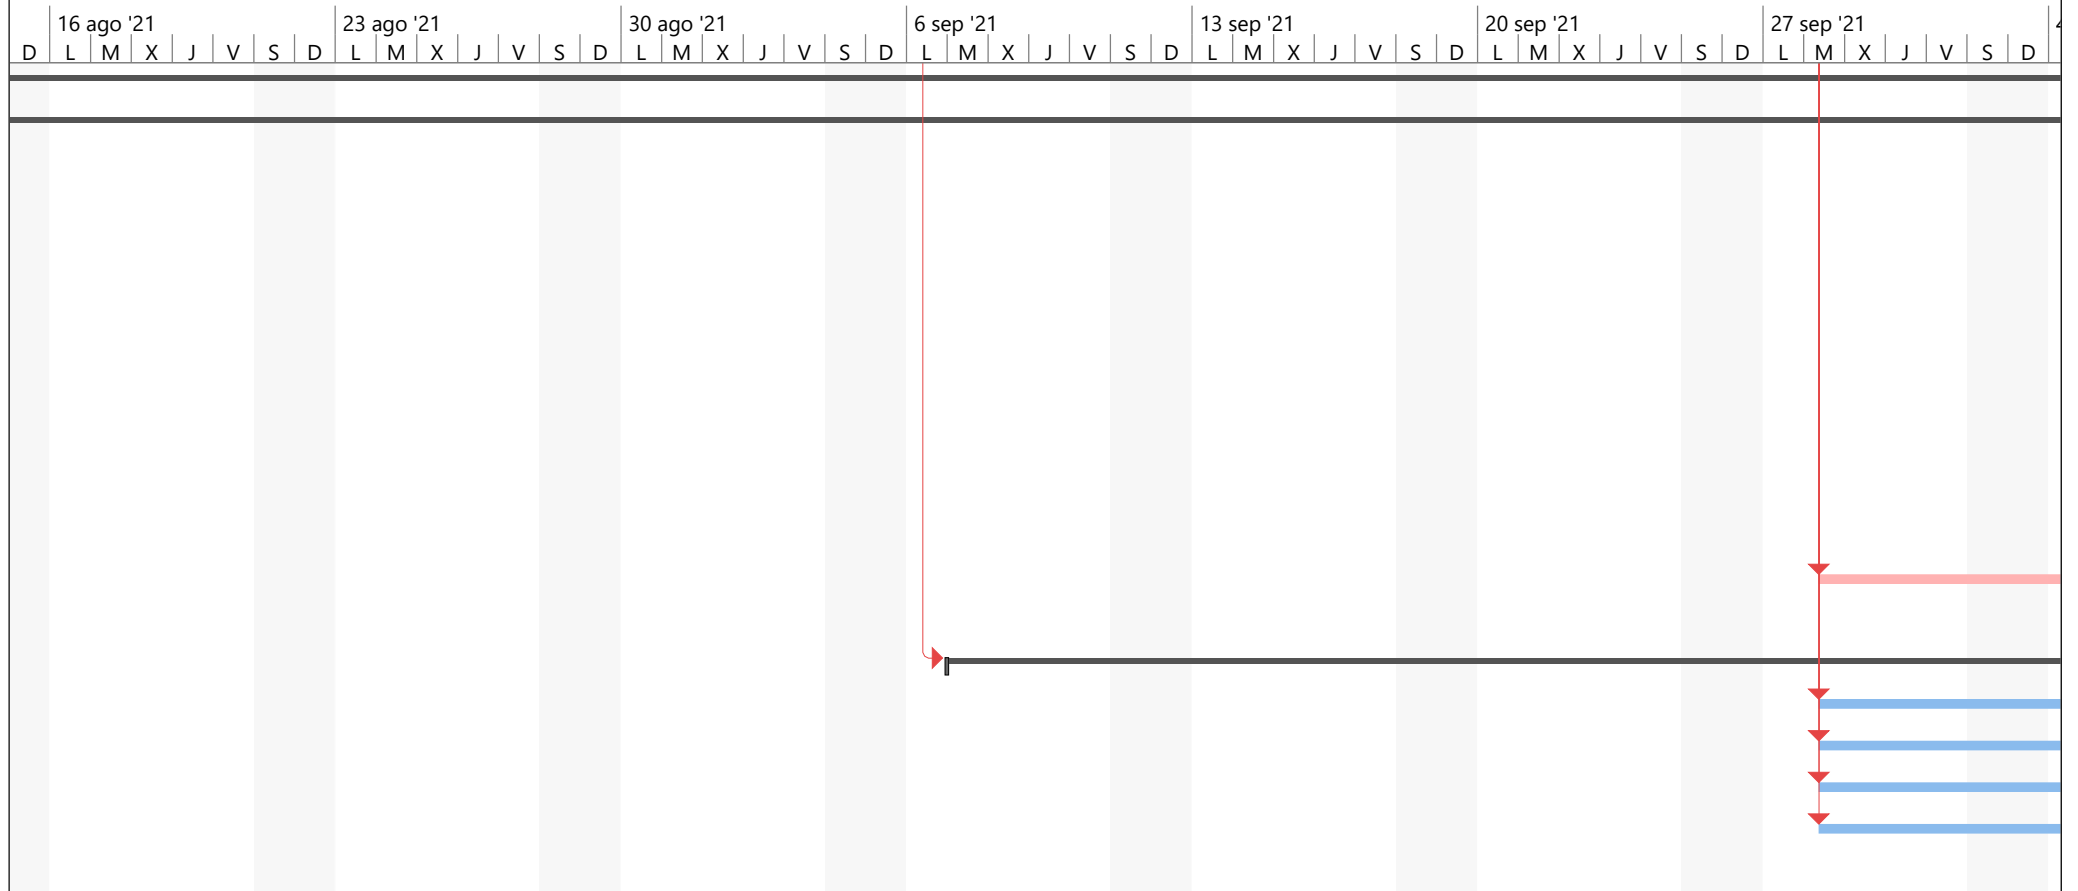

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	





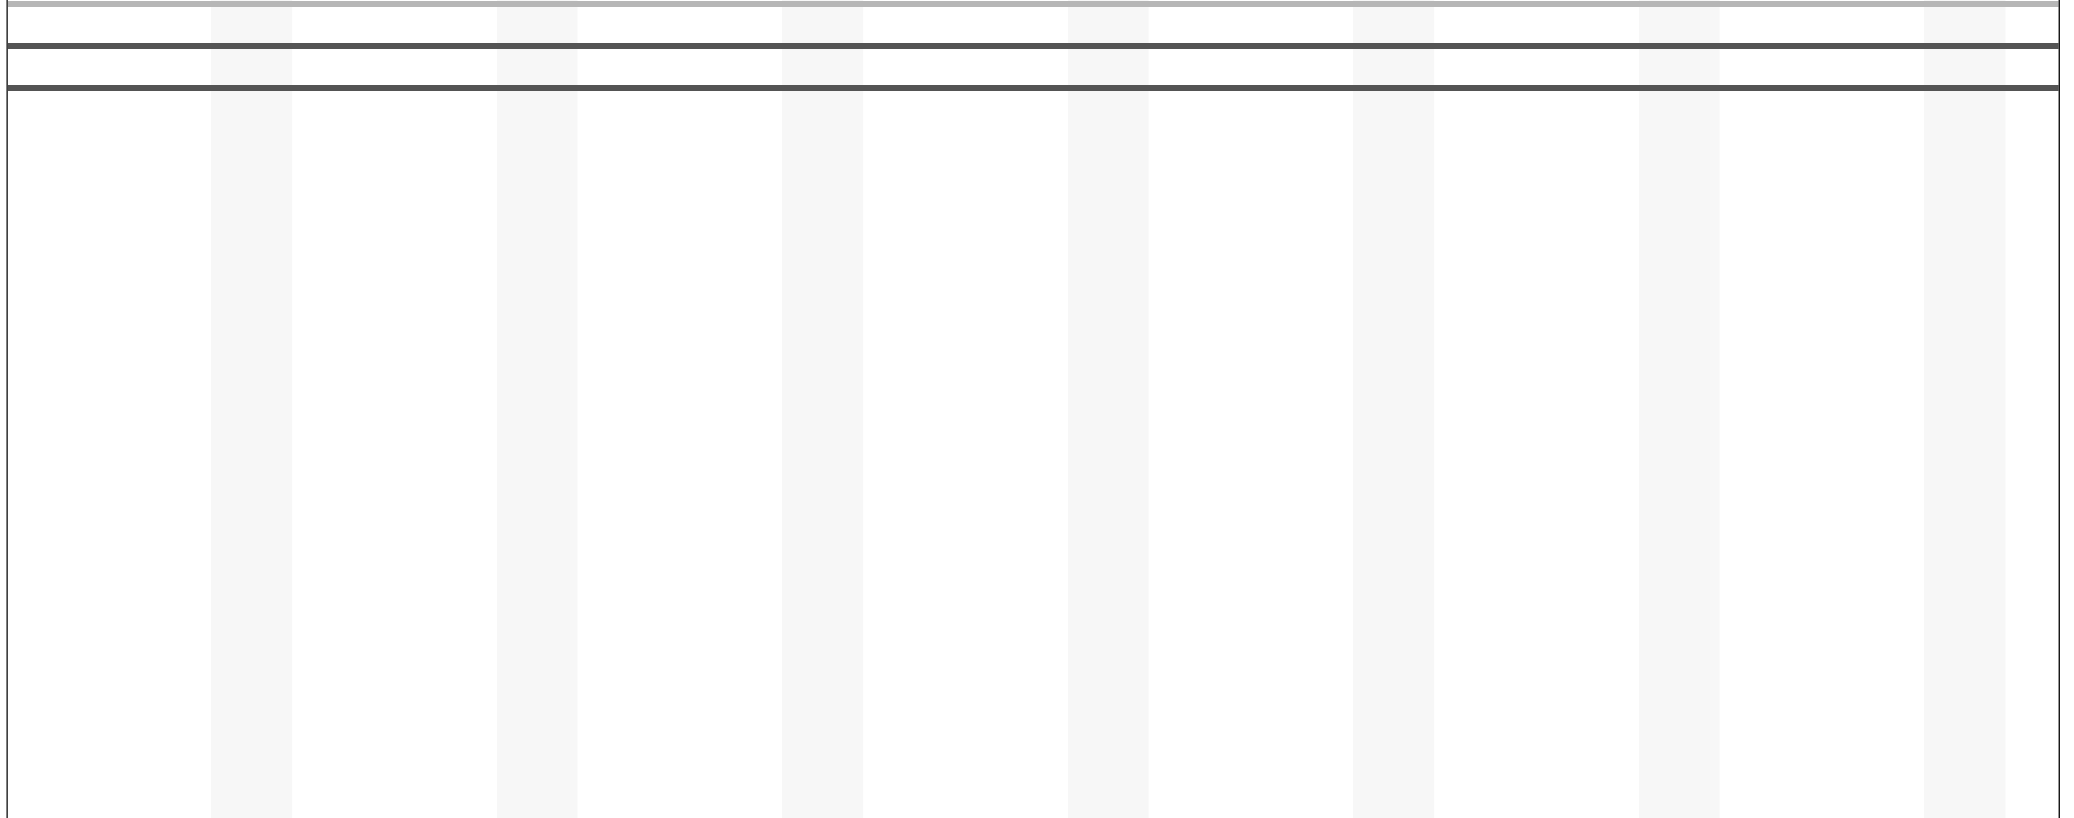



















# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

4 oct '21	11 oct '21	18 oct '21	25 oct '21	1 nov '21	8 nov '21	15 nov '21	22 nov '21
L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

4 oct '21							11 oct '21							18 oct '21							25 oct '21							1 nov '21							8 nov '21							15 nov '21							22 nov '21
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L

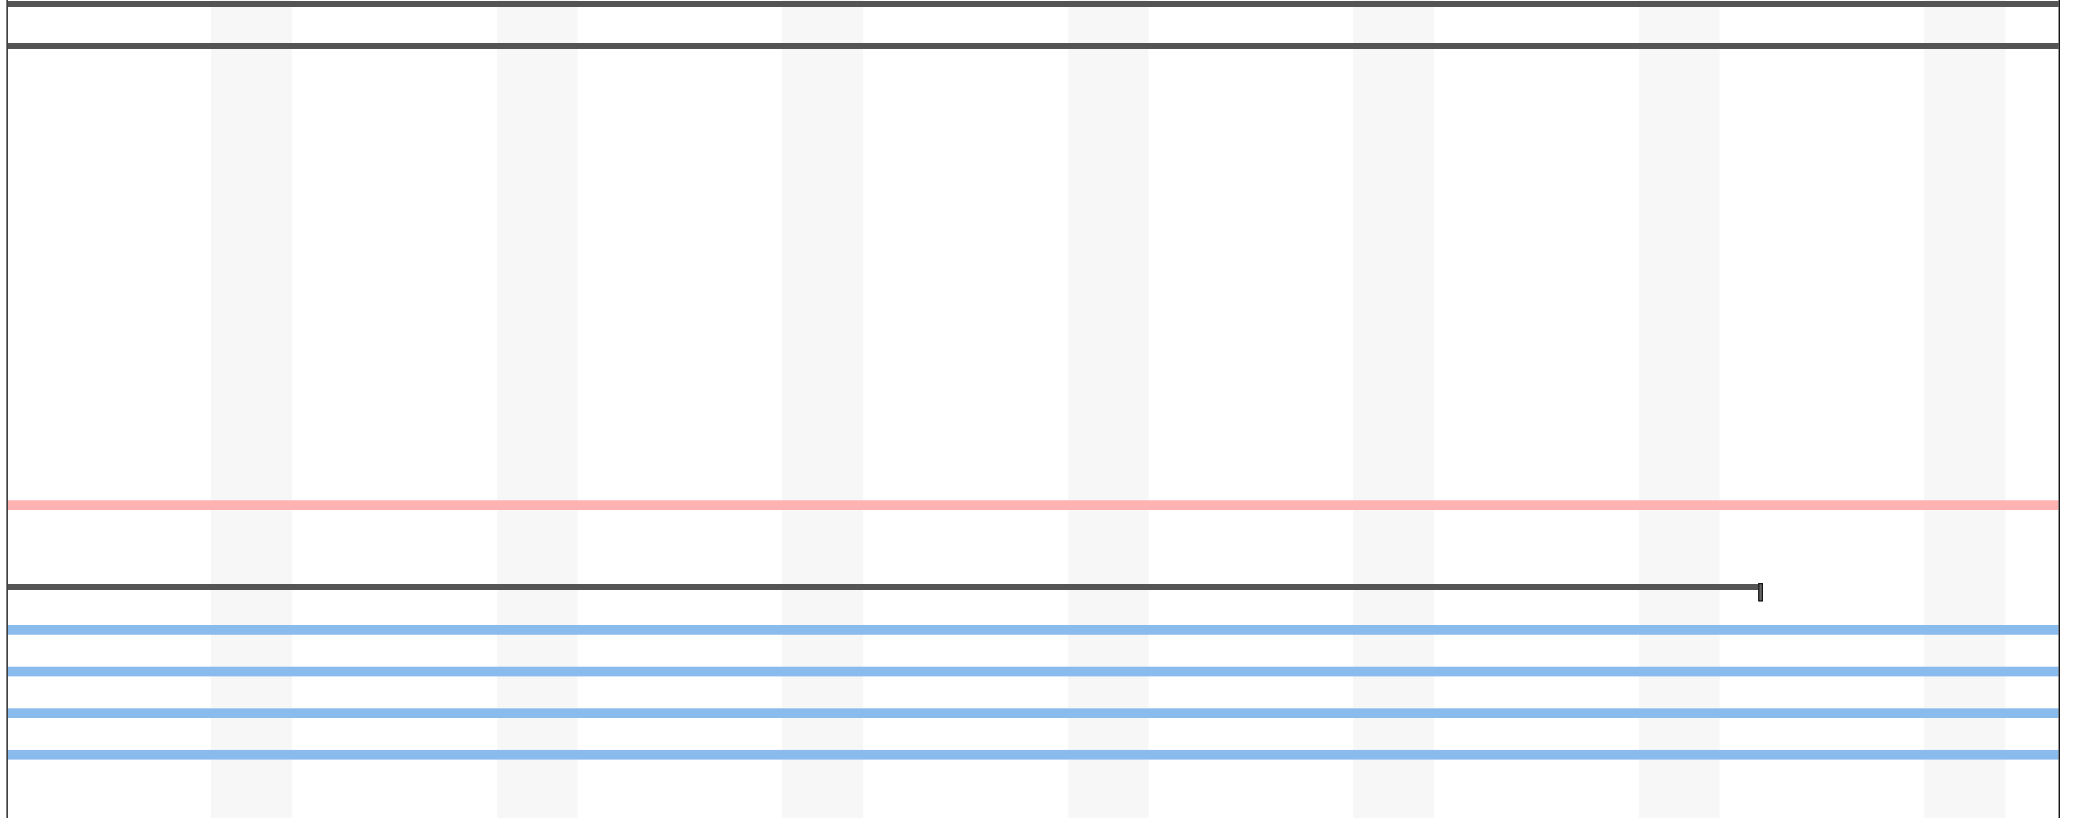

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

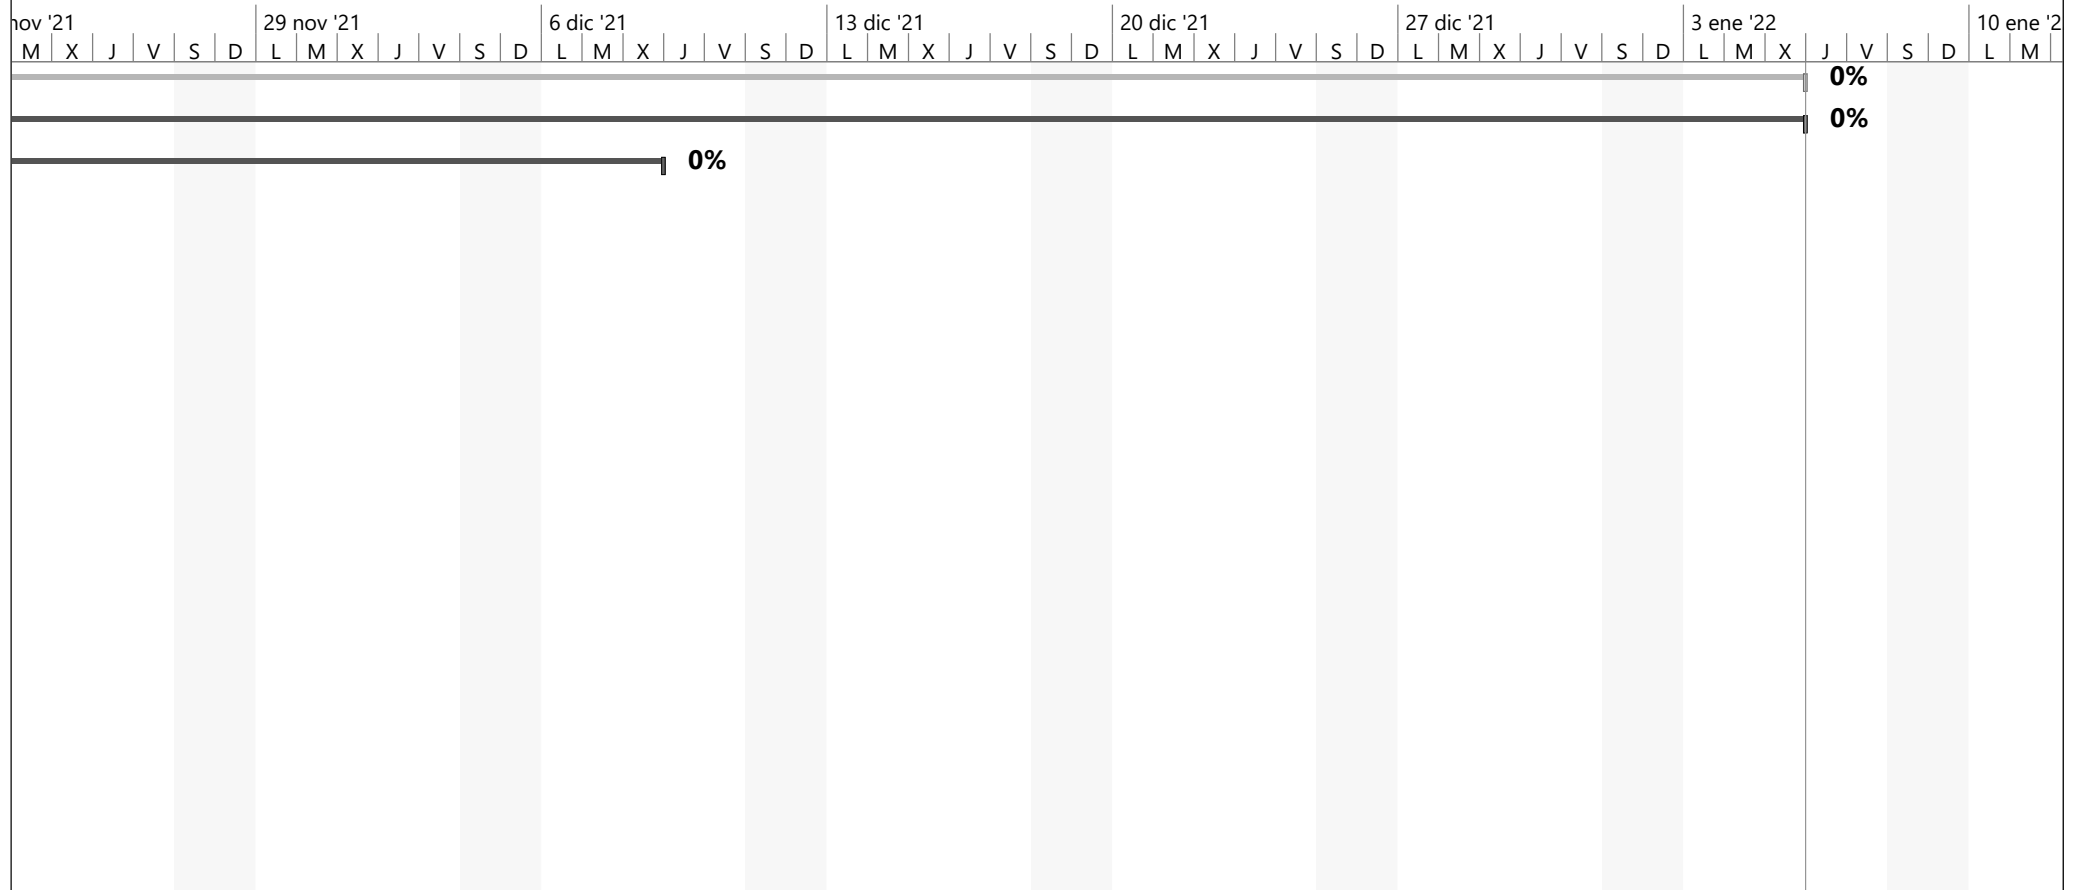

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de Ejecución MAIM401-402 Oct2020

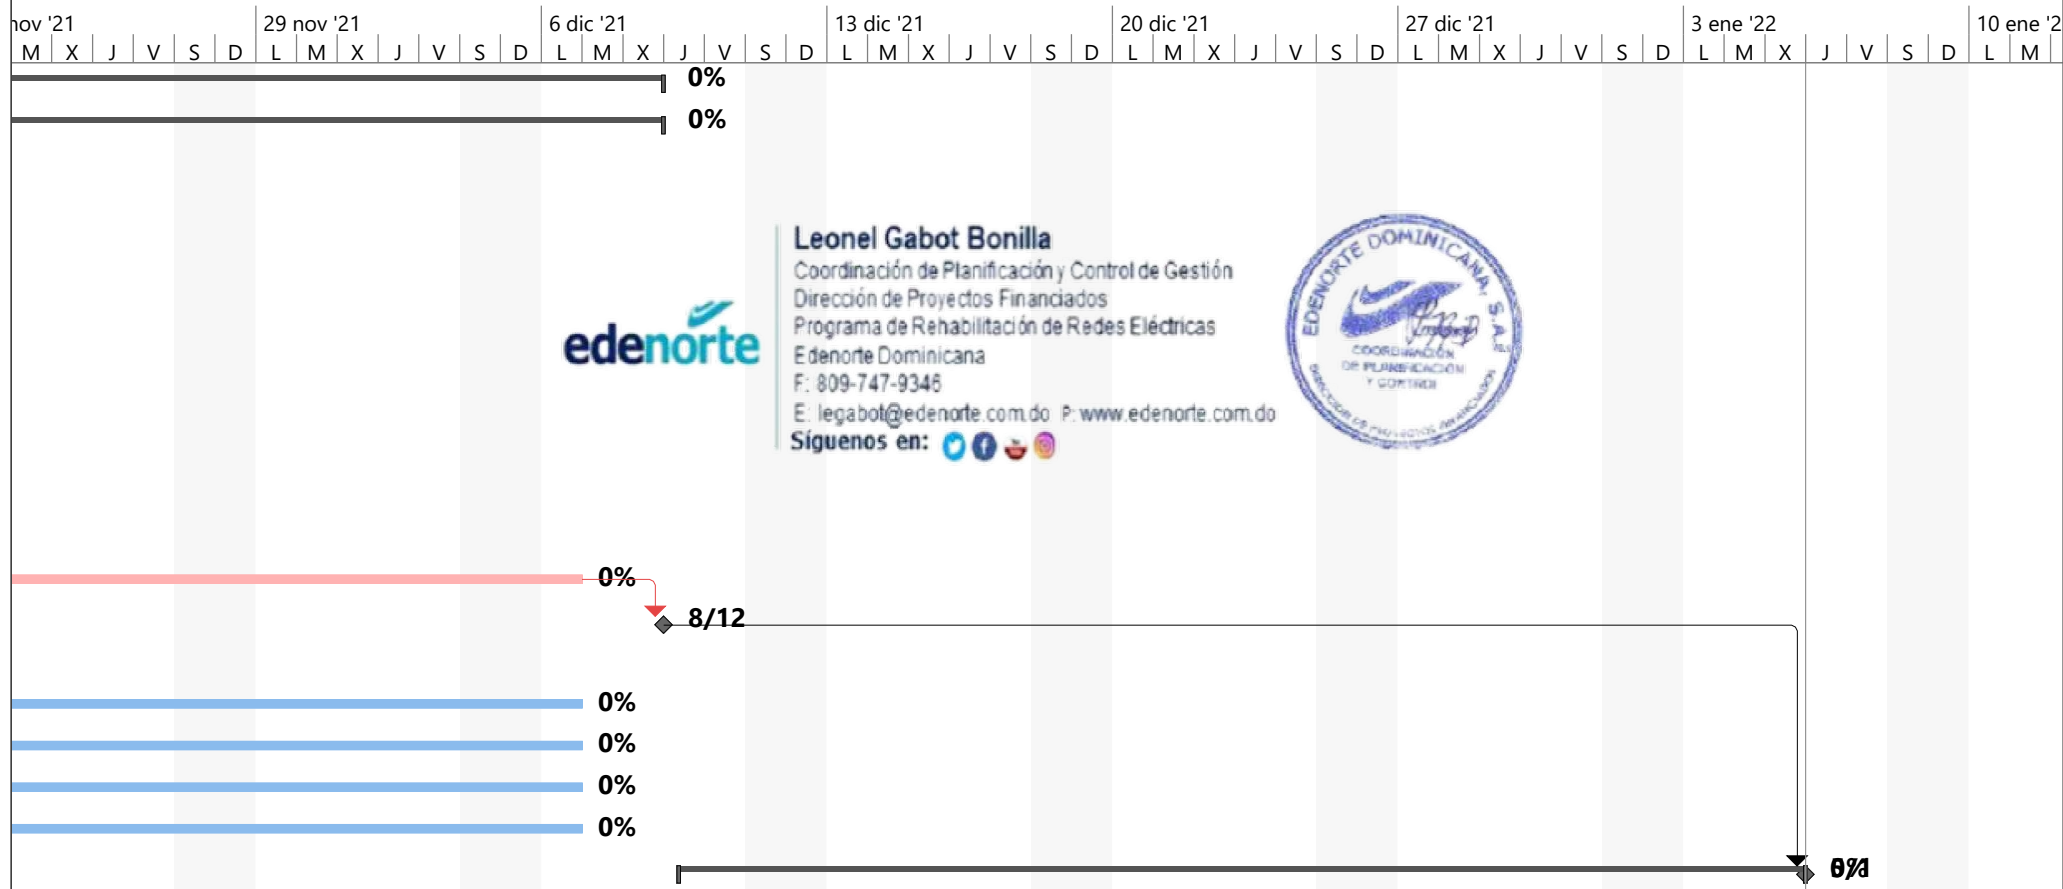

**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:

