











































































































# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18							23 abr '18						
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1			<b>Rehabilitación de Redes BPER104</b>																												
2			Adjudicación																												
3			<b>Periodo de Adquisiciones</b>																												
28			<b>Ejecución</b>																												
29			<b>Polígono 1</b>																												
30			<b>Instalación</b>																												
31			Izado de postes																												
32			Cimentaciones																												
33			Retenidas																												
34			Armados de Media y Baja Tensión																												
35			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión																												
36			Elementos de Protección y Maniobra																												
37			Conexiones y Jumpers																												
38			Transformadores																												
39			Alumbrado Publico																												
40			Normalización Suministros																												
41			<b>Remoción</b>																												
42			Tendido de Conductor Media Tensión																												
43			Tendido de Conductor Baja Tensión																												
44			Armados de Media Tensión																												










































Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18							23 abr '18						
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
45			Armados de Baja Tensión																												
46			Transformadores																												
47			Izado de postes																												
48			Cierre de Polígono 1																												
49			<b>Polígono 2</b>																												
50			<b>Instalación</b>																												
51			Izado de postes																												
52			Cimentaciones																												
53			Retenidas																												
54			Armados de Media y Baja Tensión																												
55			Tendido de Conductor Media y Baja Tensión																												
56			Elementos de Protección y Maniobra																												
57			Conexiones y Jumpers																												
58			Transformadores																												
59			Alumbrado Publico																												
60			Normalización Suministros																												
61			<b>Remoción</b>																												
62			Tendido de Conductor Media Tensión																												
63			Tendido de Conductor Baja Tensión																												
64			Armados de Media Tensión																												













Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18							23 abr '18						
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
65			Armados de Baja Tensión																												
66			Transformadores																												
67			Izado de postes																												
68			Cierre de Polígono 2																												
69			<b>Polígono 3</b>																												
70			<b>Instalación</b>																												
71			Izado de postes																												
72			Cimentaciones																												
73			Retenidas																												
74			Armados de Media y Baja Tensión																												
75			Tendido de Conductor Media y Baja Tensiór																												
76			Elementos de Protección y Maniobra																												
77			Conexiones y Jumpers																												
78			Transformadores																												
79			Alumbrado Publico																												
80			Normalización Suministros																												
81			<b>Remoción</b>																												
82			Tendido de Conductor Media Tensión																												
83			Tendido de Conductor Baja Tensión																												
84			Armados de Media Tensión																												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	2 abr '18							9 abr '18							16 abr '18							23 abr '18						
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
85			Armados de Baja Tensión																												
86			Transformadores																												
87			Izado de postes																												
88			Cierre de Polígono 3																												
89			Cierre de Obras																												

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

18 jun '18							25 jun '18							2 jul '18							9 jul '18							16 jul '18							23 jul '18							30 jul '18						
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

18 jun '18							25 jun '18							2 jul '18							9 jul '18							16 jul '18							23 jul '18							30 jul '18						
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

18 jun '18							25 jun '18							2 jul '18							9 jul '18							16 jul '18							23 jul '18							30 jul '18						
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D						

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020


6 ago '18	13 ago '18	20 ago '18	27 ago '18	3 sep '18	10 sep '18	17 sep '18	24 se
L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

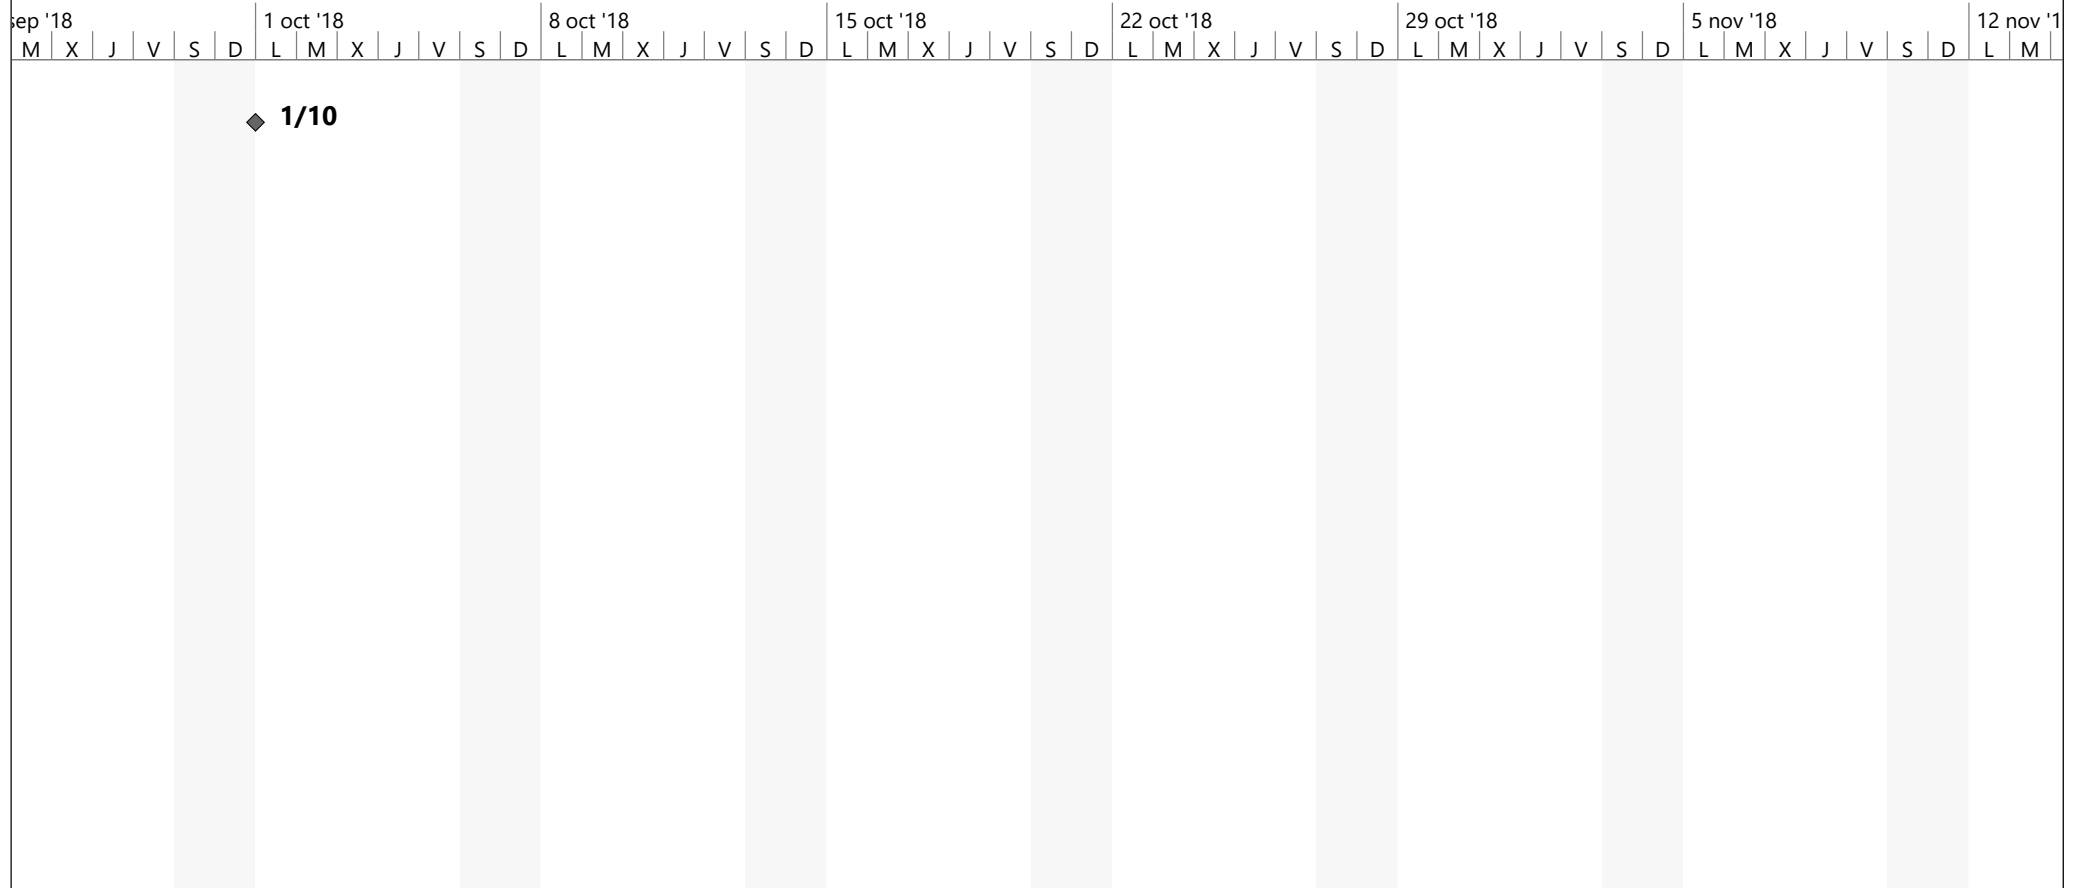

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

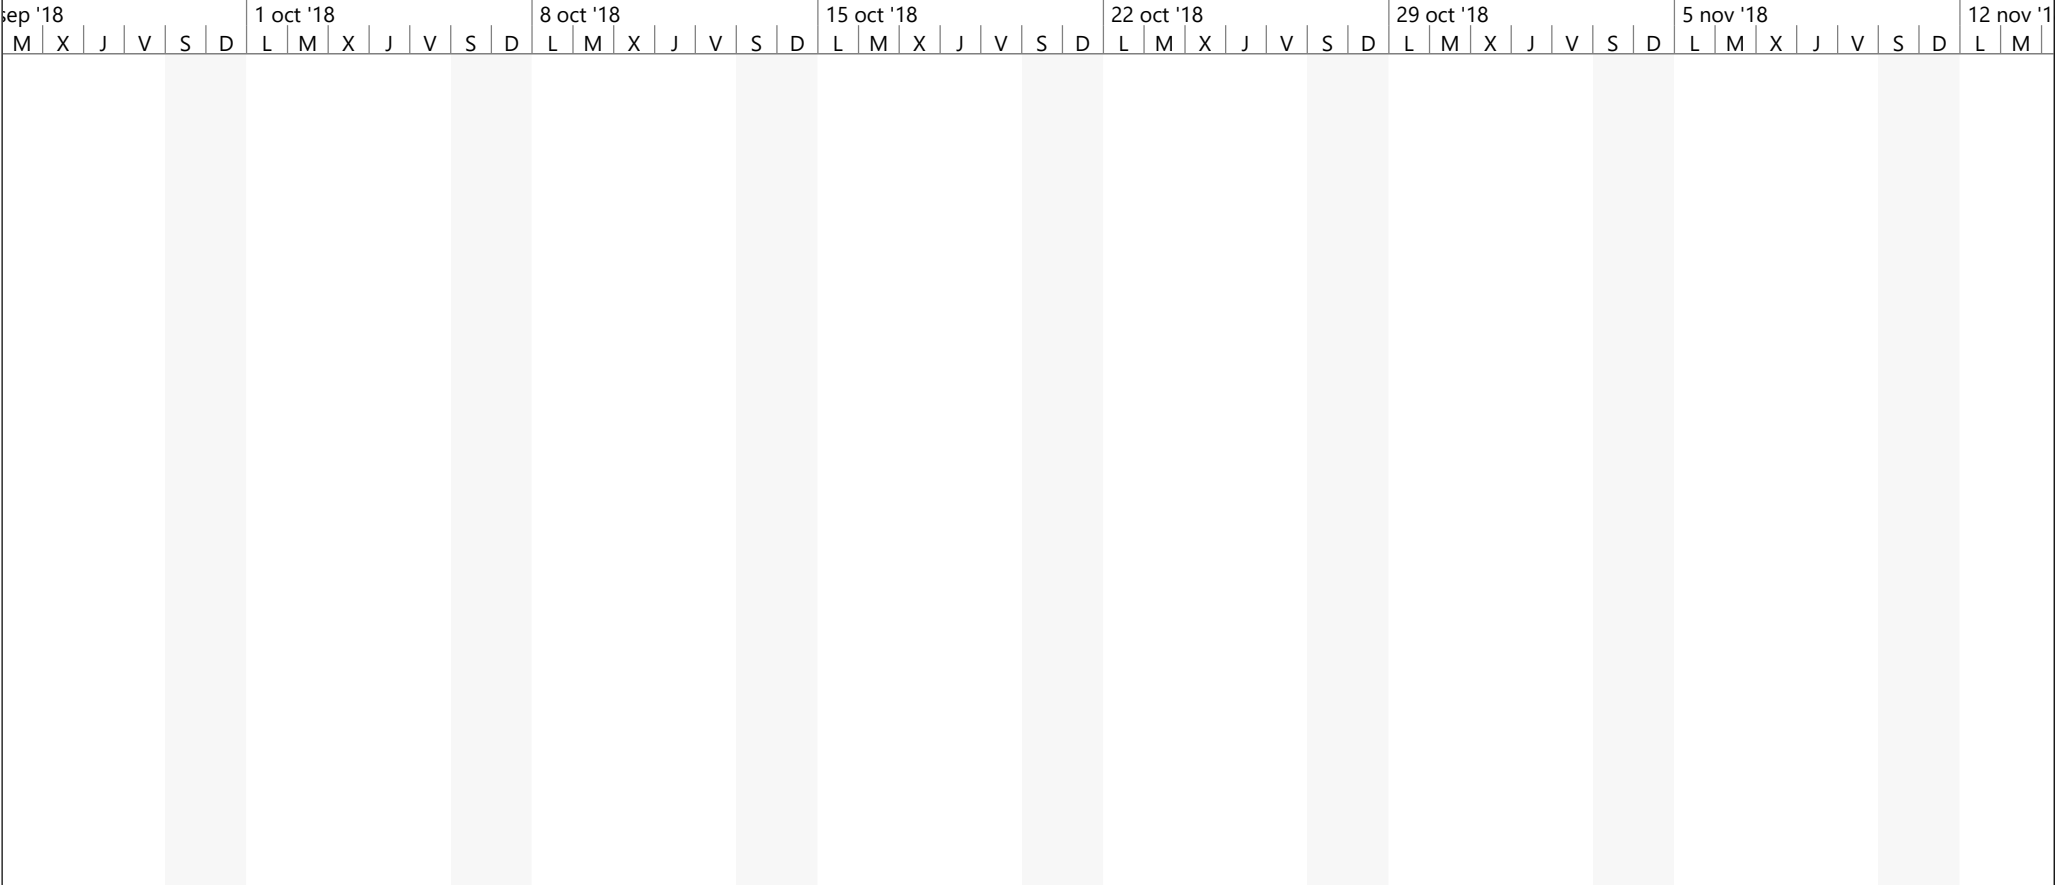

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020


sep '18	M	X	J	V	S	D	1 oct '18	L	M	X	J	V	S	D	8 oct '18	L	M	X	J	V	S	D	15 oct '18	L	M	X	J	V	S	D	22 oct '18	L	M	X	J	V	S	D	29 oct '18	L	M	X	J	V	S	D	5 nov '18	L	M	X	J	V	S	D	12 nov '18	L	M	X	J	V	S	D	19 nov '18	L	M	X	J	V	S	D	26 nov '18	L	M	X	J	V	S	D	3 dic '18	L	M	X	J	V	S	D	9 dic '18	L	M	X	J	V	S	D	16 dic '18	L	M	X	J	V	S	D	23 dic '18	L	M	X	J	V	S	D	30 dic '18	L	M	X	J	V	S	D	6 ene '19	L	M	X	J	V	S	D	13 ene '19	L	M	X	J	V	S	D	20 ene '19	L	M	X	J	V	S	D	27 ene '19	L	M	X	J	V	S	D	3 feb '19	L	M	X	J	V	S	D	10 feb '19	L	M	X	J	V	S	D	17 feb '19	L	M	X	J	V	S	D	24 feb '19	L	M	X	J	V	S	D	3 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	10 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	17 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	24 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	31 mar '19	L	M	X	J	V	S	D	7 abr '19	L	M	X	J	V	S	D	14 abr '19	L	M	X	J	V	S	D	21 abr '19	L	M	X	J	V	S	D	28 abr '19	L	M	X	J	V	S	D	5 may '19	L	M	X	J	V	S	D	12 may '19	L	M	X	J	V	S	D	19 may '19	L	M	X	J	V	S	D	26 may '19	L	M	X	J	V	S	D	2 jun '19	L	M	X	J	V	S	D	9 jun '19	L	M	X	J	V	S	D	16 jun '19	L	M	X	J	V	S	D	23 jun '19	L	M	X	J	V	S	D	30 jun '19	L	M	X	J	V	S	D	7 jul '19	L	M	X	J	V	S	D	14 jul '19	L	M	X	J	V	S	D	21 jul '19	L	M	X	J	V	S	D	28 jul '19	L	M	X	J	V	S	D	4 ago '19	L	M	X	J	V	S	D	11 ago '19	L	M	X	J	V	S	D	18 ago '19	L	M	X	J	V	S	D	25 ago '19	L	M	X	J	V	S	D	1 sep '19	L	M	X	J	V	S	D	8 sep '19	L	M	X	J	V	S	D	15 sep '19	L	M	X	J	V	S	D	22 sep '19	L	M	X	J	V	S	D	29 sep '19	L	M	X	J	V	S	D	6 oct '19	L	M	X	J	V	S	D	13 oct '19	L	M	X	J	V	S	D	20 oct '19	L	M	X	J	V	S	D	27 oct '19	L	M	X	J	V	S	D	3 nov '19	L	M	X	J	V	S	D	10 nov '19	L	M	X	J	V	S	D	17 nov '19	L	M	X	J	V	S	D	24 nov '19	L	M	X	J	V	S	D	1 dec '19	L	M	X	J	V	S	D	8 dec '19	L	M	X	J	V	S	D	15 dec '19	L	M	X	J	V	S	D	22 dec '19	L	M	X	J	V	S	D	29 dec '19	L	M	X	J	V	S	D	5 ene '20	L	M	X	J	V	S	D	12 ene '20	L	M	X	J	V	S	D	19 ene '20	L	M	X	J	V	S	D	26 ene '20	L	M	X	J	V	S	D	2 feb '20	L	M	X	J	V	S	D	9 feb '20	L	M	X	J	V	S	D	16 feb '20	L	M	X	J	V	S	D	23 feb '20	L	M	X	J	V	S	D	2 mar '20	L	M	X	J	V	S	D	9 mar '20	L	M	X	J	V	S	D	16 mar '20	L	M	X	J	V	S	D	23 mar '20	L	M	X	J	V	S	D	30 mar '20	L	M	X	J	V	S	D	6 abr '20	L	M	X	J	V	S	D	13 abr '20	L	M	X	J	V	S	D	20 abr '20	L	M	X	J	V	S	D	27 abr '20	L	M	X	J	V	S	D	4 may '20	L	M	X	J	V	S	D	11 may '20	L	M	X	J	V	S	D	18 may '20	L	M	X	J	V	S	D	25 may '20	L	M	X	J	V	S	D	1 jun '20	L	M	X	J	V	S	D	8 jun '20	L	M	X	J	V	S	D	15 jun '20	L	M	X	J	V	S	D	22 jun '20	L	M	X	J	V	S	D	29 jun '20	L	M	X	J	V	S	D	6 jul '20	L	M	X	J	V	S	D	13 jul '20	L	M	X	J	V	S	D	20 jul '20	L	M	X	J	V	S	D	27 jul '20	L	M	X	J	V	S	D	3 ago '20	L	M	X	J	V	S	D	10 ago '20	L	M	X	J	V	S	D	17 ago '20	L	M	X	J	V	S	D	24 ago '20	L	M	X	J	V	S	D	31 ago '20	L	M	X	J	V	S	D	7 sep '20	L	M	X	J	V	S	D	14 sep '20	L	M	X	J	V	S	D	21 sep '20	L	M	X	J	V	S	D	28 sep '20	L	M	X	J	V	S	D	5 oct '20	L	M	X	J	V	S	D	12 oct '20	L	M	X	J	V	S	D	19 oct '20	L	M	X	J	V	S	D	26 oct '20	L	M	X	J	V	S	D	2 nov '20	L	M	X	J	V	S	D	9 nov '20	L	M	X	J	V	S	D	16 nov '20	L	M	X	J	V	S	D	23 nov '20	L	M	X	J	V	S	D	30 nov '20	L	M	X	J	V	S	D	7 dic '20	L	M	X	J	V	S	D	14 dic '20	L	M	X	J	V	S	D	21 dic '20	L	M	X	J	V	S	D	28 dic '20	L	M	X	J	V	S	D	4 ene '21	L	M	X	J	V	S	D	11 ene '21	L	M	X	J	V	S	D	18 ene '21	L	M	X	J	V	S	D	25 ene '21	L	M	X	J	V	S	D	1 feb '21	L	M	X	J	V	S	D	8 feb '21	L	M	X	J	V	S	D	15 feb '21	L	M	X	J	V	S	D	22 feb '21	L	M	X	J	V	S	D	1 mar '21	L	M	X	J	V	S	D	8 mar '21	L	M	X	J	V	S	D	15 mar '21	L	M	X	J	V	S	D	22 mar '21	L	M	X	J	V	S	D	29 mar '21	L	M	X	J	V	S	D	5 abr '21	L	M	X	J	V	S	D	12 abr '21	L	M	X	J	V	S	D	19 abr '21	L	M	X	J	V	S	D	26 abr '21	L	M	X	J	V	S	D	3 may '21	L	M	X	J	V	S	D	10 may '21	L	M	X	J	V	S	D	17 may '21	L	M	X	J	V	S	D	24 may '21	L	M	X	J	V	S	D	31 may '21	L	M	X	J	V	S	D	7 jun '21	L	M	X	J	V	S	D	14 jun '21	L	M	X	J	V	S	D	21 jun '21	L	M	X	J	V	S	D	28 jun '21	L	M	X	J	V	S	D	5 jul '21	L	M	X	J	V	S	D	12 jul '21	L	M	X	J	V	S	D	19 jul '21	L	M	X	J	V	S	D	26 jul '21	L	M	X	J	V	S	D	2 ago '21	L	M	X	J	V	S	D	9 ago '21	L	M	X	J	V	S	D	16 ago '21	L	M	X	J	V	S	D	23 ago '21	L	M	X	J	V	S	D	30 ago '21	L	M	X	J	V	S	D	6 sep '21	L	M	X	J	V	S	D	13 sep '21	L	M	X	J	V	S	D	20 sep '21	L	M	X	J	V	S	D	27 sep '21	L	M	X	J	V	S	D	4 oct '21	L	M	X	J	V	S	D	11 oct '21	L	M	X	J	V	S	D	18 oct '21	L	M	X	J	V	S	D	25 oct '21	L	M	X	J	V	S	D	1 nov '21	L	M	X	J	V	S	D	8 nov '21	L	M	X	J	V	S	D	15 nov '21	L	M	X	J	V	S	D	22 nov '21	L	M	X	J	V	S	D	29 nov '21	L	M	X	J	V	S	D	6 dic '21	L	M	X	J	V	S	D	13 dic '21	L	M	X	J	V	S	D	20 dic '21	L	M	X	J	V	S	D	27 dic '21	L	M	X	J	V	S	D	3 ene '22	L	M	X	J	V	S	D	10 ene '22	L	M	X	J	V	S	D	17 ene '22	L	M	X	J	V	S	D	24 ene '22	L	M	X	J	V	S	D	31 ene '22	L	M	X	J	V	S	D	7 feb '22	L	M	X	J	V	S	D	14 feb '22	L	M	X	J	V	S	D	21 feb '22	L	M	X	J	V	S	D	28 feb '22	L	M	X	J	V	S	D	6 mar '22	L	M	X	J	V	S	D	13 mar '22	L	M	X	J	V	S	D	20 mar '22	L	M	X	J	V	S	D	27 mar '22	L	M	X	J	V	S	D	3 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	10 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	17 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	24 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	1 may '22	L	M	X	J	V	S	D	8 may '22	L	M	X	J	V	S	D	15 may '22	L	M	X	J	V	S	D	22 may '22	L	M	X	J	V	S	D	29 may '22	L	M	X	J	V	S	D	5 jun '22	L	M	X	J	V	S	D	12 jun '22	L	M	X	J	V	S	D	19 jun '22	L	M	X	J	V	S	D	26 jun '22	L	M	X	J	V	S	D	3 jul '22	L	M	X	J	V	S	D	10 jul '22	L	M	X	J	V	S	D	17 jul '22	L	M	X	J	V	S	D	24 jul '22	L	M	X	J	V	S	D	31 jul '22	L	M	X	J	V	S	D	7 ago '22	L	M	X	J	V	S	D	14 ago '22	L	M	X	J	V	S	D	21 ago '22	L	M	X	J	V	S	D	28 ago '22	L	M	X	J	V	S	D	4 sep '22	L	M	X	J	V	S	D	11 sep '22	L	M	X	J	V	S	D	18 sep '22	L	M	X	J	V	S	D	25 sep '22	L	M	X	J	V	S	D	2 oct '22	L	M	X	J	V	S	D	9 oct '22	L	M	X	J	V	S	D	16 oct '22	L	M	X	J	V	S	D	23 oct '22	L	M	X	J	V	S	D	30 oct '22	L	M	X	J	V	S	D	6 nov '22	L	M	X	J	V	S	D	13 nov '22	L	M	X	J	V	S	D	20 nov '22	L	M	X	J	V	S	D	27 nov '22	L	M	X	J	V	S	D	4 dic '22	L	M	X	J	V	S	D	11 dic '22	L	M	X	J	V	S	D	18 dic '22	L	M	X	J	V	S	D	25 dic '22	L	M	X	J	V	S	D	1 ene '23	L	M	X	J	V	S	D	8 ene '23	L	M	X	J	V	S	D	15 ene '23	L	M	X	J	V	S	D	22 ene '23	L	M	X	J	V	S	D	29 ene '23	L	M	X	J	V	S	D	5 feb '23	L	M	X	J	V	S	D	12 feb '23	L	M	X	J	V	S	D	19 feb '23	L	M	X	J	V	S	D	26 feb '23	L	M	X	J	V	S	D	5 mar '23	L	M	X	J	V	S	D	12 mar '23	L	M	X	J	V	S	D	19 mar '23	L	M	X	J	V	S	D	26 mar '23	L	M	X	J	V	S	D	2 apr '23	L	M	X	J	V	S	D	9 apr '23	L	M	X	J	V	S	D	16 apr '23	L	M	X	J	V	S	D	23 apr '23	L	M	X	J	V	S	D	30 apr '23	L	M	X	J	V	S	D	7 may '23	L	M	X	J	V	S	D	14 may '23	L	M	X	J	V	S	D	21 may '23	L	M	X	J	V	S	D	28 may '23	L	M	X	J	V	S	D	4 jun '23	L	M	X	J	V	S	D	11 jun '23	L	M	X	J	V	S	D	18 jun '23	L	M	X	J	V	S	D	25 jun '23	L	M	X	J	V	S	D	2 jul '23	L	M	X	J	V	S	D	9 jul '23	L	M	X	J	V	S	D	16 jul '23	L	M	X	J	V	S	D	23 jul '23	L	M	X	J	V	S	D	30 jul '23	L	M	X	J	V	S	D	6 ago '23	L	M	X	J	V	S	D	13 ago '23	L	M	X	J	V	S	D	20 ago '23	L	M	X	J	V	S	D	27 ago '23	L	M	X	J	V	S	D	3 sep '23	L	M	X	J	V	S	D	10 sep '23	L	M	X	J	V	S	D	17 sep '23	L	M	X	J	V	S	D	24 sep '23	L	M	X	J	V	S	D	1 oct '23	L	M	X	J	V	S	D	8 oct '23	L	M	X	J	V	S	D	15 oct '23	L	M	X	J	V	S	D	22 oct '23	L	M	X	J	V	S	D	29 oct '23	L	M	X	J	V	S	D	5 nov '23	L	M	X	J	V	S	D	12 nov '23	L	M	X	J	V	S	D	19 nov '
---------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	----------

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

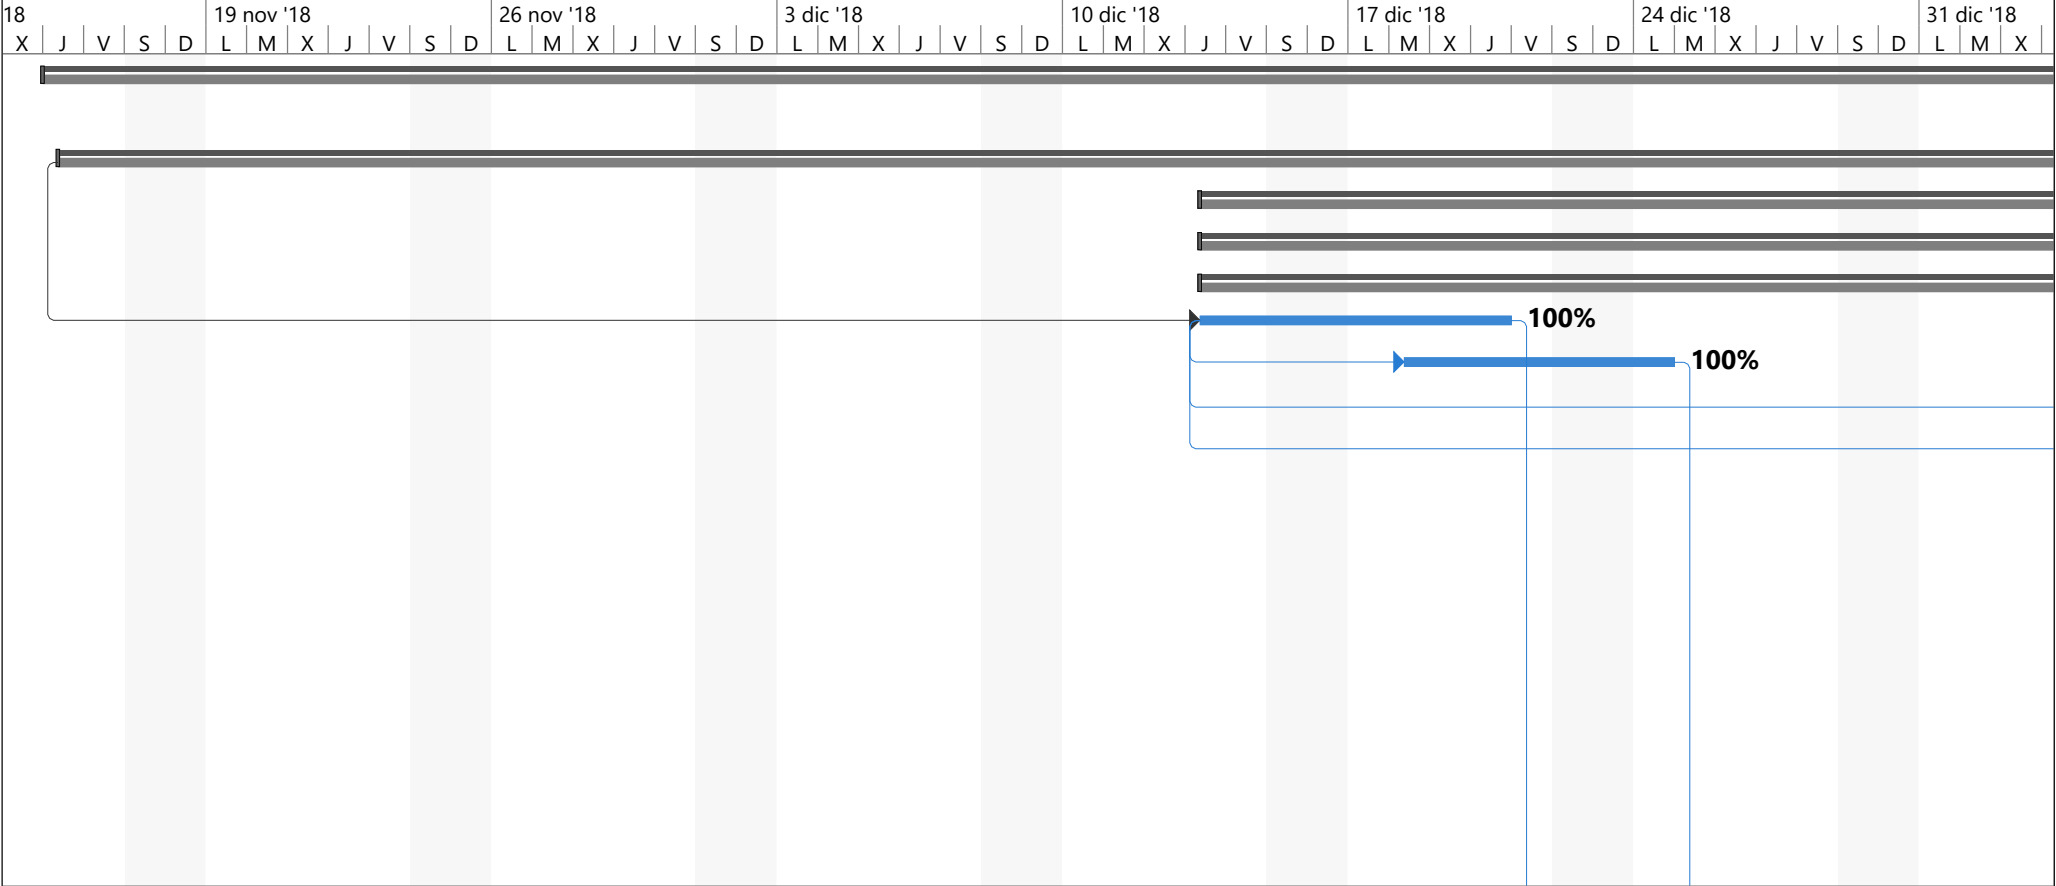

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




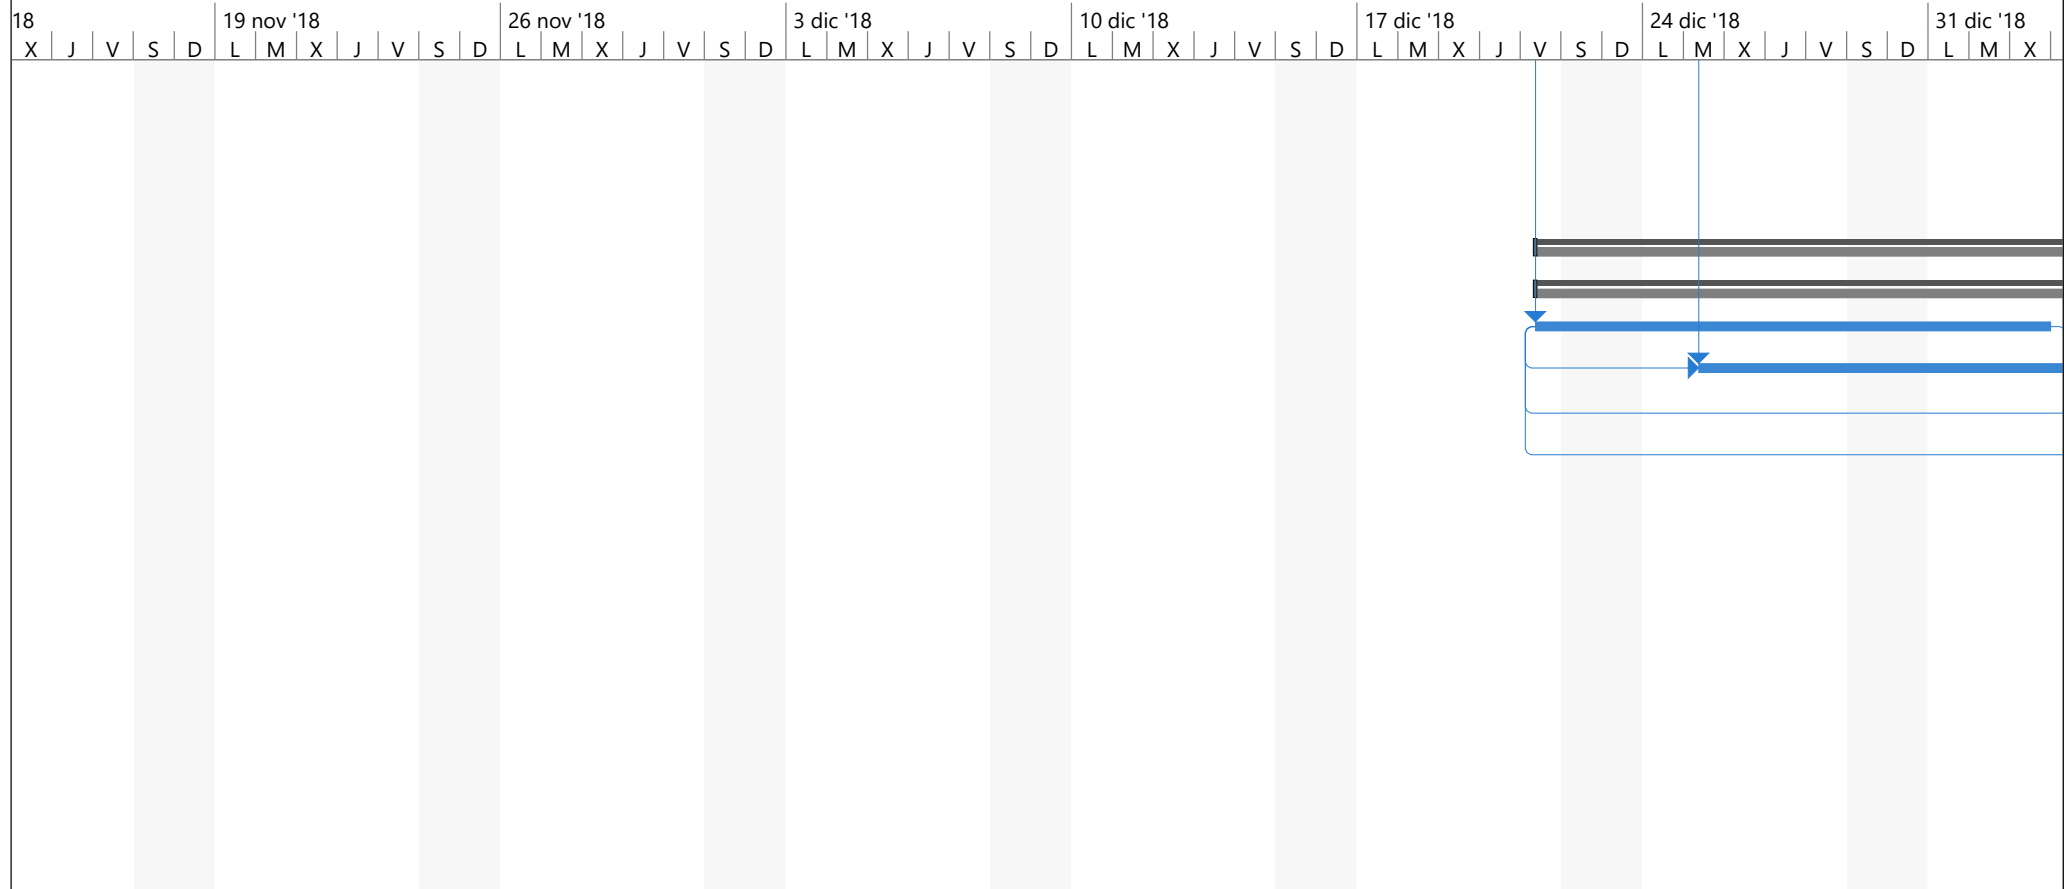




















# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

18					19 nov '18					26 nov '18					3 dic '18					10 dic '18					17 dic '18					24 dic '18					31 dic '18		
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020


18					19 nov '18					26 nov '18					3 dic '18					10 dic '18					17 dic '18					24 dic '18					31 dic '18		
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

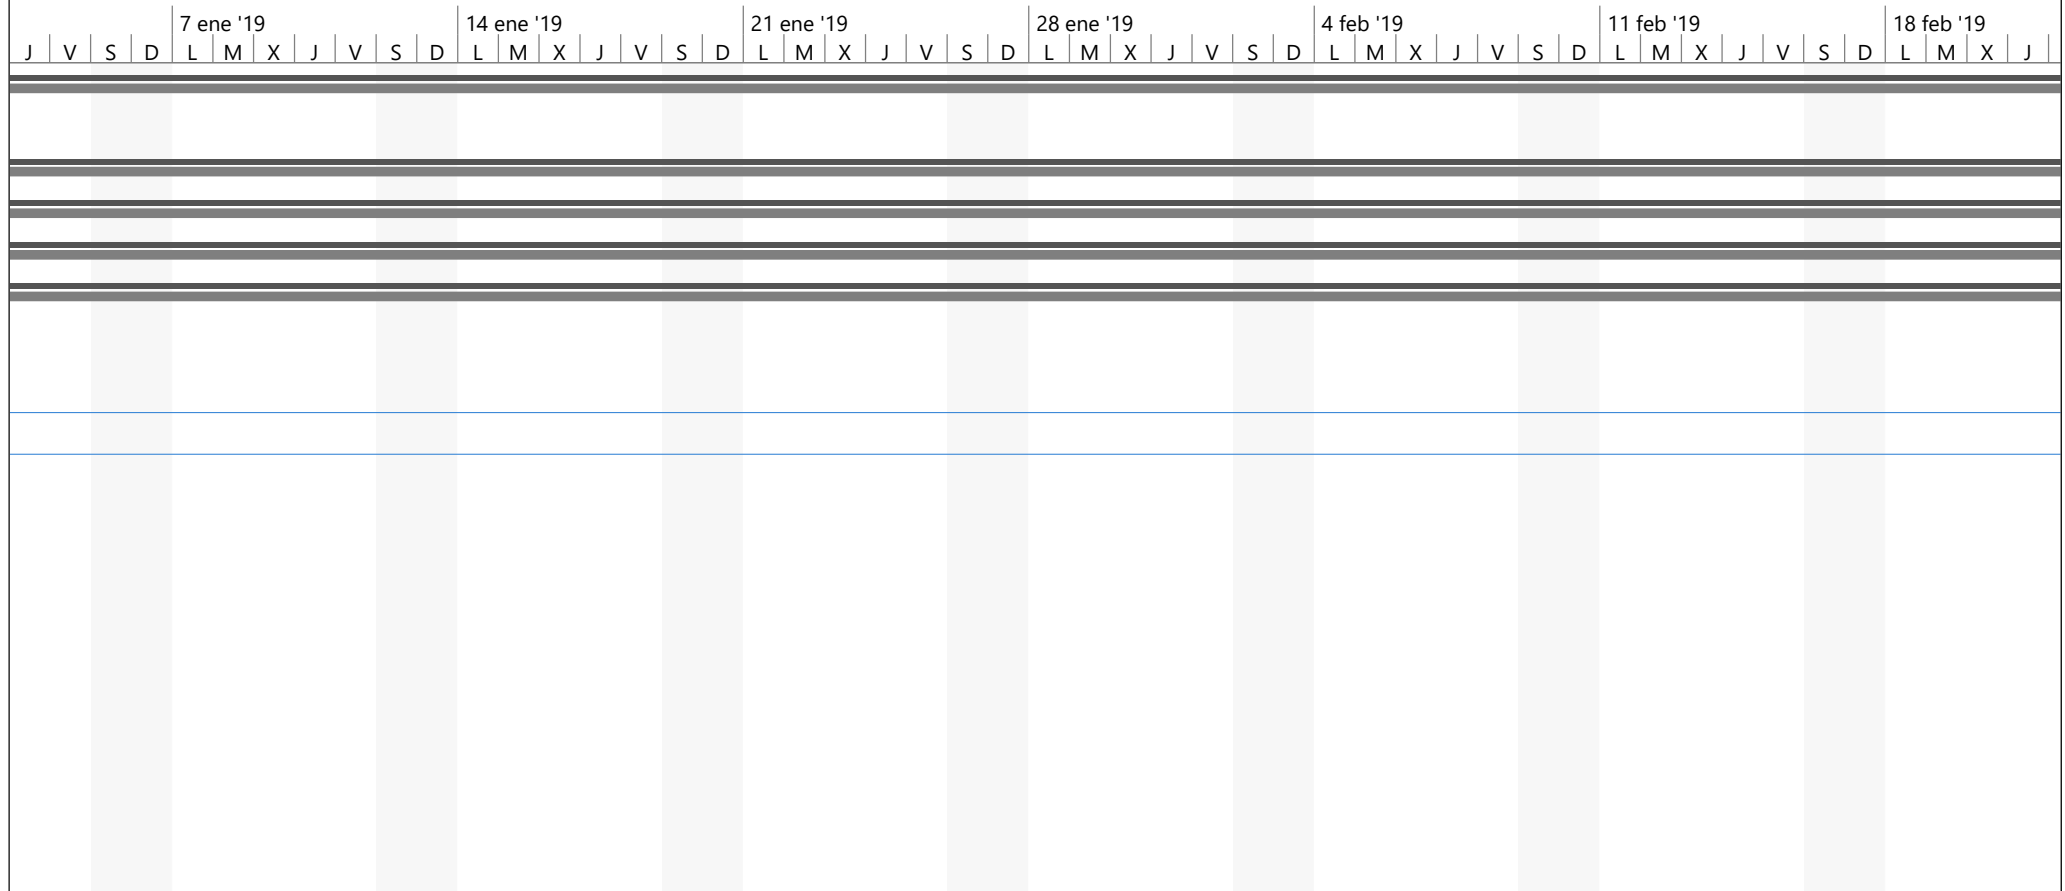


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

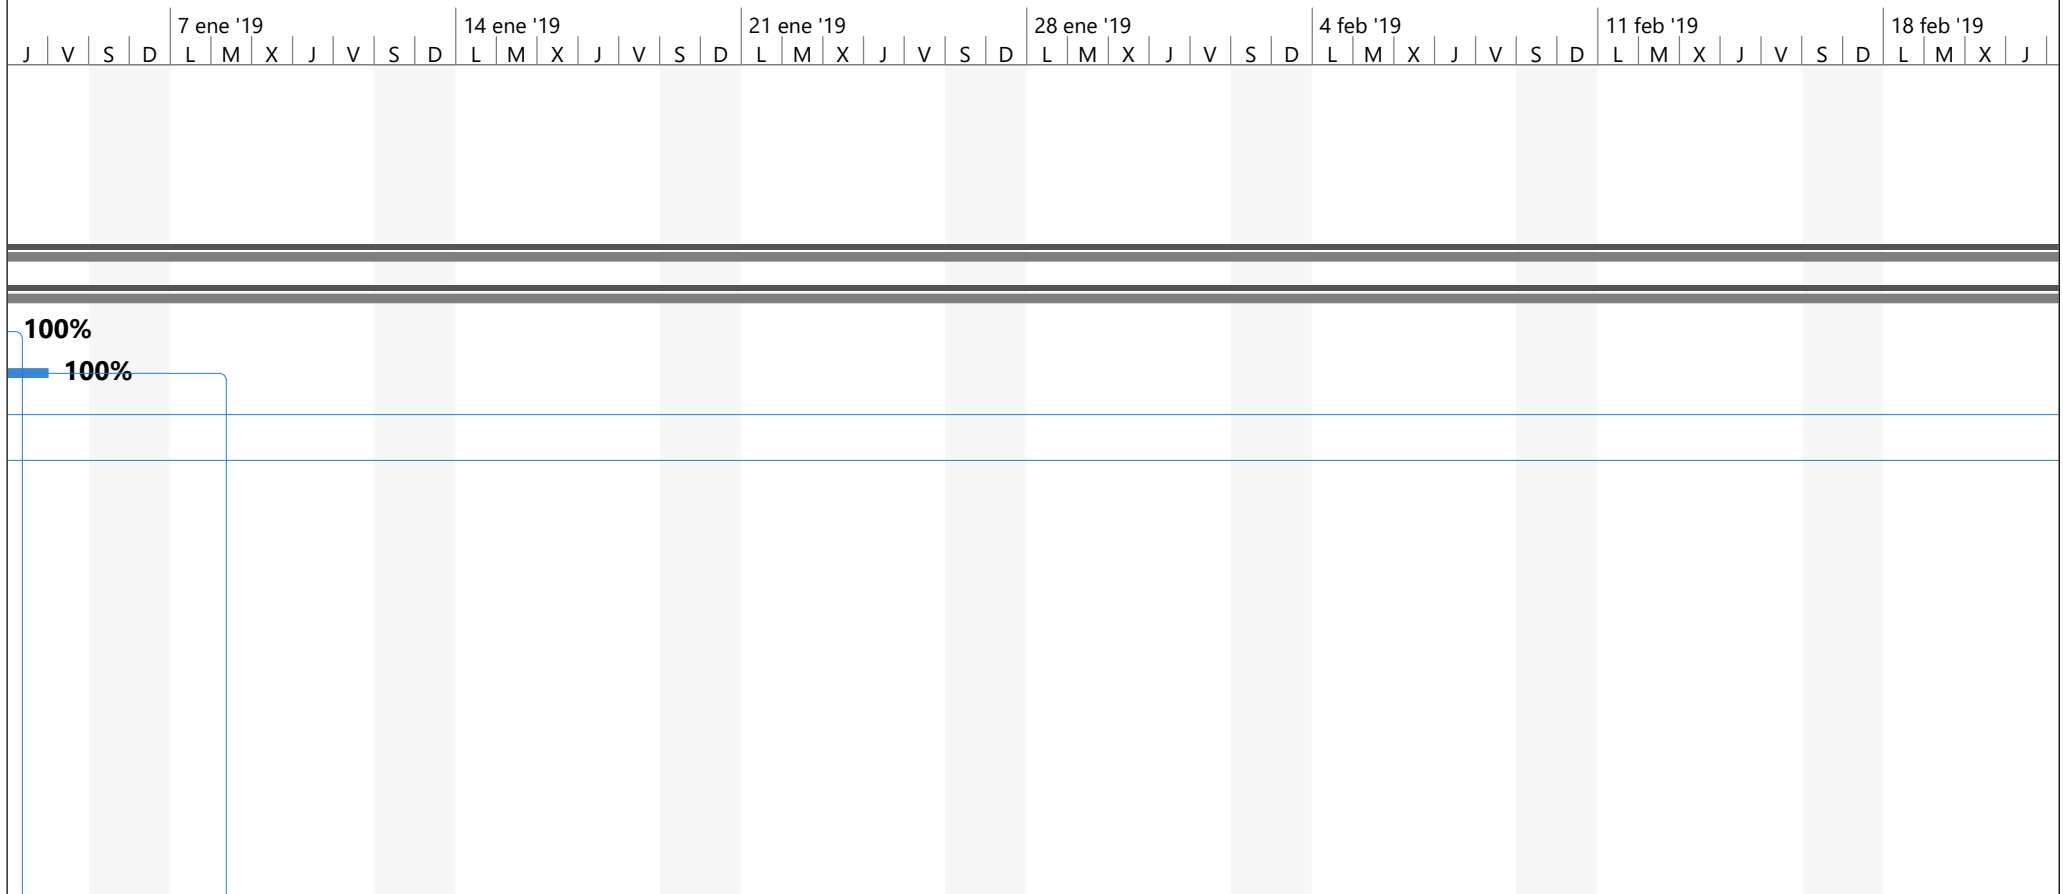

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

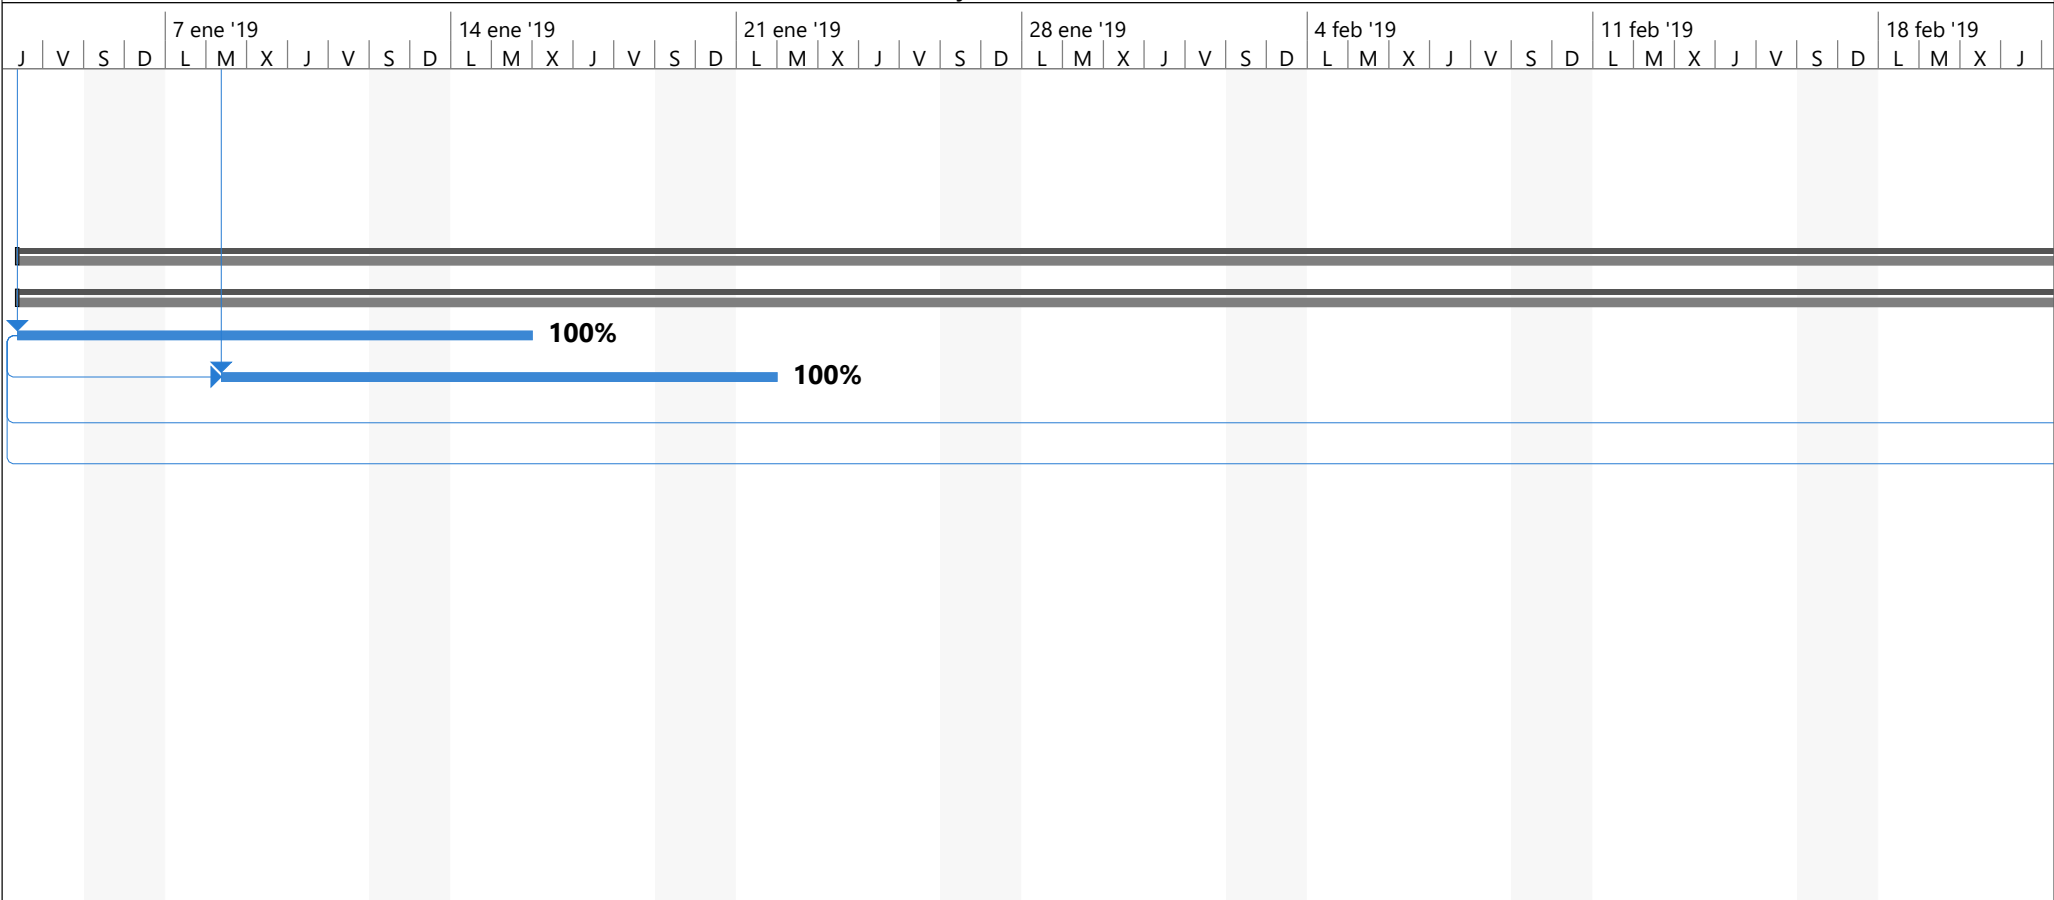

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020









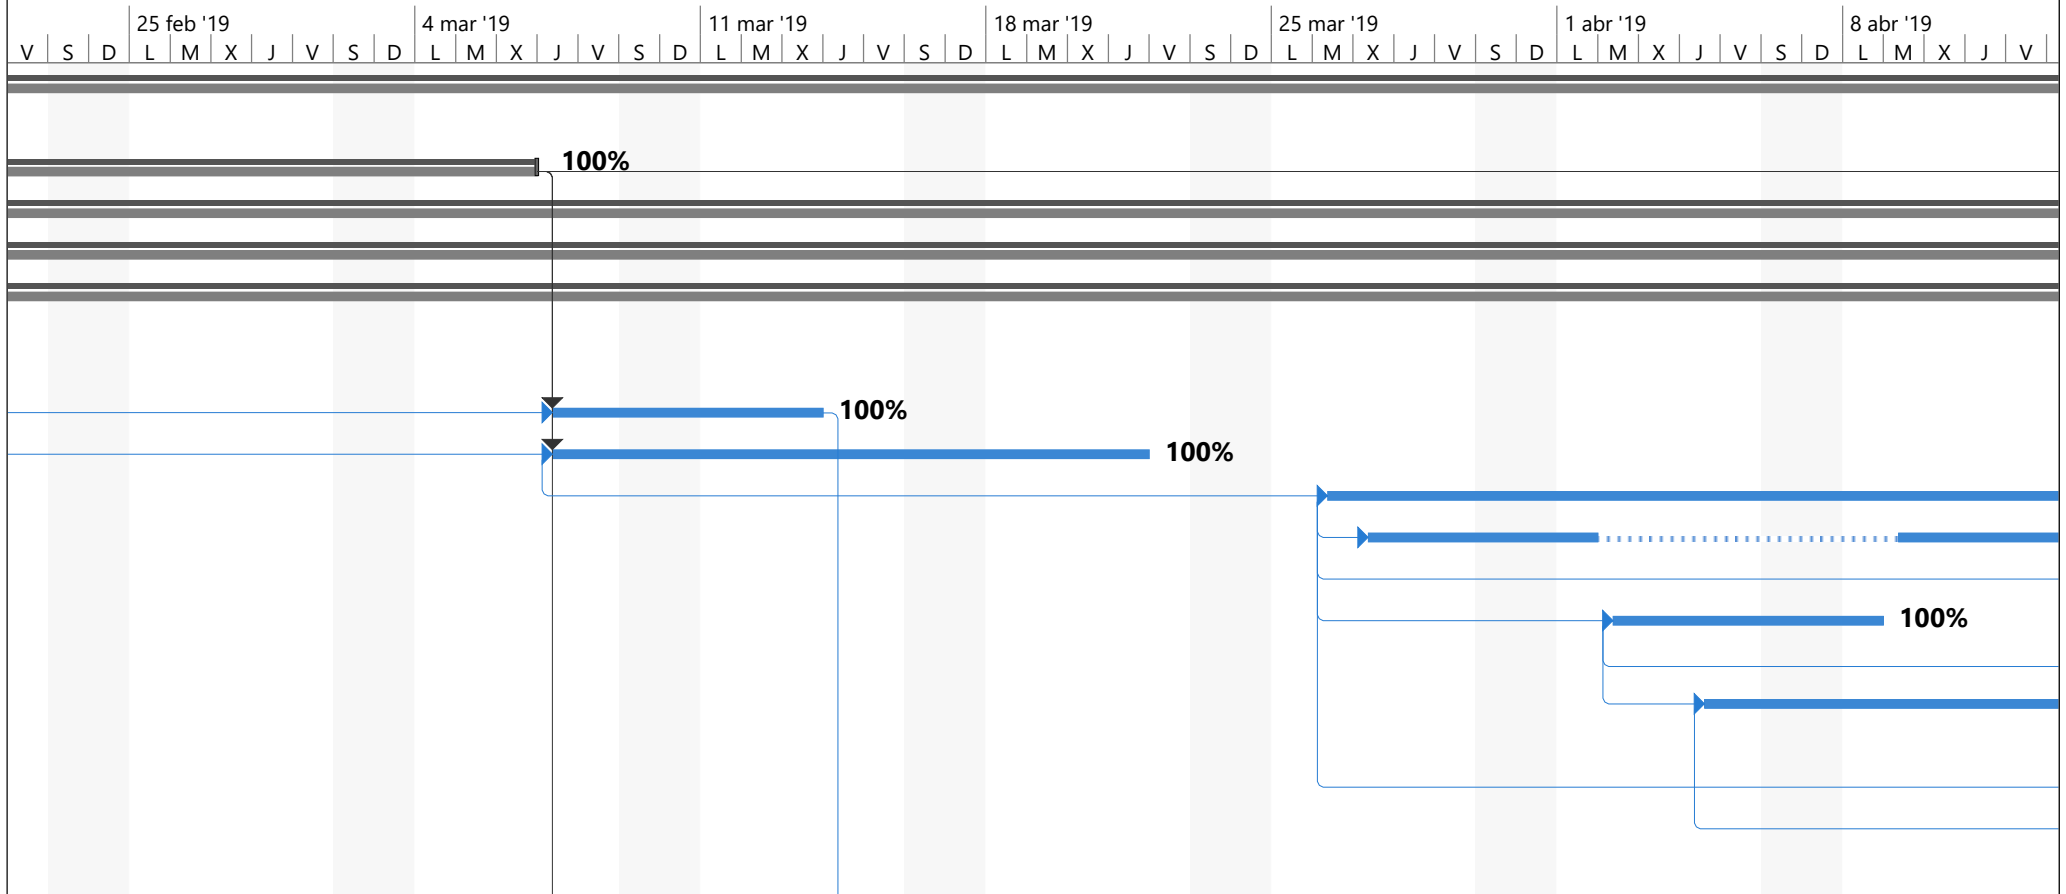















				7 ene '19				14 ene '19				21 ene '19				28 ene '19				4 feb '19				11 feb '19				18 feb '19			
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

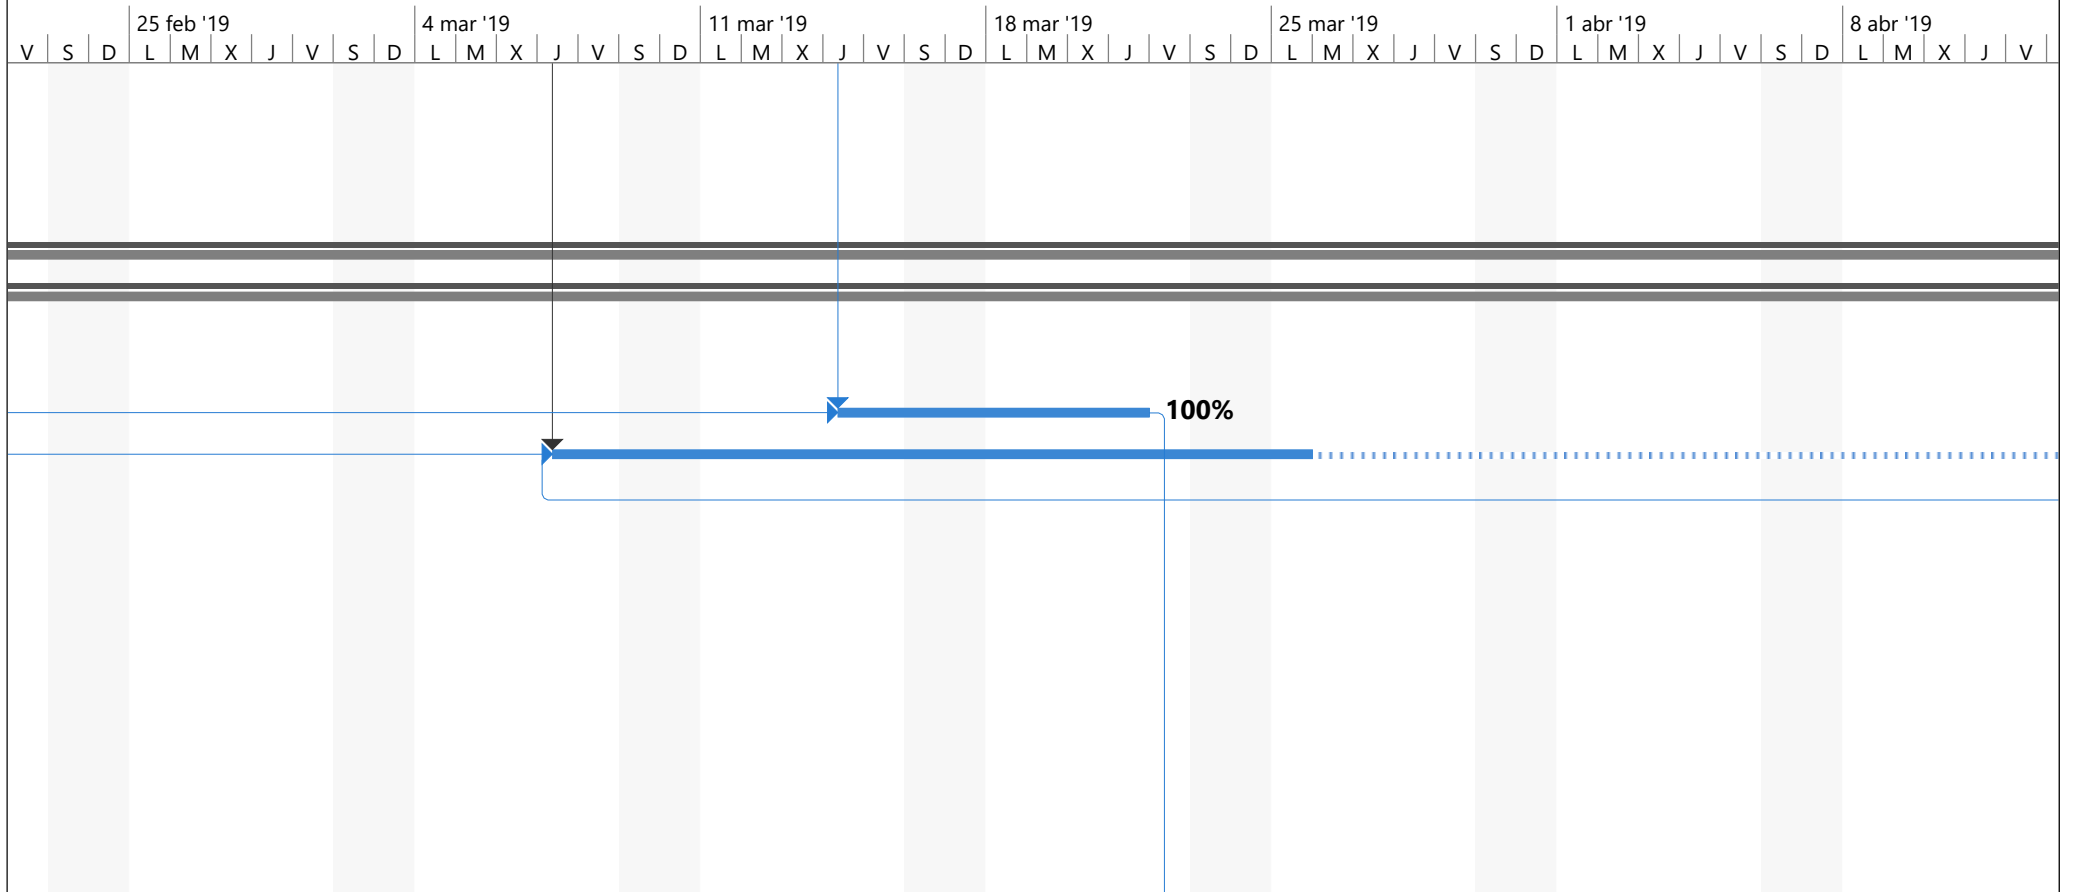

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

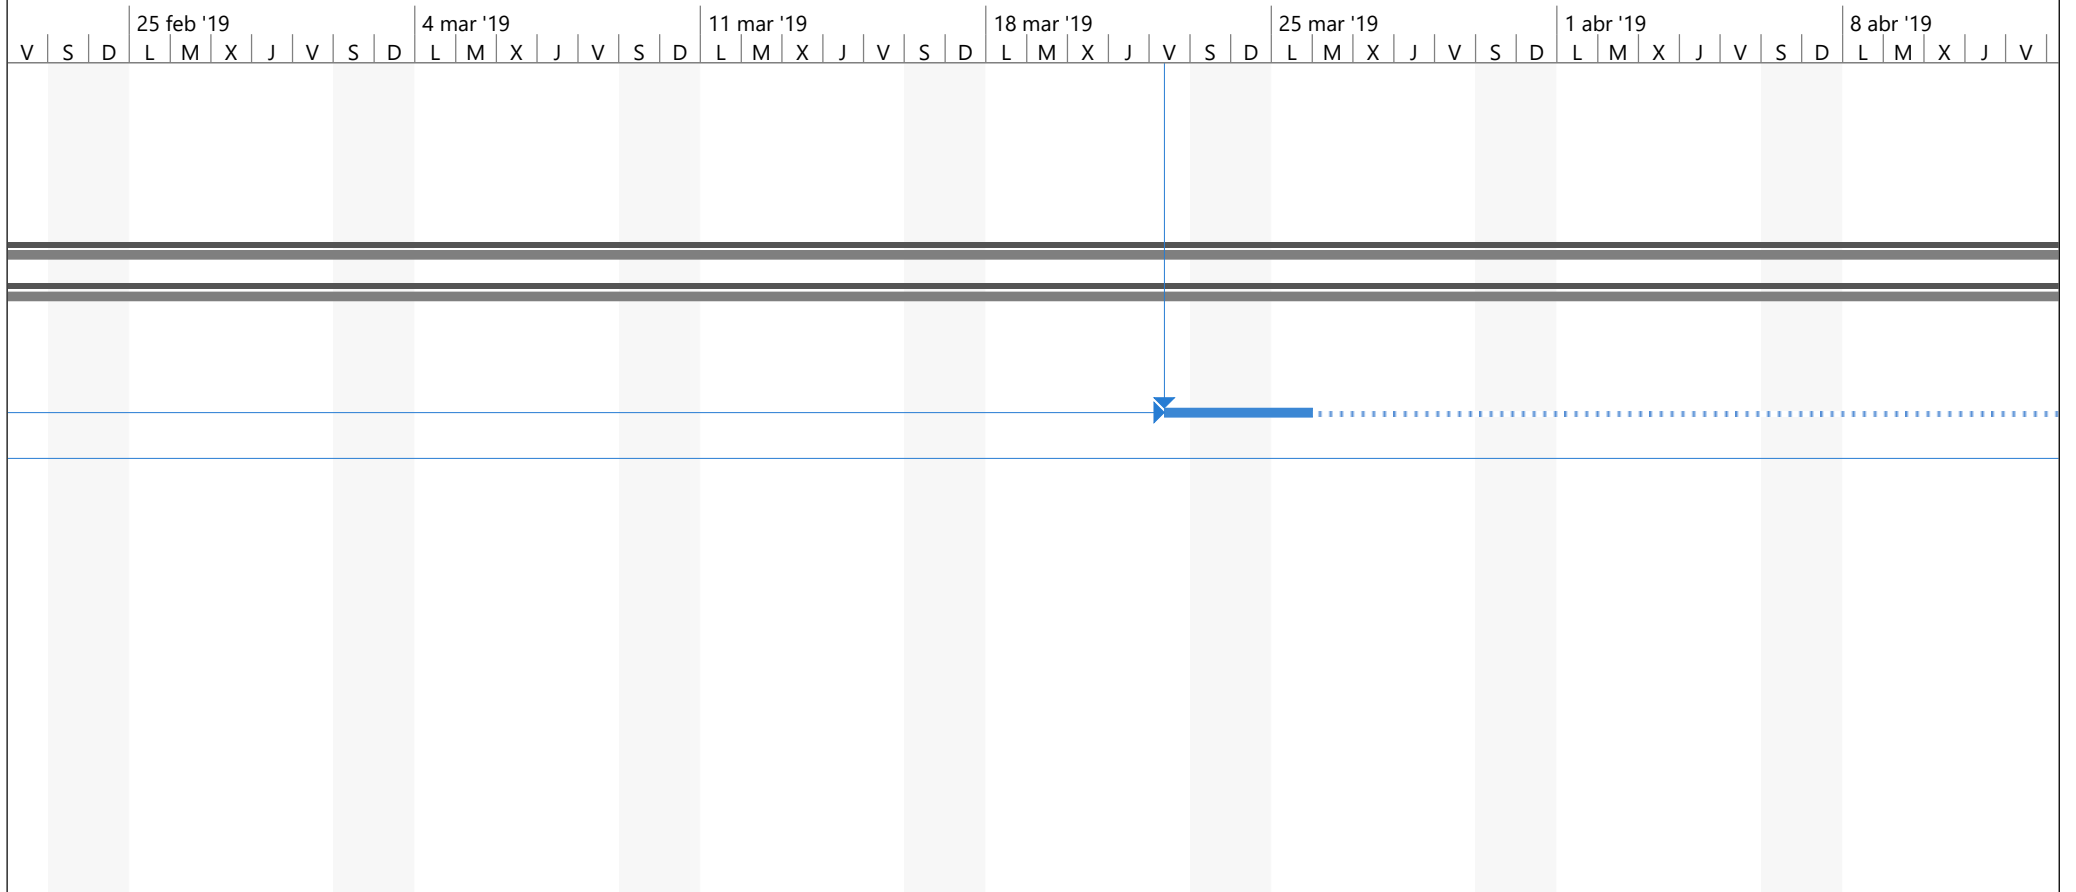

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

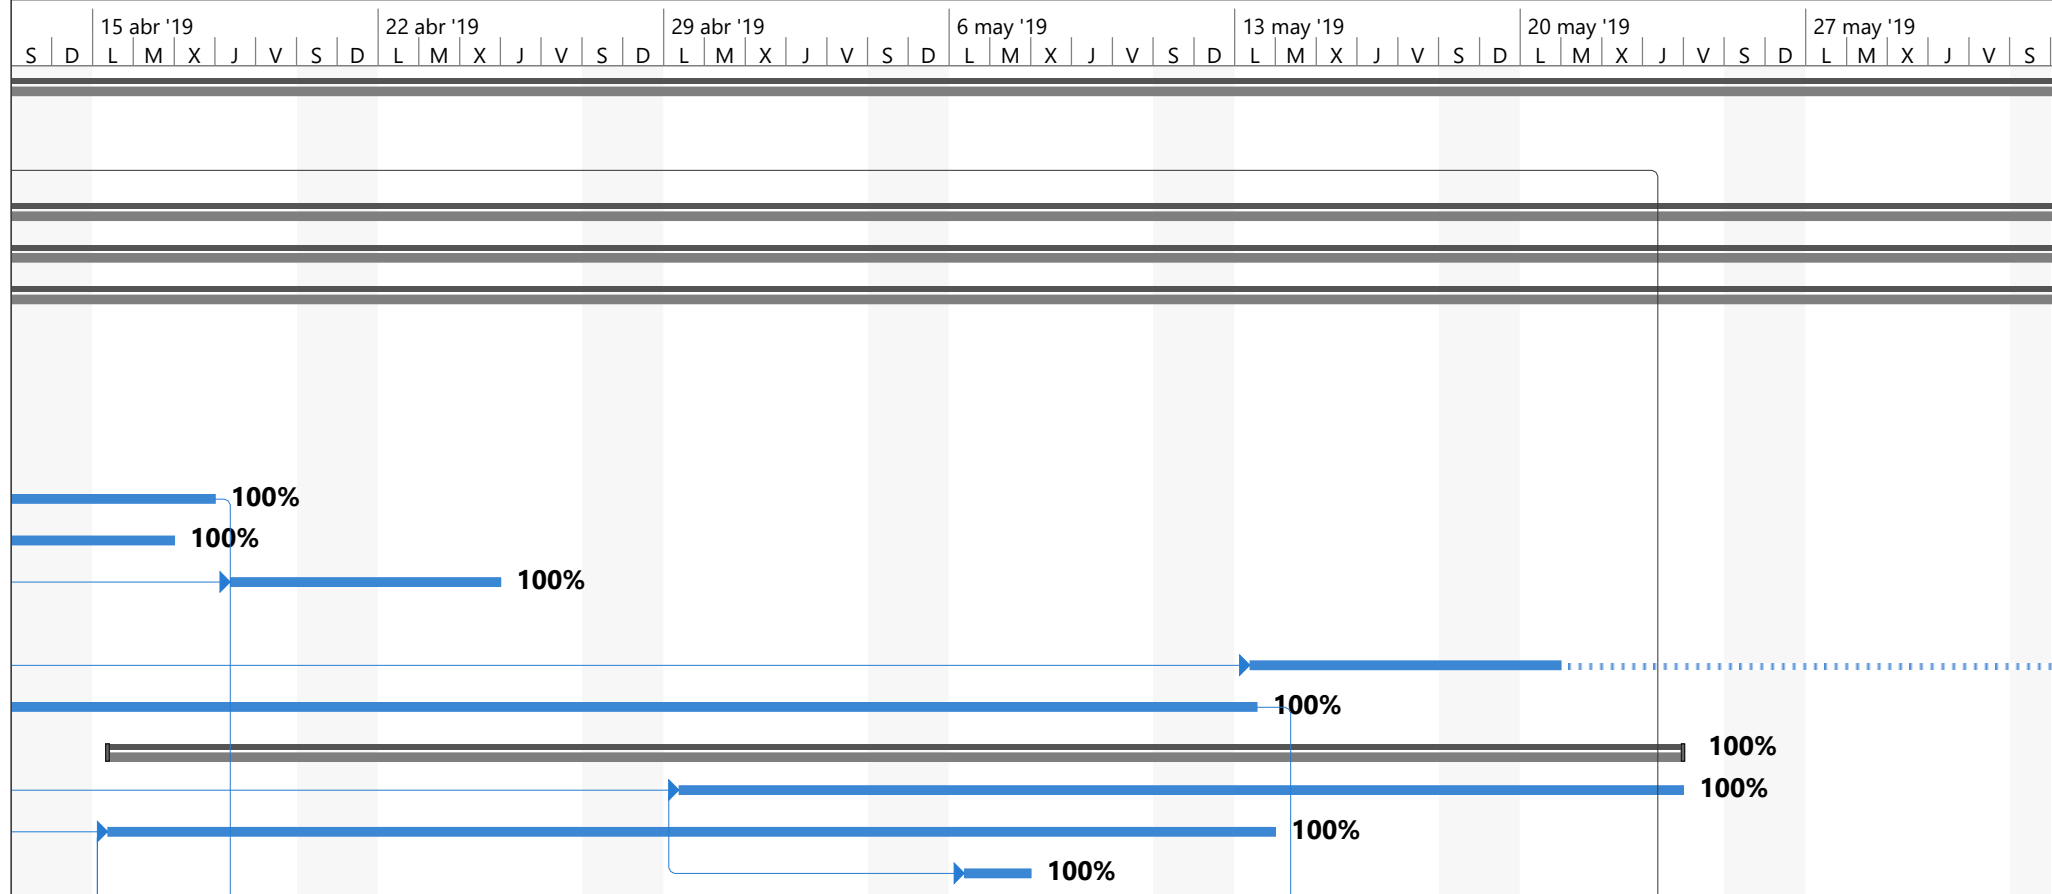


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




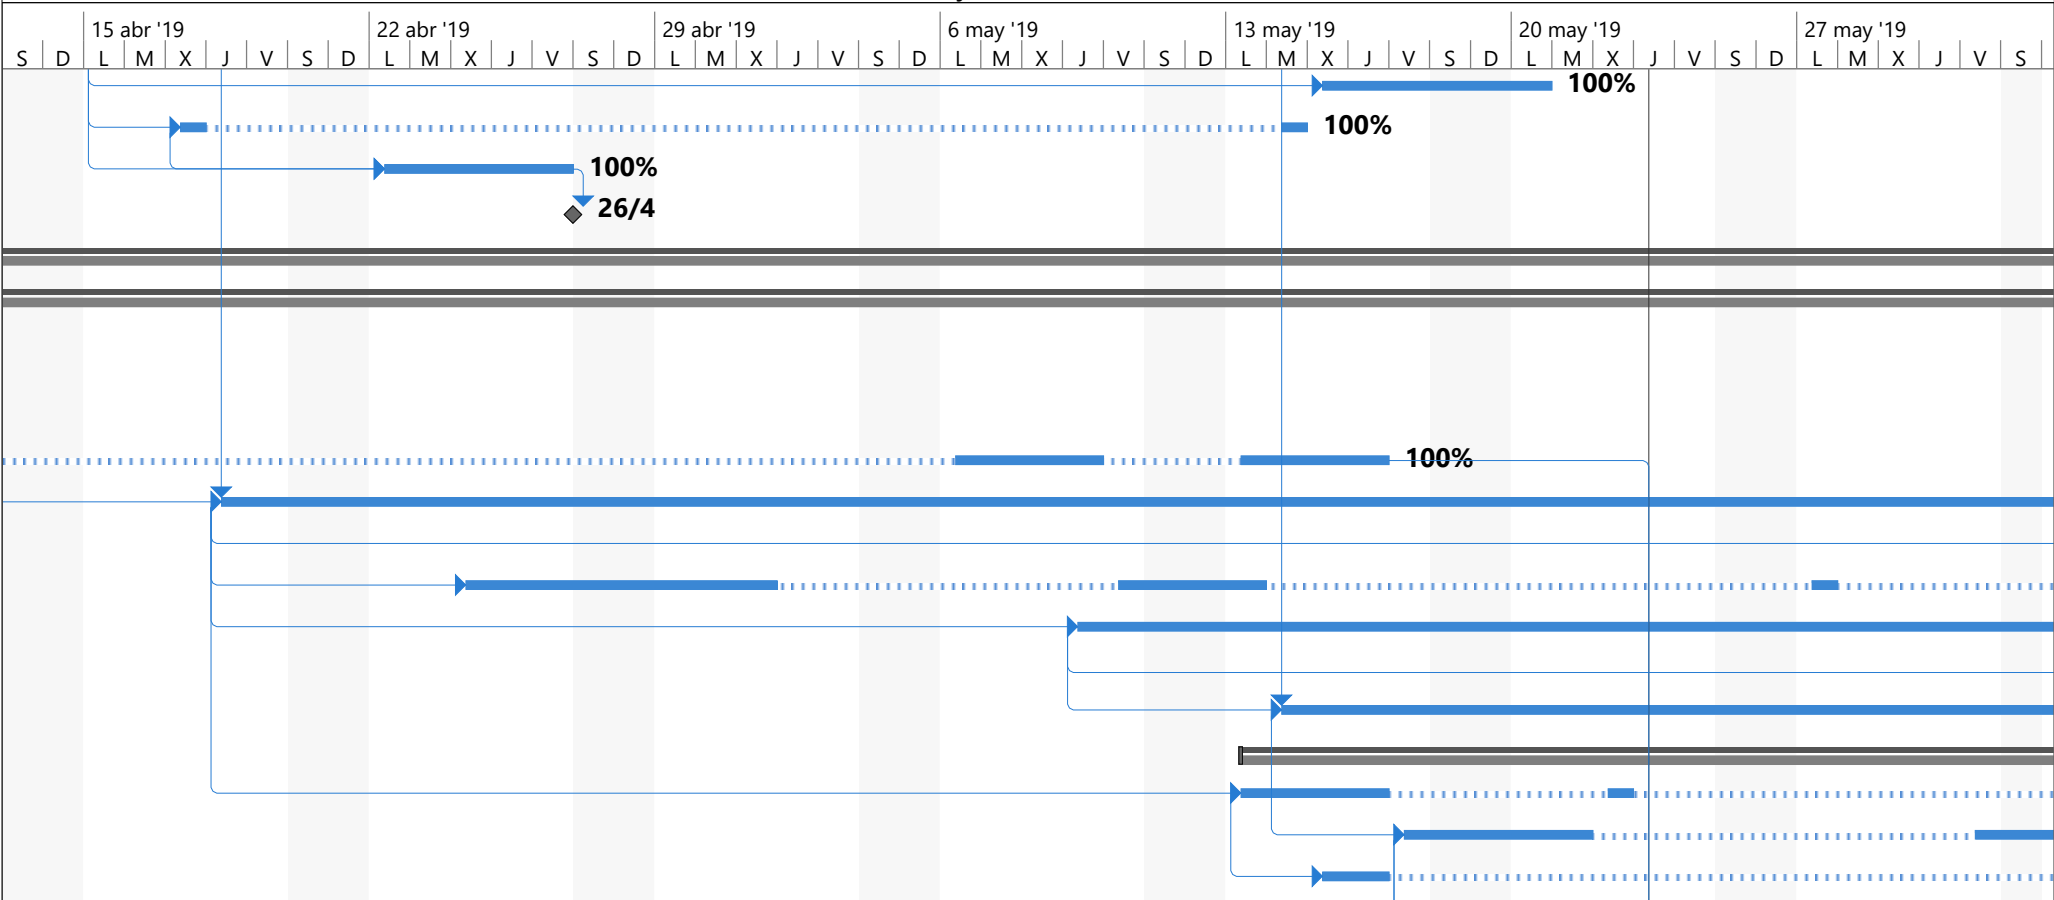





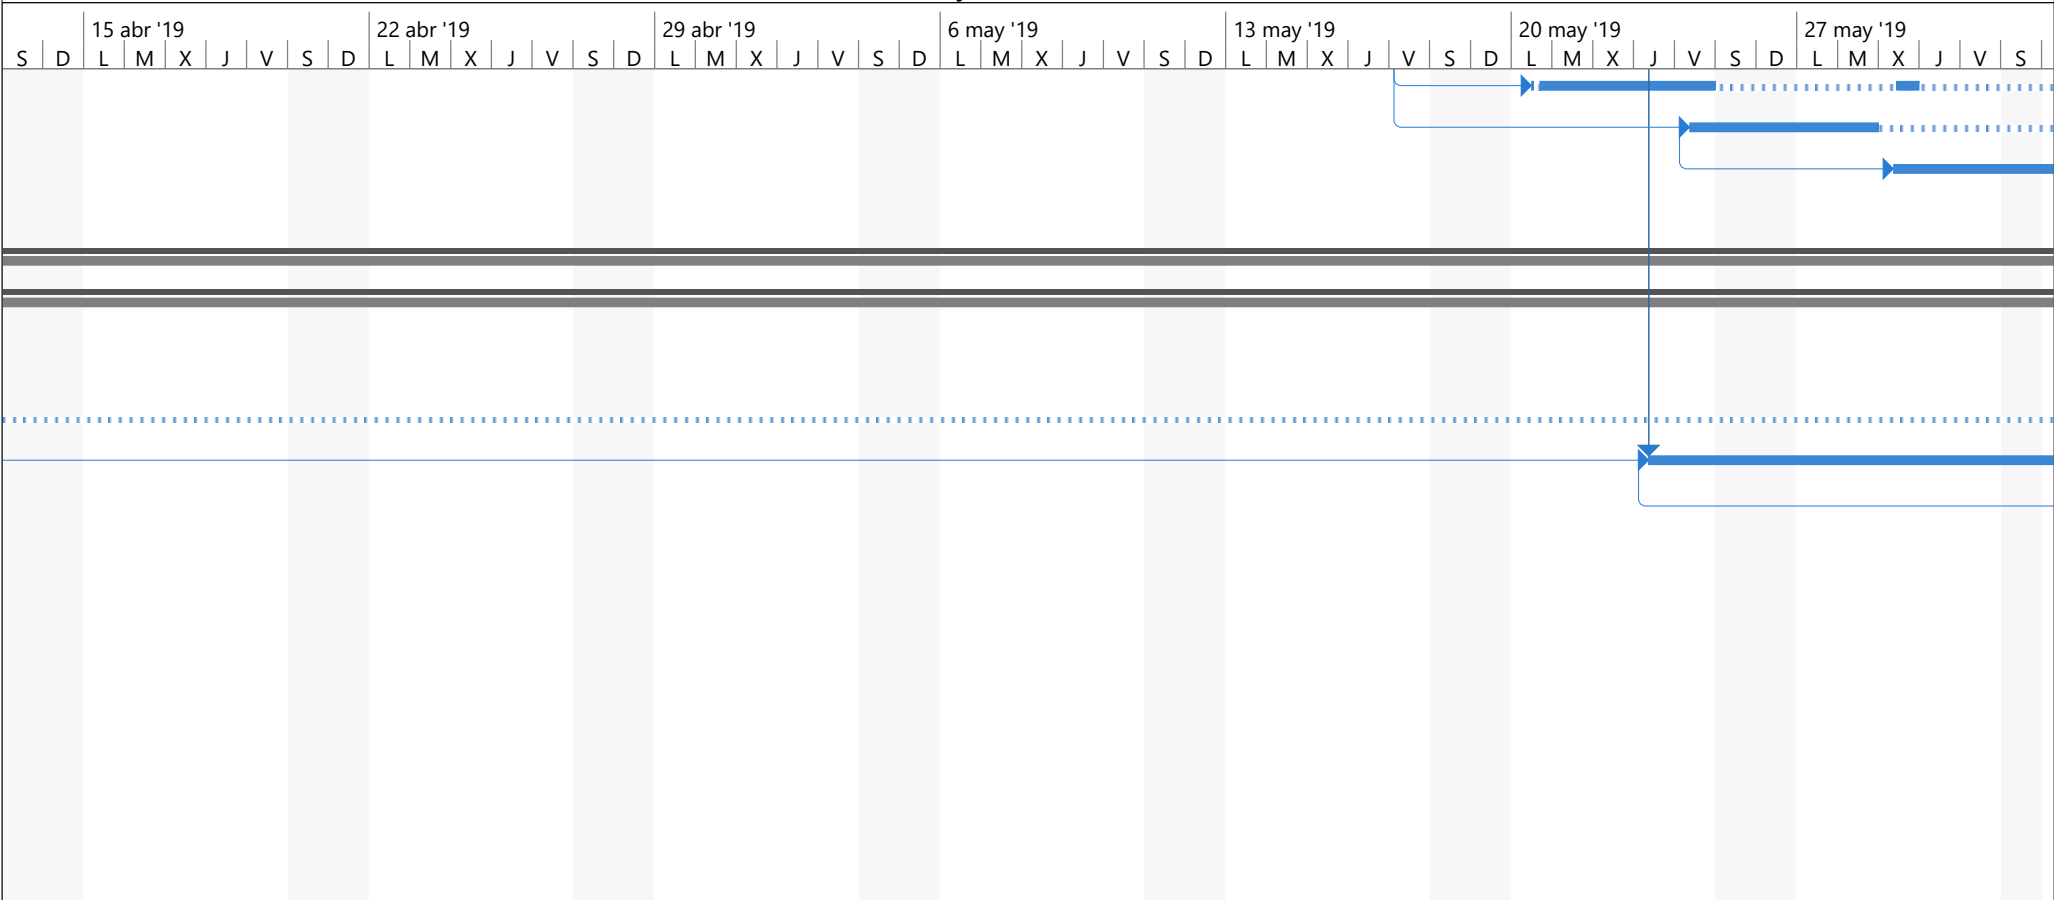














Calendario de ejecución BPER104 Nov2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

























Calendario de ejecución BPER104 Nov2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020


[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

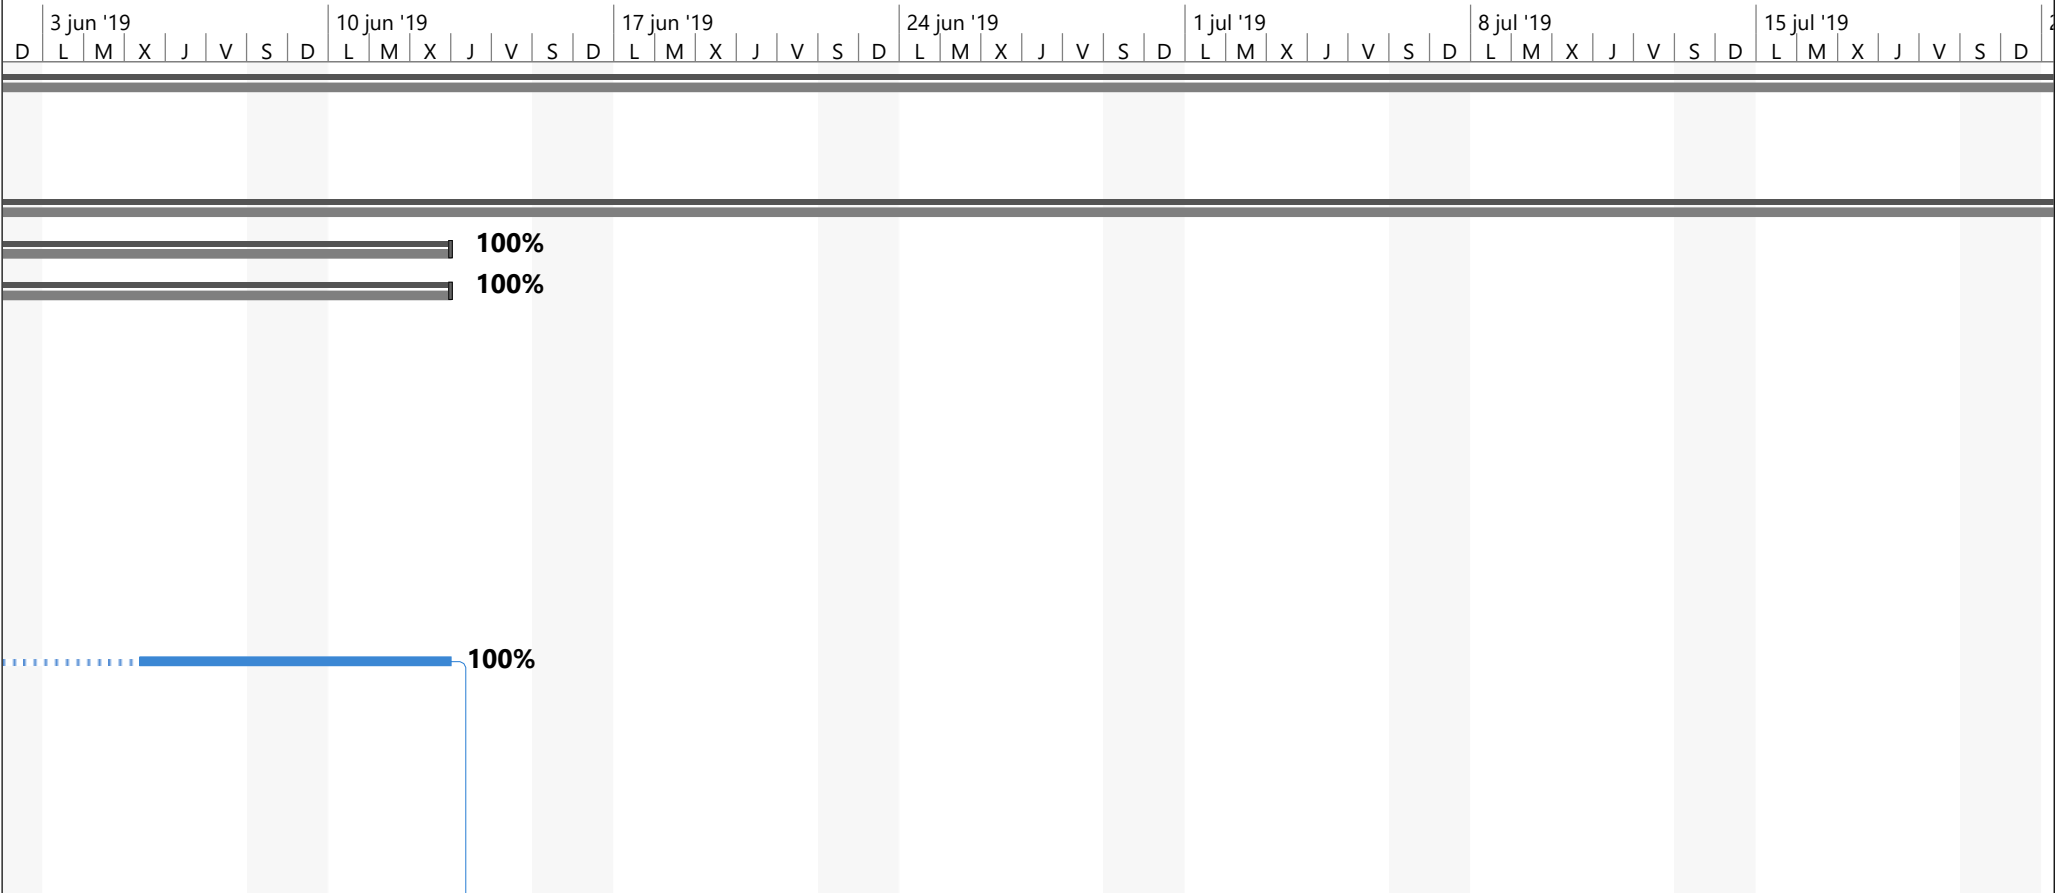

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo




División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

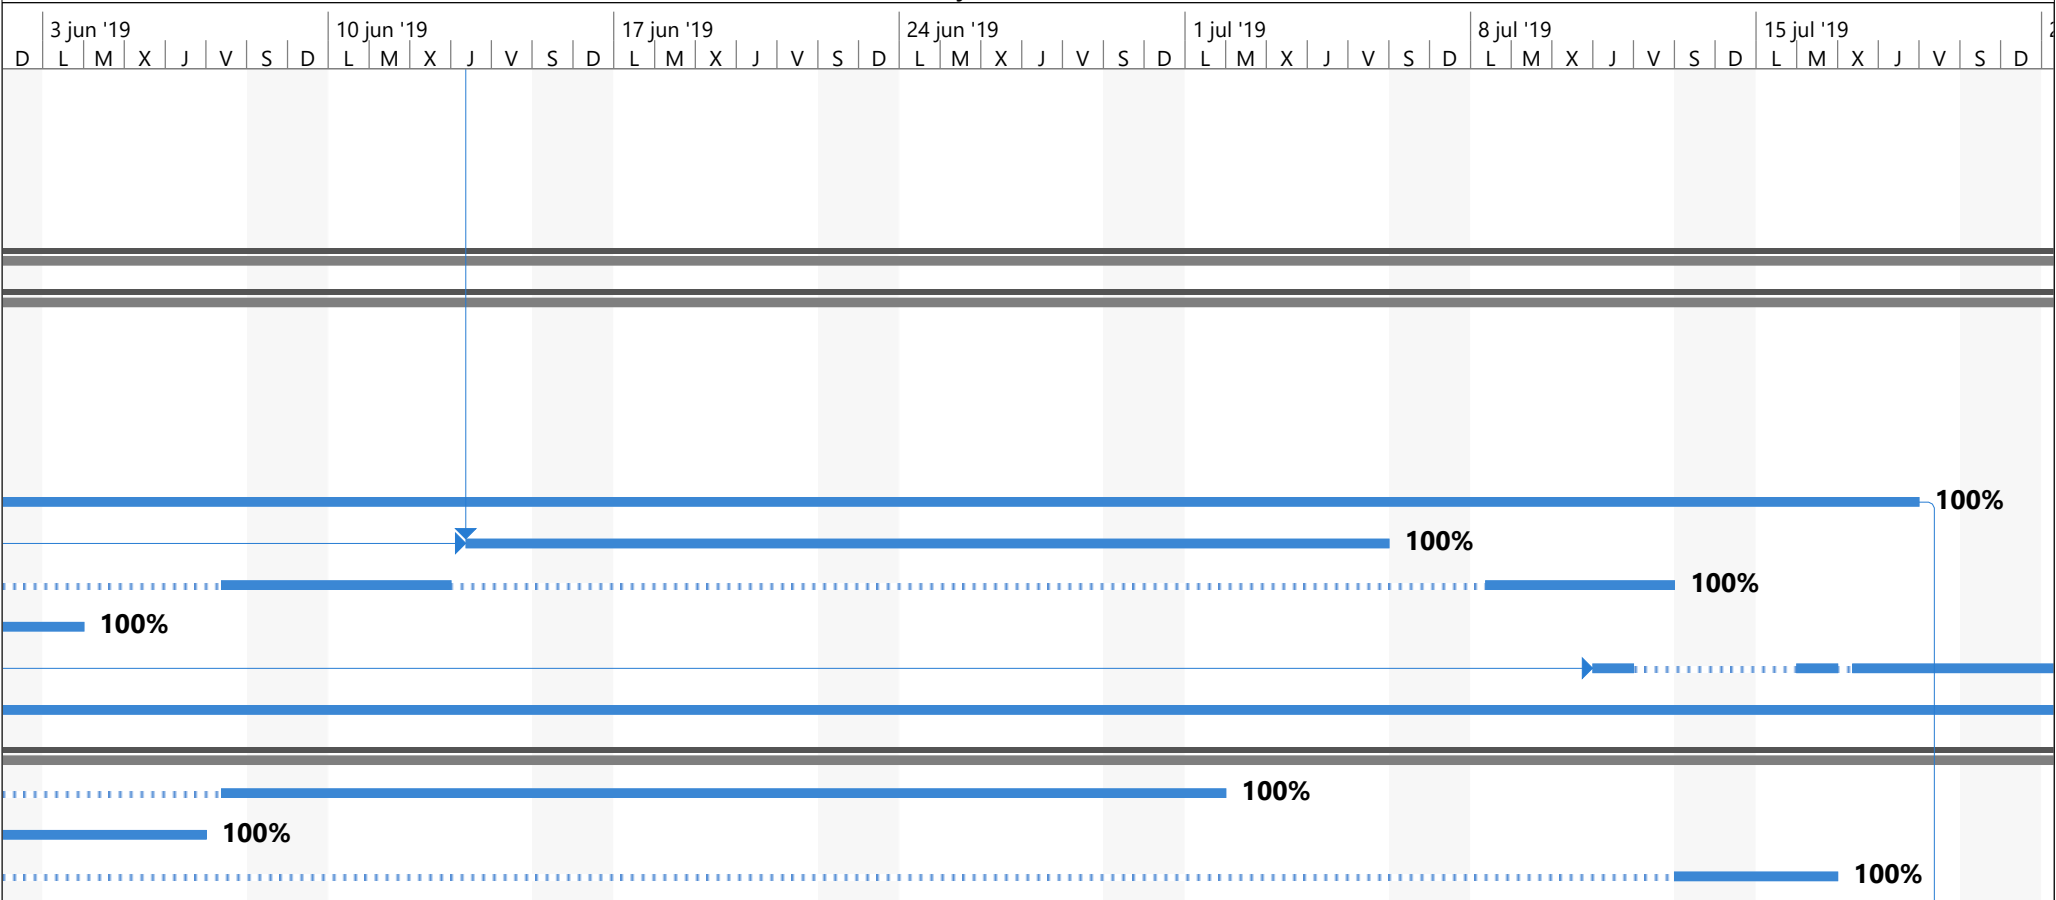

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

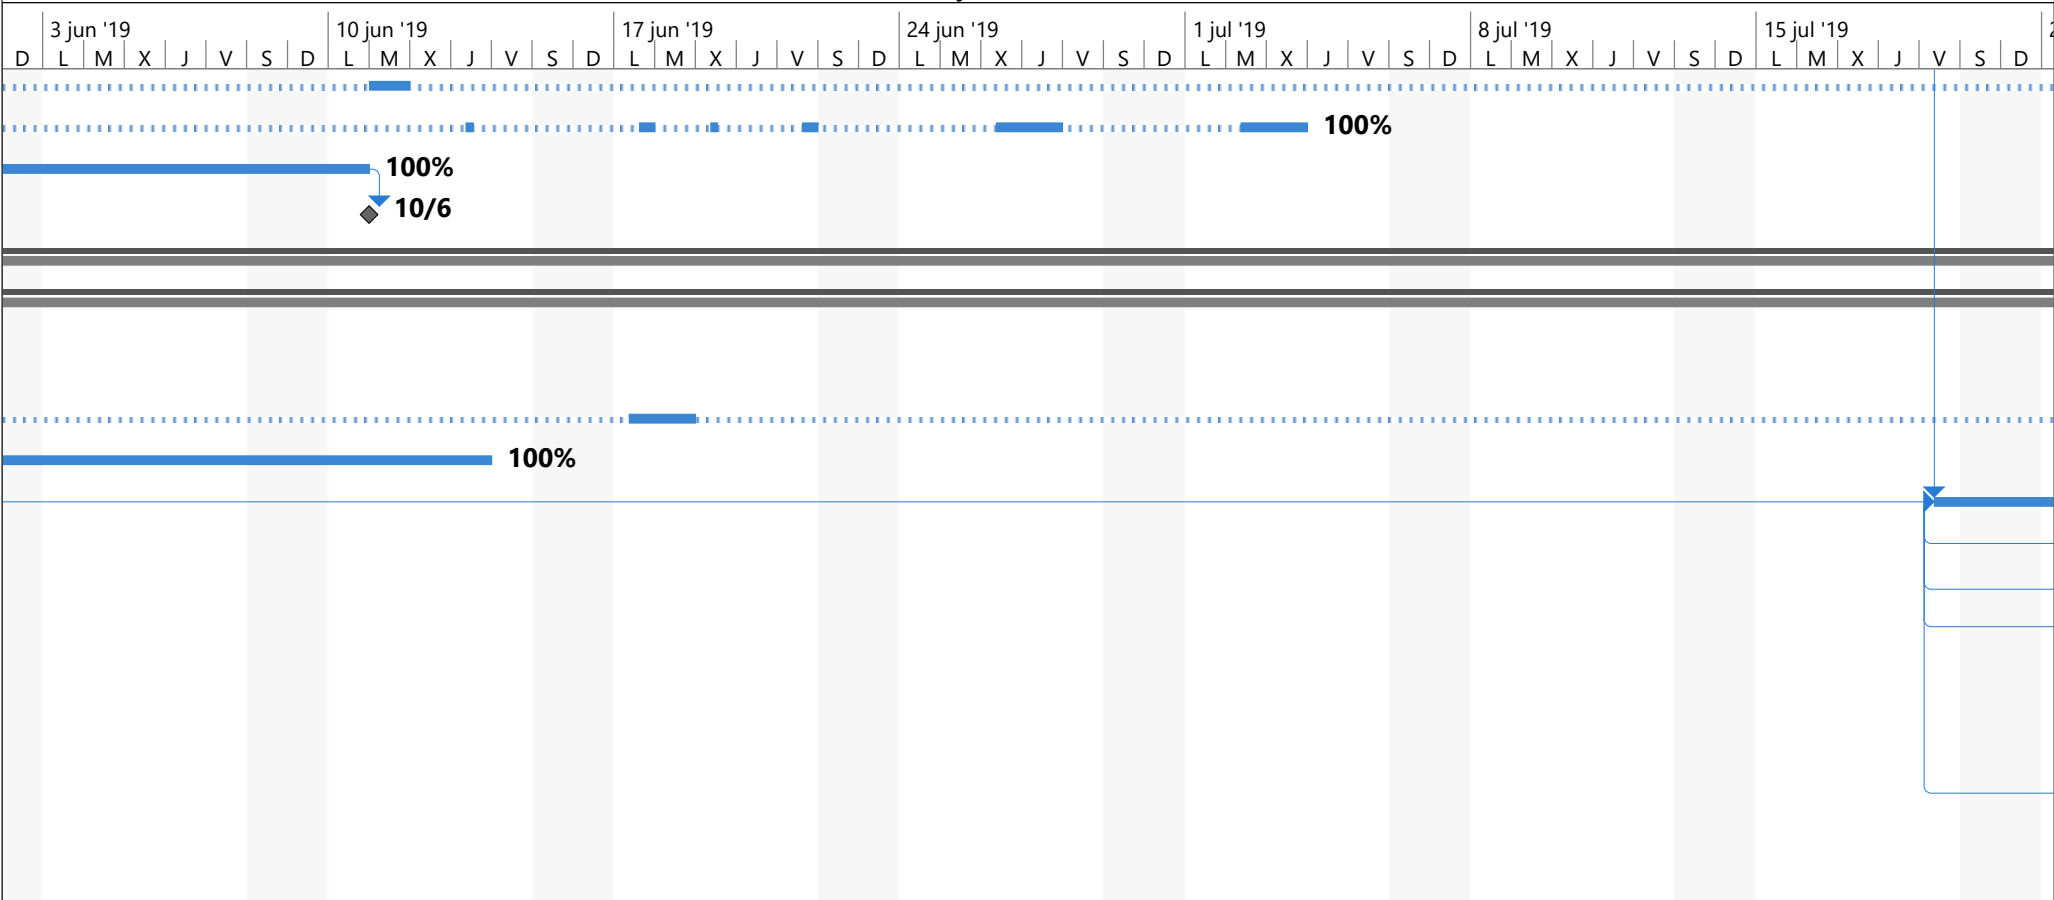

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución BPER104 Nov2020


[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

22 jul '19							29 jul '19							5 ago '19							12 ago '19							19 ago '19							26 ago '19							2 sep '19							9 sep
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L							

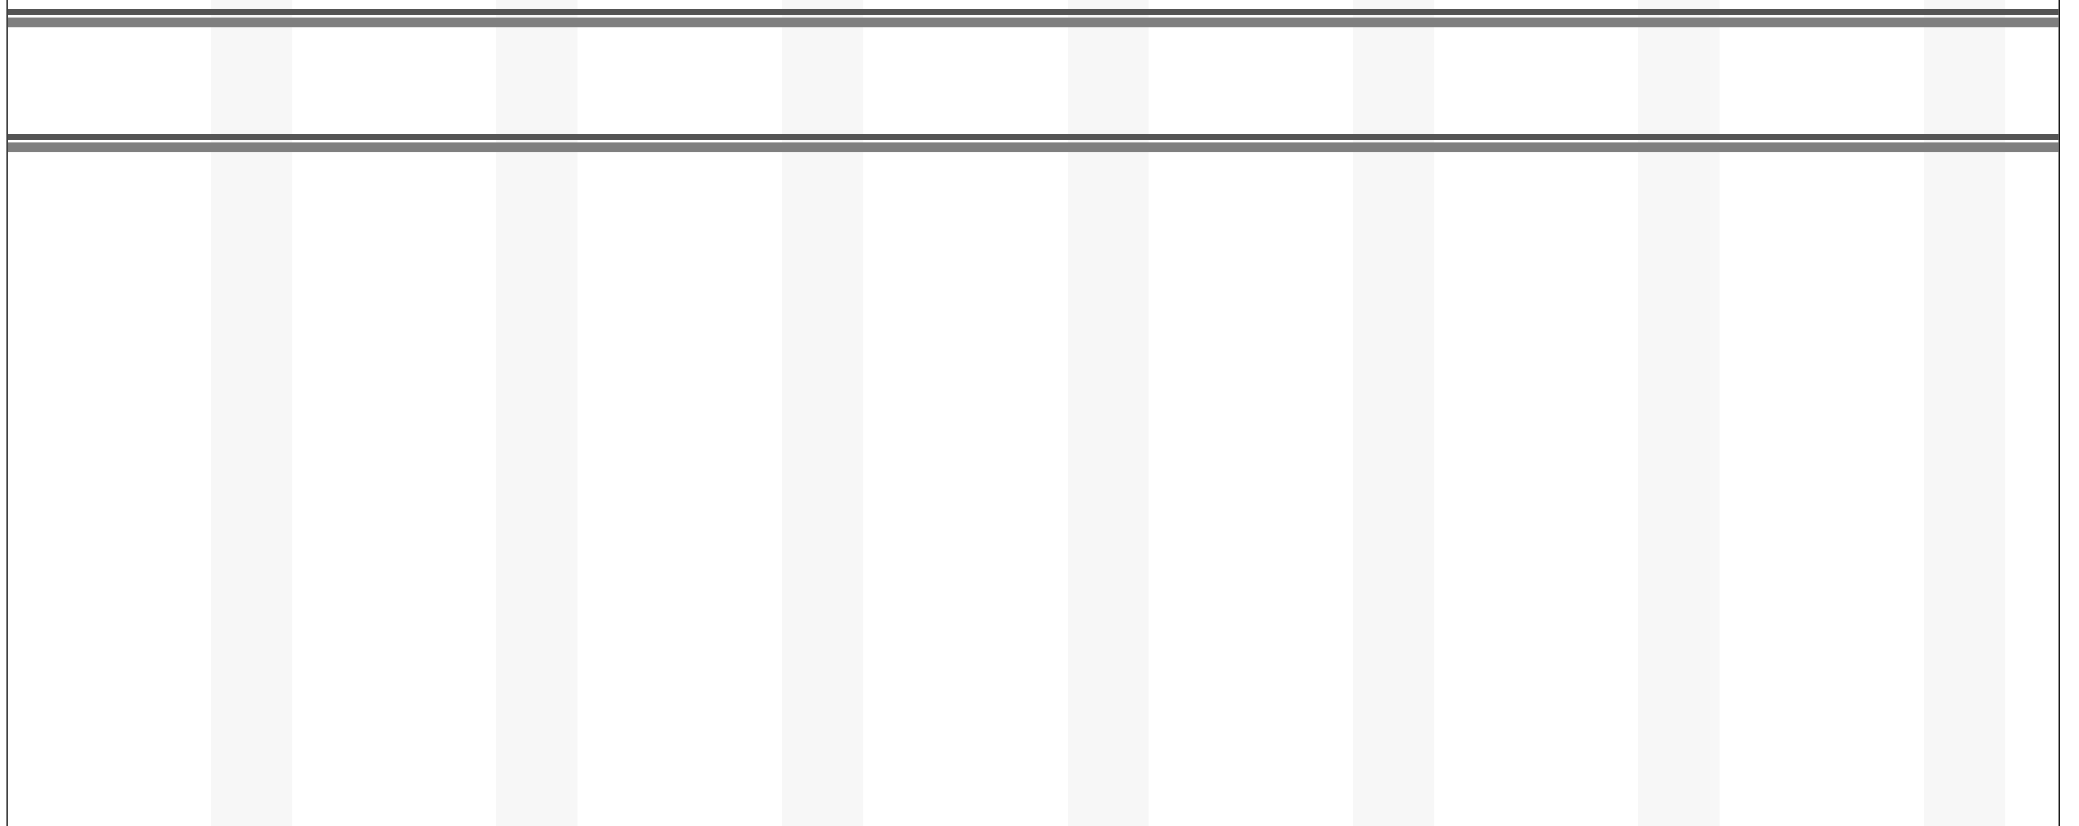


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

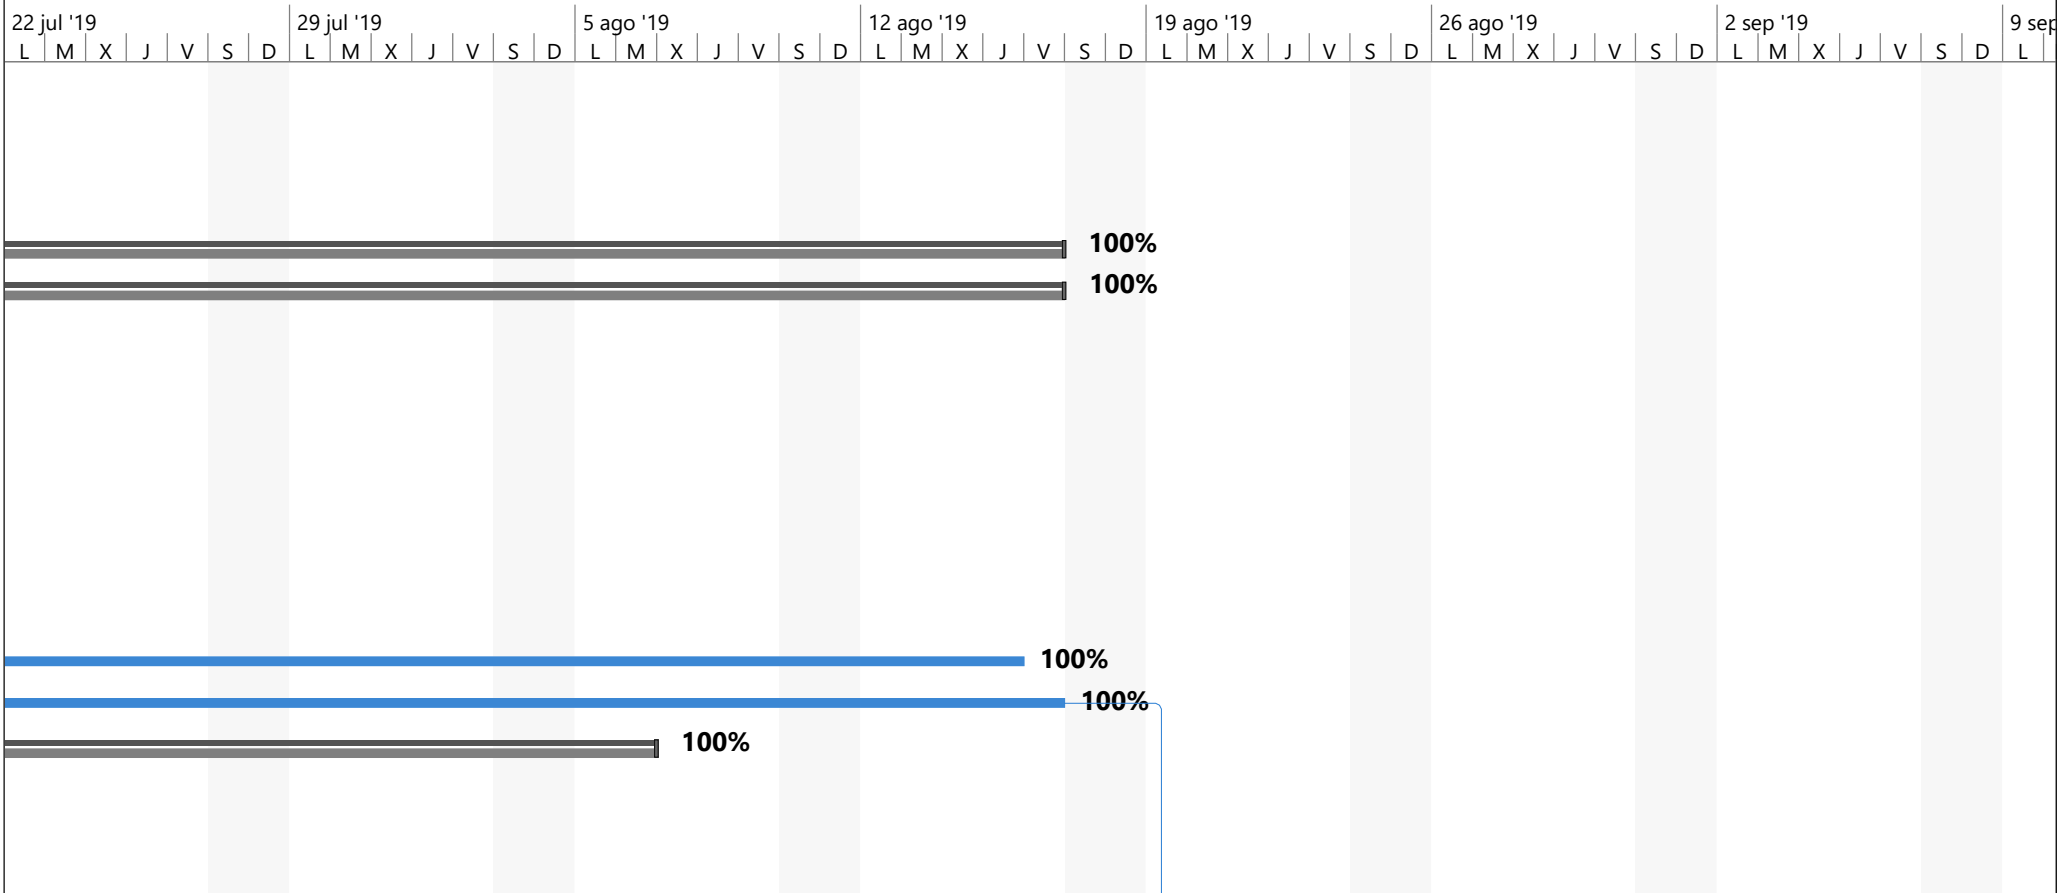

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

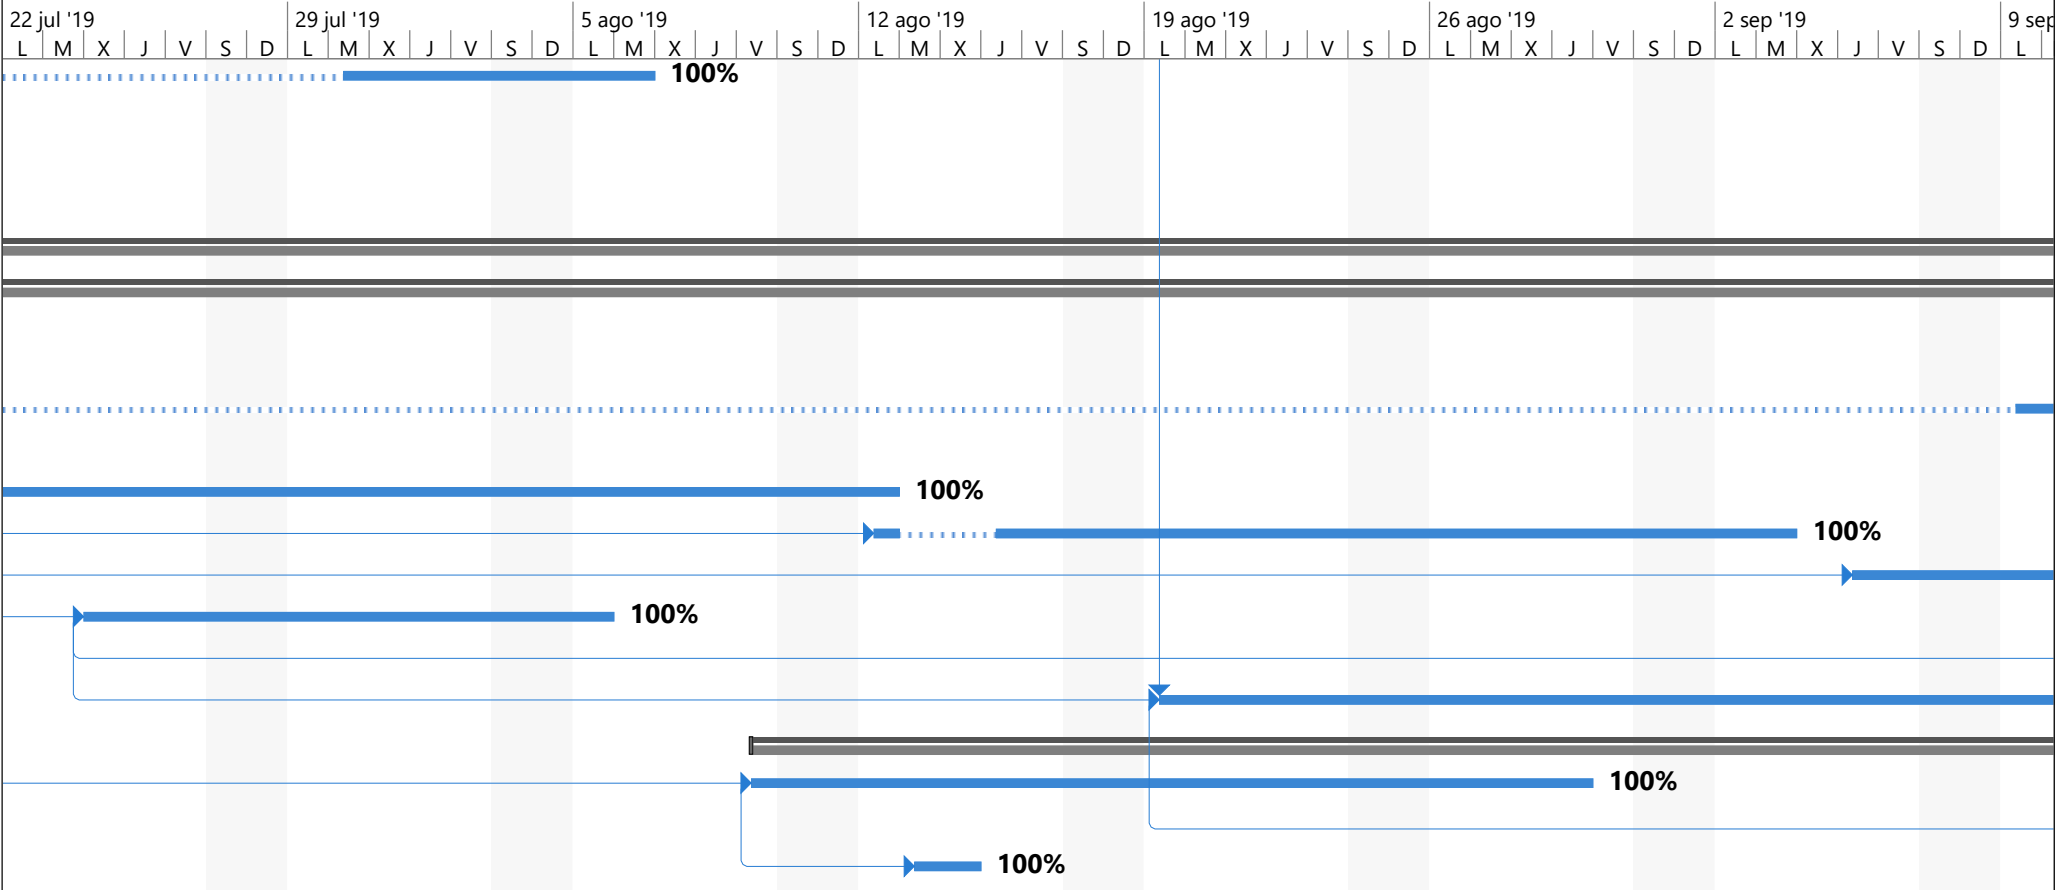

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

22 jul '19	29 jul '19	5 ago '19	12 ago '19	19 ago '19	26 ago '19	2 sep '19	9 sep '19
L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

p '19 16 sep '19 23 sep '19 30 sep '19 7 oct '19 14 oct '19 21 oct '19 28 oct '19  
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M



























Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	










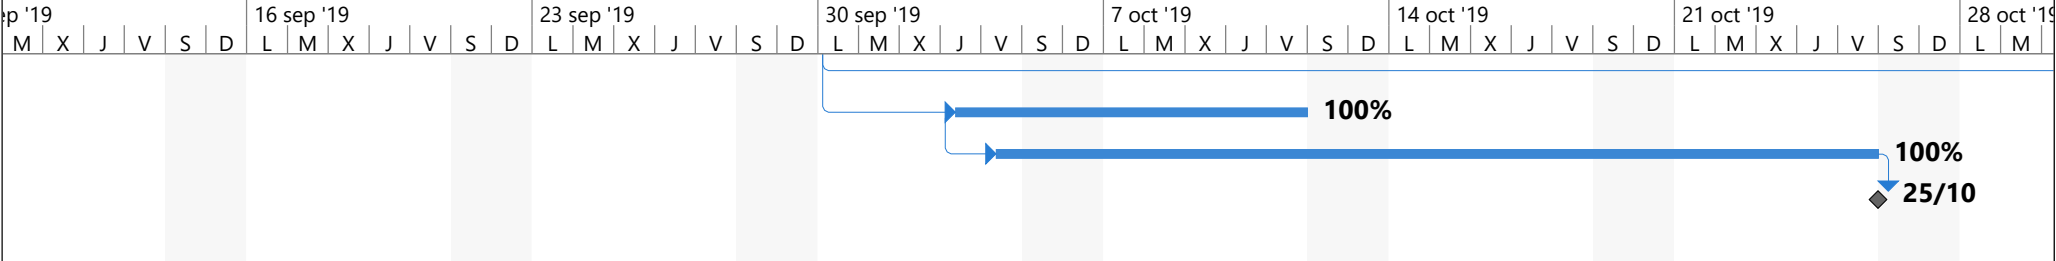














Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

Task	Start Date	End Date	Completion Percentage
Task 1	16 sep '19	28 oct '19	100%
Task 2	16 sep '19	30 sep '19	100%
Task 3	30 sep '19	14 oct '19	100%
Task 4	14 oct '19	28 oct '19	100%
Task 5	28 oct '19	28 oct '19	100%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



Calendario de ejecución BPER104 Nov2020




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

9					4 nov '19					11 nov '19					18 nov '19					25 nov '19					2 dic '19					9 dic '19					16 dic '19				
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X				


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

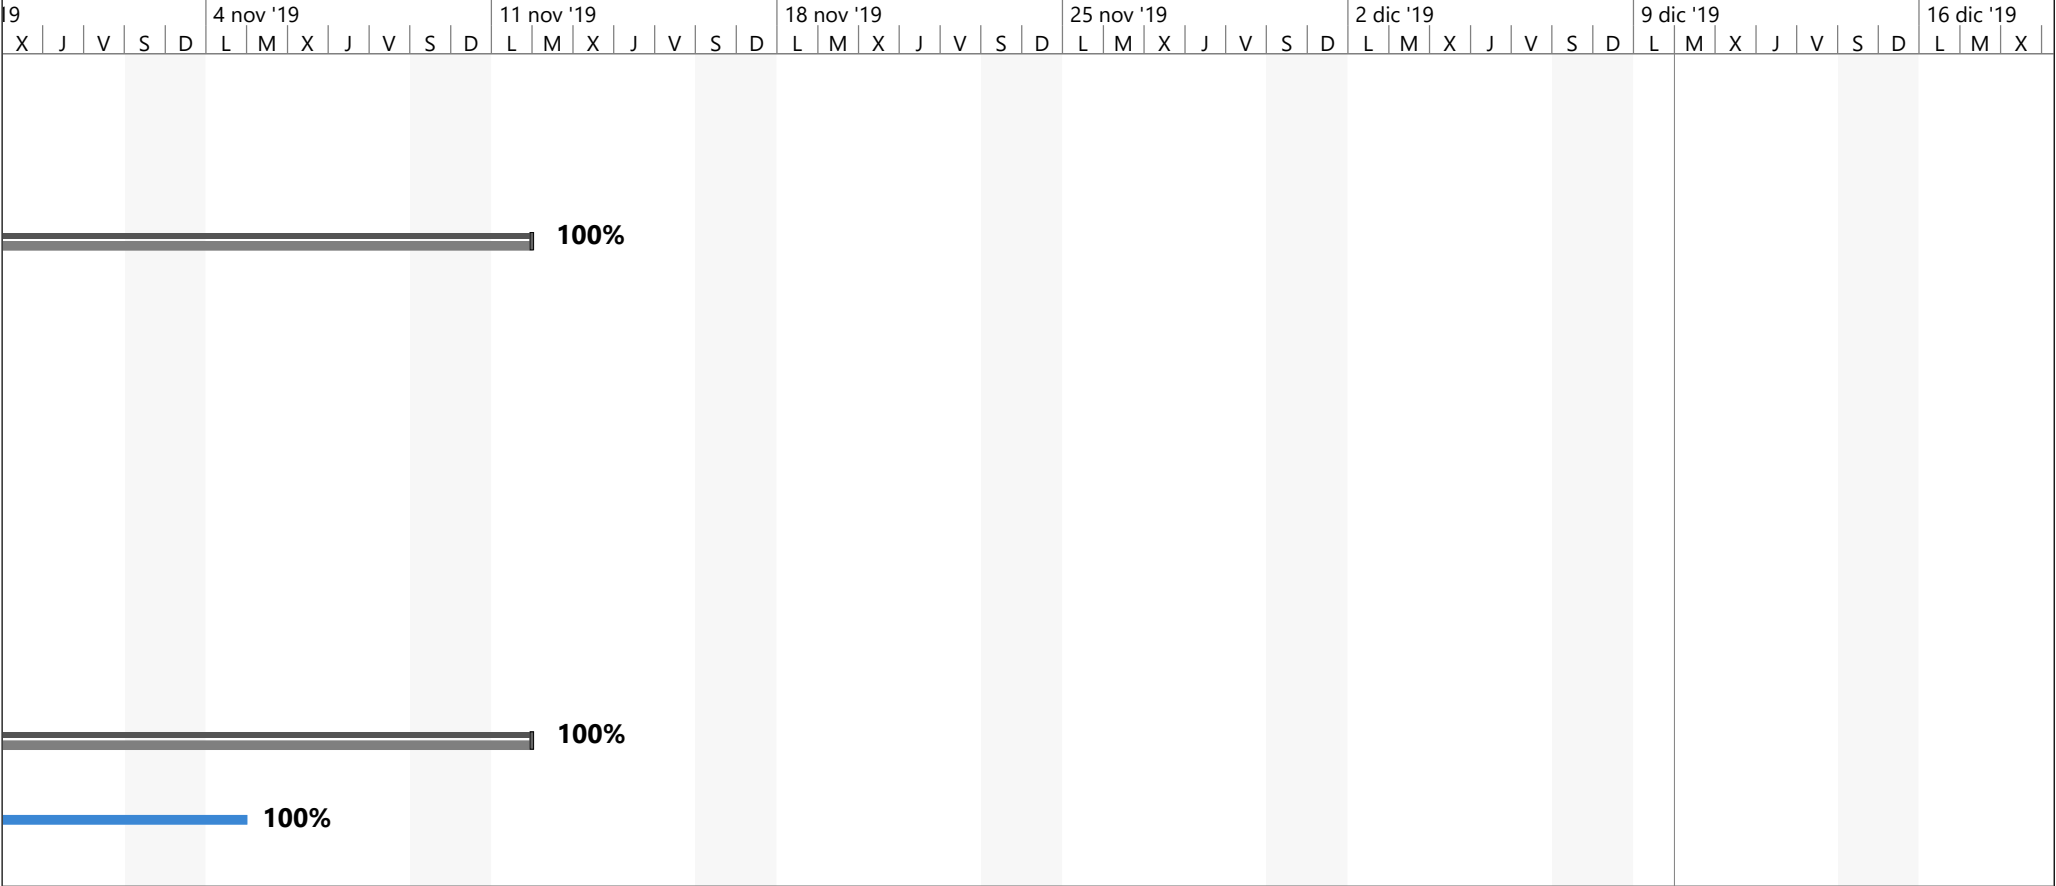

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecución BPER104 Nov2020

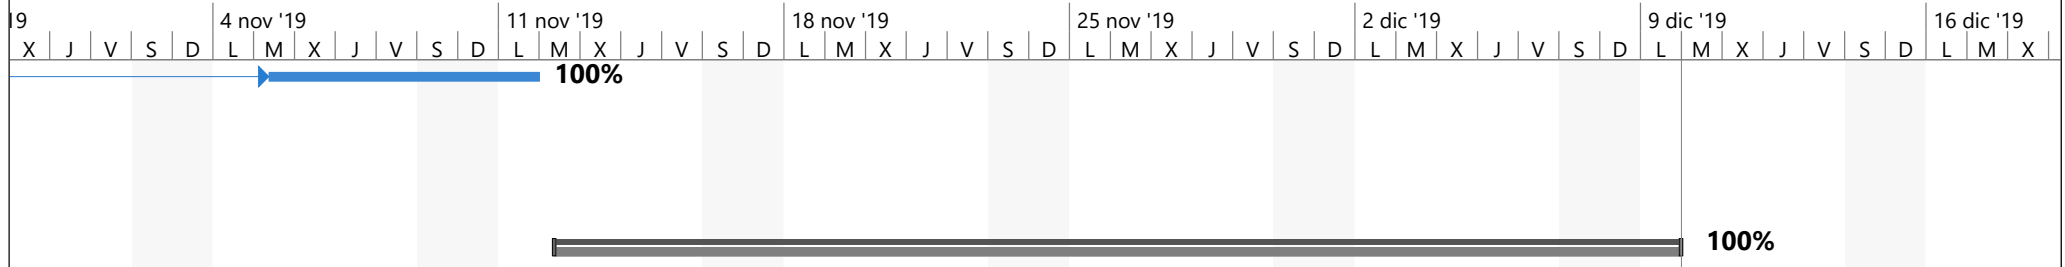

**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión  
Dirección de Proyectos Financiados  
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas  
Edenorste Dominicana  
F: 809-747-9346

E: legabot@edenorste.com.do P: www.edenorste.com.do

Síguenos en:



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
