

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|----------------------------------|-------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | | | | | D | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | |
| | | | | | | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 1 | | | Rehabilitación de Redes CHIVO105 | 272.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Adjudicación | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Periodo de Adquisiciones | 80 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | Ejecución | 242.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | Polígono 1 | 145.88 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | Instalación | 135 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Cimentaciones | 12 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | Retenidas | 6 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | Armados de Media y Baja | 17 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | Tendido de Conductor Me | 22 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | Elementos de Protección y | 10 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | Conexiones y Jumpers | 5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | Transformadores | 12 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | Alumbrado Publico | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | Normalización Suministros | 34 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | Remoción | 69.75 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | Tendido de Conductor Me | 16 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | Tendido de Conductor Baj | 22 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | Armados de Media Tensió | 44 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--------------------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|
| | | | | | D | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 |
| | | | | | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 45 | | | Armados de Baja Tensión | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | Transformadores | 25.25 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | Cierre de Polígono 1 | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | Polígono 2 | 175.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | Instalación | 175.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | Izado de postes | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | Cimentaciones | 19 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | Retenidas | 9 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | Armados de Media y Baja | 18 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | Tendido de Conductor Me | 11 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | Elementos de Protección | 14.75 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | Conexiones y Jumpers | 11 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | Transformadores | 13 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | Alumbrado Publico | 16 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | Normalización Suministro | 70 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | Remoción | 71.63 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | Tendido de Conductor Me | 6 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | Tendido de Conductor Baj | 13 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | Armados de Media Tensió | 12 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |












| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--------------------------|-------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | | | | | D | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | |
| | | | | | | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 65 | | | Armados de Baja Tensión | 8 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | Transformadores | 5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | Izado de postes | 13 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | Cierre de Polígono 2 | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | Polígono 3 | 208.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | Instalación | 198.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | Cimentaciones | 10 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | Retenidas | 7 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | Armados de Media y Baja | 47 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | Tendido de Conductor M | 56 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | Elementos de Protección | 19 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | Conexiones y Jumpers | 8 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | Transformadores | 39 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | Alumbrado Publico | 35 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | Normalización Suministr | 43 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | Remoción | 107.25 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | Tendido de Conductor Me | 9 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | Tendido de Conductor Baj | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | Armados de Media Tensió | 18 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------|----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | | | | | D | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | |
| | | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 85 |  |  | Armados de Baja Tensión | 16 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 |  |  | Transformadores | 9 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 |  |  | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 |  |  | Cierre de Polígono 3 | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 |  |  | Cierre de Obras | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

abr '18
M X J V S D

7 may '18
L M X J V S D

14 may '18
L M X J V S D


21 may '18
L M X J V S D

28 may '18
L M X J V S D

4 jun '18
L M X J V S D


11 jun '18
L M X J V S D

18 jun '18
L M X




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

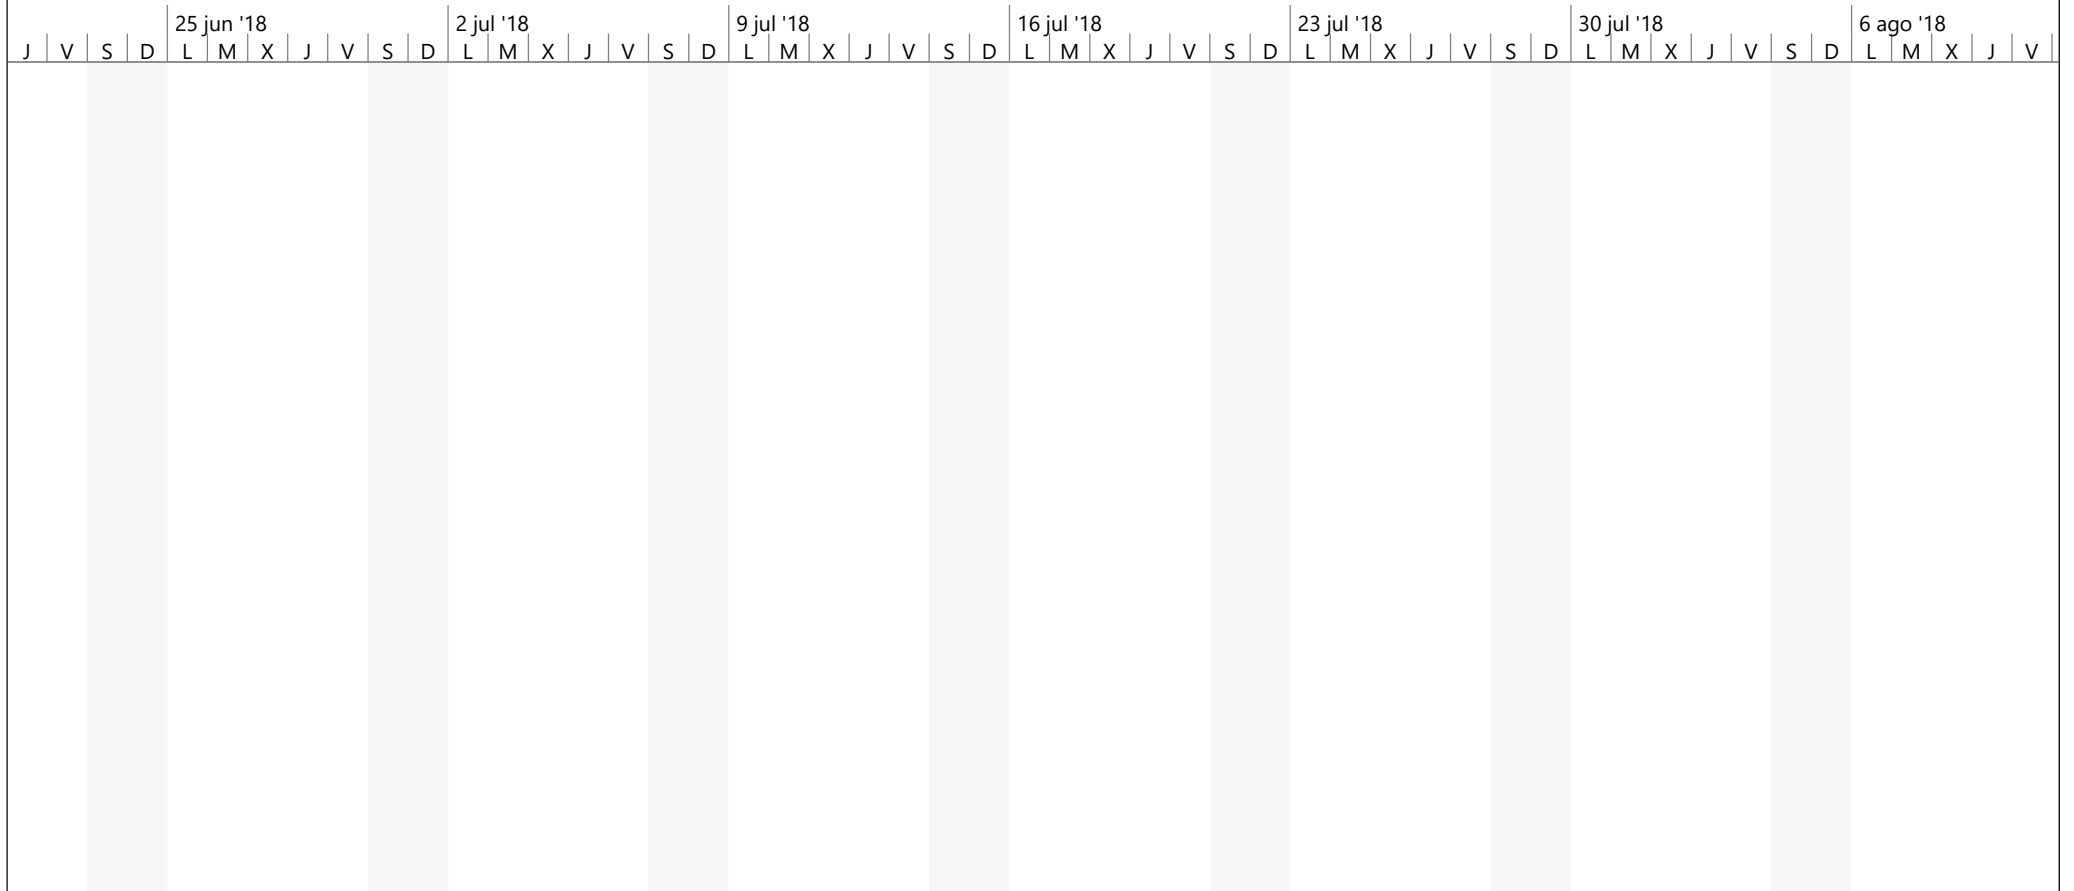


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

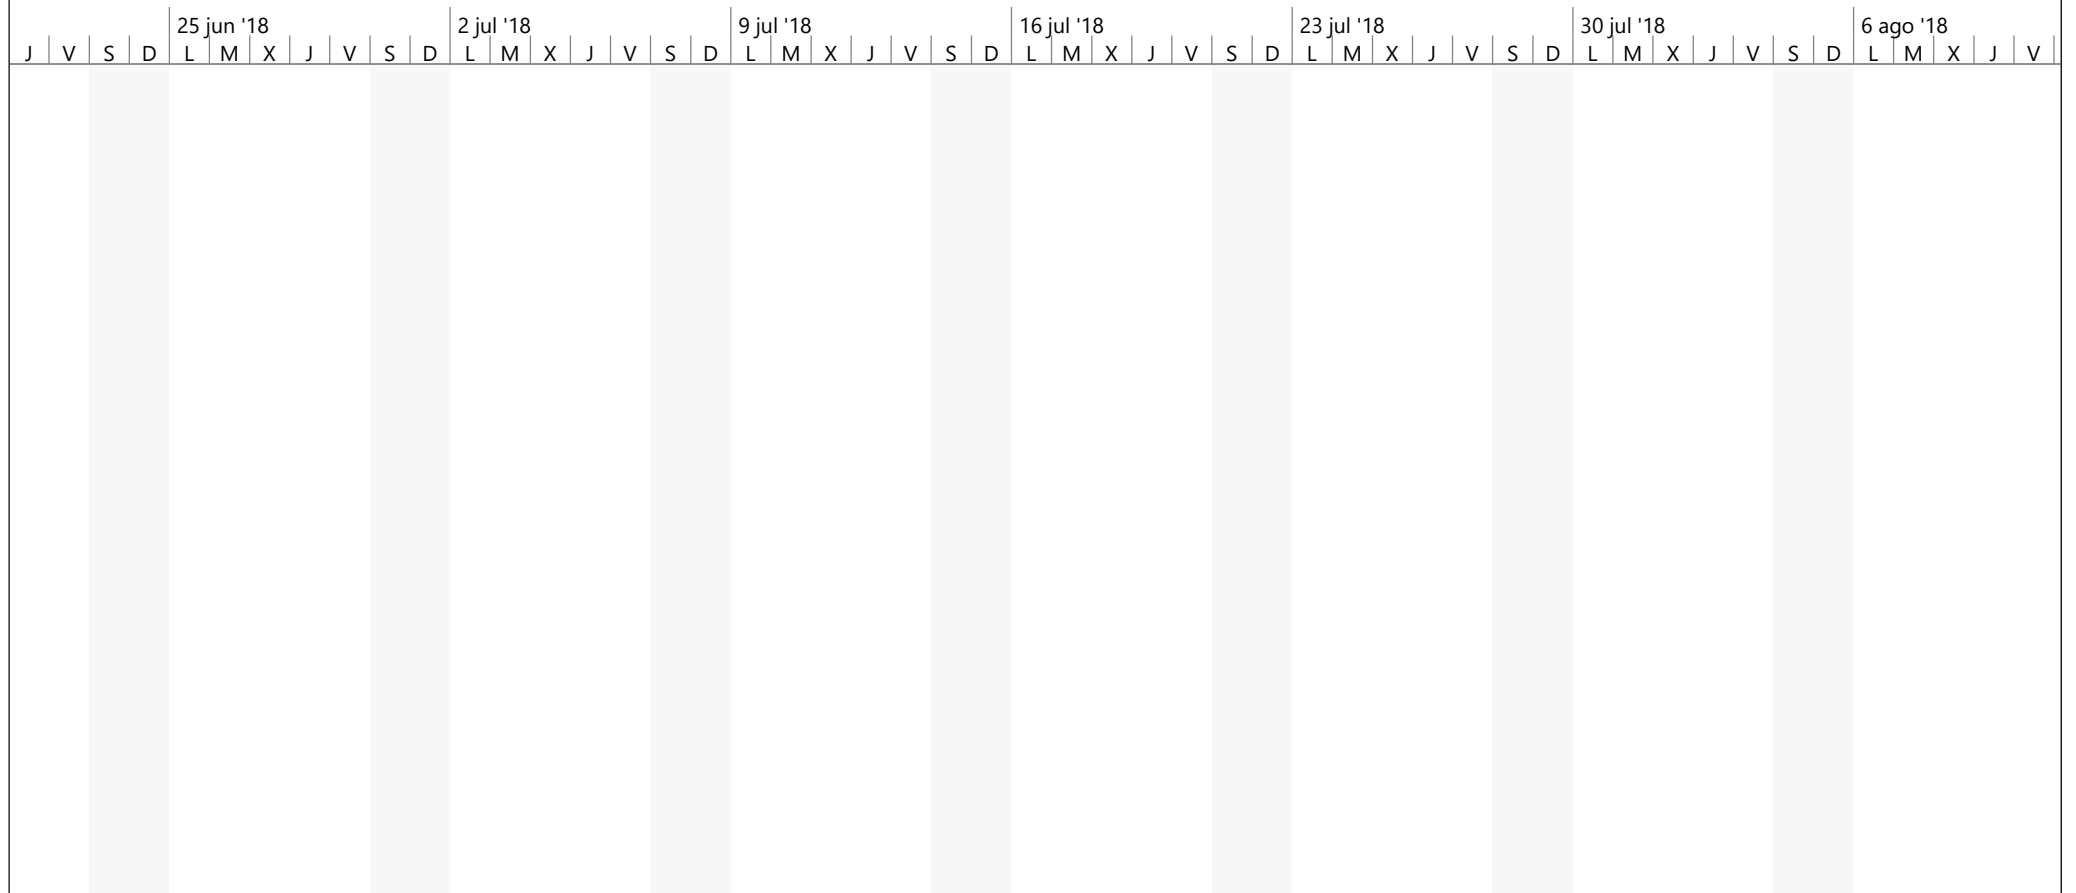

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

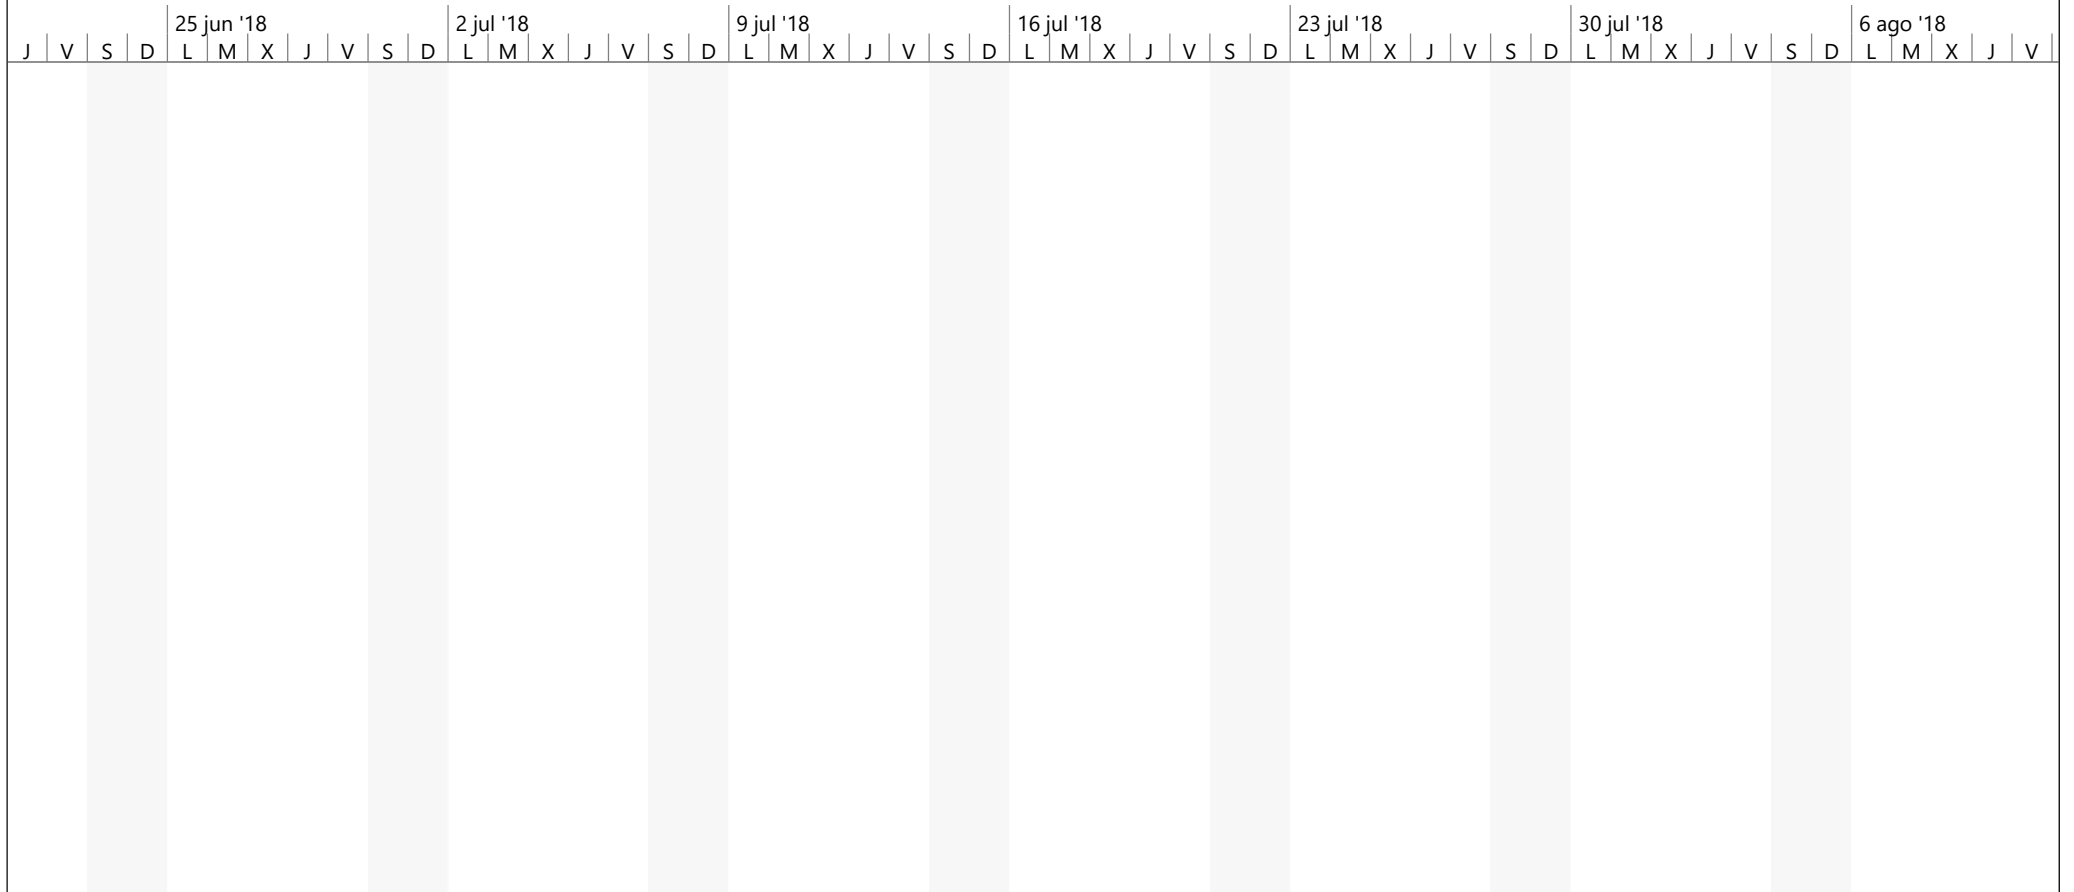


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |



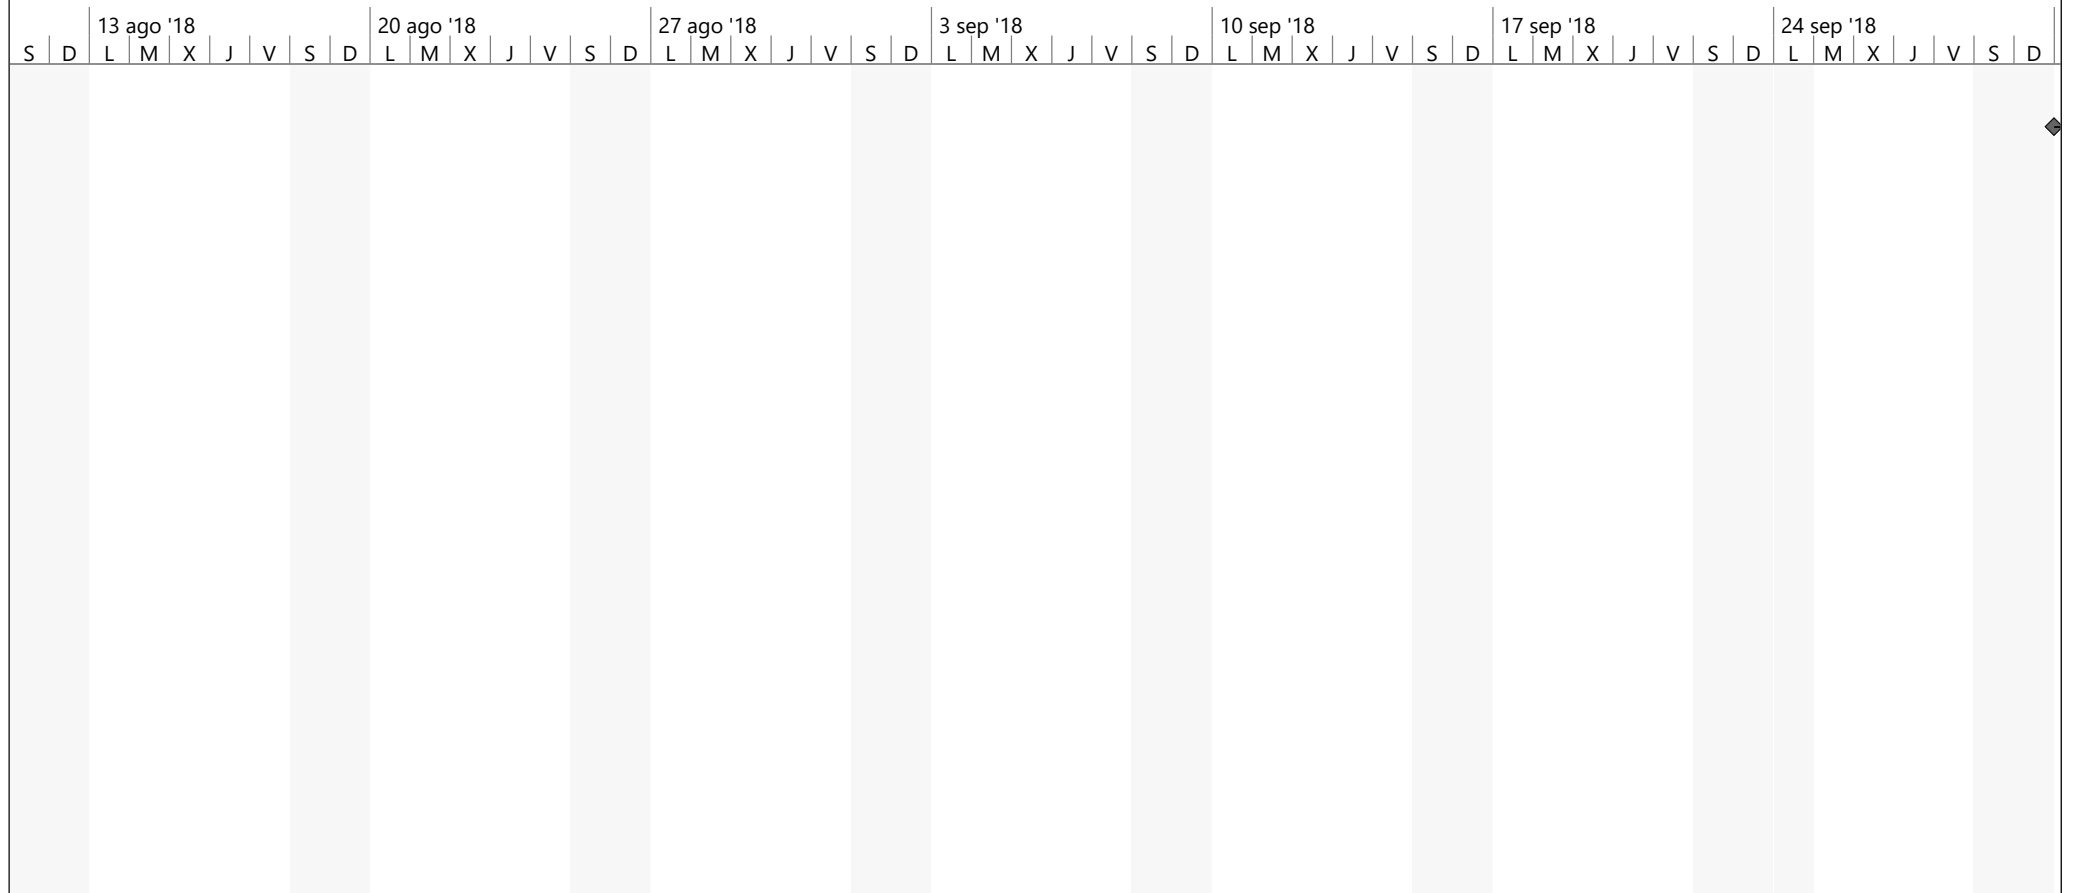





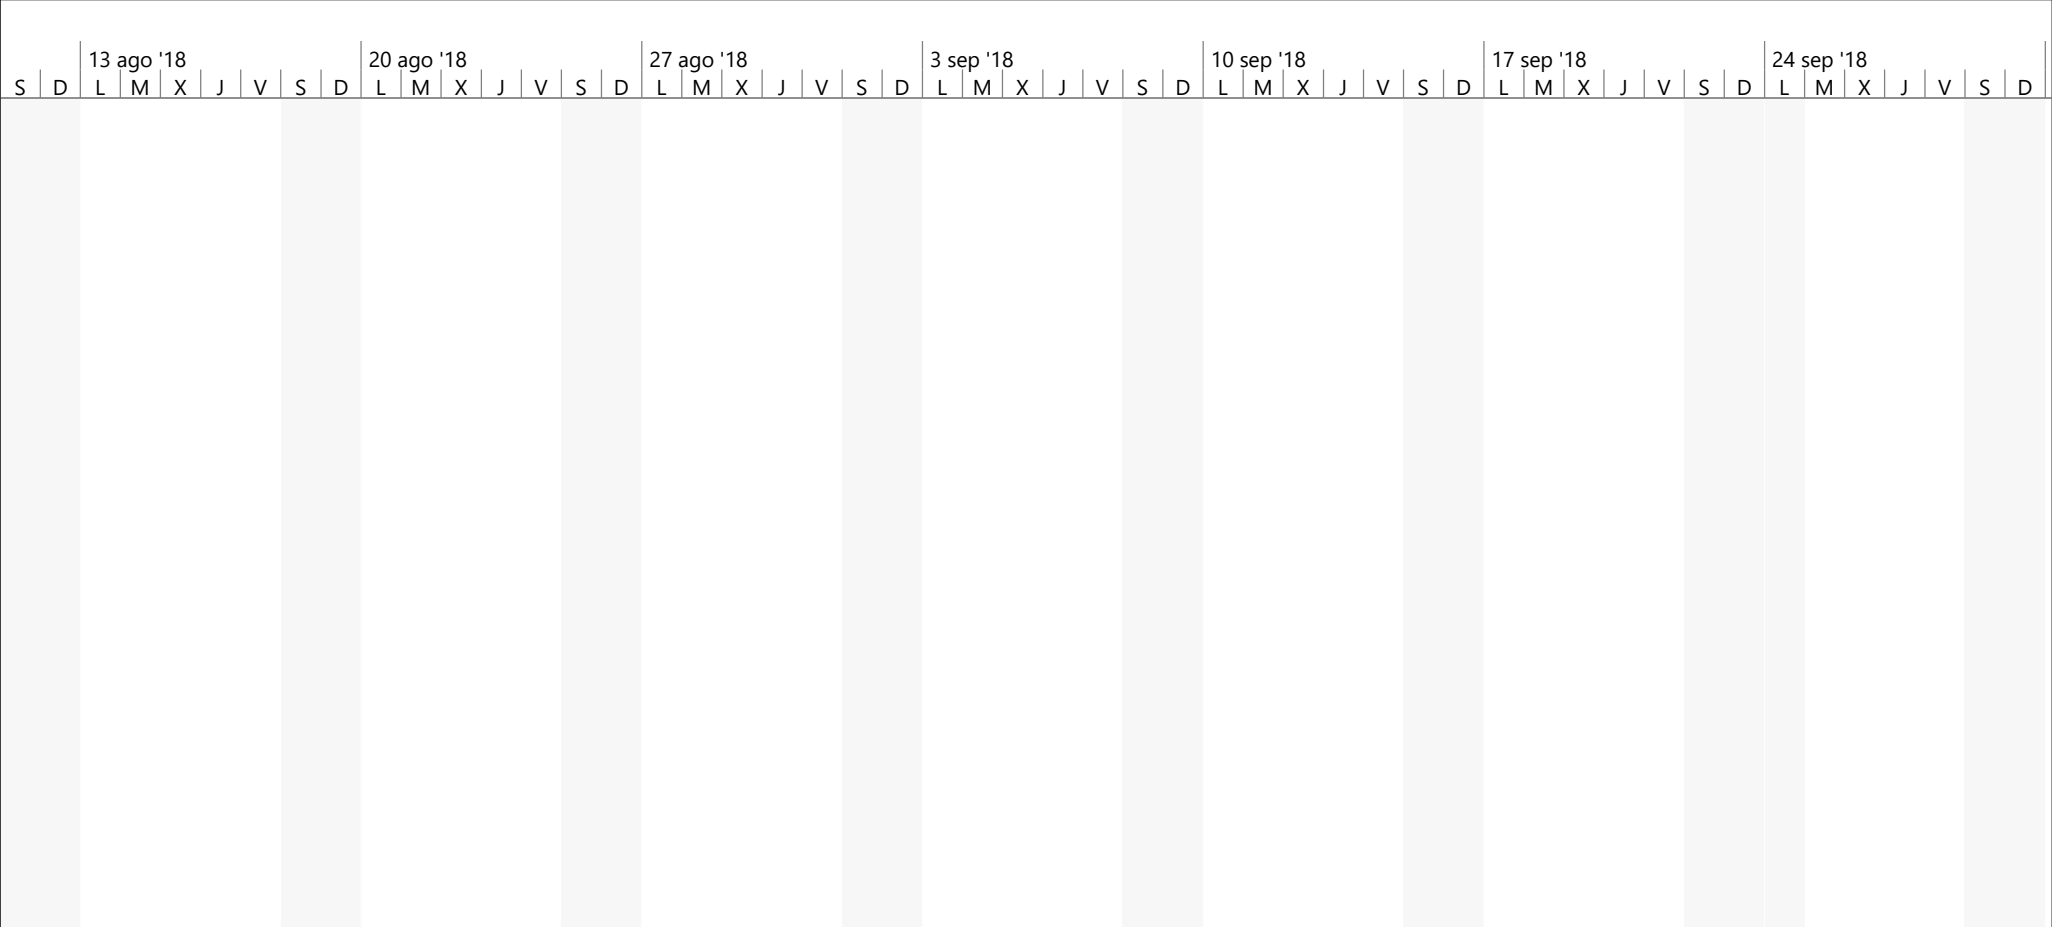















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |









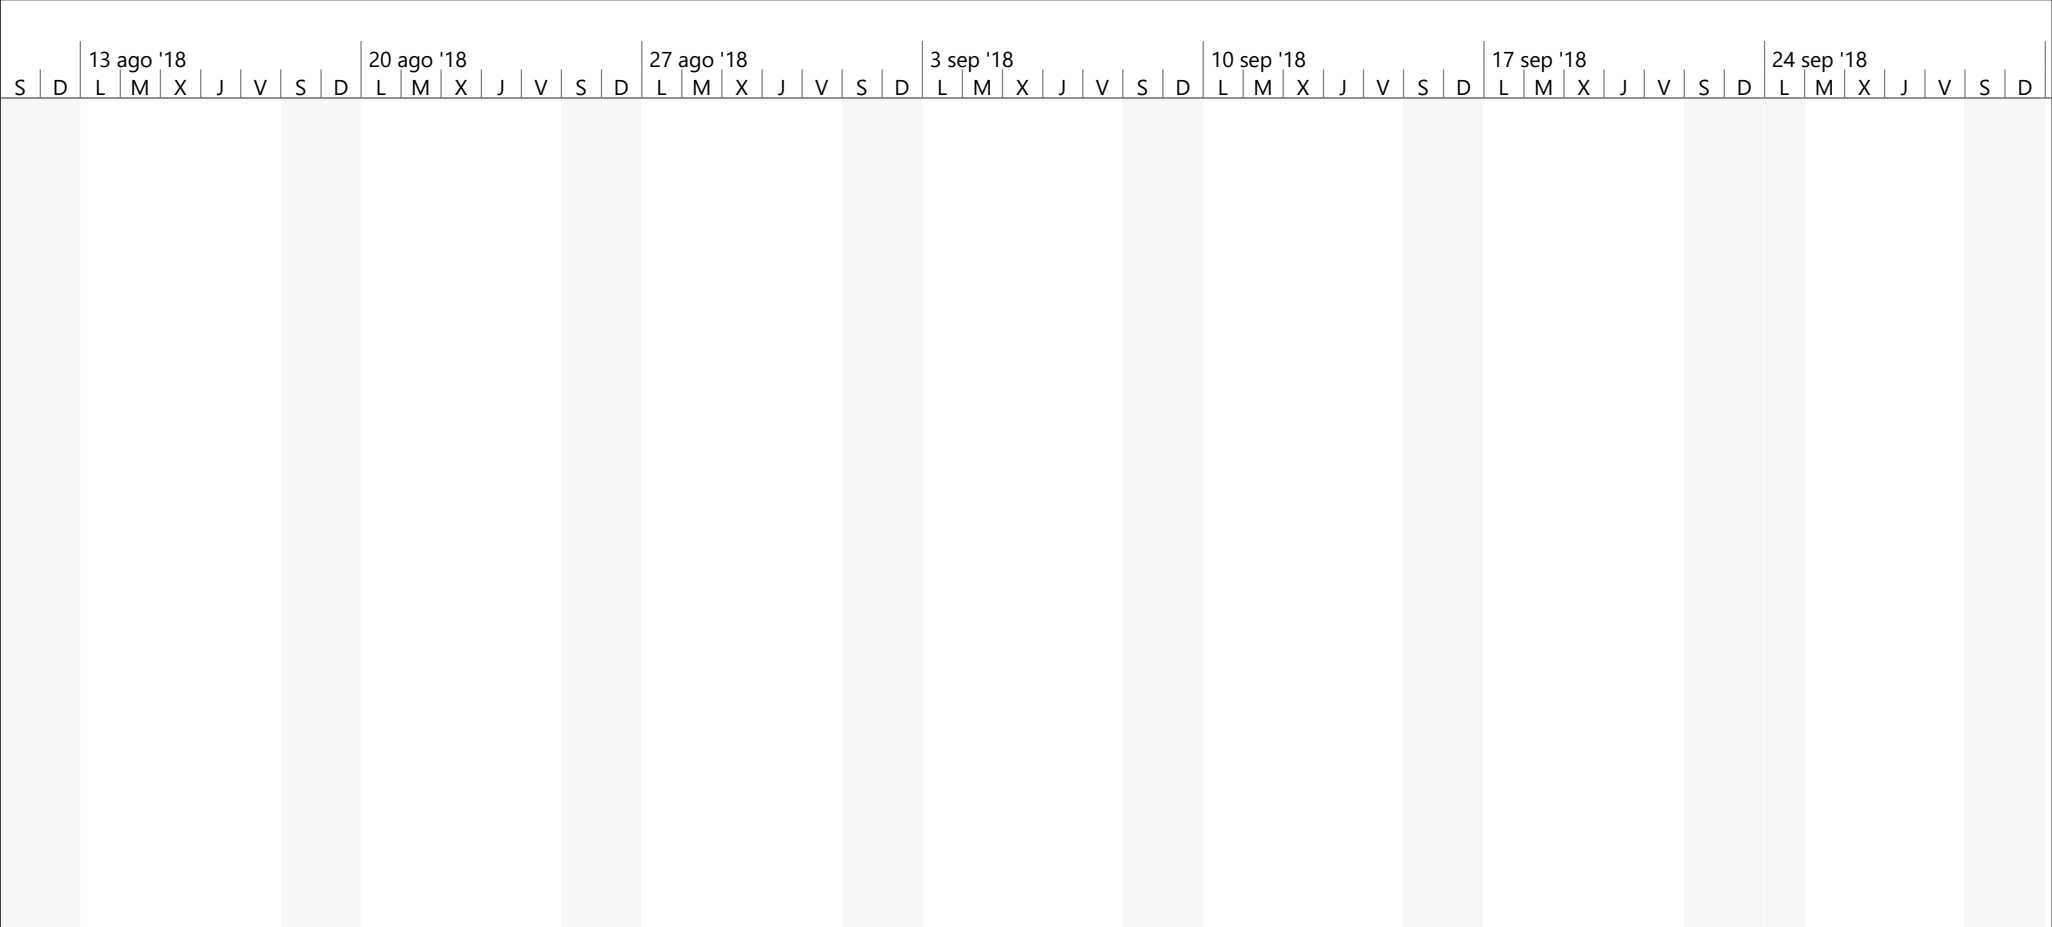















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| S | D | 13 ago '18 | | | | | S | D | 20 ago '18 | | | | | S | D | 27 ago '18 | | | | | S | D | 3 sep '18 | | | | | S | D | 10 sep '18 | | | | | S | D | 17 sep '18 | | | | | S | D | 24 sep '18 | | | | | S | D |
|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|-----------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021


1 oct '18 8 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 5 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1/10

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

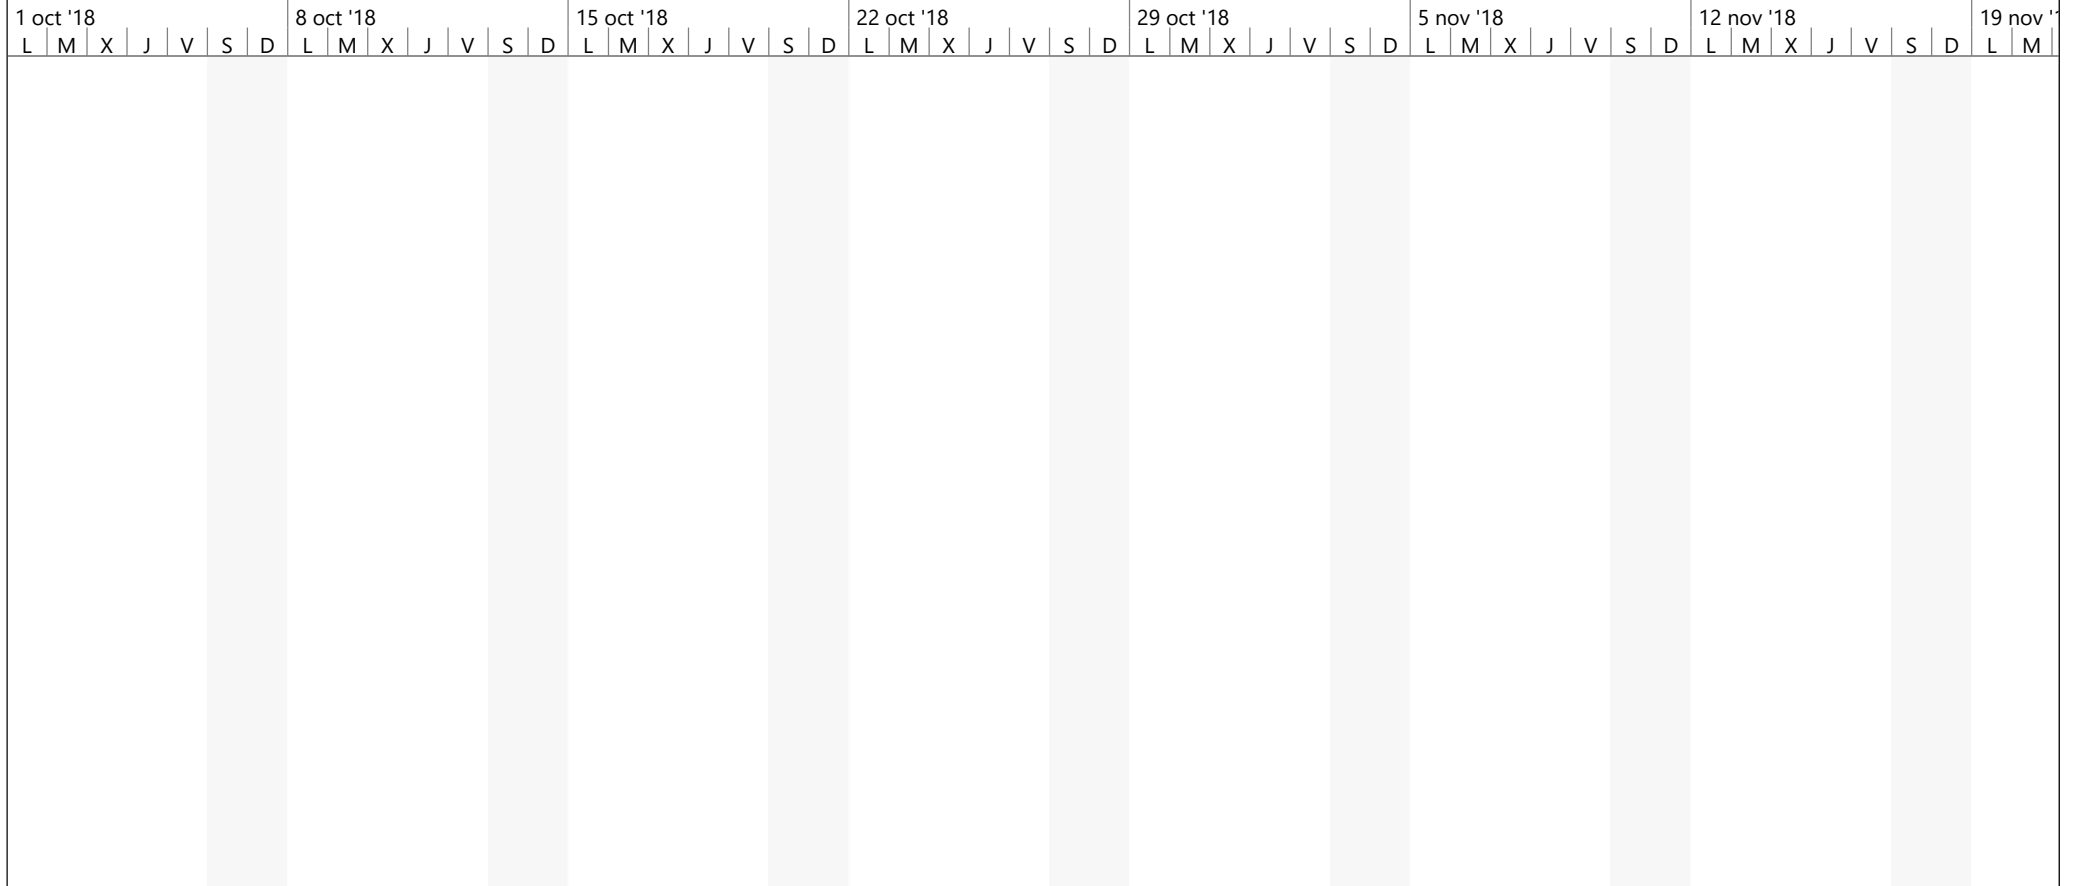

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021


1 oct '18 8 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 5 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

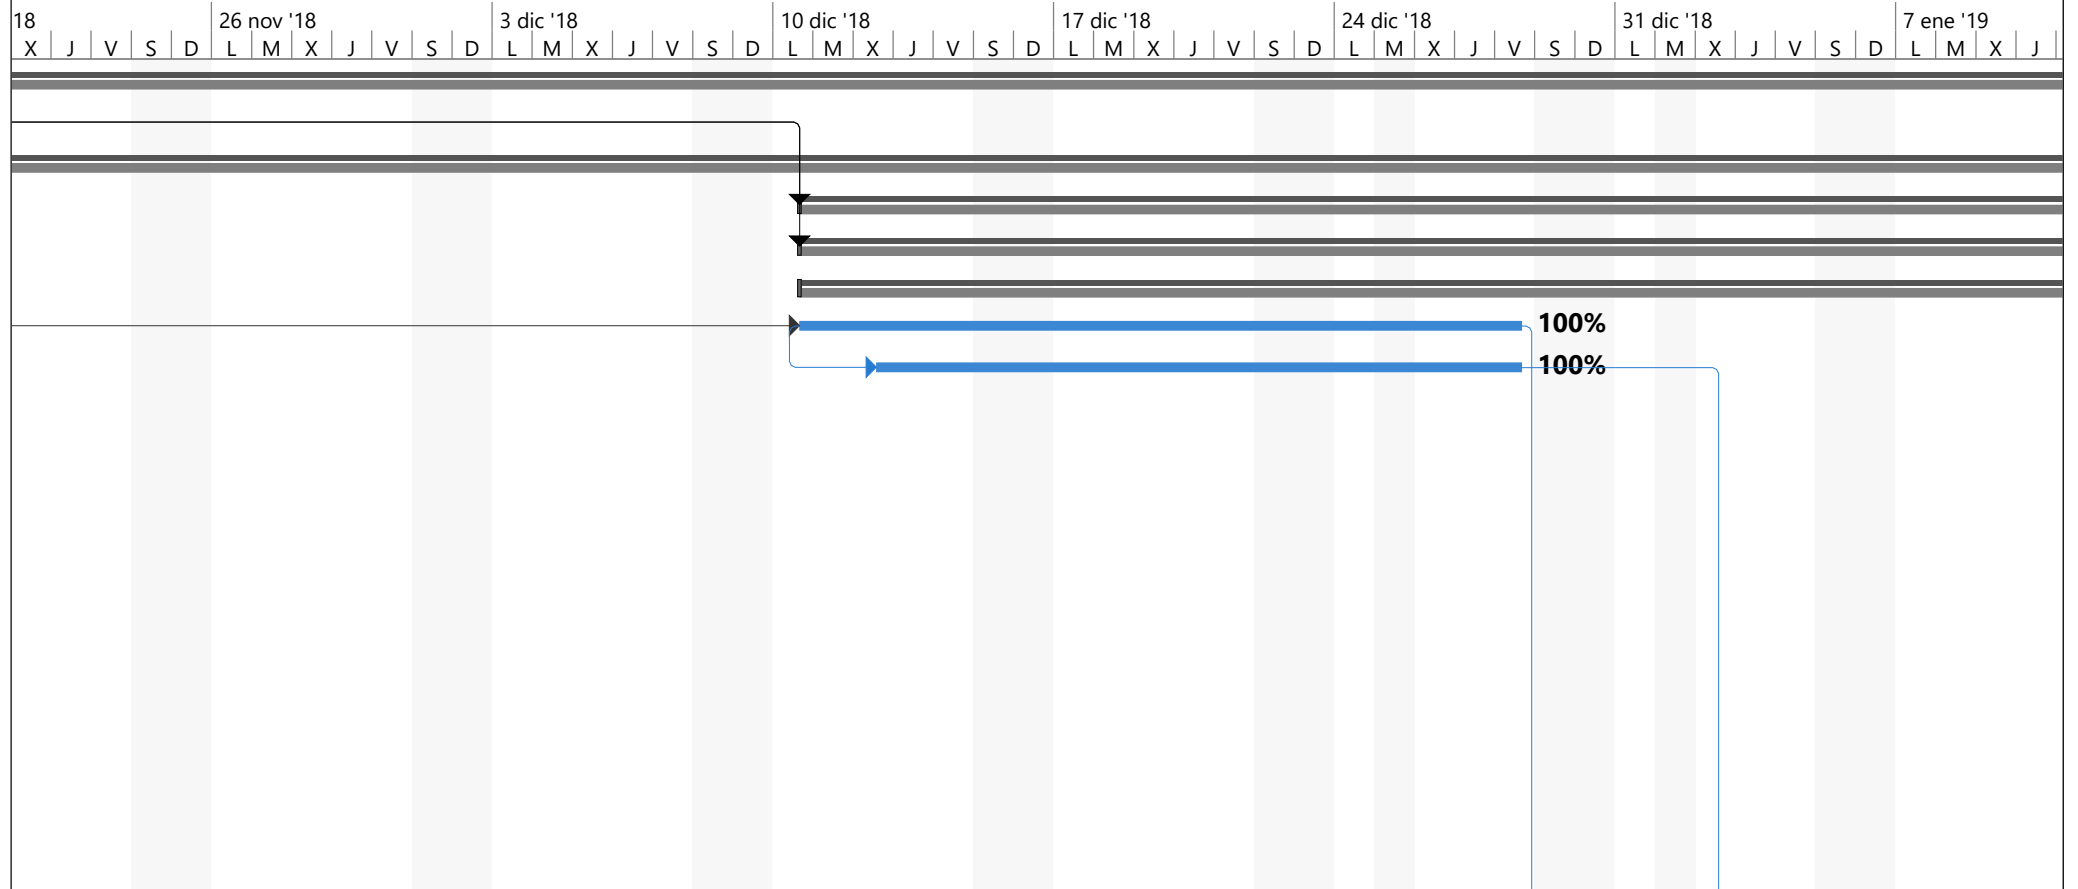




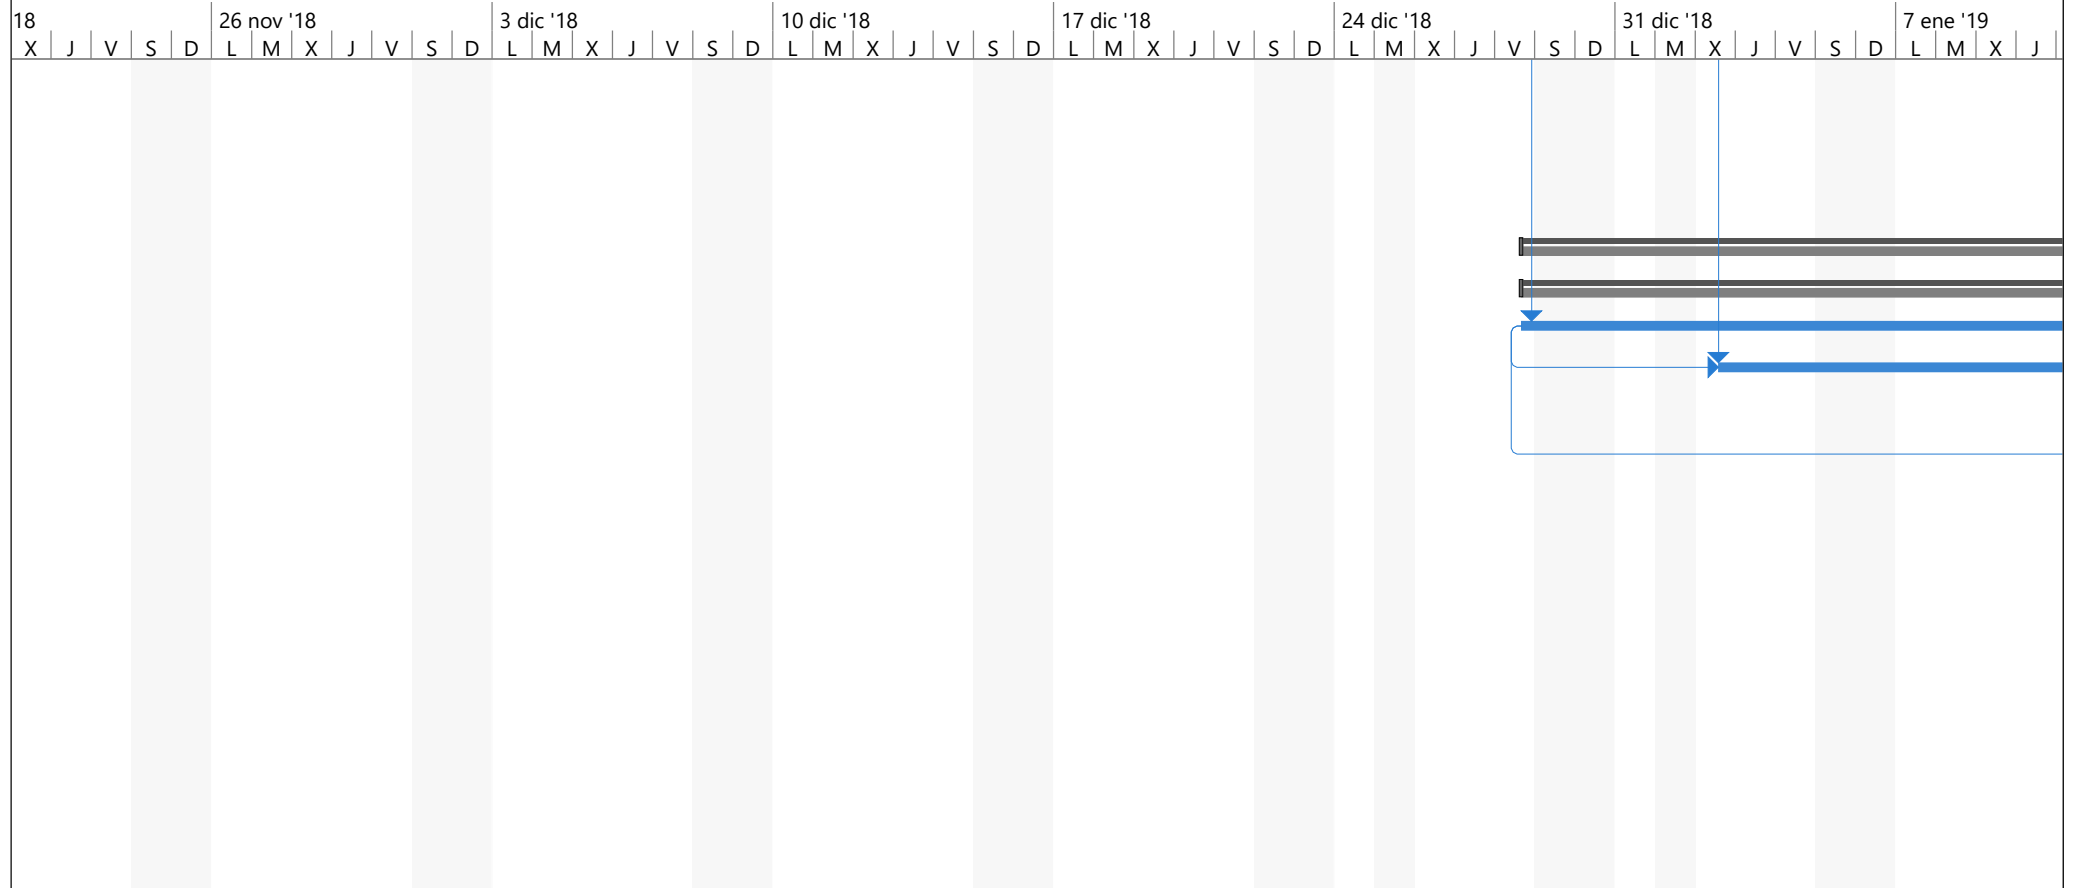




















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| 18 | | | | | 26 nov '18 | | | | | 3 dic '18 | | | | | 10 dic '18 | | | | | 17 dic '18 | | | | | 24 dic '18 | | | | | 31 dic '18 | | | | | 7 ene '19 | | | | |
|----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|--|--|--|
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p align="center">Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021</p> | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

18 X J V S D 26 nov '18 L M X J V S D 3 dic '18 L M X J V S D 10 dic '18 L M X J V S D 17 dic '18 L M X J V S D 24 dic '18 L M X J V S D 31 dic '18 L M X J V S D 7 ene '19 L M X J


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |



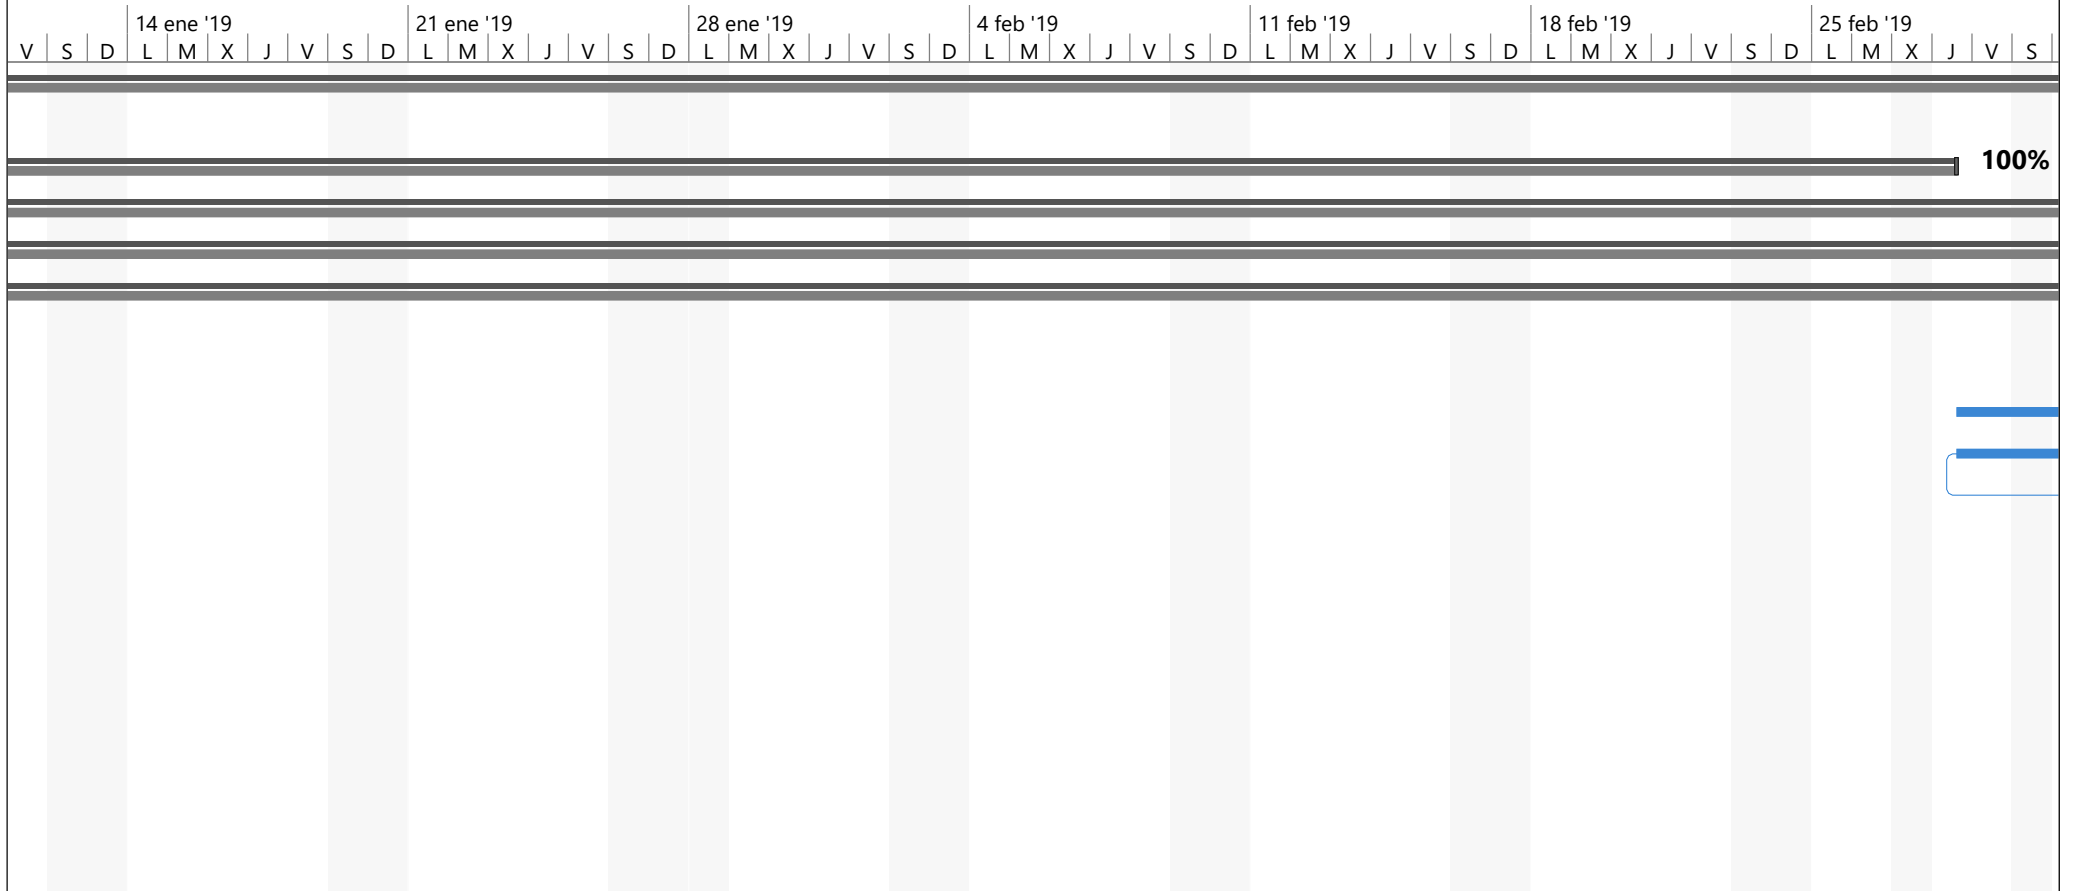





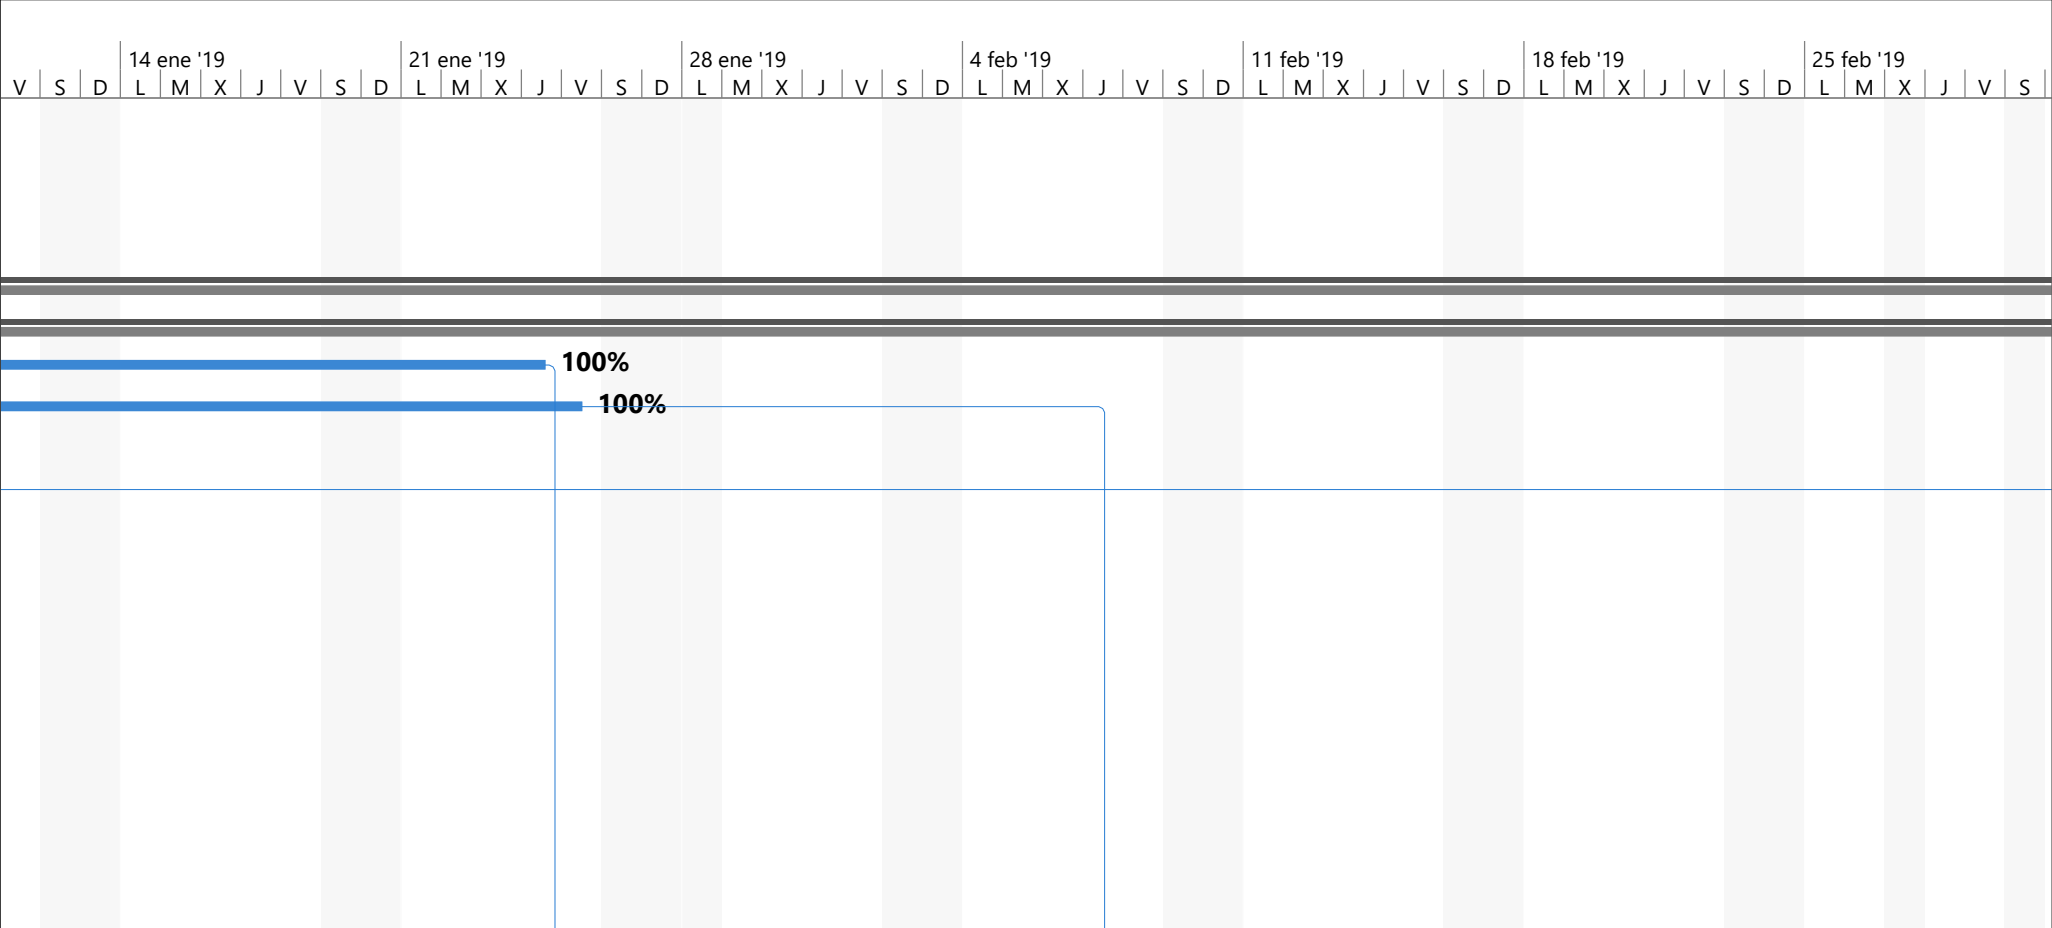















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |




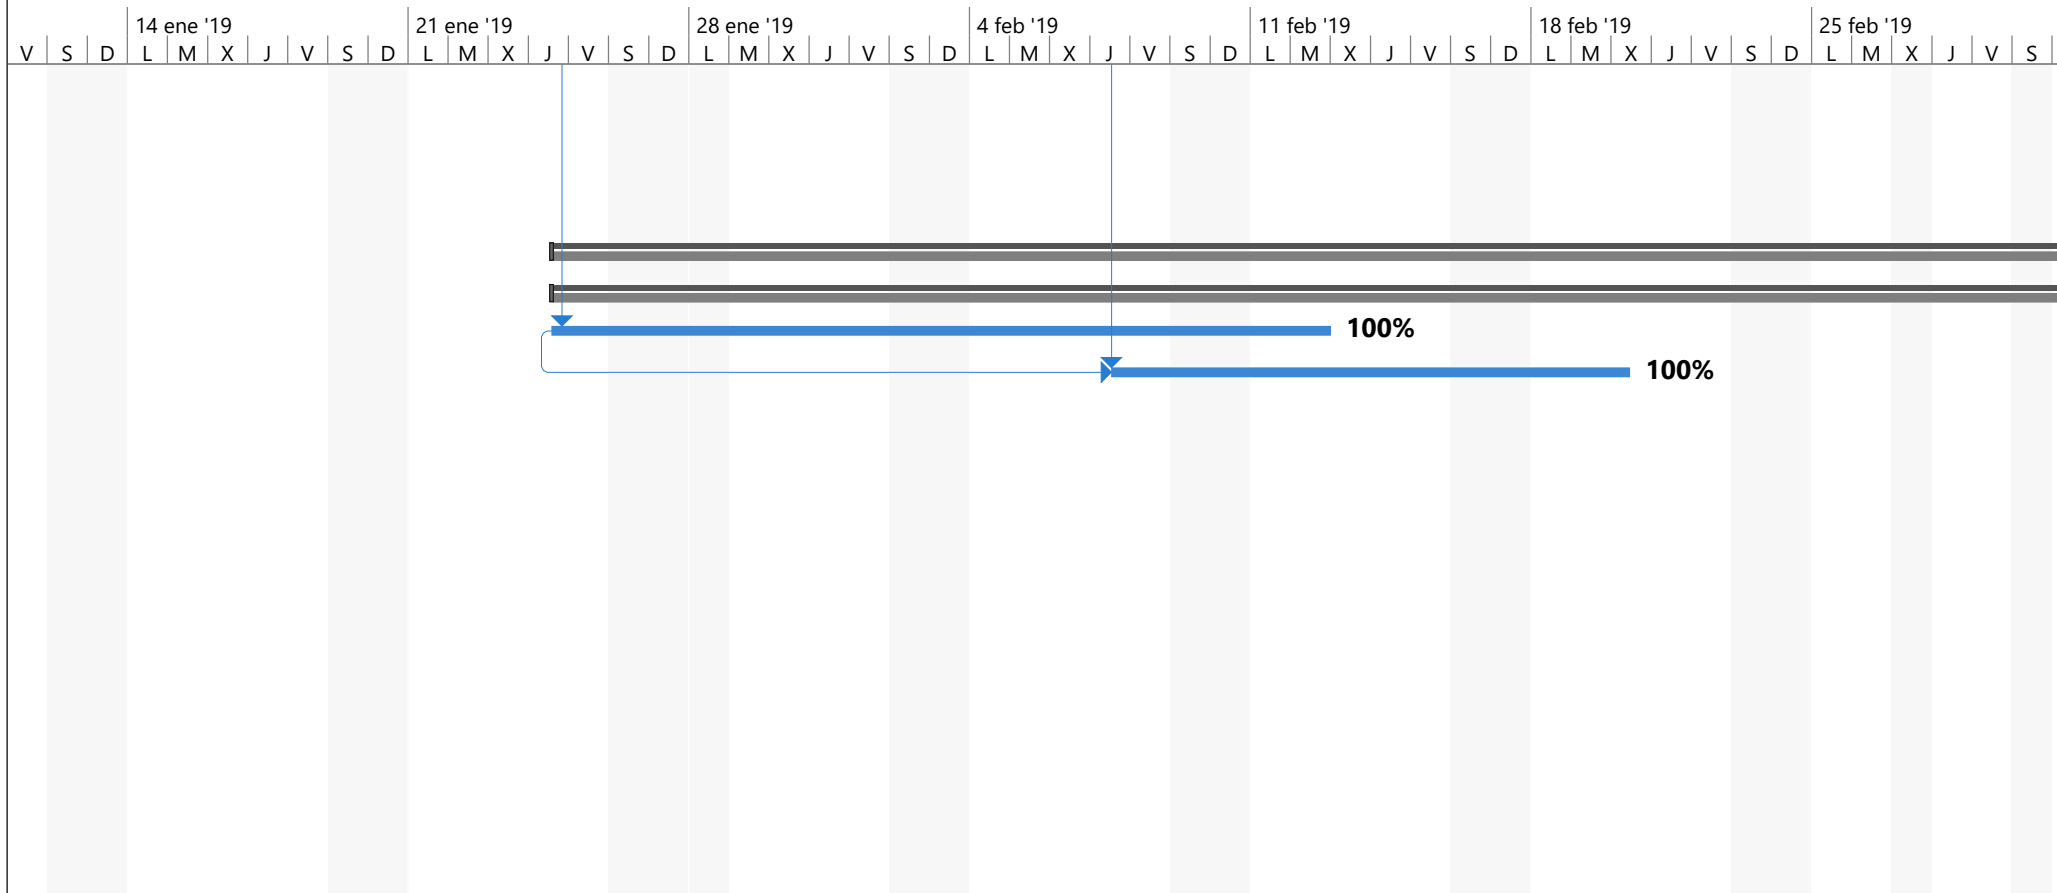




















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| | | | 14 ene '19 | | | | | | | 21 ene '19 | | | | | | | 28 ene '19 | | | | | | | 4 feb '19 | | | | | | | 11 feb '19 | | | | | | | 18 feb '19 | | | | | | | 25 feb '19 | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

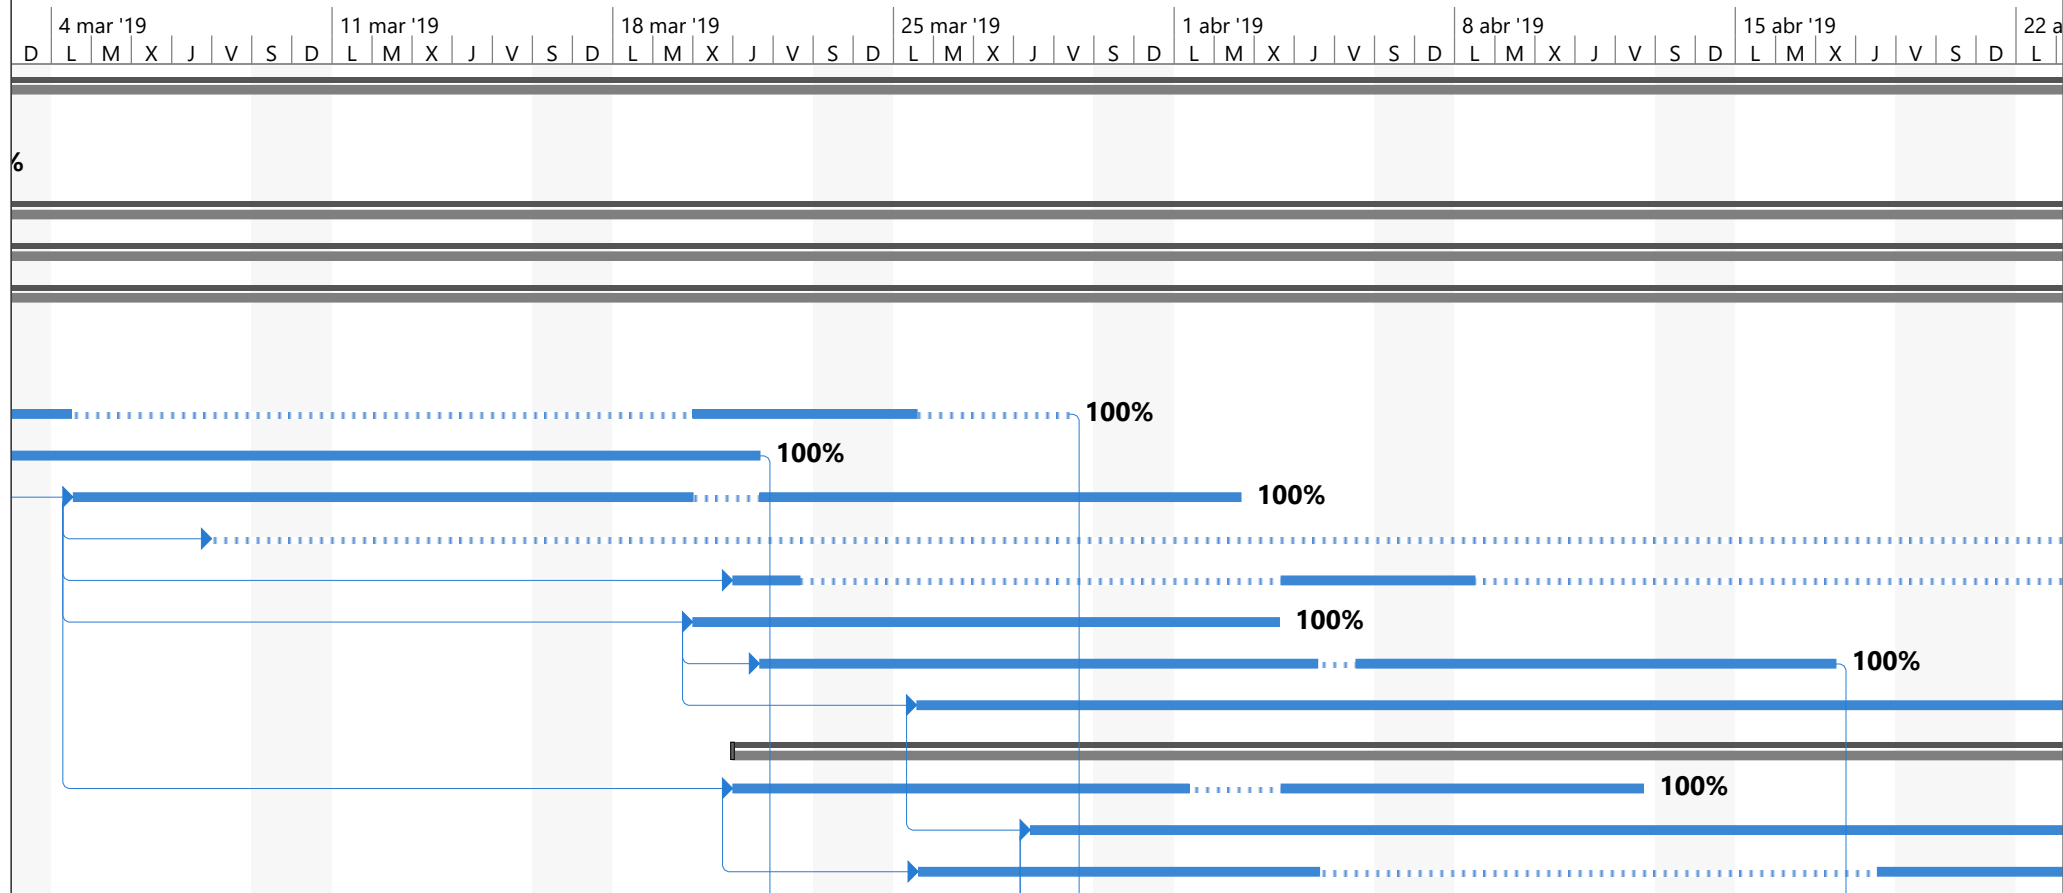


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

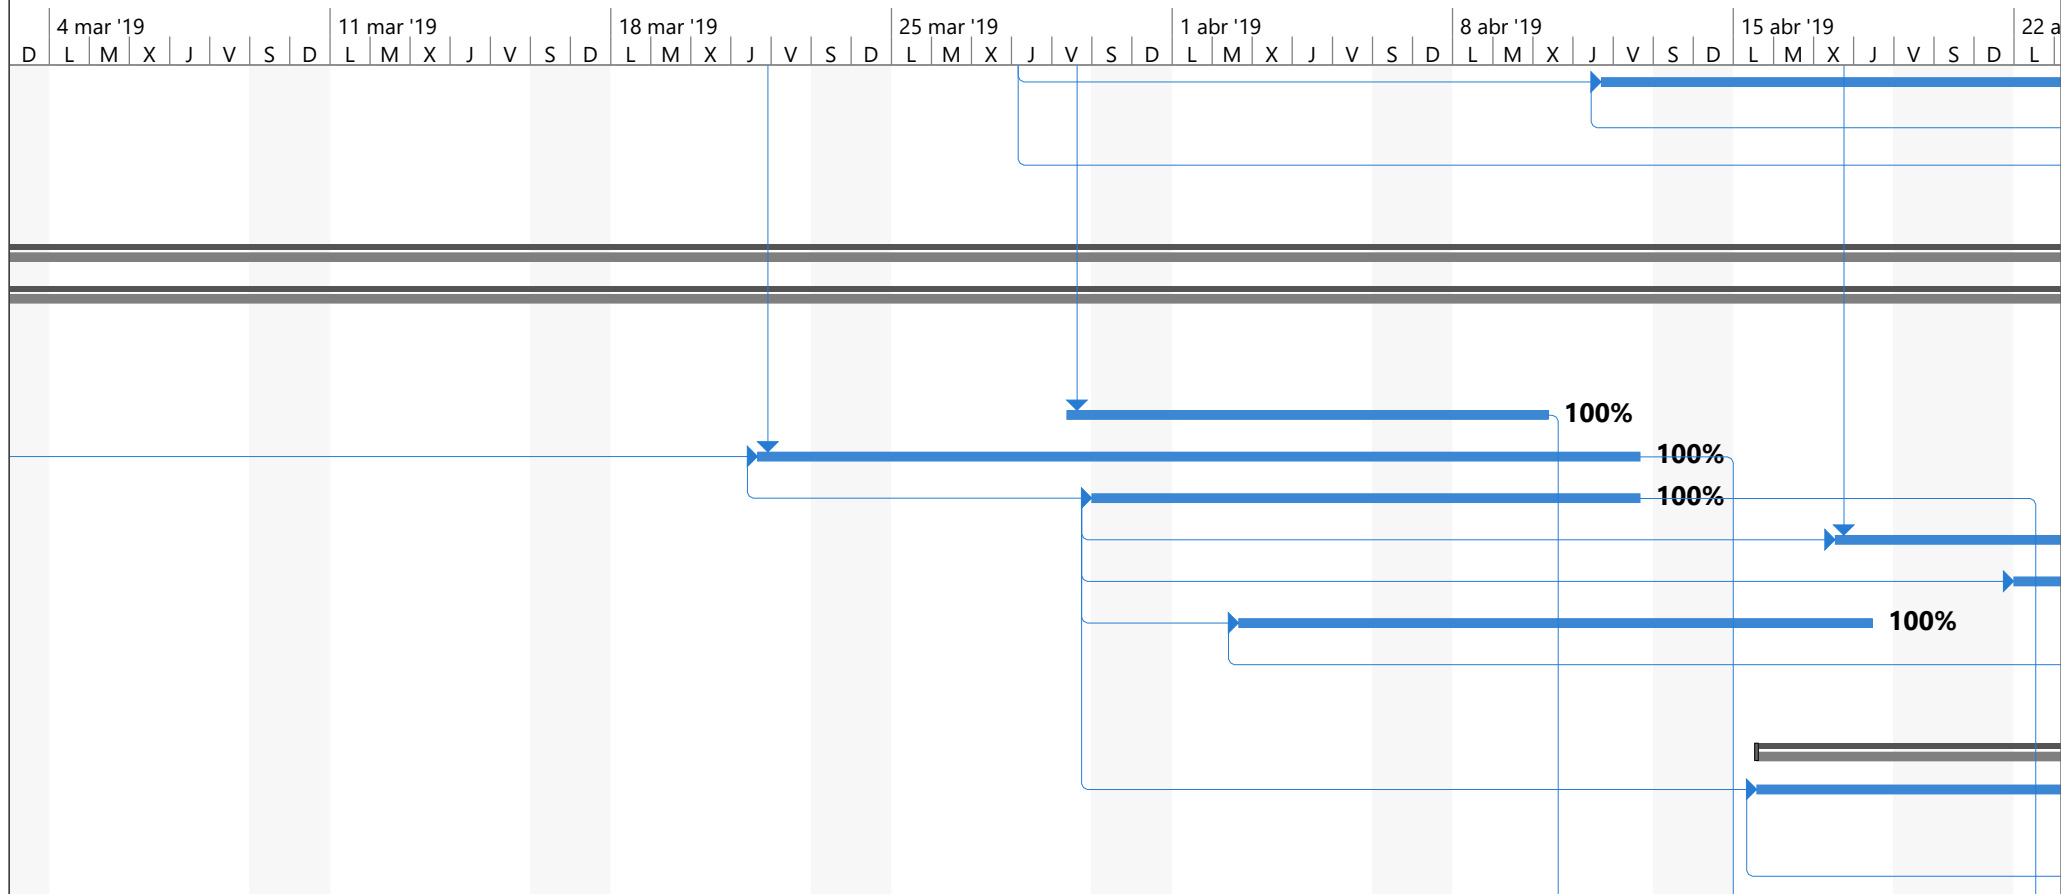

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |



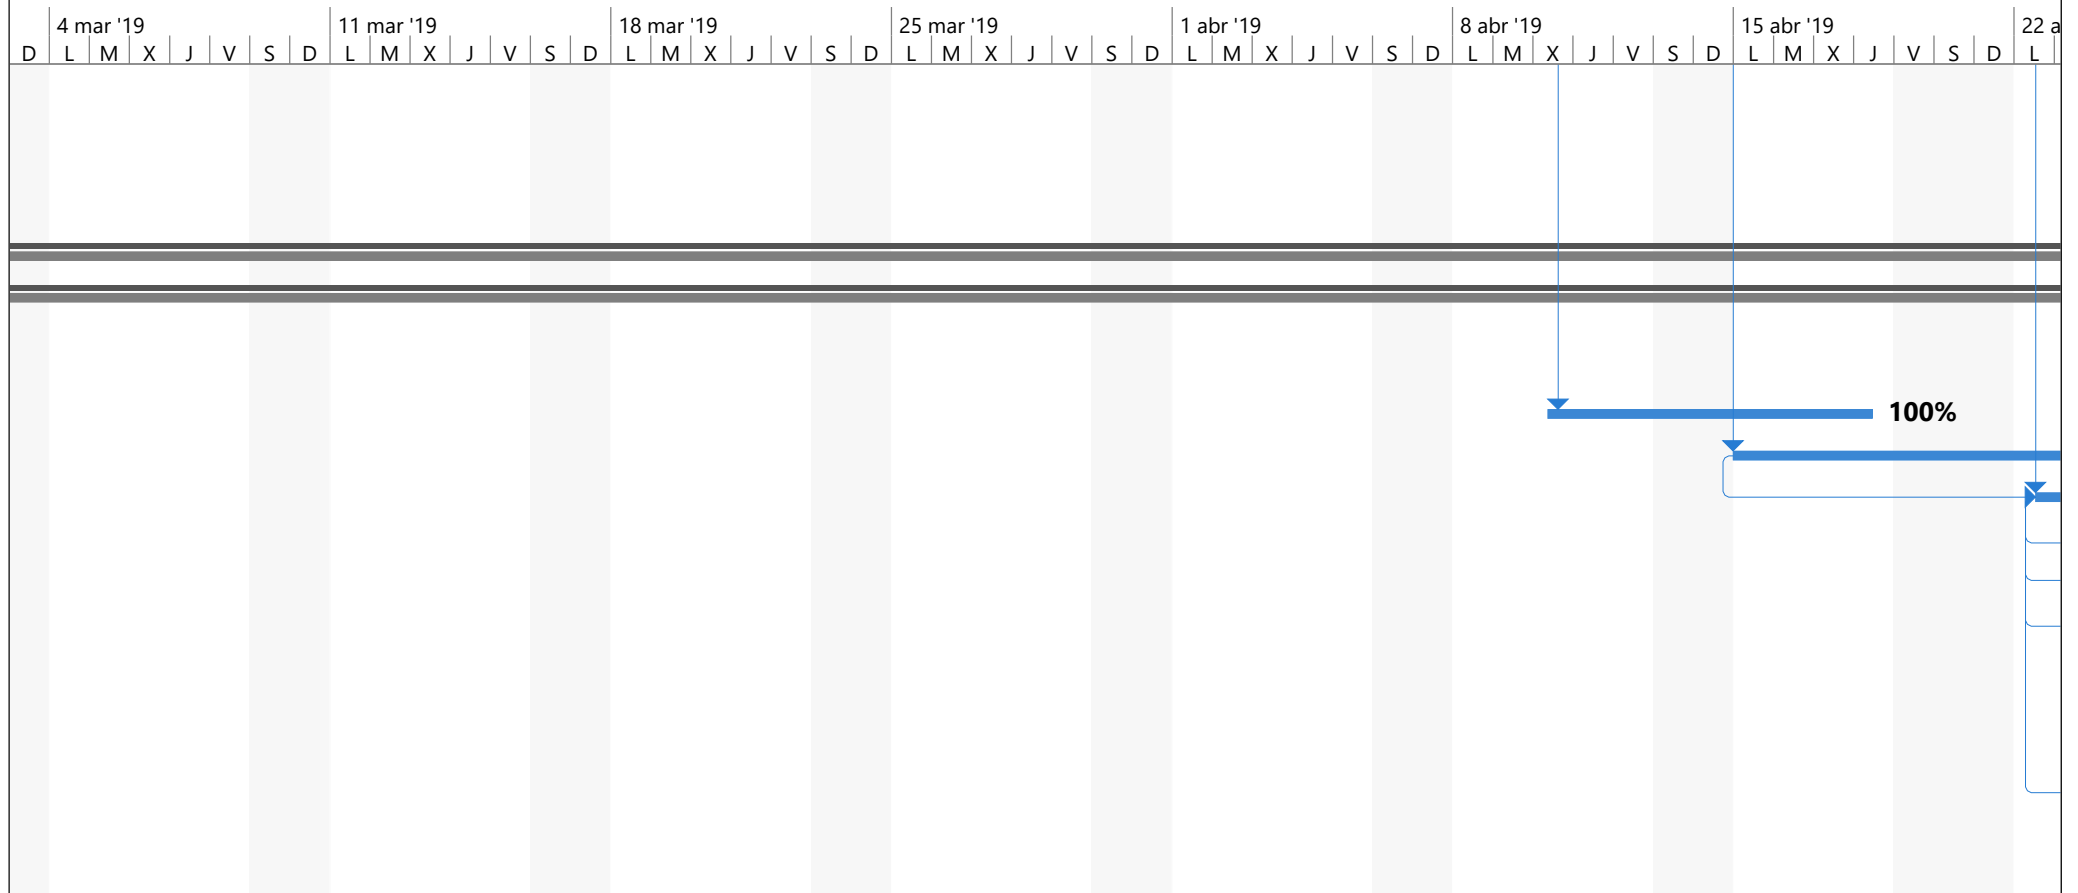





















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

| 4 mar '19 | | | | | | | 11 mar '19 | | | | | | | 18 mar '19 | | | | | | | 25 mar '19 | | | | | | | 1 abr '19 | | | | | | | 8 abr '19 | | | | | | | 15 abr '19 | | | | | | | 22 a |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|--|--|--|------|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

abr '19
M X J V S D

29 abr '19
L M X J V S D

6 may '19
L M X J V S D


13 may '19
L M X J V S D

20 may '19
L M X J V S D

27 may '19
L M X J V S D


3 jun '19
L M X J V S D

10 jun '19
L M X

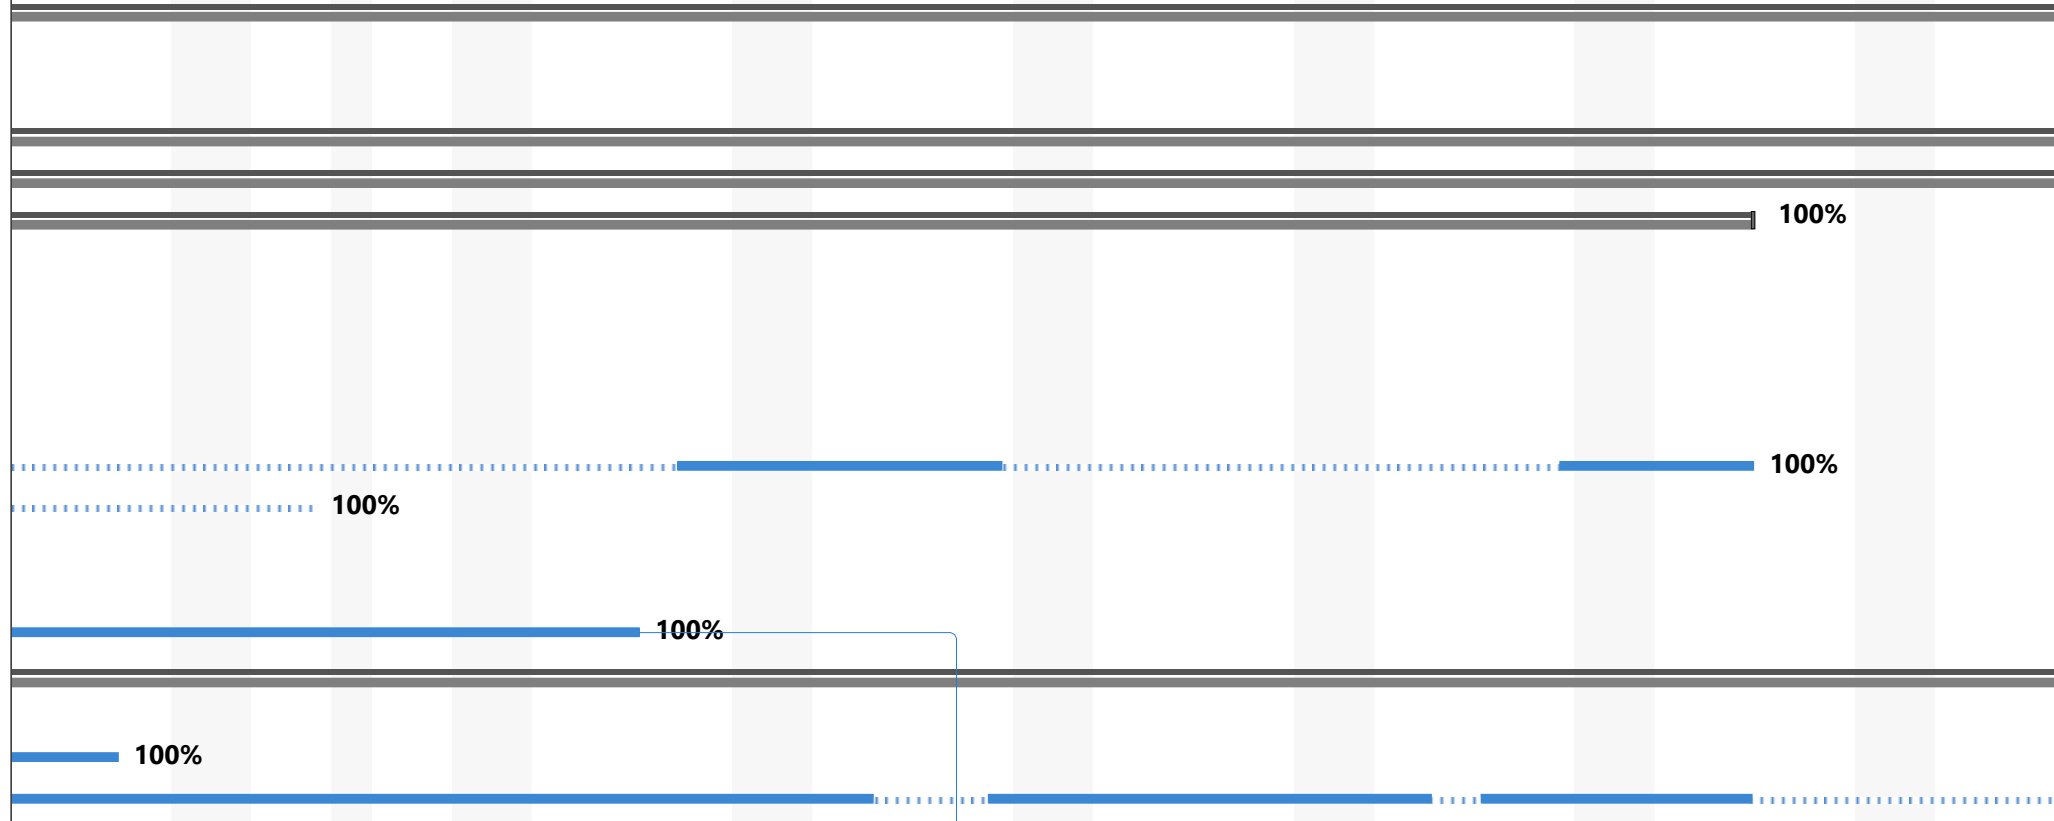


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

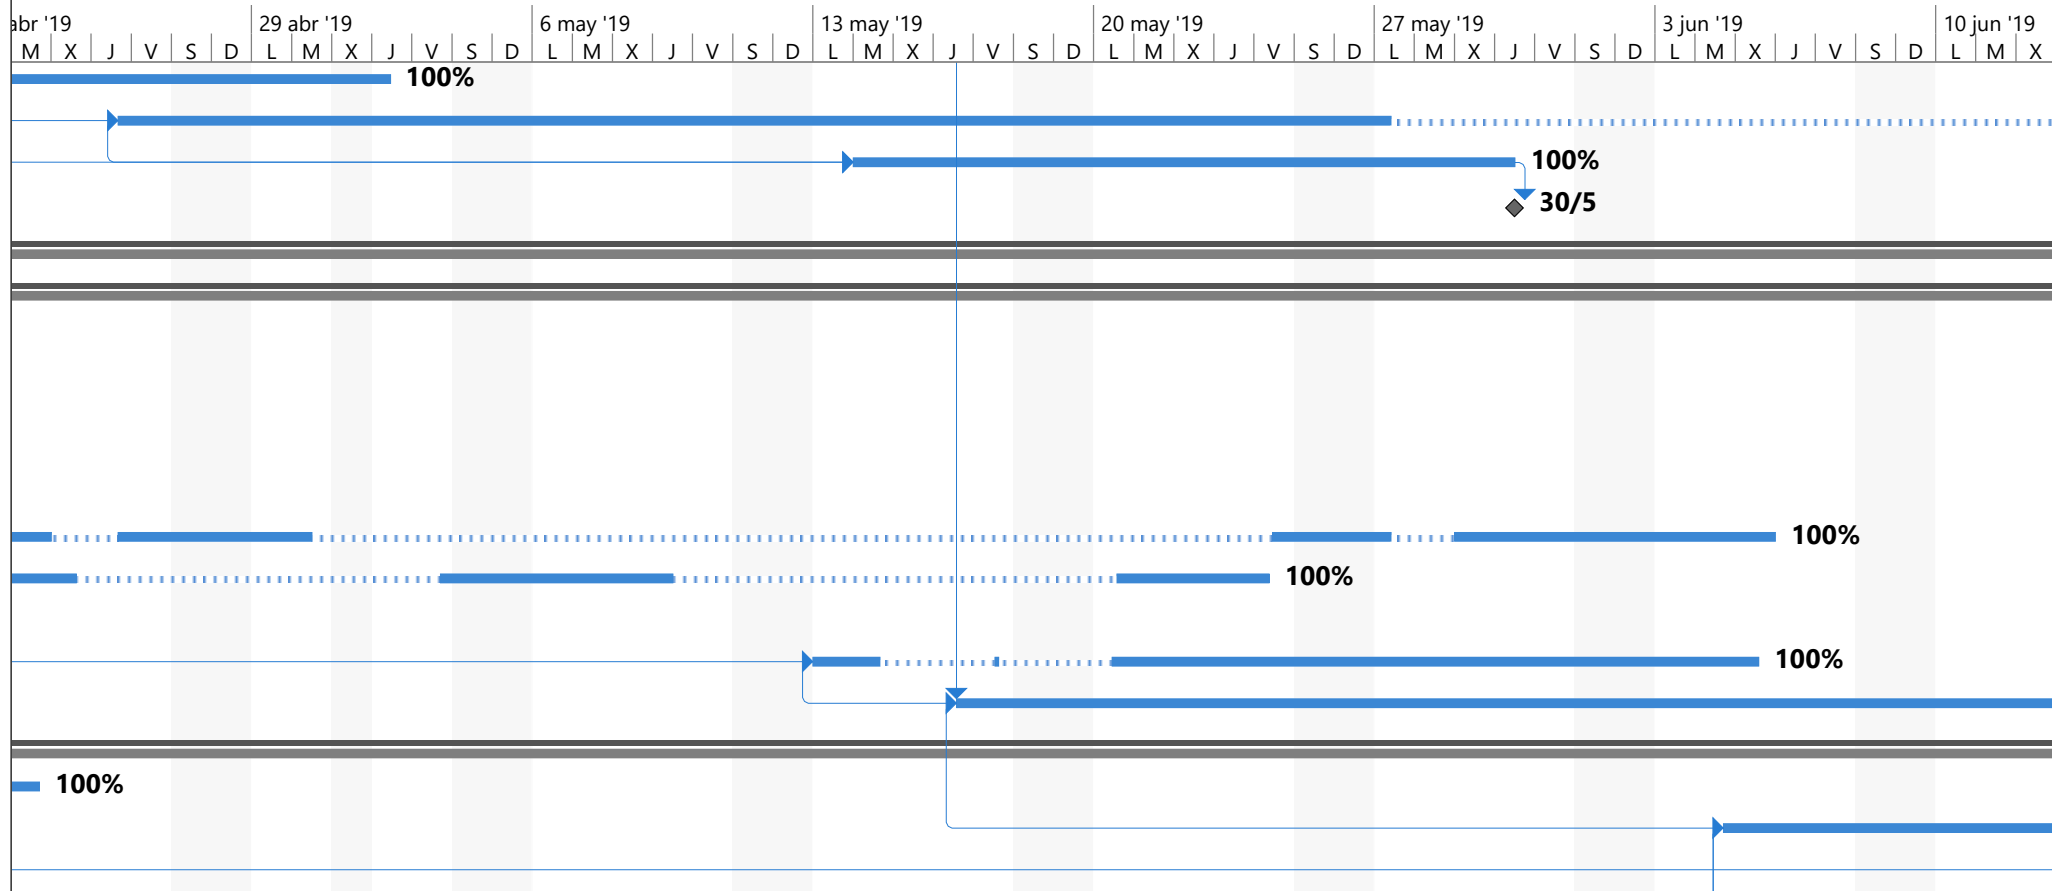

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

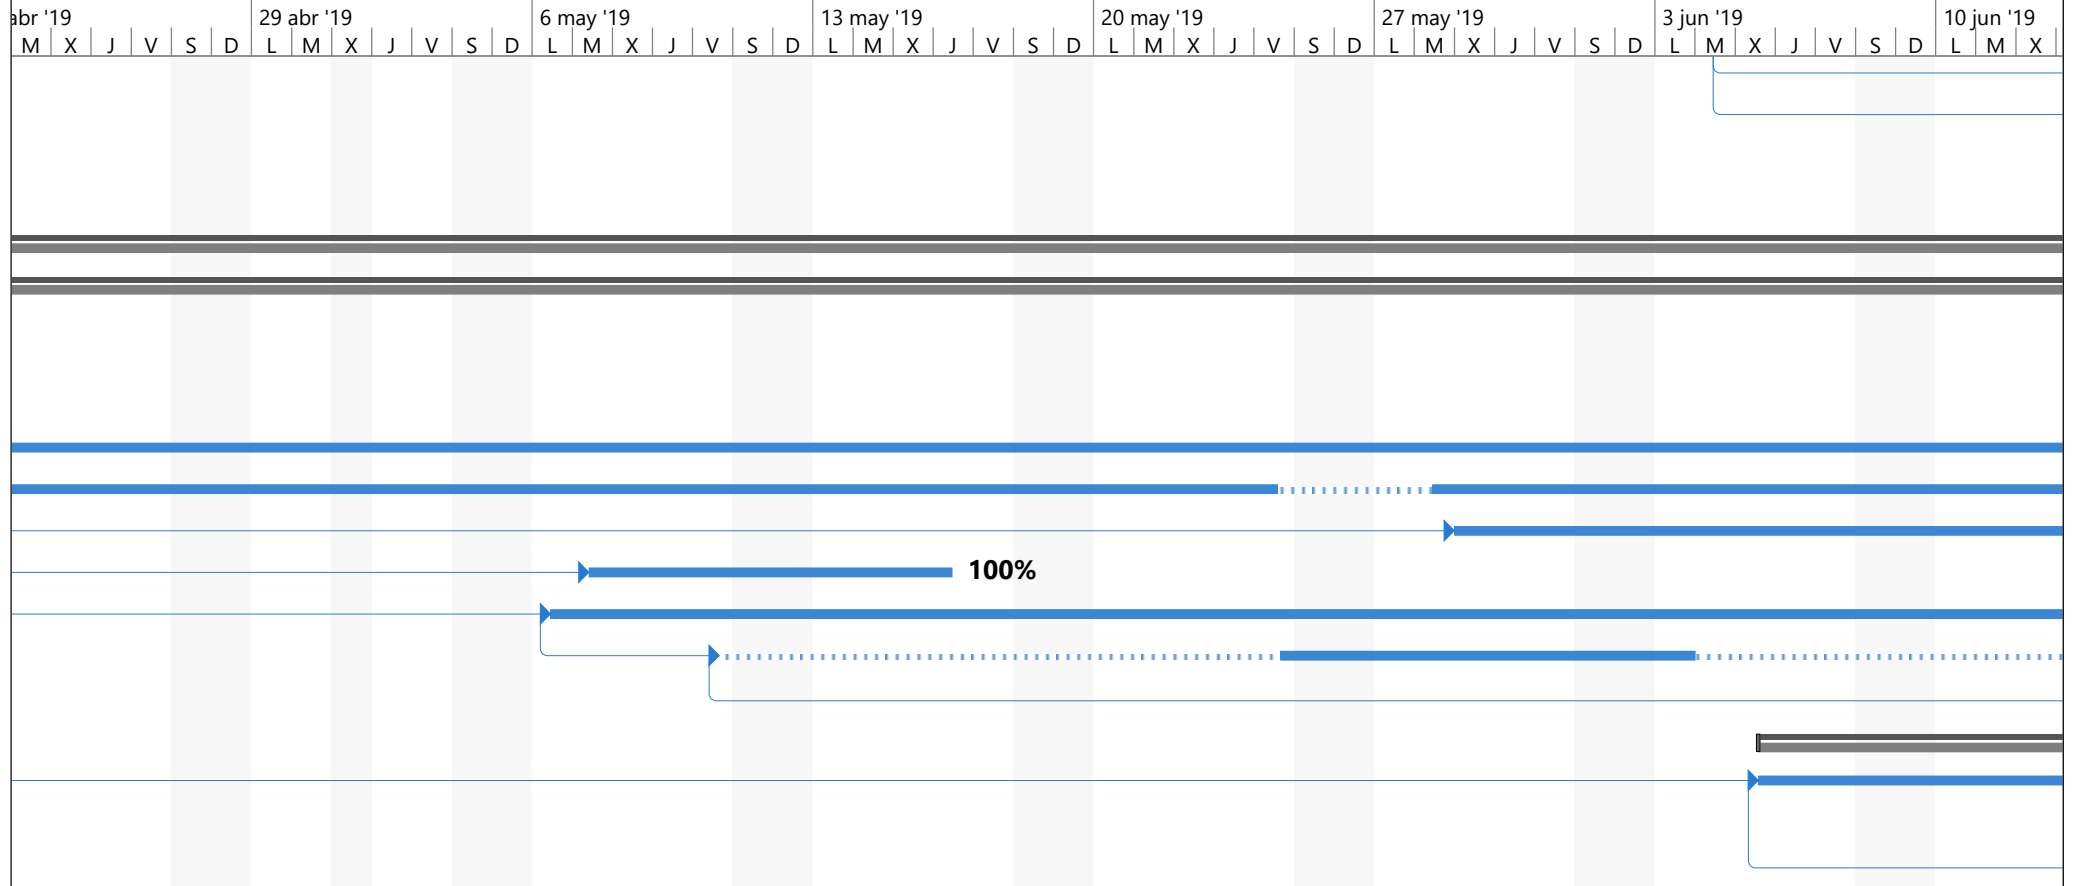

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

abr '19
M X J V S D
29 abr '19
L M X J V S D
6 may '19
L M X J V S D
13 may '19
L M X J V S D
20 may '19
L M X J V S D
27 may '19
L M X J V S D
3 jun '19
L M X J V S D
10 jun '19
L M X




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

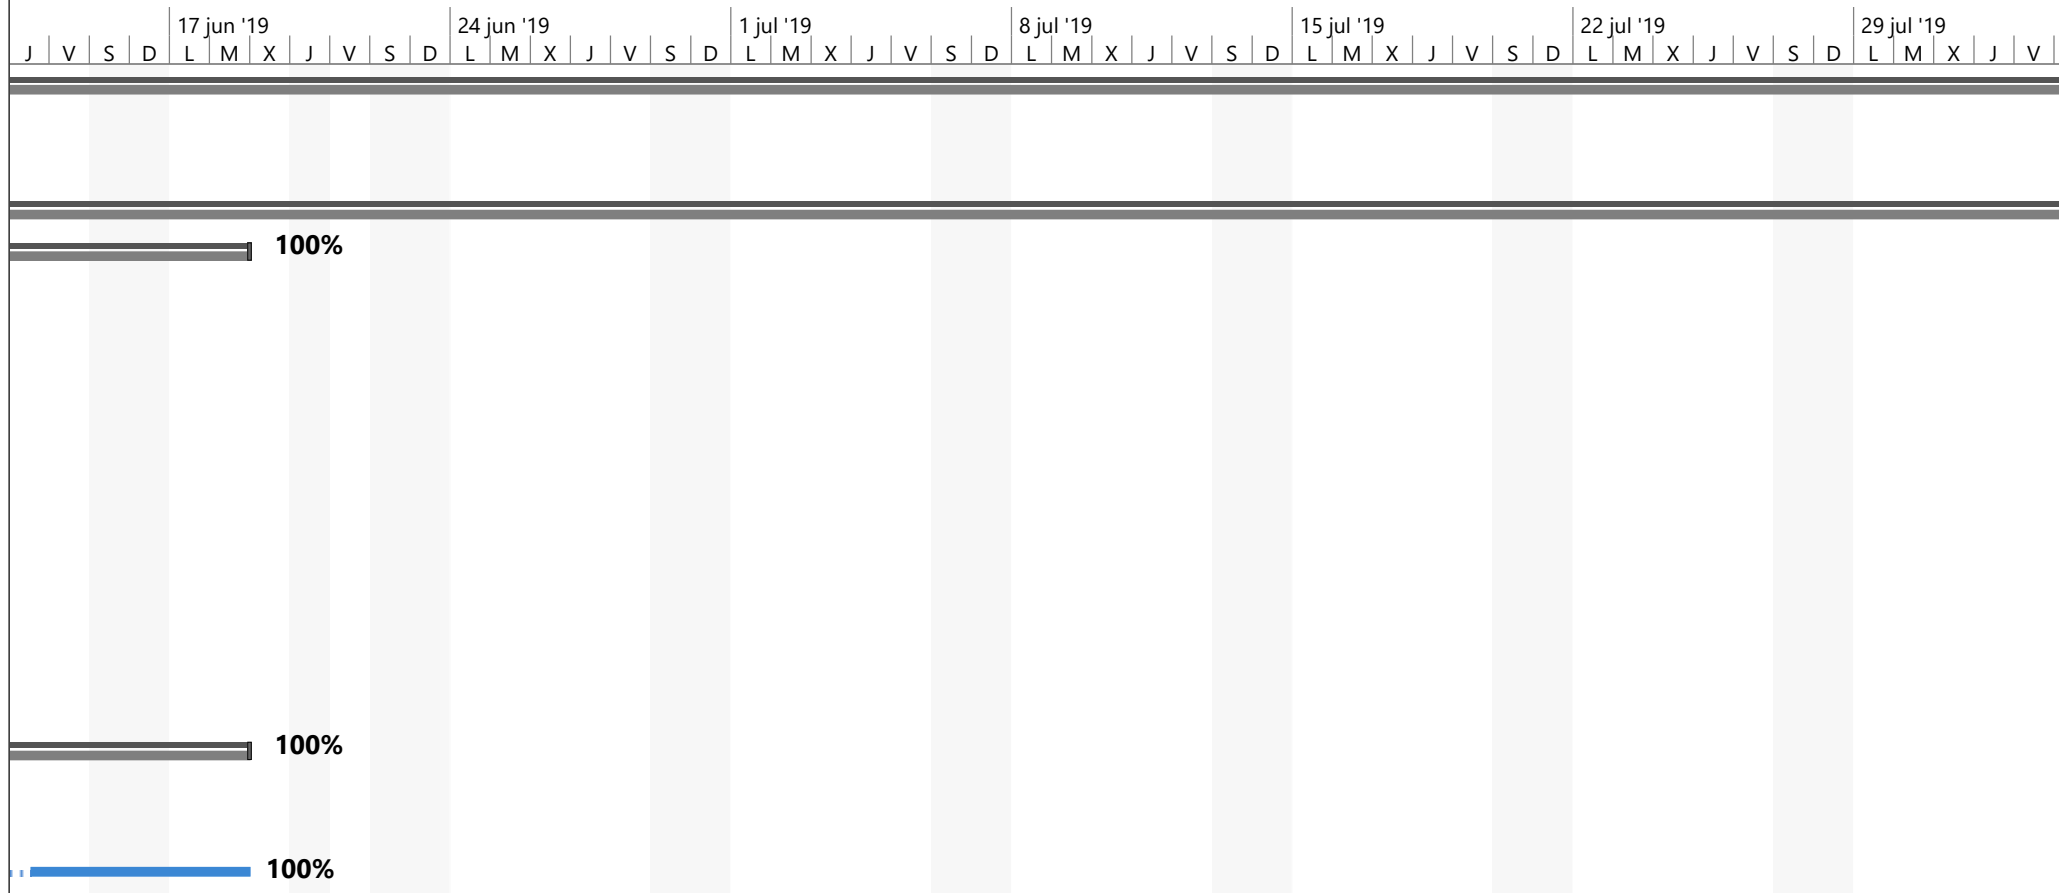


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

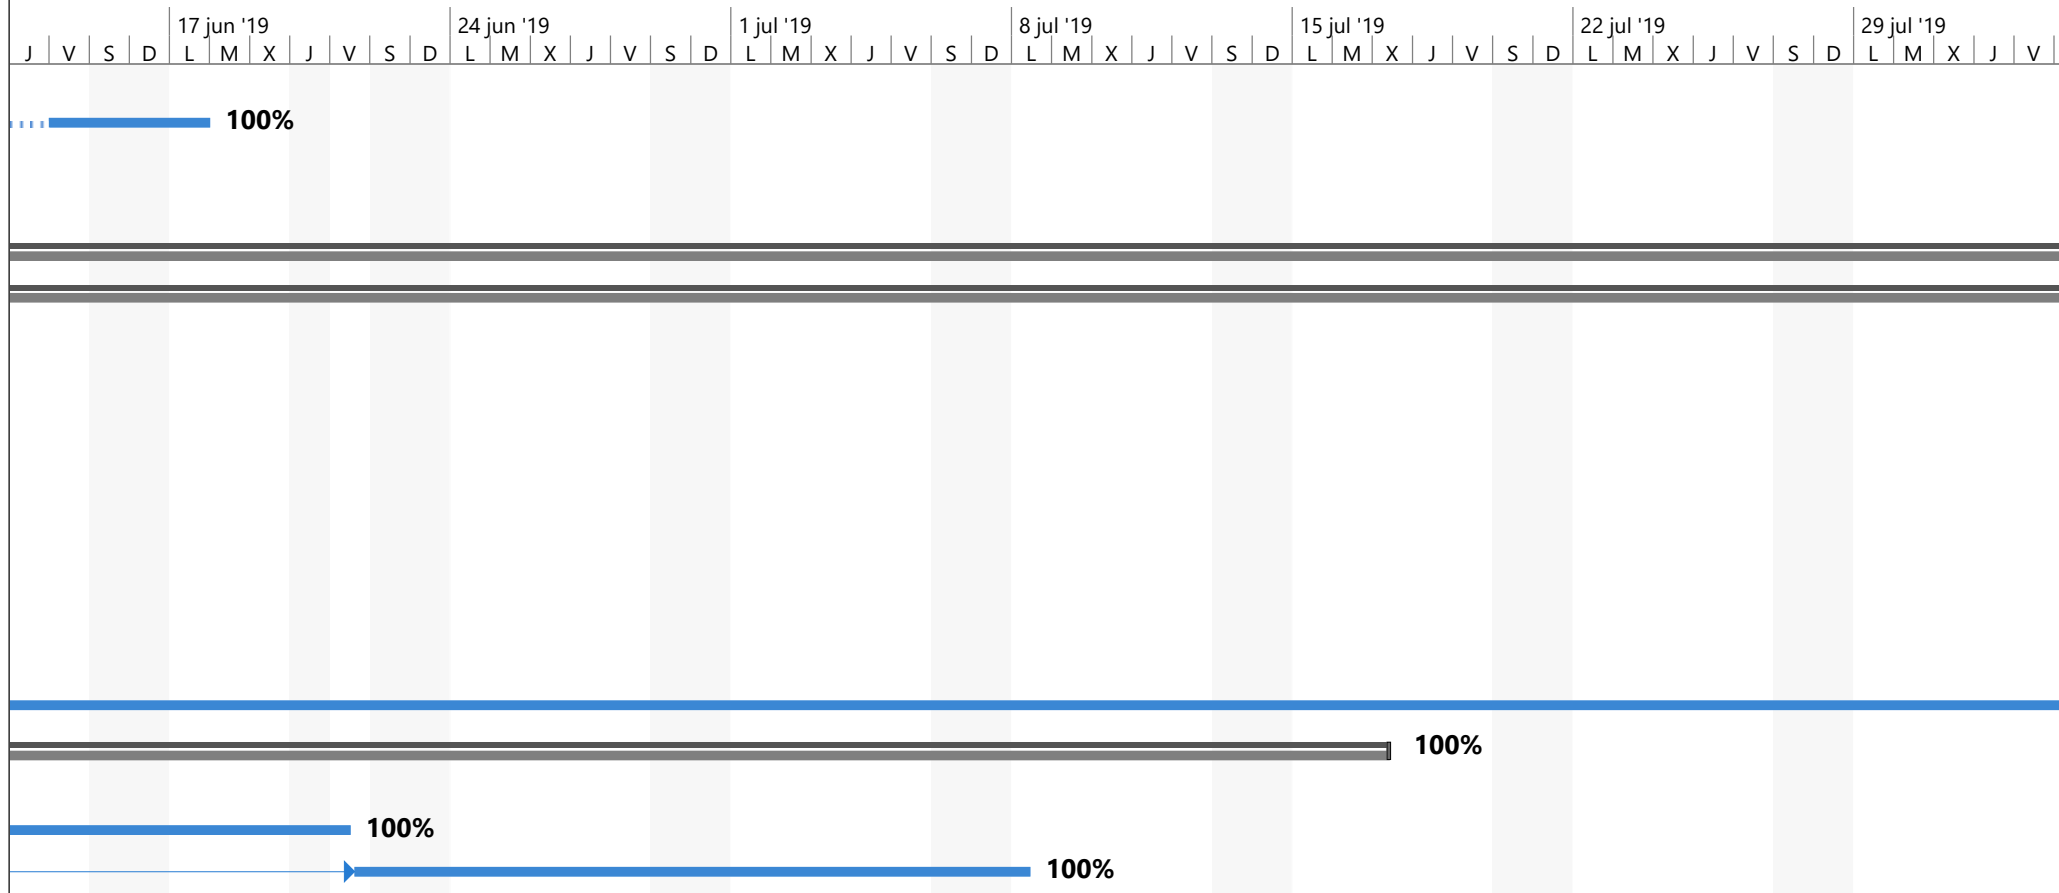

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

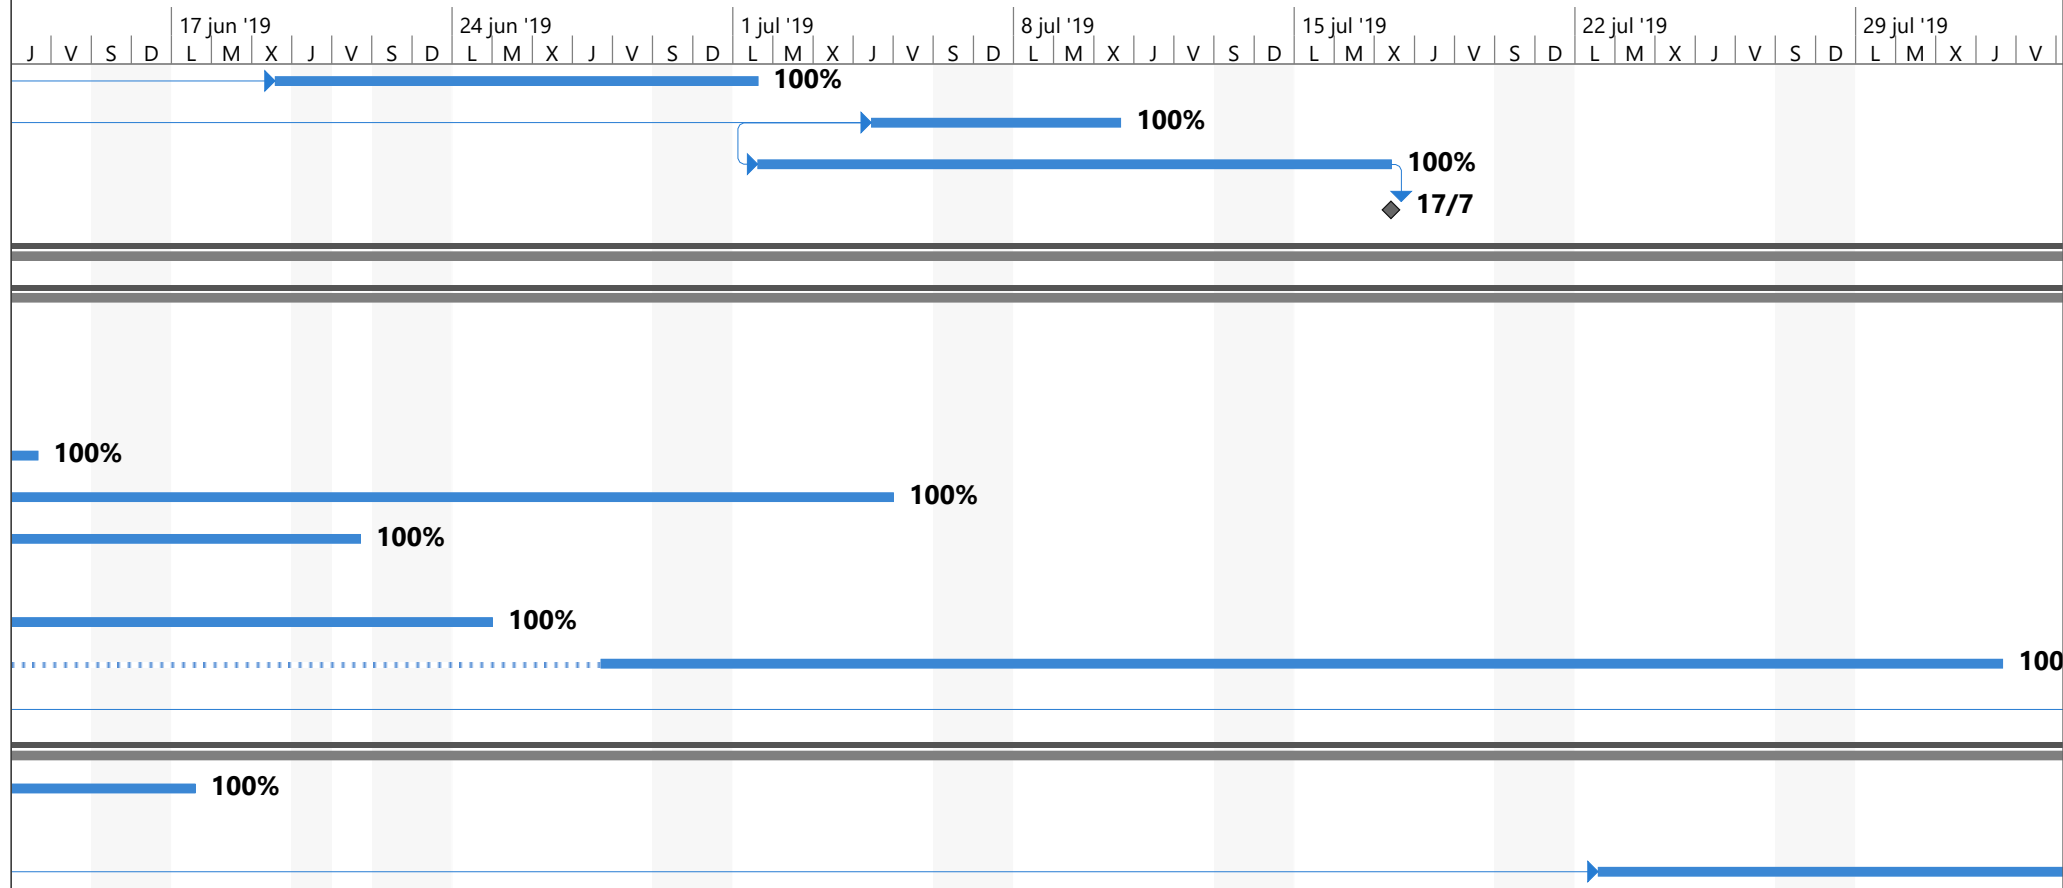


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

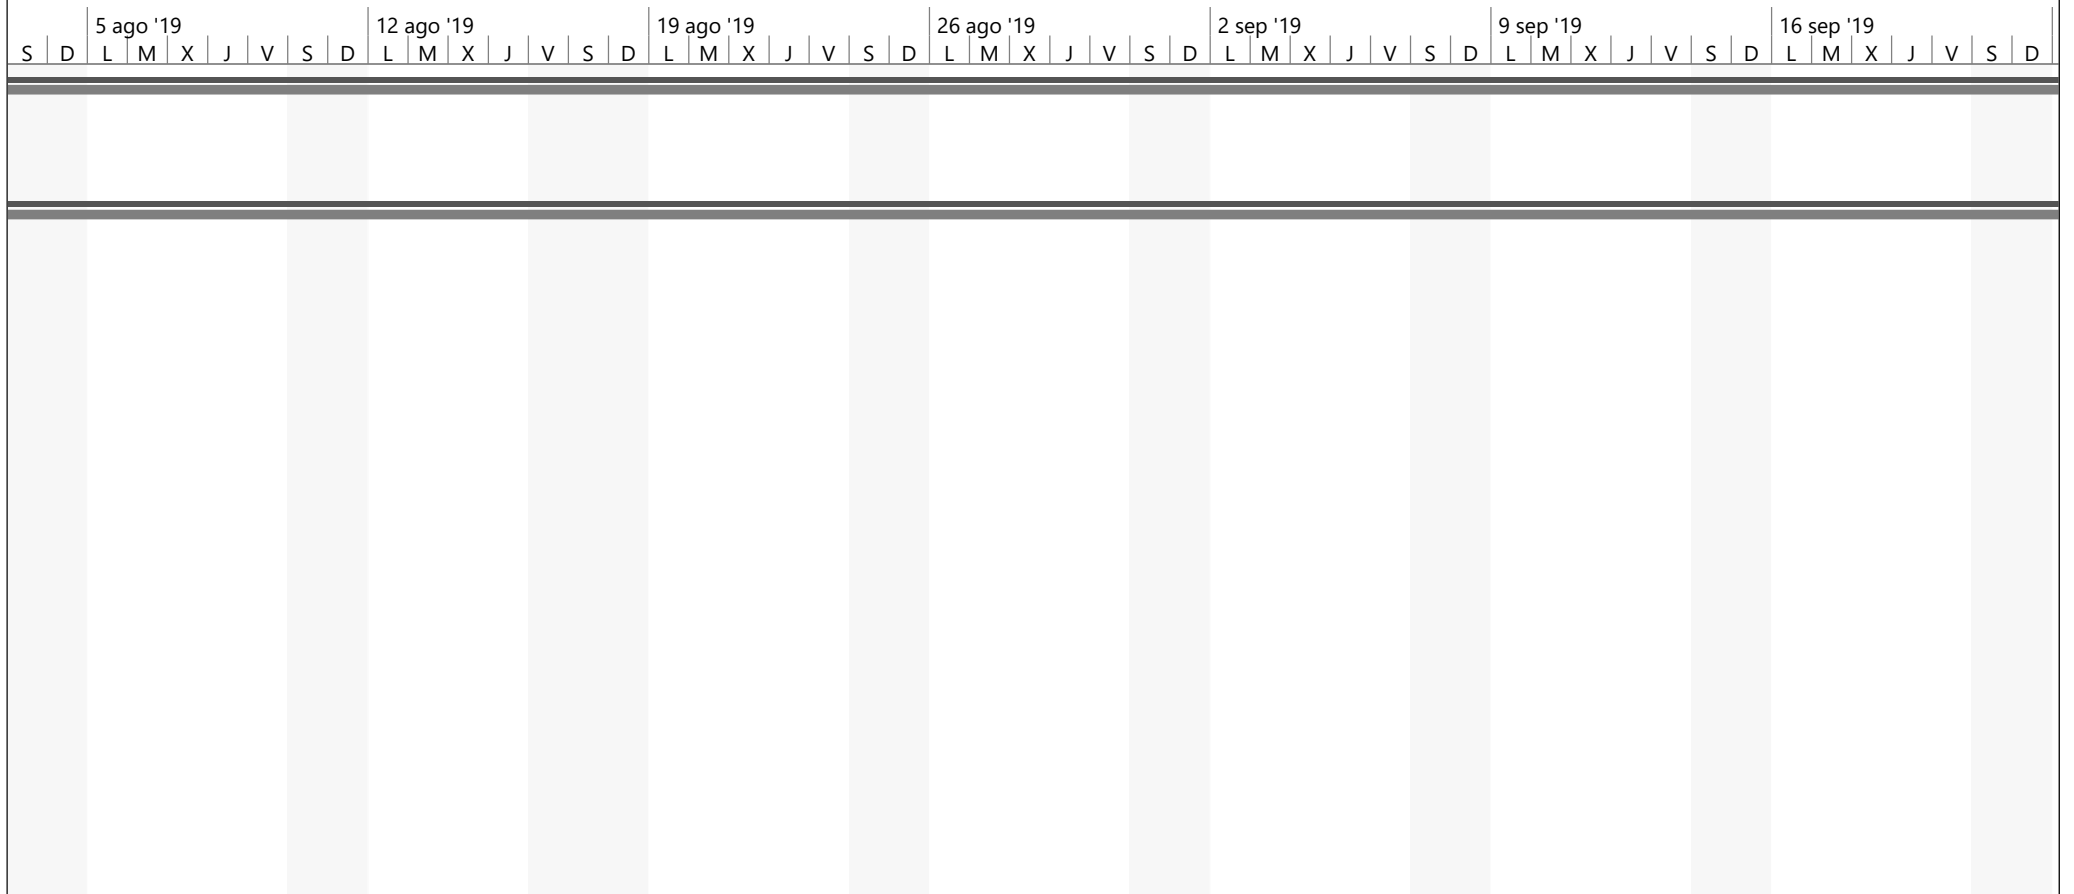


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

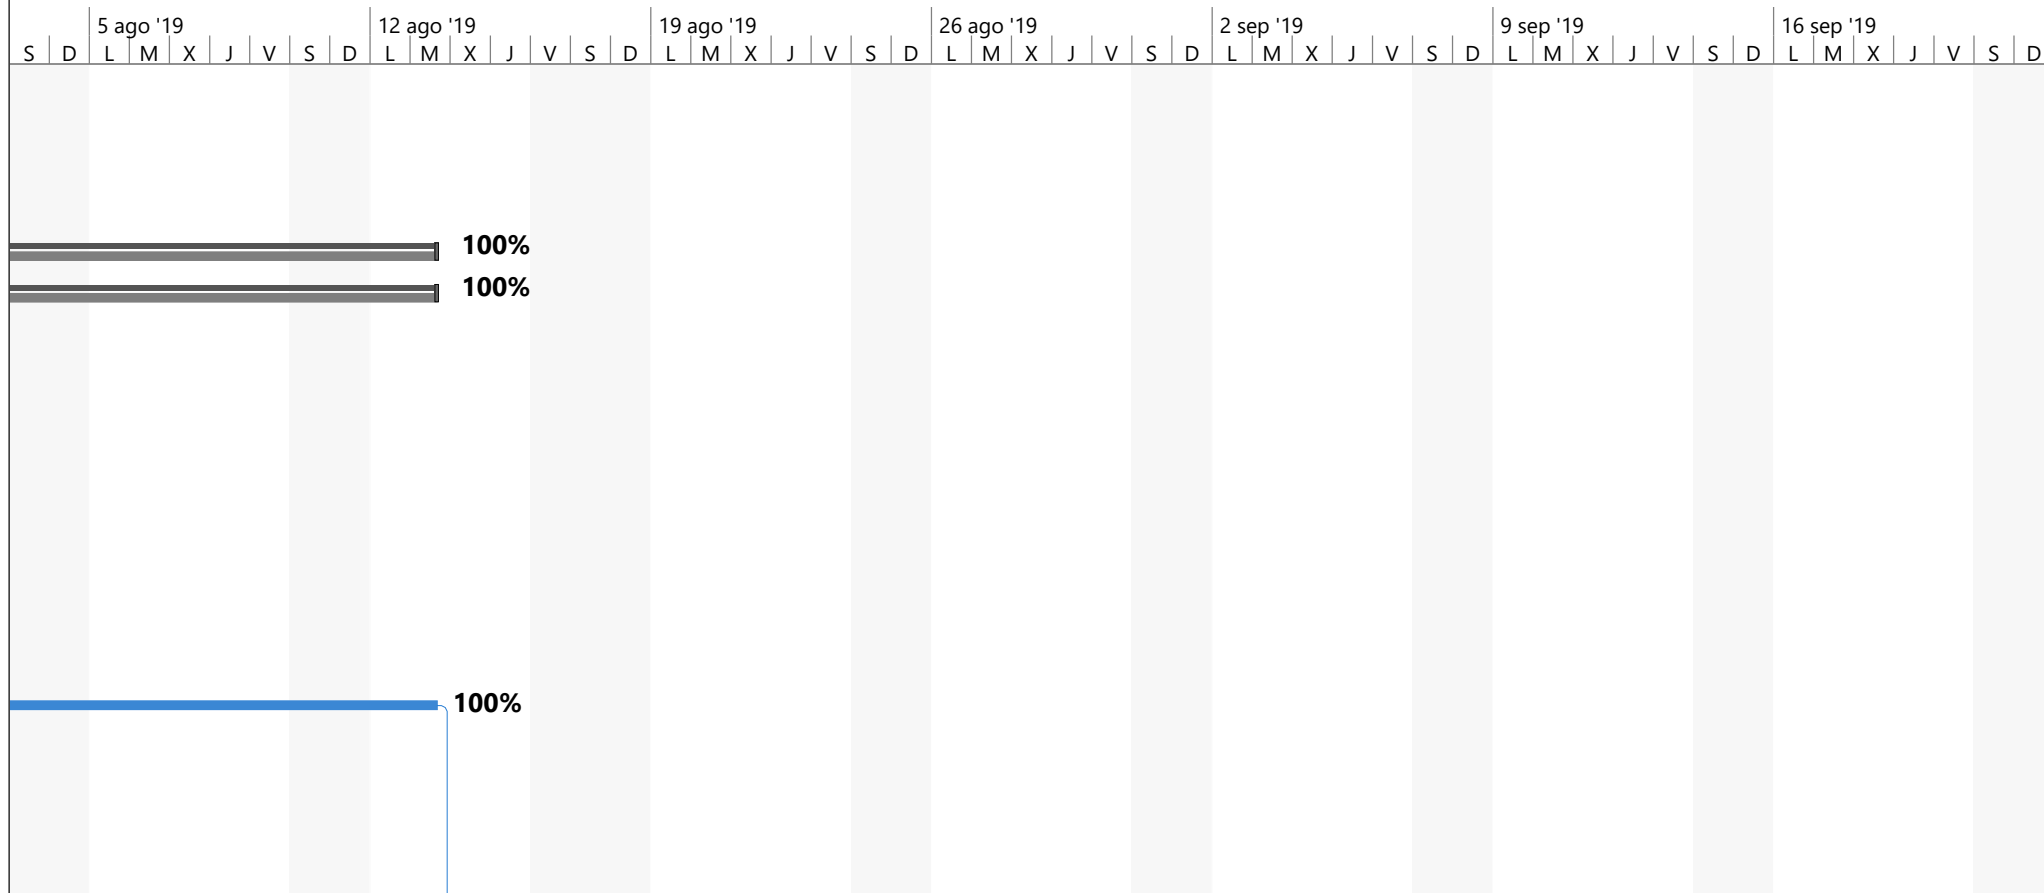


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

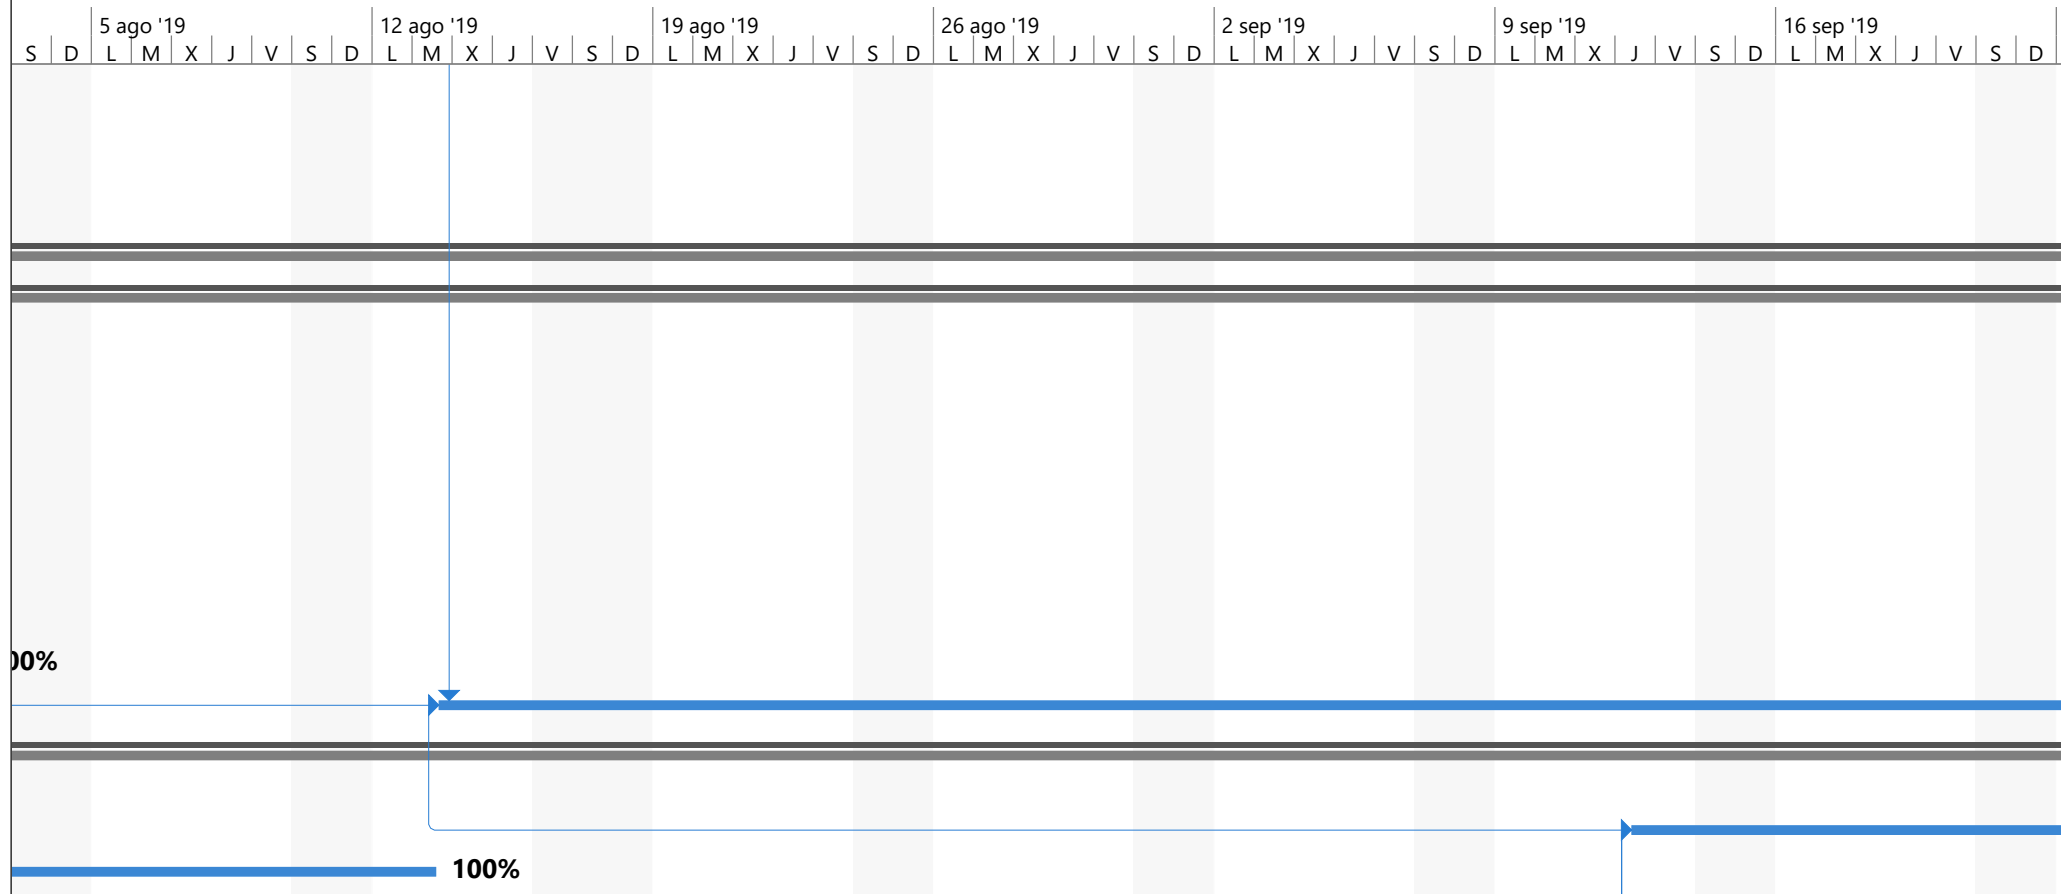

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

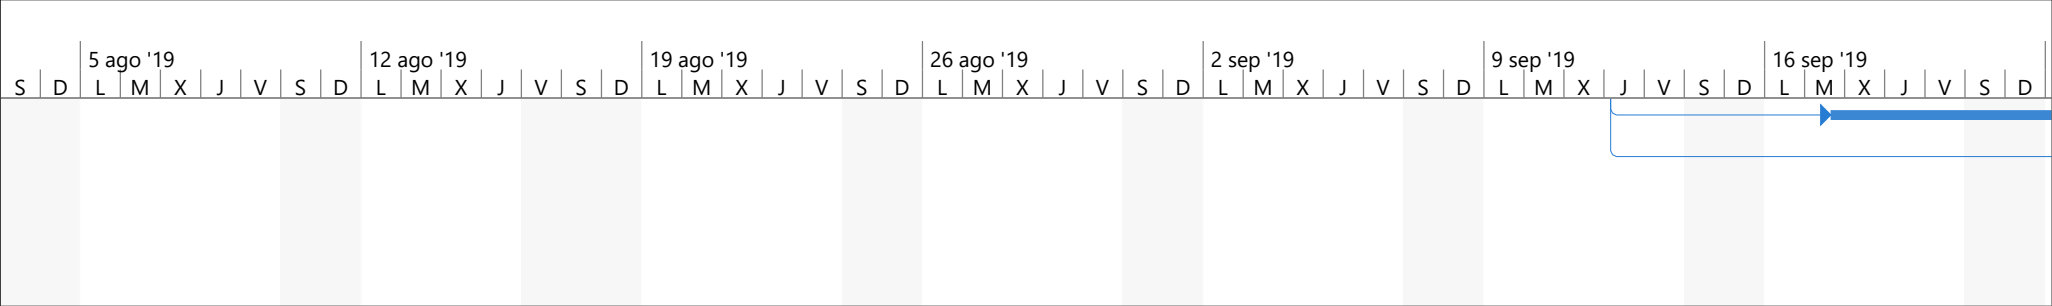

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

23 sep '19 L M X J V S D 30 sep '19 L M X J V S D 7 oct '19 L M X J V S D 14 oct '19 L M X J V S D 21 oct '19 L M X J V S D 28 oct '19 L M X J V S D 4 nov '19 L M X J V S D 11 nov '19 L M

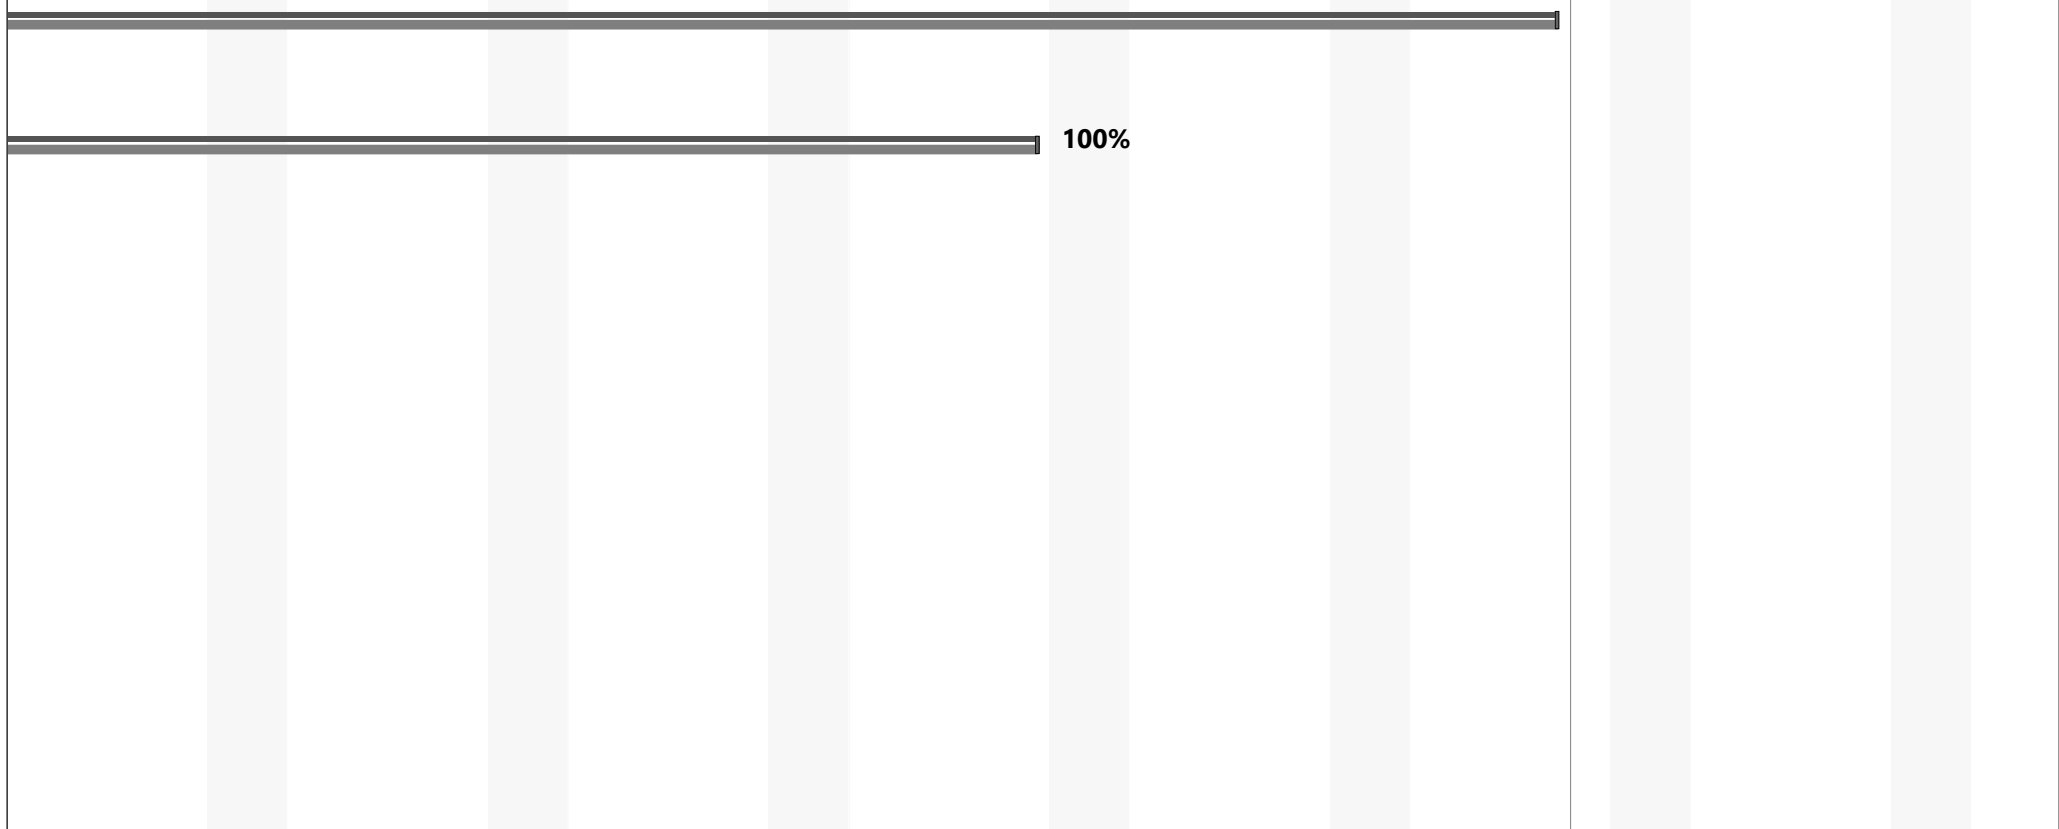


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

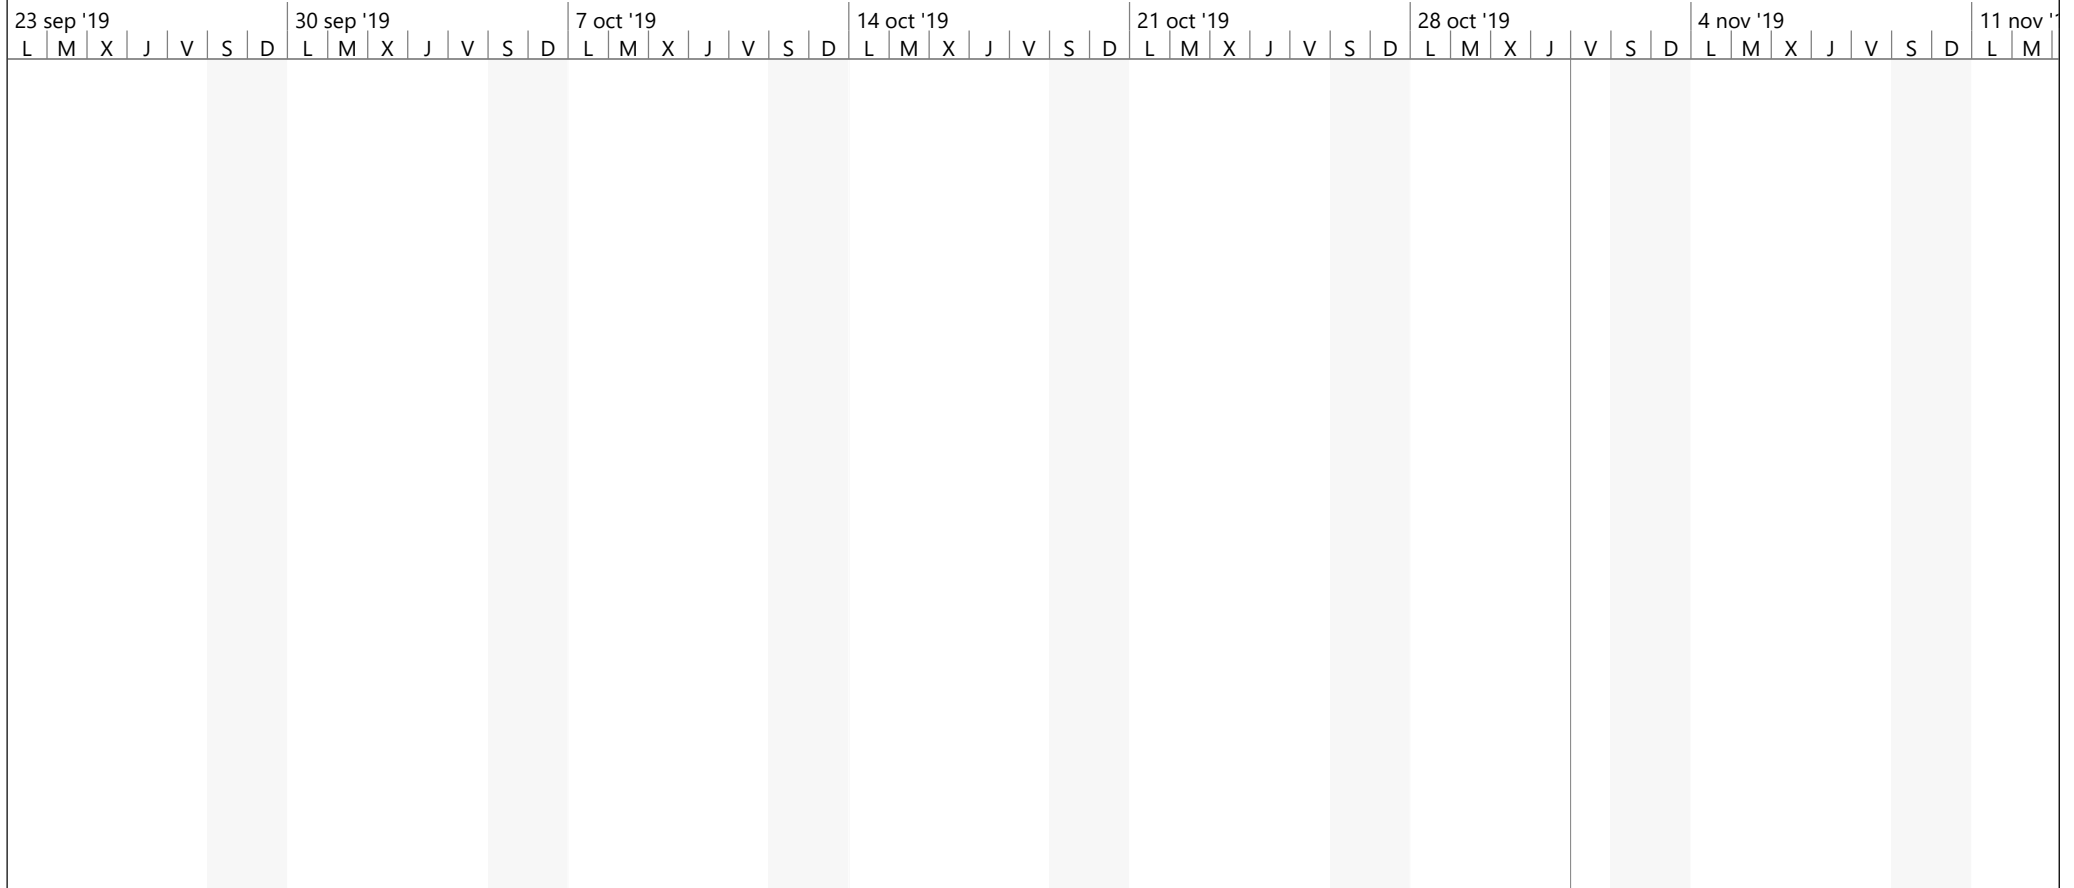


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021

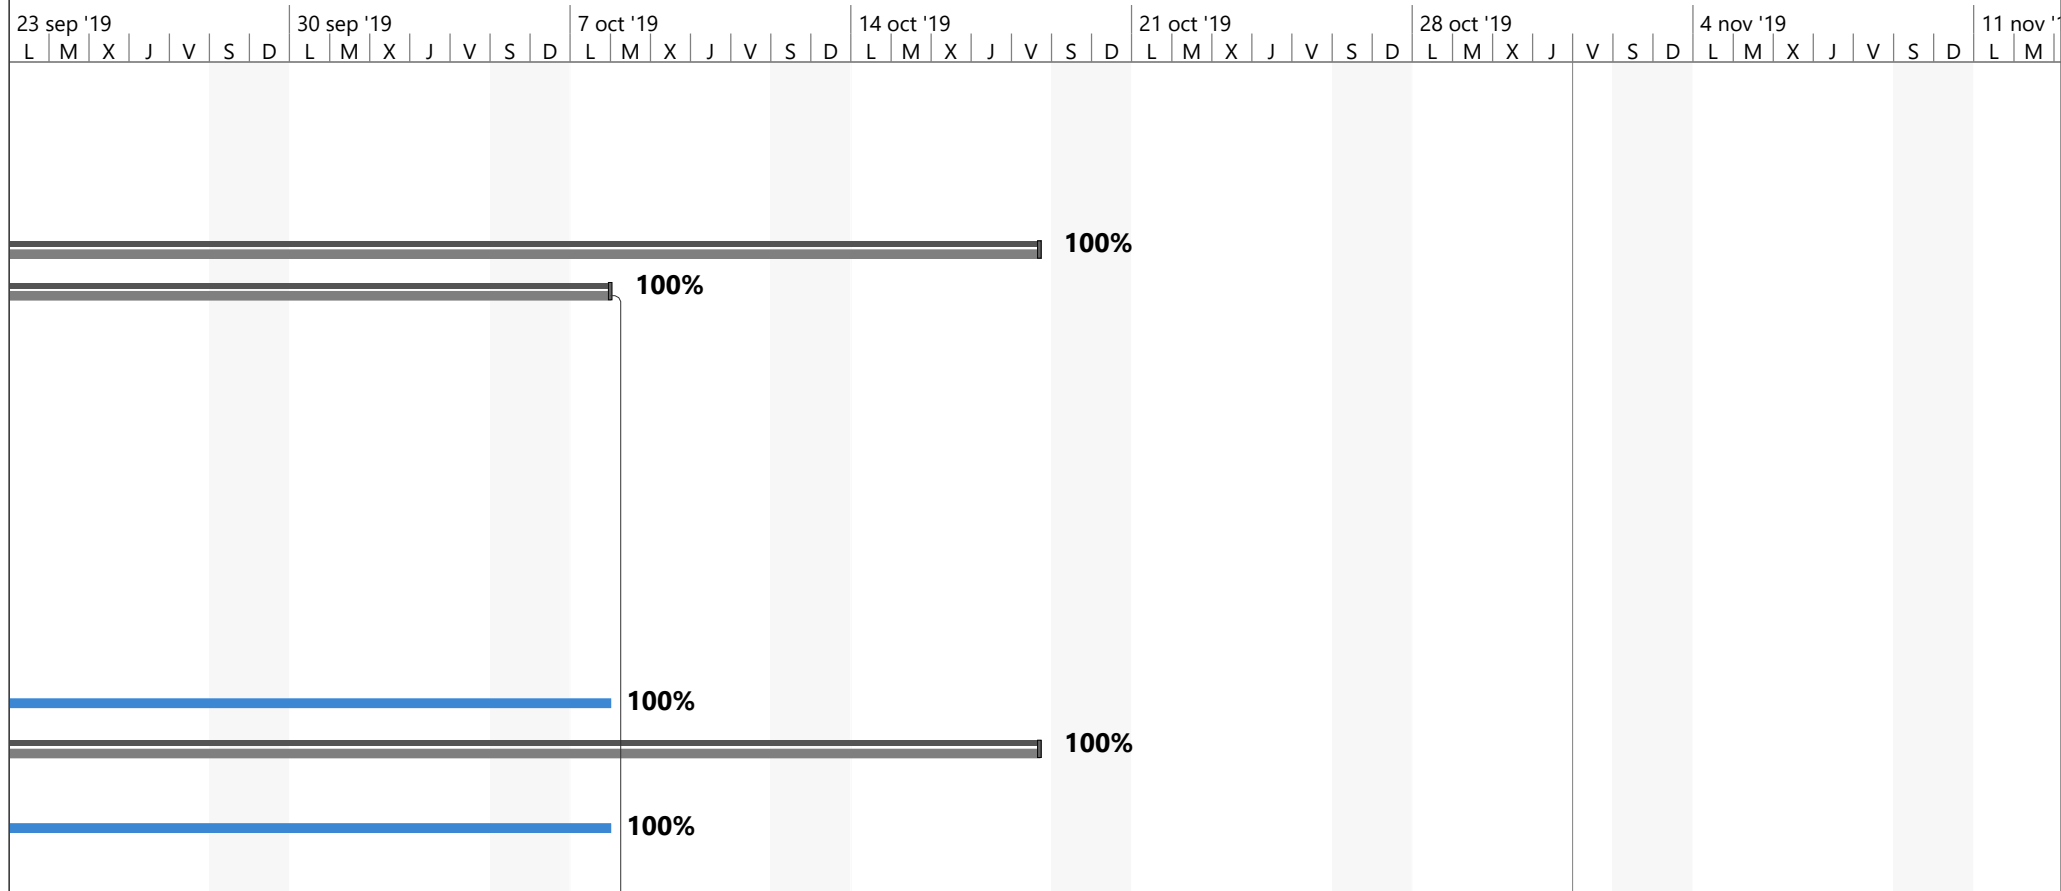

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |




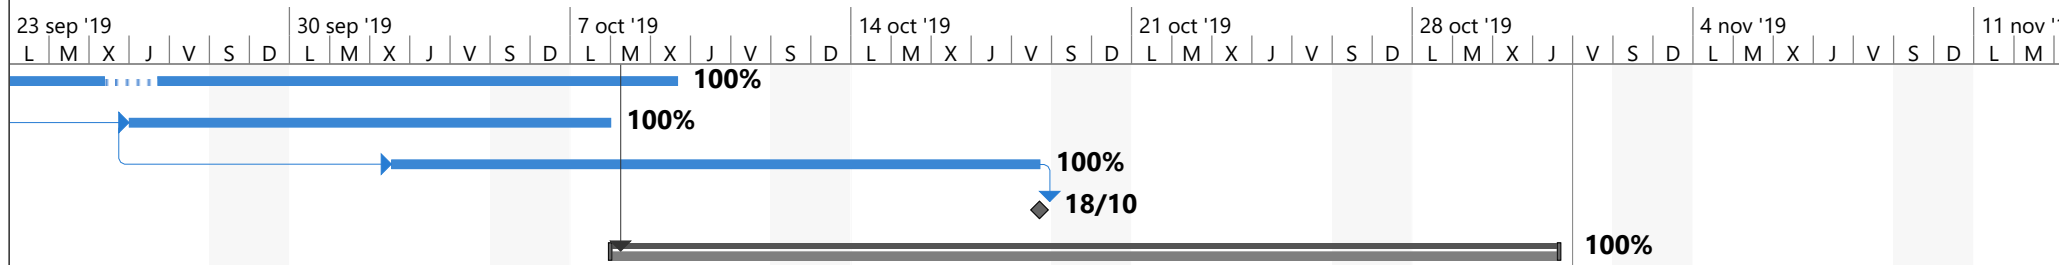




















Calendario de Ejecución CHIV105 Enero2021



Leonel Gabot Bonilla

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
Dirección de Proyectos Financiados
Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
Edenorte Dominicana
F: 809-747-9346
E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do
Síguenos en:    



| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |
