


































































































































| Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|
| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | jun '20 | | | | | | | 6 jul '20 | | | | |
| | | | | | | | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S |
| 0 | |  | Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021 | 338 días | lun 21/9/20 | mié 5/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | |  | Rehabilitación de Redes LOTE 10 | 338 días | lun 21/9/20 | mié 5/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |  | Ejecución | 318 días | lun 21/9/20 | mié 8/12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |  | Polígono 1 | 153 días | lun 21/9/20 | mié 21/4/21 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | Instalación | 153 días | lun 21/9/20 | mié 21/4/21 | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  |  | Excavaciones | 51 días | lun 21/9/20 | lun 30/11/20 | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  |  | Izado de postes | 48 días | mié 23/9/20 | vie 27/11/20 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | |  | Cimentaciones | 13 días | vie 13/11/20 | mar 1/12/20 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | |  | Retenidas | 25 días | jue 29/10/20 | mié 2/12/20 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | |  | Armados MT y BT | 42 días | jue 29/10/20 | vie 25/12/20 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 40 días | jue 12/11/20 | mié 6/1/21 | | | | | | | | | | | | |
| 11 |  |  | Conexiones y Jumpers | 27 días | jue 3/12/20 | vie 8/1/21 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | |  | Puesta a Tierra | 27 días | jue 3/12/20 | vie 8/1/21 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | |  | Transformadores | 19 días | vie 25/12/20 | mié 20/1/21 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | |  | Alumbrado Público | 23 días | lun 28/12/20 | mié 27/1/21 | | | | | | | | | | | | |
| 15 |  |  | Acometida | 75 días | mar 5/1/21 | lun 19/4/21 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | |  | Finalizacion del Poligono 1 | 2 días | mar 20/4/21 | mié 21/4/21 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | |  | Remoción | 52 días | lun 4/1/21 | mié 17/3/21 | | | | | | | | | | | | |
| 18 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 52 días | lun 4/1/21 | mié 17/3/21 | | | | | | | | | | | | |
| 19 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 52 días | lun 4/1/21 | mié 17/3/21 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual | | |  | | | | | | | | |
| | | | División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto | | |  | | | | | | | | |
| | | | Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas | | |  | | | | | | | | |
| | | | Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo | | |  | | | | | | | | |
| | | | División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva | | |  | | | | | | | | |
| | | | Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo | | |  | | | | | | | | |
| | | | Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo | | |  | | | | | | | | |
| | | | solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite | | |  | | | | | | | | |
| Página 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | un '20 M X J V S D | 6 jul '20 L M X J V S |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 20 |  |  | Transformadores | 52 días | lun 4/1/21 | mié 17/3/21 | | |
| 21 |  |  | Remocion de postes | 52 días | lun 4/1/21 | mié 17/3/21 | | |
| 22 | |  | Polígono 2 | 156 días | mar 1/12/20 | mar 6/7/21 | | |
| 23 | |  | Instalación | 156 días | mar 1/12/20 | mar 6/7/21 | | |
| 24 | |  | Excavaciones | 52 días | mar 1/12/20 | mié 10/2/21 | | |
| 25 | |  | Izado de postes | 48 días | lun 7/12/20 | mié 10/2/21 | | |
| 26 | |  | Cimentaciones | 14 días | mar 26/1/21 | vie 12/2/21 | | |
| 27 | |  | Retenidas | 26 días | vie 8/1/21 | vie 12/2/21 | | |
| 28 | |  | Armados MT y BT | 40 días | lun 28/12/20 | vie 19/2/21 | | |
| 29 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 36 días | jue 7/1/21 | jue 25/2/21 | | |
| 30 | |  | Conexiones y Jumpers | 22 días | lun 1/2/21 | mar 2/3/21 | | |
| 31 | |  | Puesta a Tierra | 22 días | lun 1/2/21 | mar 2/3/21 | | |
| 32 | |  | Transformadores | 18 días | jue 11/2/21 | lun 8/3/21 | | |
| 33 | |  | Alumbrado Público | 31 días | jue 18/2/21 | jue 1/4/21 | | |
| 34 |  |  | Acometida | 55 días | mar 20/4/21 | lun 5/7/21 | | |
| 35 | |  | Finalizacion del Poligono 2 | 1 día | mar 6/7/21 | mar 6/7/21 | | |
| 36 | |  | Remoción | 50 días | mié 17/3/21 | mié 26/5/21 | | |
| 37 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 50 días | mié 17/3/21 | mié 26/5/21 | | |
| 38 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 50 días | mié 17/3/21 | mié 26/5/21 | | |
| 39 |  |  | Transformadores | 50 días | mié 17/3/21 | mié 26/5/21 | | |






| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | un '20 | 6 jul '20 |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | M X J V S D | L M X J V S |
| 40 |  |  | Remocion de postes | 50 días | mié 17/3/21 | mié 26/5/21 | | |
| 41 | |  | Polígono 3 | 124 días | jue 11/2/21 | mar 3/8/21 | | |
| 42 | |  | Instalación | 124 días | jue 11/2/21 | mar 3/8/21 | | |
| 43 | |  | Excavaciones | 17 días | jue 11/2/21 | vie 5/3/21 | | |
| 44 | |  | Izado de postes | 16 días | lun 15/2/21 | lun 8/3/21 | | |
| 45 | |  | Cimentaciones | 5 días | jue 4/3/21 | mié 10/3/21 | | |
| 46 | |  | Retenidas | 9 días | mar 2/3/21 | vie 12/3/21 | | |
| 47 | |  | Armados MT y BT | 14 días | lun 22/2/21 | jue 11/3/21 | | |
| 48 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 15 días | vie 5/3/21 | jue 25/3/21 | | |
| 49 | |  | Conexiones y Jumpers | 9 días | mié 24/3/21 | lun 5/4/21 | | |
| 50 | |  | Puesta a Tierra | 6 días | mié 24/3/21 | mié 31/3/21 | | |
| 51 | |  | Transformadores | 5 días | mar 6/4/21 | lun 12/4/21 | | |
| 52 | |  | Alumbrado Público | 10 días | vie 2/4/21 | jue 15/4/21 | | |
| 53 | |  | Acometida | 20 días | mar 6/7/21 | lun 2/8/21 | | |
| 54 |  |  | Finalizacion del Poligono 3 | 1 día | mar 3/8/21 | mar 3/8/21 | | |
| 55 | |  | Remoción | 15 días | mié 26/5/21 | mié 16/6/21 | | |
| 56 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 15 días | mié 26/5/21 | mié 16/6/21 | | |
| 57 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 15 días | mié 26/5/21 | mié 16/6/21 | | |
| 58 |  |  | Transformadores | 15 días | mié 26/5/21 | mié 16/6/21 | | |
| 59 |  |  | Remocion de postes | 15 días | mié 26/5/21 | mié 16/6/21 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | jun '20 | 7 jul '20 |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | M X J V S D | L M X J V S |
| 60 | |  | Polígono 4 | 148 días | lun 8/3/21 | mié 29/9/21 | | |
| 61 | |  | Instalación | 148 días | lun 8/3/21 | mié 29/9/21 | | |
| 62 | |  | Excavaciones | 16 días | lun 8/3/21 | lun 29/3/21 | | |
| 63 | |  | Izado de postes | 14 días | mar 9/3/21 | vie 26/3/21 | | |
| 64 | |  | Cimentaciones | 10 días | mié 17/3/21 | mar 30/3/21 | | |
| 65 | |  | Retenidas | 9 días | lun 22/3/21 | jue 1/4/21 | | |
| 66 | |  | Armados MT y BT | 13 días | vie 12/3/21 | mar 30/3/21 | | |
| 67 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 19 días | vie 2/4/21 | mié 28/4/21 | | |
| 68 | |  | Conexiones y Jumpers | 10 días | mar 20/4/21 | lun 3/5/21 | | |
| 69 | |  | Puesta a Tierra | 10 días | jue 22/4/21 | mié 5/5/21 | | |
| 70 | |  | Transformadores | 7 días | mar 4/5/21 | mié 12/5/21 | | |
| 71 | |  | Alumbrado Público | 9 días | vie 7/5/21 | mié 19/5/21 | | |
| 72 |  |  | Totalizadores | 4 días | jue 13/5/21 | mar 18/5/21 | | |
| 73 | |  | Acometida | 40 días | mar 3/8/21 | lun 27/9/21 | | |
| 74 | |  | Finalizacion del Poligono 4 | 2 días | mar 28/9/21 | mié 29/9/21 | | |
| 75 | |  | Remoción | 40 días | mar 3/8/21 | lun 27/9/21 | | |
| 76 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 40 días | mar 3/8/21 | lun 27/9/21 | | |
| 77 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 40 días | mar 3/8/21 | lun 27/9/21 | | |
| 78 |  |  | Transformadores | 40 días | mar 3/8/21 | lun 27/9/21 | | |
| 79 |  |  | Remocion de postes | 40 días | mar 3/8/21 | lun 27/9/21 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | un '20 M X J V S D | 6 jul '20 L M X J V S |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 80 | |  | Polígono 5 | 183 días | lun 29/3/21 | mié 8/12/21 | | |
| 81 | |  | Instalación | 183 días | lun 29/3/21 | mié 8/12/21 | | |
| 82 | |  | Excavaciones | 26 días | mar 30/3/21 | mar 4/5/21 | | |
| 83 | |  | Izado de postes | 24 días | lun 29/3/21 | jue 29/4/21 | | |
| 84 | |  | Cimentaciones | 13 días | jue 15/4/21 | lun 3/5/21 | | |
| 85 | |  | Retenidas | 14 días | vie 23/4/21 | mié 12/5/21 | | |
| 86 | |  | Armados MT y BT | 21 días | mié 14/4/21 | mié 12/5/21 | | |
| 87 | |  | Tendido de Conductor MT y BT | 27 días | jue 29/4/21 | vie 4/6/21 | | |
| 88 | |  | Conexiones y Jumpers | 15 días | jue 20/5/21 | mié 9/6/21 | | |
| 89 | |  | Puesta a Tierra | 15 días | lun 24/5/21 | vie 11/6/21 | | |
| 90 | |  | Transformadores | 13 días | jue 3/6/21 | lun 21/6/21 | | |
| 91 | |  | Alumbrado Público | 15 días | jue 10/6/21 | mié 30/6/21 | | |
| 92 | |  | Acometida | 50 días | mar 28/9/21 | lun 6/12/21 | | |
| 93 | |  | Finalizacion del Poligono 5 | 2 días | mar 7/12/21 | mié 8/12/21 | | |
| 94 | |  | Remoción | 50 días | mar 7/9/21 | lun 15/11/21 | | |
| 95 |  |  | Tendido de Media y Baja Tensión | 50 días | mar 28/9/21 | lun 6/12/21 | | |
| 96 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión | 50 días | mar 28/9/21 | lun 6/12/21 | | |
| 97 |  |  | Transformadores | 50 días | mar 28/9/21 | lun 6/12/21 | | |
| 98 |  |  | Remocion de postes | 50 días | mar 28/9/21 | lun 6/12/21 | | |
| 99 | |  | Cierre de Obras | 20 días | jue 9/12/21 | mié 5/1/22 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021


[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

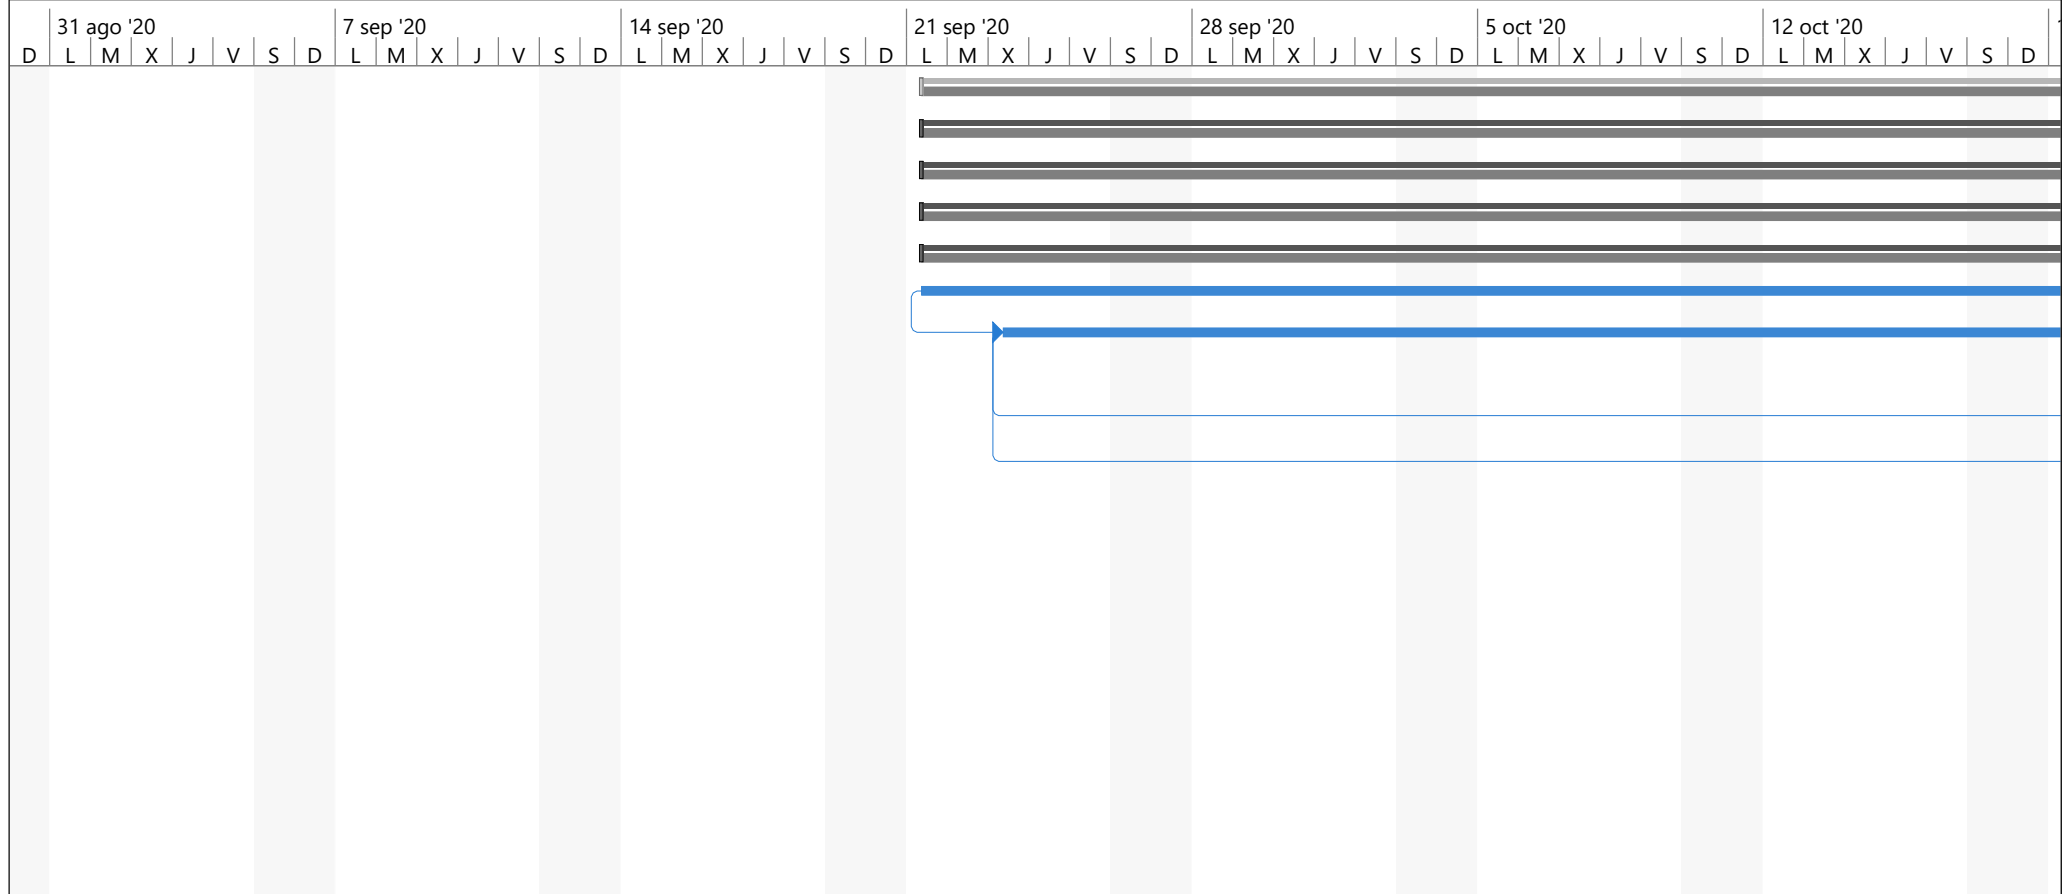

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| 31 ago '20 | | | | | | | 7 sep '20 | | | | | | | 14 sep '20 | | | | | | | 21 sep '20 | | | | | | | 28 sep '20 | | | | | | | 5 oct '20 | | | | | | | 12 oct '20 | | | | | | | 19 oct '20 | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

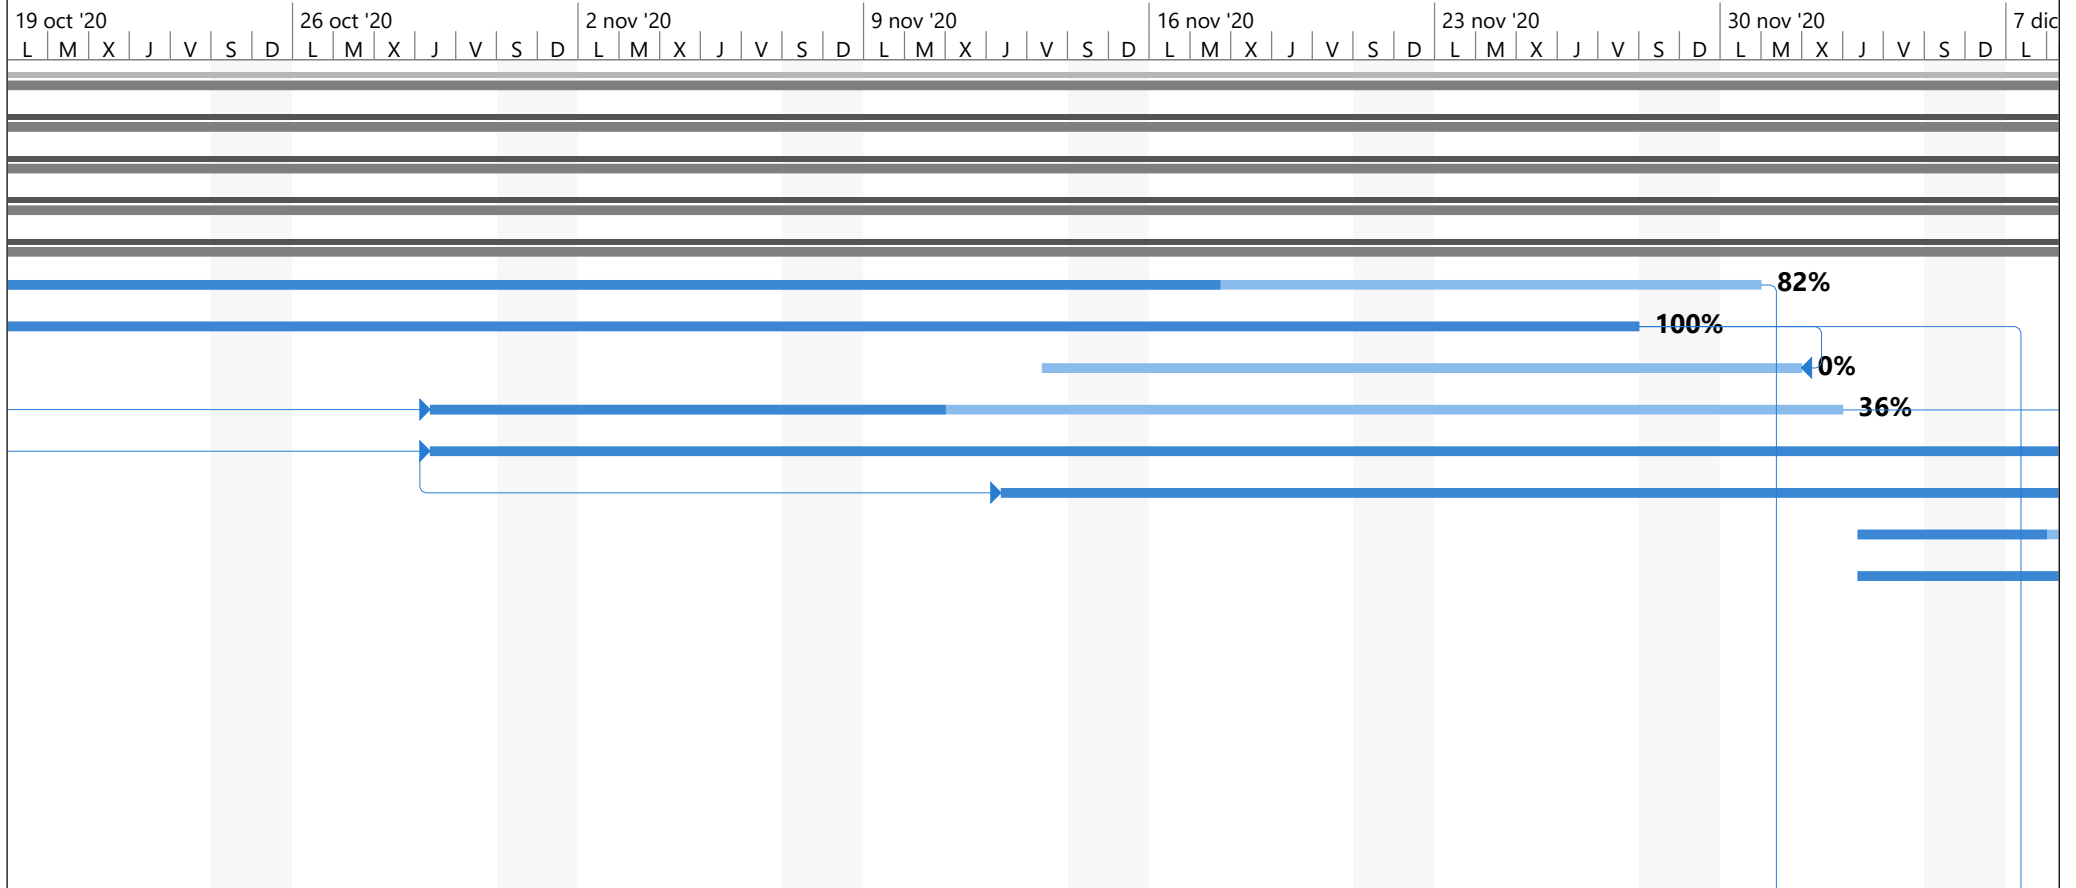

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| 19 oct '20 | | | | | | | 26 oct '20 | | | | | | | 2 nov '20 | | | | | | | 9 nov '20 | | | | | | | 16 nov '20 | | | | | | | 23 nov '20 | | | | | | | 30 nov '20 | | | | | | | 7 dic |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| 19 oct '20 | | | | | | | 26 oct '20 | | | | | | | 2 nov '20 | | | | | | | 9 nov '20 | | | | | | | 16 nov '20 | | | | | | | 23 nov '20 | | | | | | | 30 nov '20 | | | | | | | 7 dic |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| 19 oct '20 | | | | | | | 26 oct '20 | | | | | | | 2 nov '20 | | | | | | | 9 nov '20 | | | | | | | 16 nov '20 | | | | | | | 23 nov '20 | | | | | | | 30 nov '20 | | | | | | | 7 dic |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

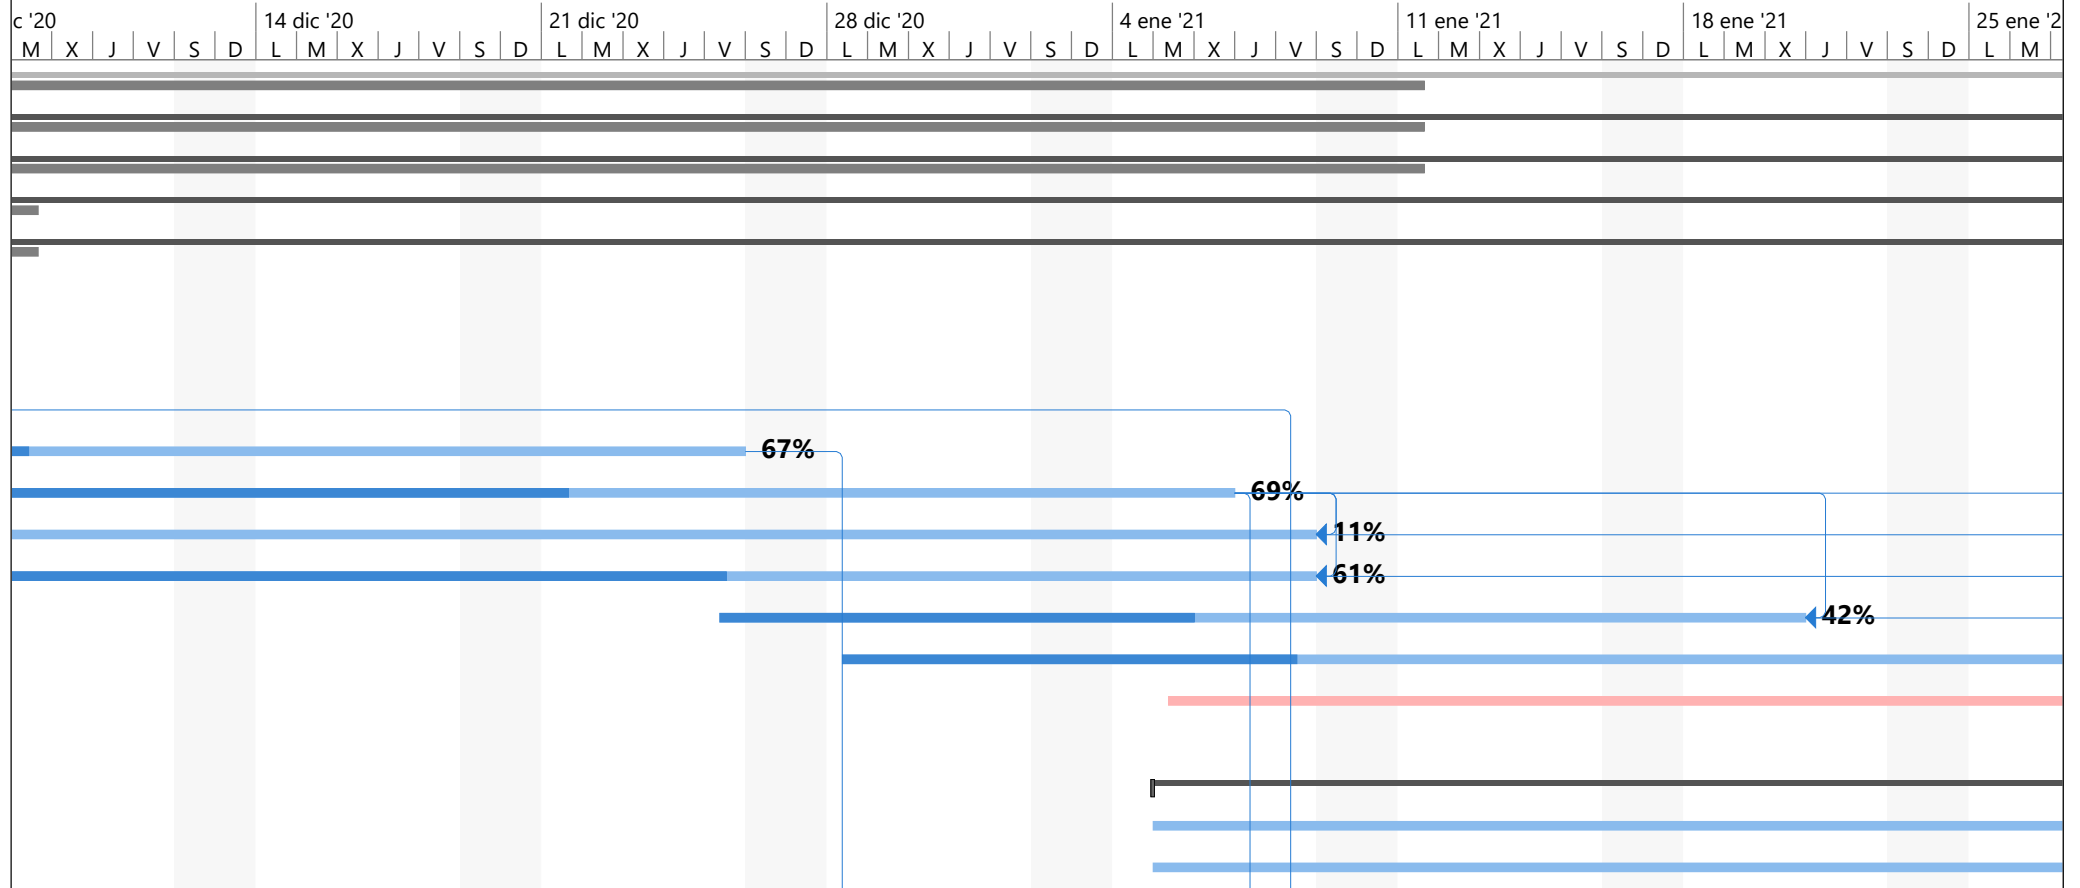

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

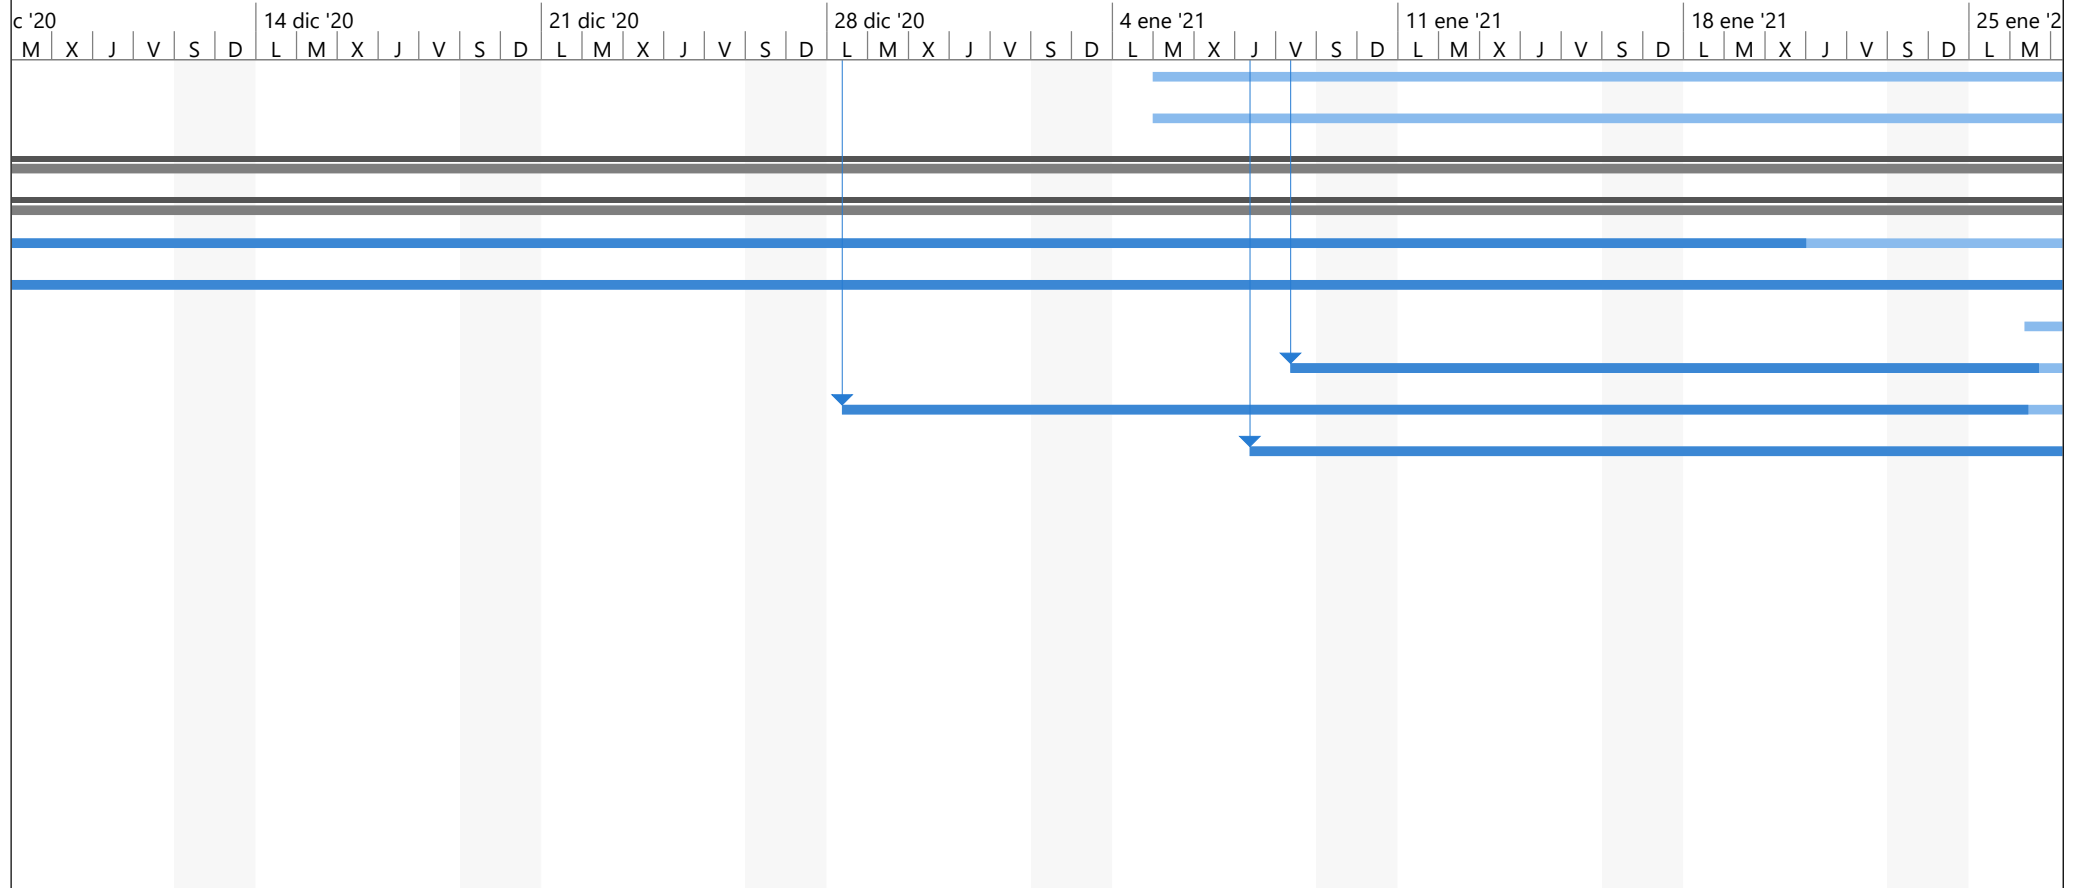

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]

























| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| c '20 | | 14 dic '20 | | | | | 21 dic '20 | | | | | 28 dic '20 | | | | | 4 ene '21 | | | | | 11 ene '21 | | | | | 18 ene '21 | | | | | 25 ene '2 | | | |
|-------|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

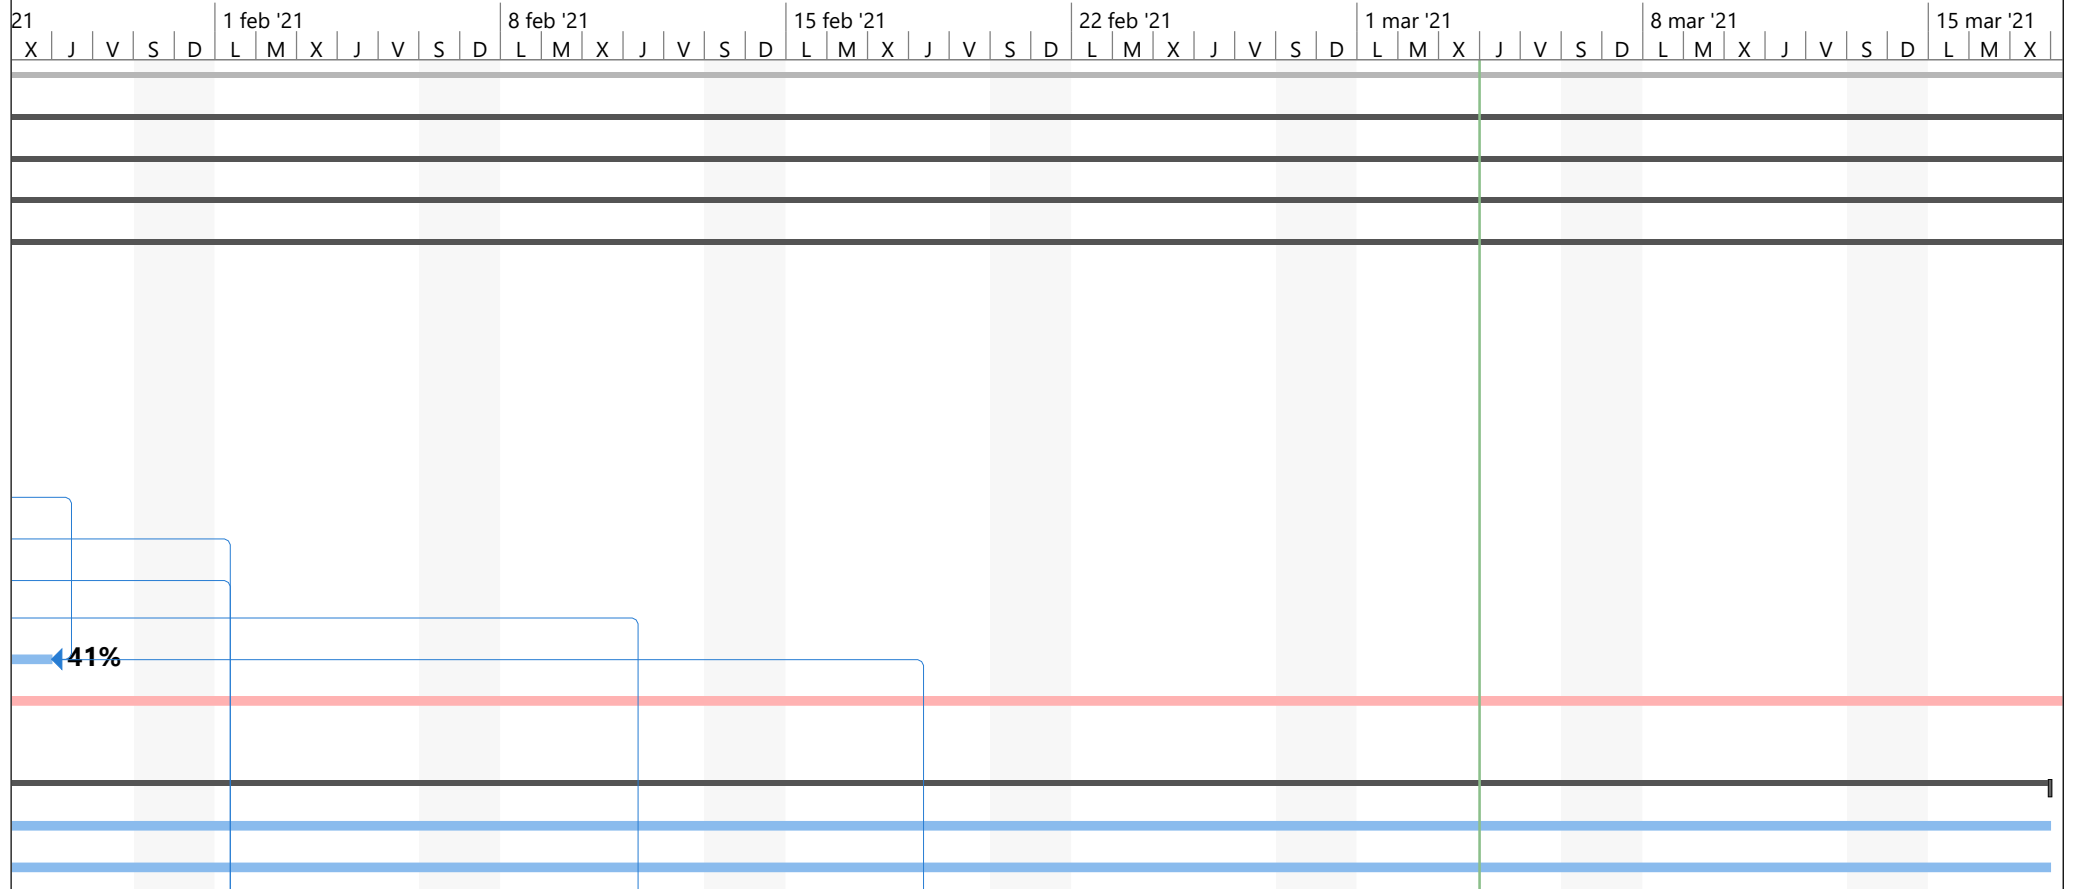


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

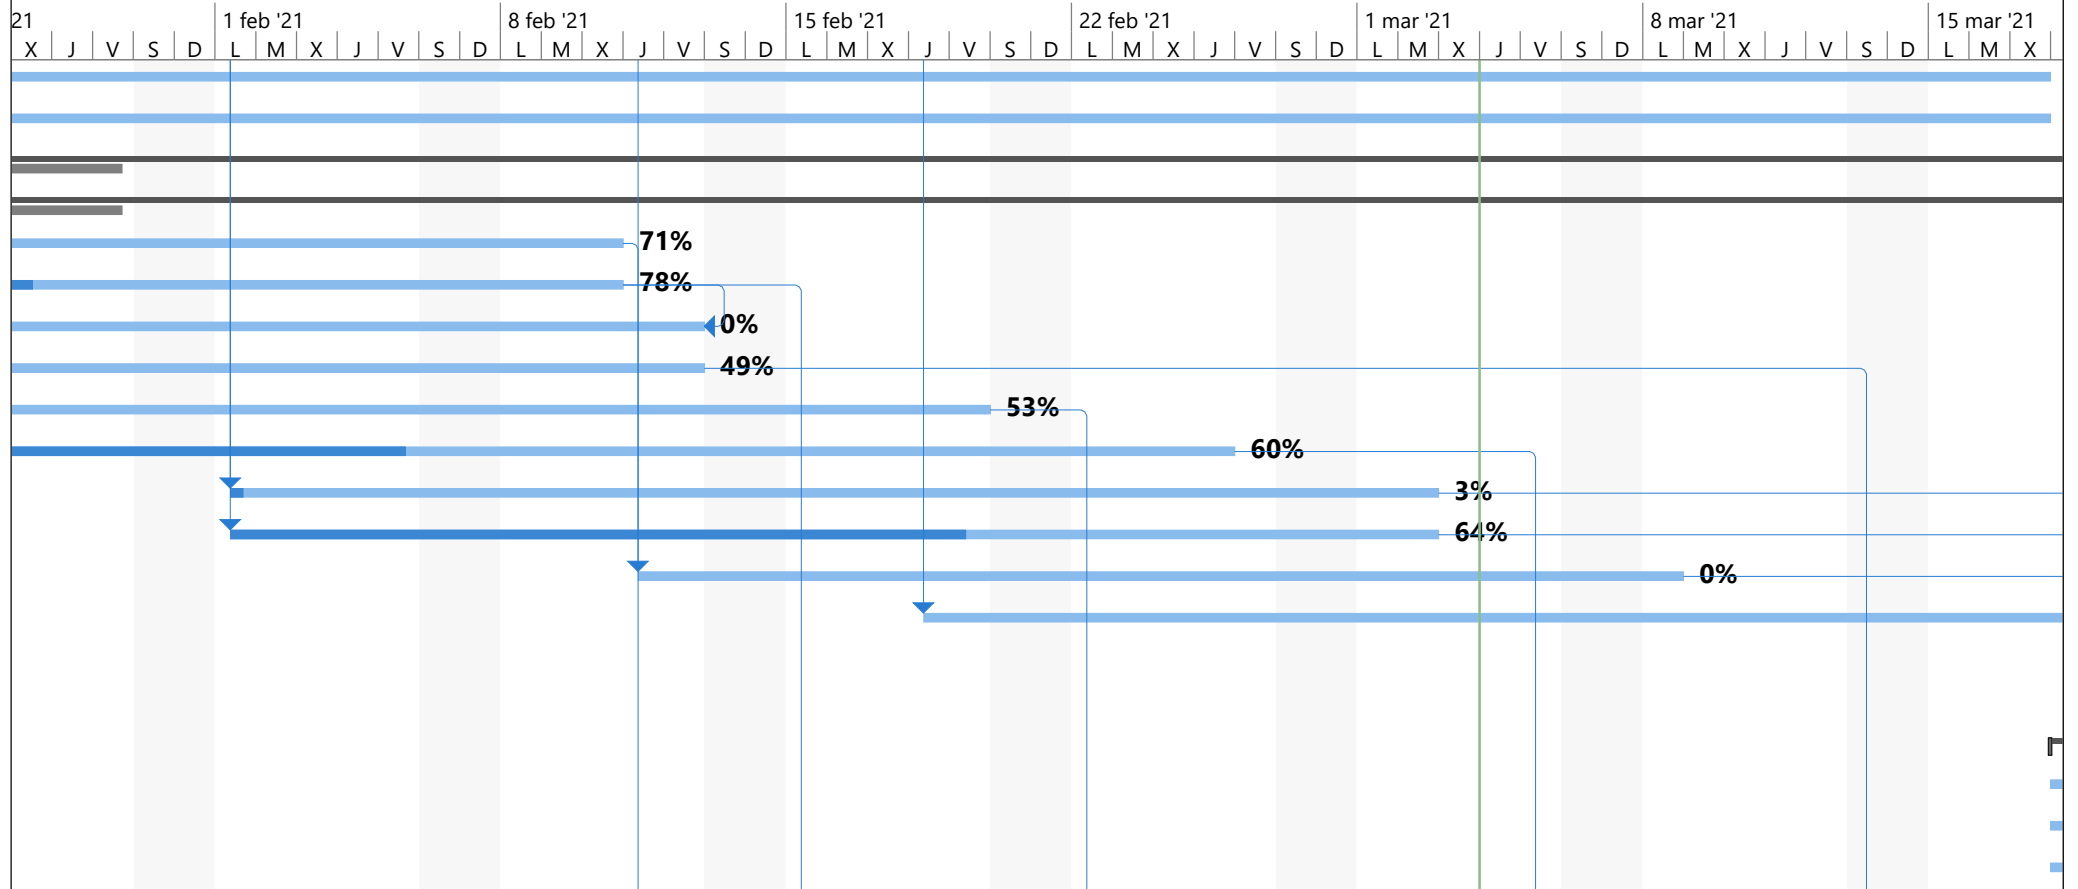





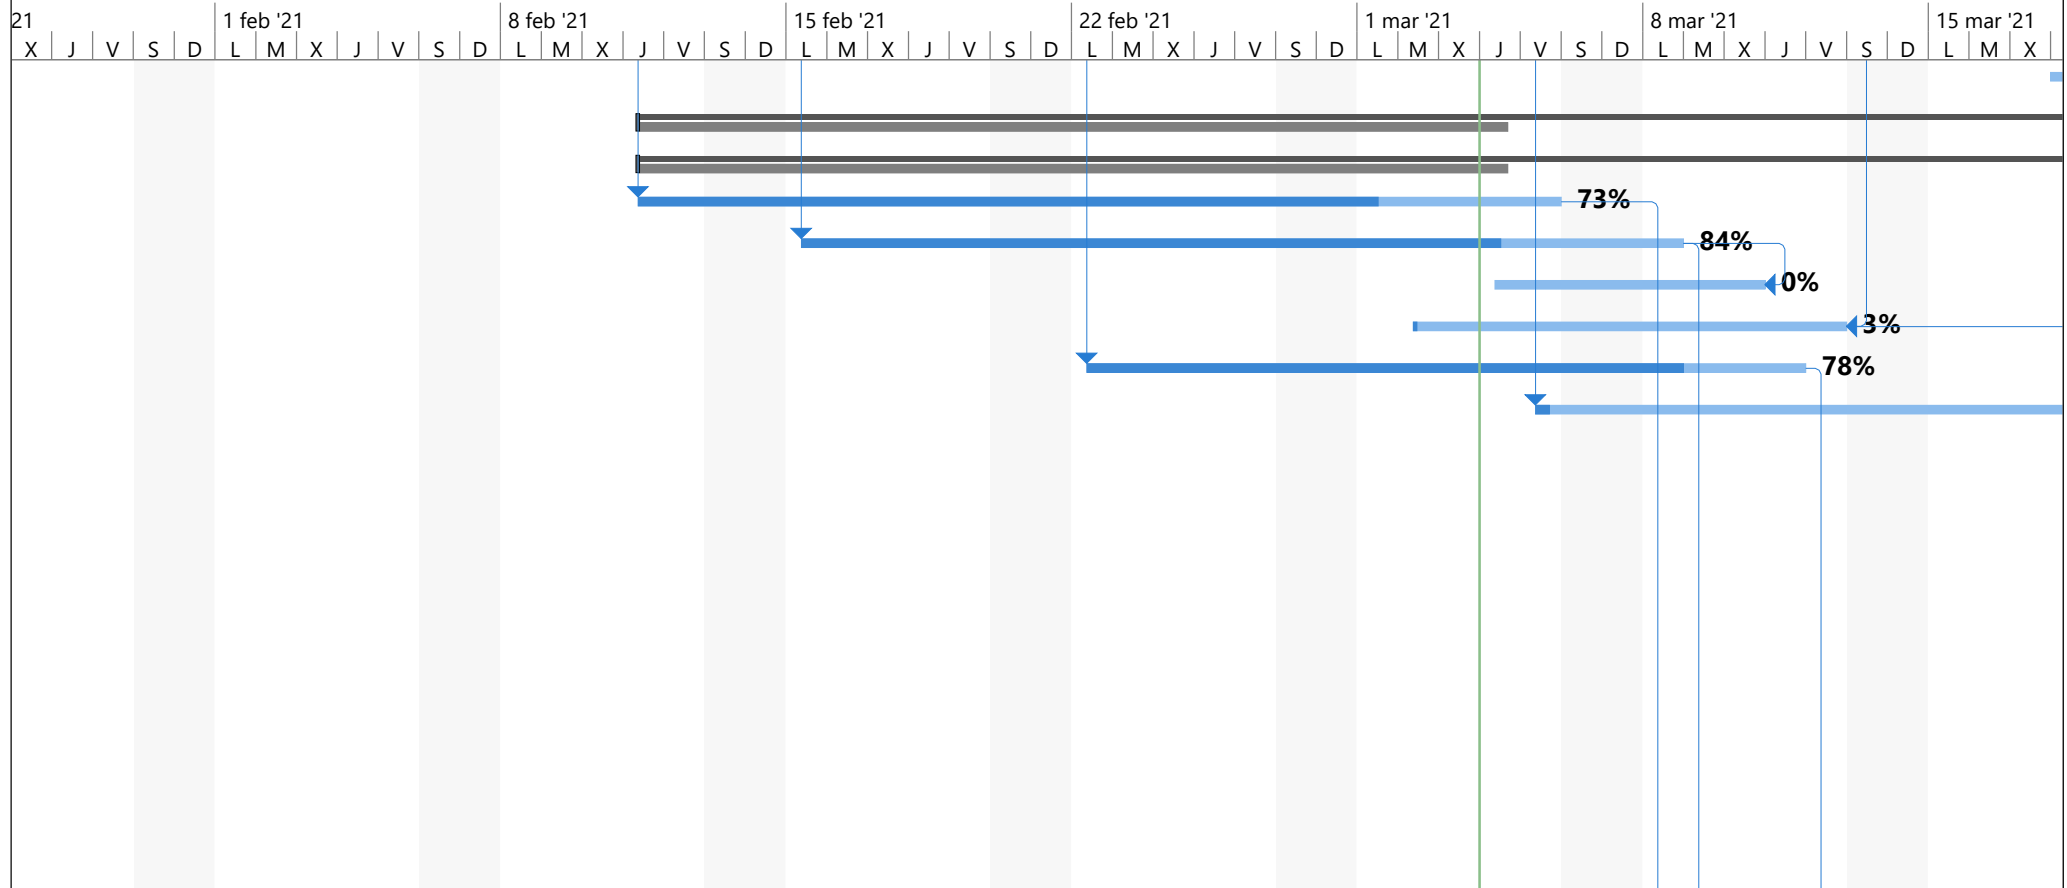



















| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021



























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| 21 | 1 feb '21 | | | | | 8 feb '21 | | | | | 15 feb '21 | | | | | 22 feb '21 | | | | | 1 mar '21 | | | | | 8 mar '21 | | | | | 15 mar '21 | | | | |
|----|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

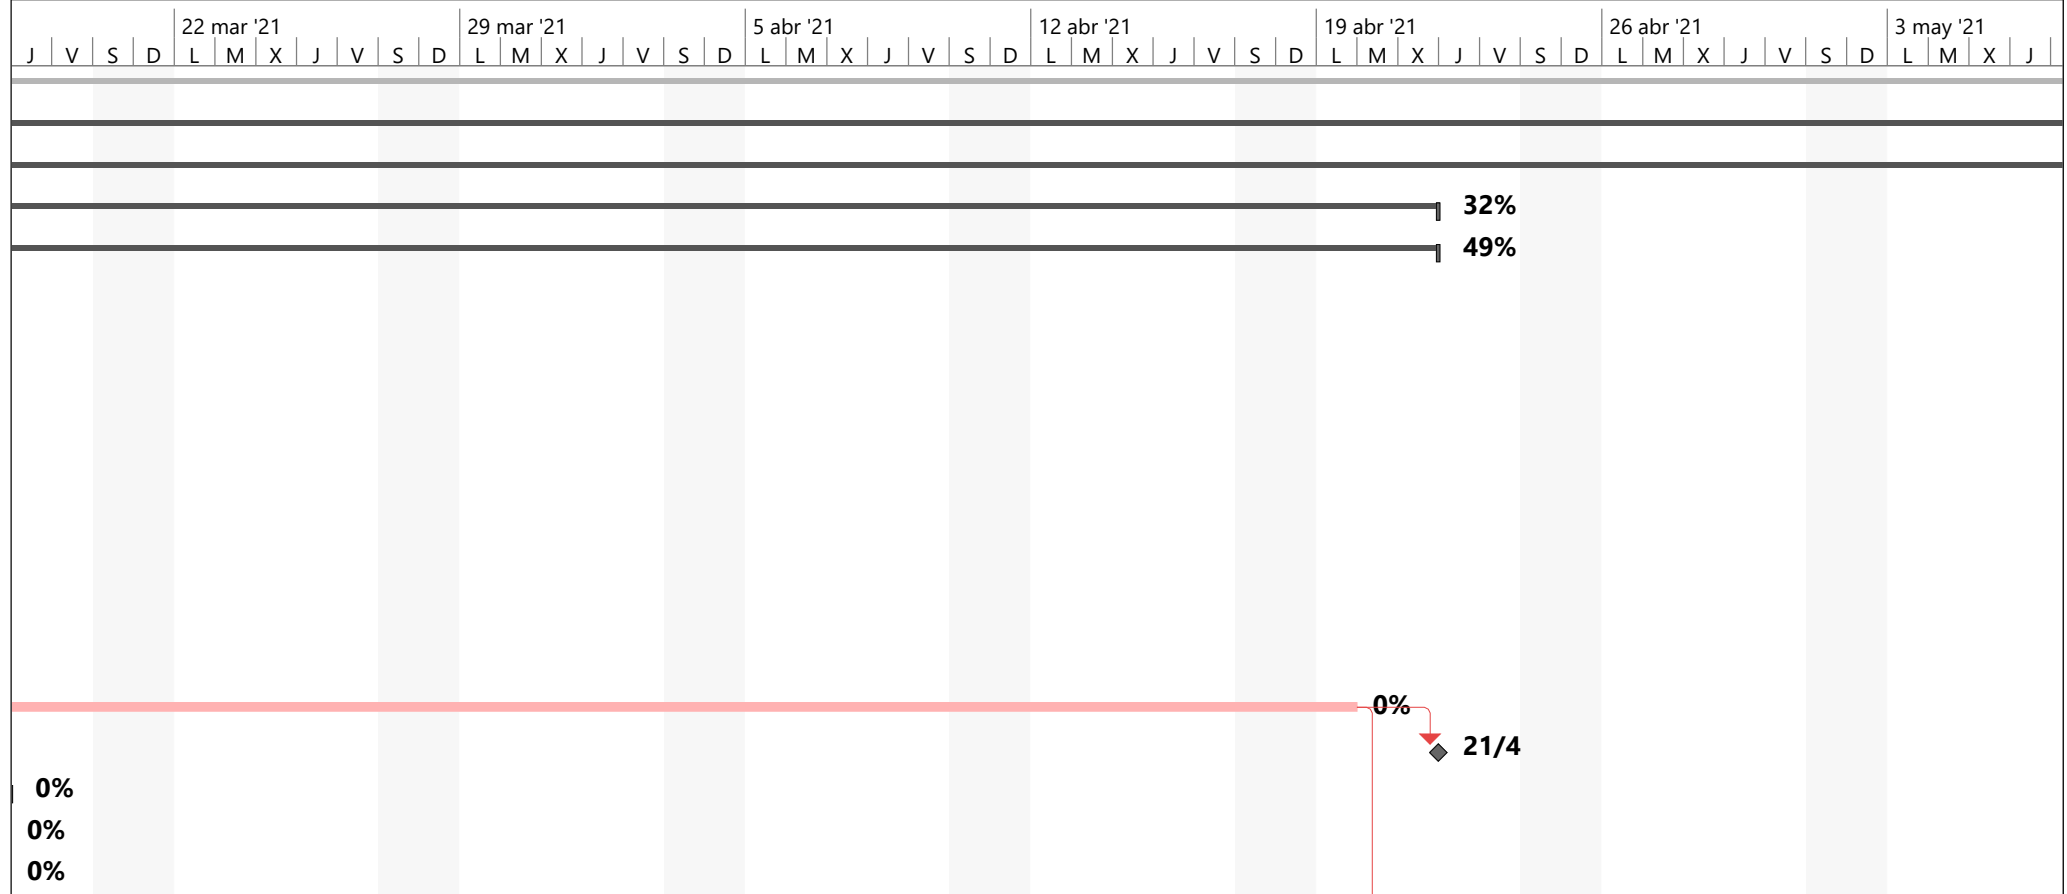


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

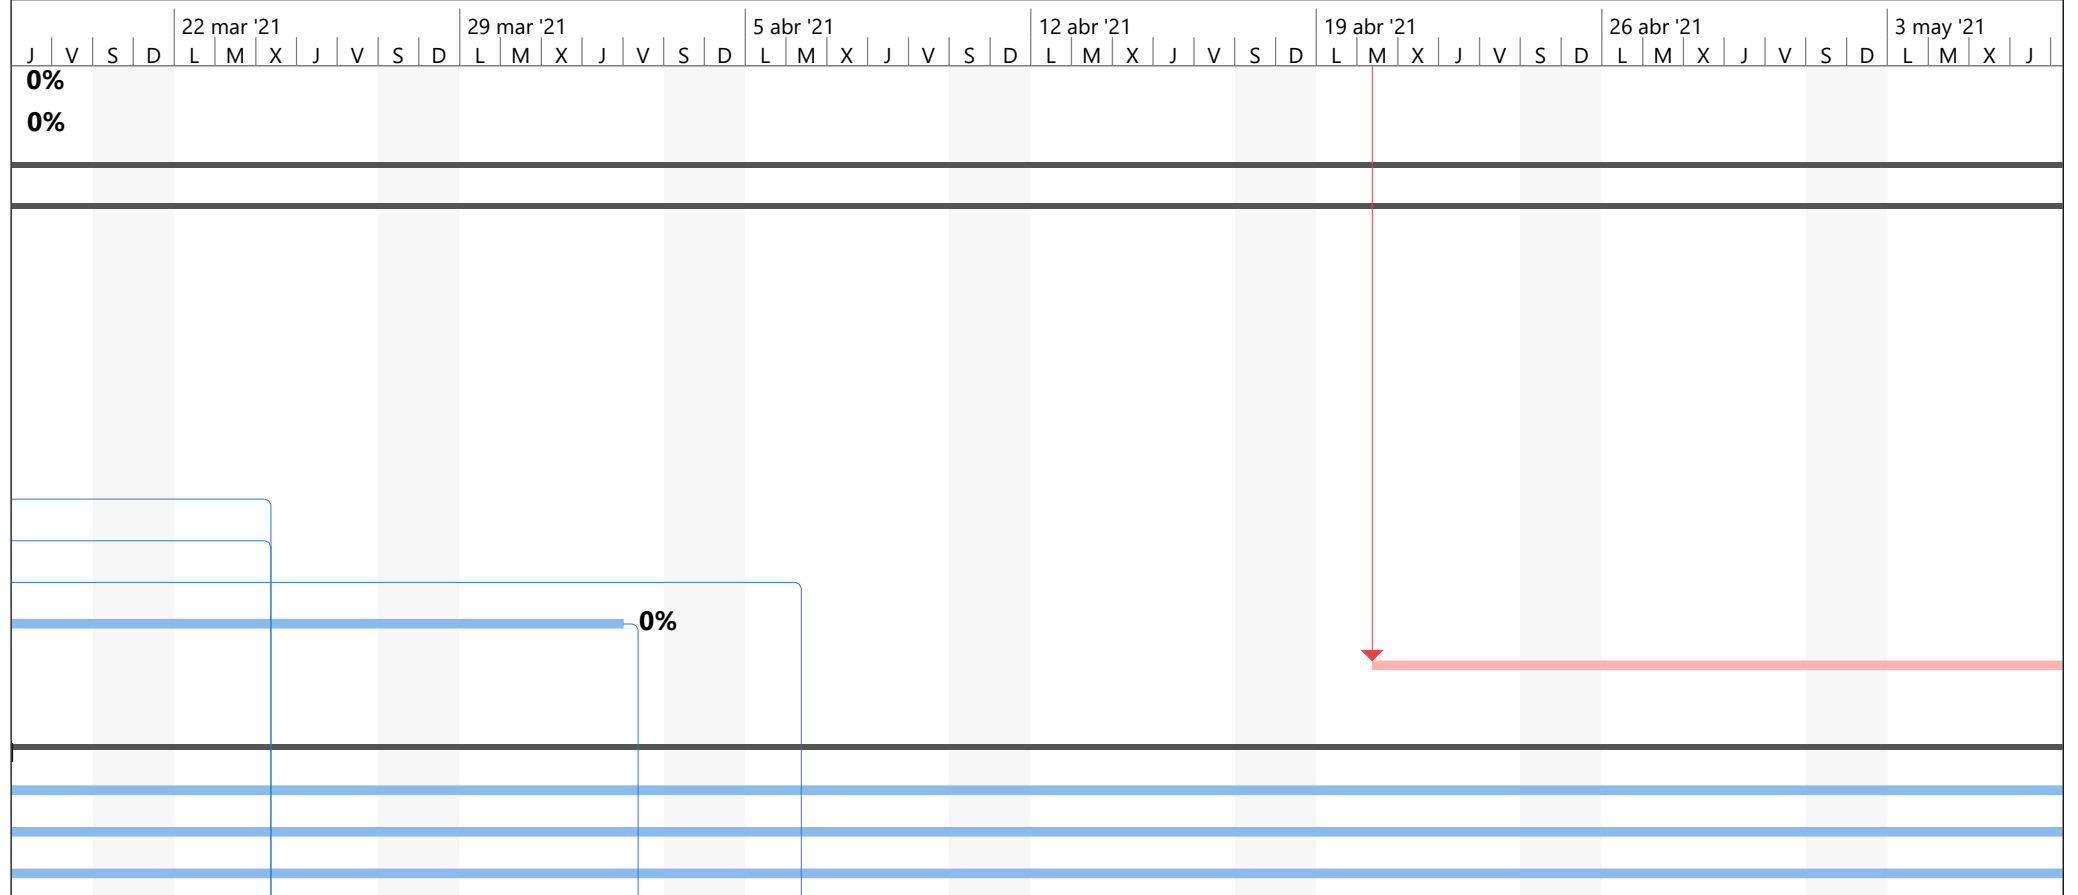


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

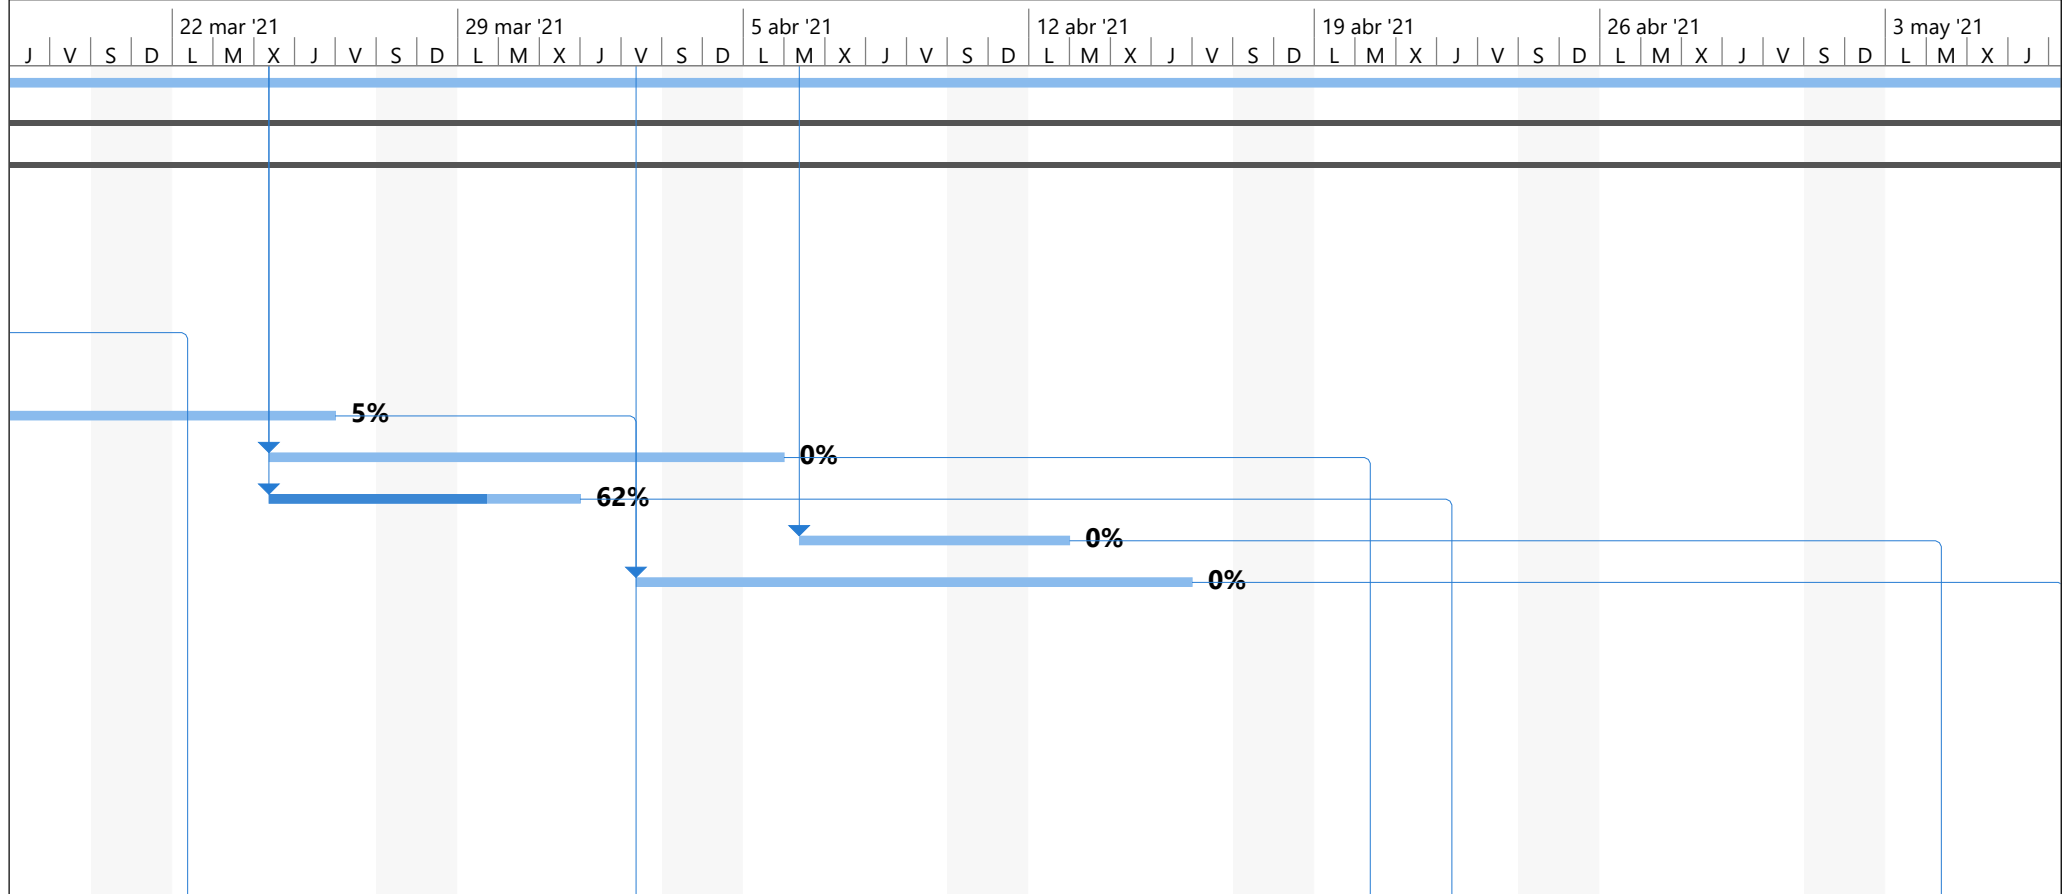


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

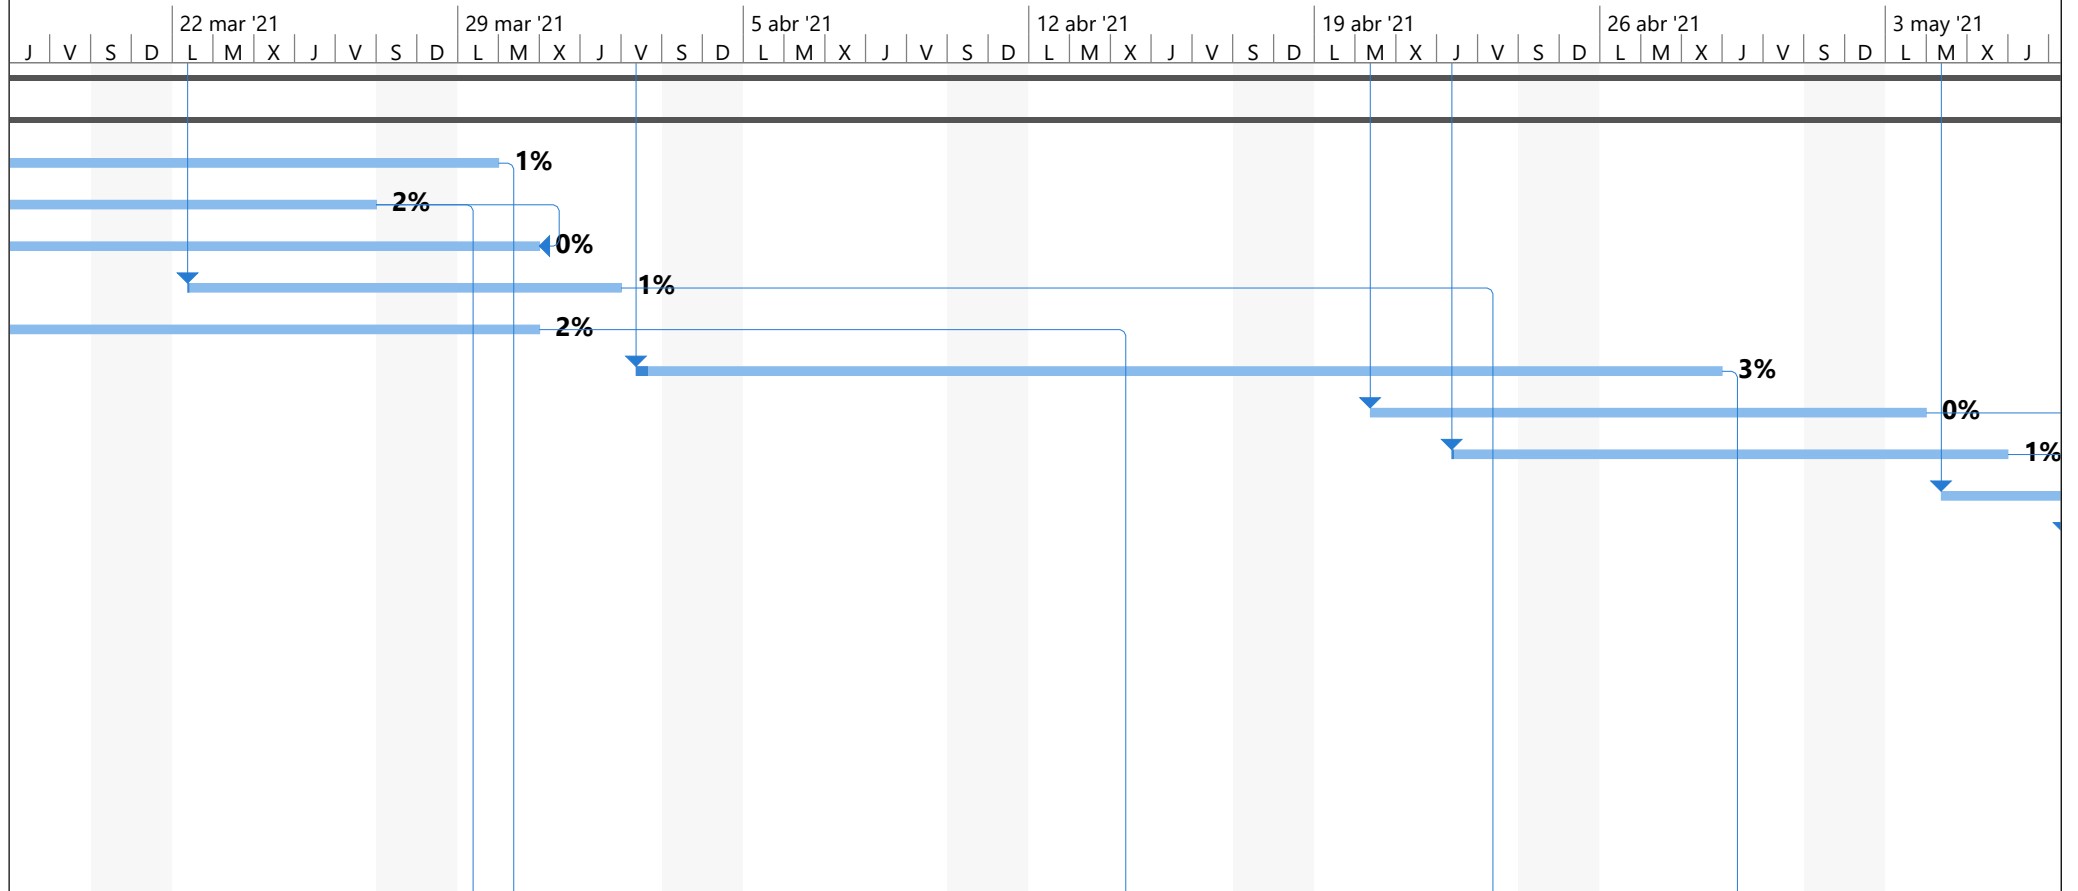

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

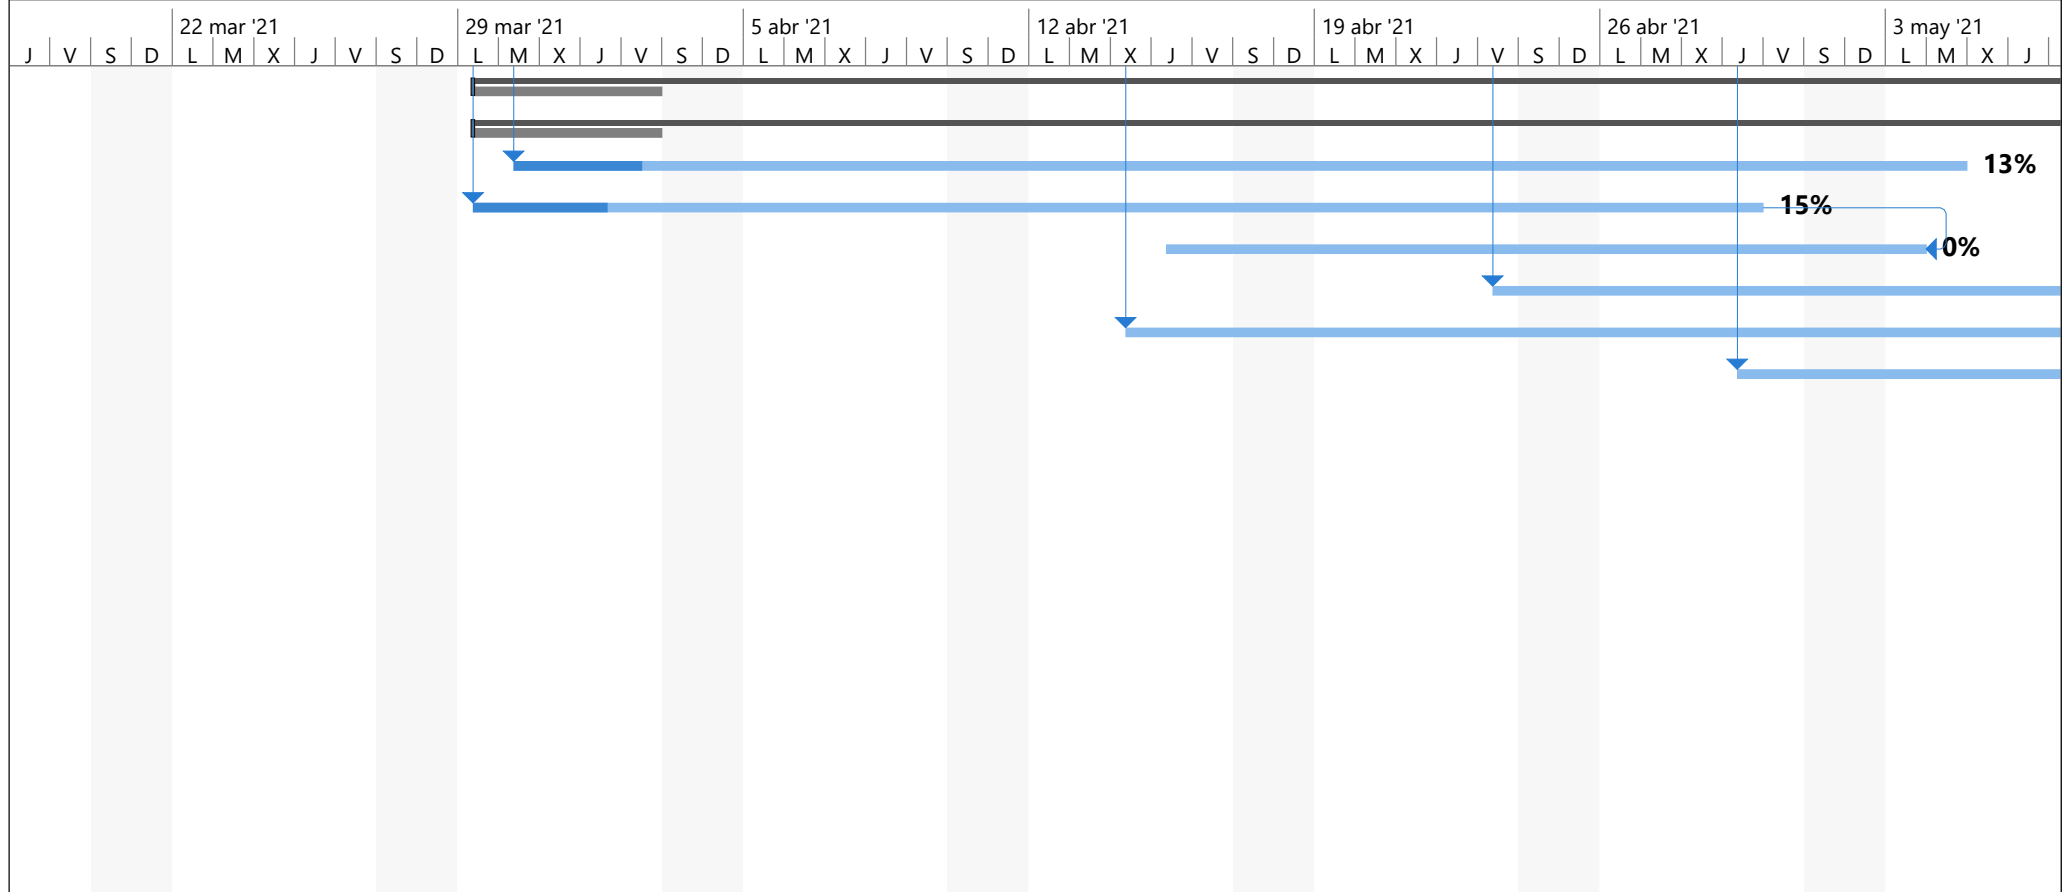


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

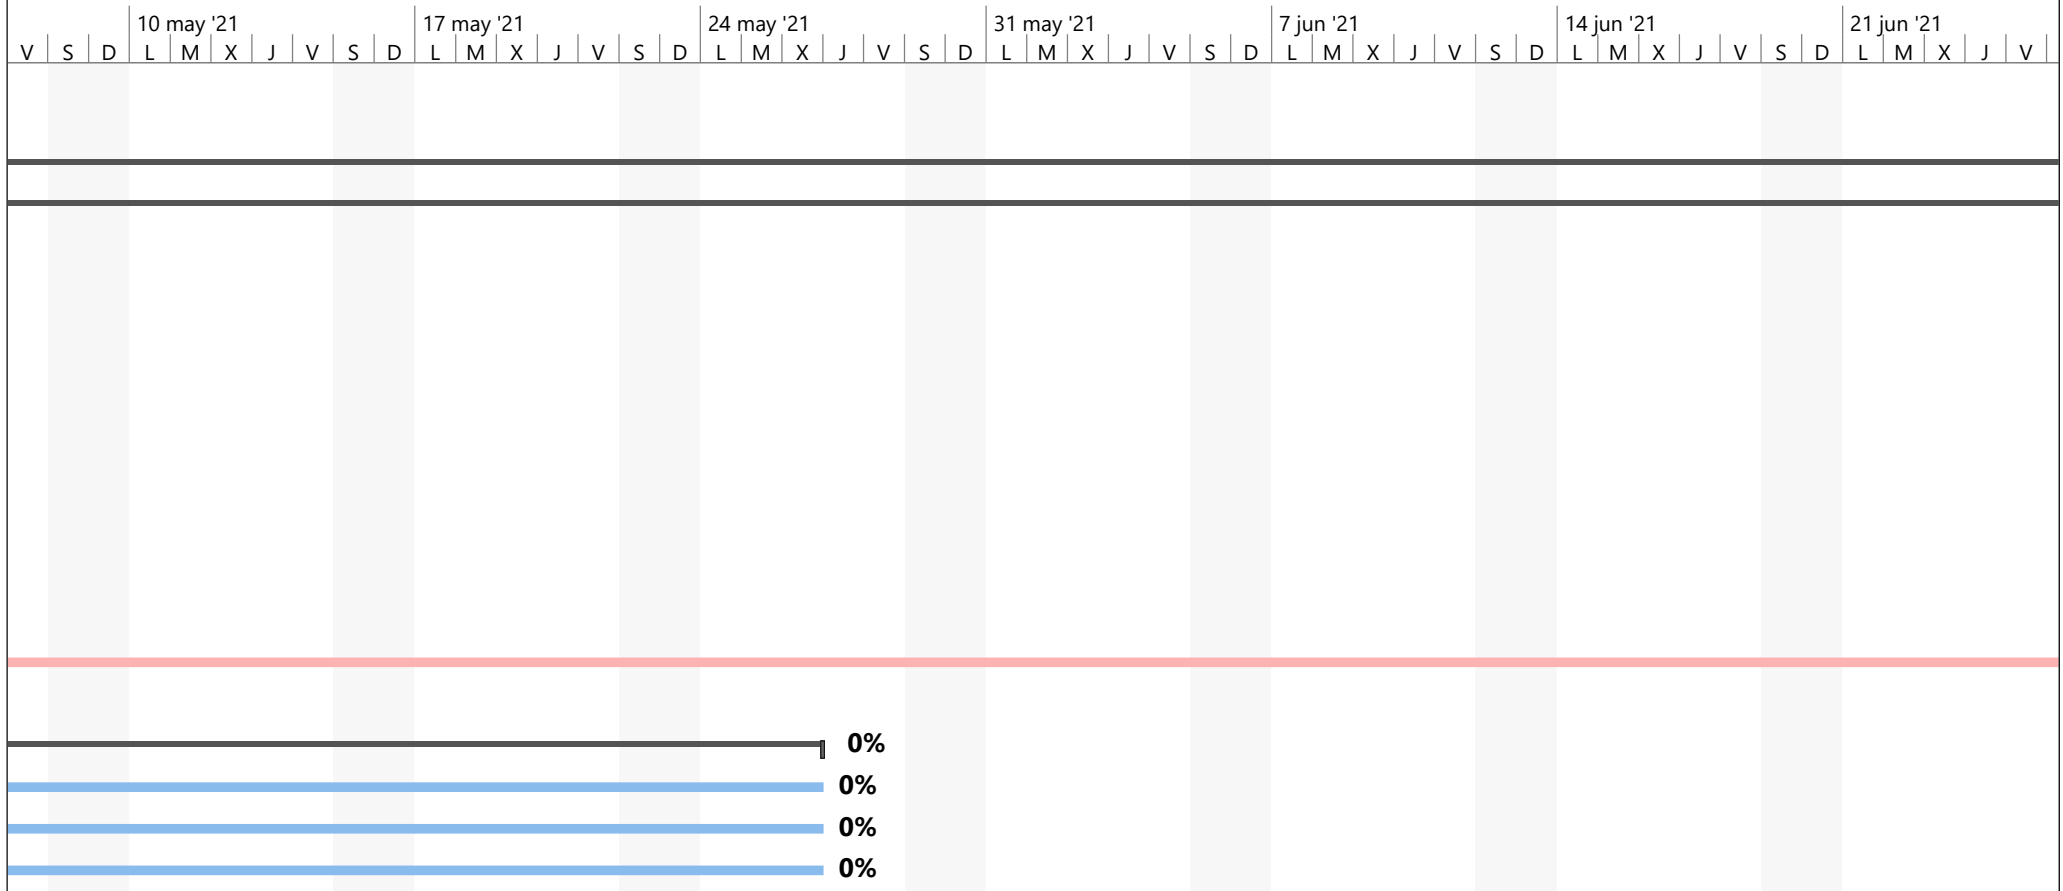


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

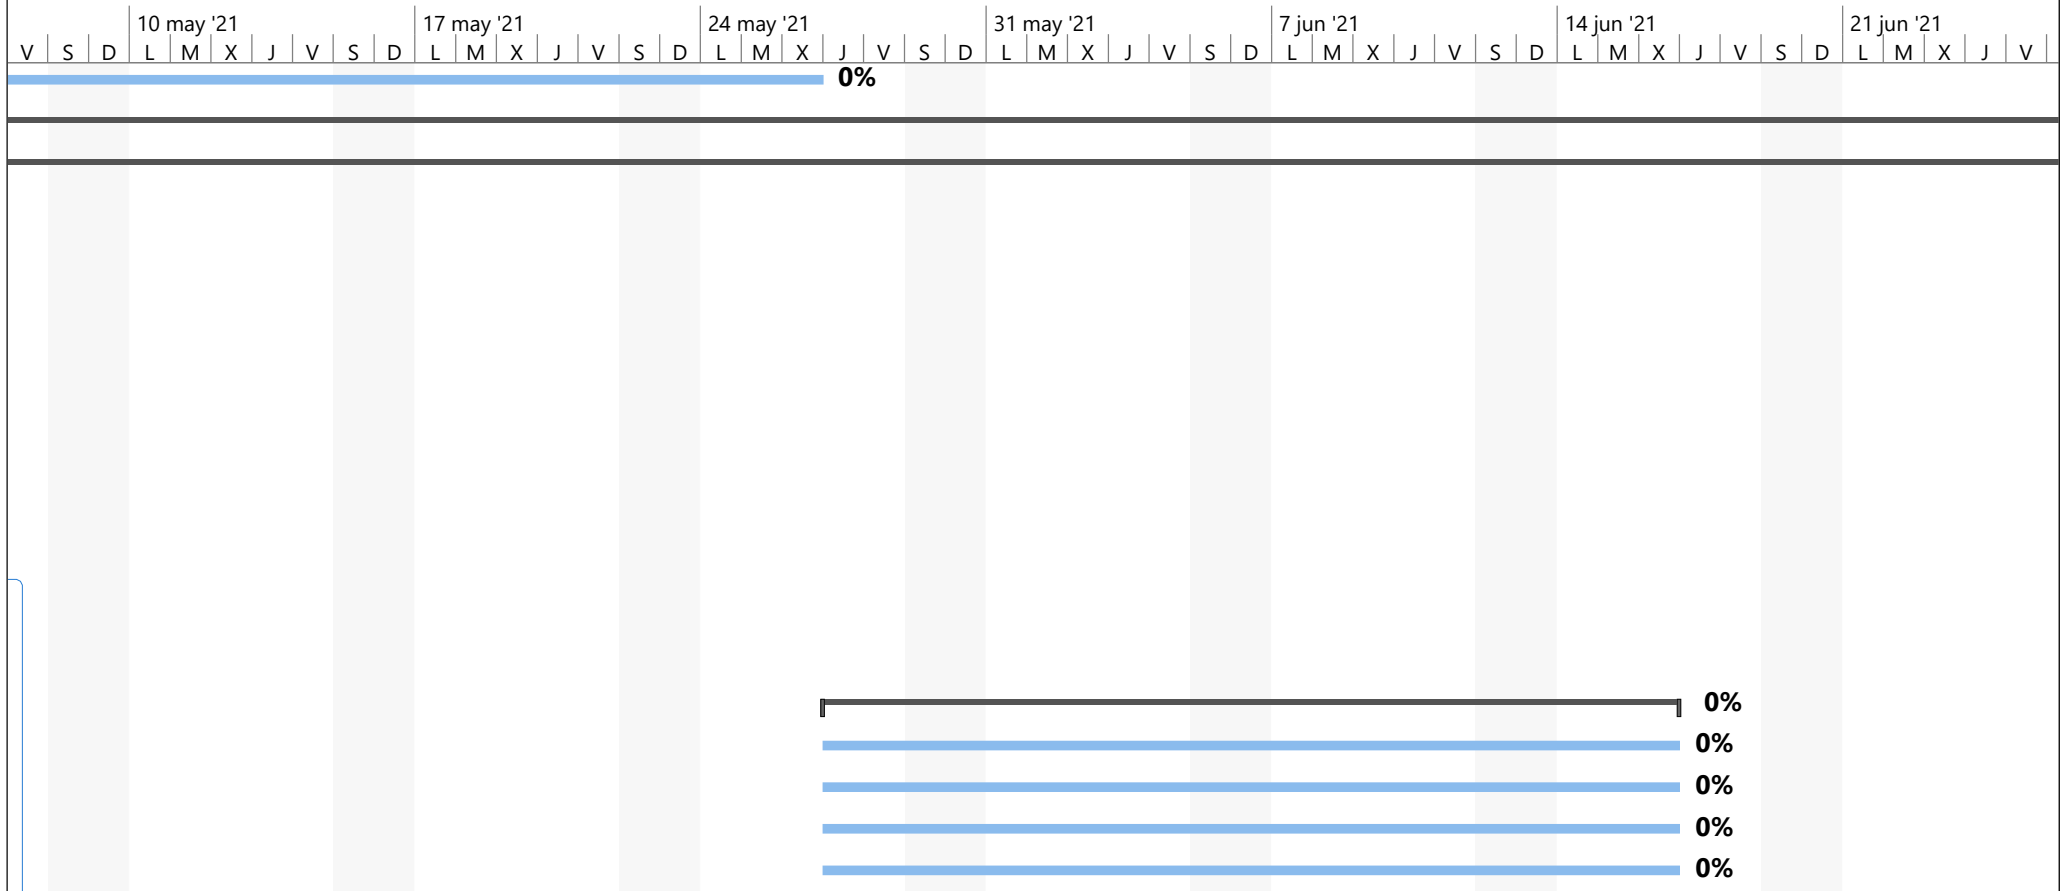

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |



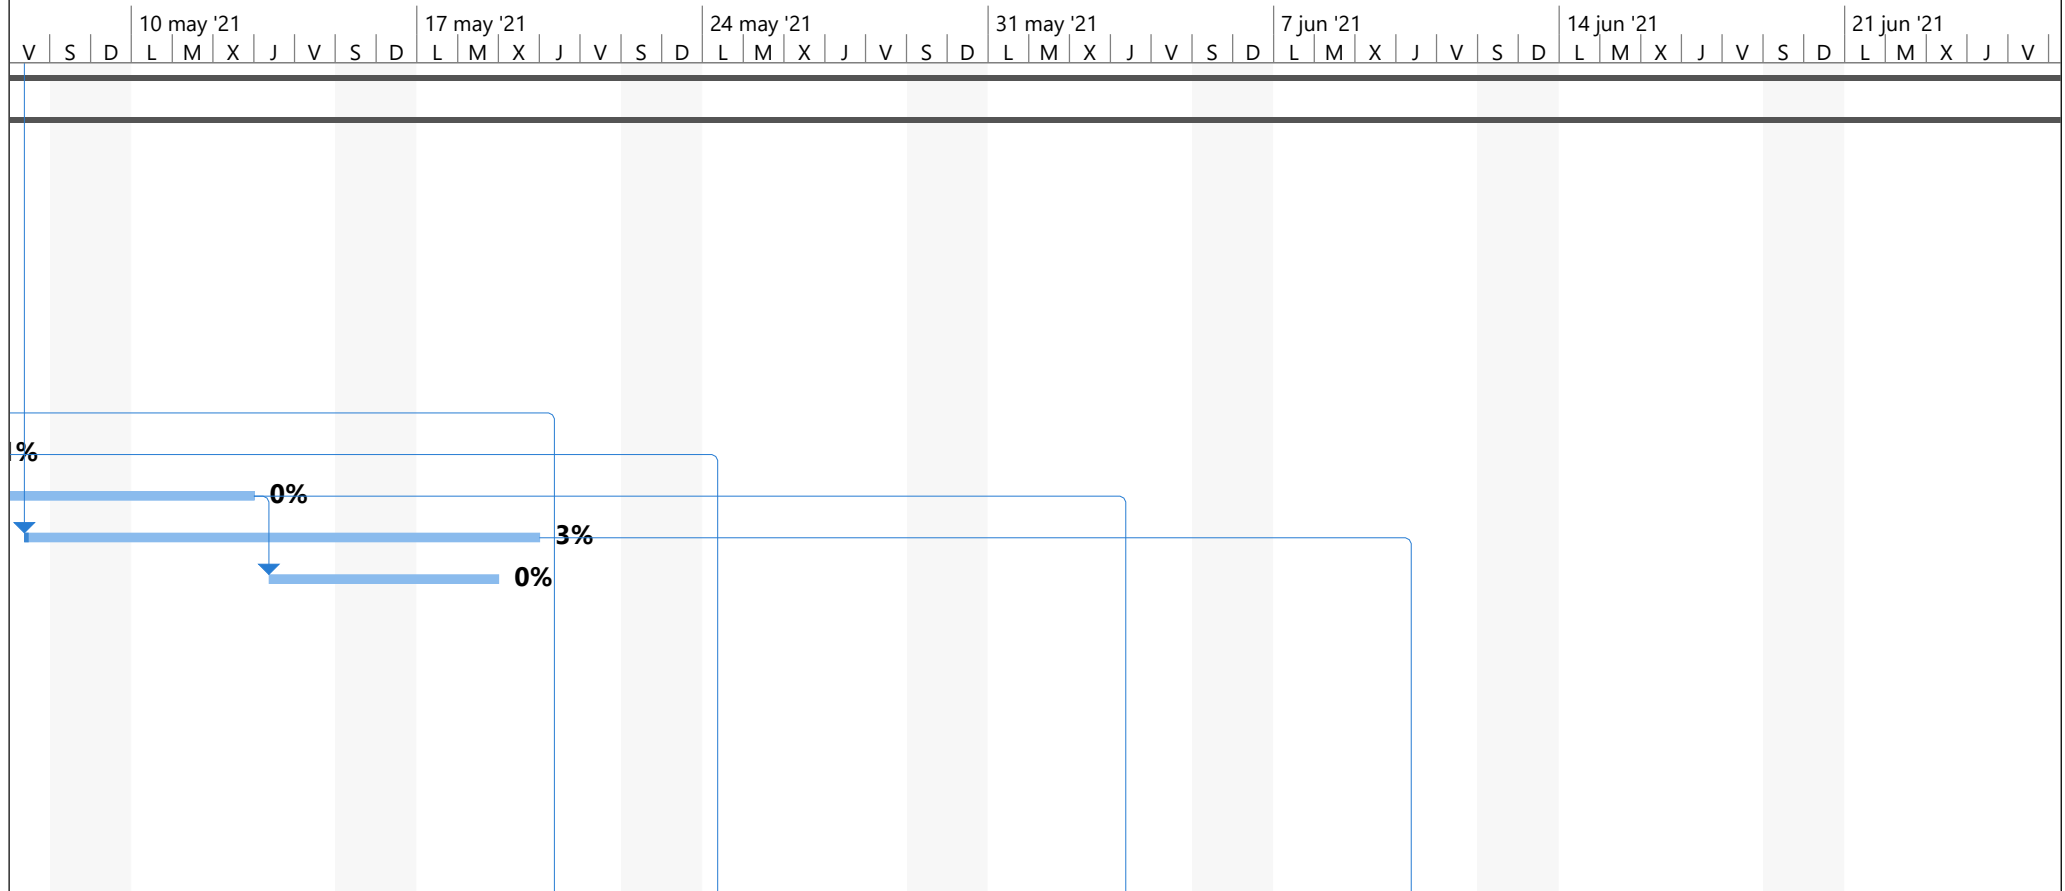





















Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| Actividad | Color | Inicio | Fin | Progreso (%) |
|-------------|------------|--------|--------|--------------|
| Actividad 1 | Light Blue | May 10 | May 17 | 0% |
| Actividad 2 | Dark Blue | May 10 | May 17 | 0% |
| Actividad 3 | Light Blue | May 10 | May 24 | 0% |
| Actividad 4 | Dark Blue | May 10 | May 31 | 0% |
| Actividad 5 | Light Blue | May 10 | Jun 21 | 12% |


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

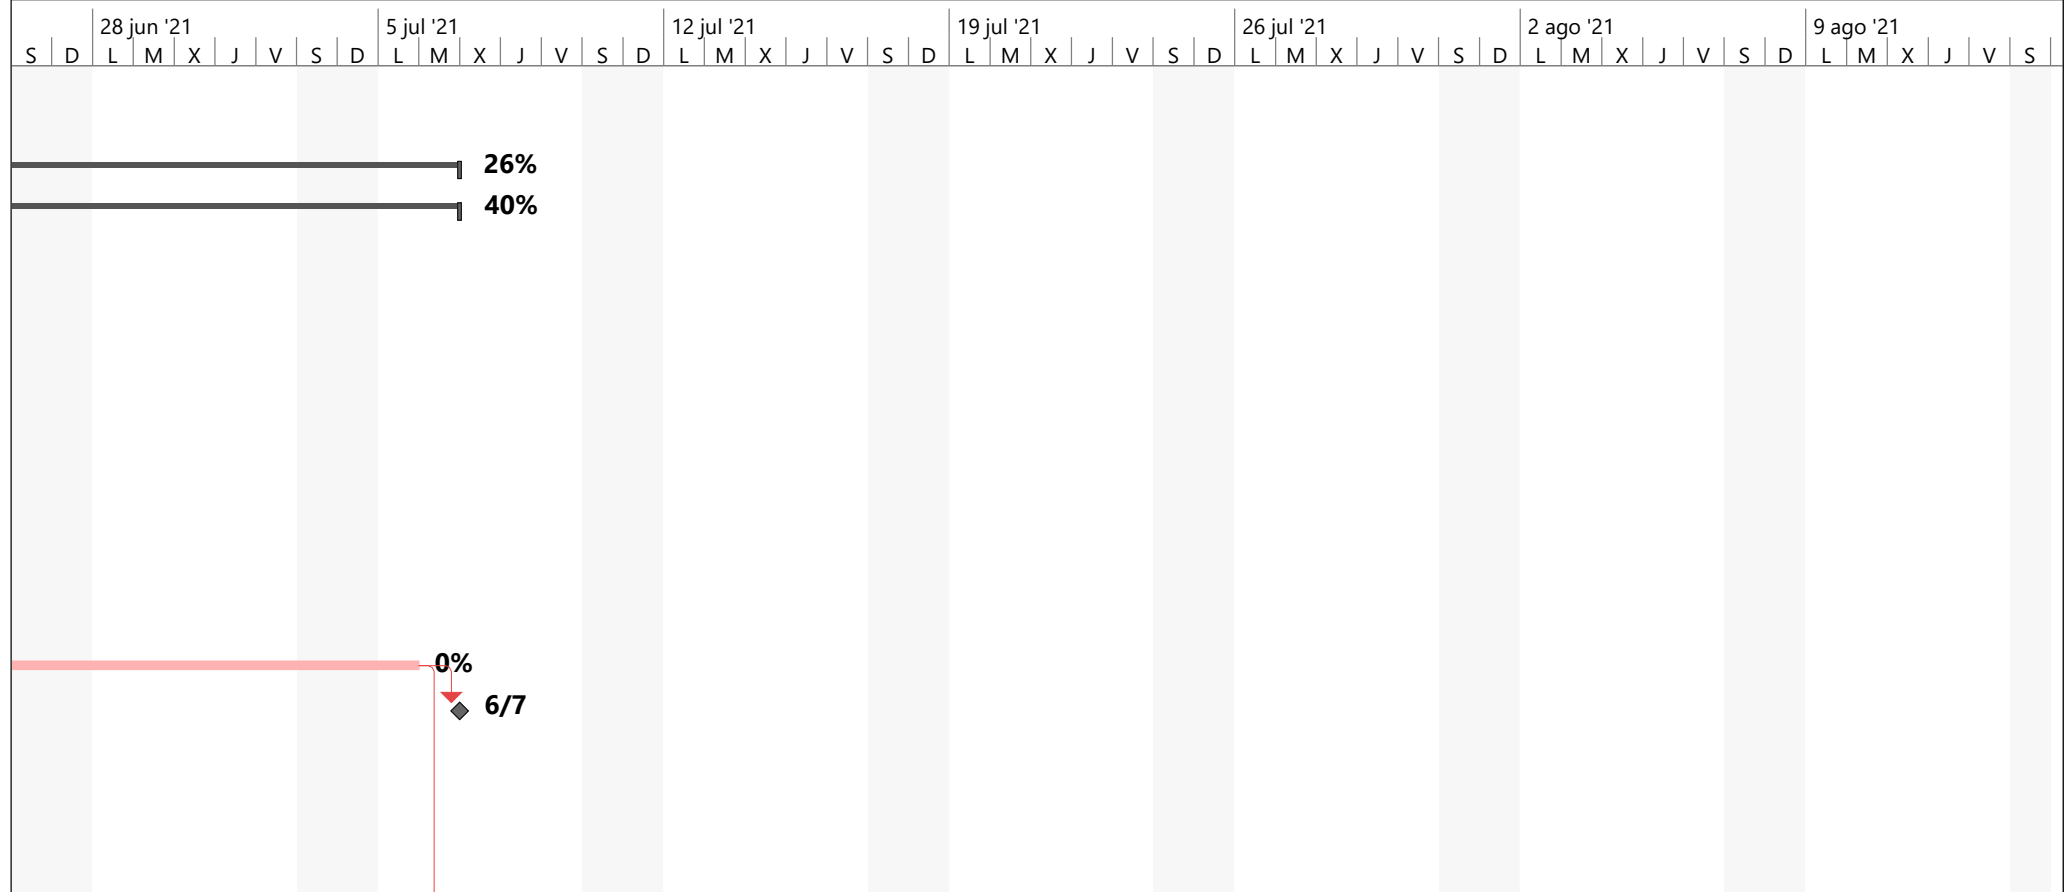

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |



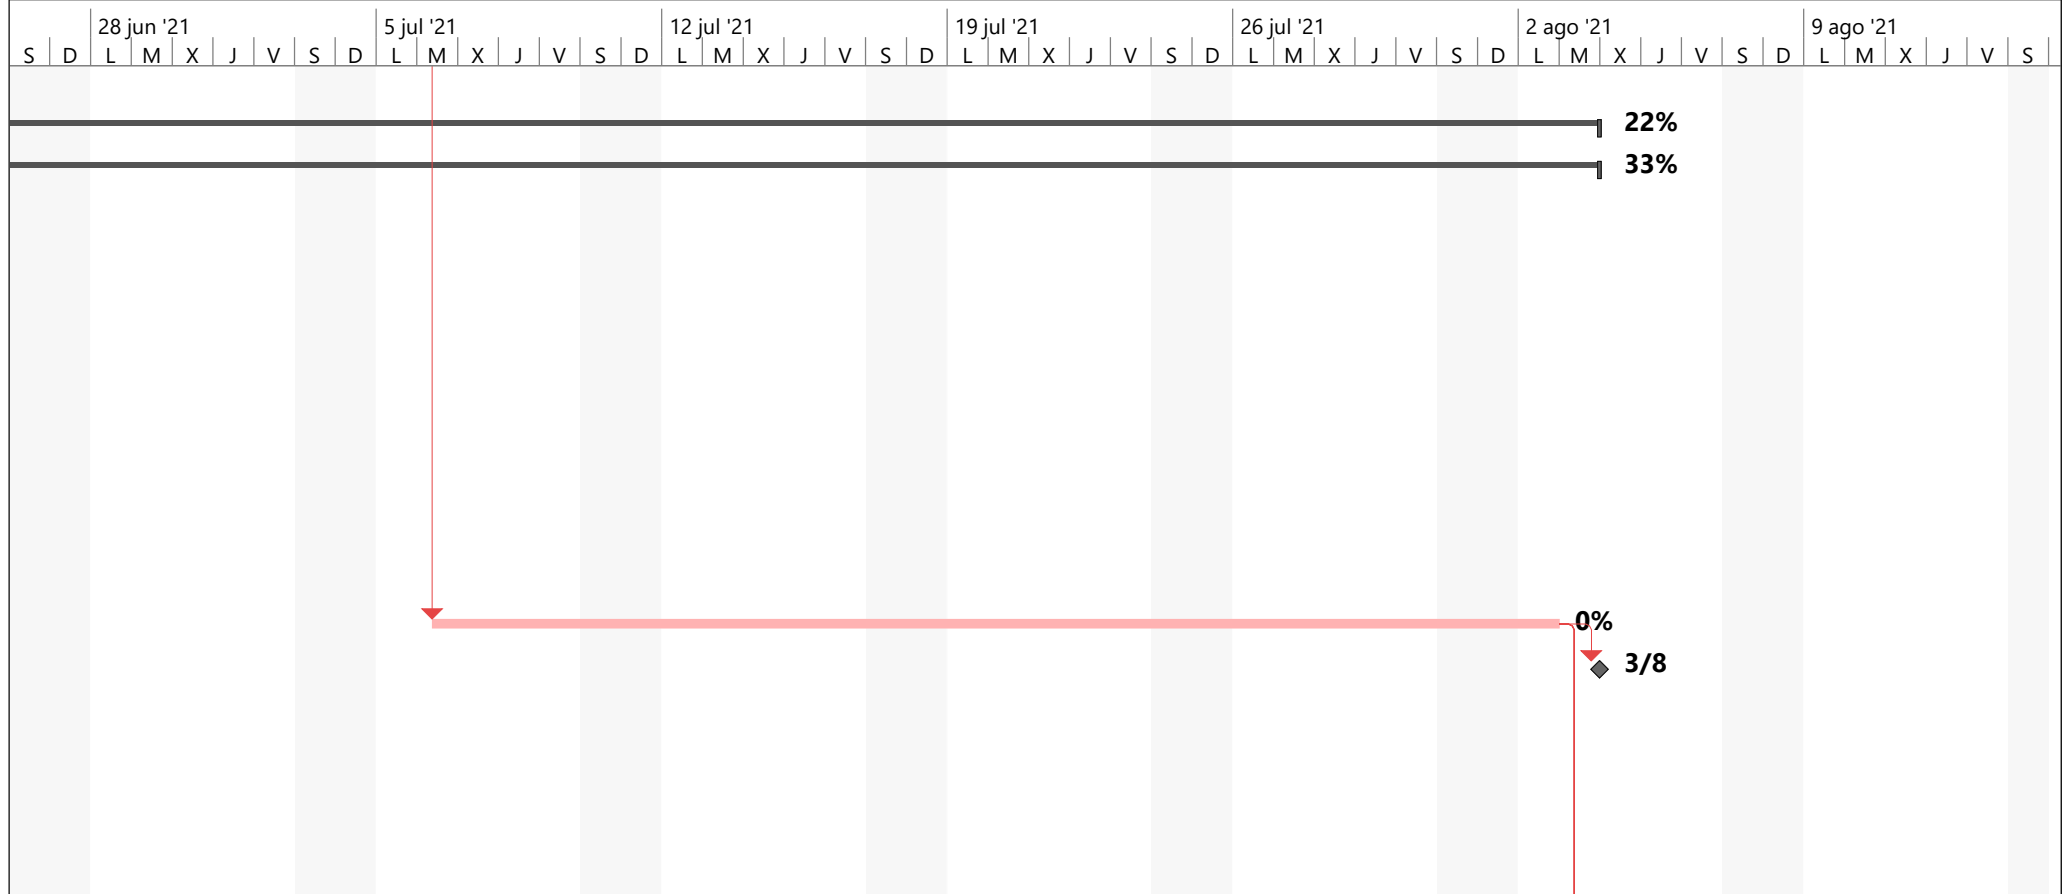





















Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

Timeline visualization showing a sequence of events from June 28, 2021, to August 9, 2021. The timeline is represented by a horizontal axis with vertical grid lines for each day. A red vertical line marks the start of the timeline on June 28, 2021. A red horizontal bar with a downward arrow indicates a period from June 28 to July 1, 2021. A black horizontal bar with a downward arrow indicates a period from July 1 to July 2, 2021. Four blue horizontal bars with downward arrows indicate periods from July 2 to July 3, July 3 to July 4, July 4 to July 5, and July 5 to July 6, 2021.

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021



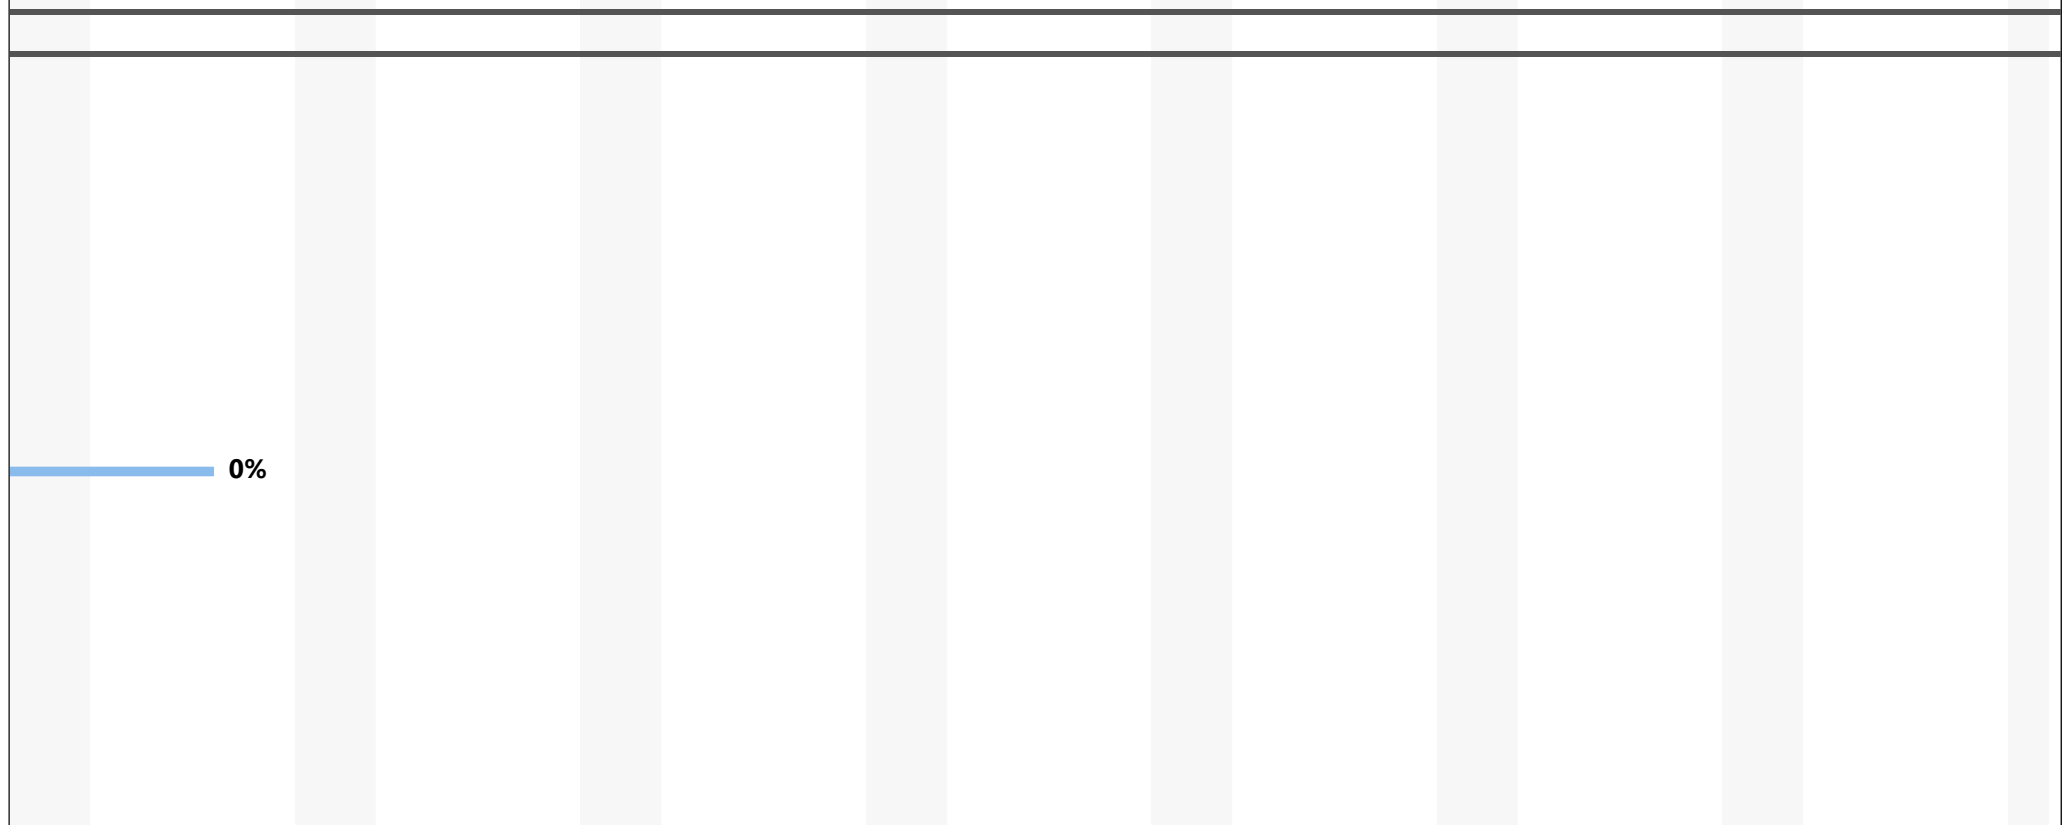





















| | | 28 jun '21 | | | | | | | 5 jul '21 | | | | | | | 12 jul '21 | | | | | | | 19 jul '21 | | | | | | | 26 jul '21 | | | | | | | 2 ago '21 | | | | | | | 9 ago '21 | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | | |



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]

























| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

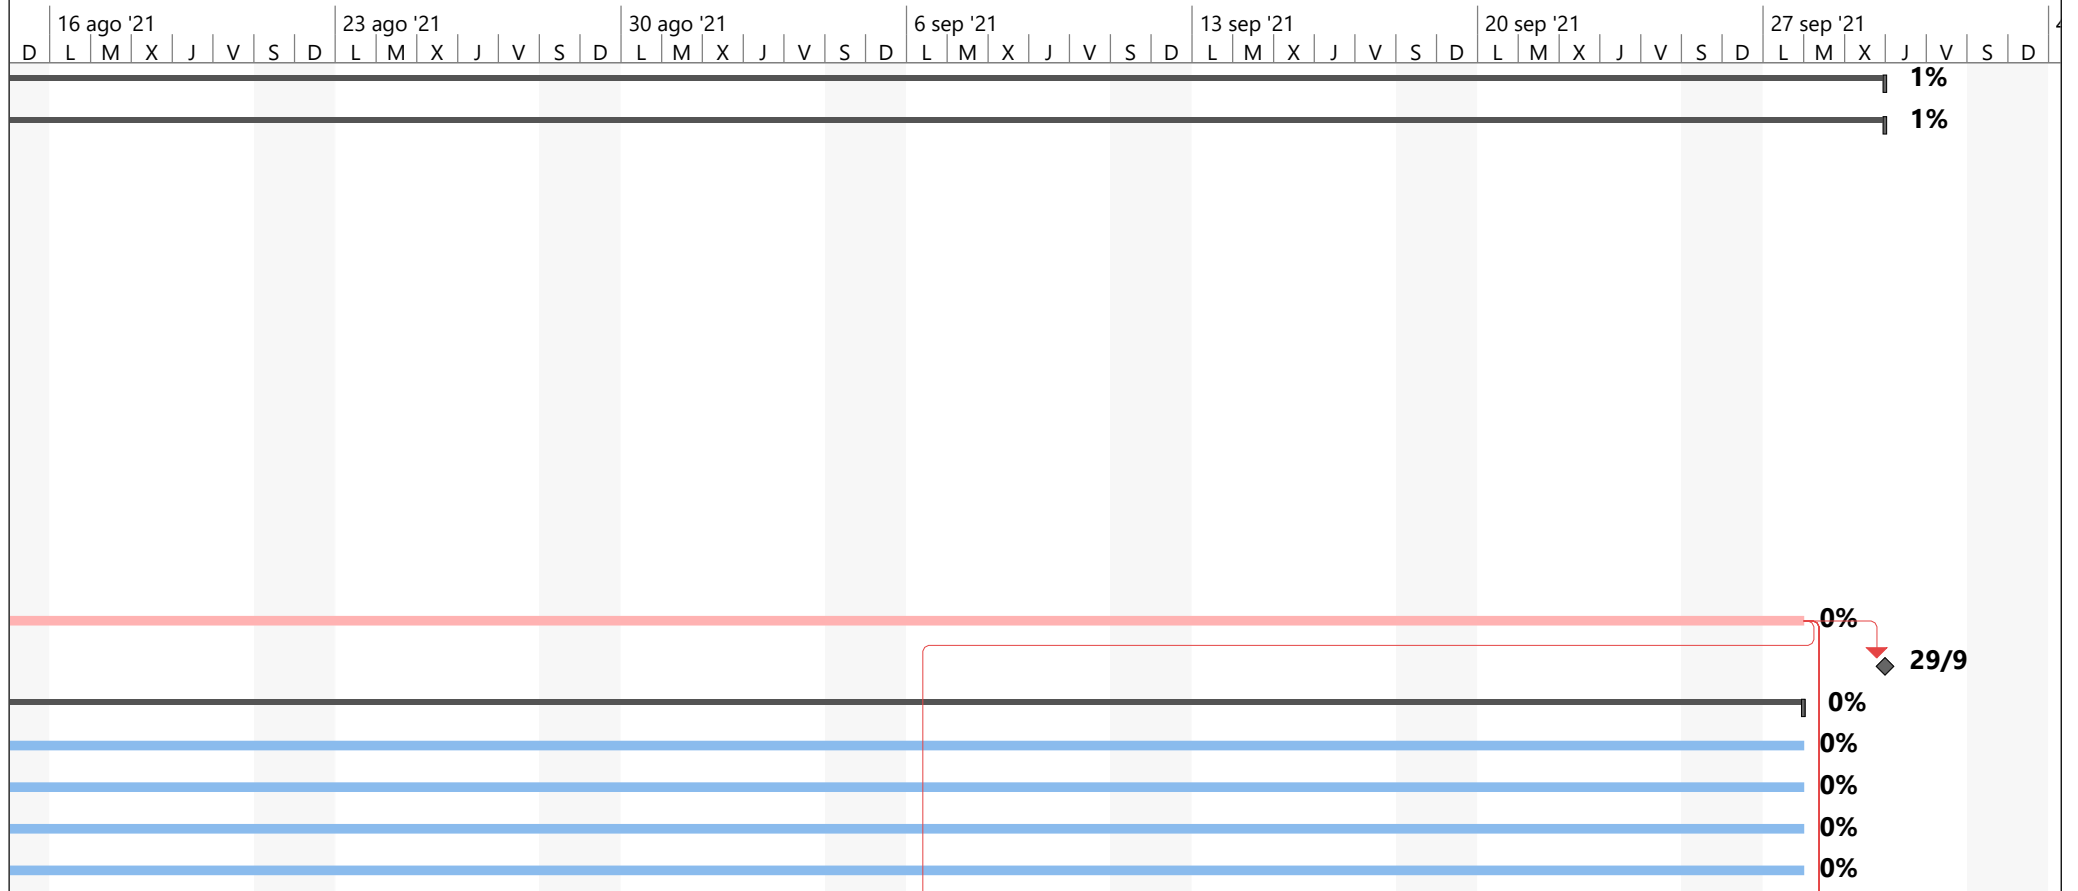

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

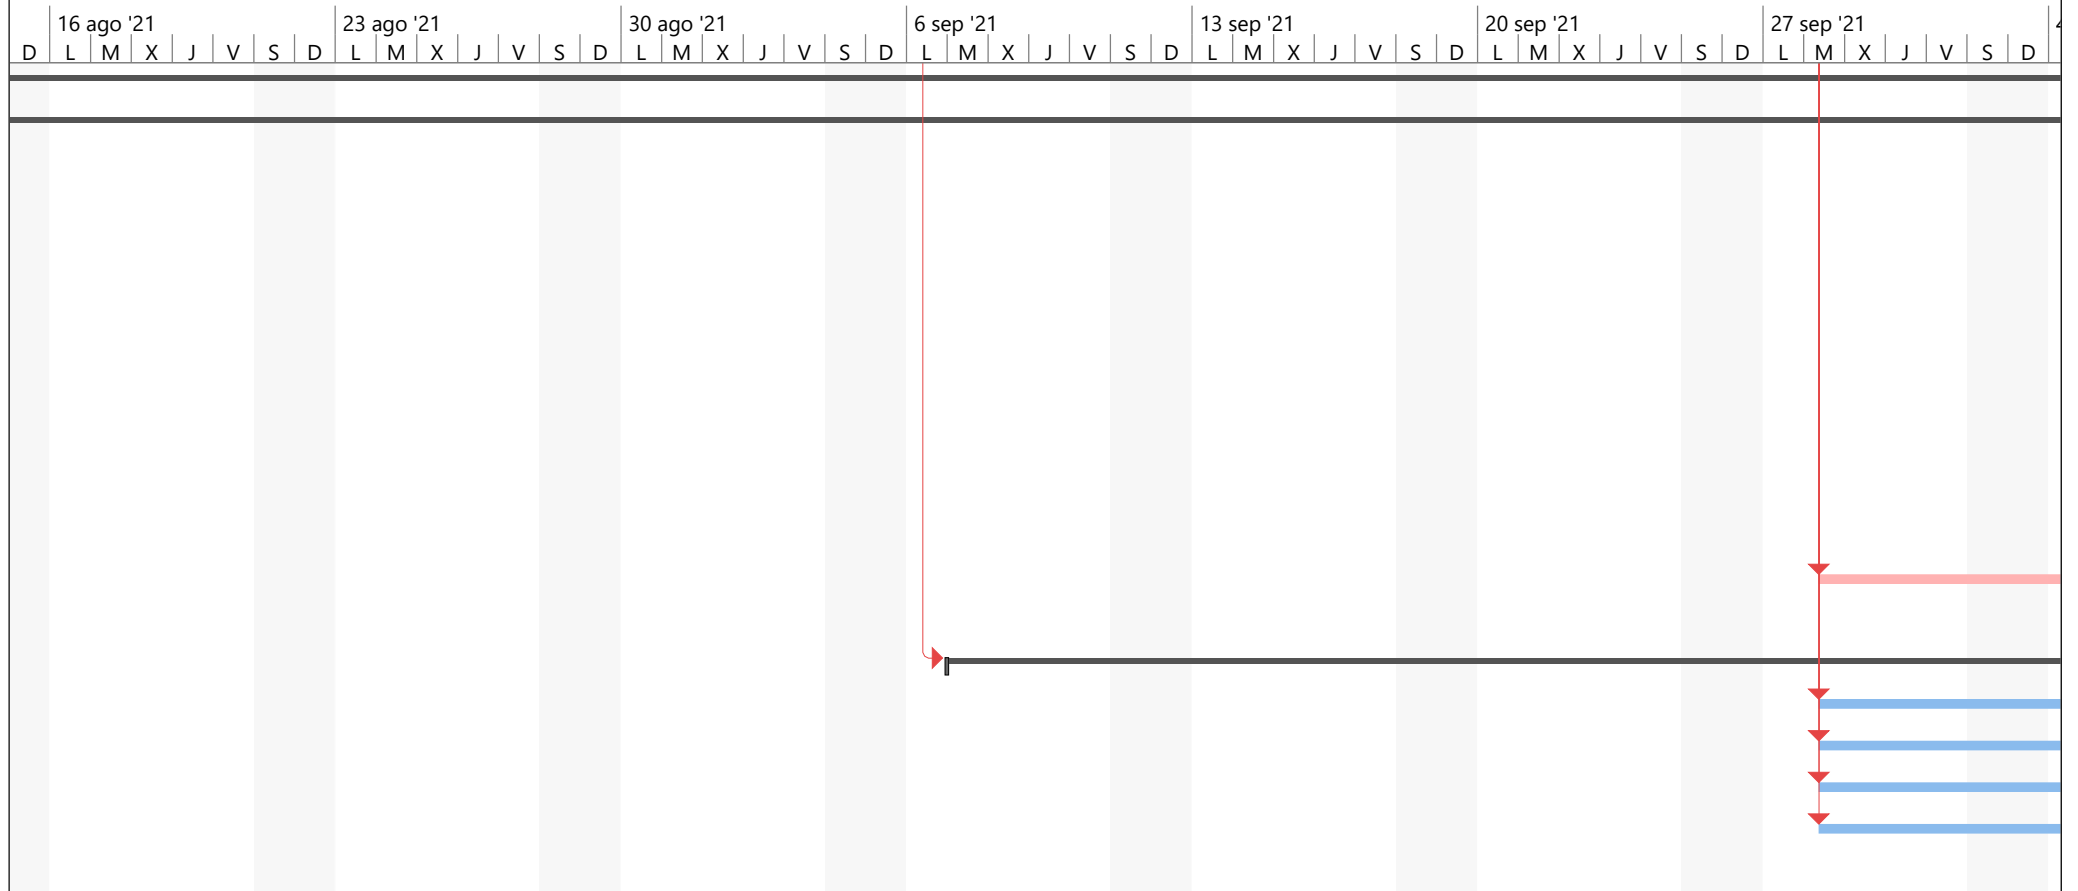

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021



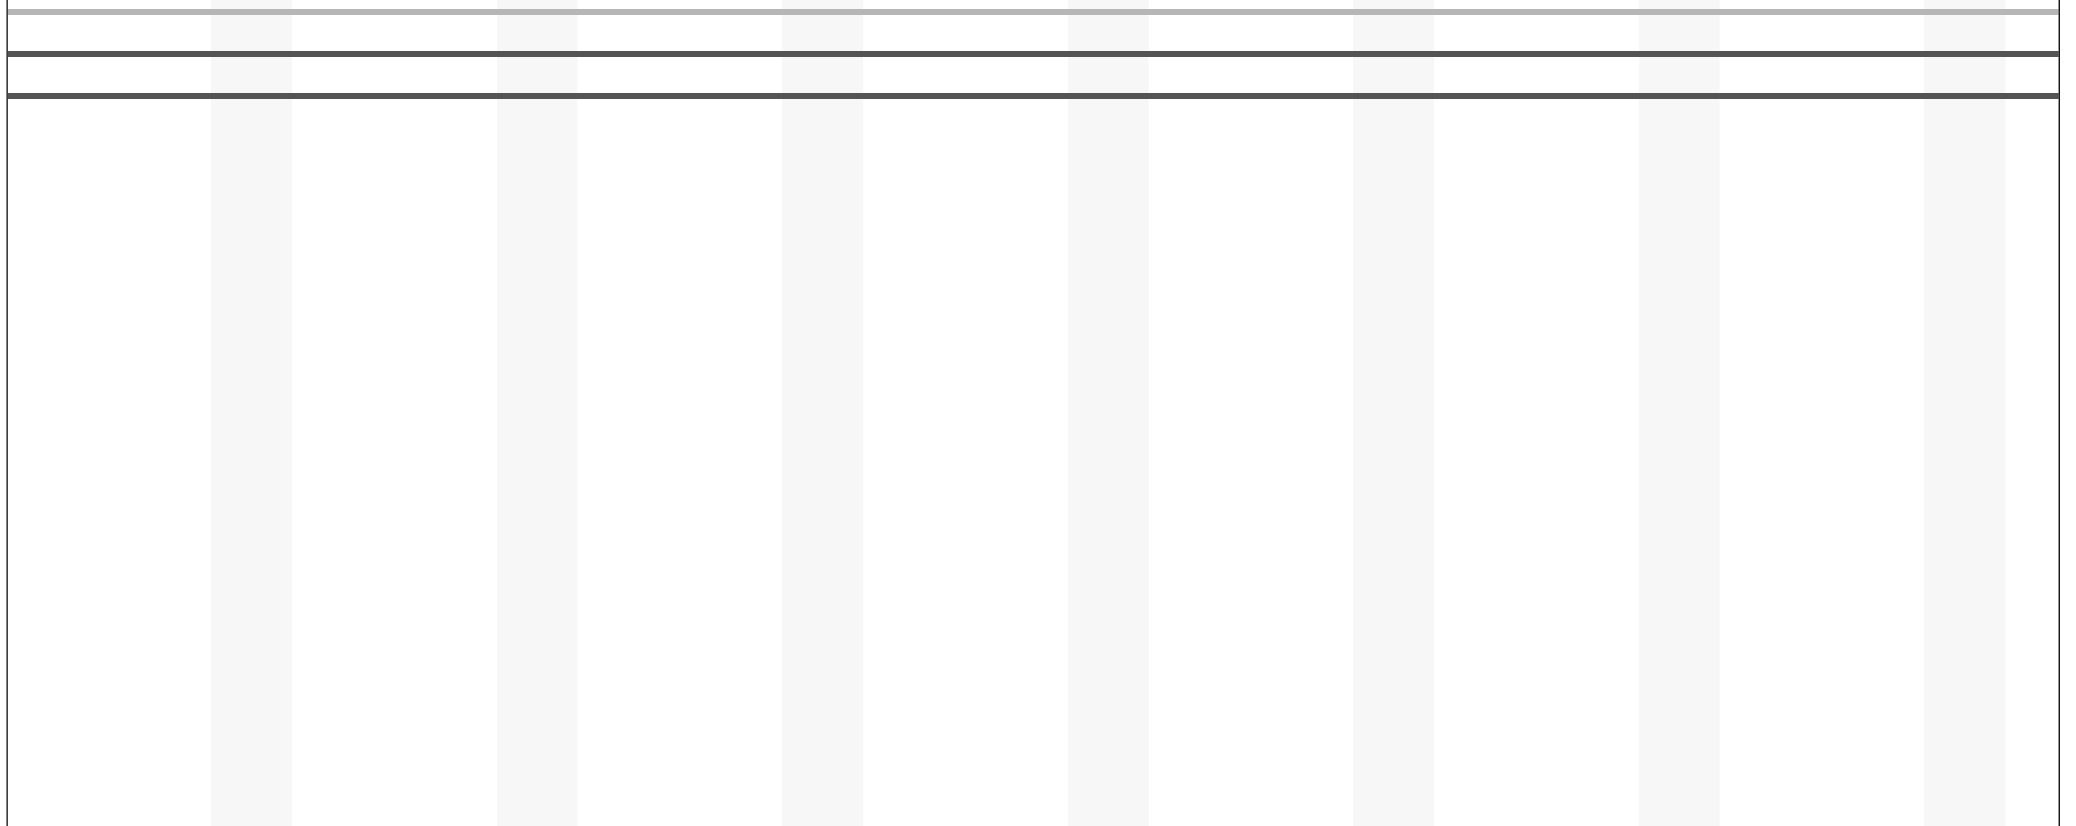





















| 4 oct '21 | | | | | | | 11 oct '21 | | | | | | | 18 oct '21 | | | | | | | 25 oct '21 | | | | | | | 1 nov '21 | | | | | | | 8 nov '21 | | | | | | | 15 nov '21 | | | | | | | 22 nov '21 | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |



























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]


| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

| 4 oct '21 | | | | | | | 11 oct '21 | | | | | | | 18 oct '21 | | | | | | | 25 oct '21 | | | | | | | 1 nov '21 | | | | | | | 8 nov '21 | | | | | | | 15 nov '21 | | | | | | | 22 nov '21 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | |

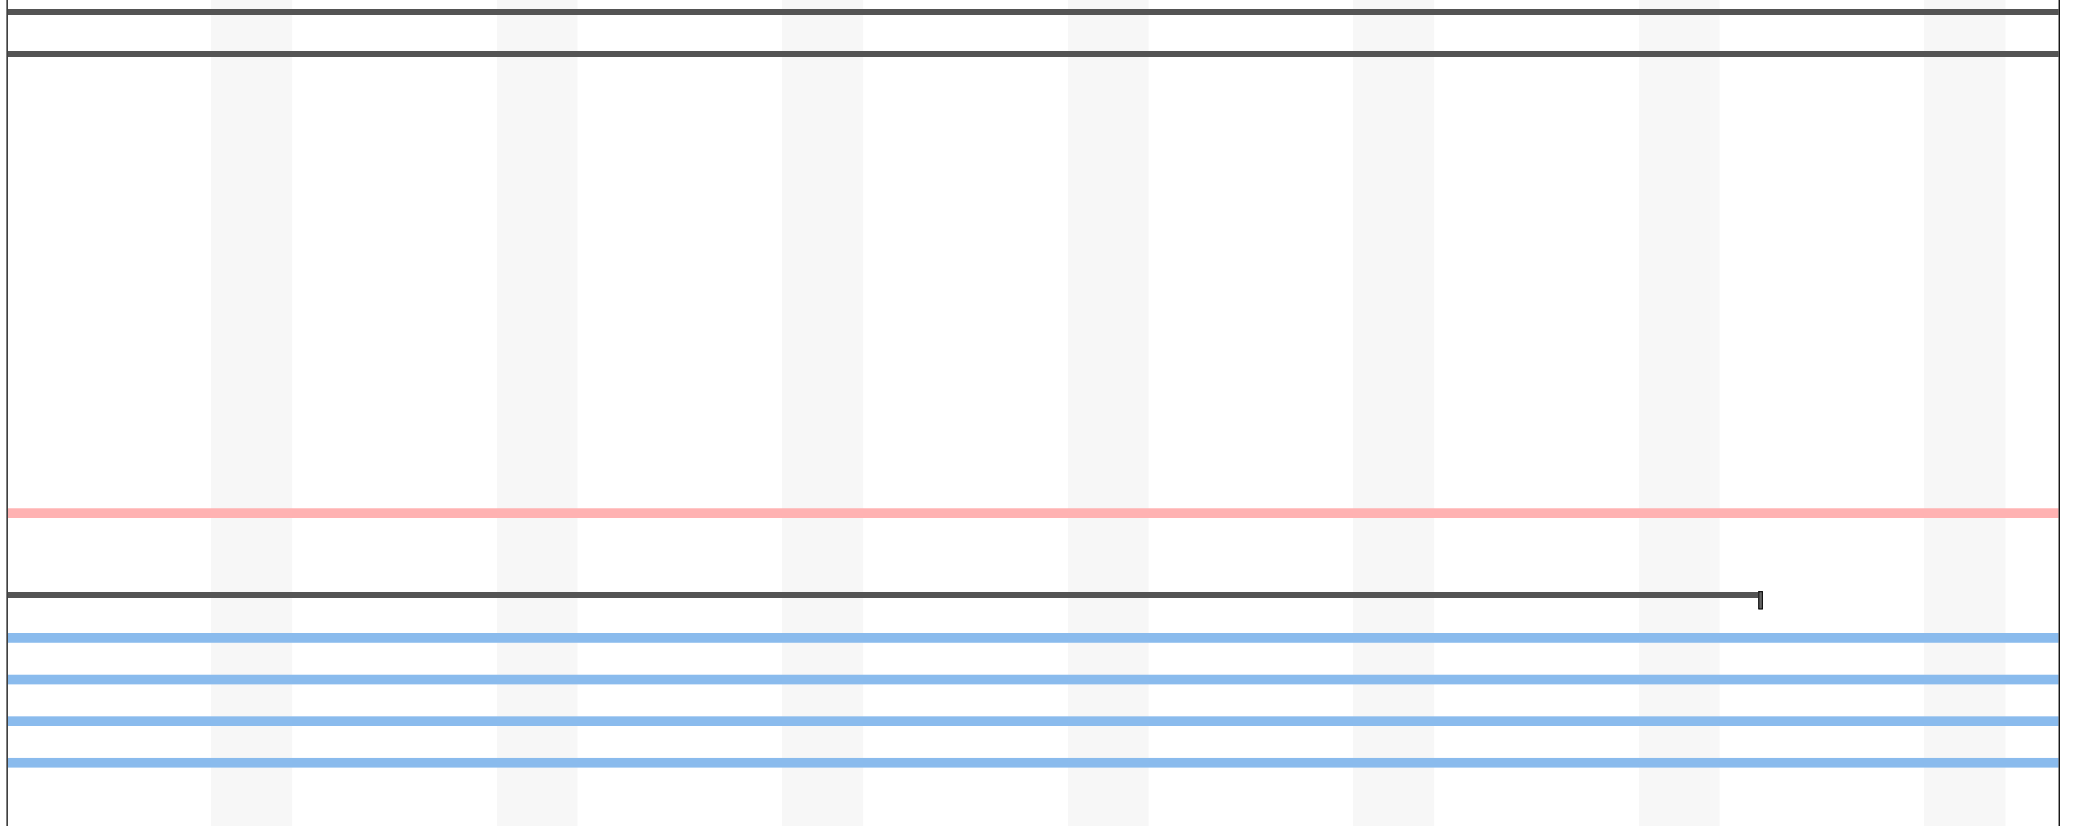

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

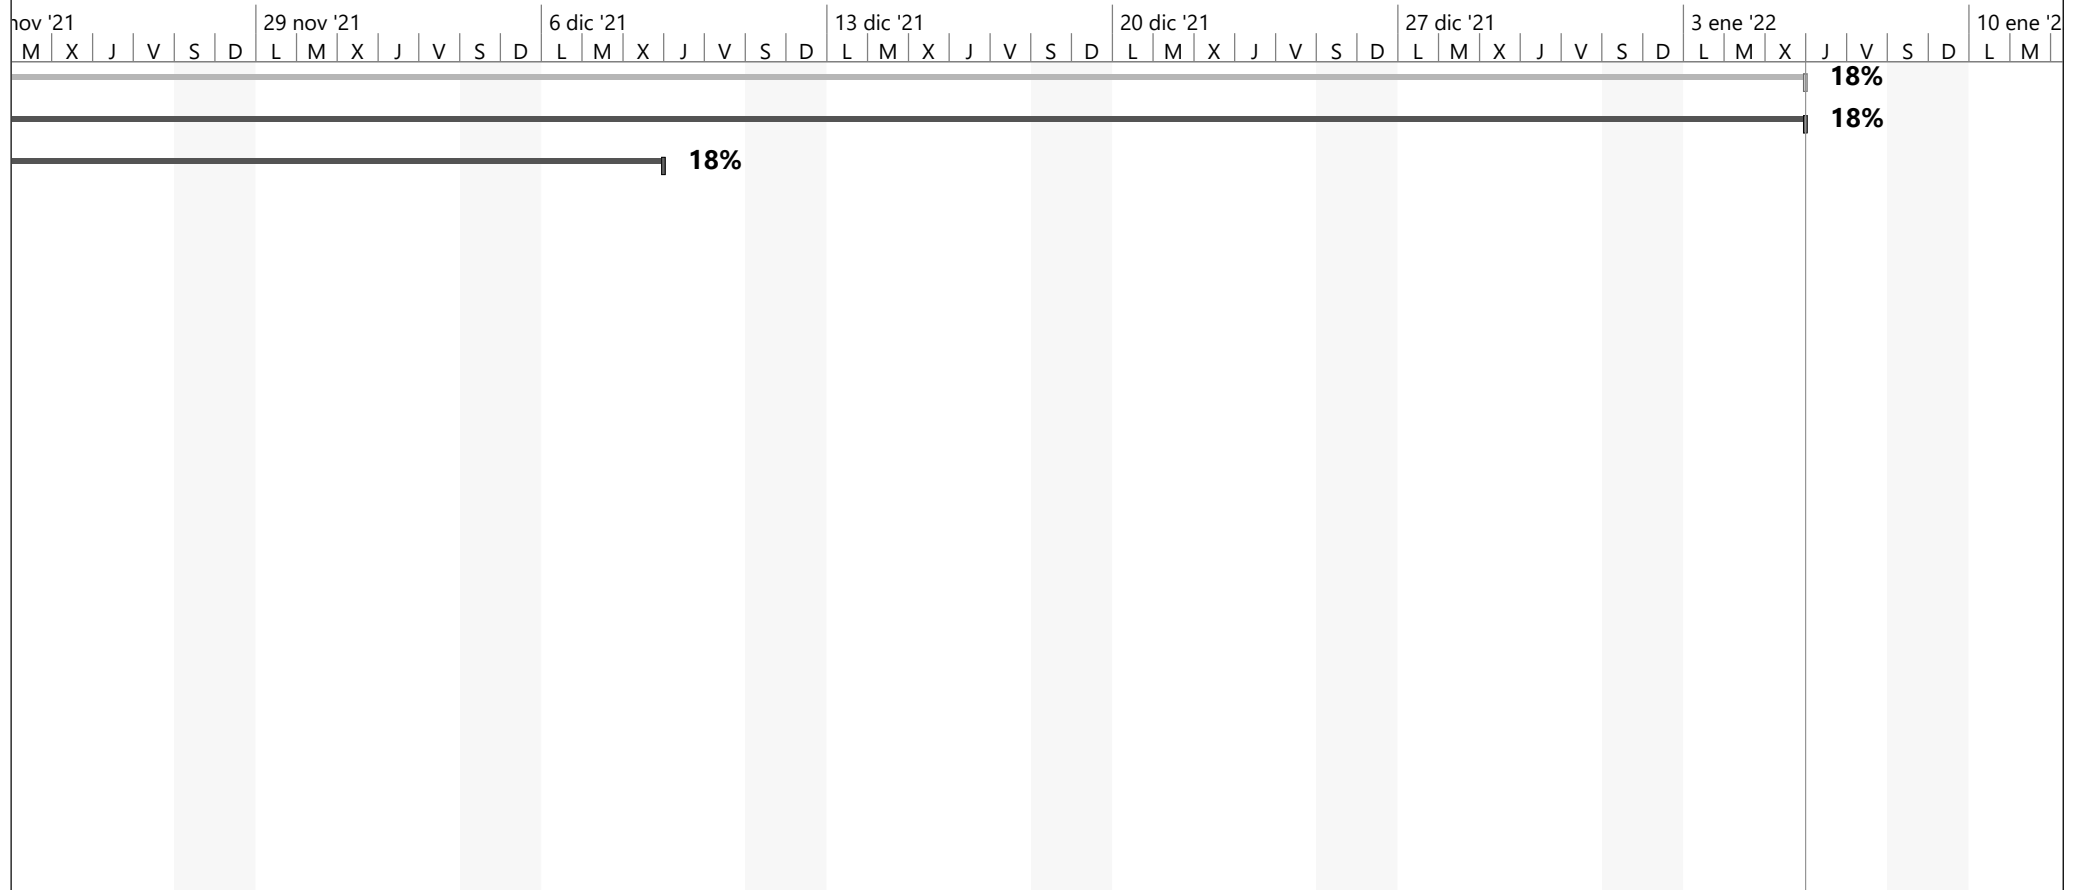

























| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |


[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución MAIM401-402 Febrero2021

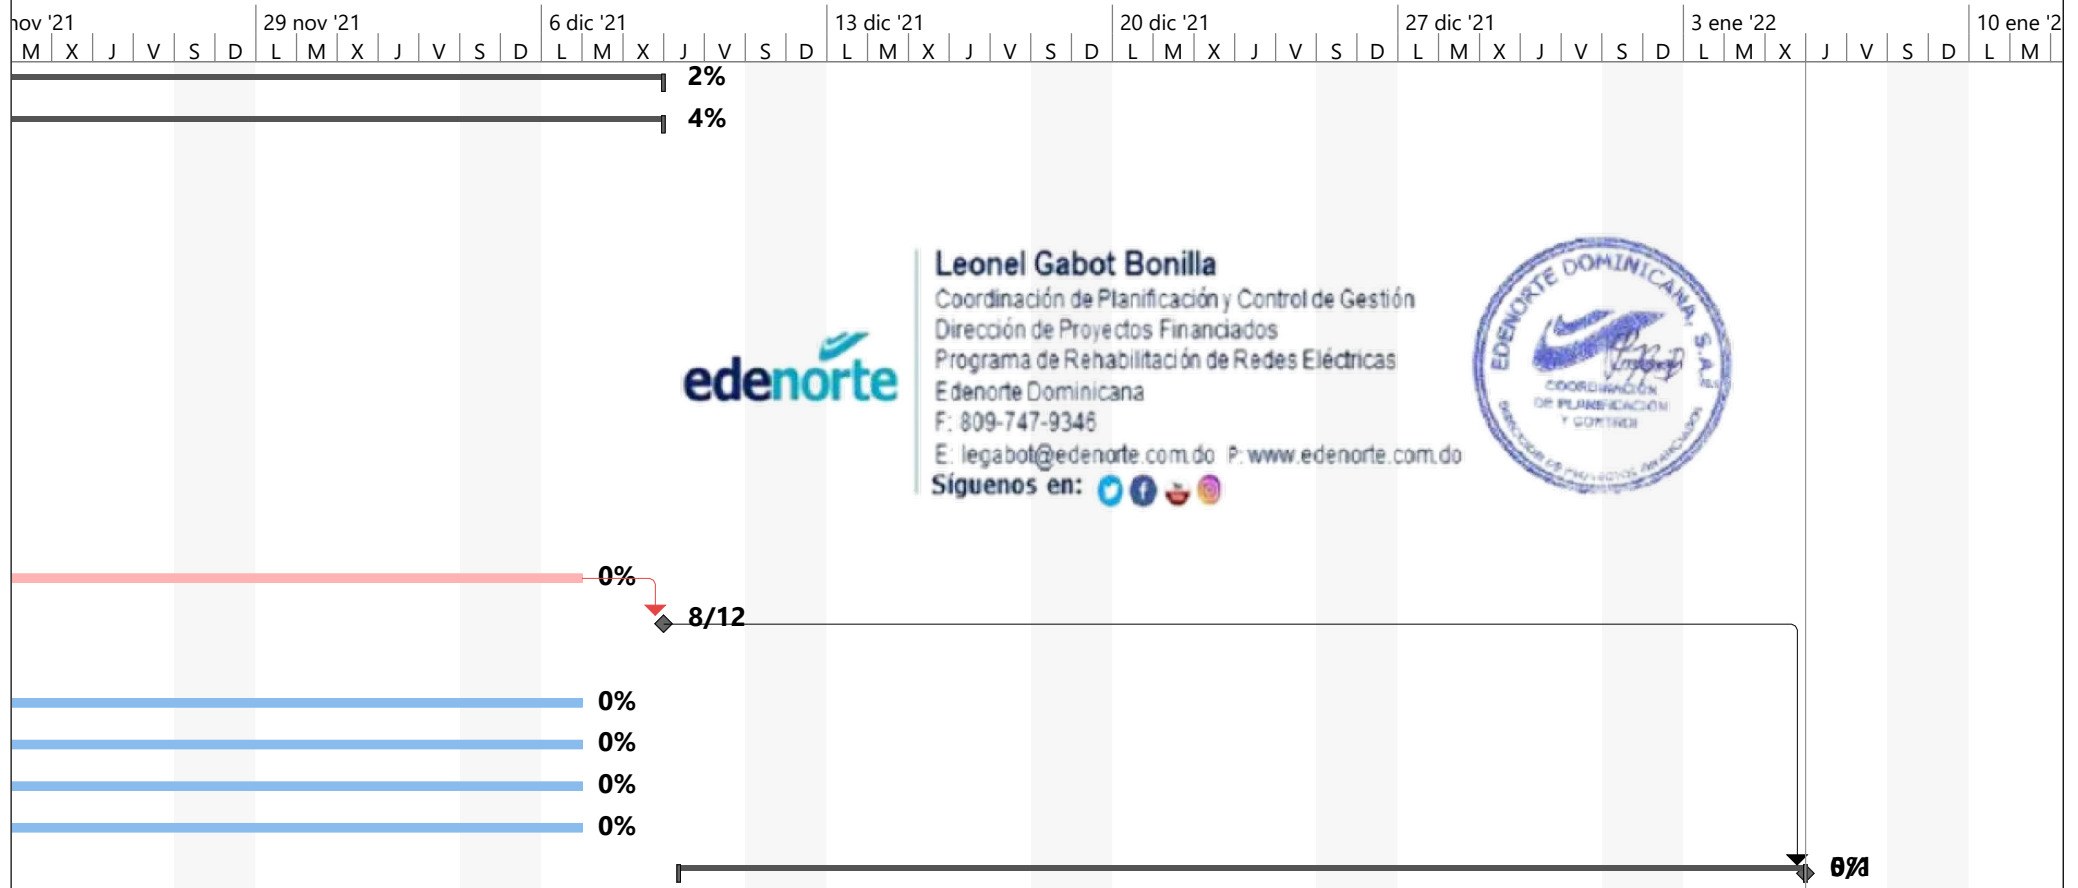

Leonel Gabot Bonilla
 Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana
 F: 809-747-9346
 E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do
 Síguenos en:

