













# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                         | Duración    | Comienzo     | Fin          | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |   |  |
|----|---|---|---|-------------|--------------|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|
|    |   |   |   |             |              |              | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D     | L | N |  |
| 1  |  |  | Rehabilitación de Redes CANA102         | 245.13 días | jue 15/11/18 | lun 4/11/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 2  |  |  | Adjudicación                            | 0 días      | lun 15/10/18 | lun 15/10/18 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 3  |  |  | Periodo de Adquisiciones                | 80 días     | jue 15/11/18 | lun 11/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 28 |  |  | Ejecución                               | 221 días    | jue 13/12/18 | mar 29/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 29 |  |  | Polígono 1                              | 99 días     | jue 13/12/18 | mar 7/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 30 |  |  | Instalación                             | 99 días     | jue 13/12/18 | mar 7/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 31 |  |  | Izado de postes                         | 3 días      | jue 13/12/18 | lun 17/12/18 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 32 |  |  | Cimentaciones                           | 4 días      | lun 17/12/18 | jue 20/12/18 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 33 |  |  | Retenidas                               | 4 días      | mar 12/3/19  | vie 15/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 34 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 11 días     | mar 12/3/19  | mar 26/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 35 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 5 días      | mié 20/3/19  | mar 26/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 36 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 4.95 días   | mié 20/3/19  | mié 10/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 37 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 4 días      | jue 2/5/19   | mar 7/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 38 |  |  | Transformadores                         | 4 días      | jue 21/3/19  | mar 26/3/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 39 |  |  | Alumbrado Publico                       | 7 días      | mié 27/3/19  | vie 5/4/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 40 |  |  | Normalización Suministros               | 9 días      | lun 1/4/19   | jue 11/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 41 |  |  | Remoción                                | 26 días     | mié 27/3/19  | vie 3/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 42 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 8 días      | mié 27/3/19  | jue 11/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 43 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 5 días      | mié 3/4/19   | mar 16/4/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 44 |  |  | Armados de Media Tensión                | 4 días      | lun 29/4/19  | vie 3/5/19   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |










































|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                        | Duración        | Comienzo            | Fin                | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |   |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|
|    |   |   |  |                 |                     |                    | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D     | L | N |
| 45 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 6 días          | mié 3/4/19          | mié 10/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 46 |  |  | Transformadores                        | 8 días          | jue 4/4/19          | lun 22/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 47 |  |  | Izado de postes                        | 7 días          | mar 9/4/19          | mié 17/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 48 |  |  | Cierre de Polígono 1                   | 0 días          | mié 17/4/19         | mié 17/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 49 |  |  | <b>Polígono 2</b>                      | <b>100 días</b> | <b>mar 18/12/18</b> | <b>lun 13/5/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 50 |  |  | <b>Instalación</b>                     | <b>94 días</b>  | <b>mar 18/12/18</b> | <b>vie 3/5/19</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 51 |  |  | Izado de postes                        | 5 días          | mar 18/12/18        | lun 24/12/18       |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 52 |  |  | Cimentaciones                          | 6 días          | vie 21/12/18        | vie 28/12/18       |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 53 |  |  | Retenidas                              | 6 días          | lun 18/3/19         | lun 25/3/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 54 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 11 días         | lun 18/3/19         | mar 2/4/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 55 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tens | 9 días          | vie 5/4/19          | mié 17/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 56 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 10 días         | vie 19/4/19         | vie 3/5/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 57 |  |  | Conexiones y Jumpers                   | 5 días          | vie 12/4/19         | jue 18/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 58 |  |  | Transformadores                        | 6 días          | jue 11/4/19         | jue 18/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 59 |  |  | Alumbrado Publico                      | 14 días         | vie 12/4/19         | jue 2/5/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 60 |  |  | Normalización Suministros              | 7 días          | vie 12/4/19         | lun 22/4/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 61 |  |  | <b>Remoción</b>                        | <b>16 días</b>  | <b>vie 19/4/19</b>  | <b>lun 13/5/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 62 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 12 días         | vie 19/4/19         | mar 7/5/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 63 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 11 días         | vie 19/4/19         | lun 6/5/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 64 |  |  | Armados de Media Tensión               | 3 días          | jue 9/5/19          | lun 13/5/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                        | Duración | Comienzo     | Fin          | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |
|----|---|---|--|----------|--------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|
|    |   |   |  |          |              |              |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |
| 65 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 4 días   | mar 30/4/19  | lun 6/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 66 |  |  | Transformadores                        | 6 días   | jue 25/4/19  | vie 3/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 67 |  |  | Izado de postes                        | 6 días   | lun 6/5/19   | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 68 |  |  | Cierre de Polígono 2                   | 0 días   | lun 13/5/19  | lun 13/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 69 |  |  | Polígono 3                             | 142 días | mar 25/12/18 | jue 18/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 70 |  |  | Instalación                            | 142 días | mar 25/12/18 | jue 18/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 71 |  |  | Izado de postes                        | 5 días   | mar 25/12/18 | lun 31/12/18 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 72 |  |  | Cimentaciones                          | 6 días   | lun 31/12/18 | mar 8/1/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 73 |  |  | Retenidas                              | 6 días   | mar 26/3/19  | mié 3/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 74 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 9 días   | mié 27/3/19  | mar 9/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 75 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten: | 10 días  | mié 3/4/19   | mar 16/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 76 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 6 días   | lun 17/6/19  | lun 8/7/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 77 |  |  | Conexiones y Jumpers                   | 5 días   | mié 26/6/19  | jue 11/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 78 |  |  | Transformadores                        | 4 días   | vie 19/4/19  | mié 24/4/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 79 |  |  | Alumbrado Publico                      | 8 días   | mar 9/7/19   | jue 18/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 80 |  |  | Normalización Suministros              | 15 días  | mar 23/4/19  | mar 14/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 81 |  |  | Remoción                               | 44 días  | mar 23/4/19  | mar 25/6/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 82 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 13 días  | mié 24/4/19  | jue 6/6/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 83 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 12 días  | mar 23/4/19  | vie 24/5/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 84 |  |  | Armados de Media Tensión               | 8 días   | vie 26/4/19  | mié 8/5/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                       | Duración  | Comienzo    | Fin         | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |   |  |
|-----|---|---|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|
|     |   |   |                                       |           |             |             | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D     | L | N |  |
| 85  |  |  | Armados de Baja Tensión               | 11 días   | mar 11/6/19 | mar 25/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 86  |  |  | Transformadores                       | 11 días   | mié 15/5/19 | lun 17/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 87  |  |  | Izado de postes                       | 14 días   | vie 17/5/19 | jue 6/6/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 88  |  |  | Cierre de Polígono 3                  | 0 días    | jue 6/6/19  | jue 6/6/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 89  |  |  | Polígono 4                            | 128 días  | mié 2/1/19  | vie 5/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 90  |  |  | Instalación                           | 128 días  | mié 2/1/19  | vie 5/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 91  |  |  | Izado de postes                       | 7 días    | mié 2/1/19  | jue 10/1/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 92  |  |  | Cimentaciones                         | 9 días    | mié 2/1/19  | lun 14/1/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 93  |  |  | Retenidas                             | 7 días    | jue 4/4/19  | vie 12/4/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 94  |  |  | Armados de Media y Baja Tensión       | 15 días   | mar 12/3/19 | jue 25/4/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 95  |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten | 59 días   | mié 3/4/19  | vie 5/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 96  |  |  | Elementos de Protección y Maniobra    | 6 días    | vie 14/6/19 | mié 3/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 97  |  |  | Conexiones y Jumpers                  | 9 días    | mié 22/5/19 | vie 7/6/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 98  |  |  | Transformadores                       | 9 días    | mié 24/4/19 | mié 15/5/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 99  |  |  | Alumbrado Publico                     | 13 días   | lun 6/5/19  | mié 22/5/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 100 |  |  | Normalización Suministros             | 11 días   | mié 15/5/19 | mié 29/5/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 101 |  |  | Remoción                              | 47 días   | lun 29/4/19 | jue 4/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 102 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión    | 24.7 días | lun 29/4/19 | mié 19/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 103 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión     | 14 días   | lun 27/5/19 | lun 24/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 104 |  |  | Armados de Media Tensión              | 3 días    | mar 18/6/19 | jue 4/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                        | Duración  | Comienzo    | Fin         | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |   |  |
|-----|---|---|--|-----------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|
|     |   |   |  |           |             |             | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D     | L | N |  |
| 105 |  |  | Armados de Baja Tensión                | 4 días    | vie 21/6/19 | mié 26/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 106 |  |  | Transformadores                        | 4.75 días | mar 28/5/19 | vie 7/6/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 107 |  |  | Izado de postes                        | 6 días    | jue 13/6/19 | jue 20/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 108 |  |  | Cierre de Polígono 4                   | 0 días    | vie 21/6/19 | vie 21/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 109 |  |  | Polígono 5                             | 171 días  | vie 11/1/19 | lun 16/9/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 110 |  |  | Instalación                            | 130 días  | vie 11/1/19 | jue 18/7/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 111 |  |  | Izado de postes                        | 3 días    | vie 11/1/19 | mar 15/1/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 112 |  |  | Cimentaciones                          | 5 días    | mar 15/1/19 | mar 22/1/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 113 |  |  | Retenidas                              | 3 días    | lun 15/4/19 | mié 17/4/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 114 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión        | 12 días   | mié 27/3/19 | mié 22/5/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 115 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Ten: | 6 días    | jue 2/5/19  | jue 9/5/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 116 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra     | 4 días    | jue 13/6/19 | jue 18/7/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 117 |  |  | Conexiones y Jumpers                   | 4 días    | lun 10/6/19 | jue 13/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 118 |  |  | Transformadores                        | 5 días    | mar 14/5/19 | lun 20/5/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 119 |  |  | Alumbrado Publico                      | 5 días    | lun 20/5/19 | vie 24/5/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 120 |  |  | Normalización Suministros              | 20 días   | jue 30/5/19 | jue 27/6/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 121 |  |  | Remoción                               | 69 días   | mar 11/6/19 | lun 16/9/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 122 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión     | 8 días    | mar 11/6/19 | jue 4/7/19  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 123 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión      | 8 días    | jue 27/6/19 | lun 12/8/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |
| 124 |  |  | Armados de Media Tensión               | 5 días    | mar 6/8/19  | lun 16/9/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                           | Duración        | Comienzo           | Fin                | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |
|-----|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
|     |   |   |   |                 |                    |                    | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M |
| 125 |  |  | Armados de Baja Tensión                   | 7 días          | mié 7/8/19         | lun 16/9/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 126 |  |  | Transformadores                           | 10 días         | vie 28/6/19        | jue 1/8/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 127 |  |  | Izado de postes                           | 9 días          | vie 2/8/19         | mié 14/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 128 |  |  | Cierre de Polígono 5                      | 0 días          | mié 14/8/19        | mié 14/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 129 |  |  | <b>Polígono 6</b>                         | <b>159 días</b> | <b>mié 16/1/19</b> | <b>mar 3/9/19</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 130 |  |  | <b>Instalación</b>                        | <b>152 días</b> | <b>mié 16/1/19</b> | <b>vie 23/8/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 131 |  |  | Izado de postes                           | 5 días          | mié 16/1/19        | mié 23/1/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 132 |  |  | Cimentaciones                             | 5 días          | mié 16/1/19        | mié 23/1/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 133 |  |  | Retenidas                                 | 5 días          | lun 18/3/19        | vie 22/3/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 134 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión           | 15 días         | jue 2/5/19         | lun 27/5/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 135 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensión | 12 días         | jue 23/5/19        | lun 10/6/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 136 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra        | 6 días          | jue 6/6/19         | vie 12/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 137 |  |  | Conexiones y Jumpers                      | 6 días          | lun 27/5/19        | mar 4/6/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 138 |  |  | Transformadores                           | 6 días          | jue 30/5/19        | vie 7/6/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 139 |  |  | Alumbrado Publico                         | 8 días          | mar 13/8/19        | vie 23/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 140 |  |  | Normalización Suministros                 | 8 días          | vie 28/6/19        | mar 9/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 141 |  |  | <b>Remoción</b>                           | <b>61 días</b>  | <b>lun 10/6/19</b> | <b>mar 3/9/19</b>  |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 142 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión        | 12 días         | lun 10/6/19        | lun 1/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 143 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión         | 5 días          | mar 2/7/19         | mié 24/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 144 |  |  | Armados de Media Tensión                  | 10 días         | mar 6/8/19         | vie 23/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                         | Duración        | Comienzo           | Fin                | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |   |
|-----|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|
|     |   |   |   |                 |                    |                    | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D     | L | N |
| 145 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 14 días         | lun 12/8/19        | mar 3/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 146 |  |  | Transformadores                         | 10 días         | mar 2/7/19         | jue 25/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 147 |  |  | Izado de postes                         | 18 días         | vie 26/7/19        | mié 21/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 148 |  |  | Cierre de Polígono 6                    | 0 días          | mié 21/8/19        | mié 21/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 149 |  |  | <b>Polígono 7</b>                       | <b>162 días</b> | <b>jue 24/1/19</b> | <b>vie 13/9/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 150 |  |  | <b>Instalación</b>                      | <b>162 días</b> | <b>jue 24/1/19</b> | <b>vie 13/9/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 151 |  |  | Izado de postes                         | 8 días          | jue 24/1/19        | lun 4/2/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 152 |  |  | Cimentaciones                           | 9 días          | jue 24/1/19        | mar 5/2/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 153 |  |  | Retenidas                               | 9 días          | mar 26/3/19        | lun 8/4/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 154 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 27.34 días      | mar 12/3/19        | jue 11/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 155 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 16 días         | lun 10/6/19        | lun 1/7/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 156 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 12 días         | mié 19/6/19        | mar 27/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 157 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 9 días          | mar 20/8/19        | lun 9/9/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 158 |  |  | Transformadores                         | 6 días          | mié 3/7/19         | mié 10/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 159 |  |  | Alumbrado Publico                       | 16 días         | vie 23/8/19        | vie 13/9/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 160 |  |  | Normalización Suministros               | 8 días          | mié 10/7/19        | vie 19/7/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 161 |  |  | <b>Remoción</b>                         | <b>32 días</b>  | <b>vie 26/7/19</b> | <b>mar 10/9/19</b> |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 162 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 17 días         | mié 31/7/19        | jue 29/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 163 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 7 días          | vie 26/7/19        | lun 5/8/19         |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |
| 164 |  |  | Armados de Media Tensión                | 1 día           | vie 30/8/19        | vie 30/8/19        |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |   |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

























| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                         | Duración        | Comienzo          | Fin                 | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |  |
|-----|---|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|
|     |   |   |   |                 |                   |                     |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |  |
| 165 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 2 días          | lun 19/8/19       | mié 28/8/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 166 |  |  | Transformadores                         | 1 día           | mar 6/8/19        | mar 6/8/19          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 167 |  |  | Izado de postes                         | 2 días          | lun 9/9/19        | mar 10/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 168 |  |  | Cierre de Polígono 7                    | 0 días          | mar 10/9/19       | mar 10/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 169 |  |  | <b>Polígono 8</b>                       | <b>185 días</b> | <b>mar 5/2/19</b> | <b>mar 29/10/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 170 |  |  | <b>Instalación</b>                      | <b>185 días</b> | <b>mar 5/2/19</b> | <b>mar 29/10/19</b> |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 171 |  |  | Izado de postes                         | 4 días          | mar 5/2/19        | vie 8/2/19          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 172 |  |  | Cimentaciones                           | 4 días          | mar 5/2/19        | vie 8/2/19          |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 173 |  |  | Retenidas                               | 3 días          | jue 18/4/19       | lun 22/4/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 174 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 20 días         | lun 1/7/19        | vie 26/7/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 175 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 20 días         | lun 1/7/19        | vie 26/7/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 176 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días          | vie 20/9/19       | mar 29/10/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 177 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 5 días          | vie 30/8/19       | jue 10/10/19        |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 178 |  |  | Transformadores                         | 5 días          | lun 15/7/19       | vie 19/7/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 179 |  |  | Alumbrado Publico                       | 7 días          | mié 17/7/19       | jue 25/7/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 180 |  |  | Normalización Suministros               | 17 días         | lun 22/7/19       | mar 13/8/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 181 |  |  | <b>Remoción</b>                         | <b>40 días</b>  | <b>vie 9/8/19</b> | <b>lun 7/10/19</b>  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 182 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 11 días         | vie 9/8/19        | vie 13/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 183 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 6 días          | mar 3/9/19        | mar 10/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |
| 184 |  |  | Armados de Media Tensión                | 4 días          | lun 16/9/19       | jue 19/9/19         |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                         | Duración   | Comienzo    | Fin          | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 ab |   |  |
|-----|---|---|---|------------|-------------|--------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--|
|     |   |   |   |            |             |              |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L     | N |  |
| 185 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 5 días     | mar 17/9/19 | lun 23/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 186 |  |  | Transformadores                         | 3 días     | lun 23/9/19 | jue 26/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 187 |  |  | Izado de postes                         | 6 días     | vie 27/9/19 | lun 7/10/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 188 |  |  | Cierre de Polígono 8                    | 0 días     | lun 7/10/19 | lun 7/10/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 189 |  |  | Polígono 9                              | 173 días   | lun 11/2/19 | jue 17/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 190 |  |  | Instalación                             | 173 días   | lun 11/2/19 | jue 17/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 191 |  |  | Izado de postes                         | 4 días     | lun 11/2/19 | jue 14/2/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 192 |  |  | Cimentaciones                           | 5 días     | lun 11/2/19 | vie 15/2/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 193 |  |  | Retenidas                               | 4 días     | lun 25/3/19 | jue 28/3/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 194 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 16.08 días | mar 12/3/19 | vie 5/4/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 195 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 13 días    | lun 1/7/19  | mié 21/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 196 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días     | jue 8/8/19  | vie 27/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 197 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 3 días     | mar 8/10/19 | jue 17/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 198 |  |  | Transformadores                         | 5 días     | mar 30/7/19 | lun 5/8/19   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 199 |  |  | Alumbrado Publico                       | 8 días     | lun 2/9/19  | lun 7/10/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 200 |  |  | Normalización Suministros               | 11 días    | mié 14/8/19 | jue 29/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 201 |  |  | Remoción                                | 26 días    | mar 20/8/19 | mié 25/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 202 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 6 días     | mié 28/8/19 | jue 12/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 203 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 4 días     | mar 20/8/19 | lun 26/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |
| 204 |  |  | Armados de Media Tensión                | 6 días     | vie 13/9/19 | vie 20/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |       |   |  |












|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea                         | Duración | Comienzo    | Fin         | D | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |  |
|-----|---|---|---|----------|-------------|-------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|
|     |   |   |   |          |             |             |   | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | N |  |
| 205 |  |  | Armados de Baja Tensión                 | 9 días   | lun 2/9/19  | jue 12/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 206 |  |  | Transformadores                         | 6 días   | mar 27/8/19 | mar 3/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 207 |  |  | Izado de postes                         | 12 días  | mié 4/9/19  | mié 25/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 208 |  |  | Cierre de Polígono 9                    | 0 días   | mié 25/9/19 | mié 25/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 209 |  |  | Polígono 10                             | 162 días | vie 15/2/19 | mar 8/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 210 |  |  | Instalación                             | 145 días | vie 15/2/19 | jue 12/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 211 |  |  | Izado de postes                         | 7 días   | vie 15/2/19 | lun 25/2/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 212 |  |  | Cimentaciones                           | 9 días   | vie 15/2/19 | jue 28/2/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 213 |  |  | Retenidas                               | 7 días   | mar 9/4/19  | mié 17/4/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 214 |  |  | Armados de Media y Baja Tensión         | 14 días  | mar 12/3/19 | mié 26/6/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 215 |  |  | Tendido de Conductor Media y Baja Tensi | 16 días  | lun 10/6/19 | lun 1/7/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 216 |  |  | Elementos de Protección y Maniobra      | 6 días   | lun 5/8/19  | mar 3/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 217 |  |  | Conexiones y Jumpers                    | 4 días   | lun 19/8/19 | vie 30/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 218 |  |  | Transformadores                         | 3 días   | jue 1/8/19  | lun 5/8/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 219 |  |  | Alumbrado Publico                       | 8 días   | lun 5/8/19  | mié 14/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 220 |  |  | Normalización Suministros               | 10 días  | vie 30/8/19 | jue 12/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 221 |  |  | Remoción                                | 50 días  | lun 29/7/19 | mar 8/10/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 222 |  |  | Tendido de Conductor Media Tensión      | 18 días  | lun 29/7/19 | lun 26/8/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 223 |  |  | Tendido de Conductor Baja Tensión       | 10 días  | lun 2/9/19  | vie 13/9/19 |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |
| 224 |  |  | Armados de Media Tensión                | 5 días   | mar 27/8/19 | lun 2/9/19  |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |  |

























|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| Id  |  | Modo de tarea   | Nombre de tarea         | Duración | Comienzo    | Fin         | 2 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '18 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '18 |   |   |  |
|-----|---|---|-------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|
|     |   |   |                         |          |             |             | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M |  |
| 225 |  |  | Armados de Baja Tensión | 8 días   | mié 25/9/19 | mar 8/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 226 |  |  | Transformadores         | 5 días   | lun 16/9/19 | vie 20/9/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 227 |  |  | Izado de postes         | 10 días  | lun 23/9/19 | lun 7/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 228 |  |  | Cierre de Polígono 10   | 0 días   | lun 7/10/19 | lun 7/10/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 229 |  |  | Cierre de Obras         | 20 días  | mar 8/10/19 | lun 4/11/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

























|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

|  |
|--|
| <p>Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021</p> |
|--|

[illegible]

























|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

|   |   |   | 11 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 18 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 25 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 2 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 9 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 16 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 23 jul '18 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



























Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

























|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

























|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

























|   |   |   | 11 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 18 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 25 jun '18 |   |   |   |   |   |   | 2 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 9 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 16 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 23 jul '18 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| 30 jul '18 |   |   |   |   |   |   | 6 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 13 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 20 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 27 ago '18 |   |   |   |   |   |   | 3 sep '18 |   |   |   |   |   |   | 10 sep '18 |   |   |  |  |  |  | 17 sep '18 |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|
| L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X |  |  |  |  |            |  |  |
|            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |  |  |  |            |  |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

























|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

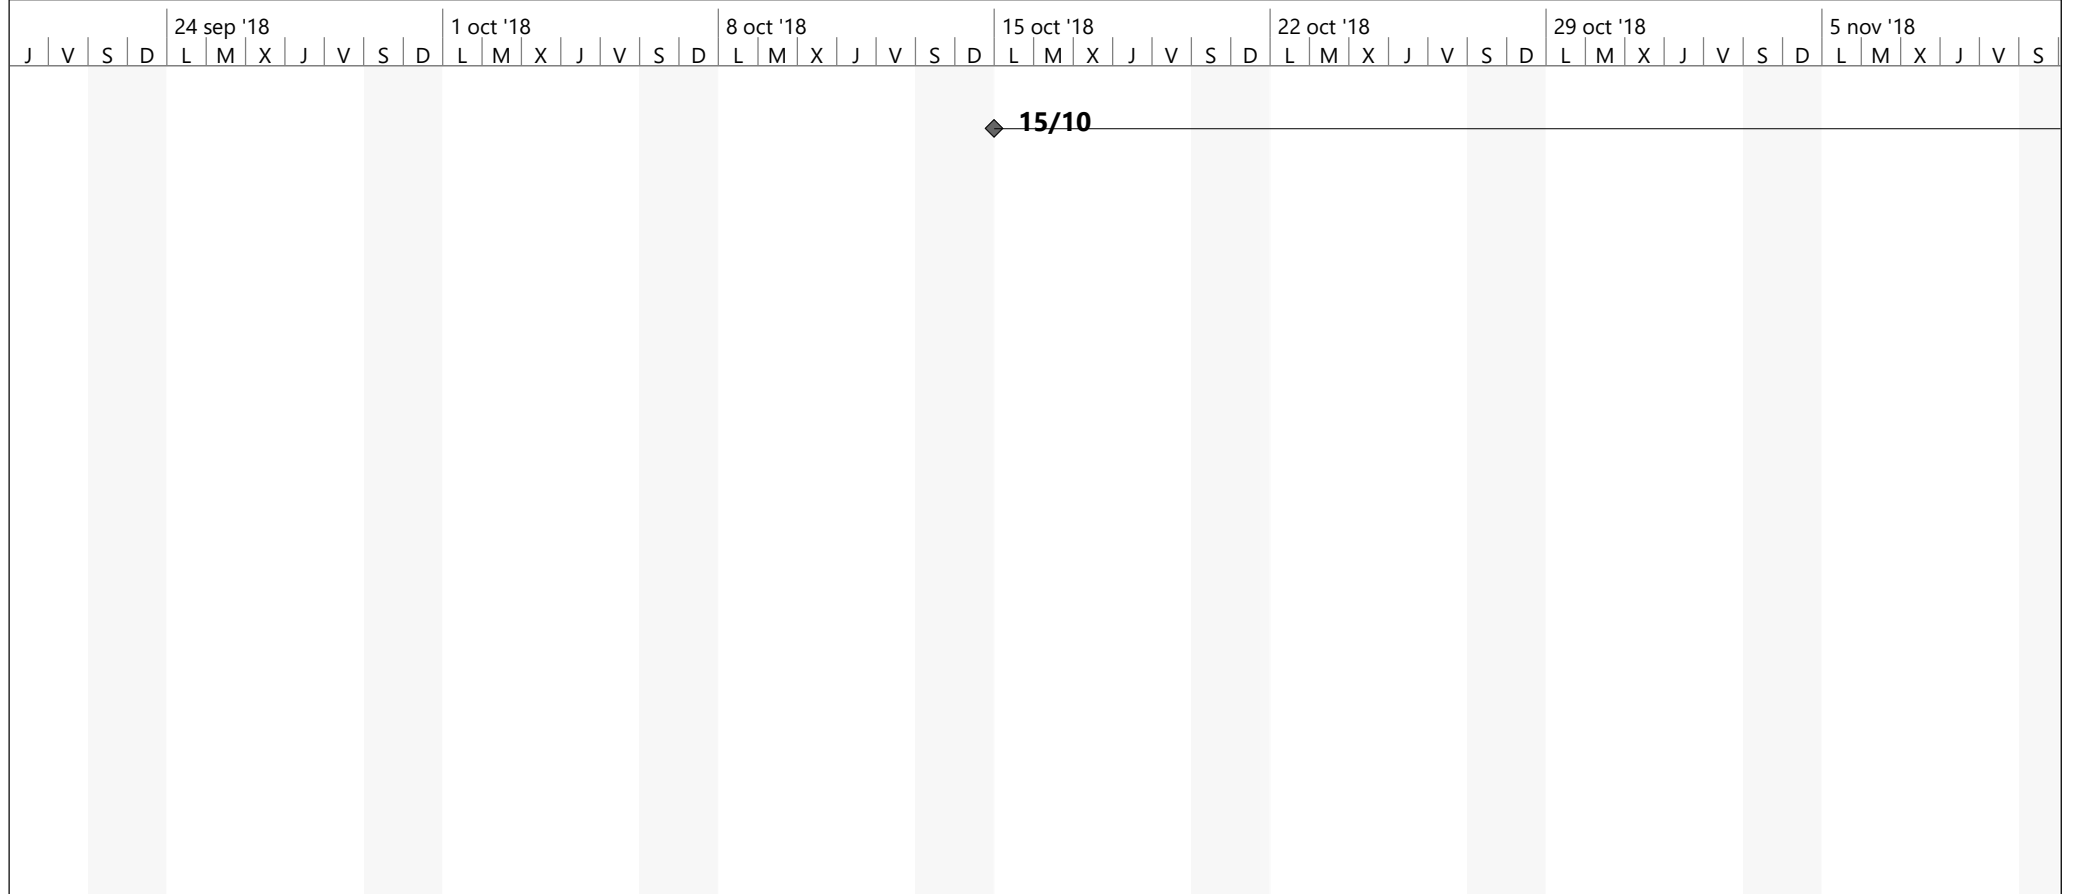


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

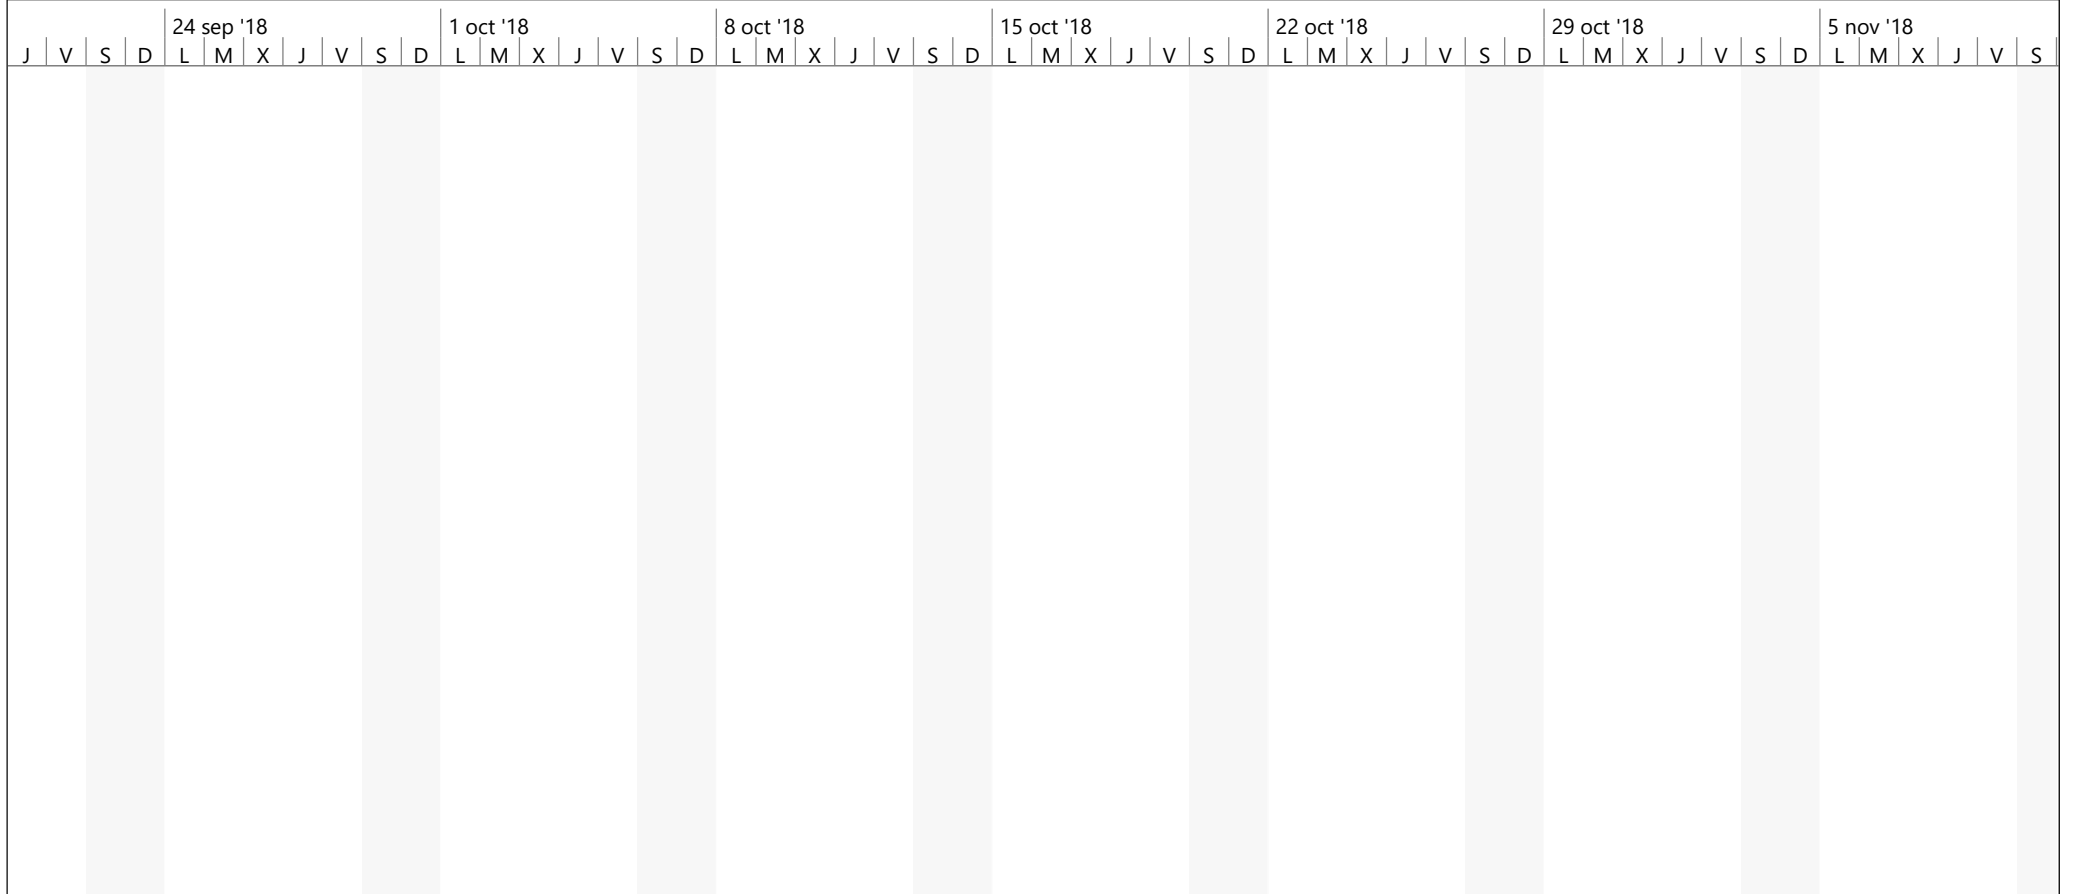


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

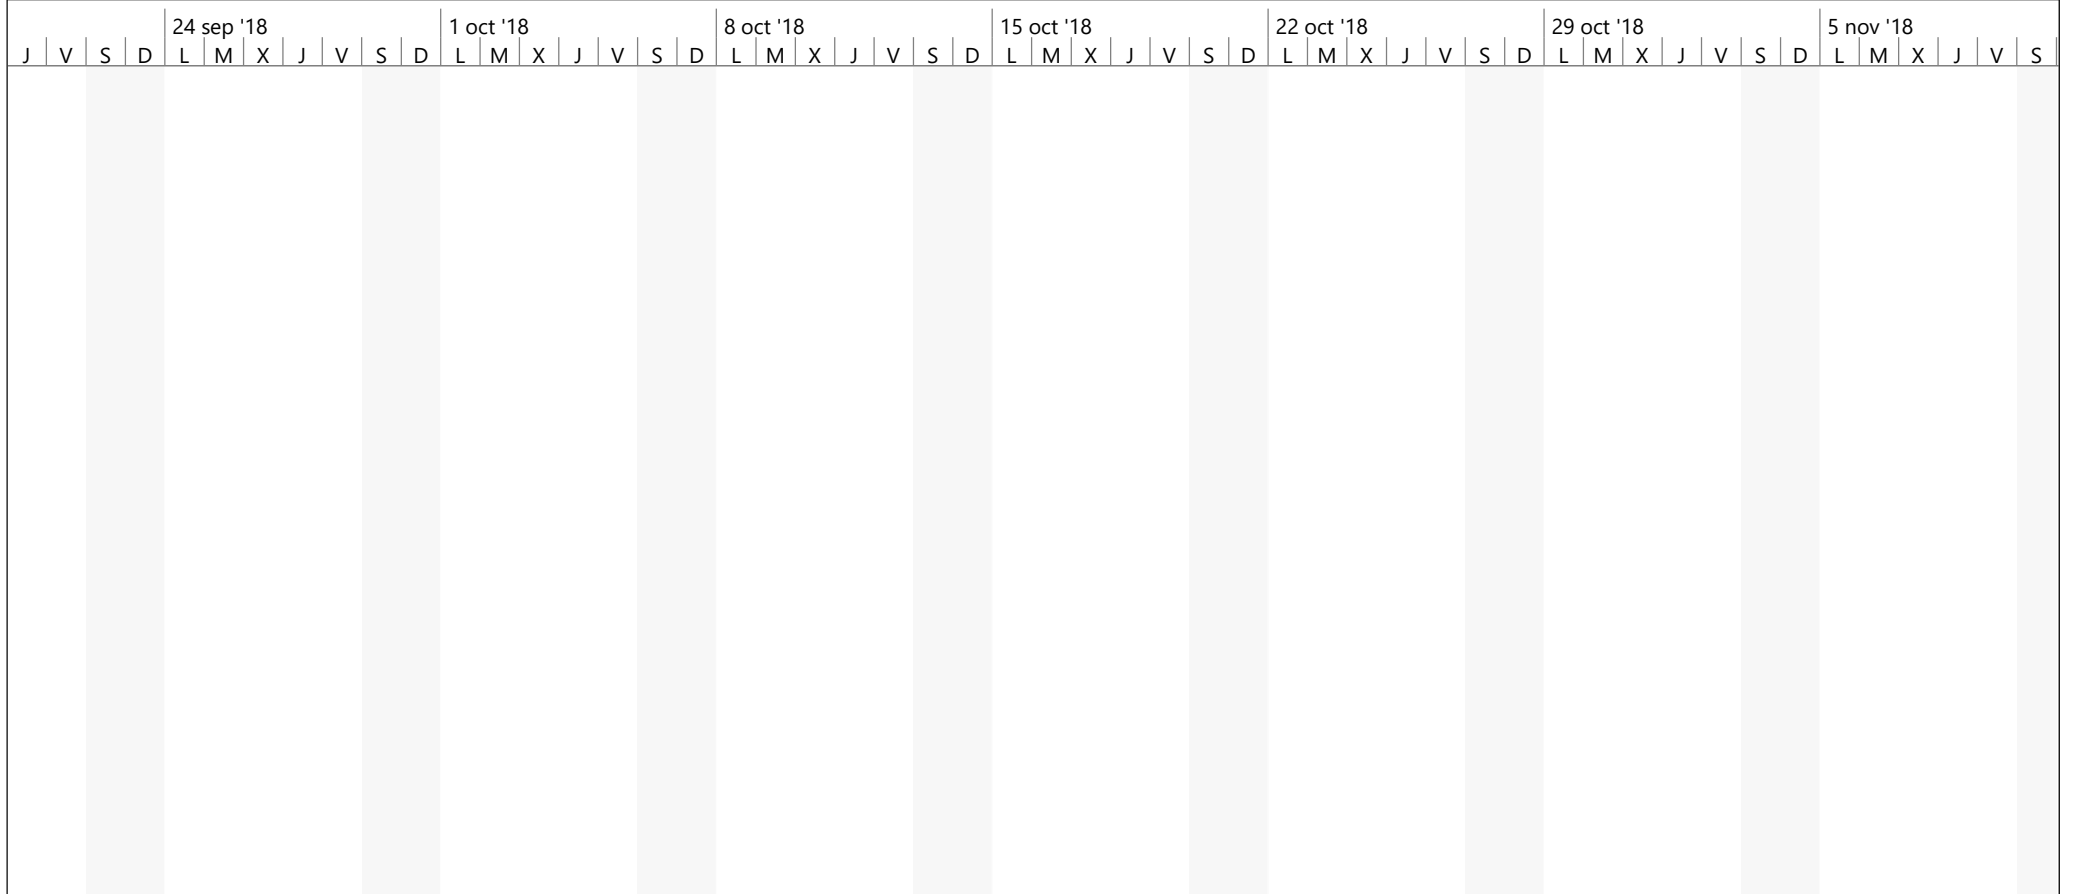

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

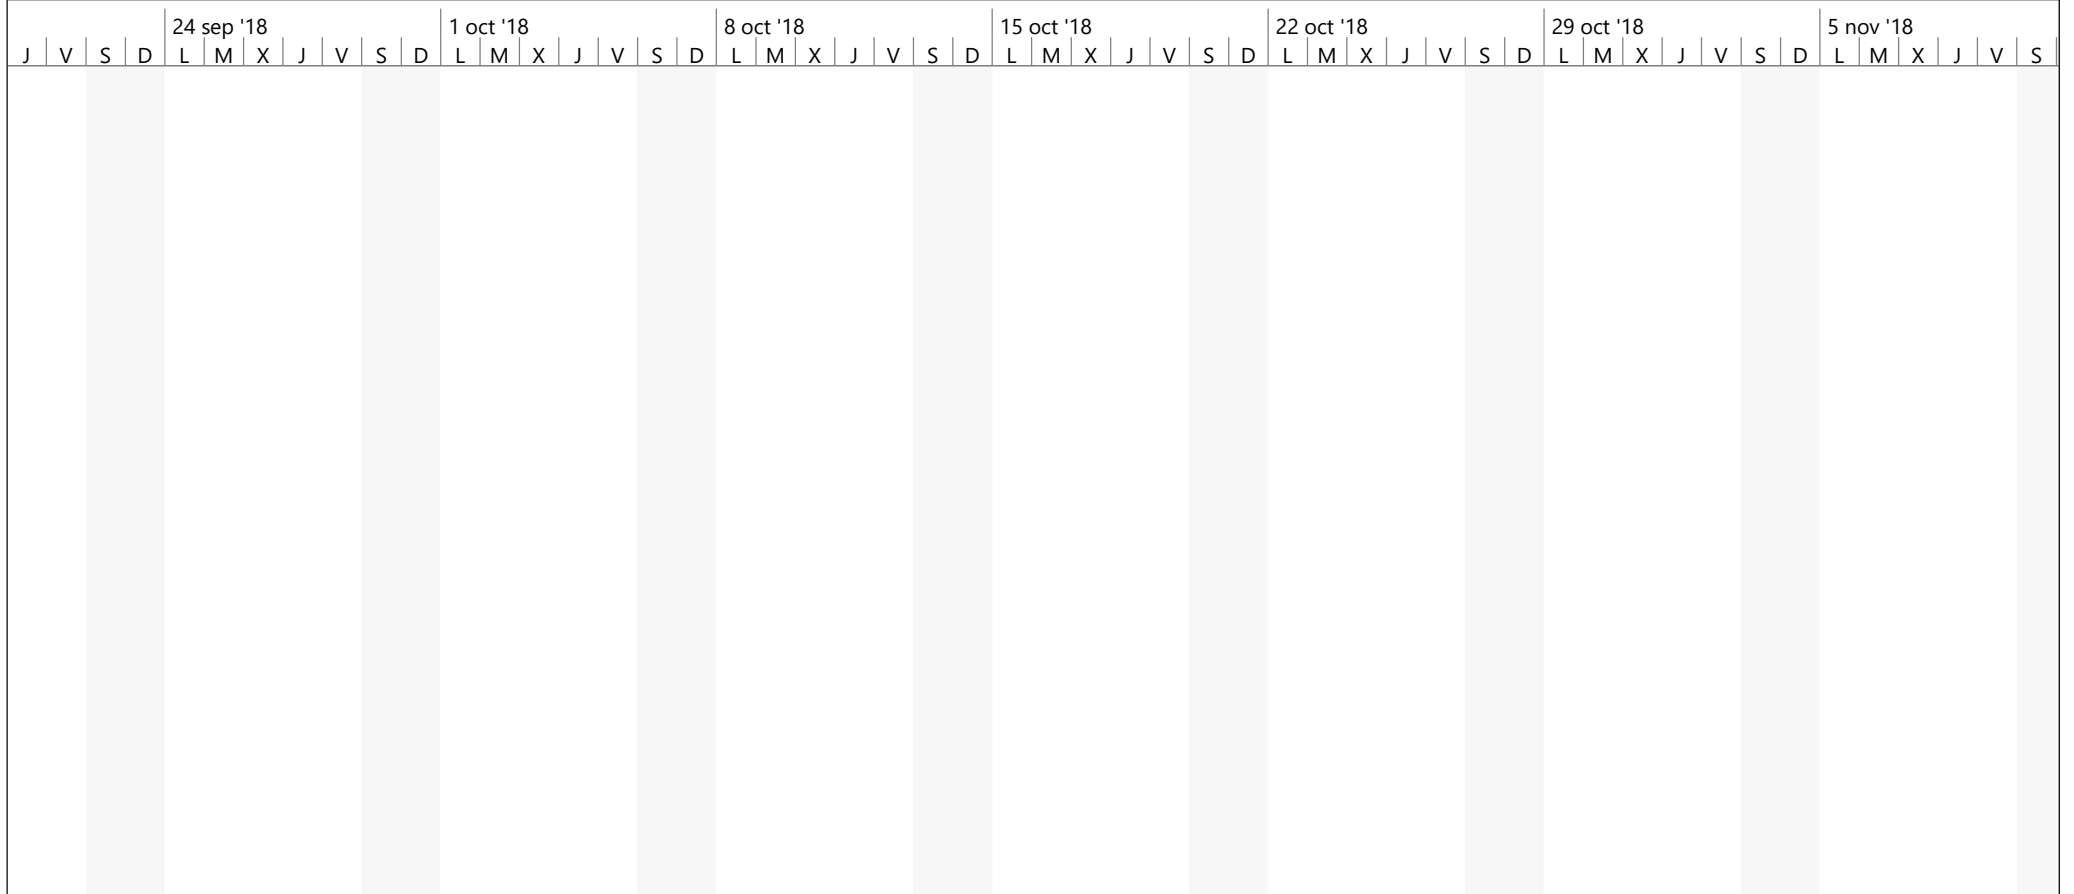

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |






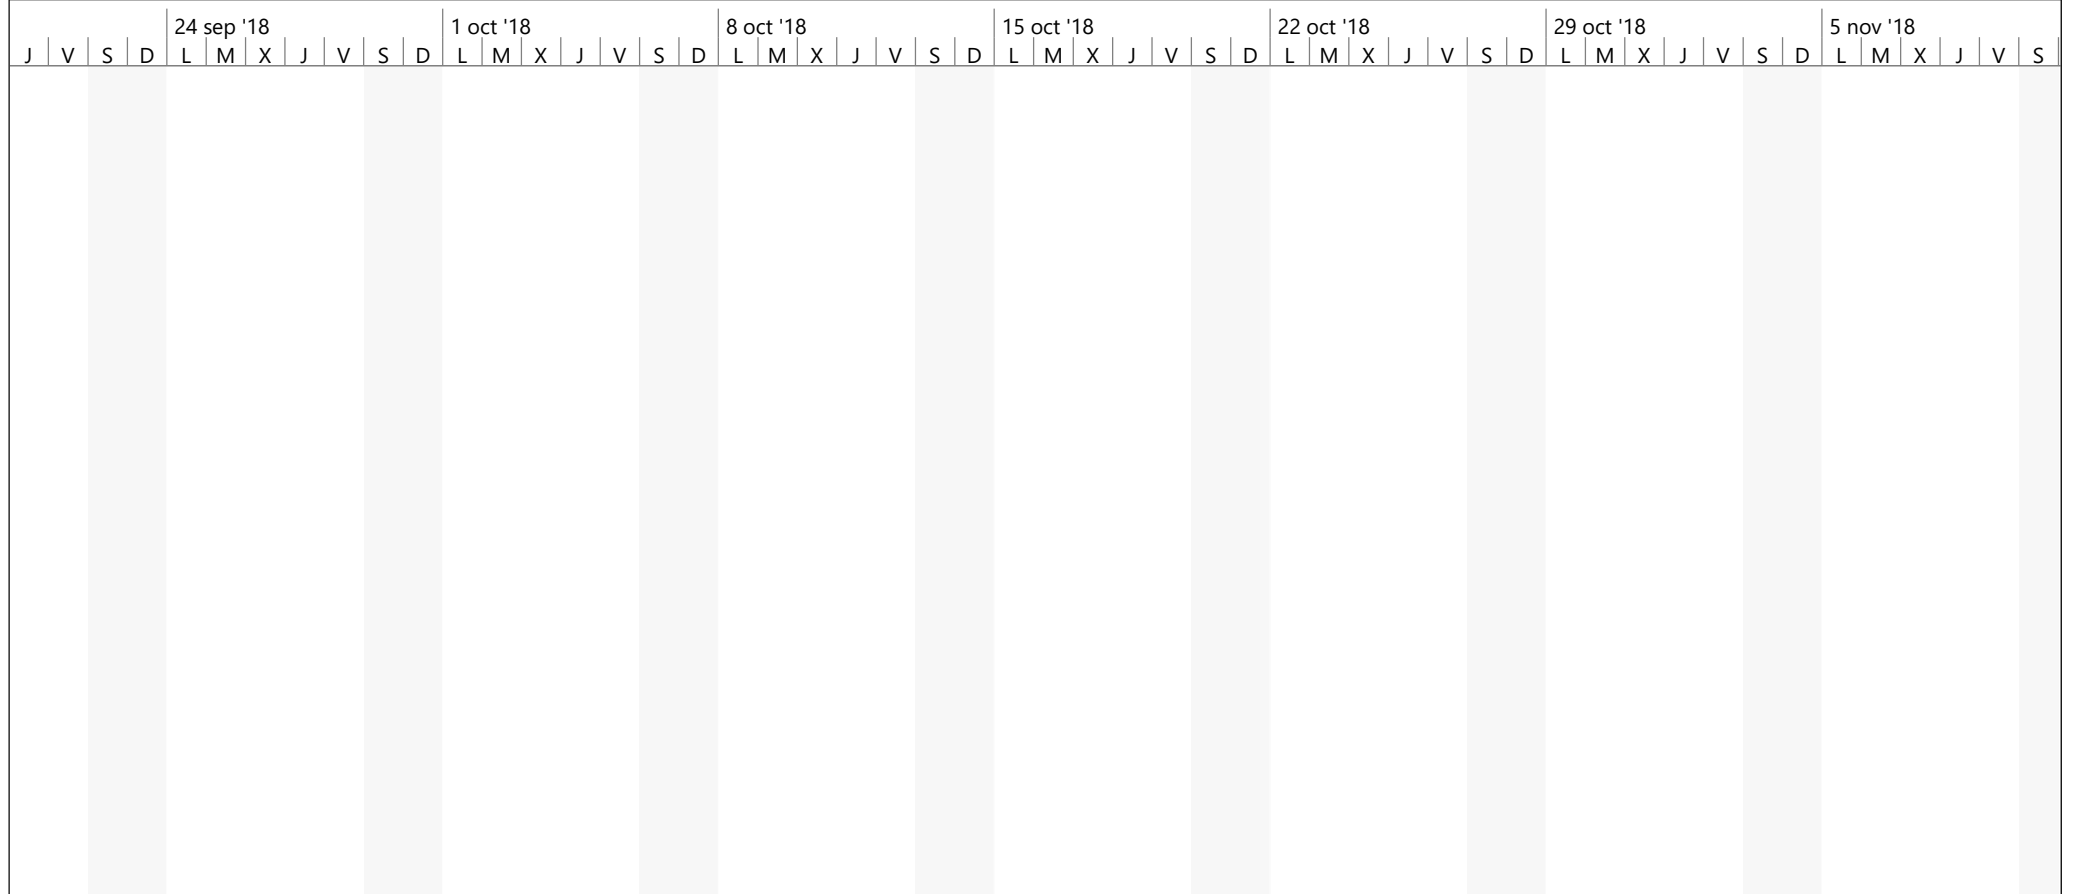




















# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

|   |   |   |   | 24 sep '18 |   |   |   | 1 oct '18 |   |   |   | 8 oct '18 |   |   |   | 15 oct '18 |   |   |   | 22 oct '18 |   |   |   | 29 oct '18 |   |   |   | 5 nov '18 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V         | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

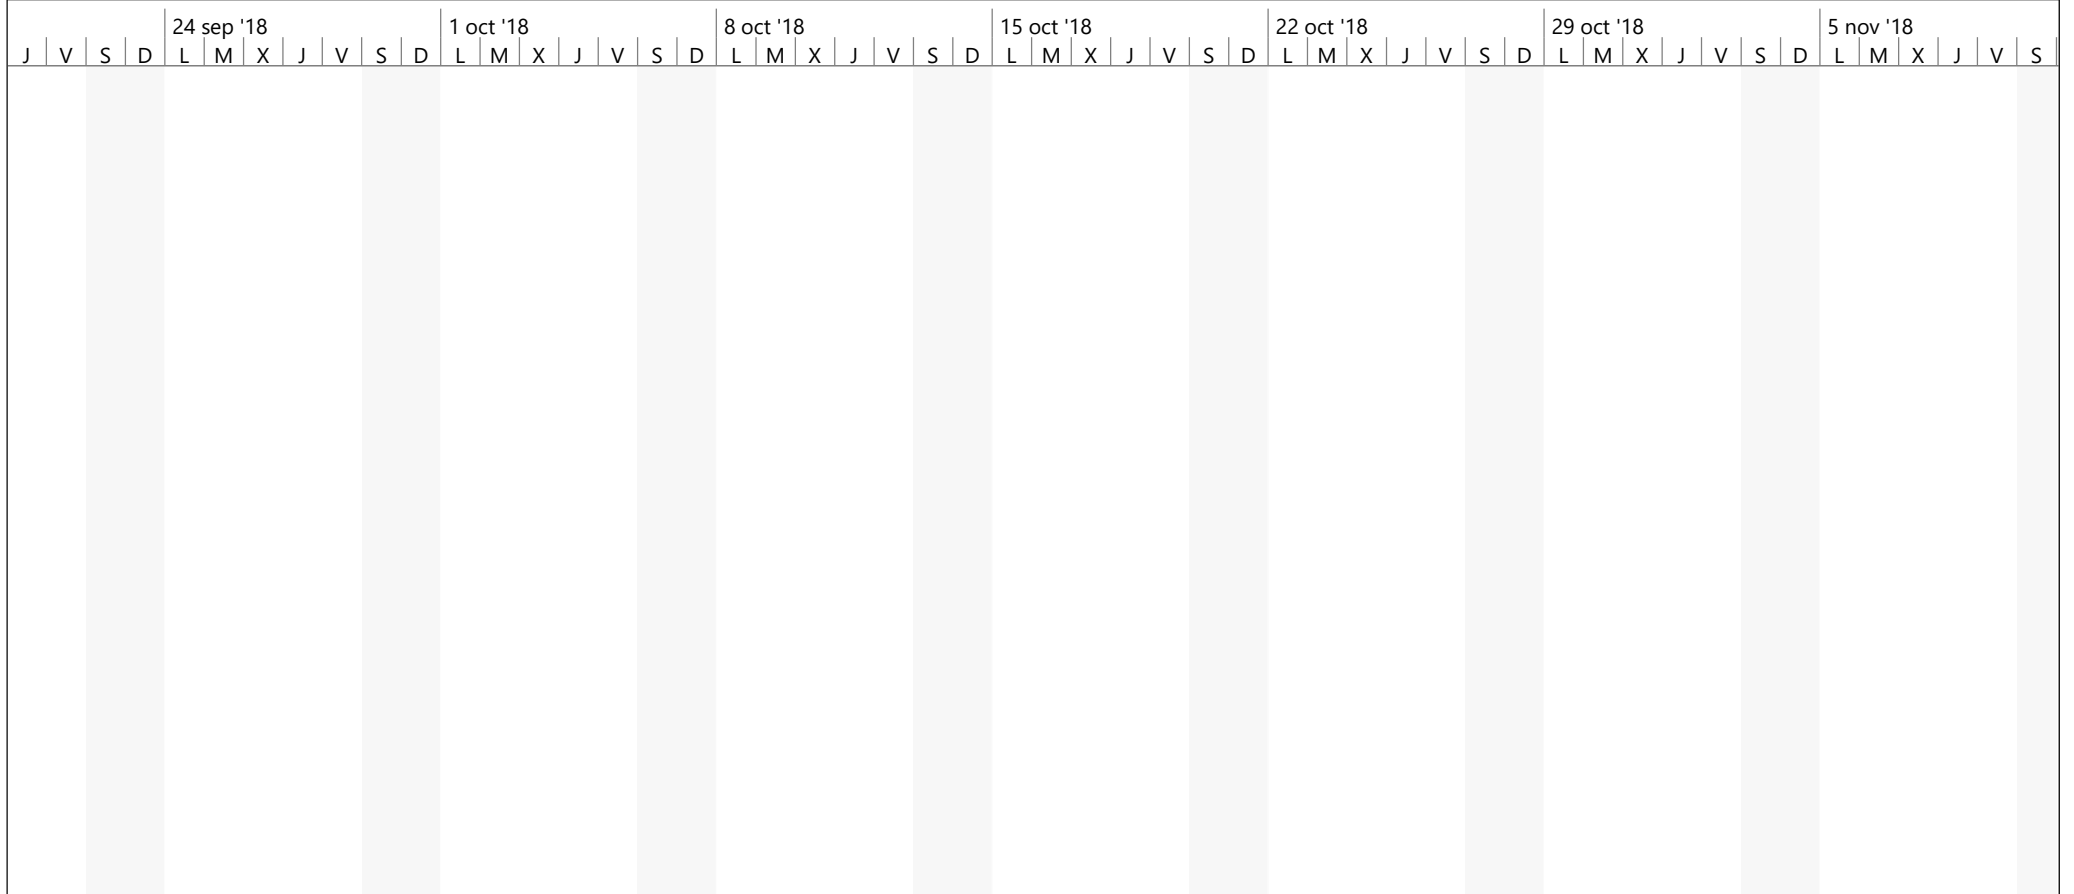


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

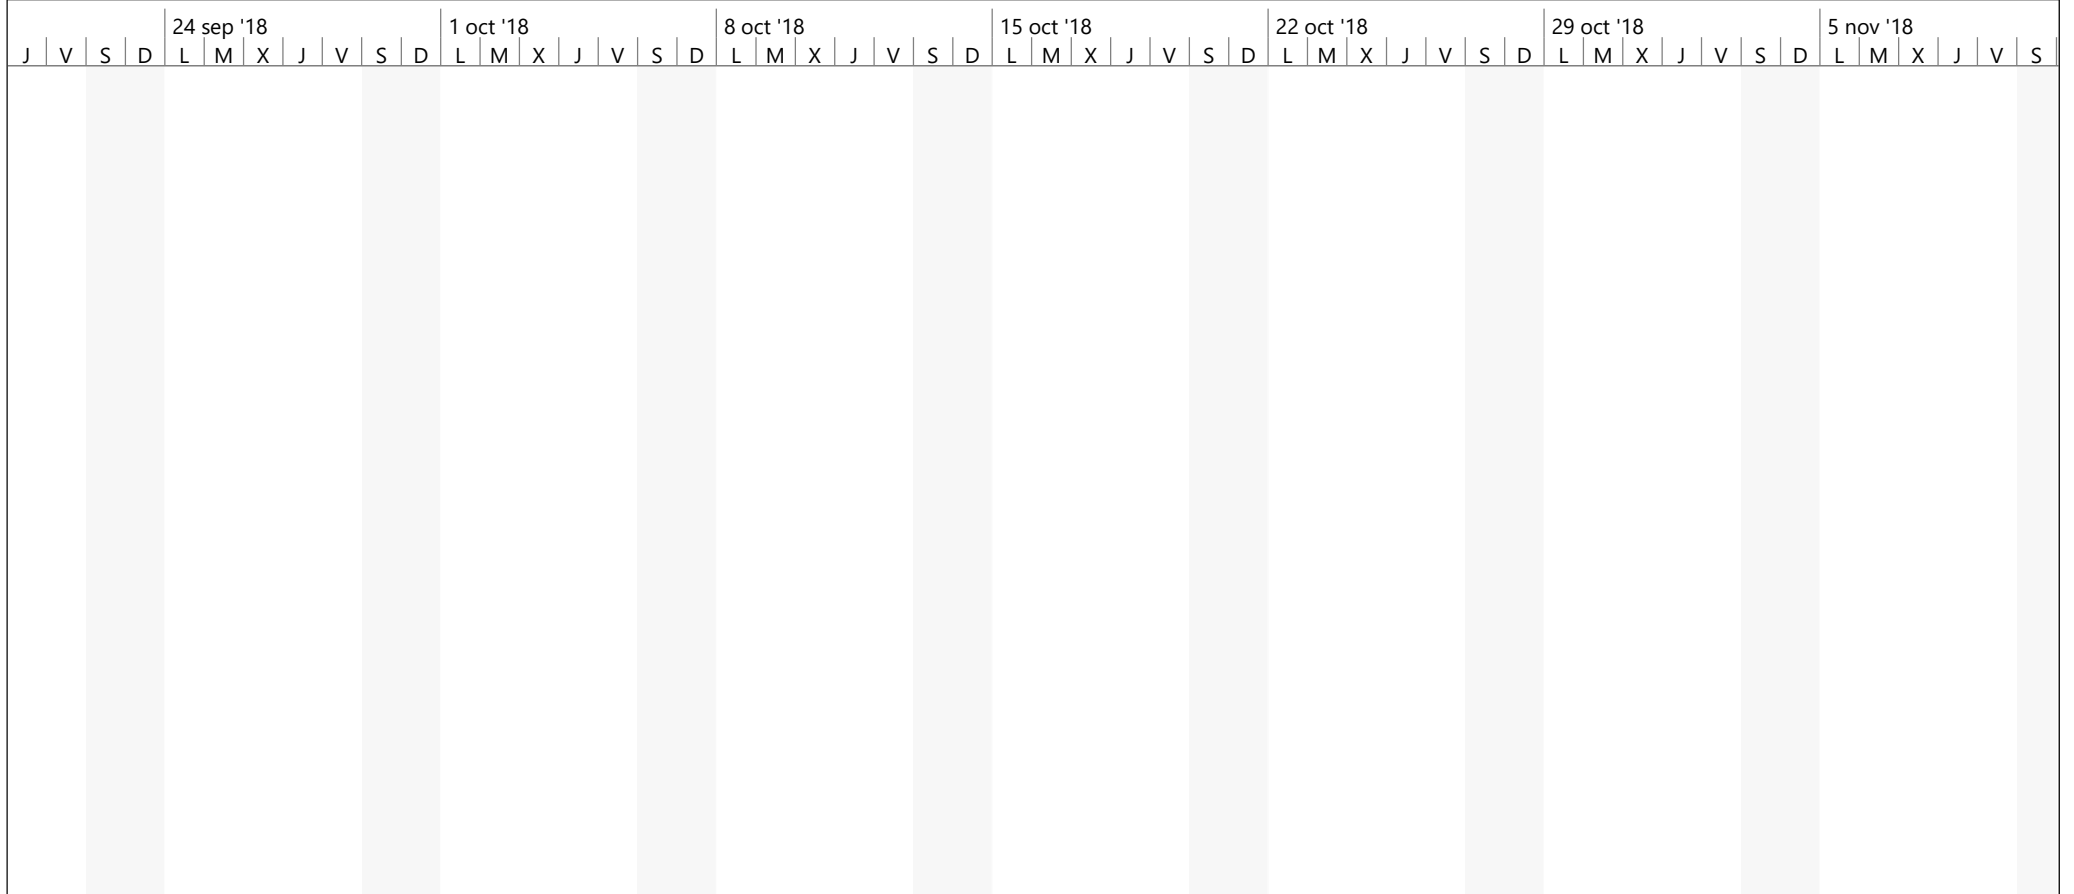


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

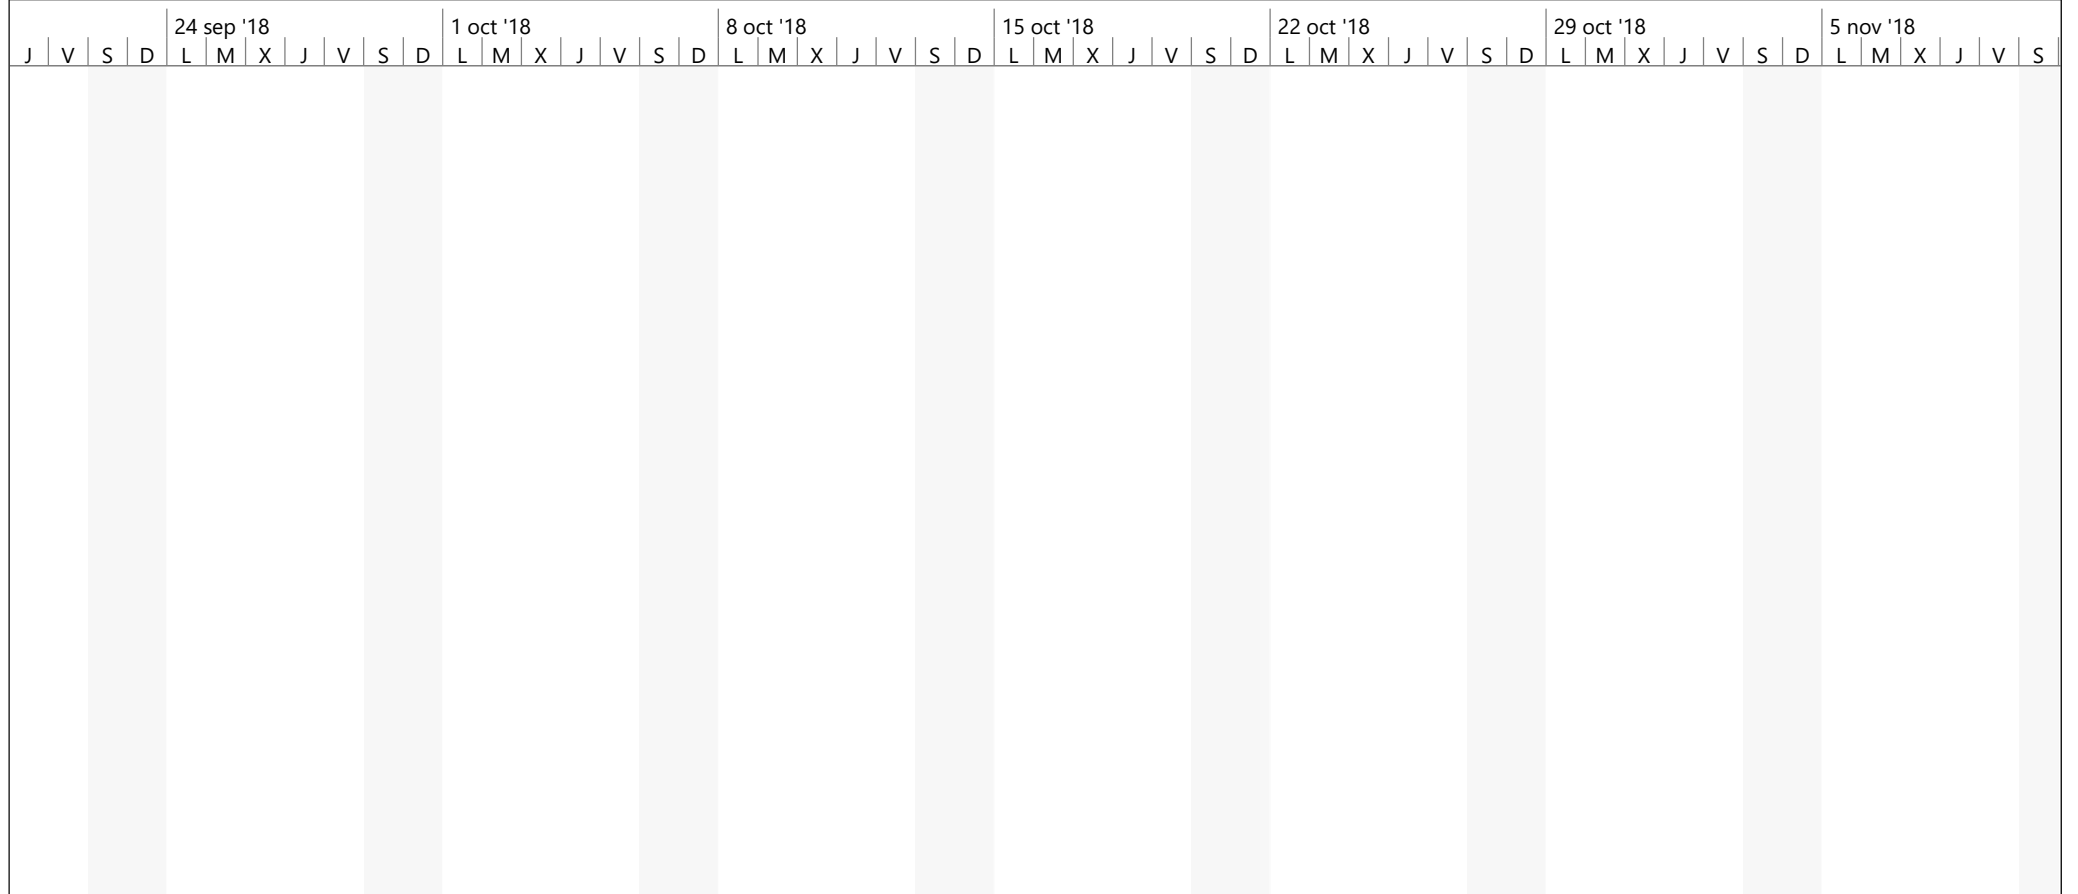

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



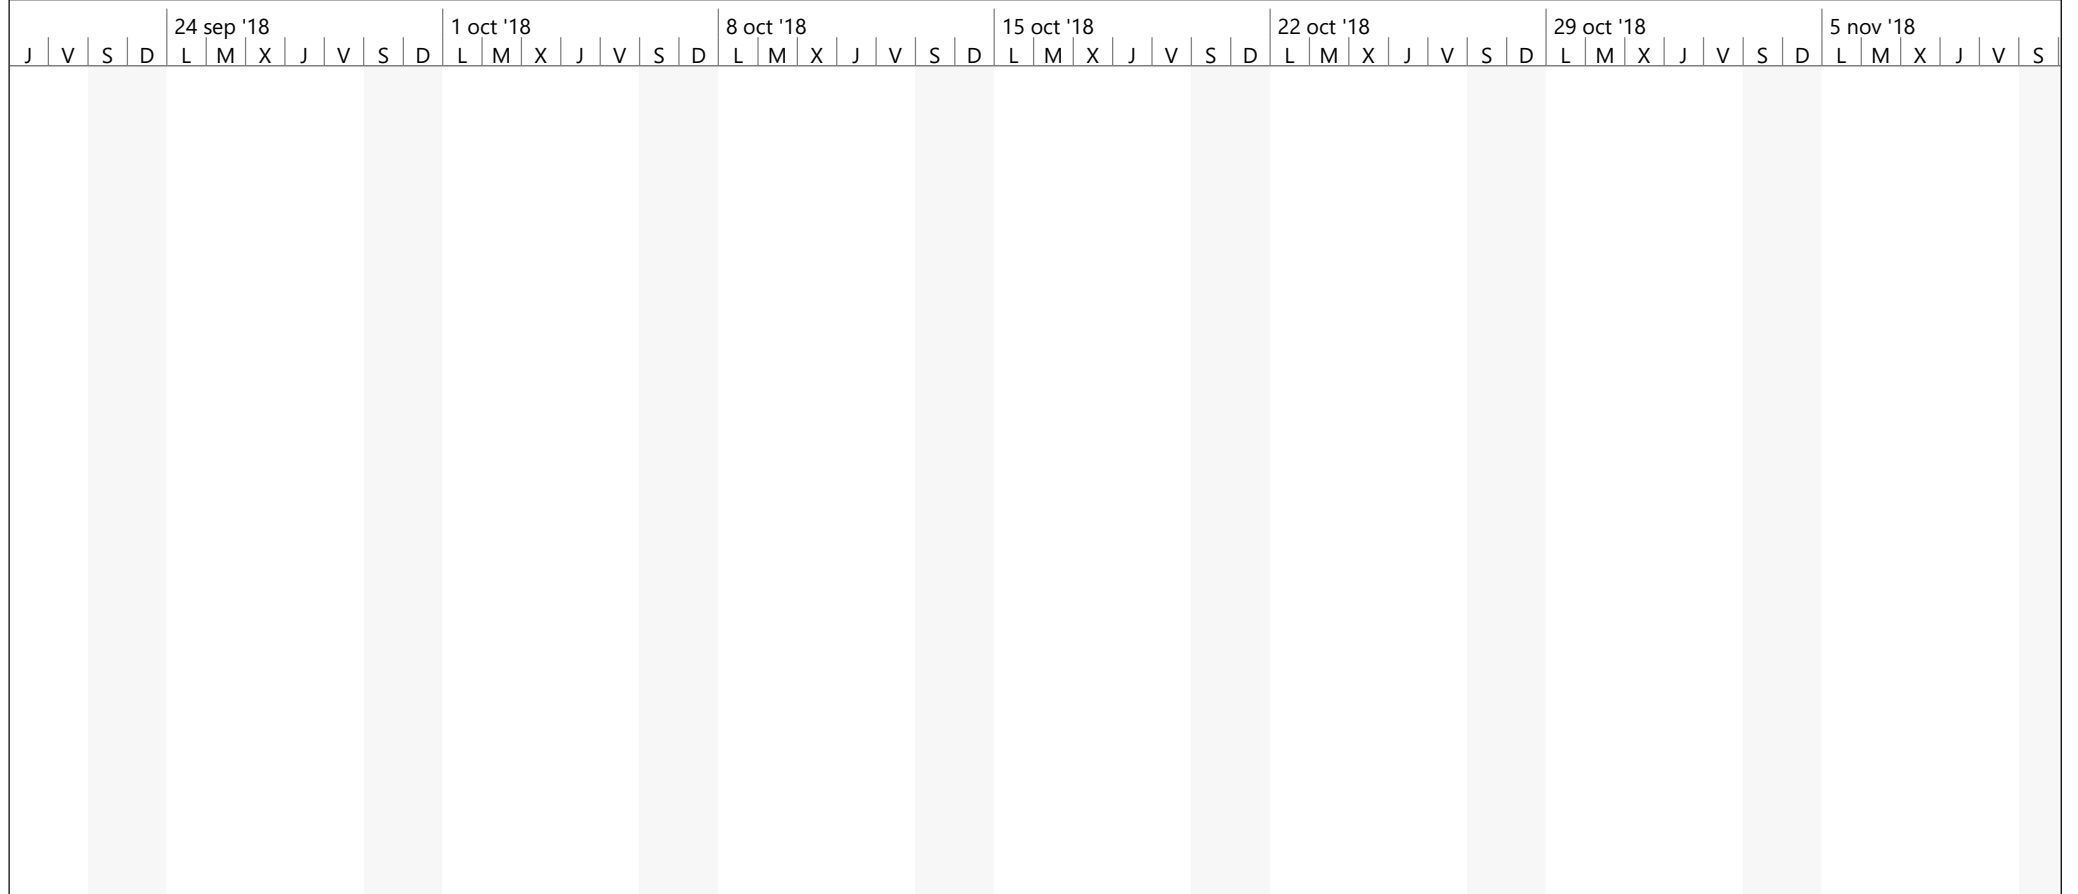





















# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

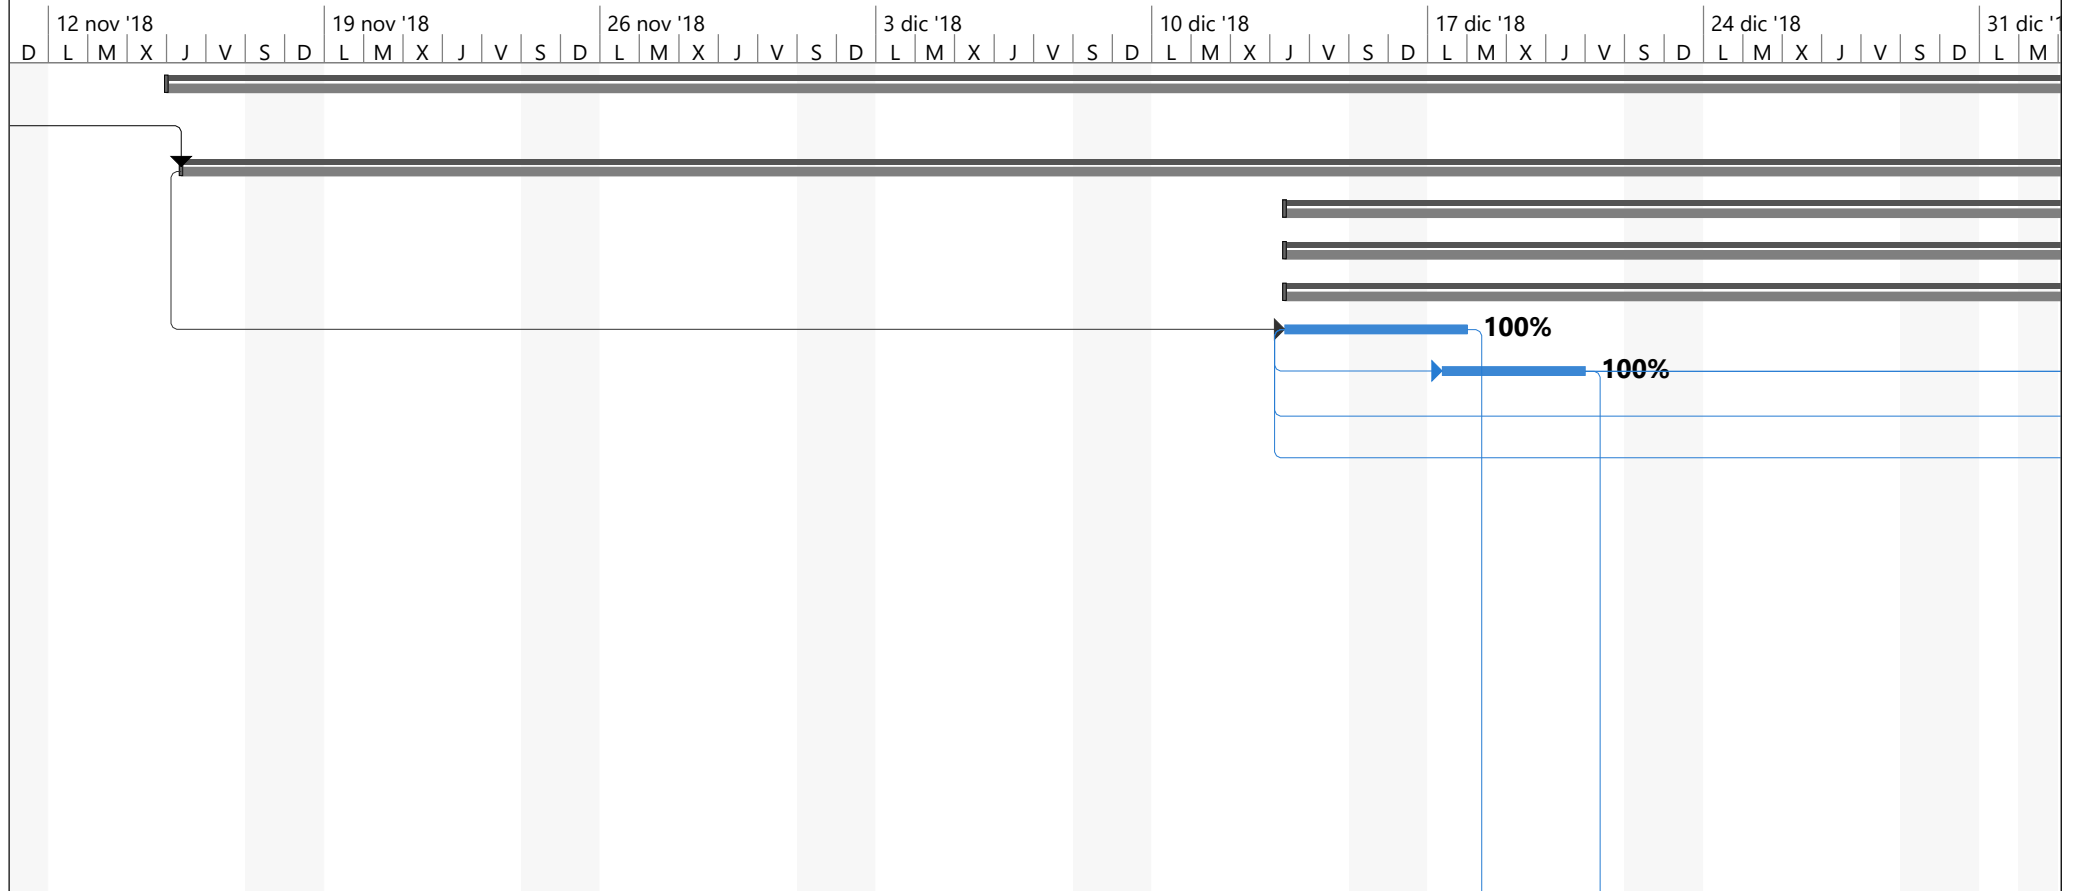

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

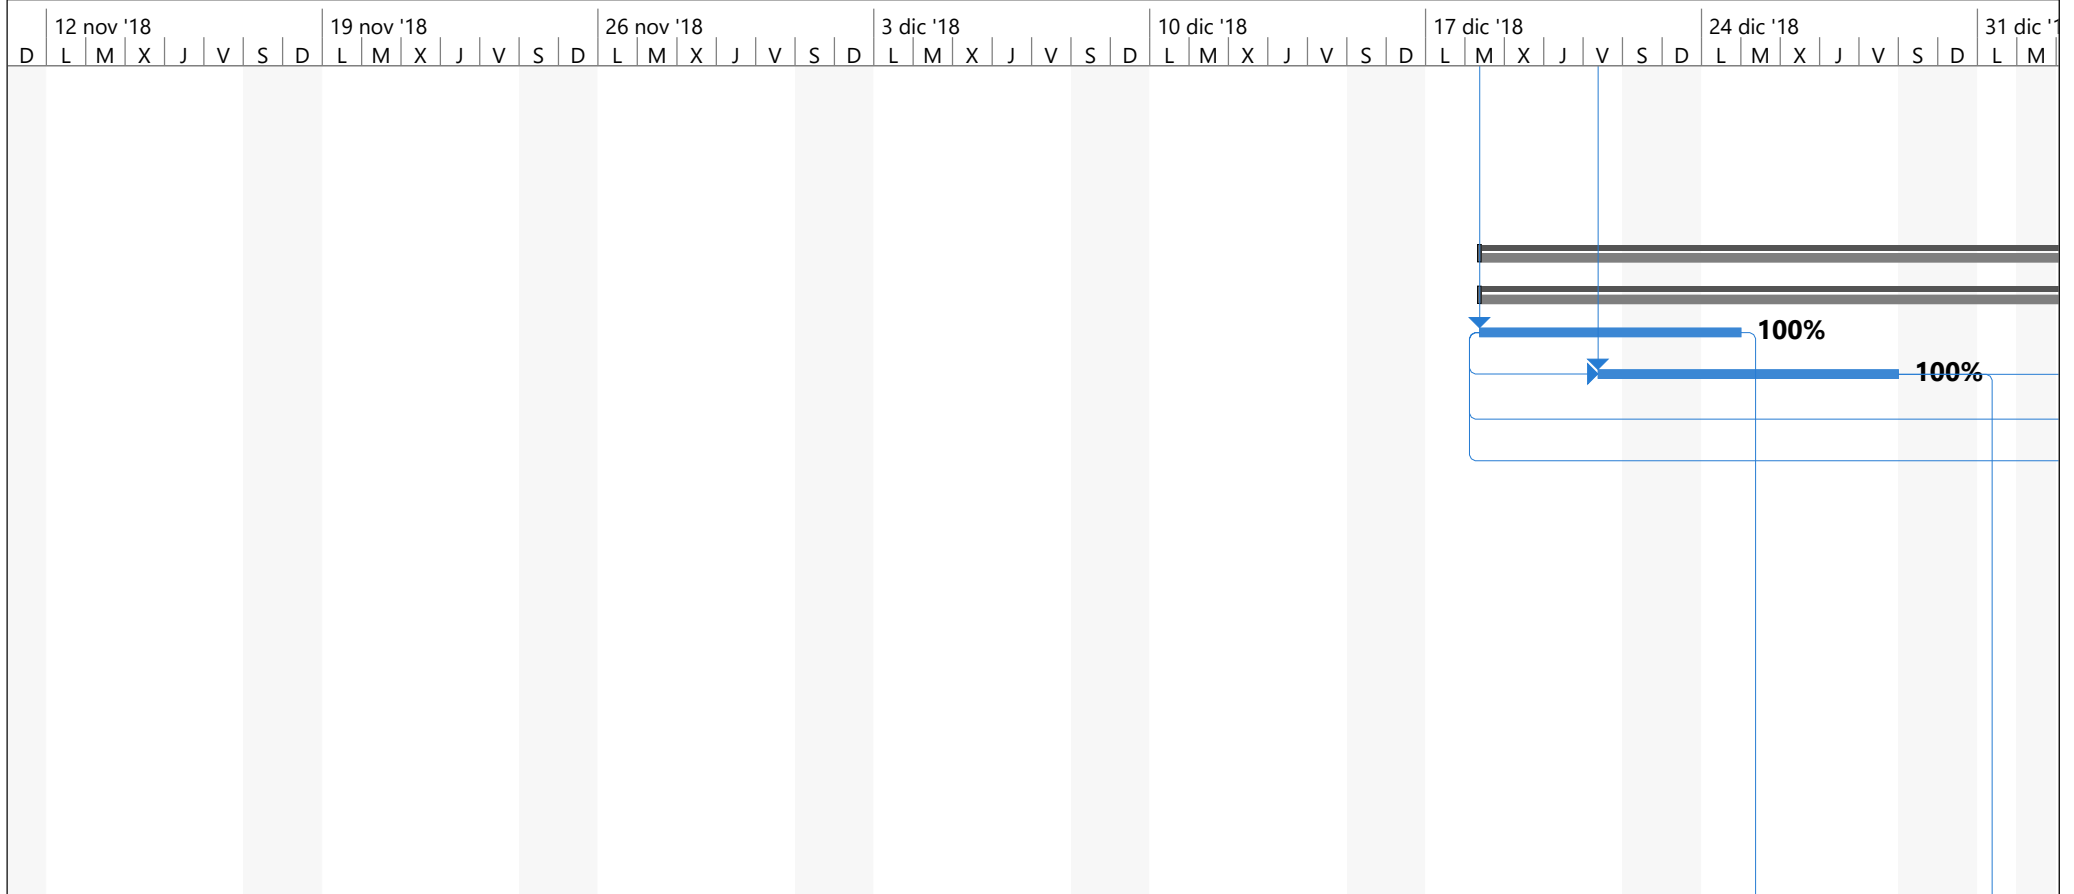

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

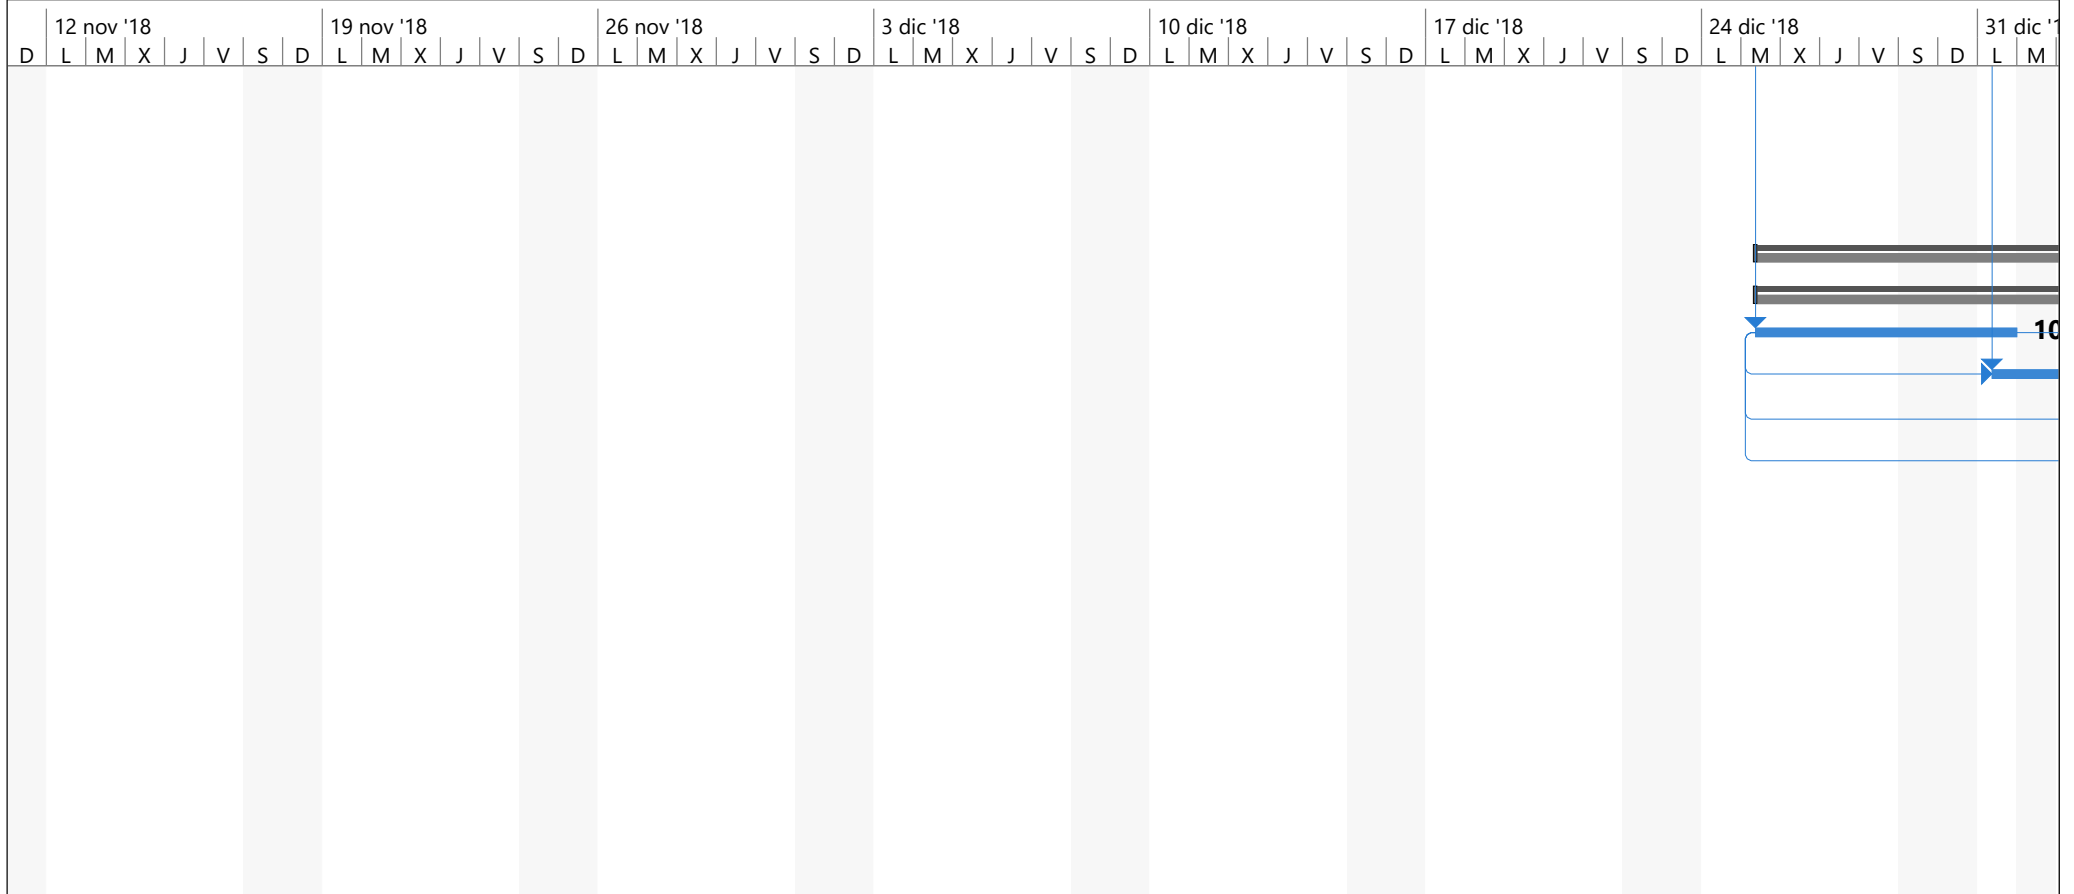

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

























|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

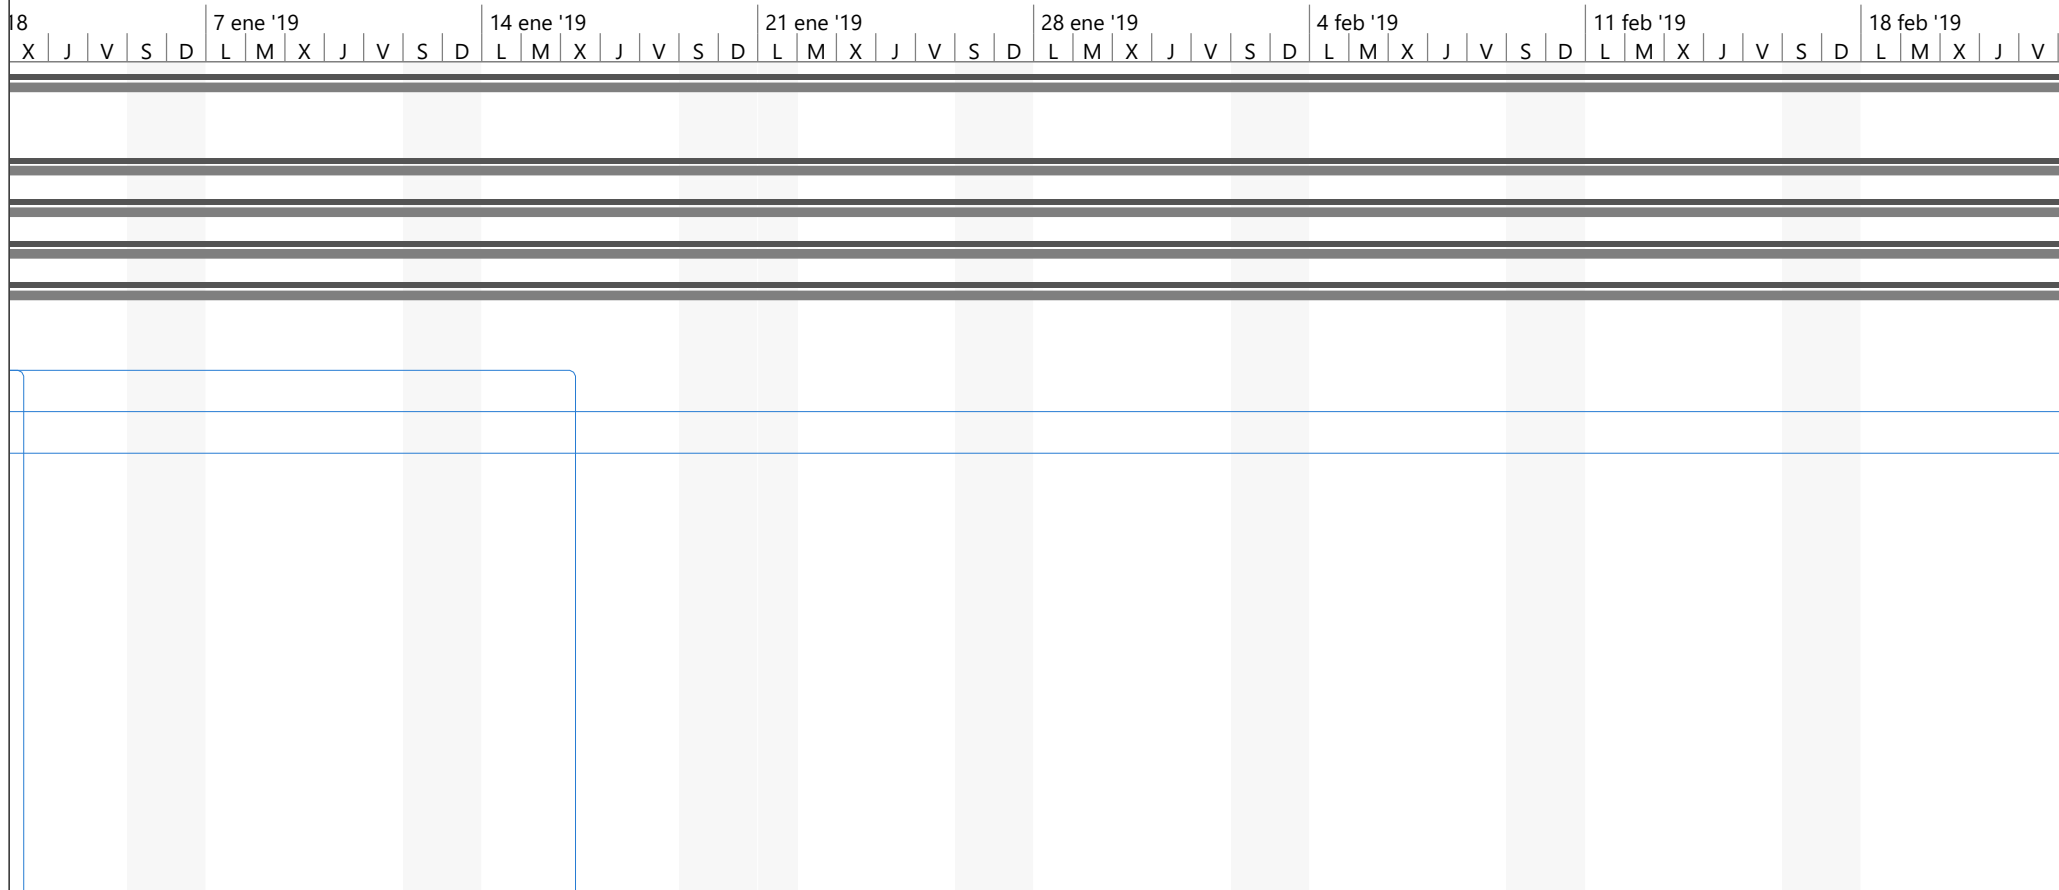


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

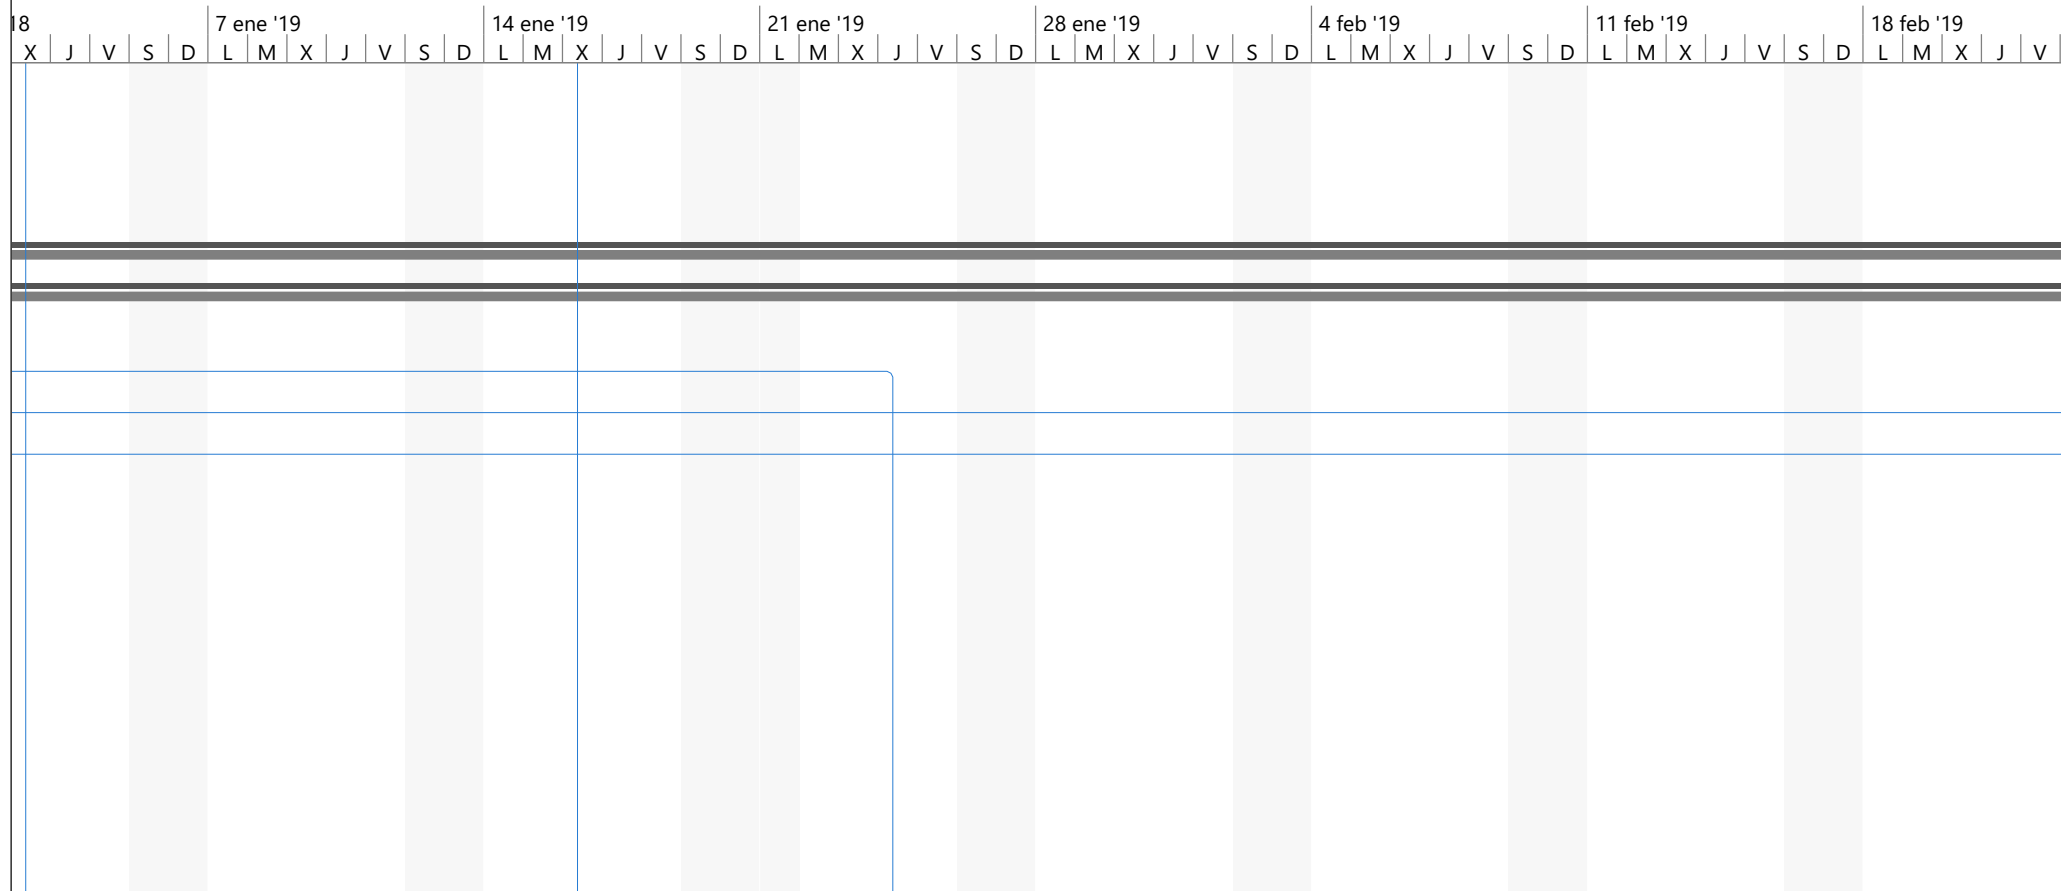


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

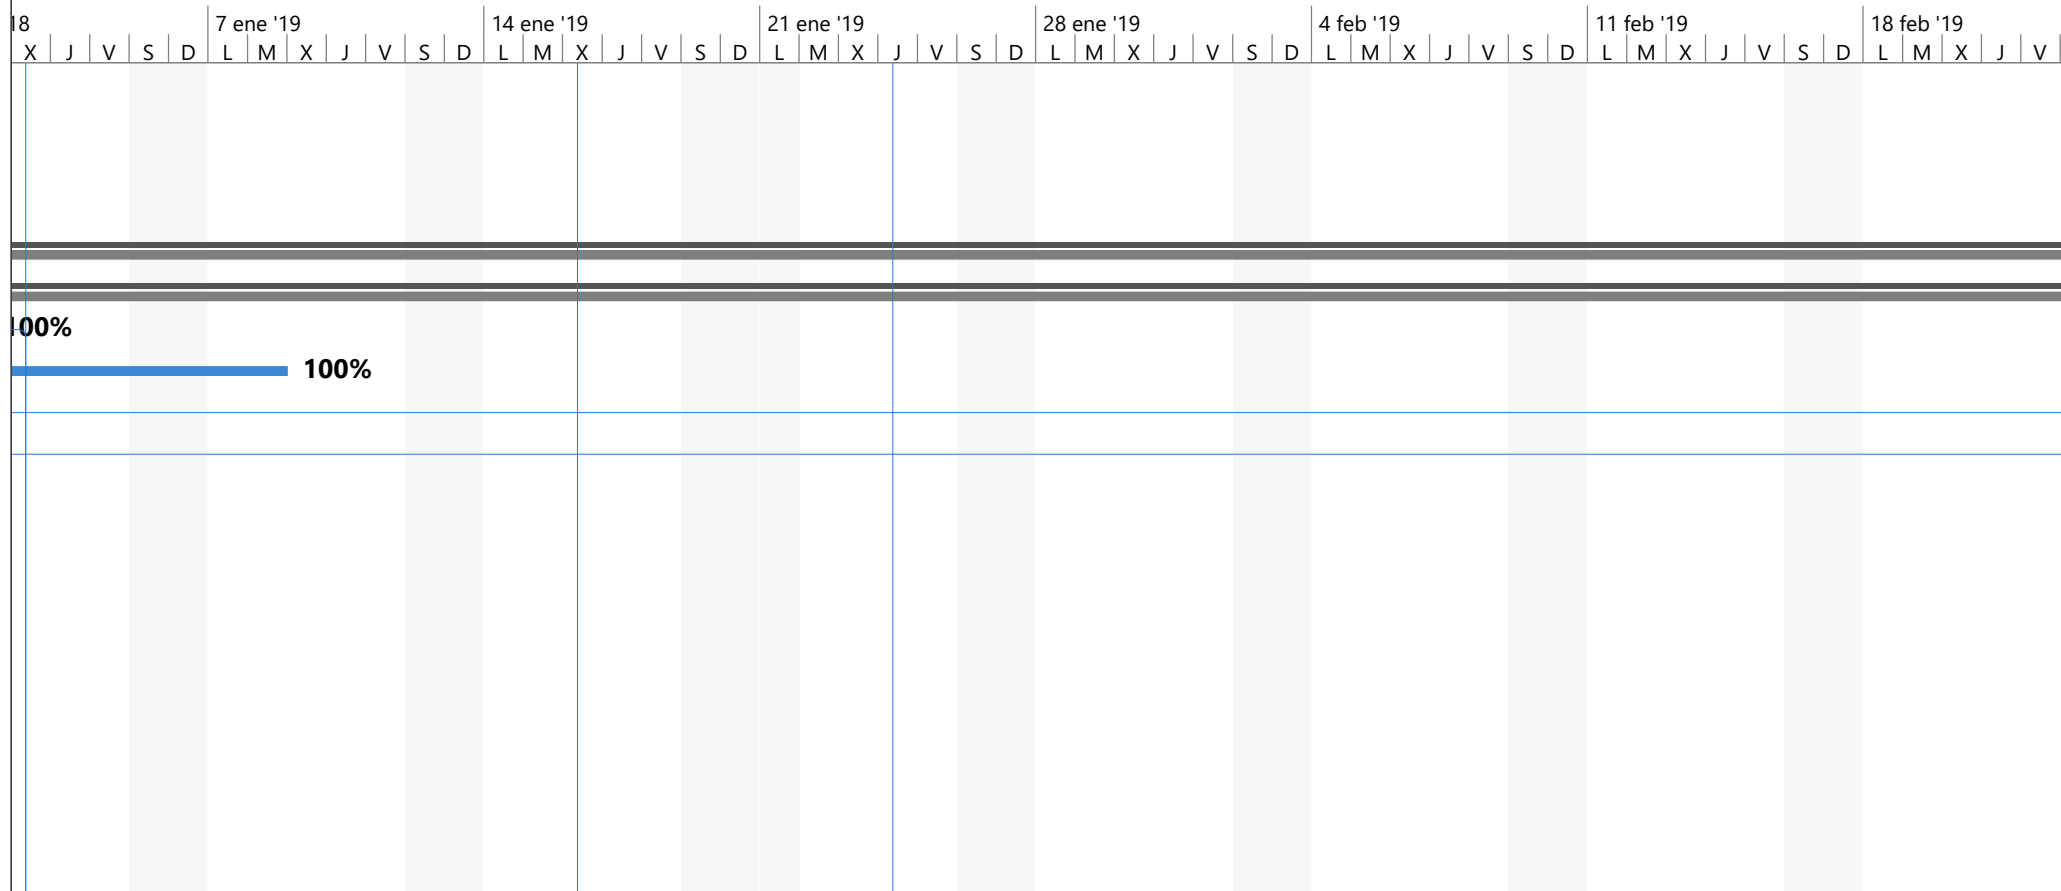


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

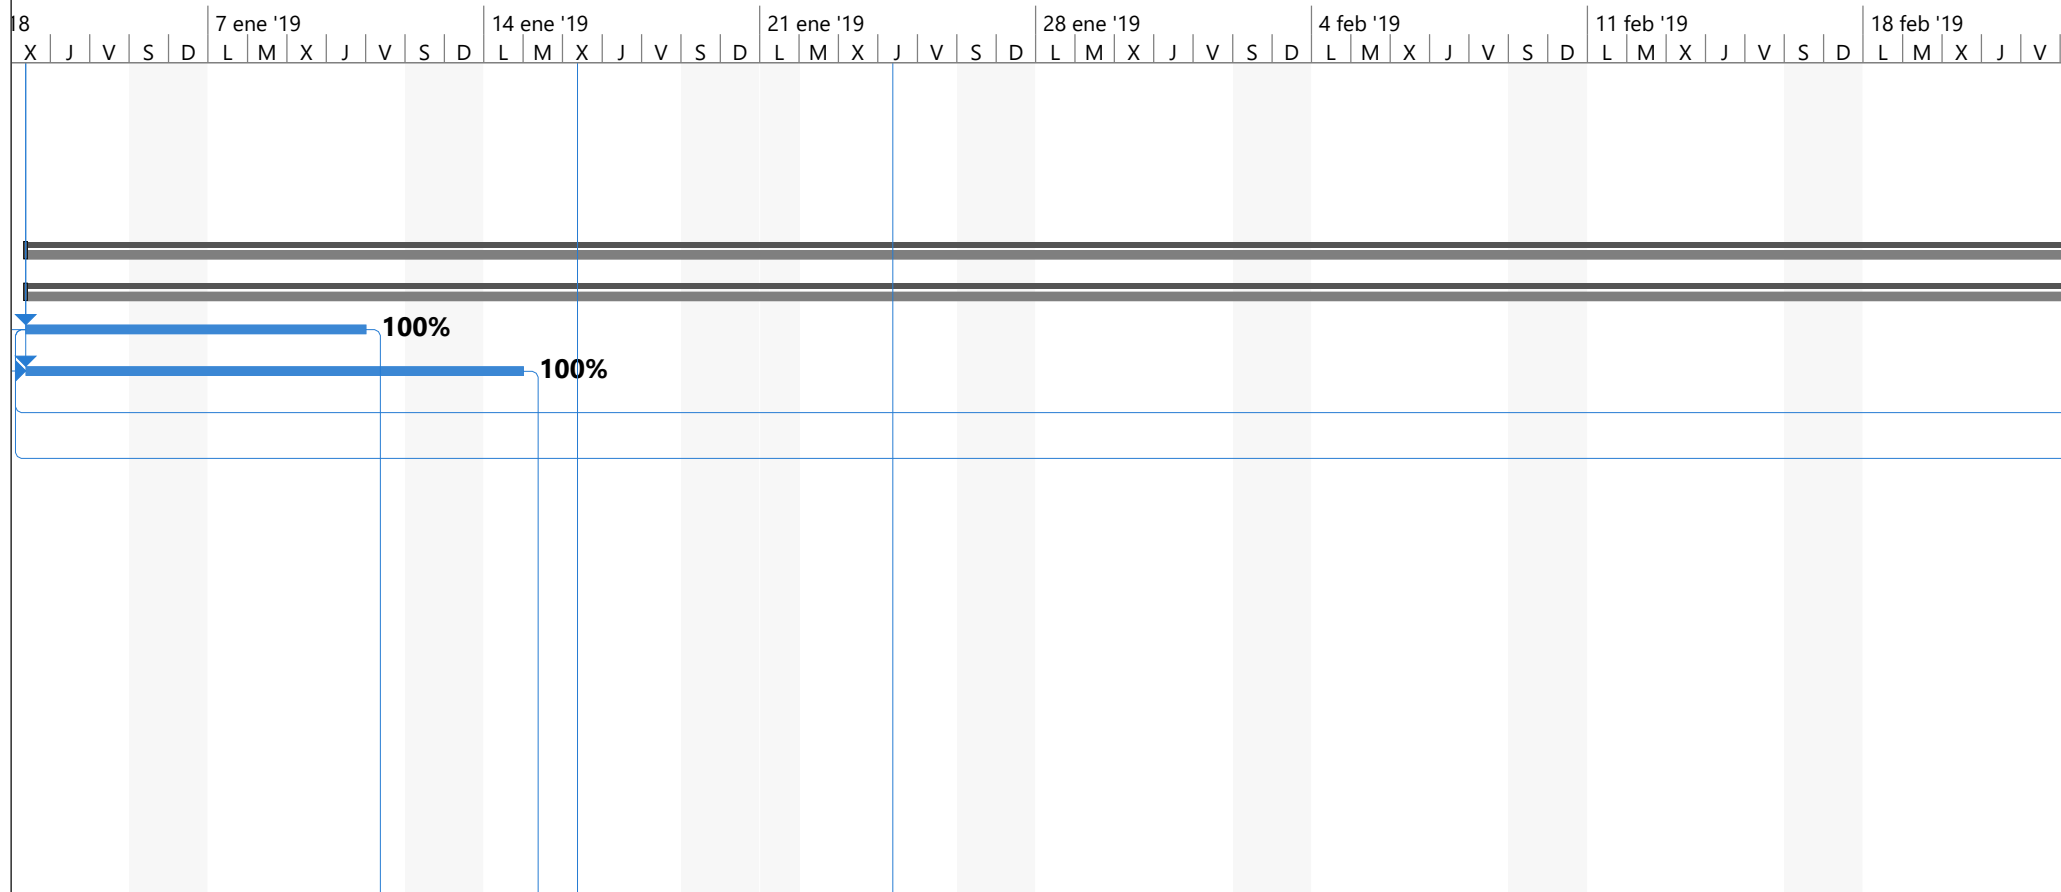


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

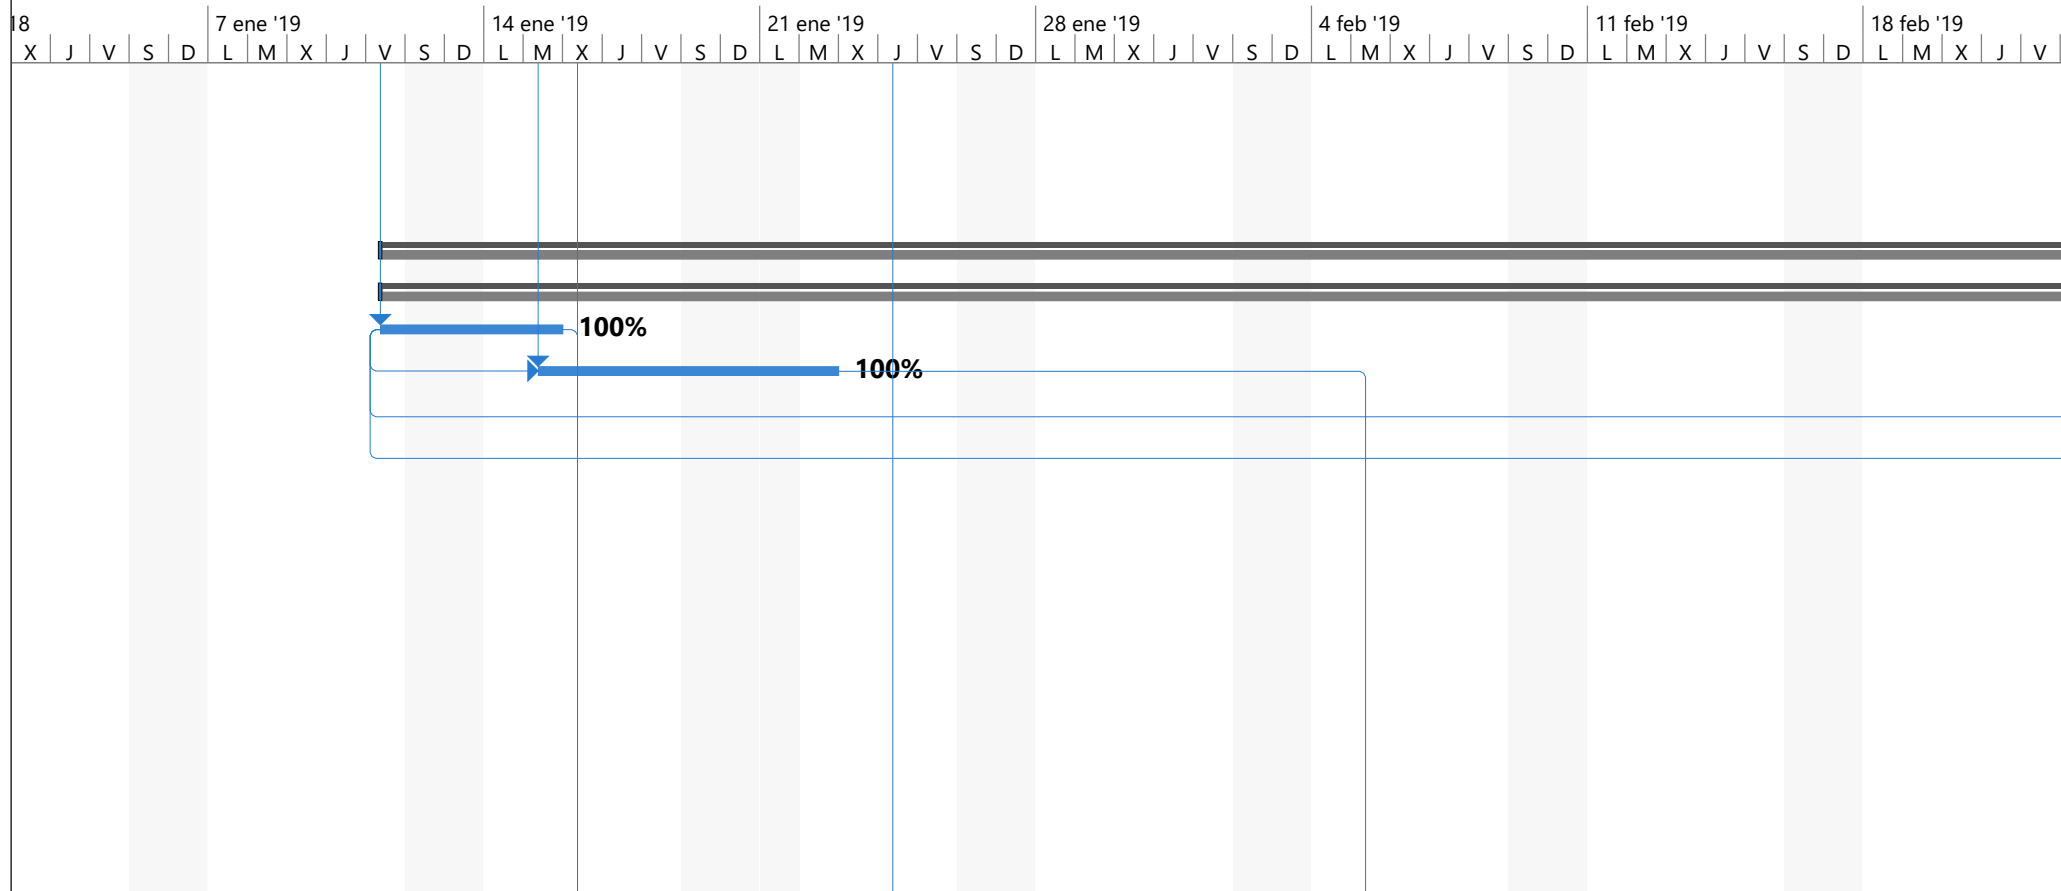

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

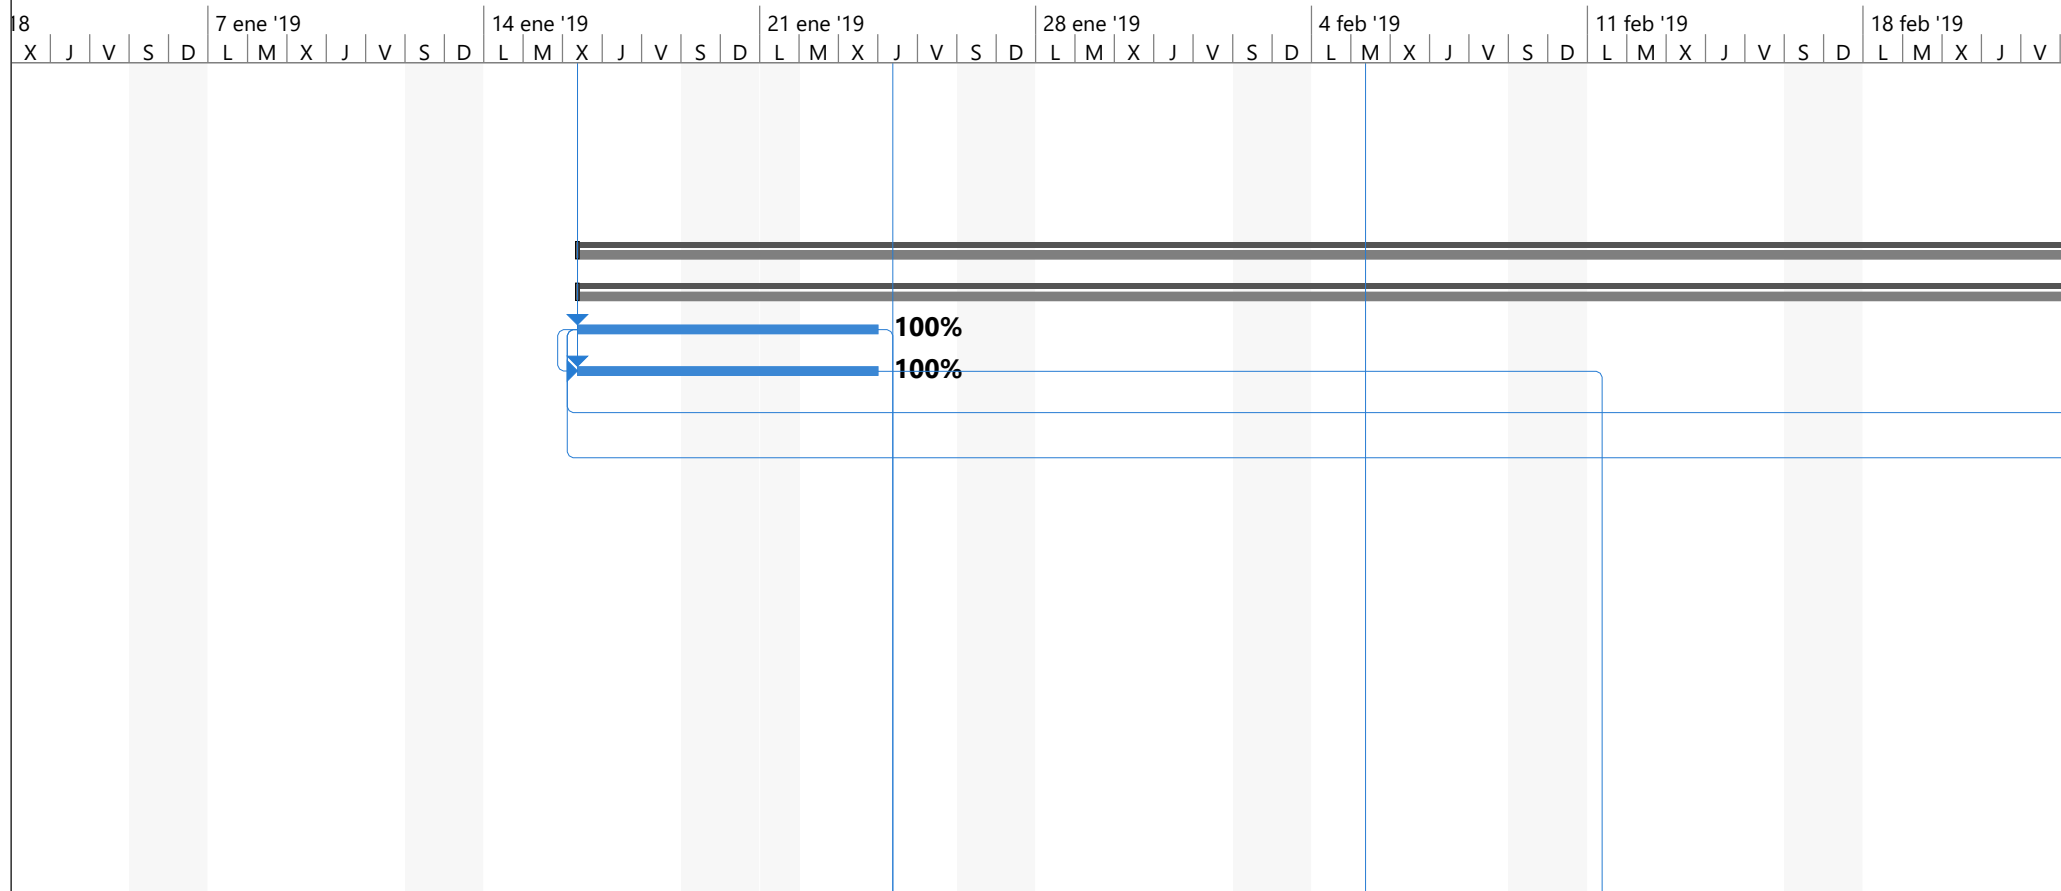

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

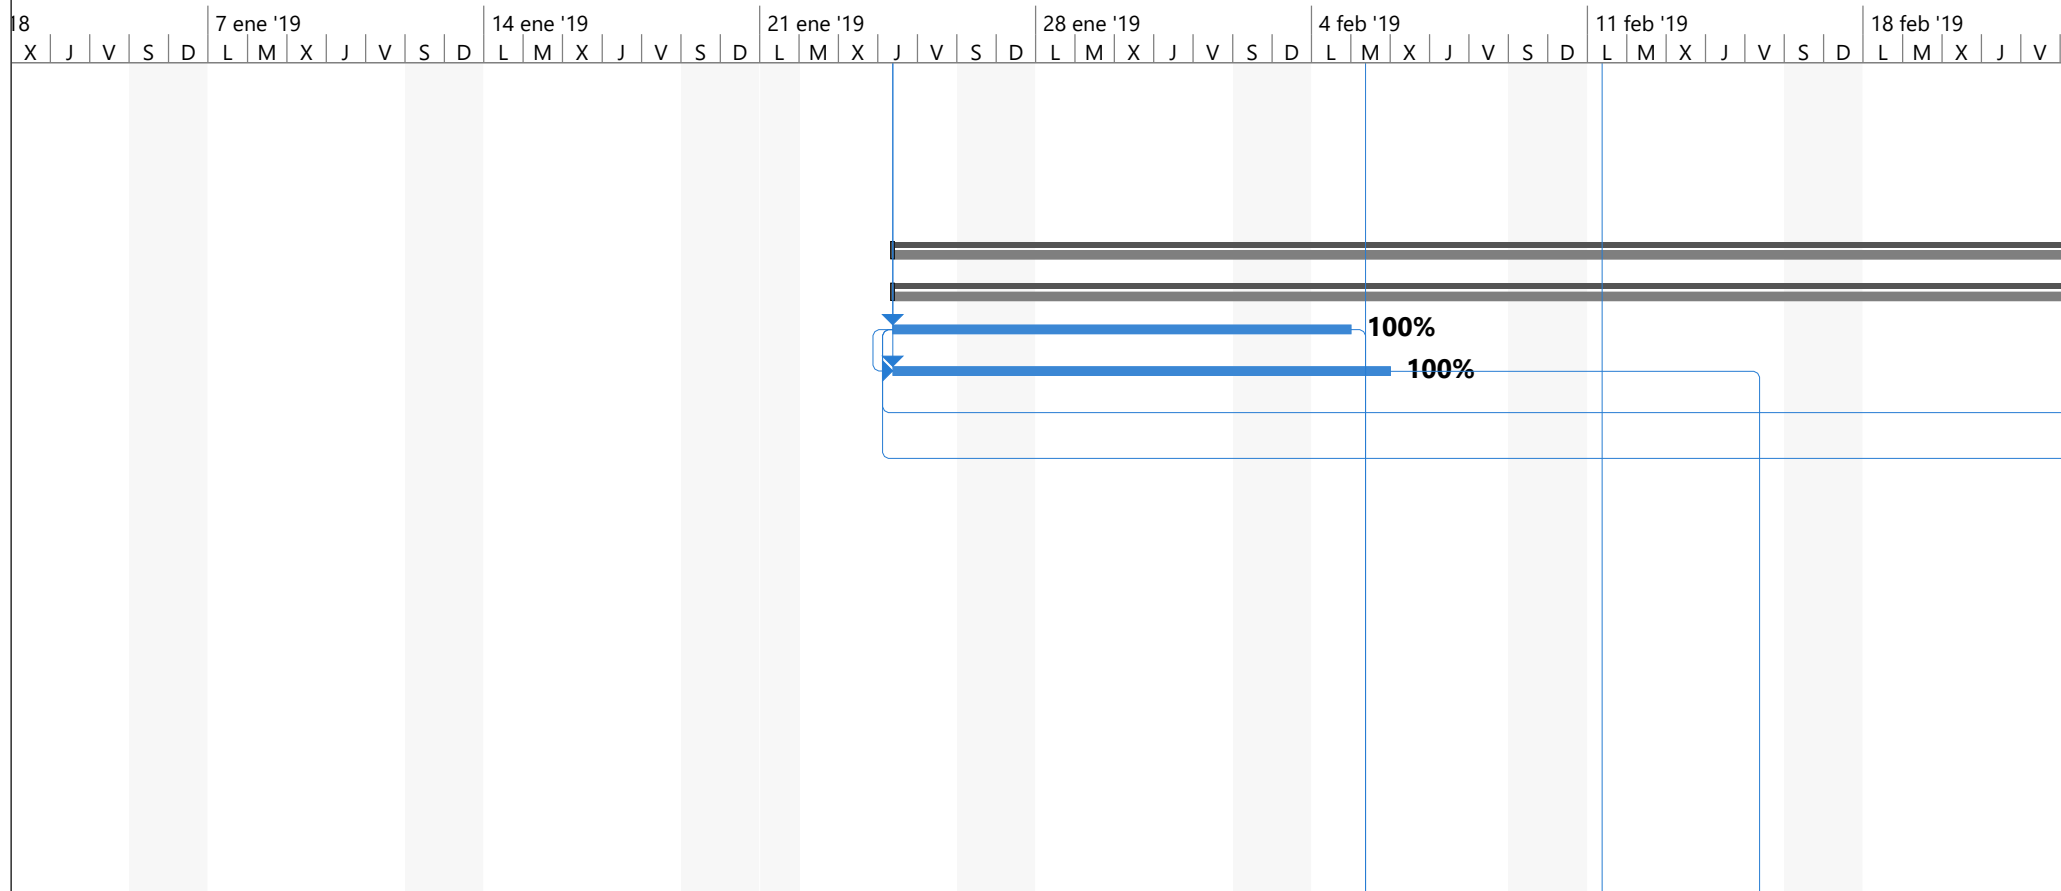


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

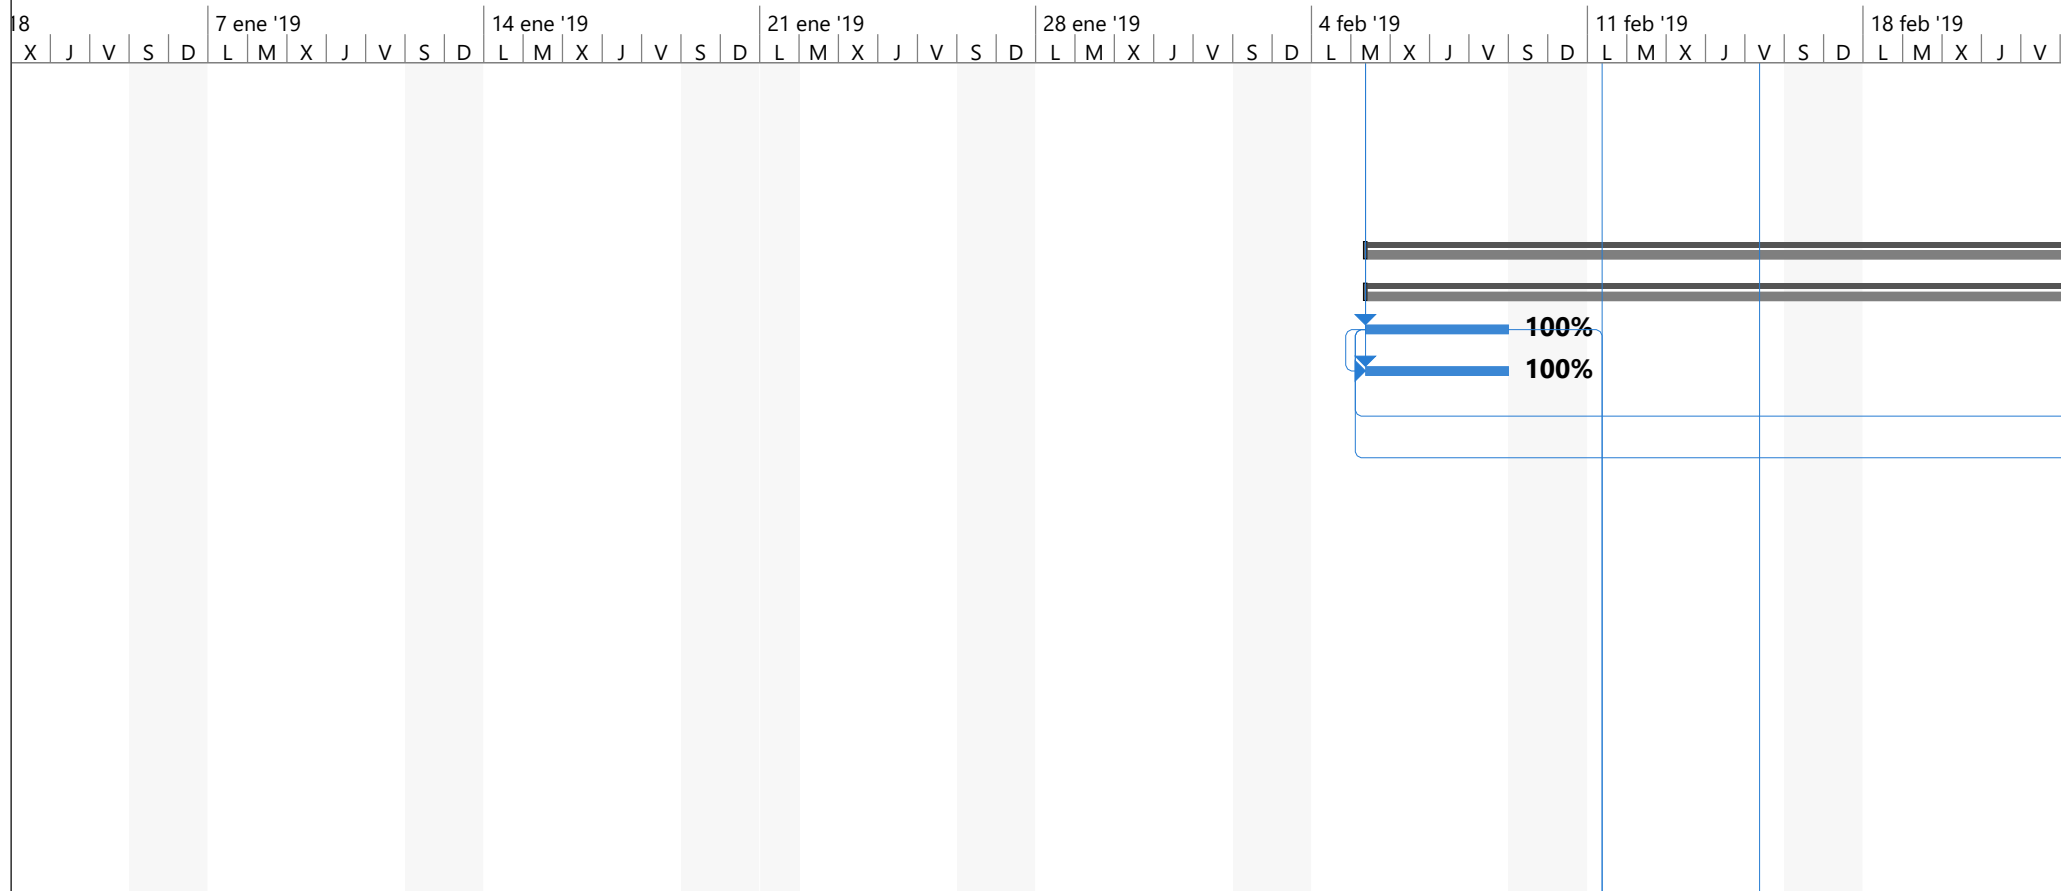


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

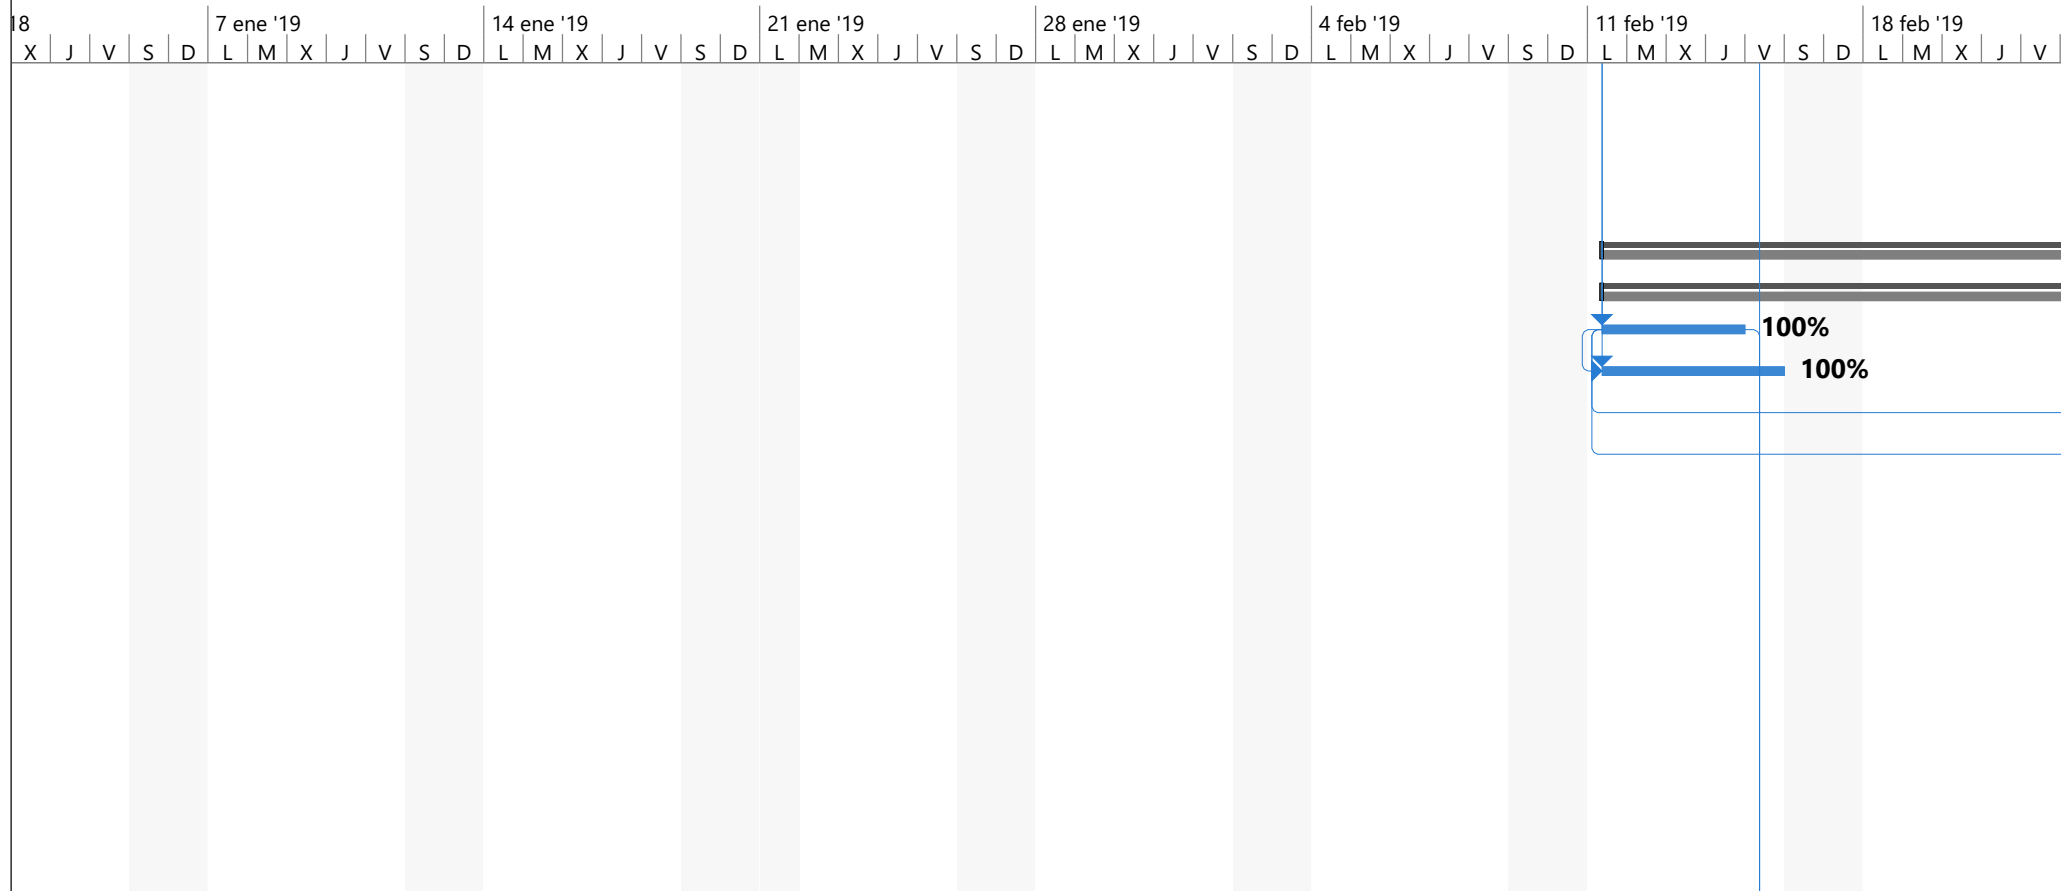

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




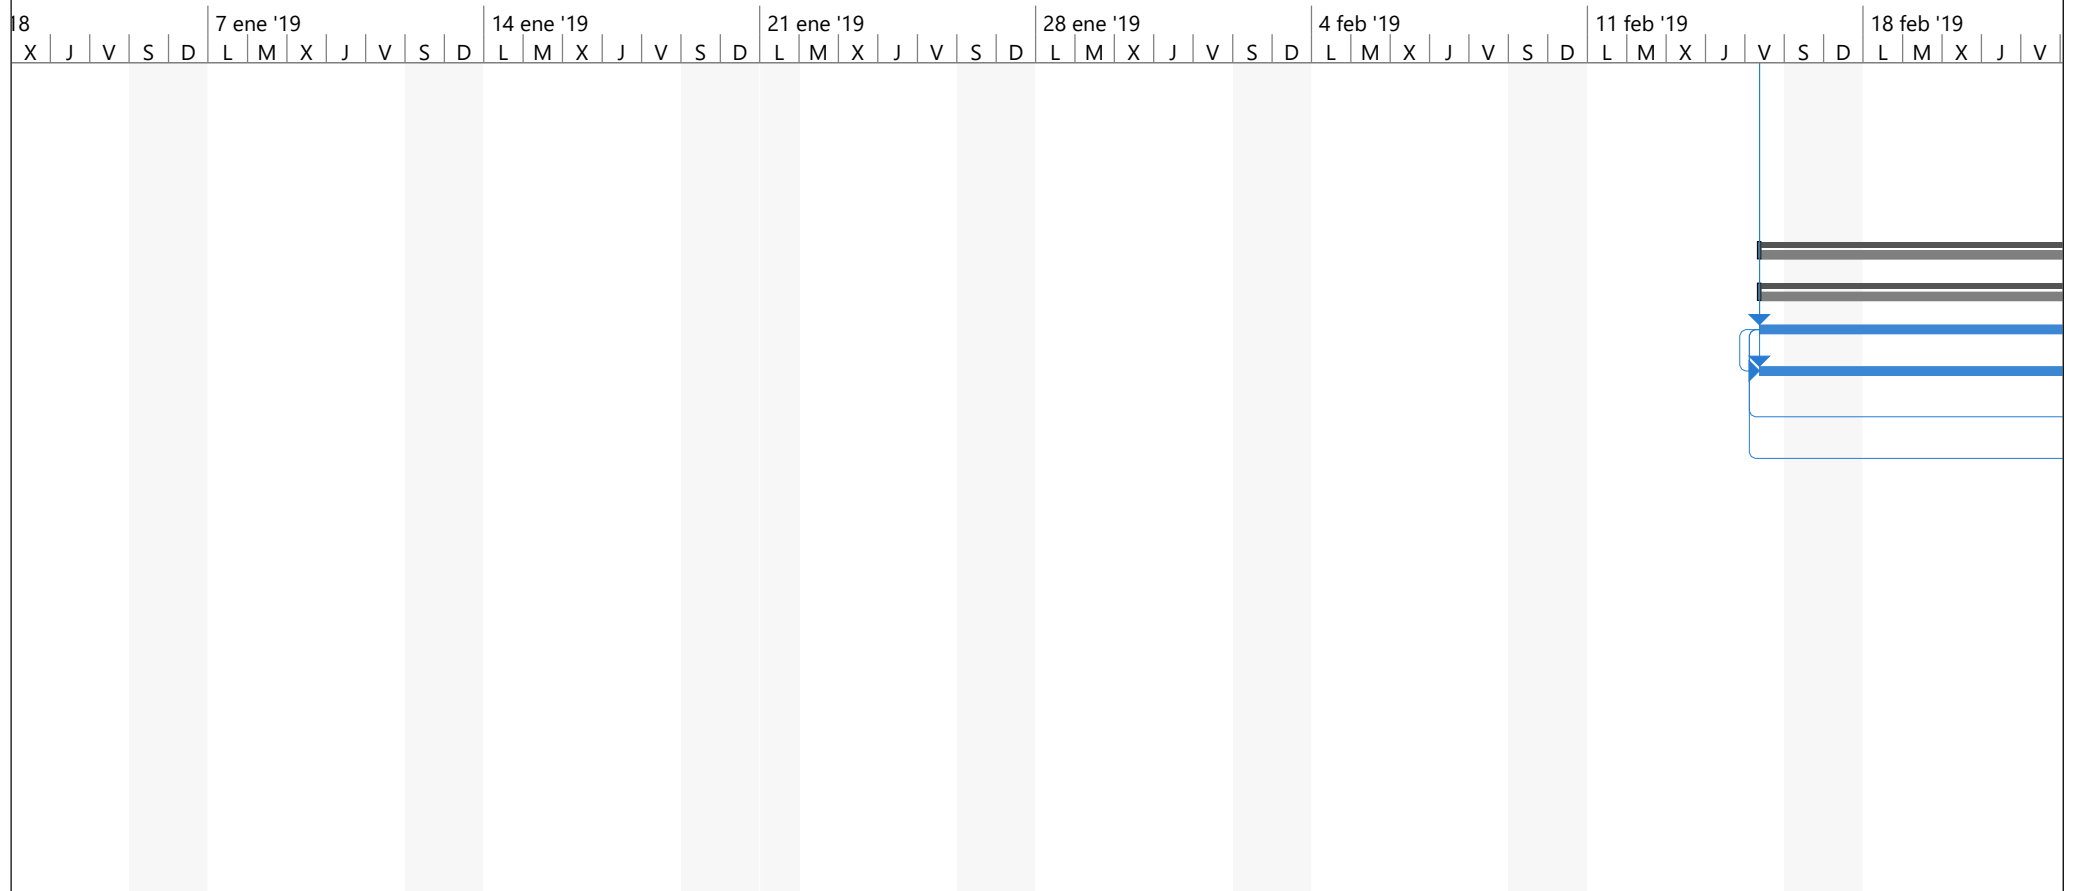




















# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021









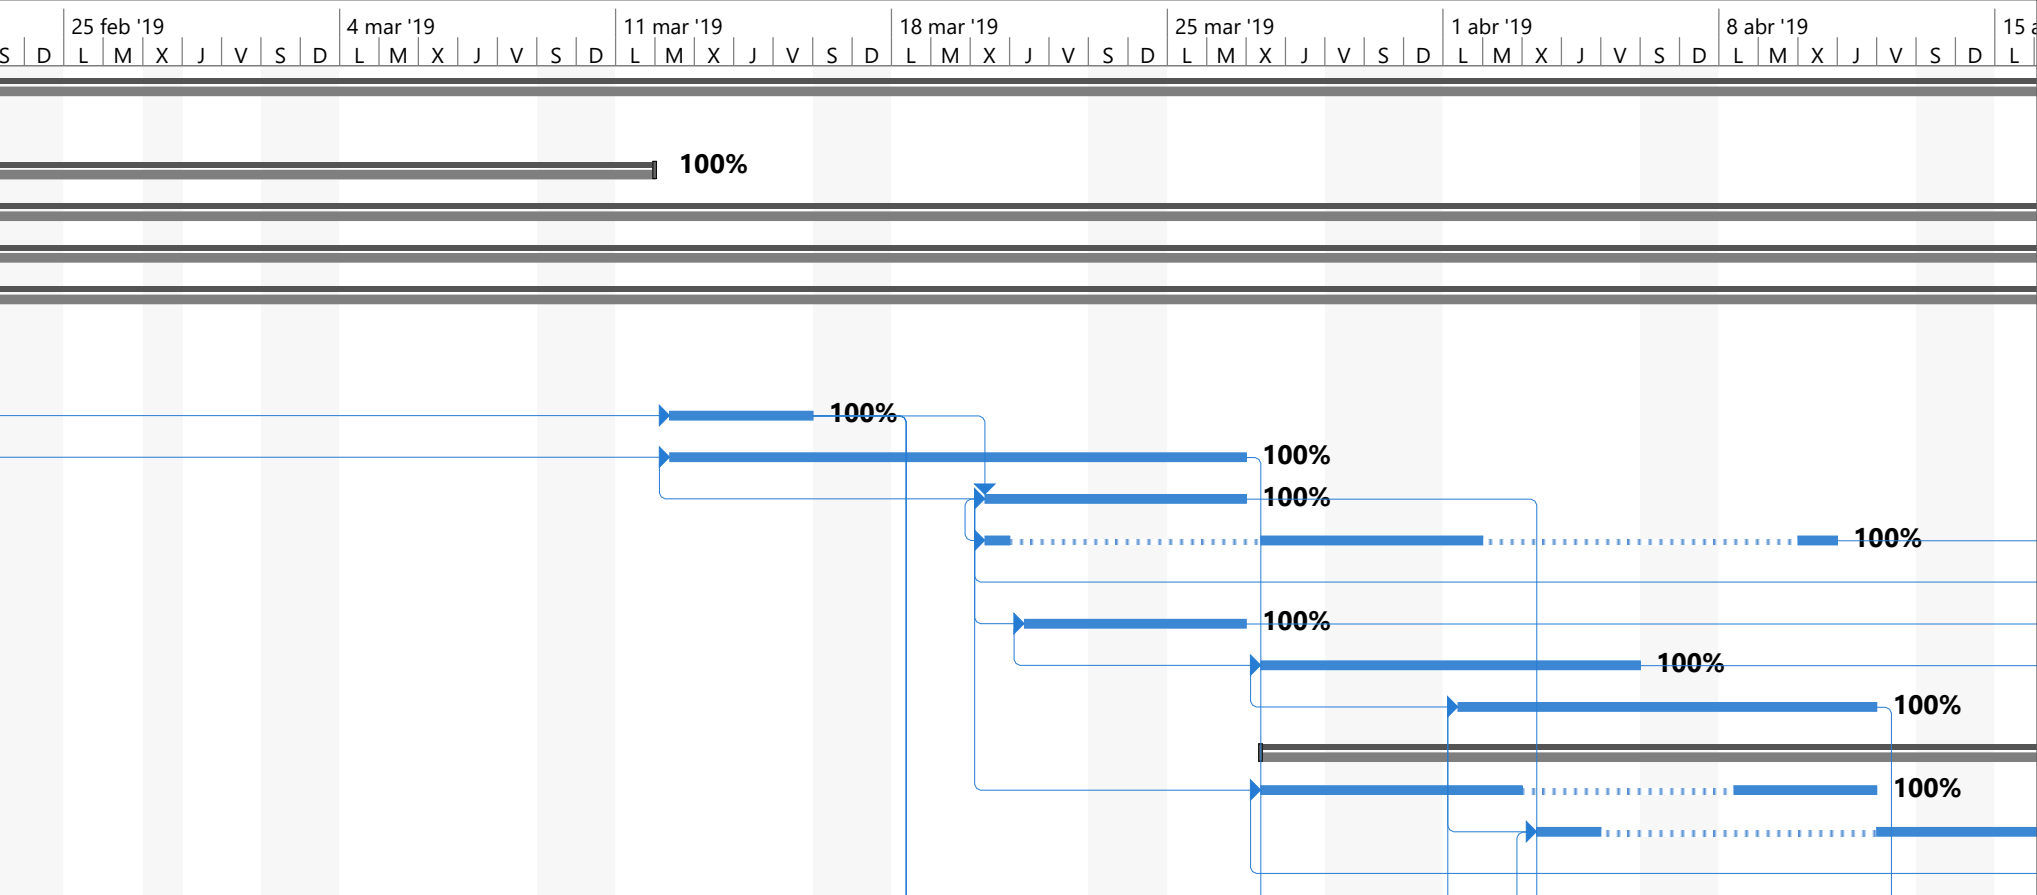















|    |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |  |  |  |
|----|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|--|--|--|
| 18 |   |   |   |   |   | 7 ene '19 |   |   |   |   | 14 ene '19 |   |   |   |   | 21 ene '19 |   |   |   |   | 28 ene '19 |   |   |   |   | 4 feb '19 |   |   |   |   | 11 feb '19 |   |   |   |   | 18 feb '19 |   |  |  |  |
| X  | J | V | S | D | L | M         | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X          | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J          | V |  |  |  |
|    |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021




|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

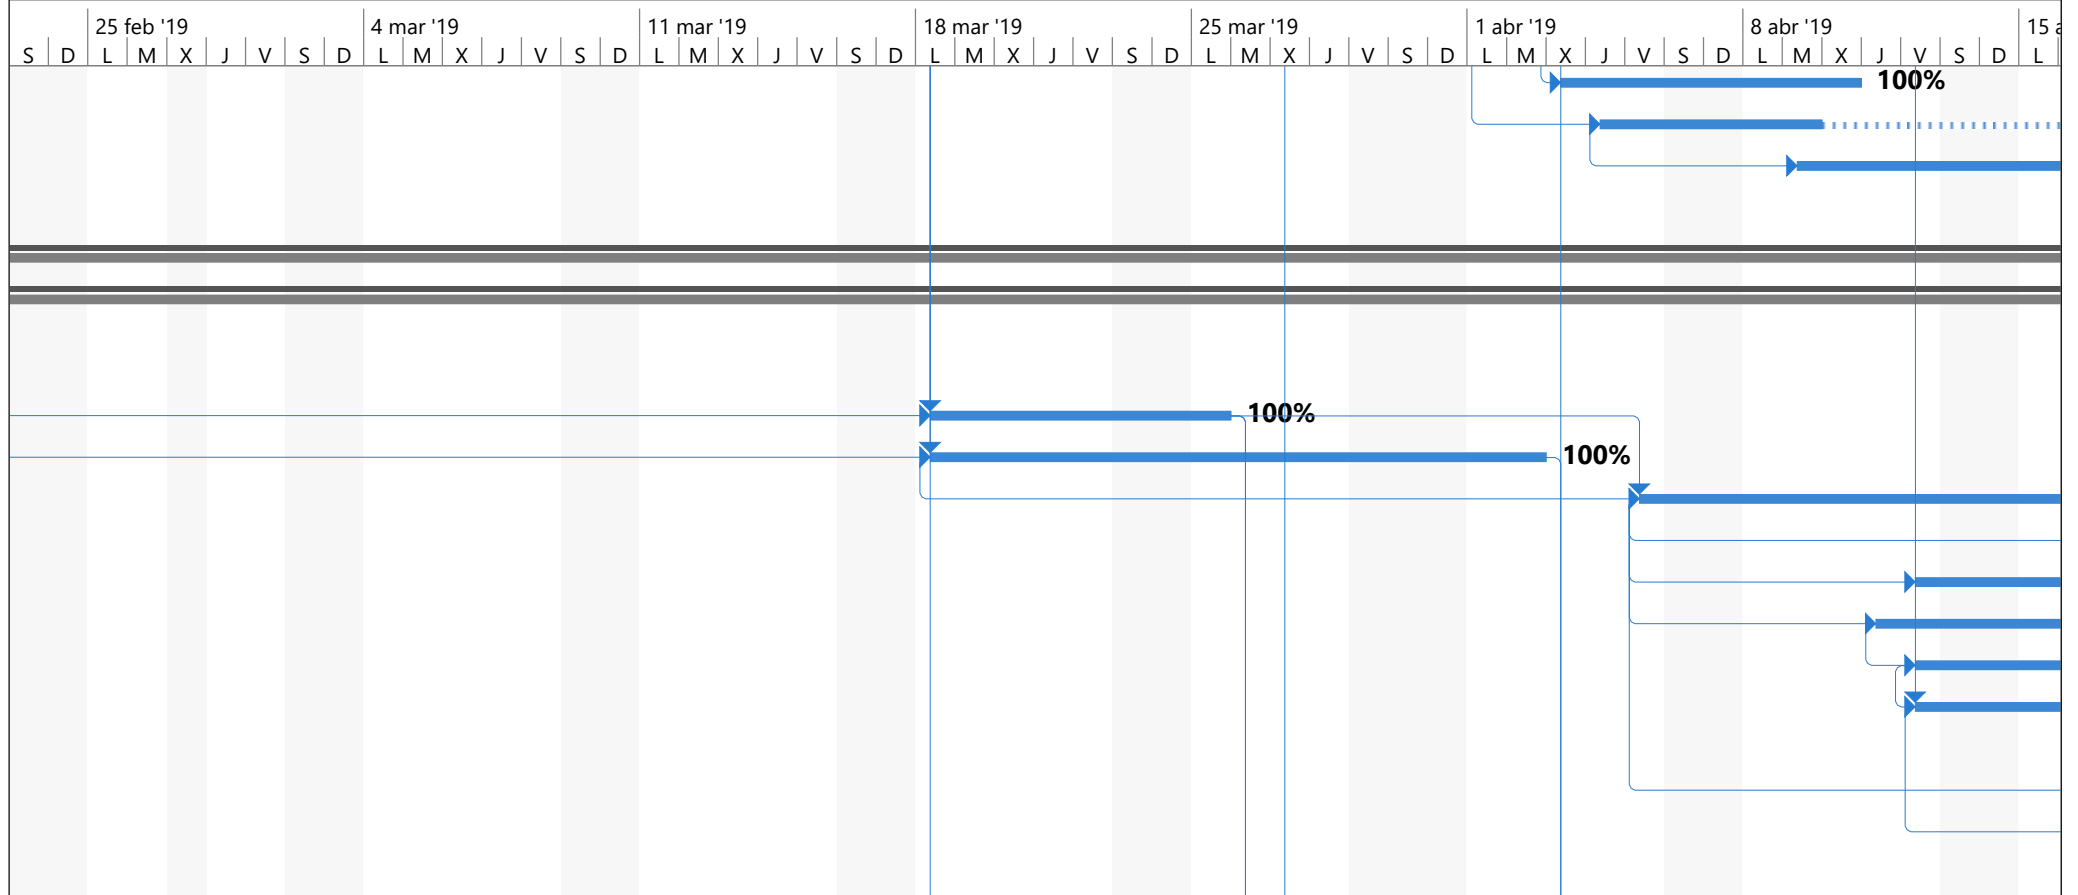

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

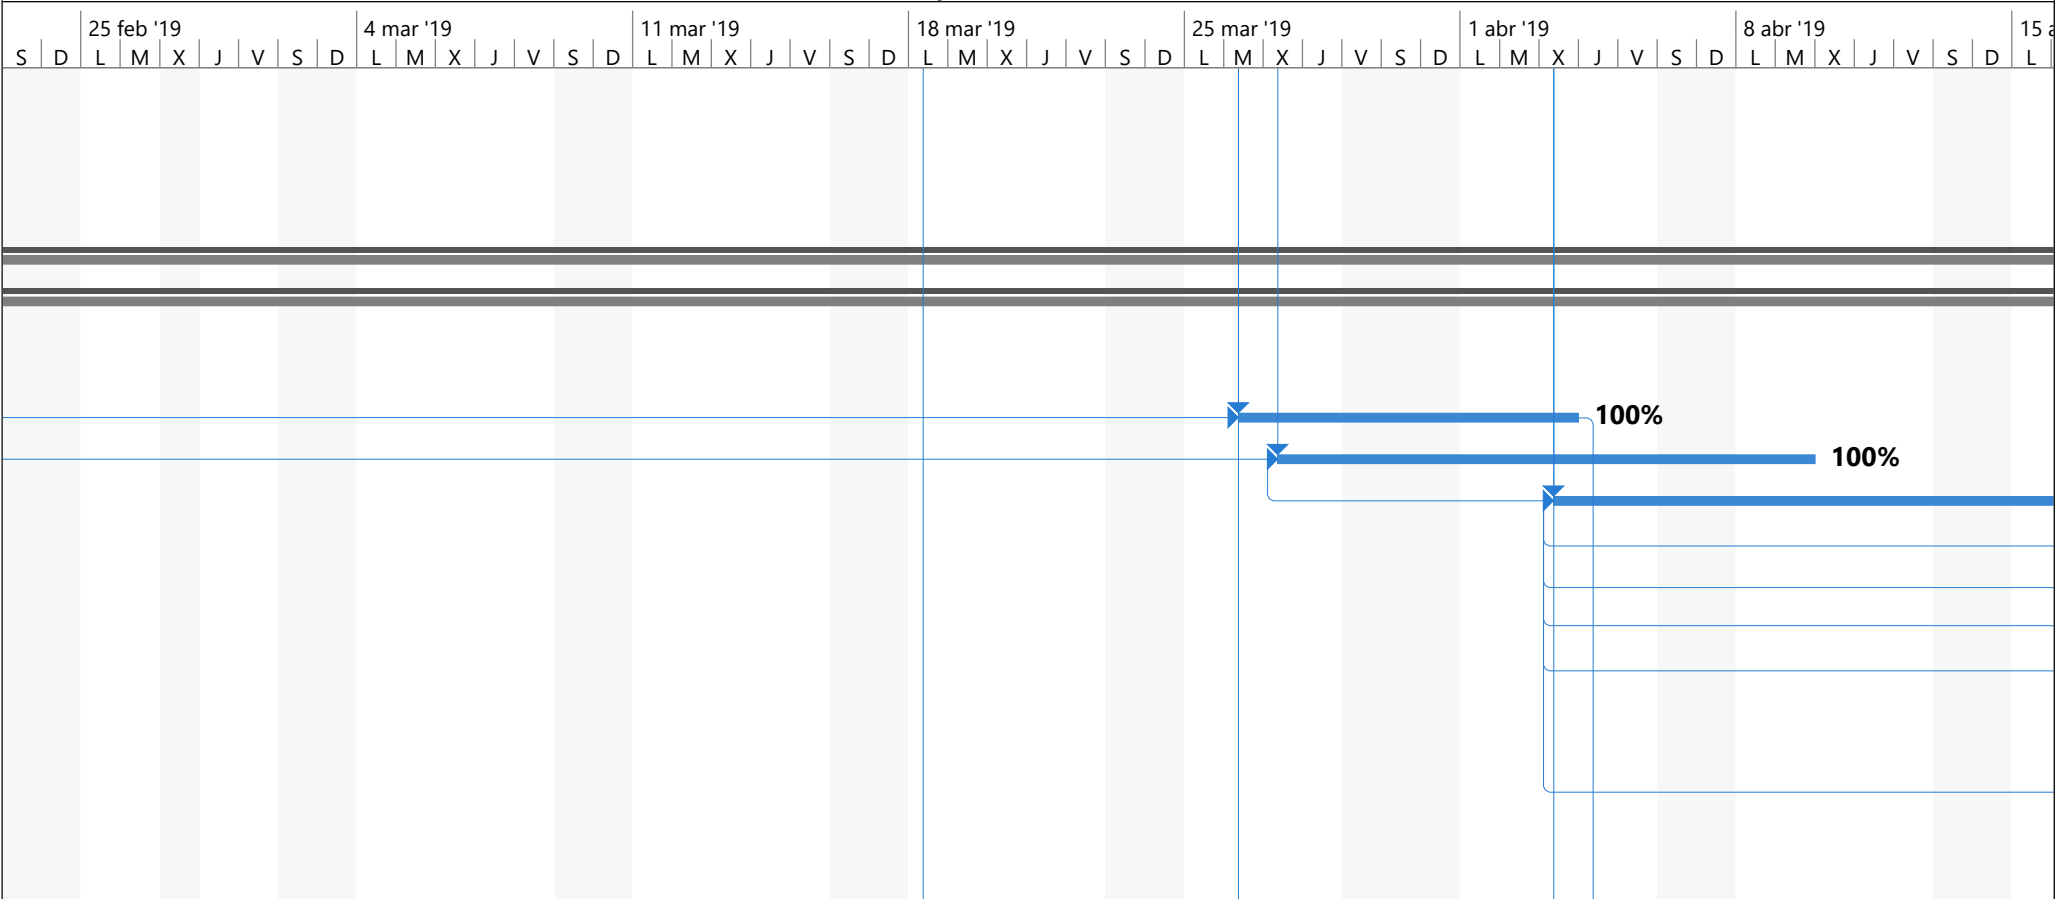

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

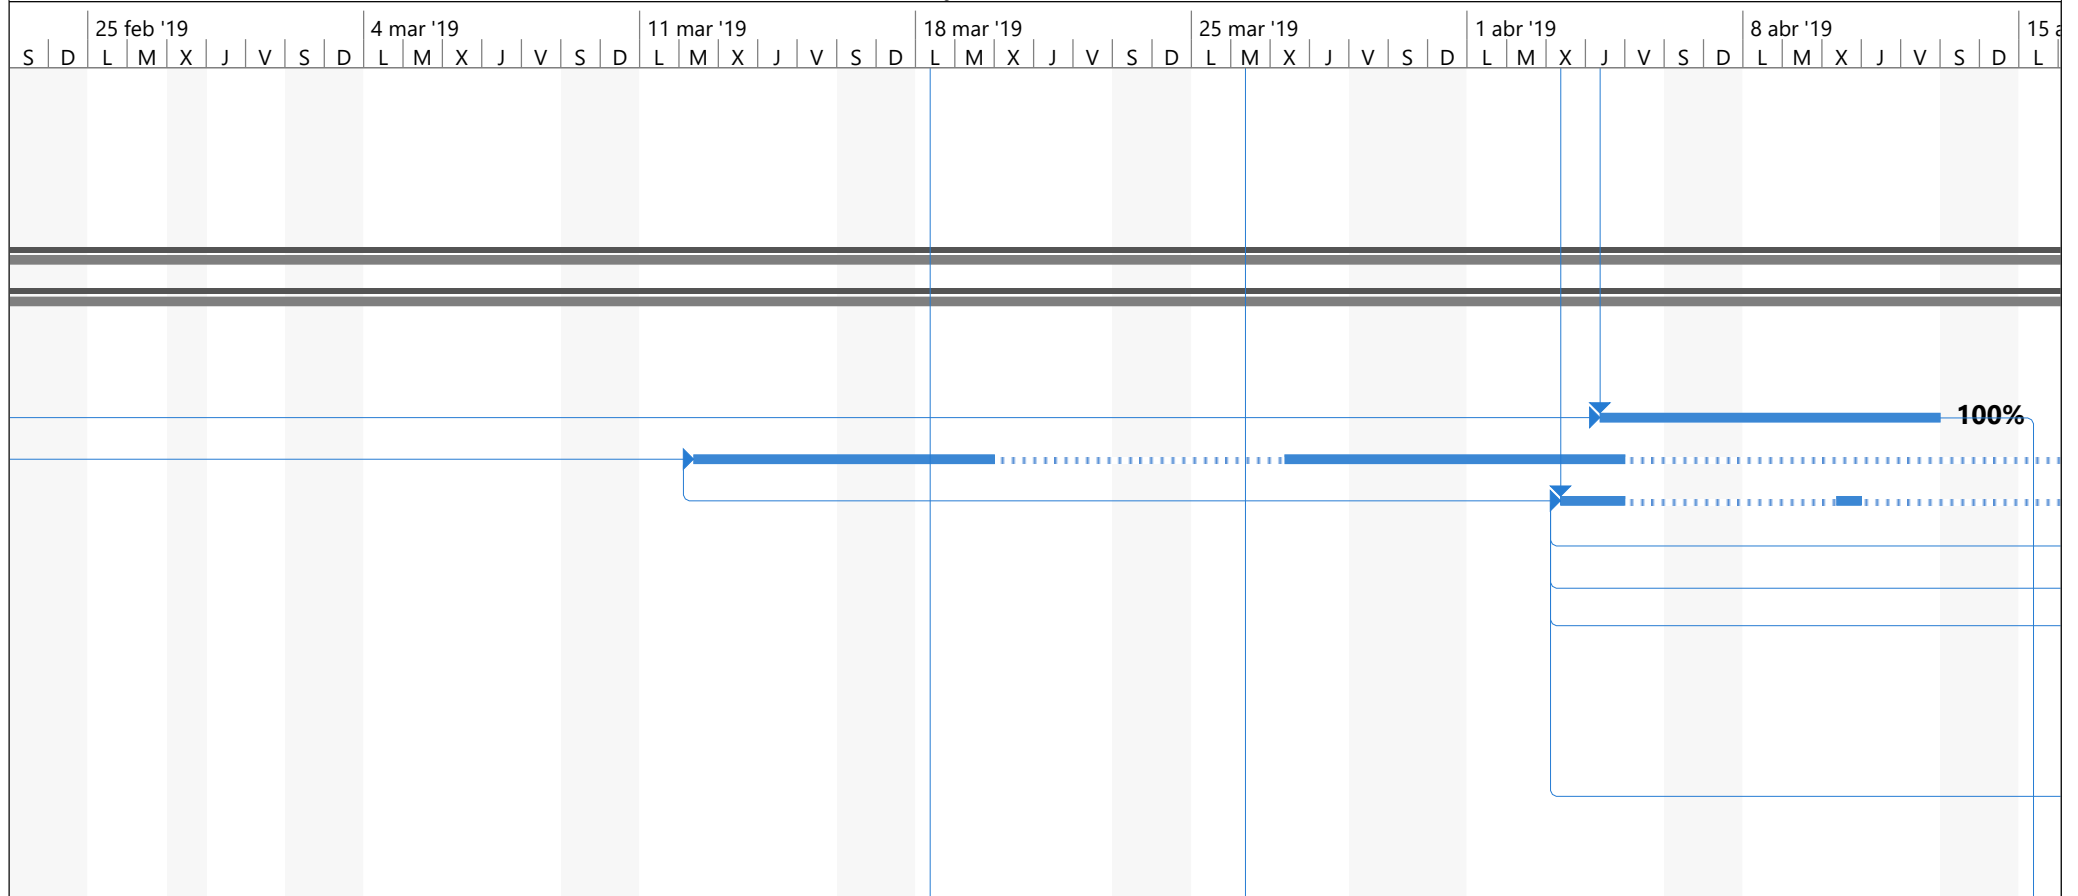


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

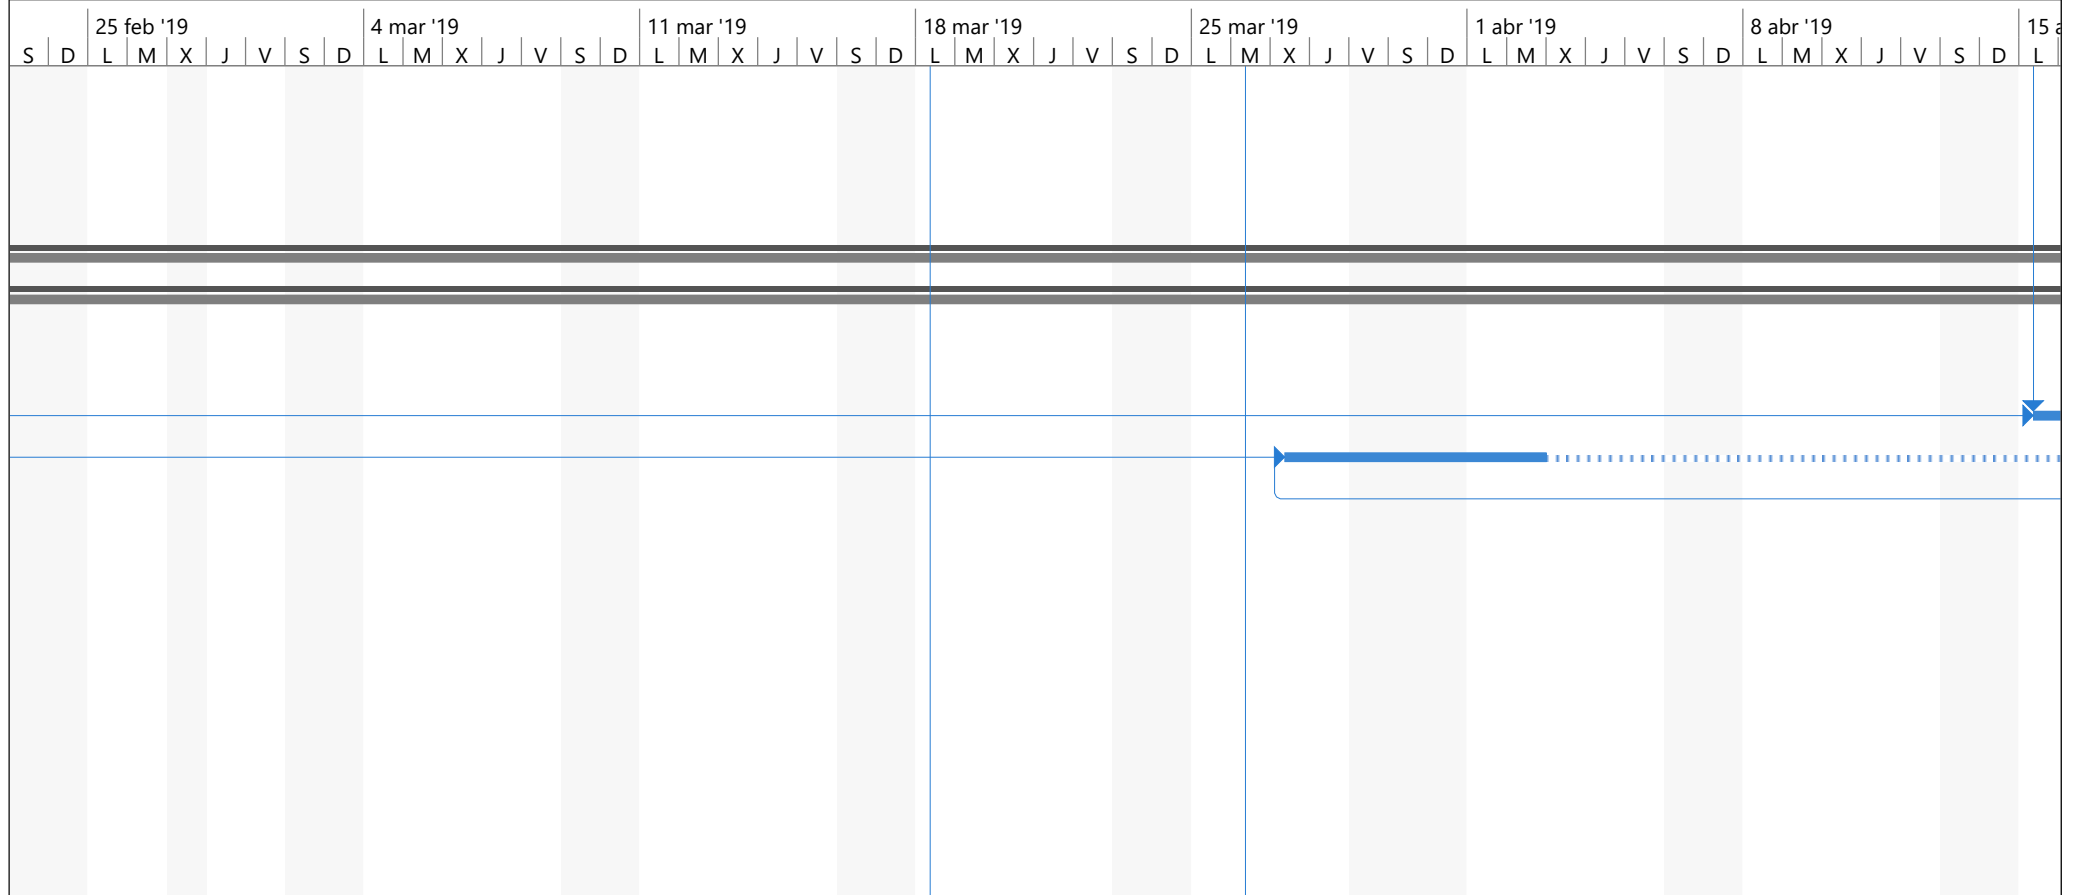


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

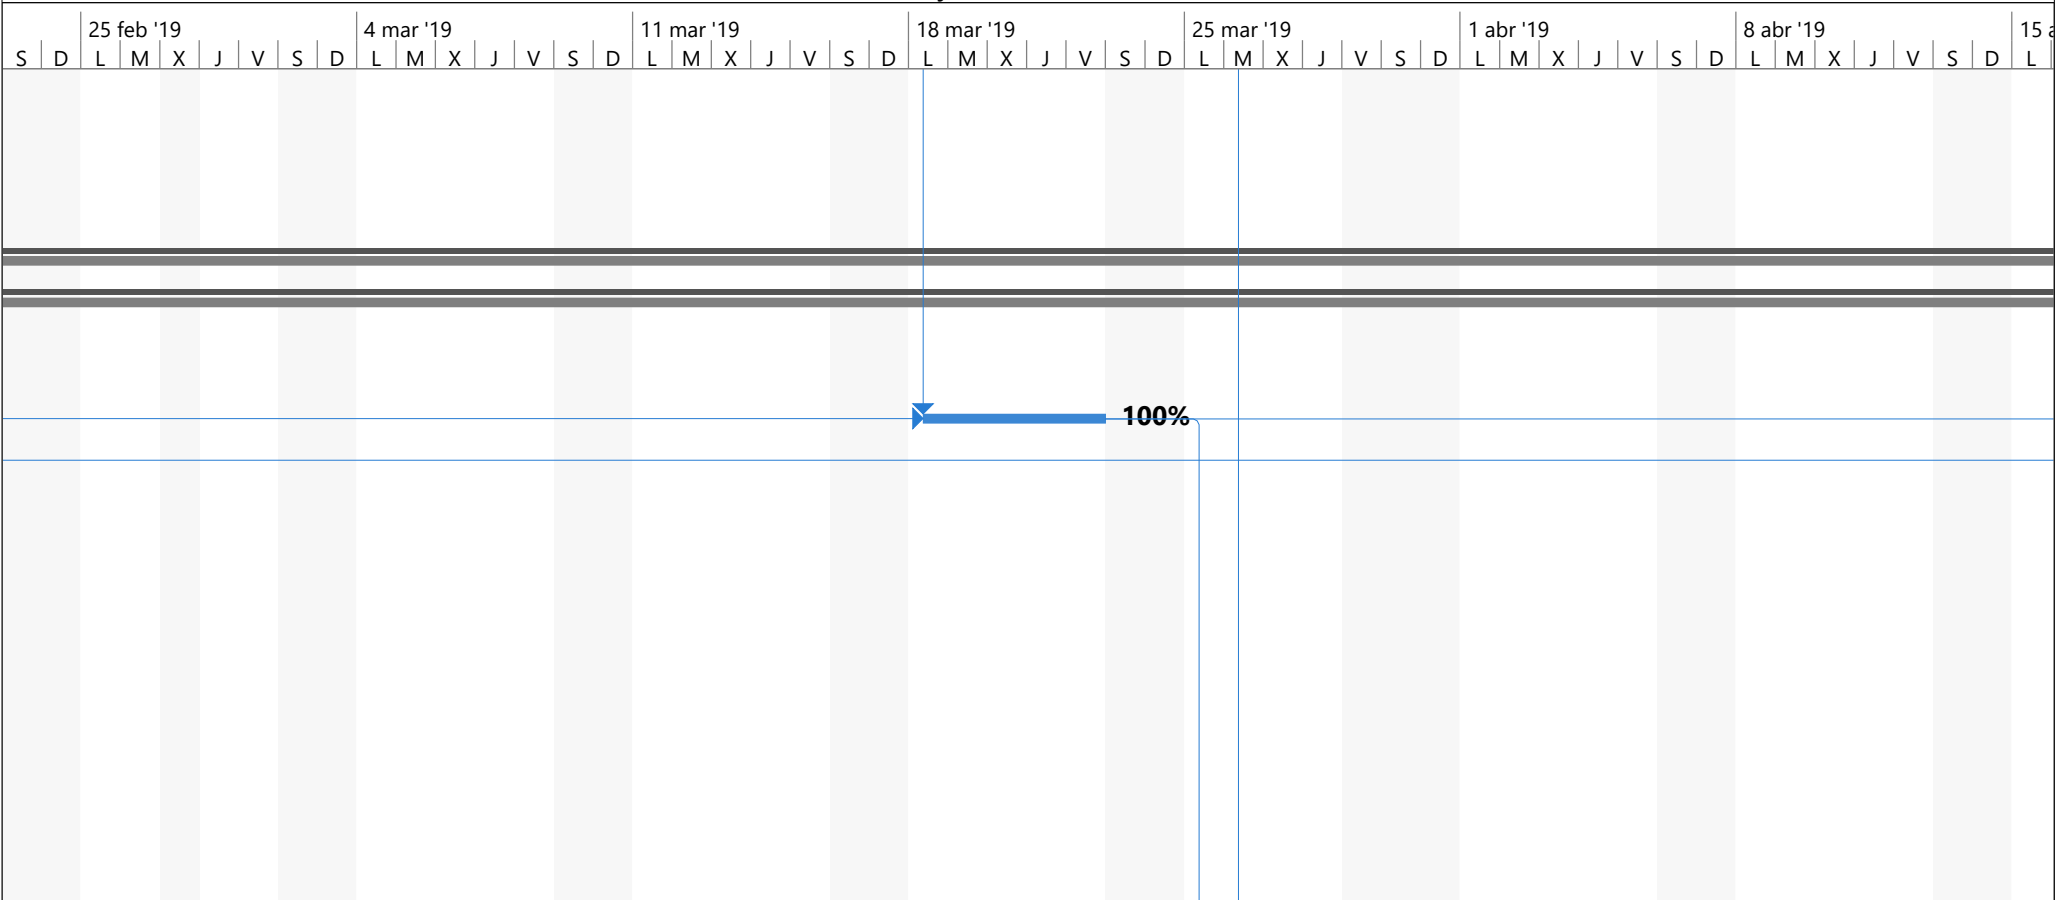

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

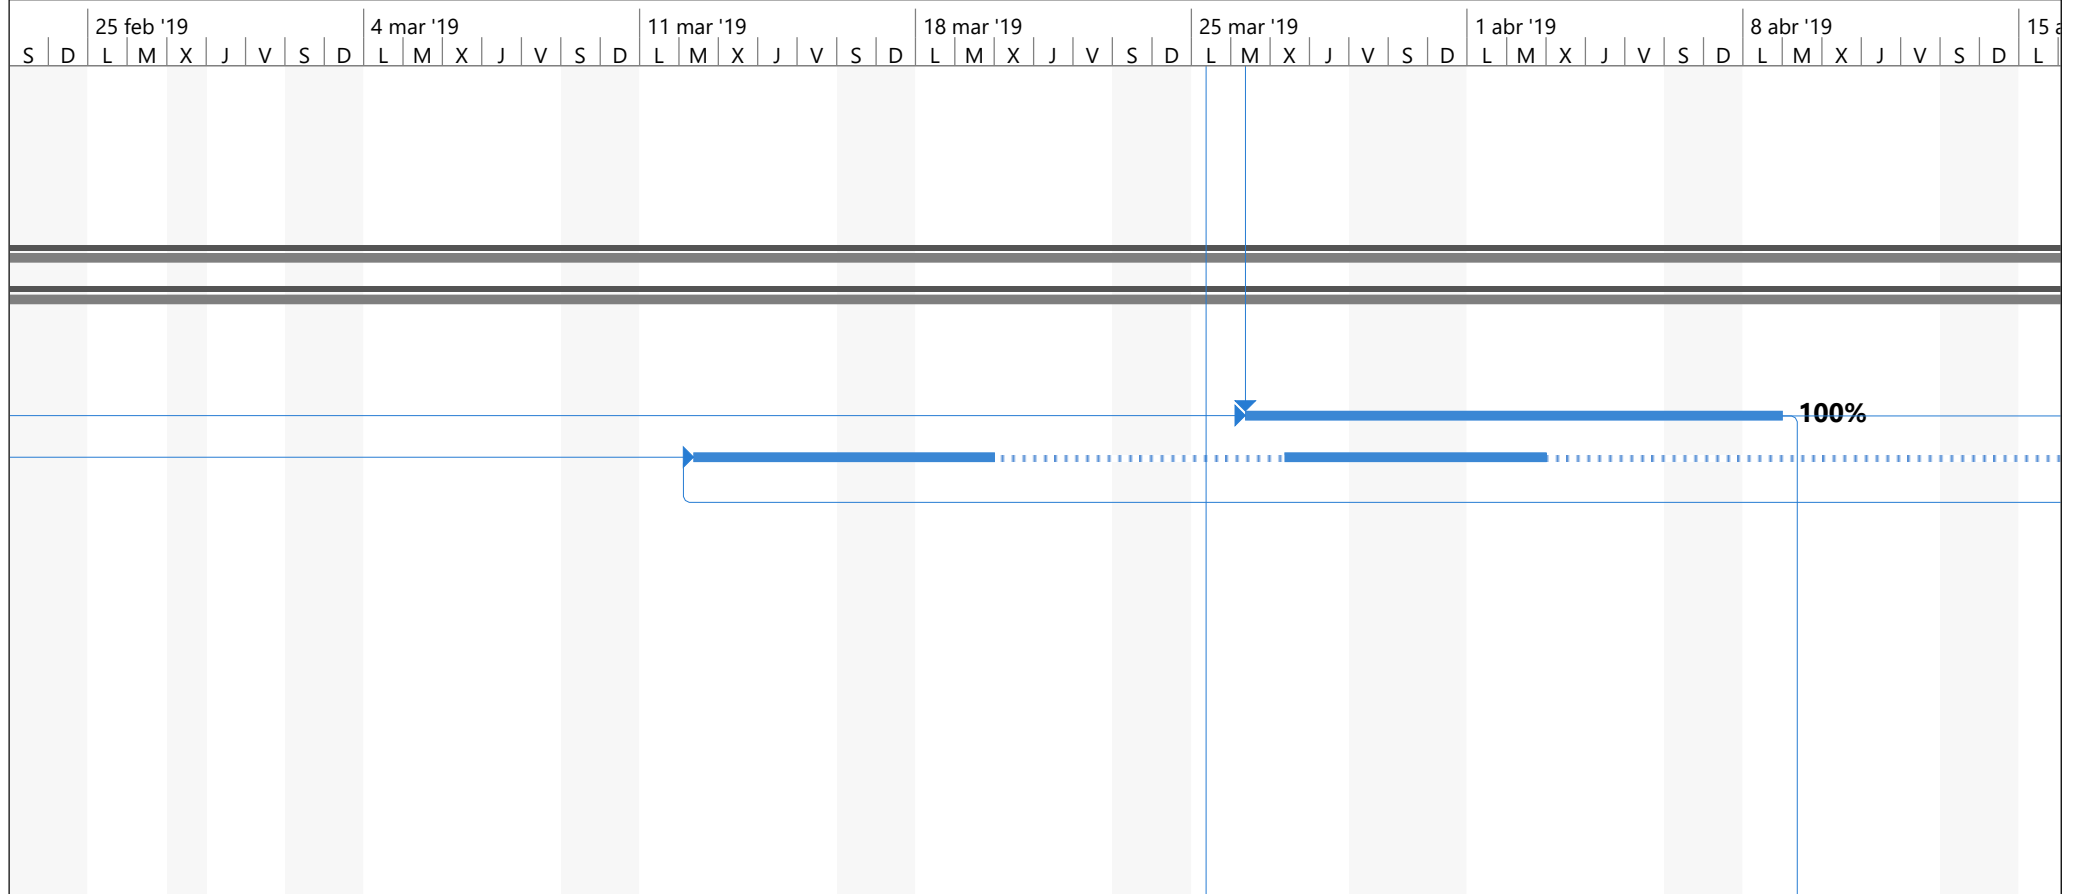


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

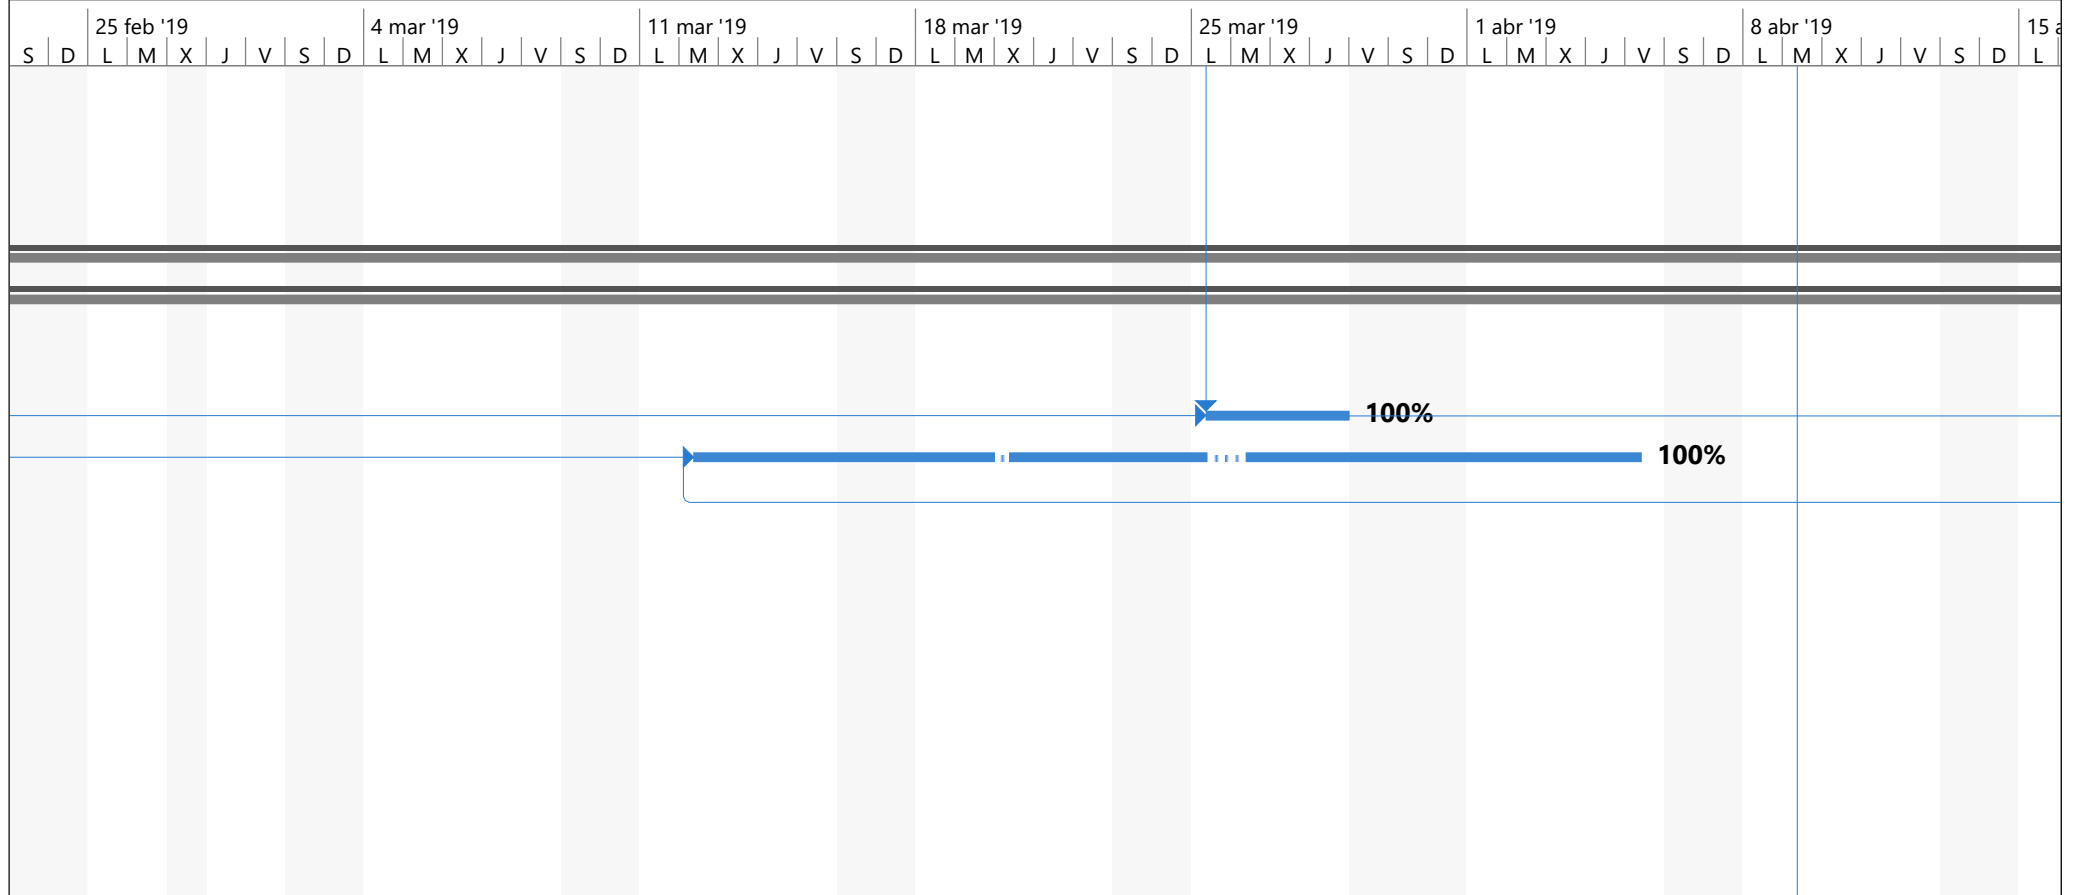

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



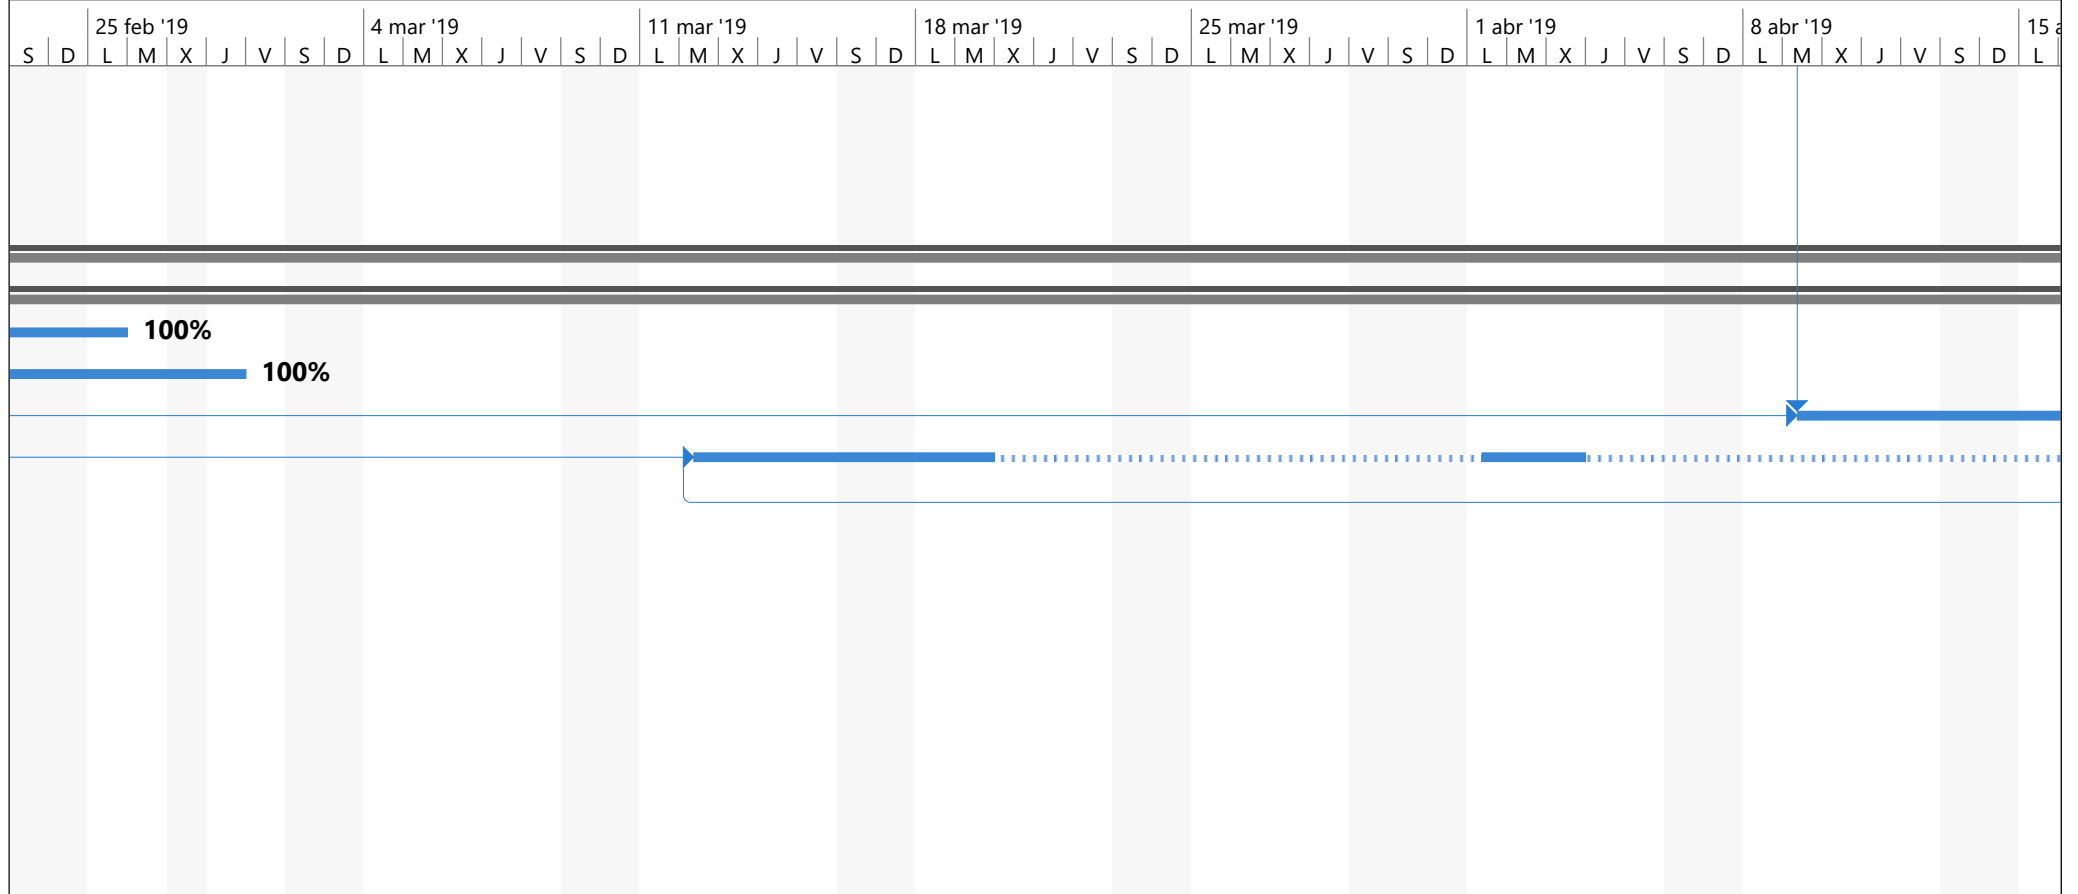





















# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

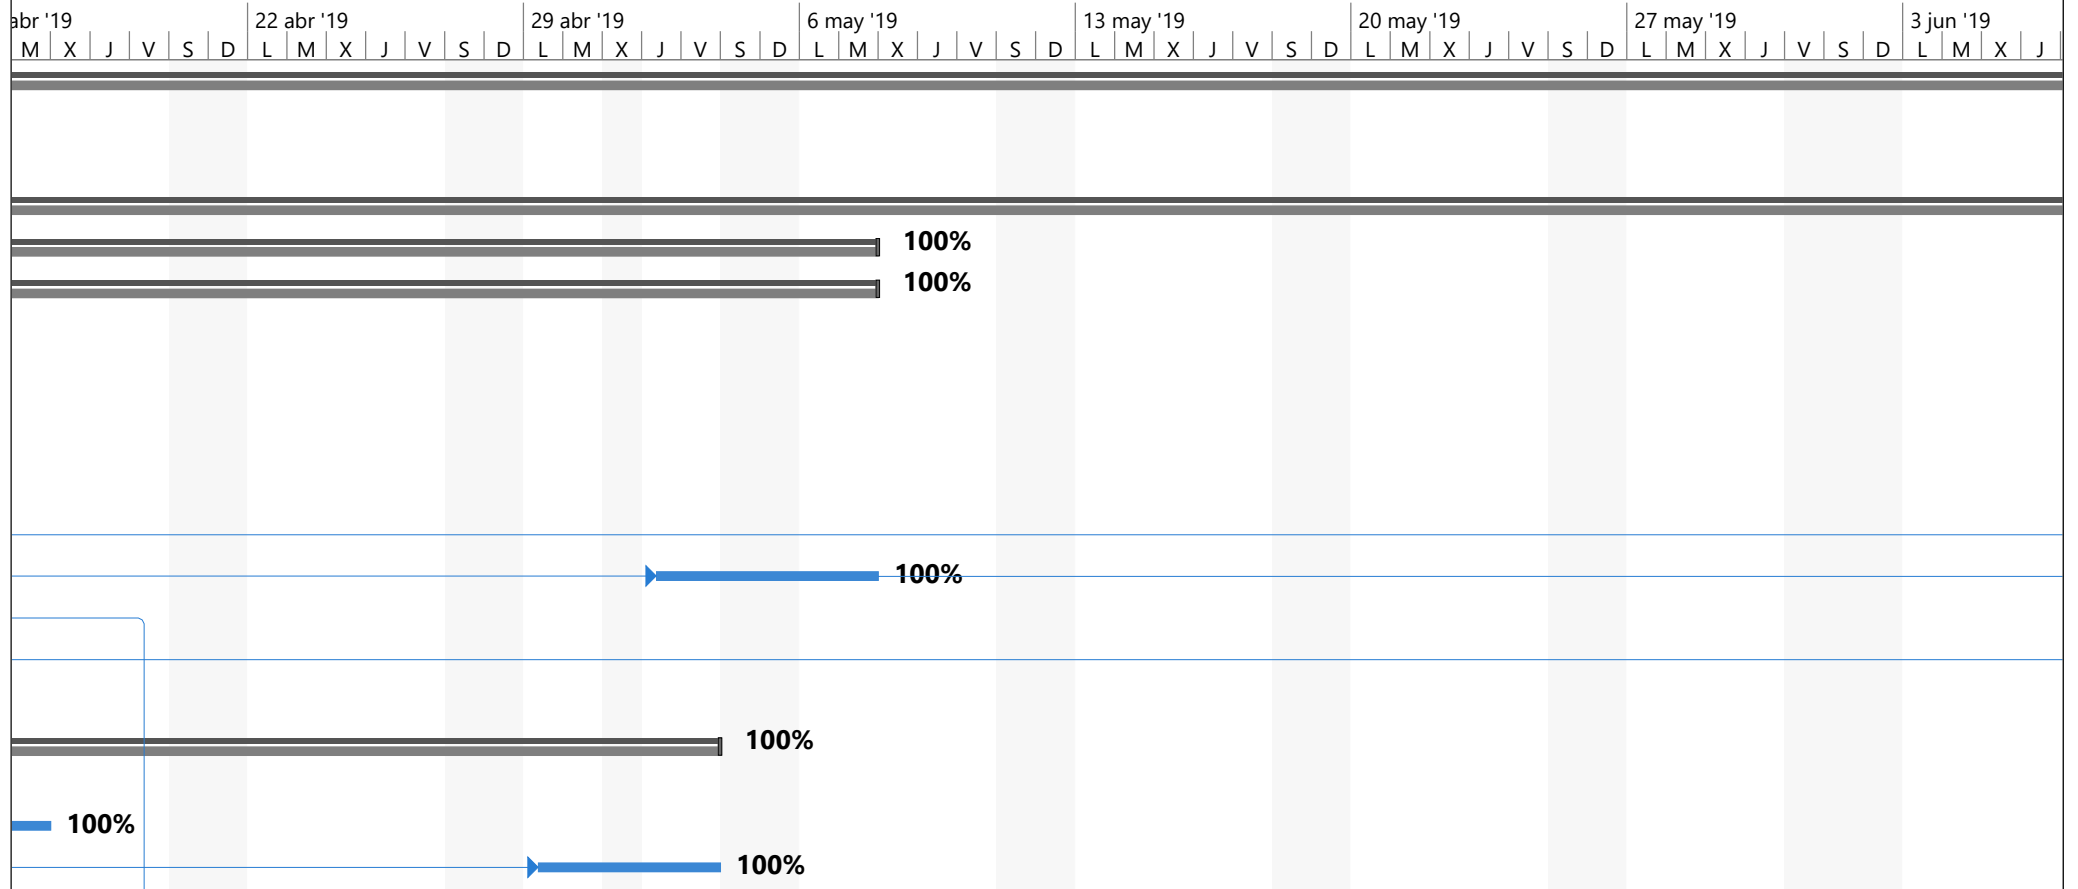


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

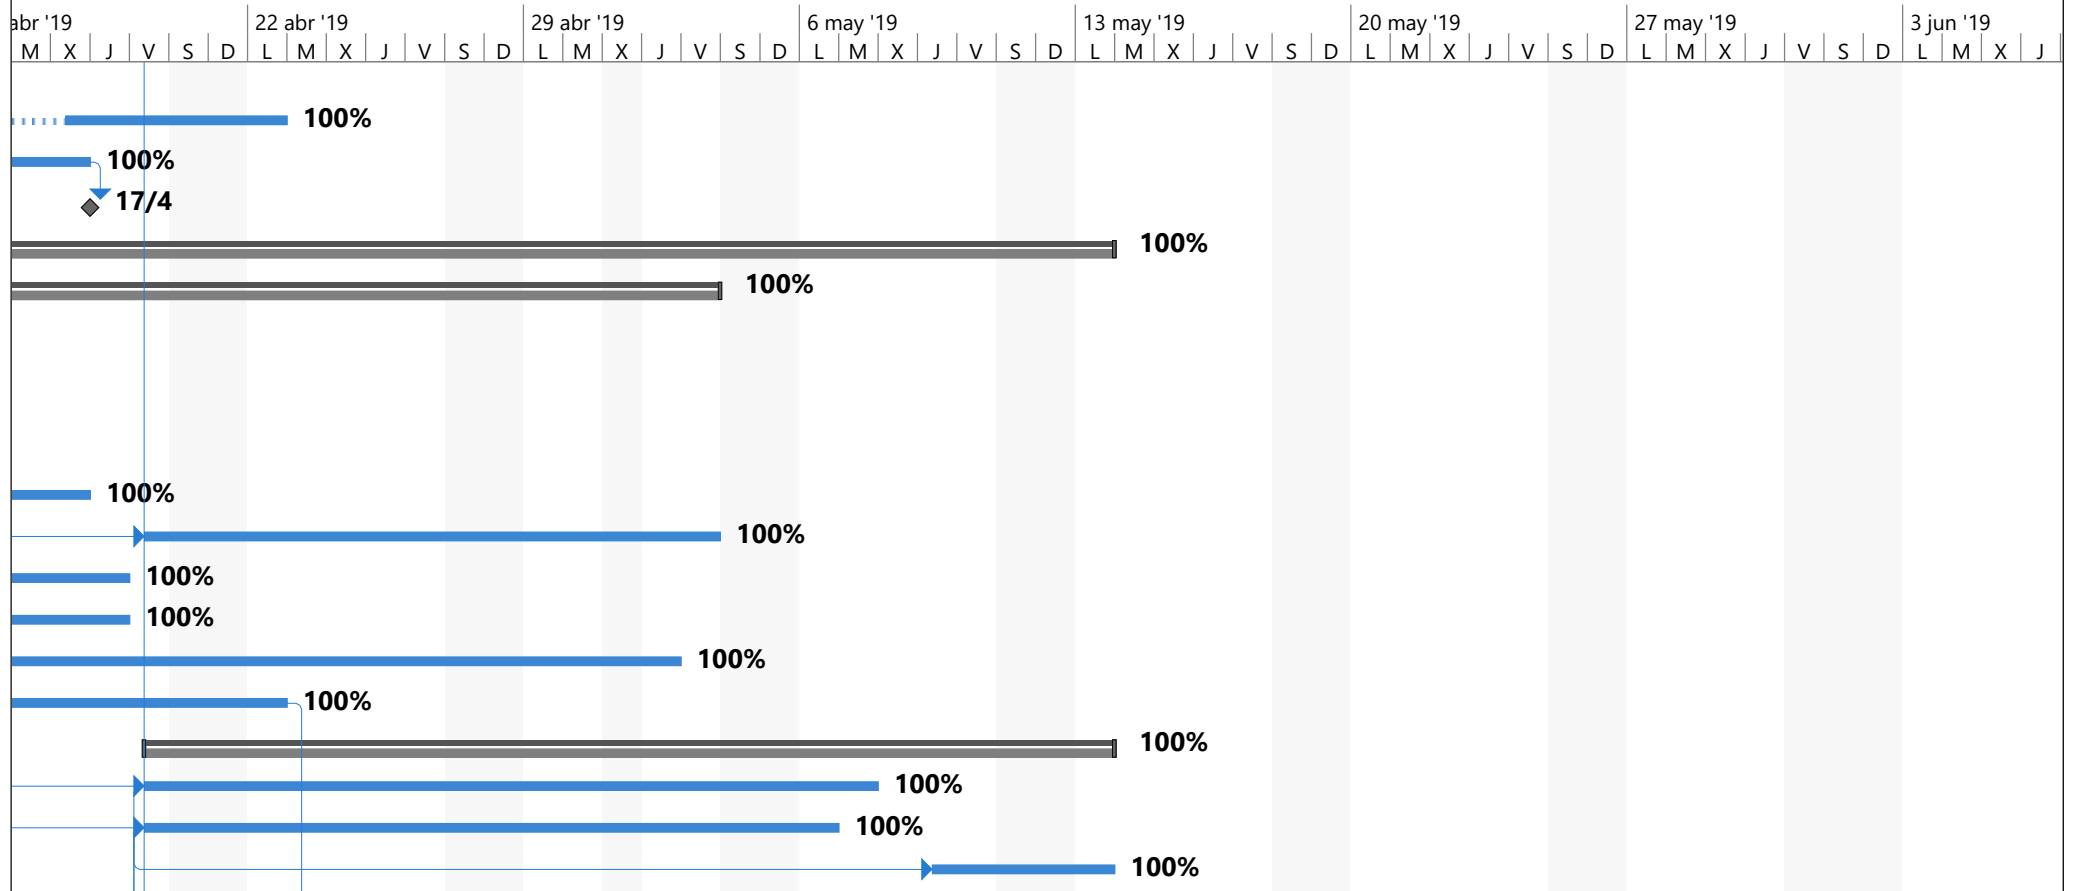


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

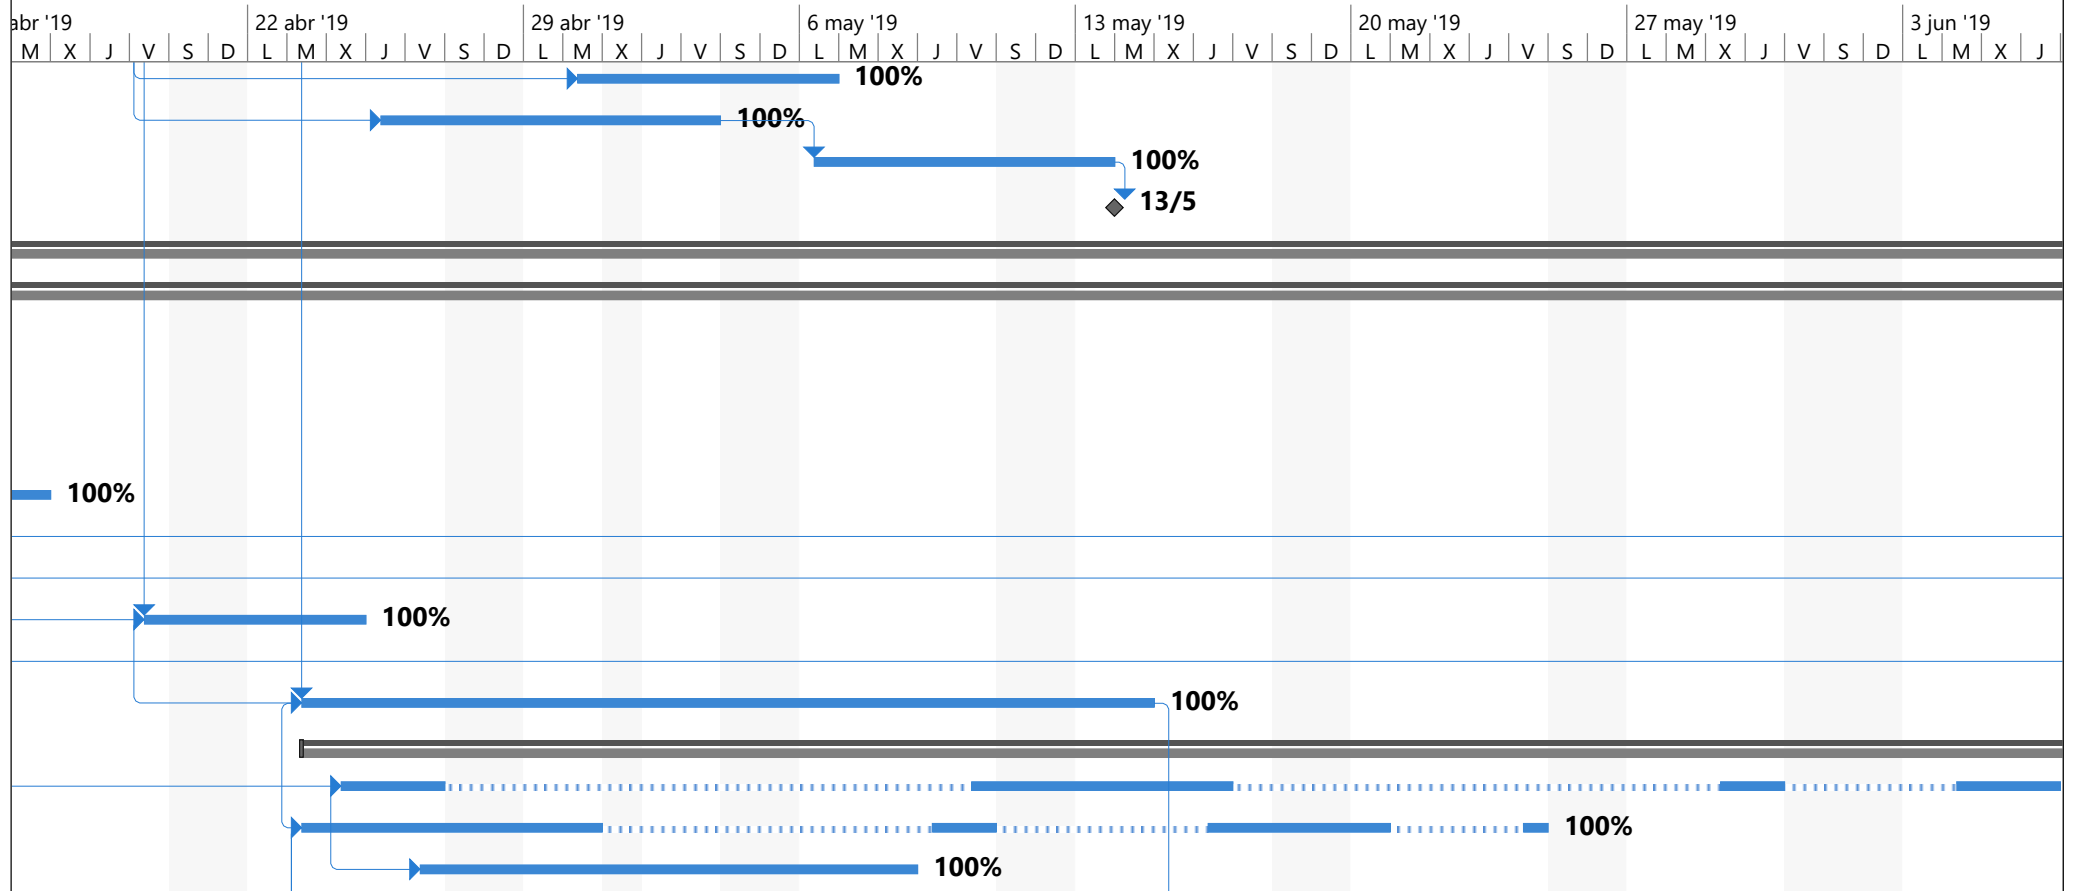


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

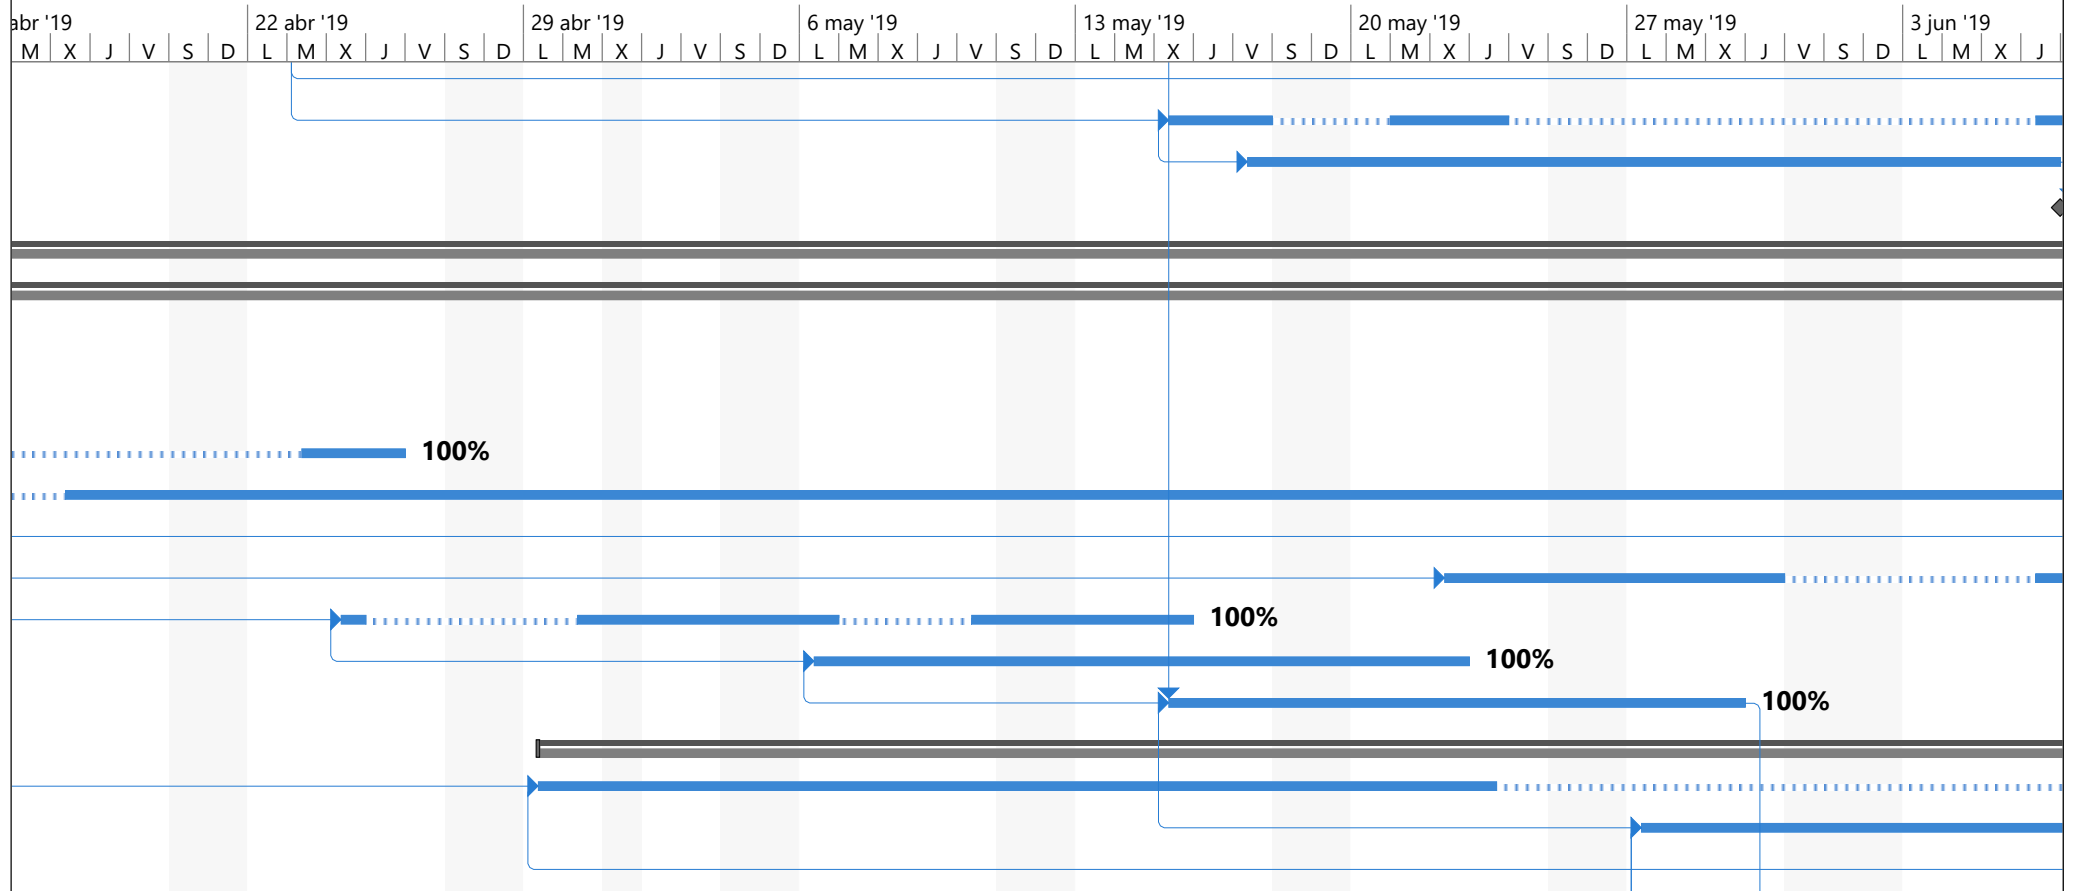


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

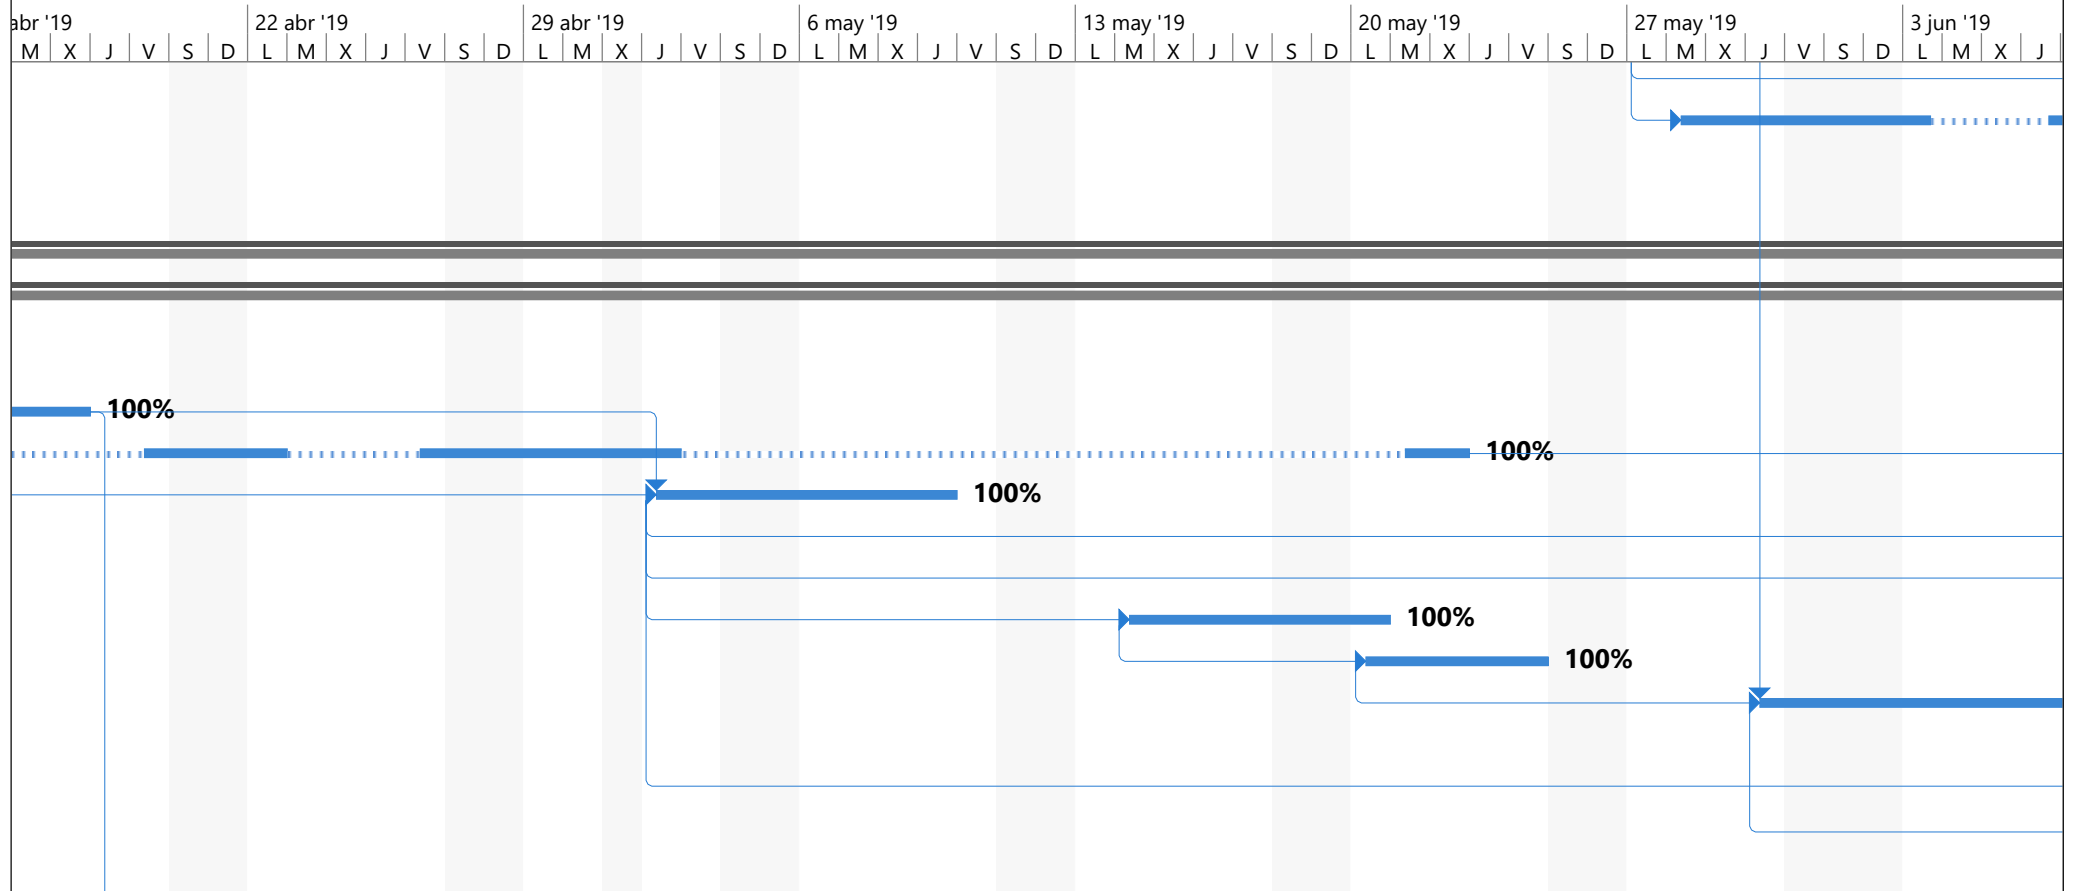


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

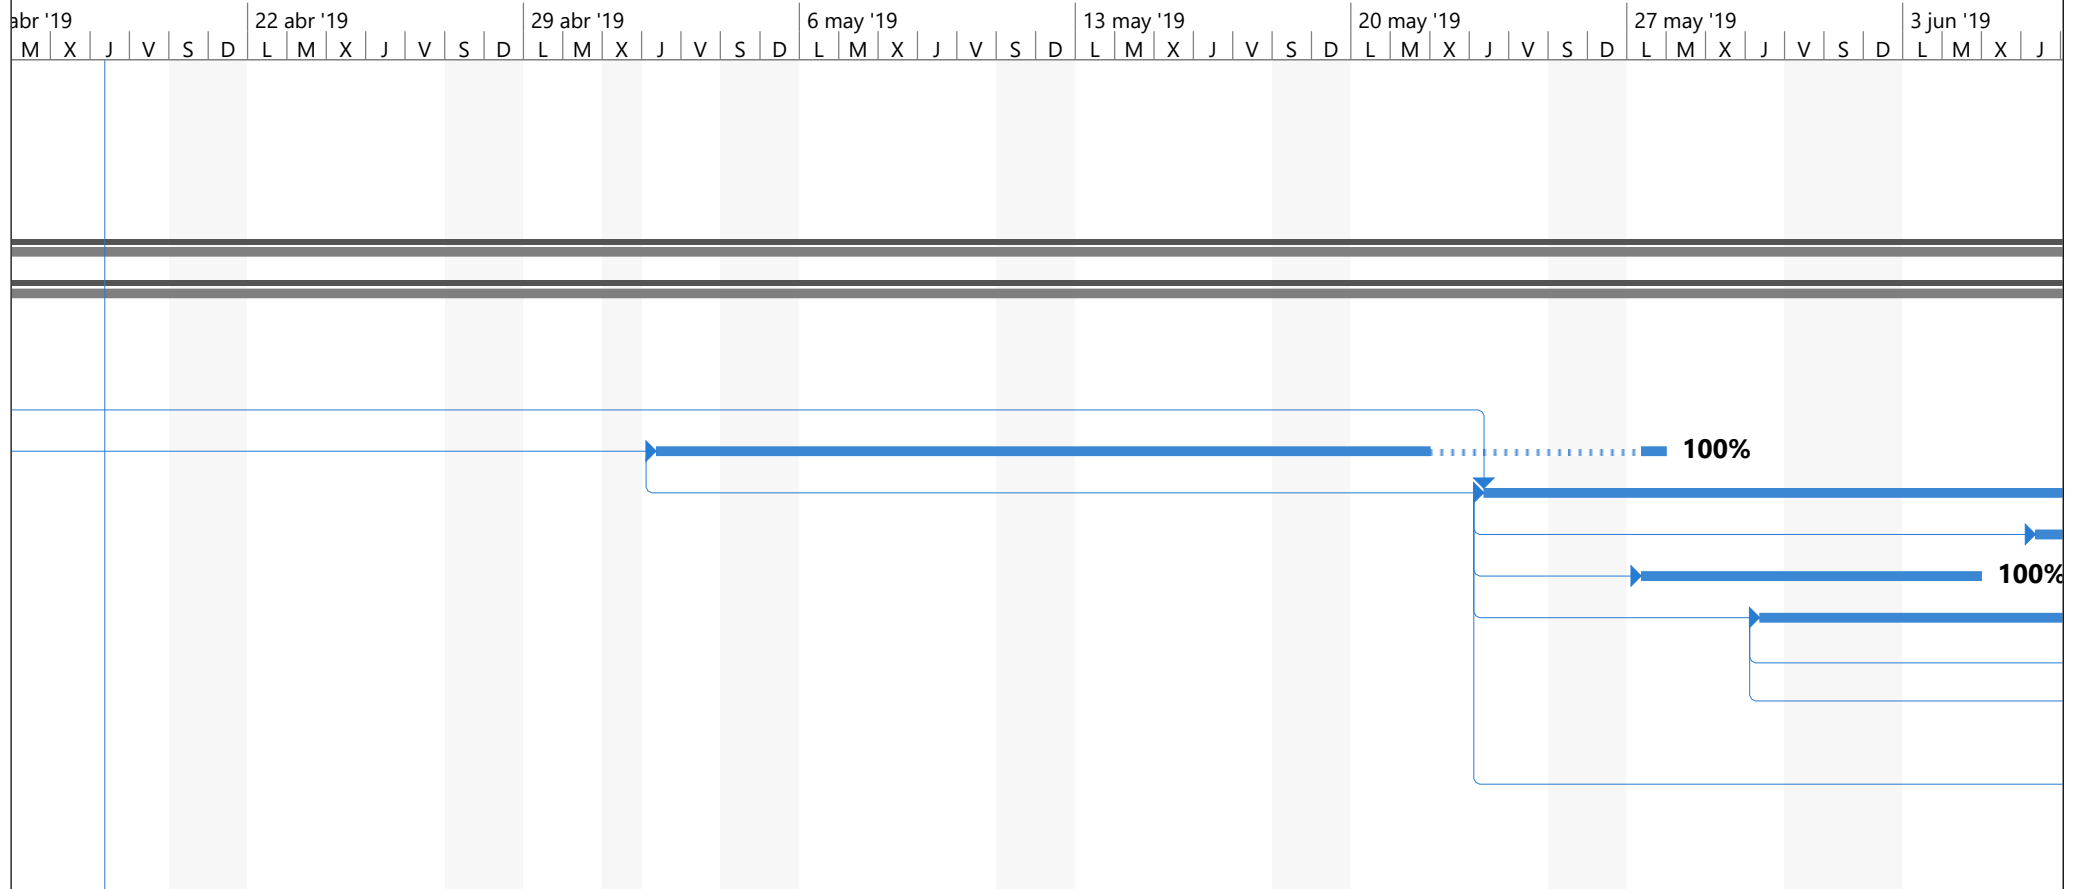


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

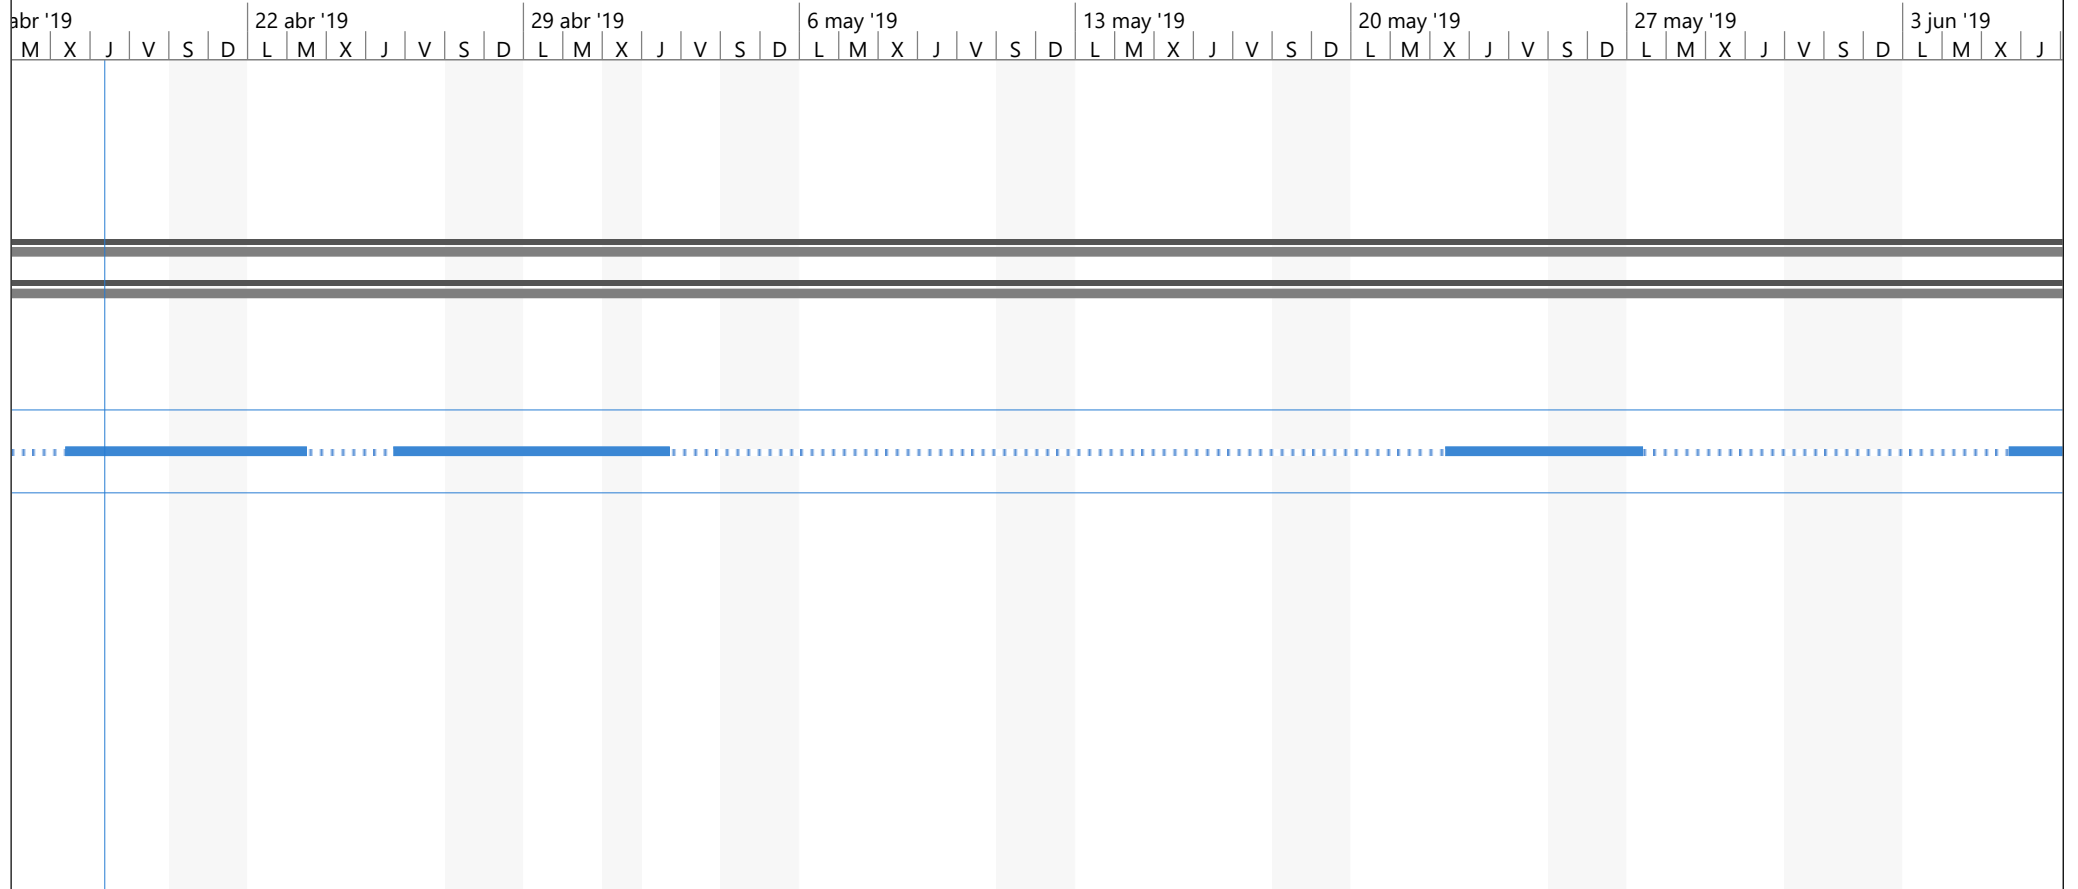

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

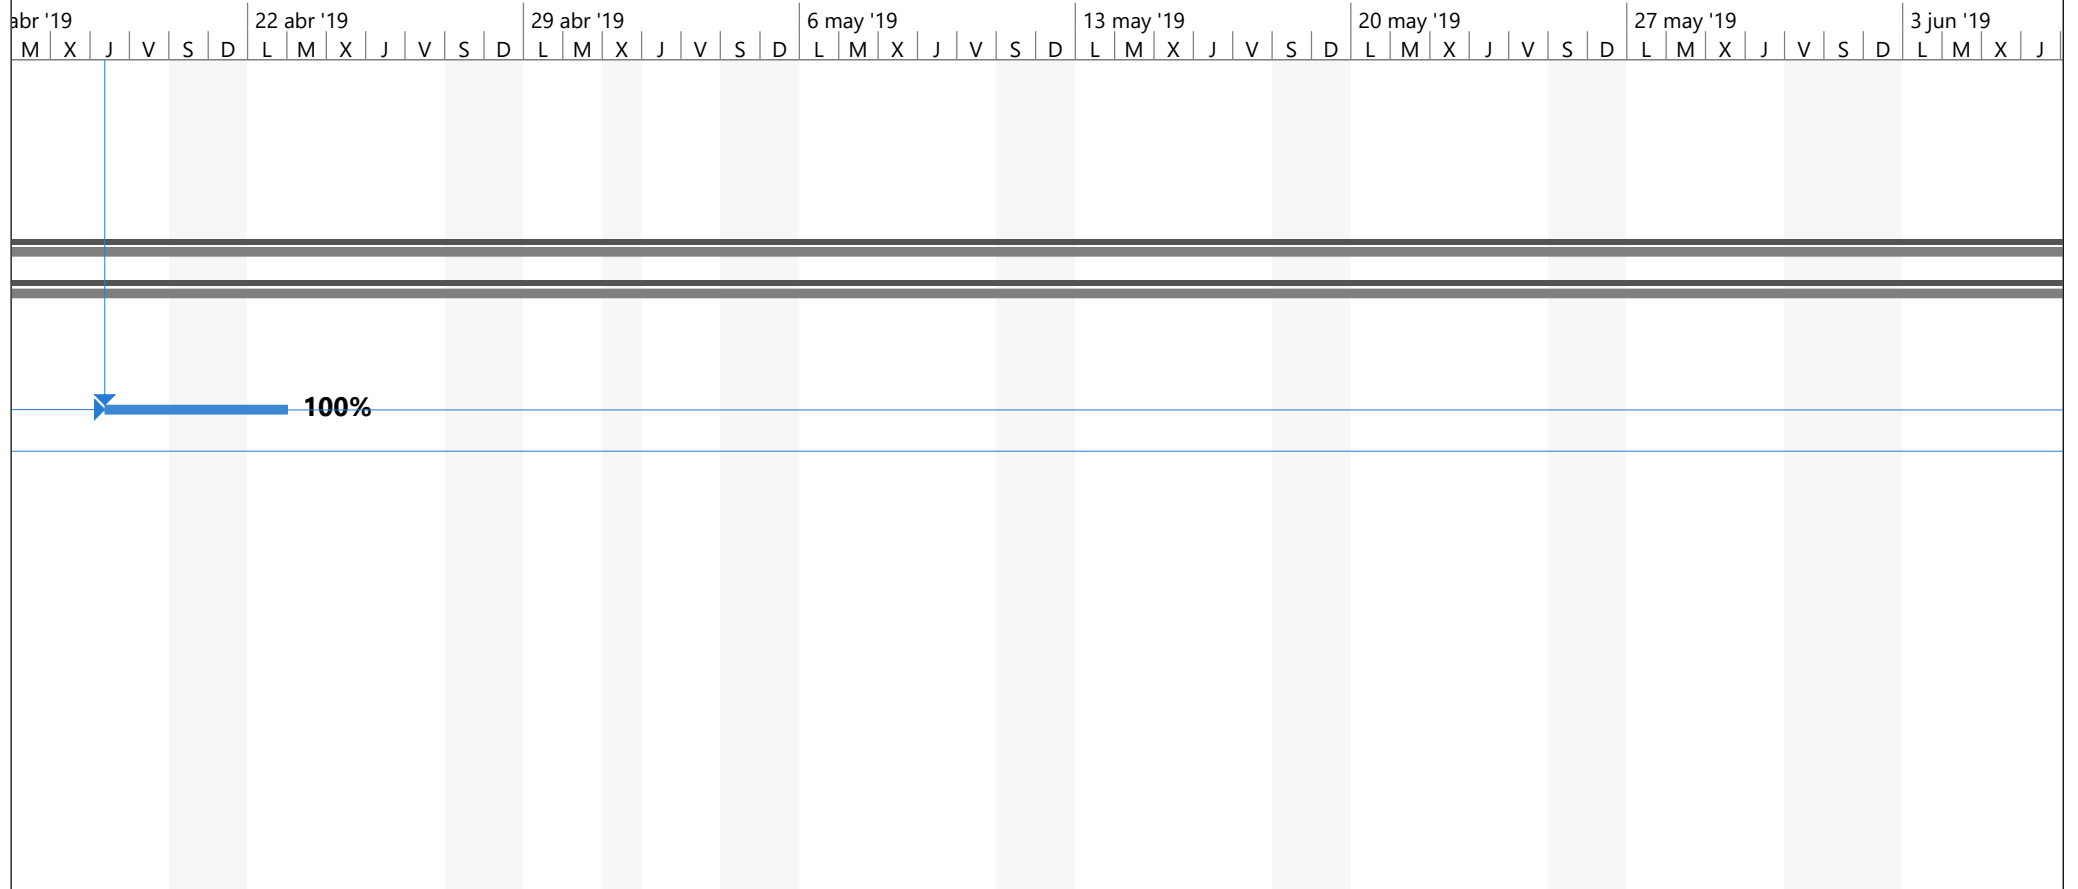


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



[illegible]

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

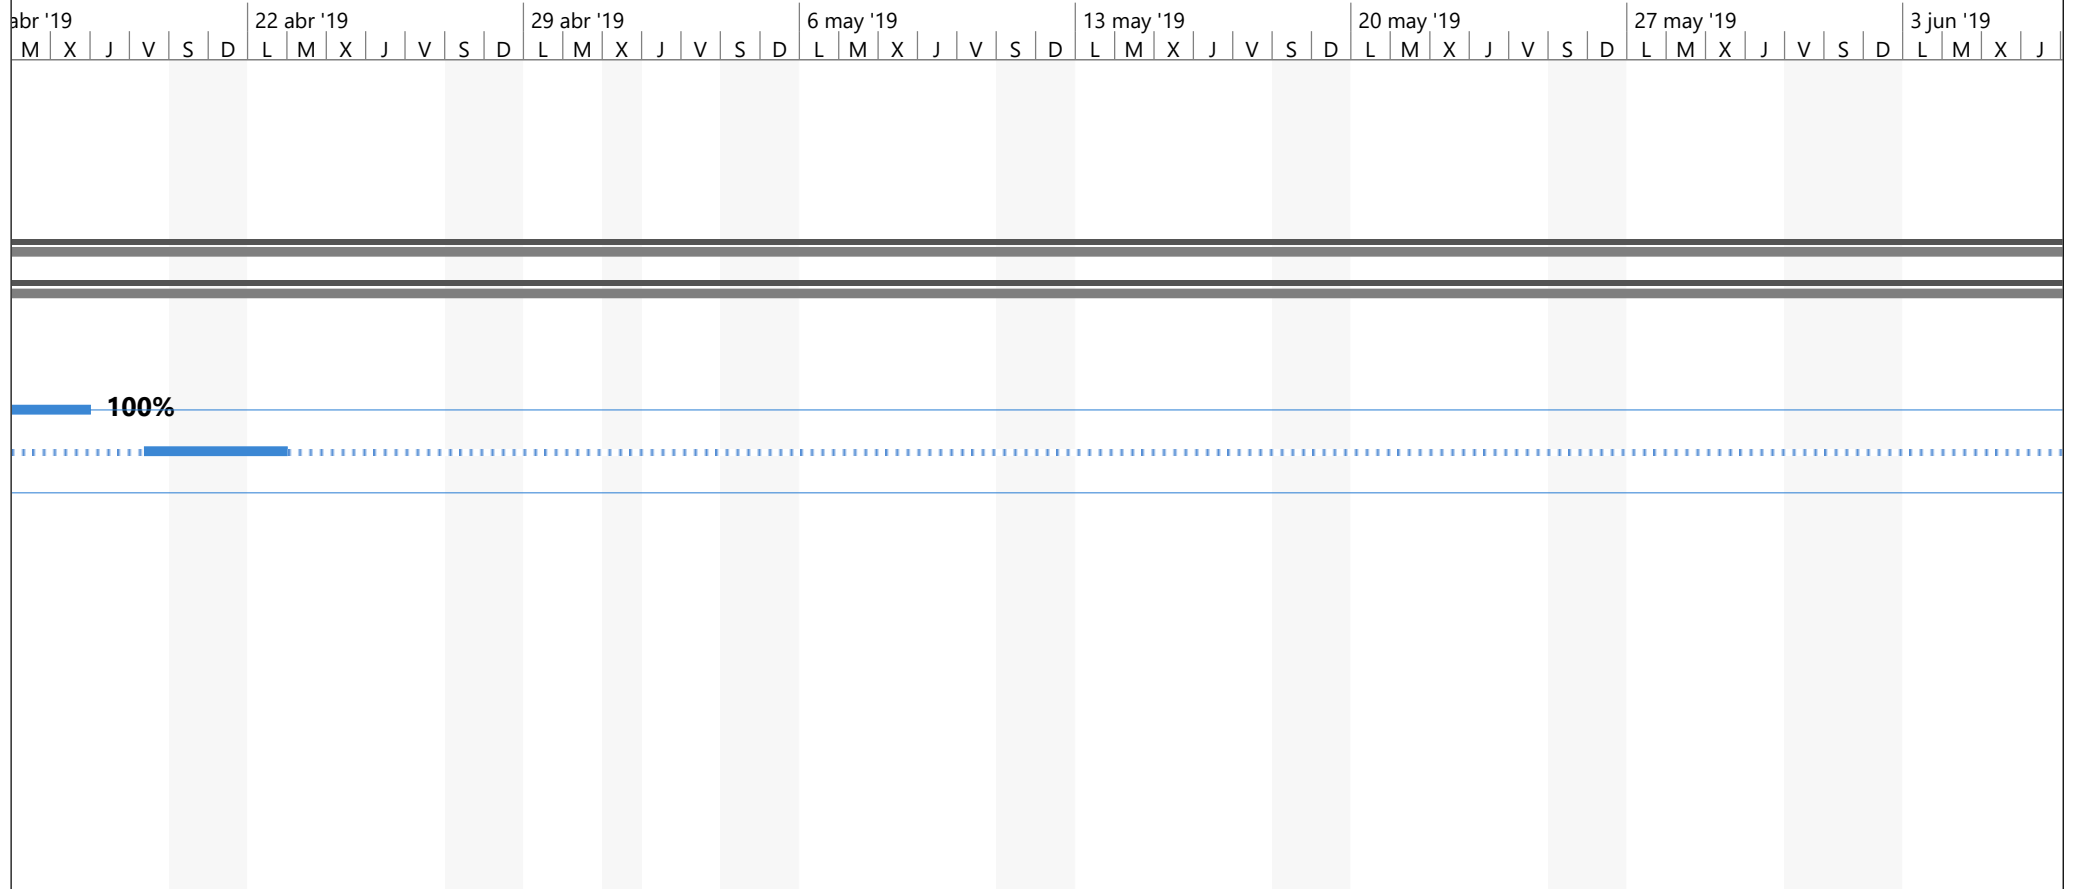

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| abr '19 |   |   |   |   |   |  | 22 abr '19 |   |   |   |   |   |   | 29 abr '19 |   |   |   |   |   |   | 6 may '19 |  |   |   |   |   |   | 13 may '19 |   |  |   |   |   |   | 20 may '19 |   |   |  |   |   |   | 27 may '19 |  |  |  |  |  |  | 3 jun '19 |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|---|---|---|---|---|------------|---|--|---|---|---|---|------------|---|---|--|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| M       | X | J | V | S | D |  | L          | M | X | J | V | S | D |            | L | M | X | J | V | S | D         |  | L | M | X | J | V | S          | D |  | L | M | X | J | V          | S | D |  | L | M | X | J          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |
|         |   |   |   |   |   |  |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |  |   |   |   |   |   |            |   |  |   |   |   |   |            |   |   |  |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

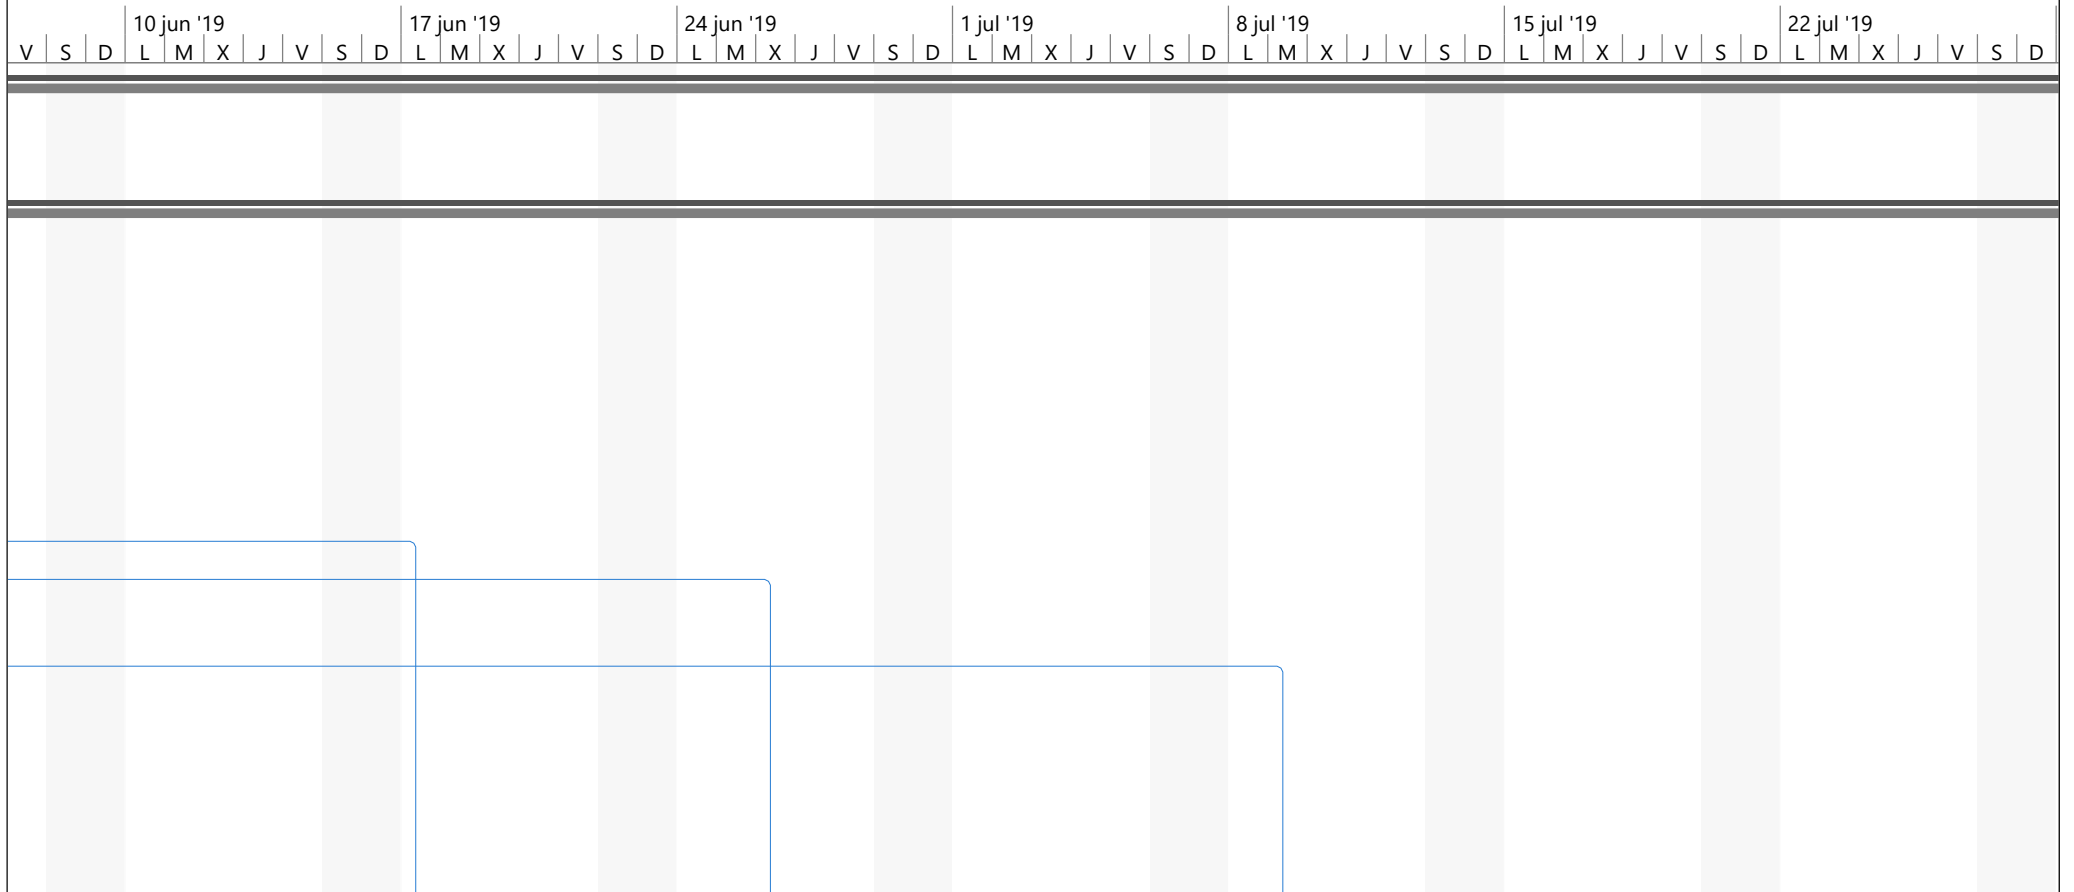


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| V | S | D | 10 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 17 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 24 jun '19 |   |   |   |   |   |   | 1 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 8 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 15 jul '19 |   |   |   |  |  |  | 22 jul '19 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

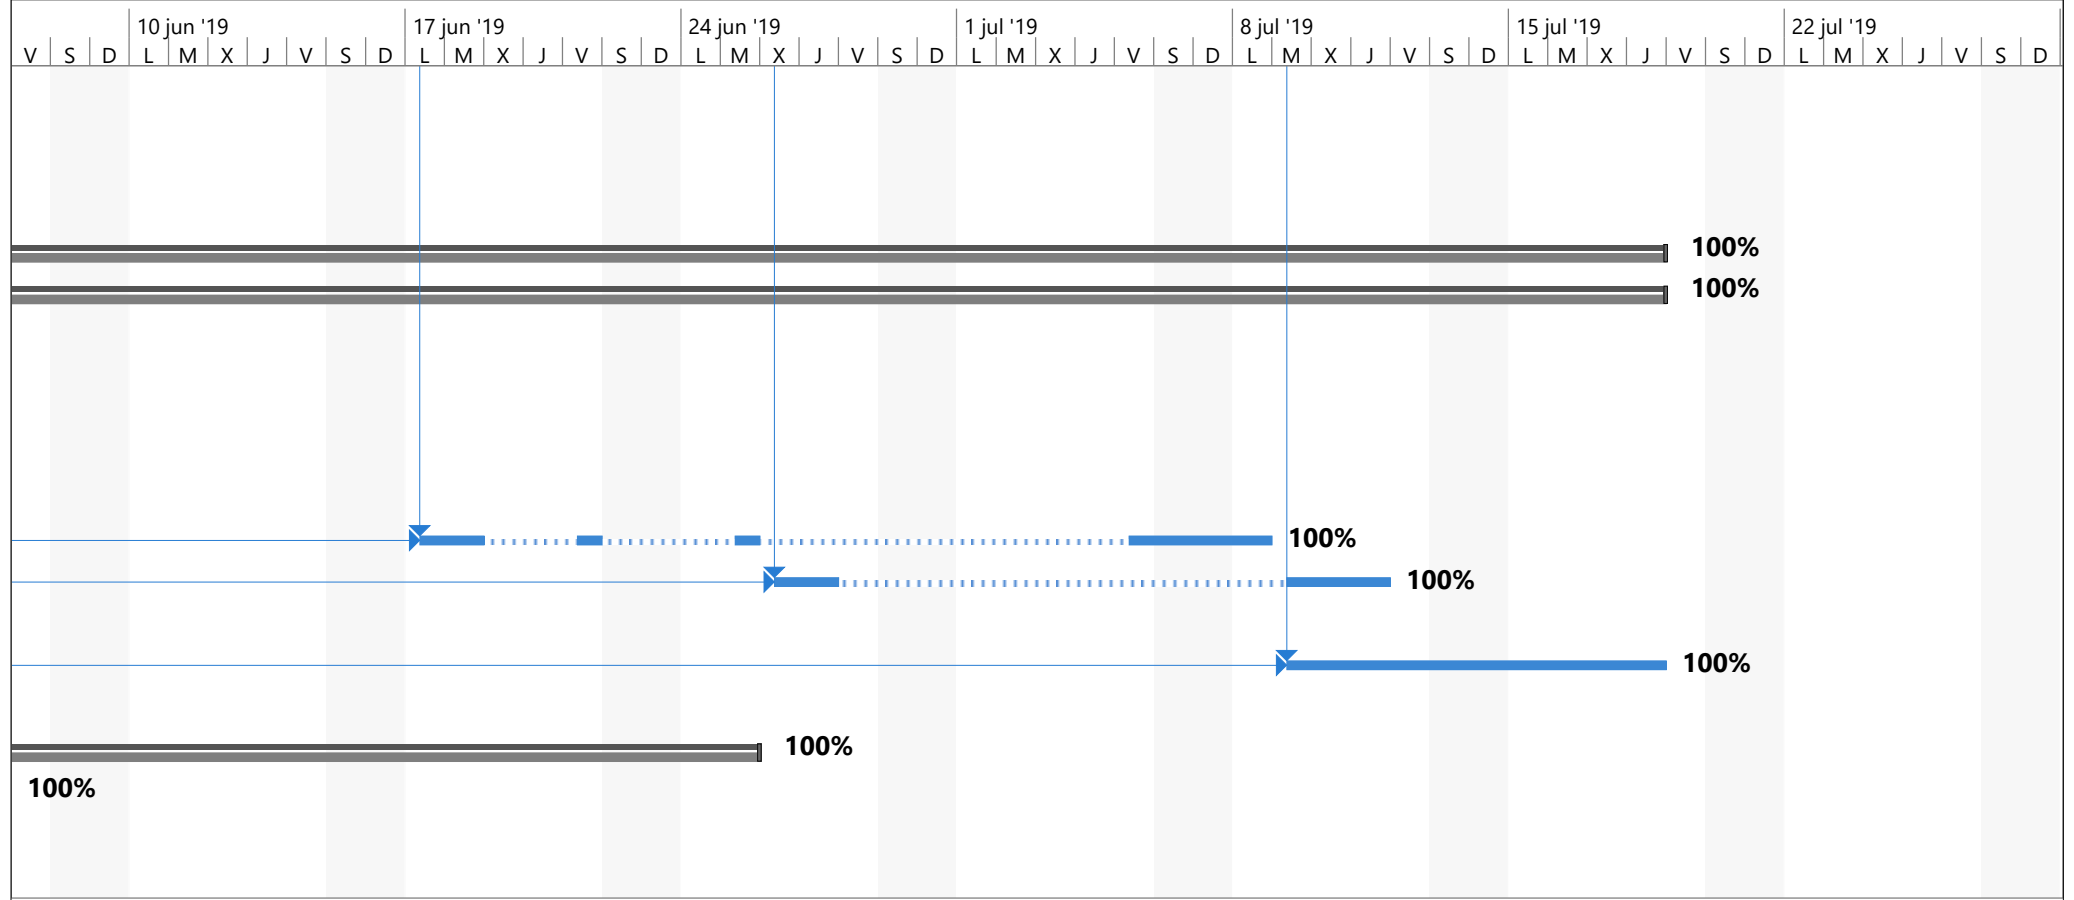


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

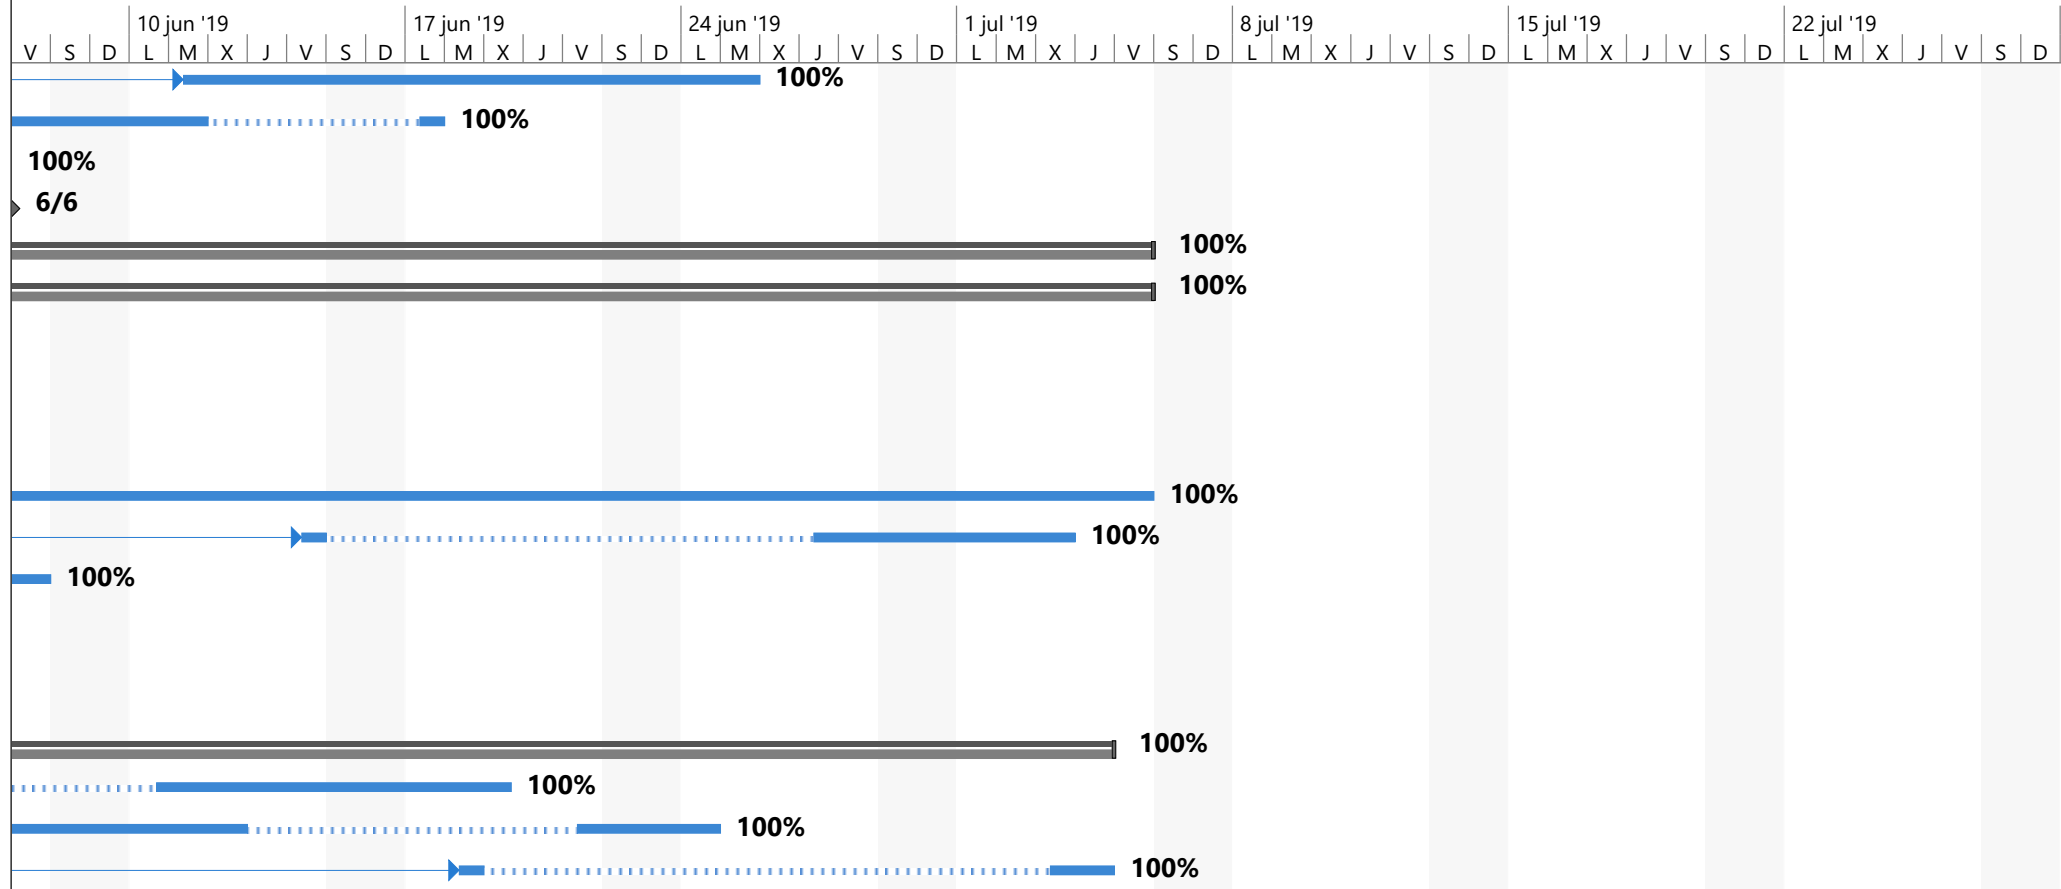

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

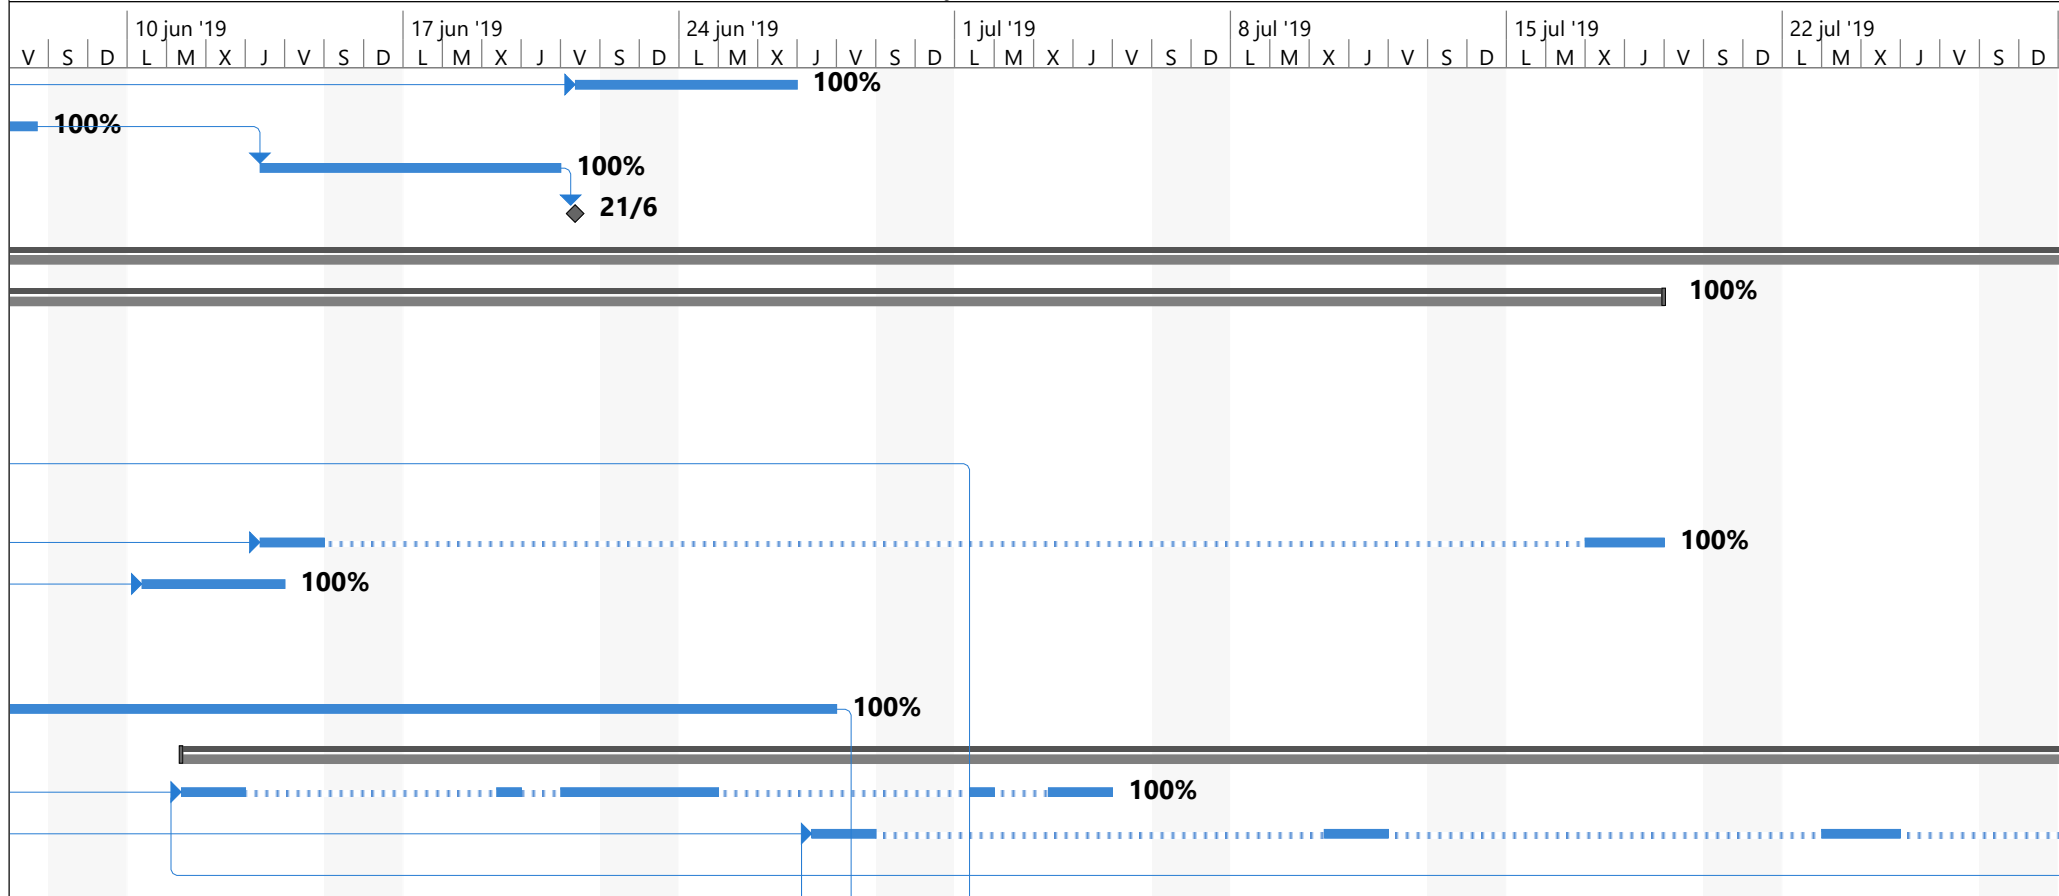

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

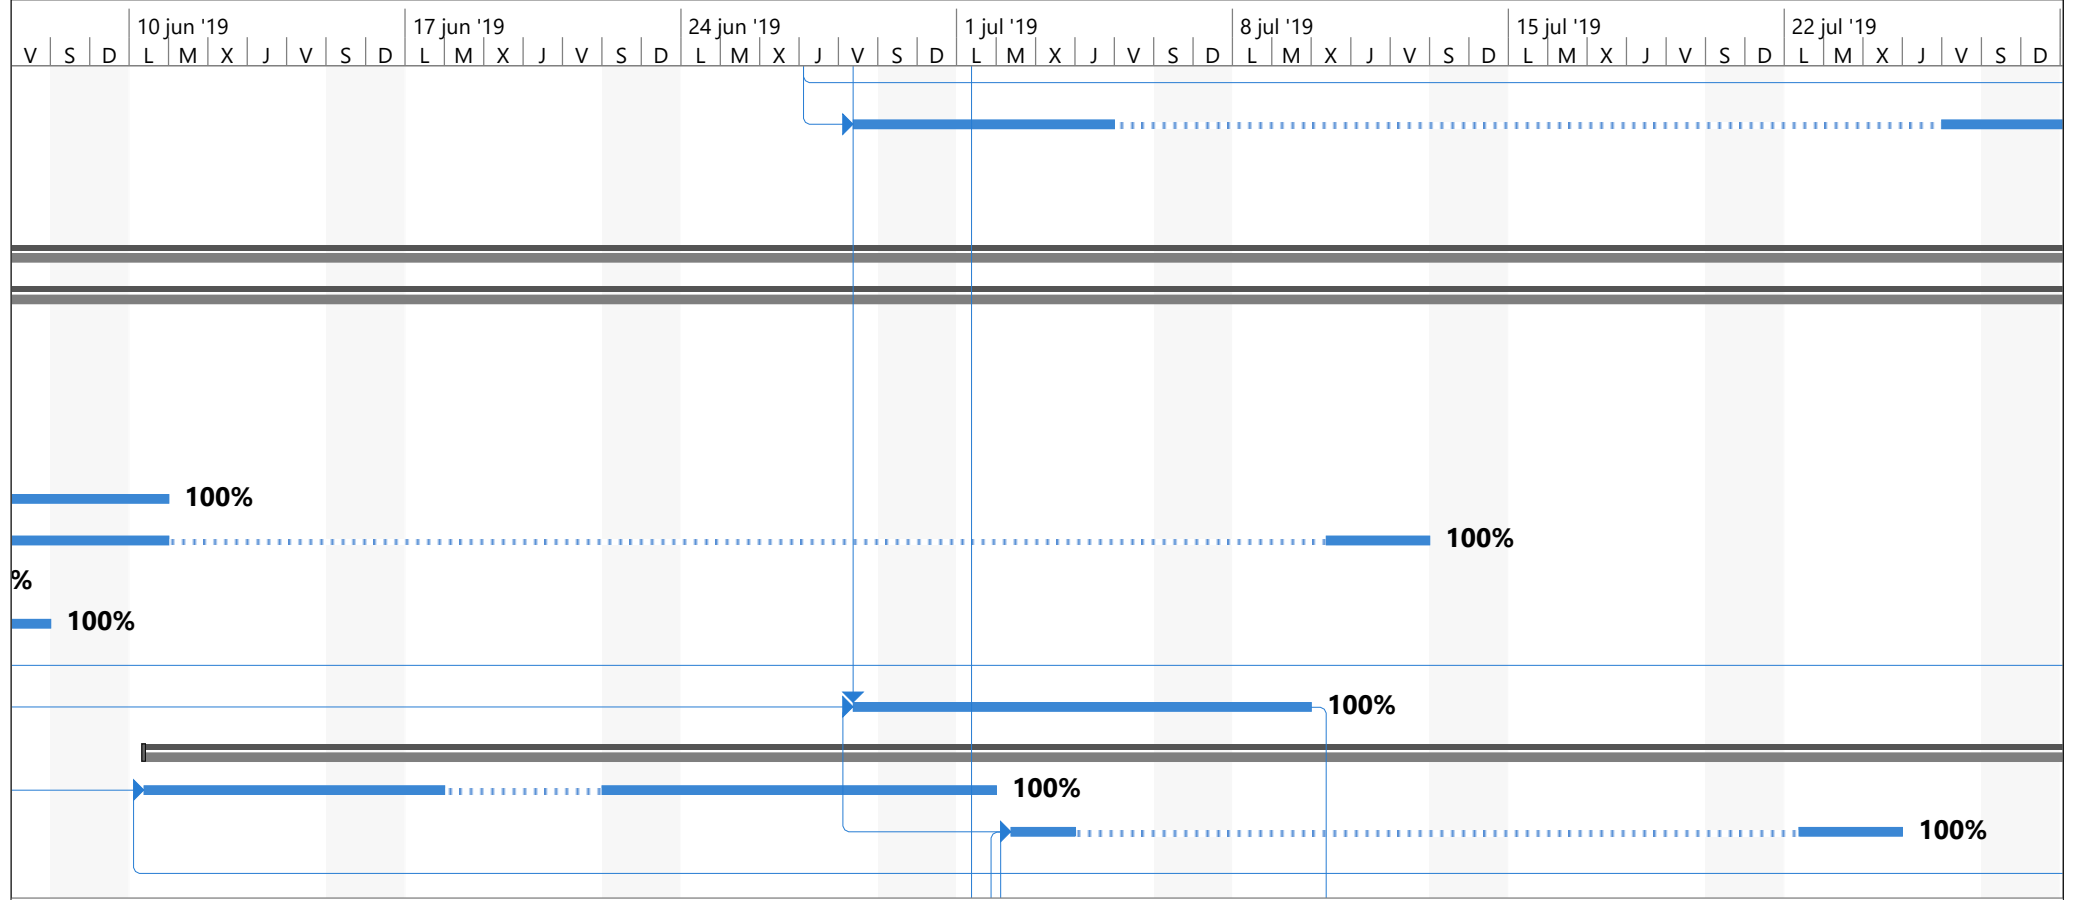


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

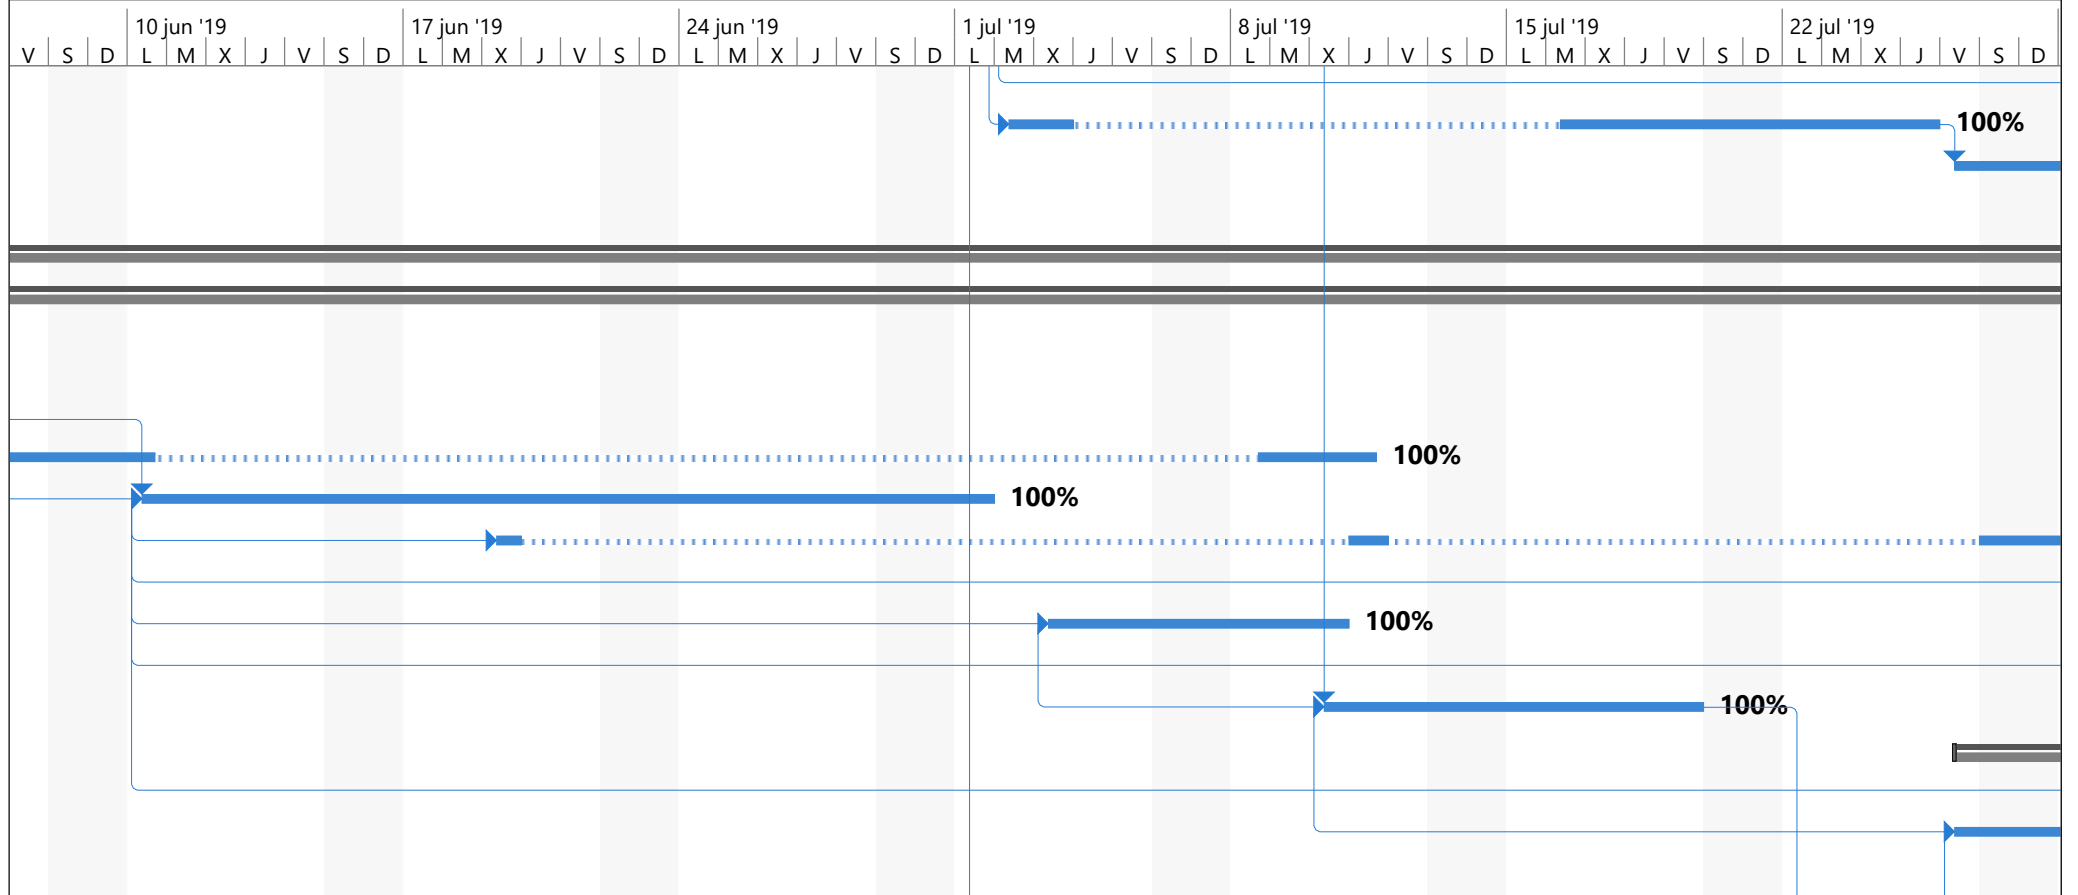


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

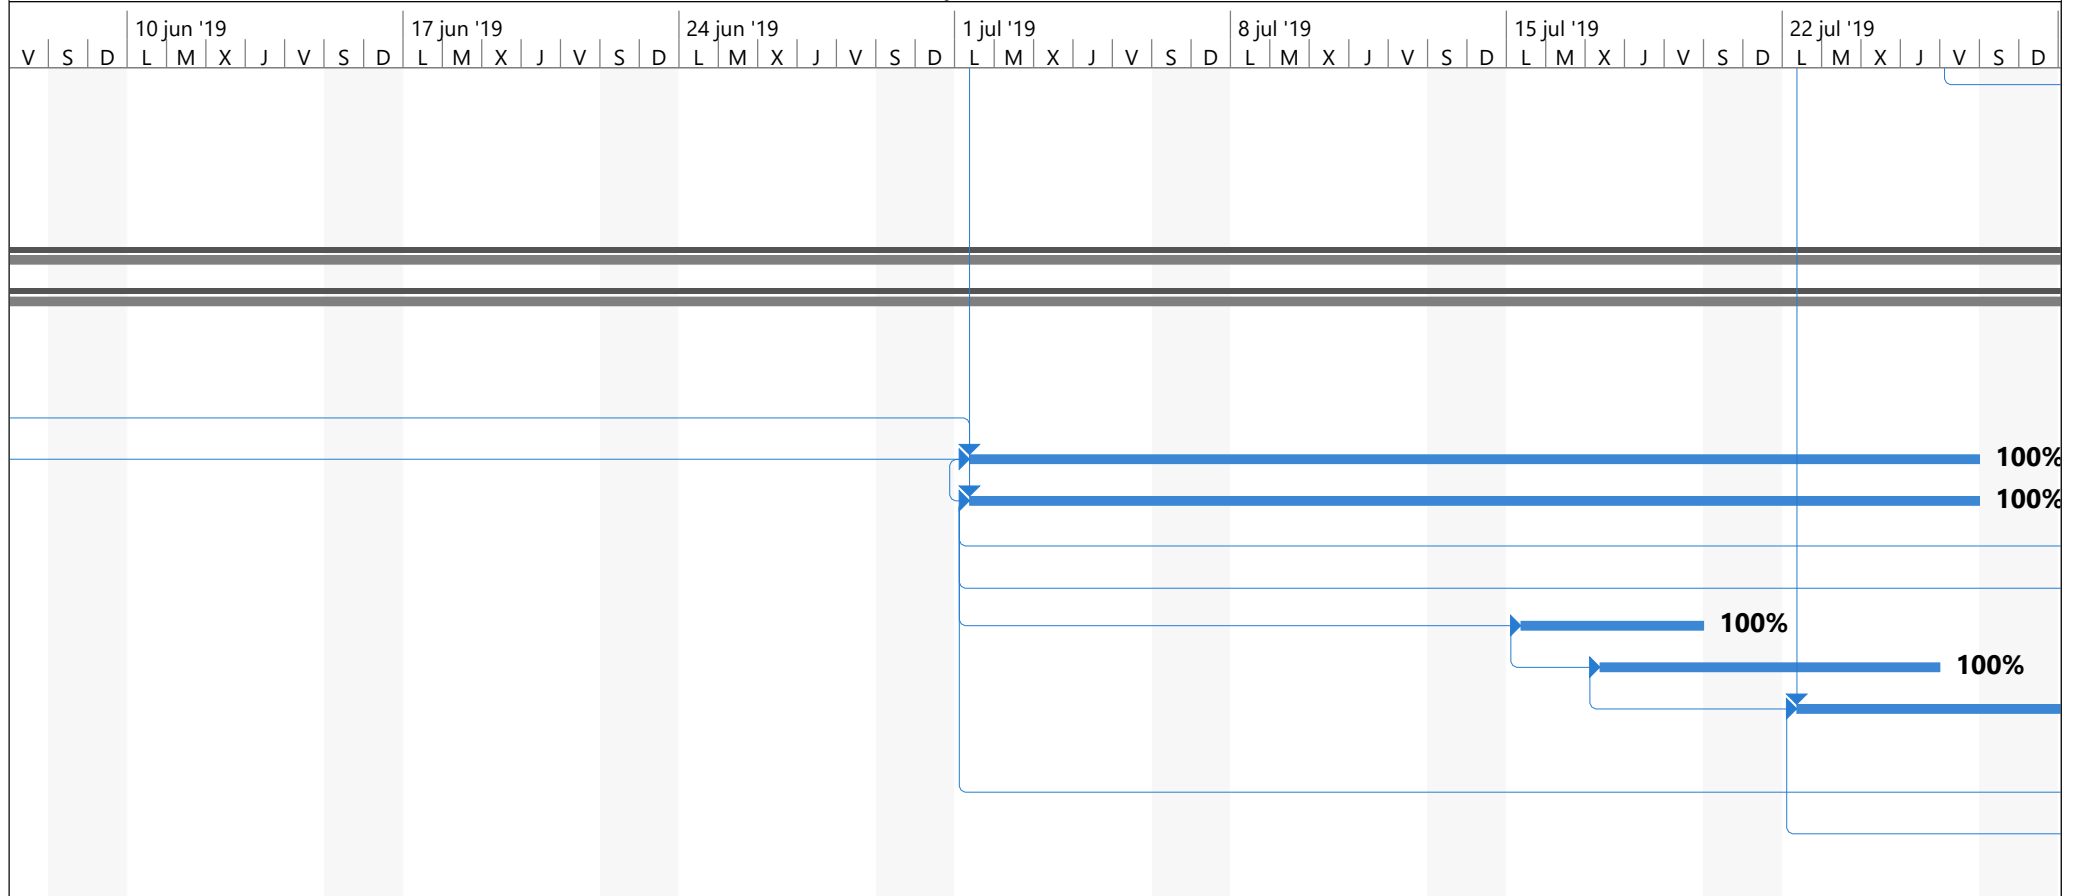


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

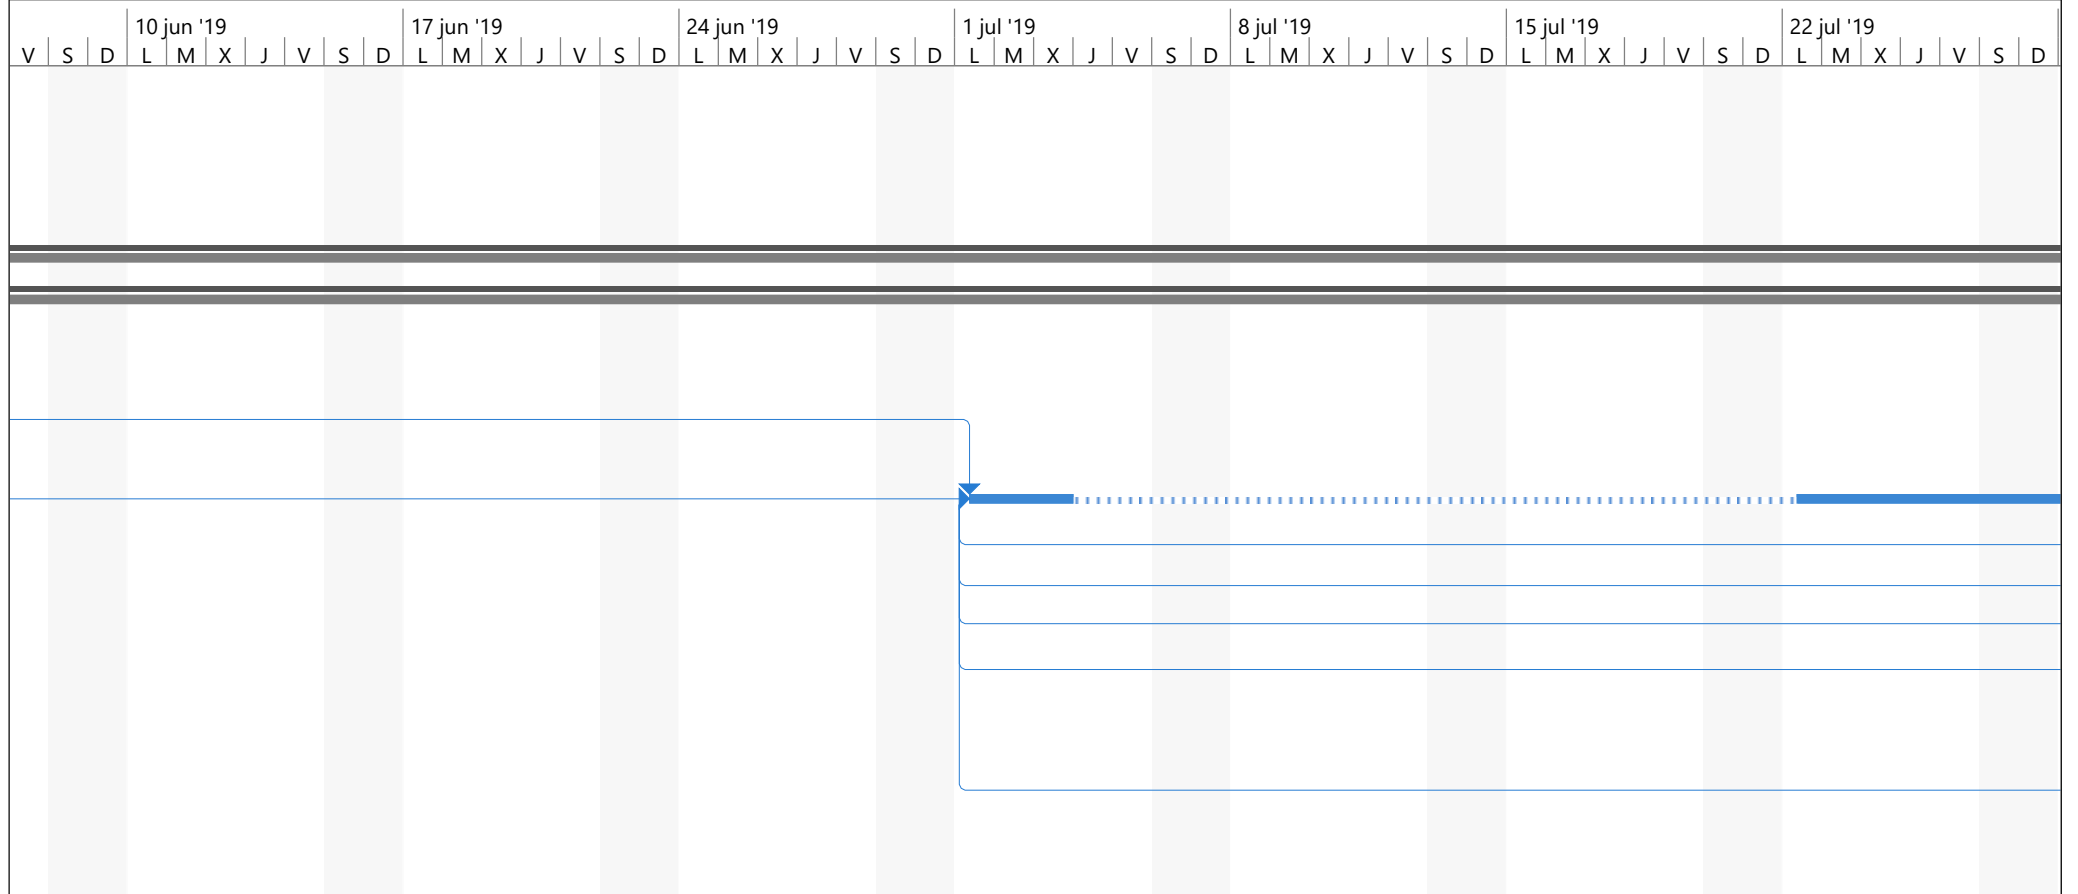

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

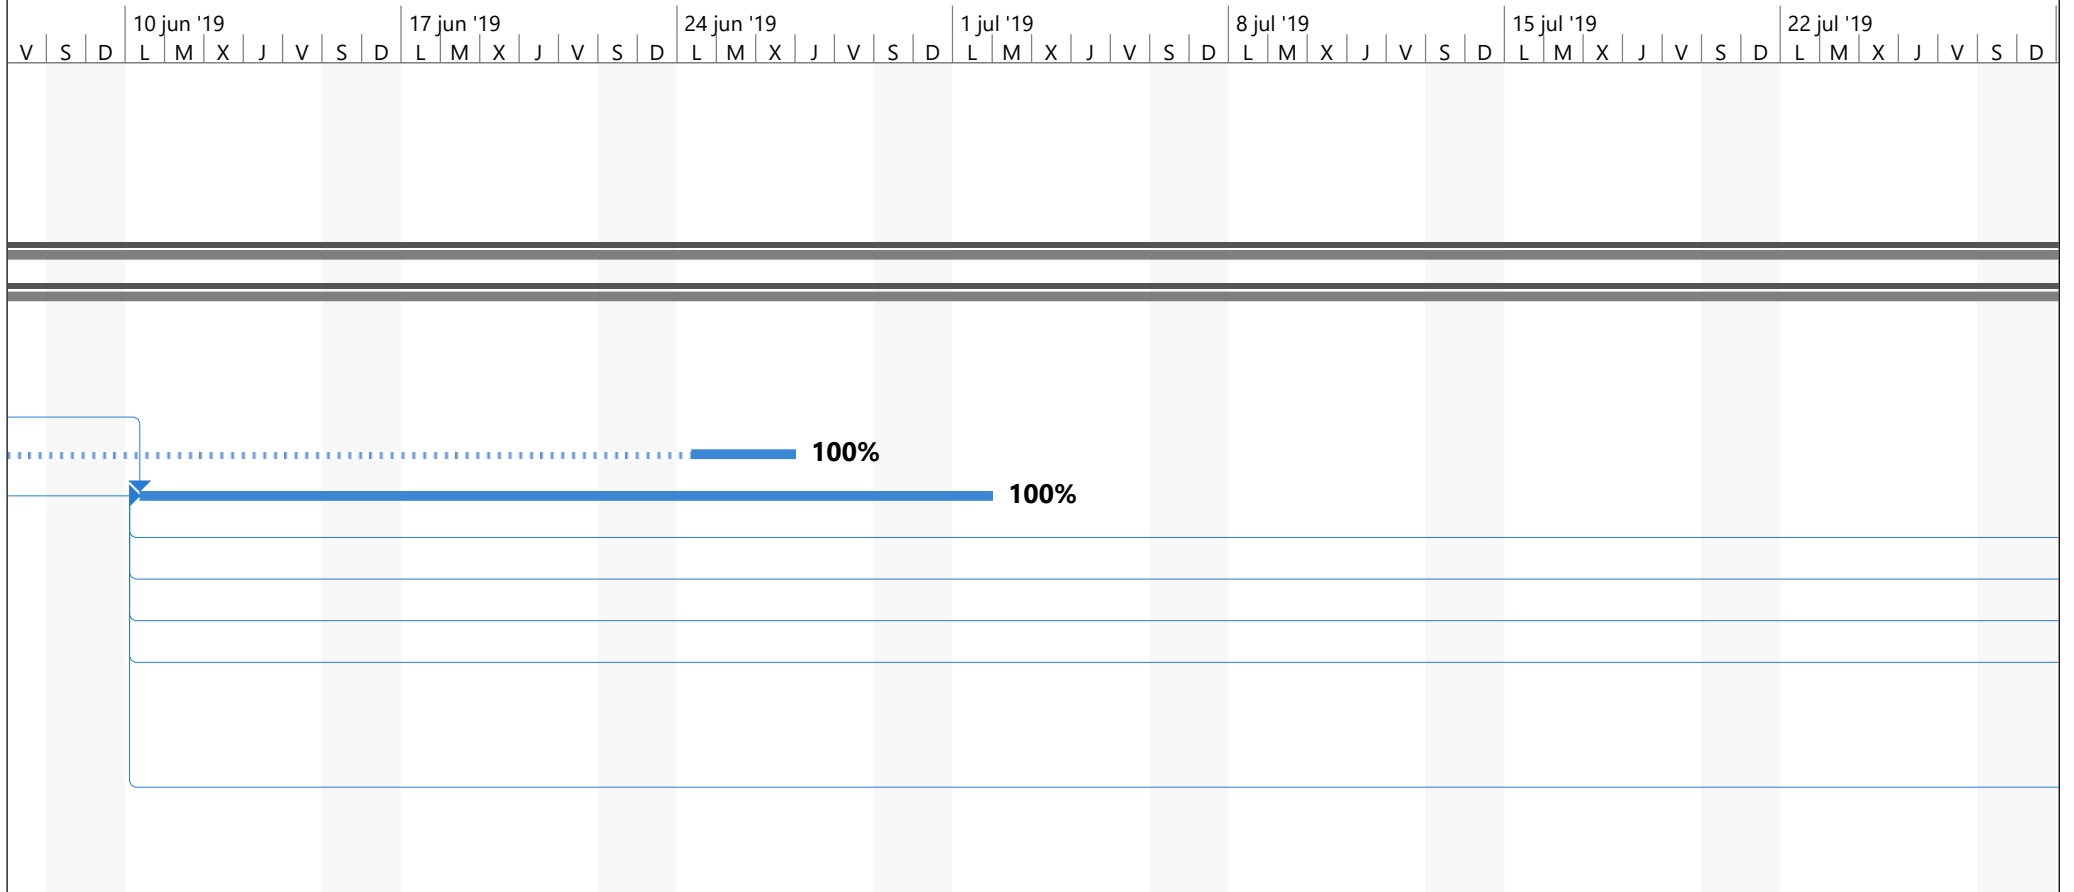


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

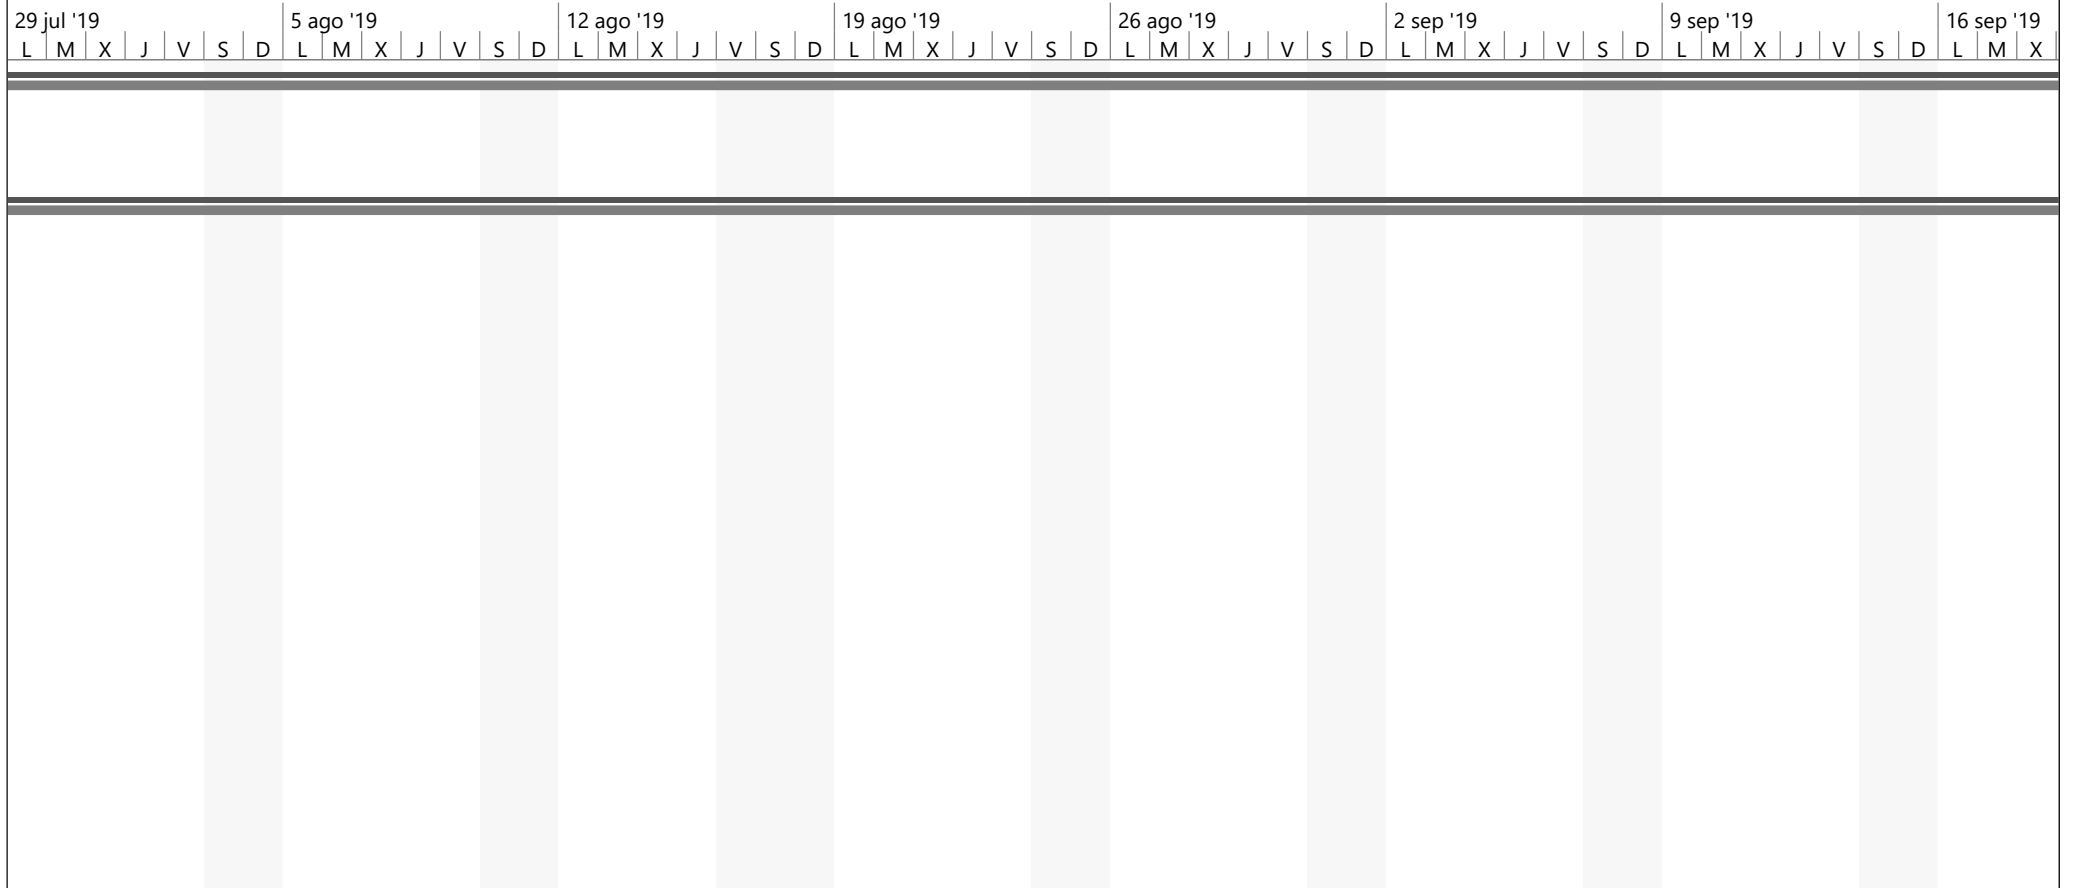

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



























[illegible]


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

[illegible]


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

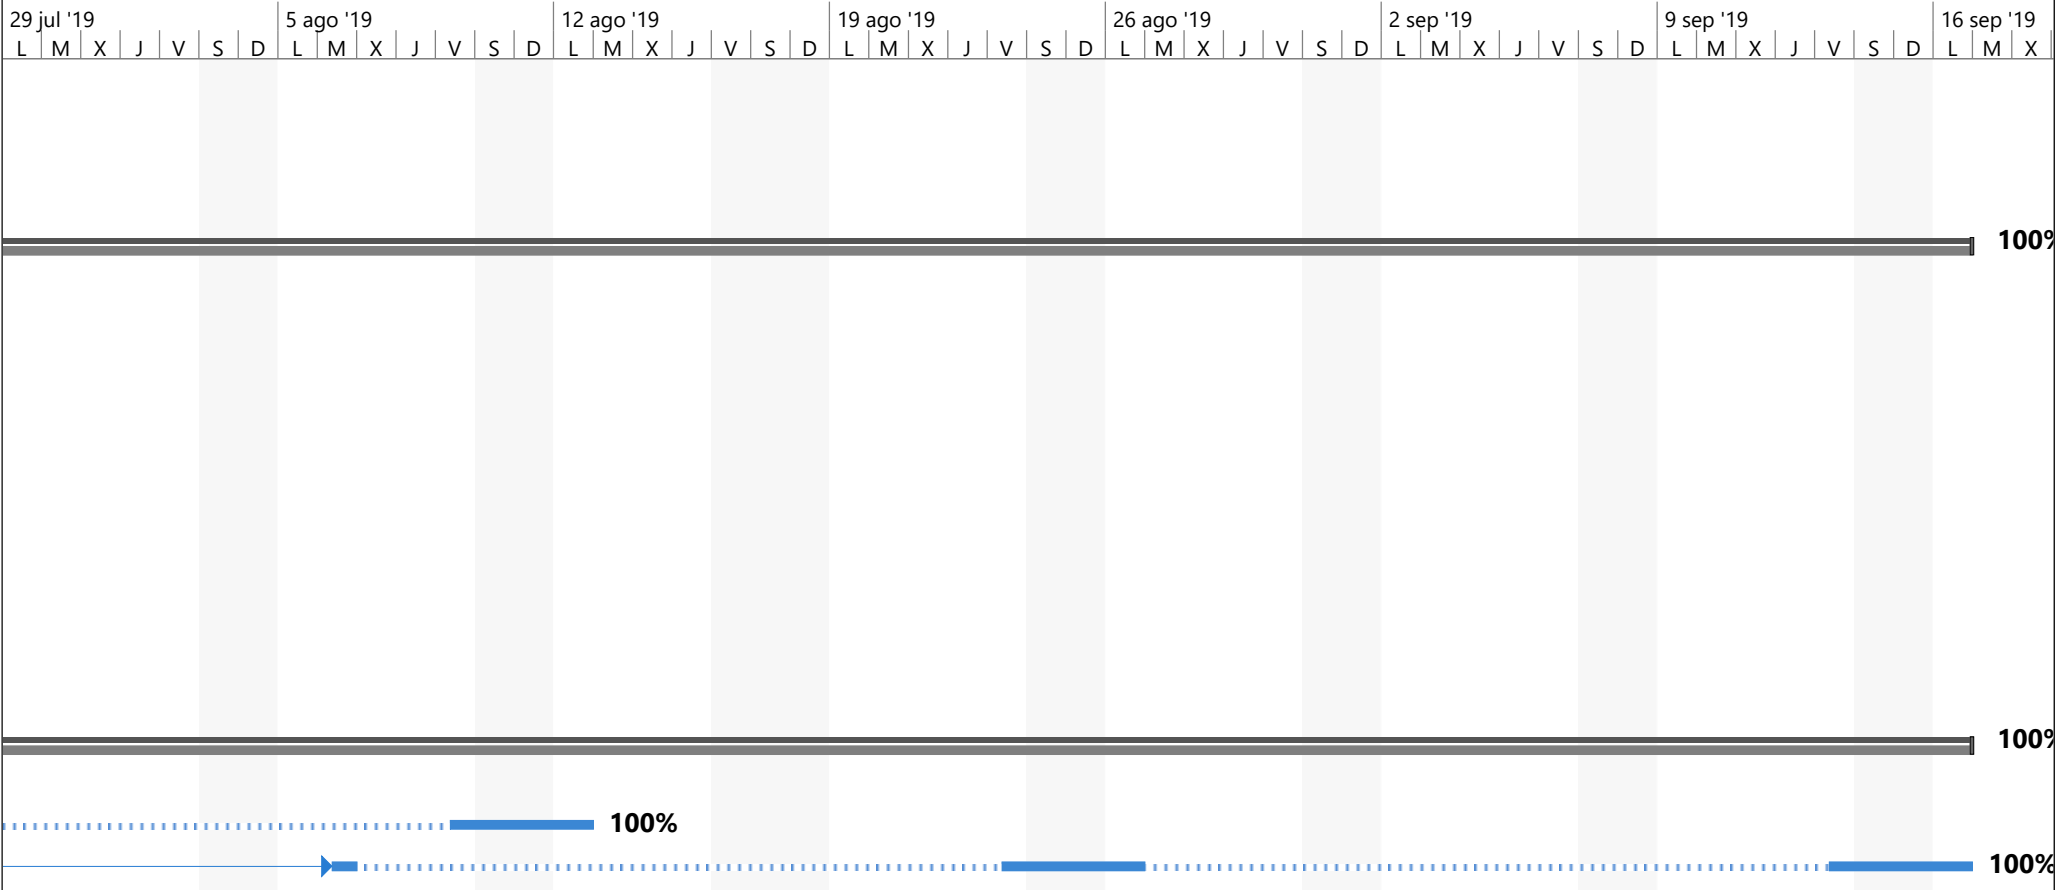


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

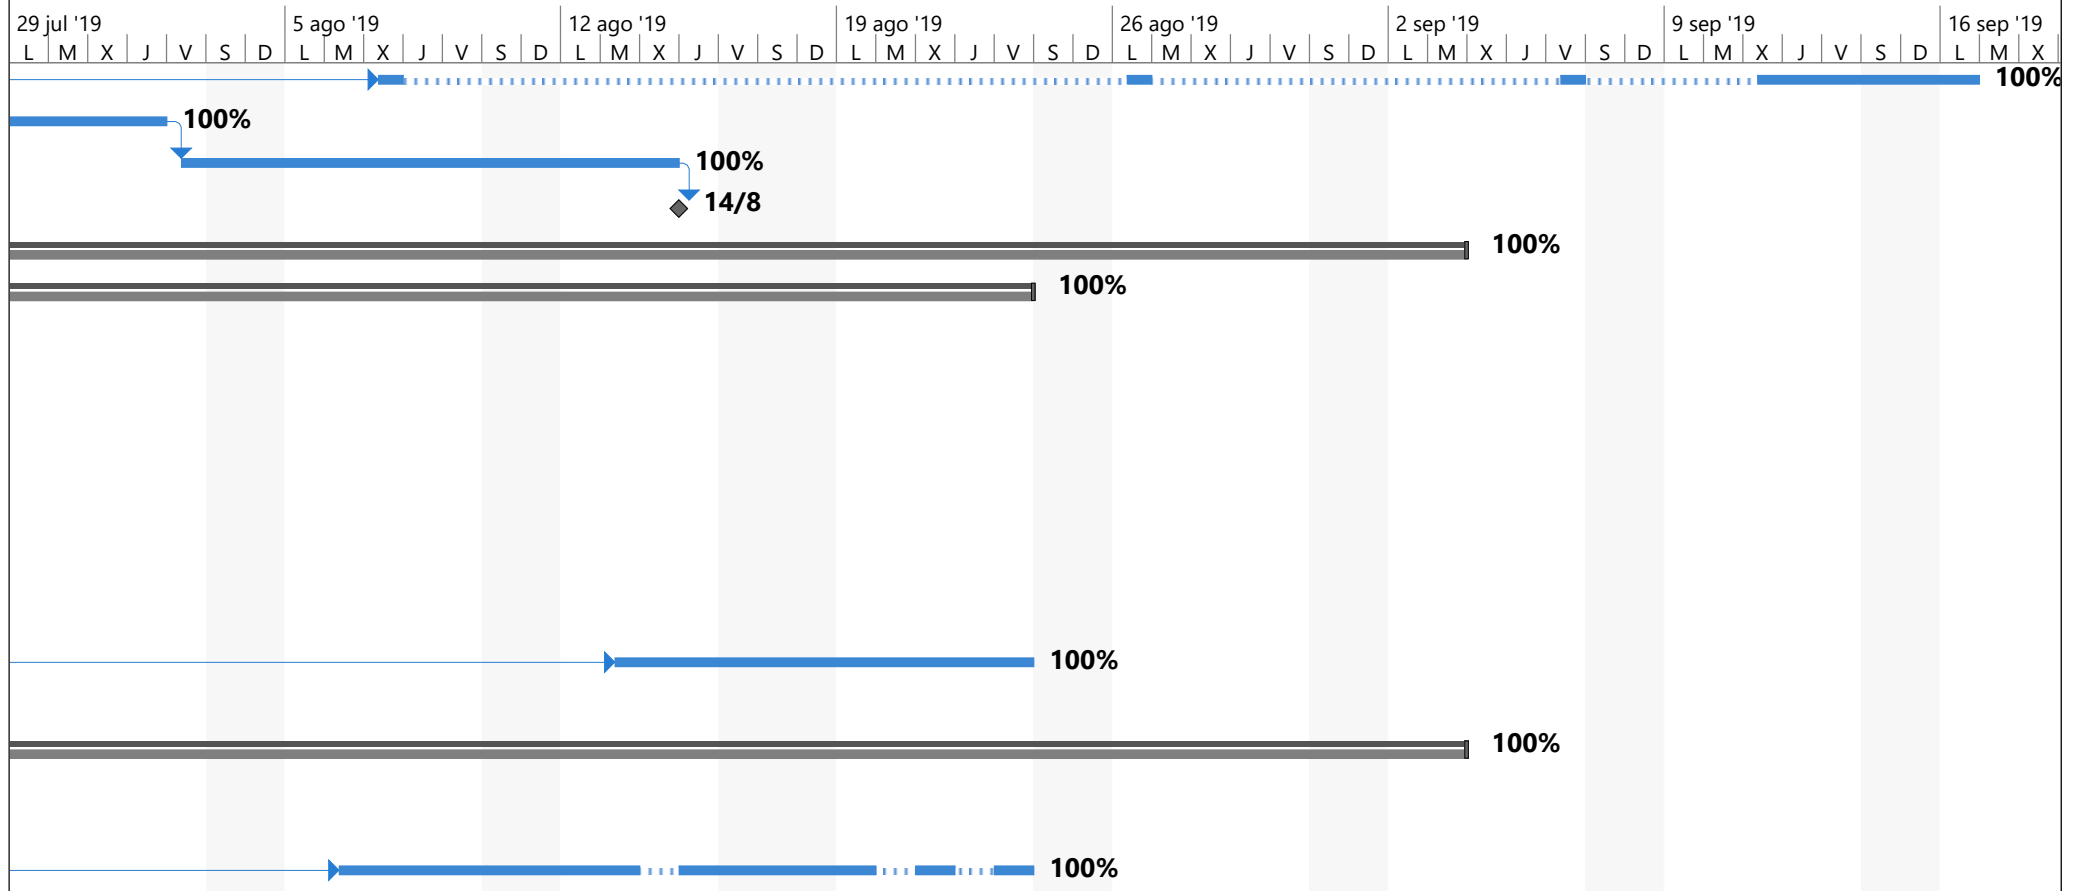

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |



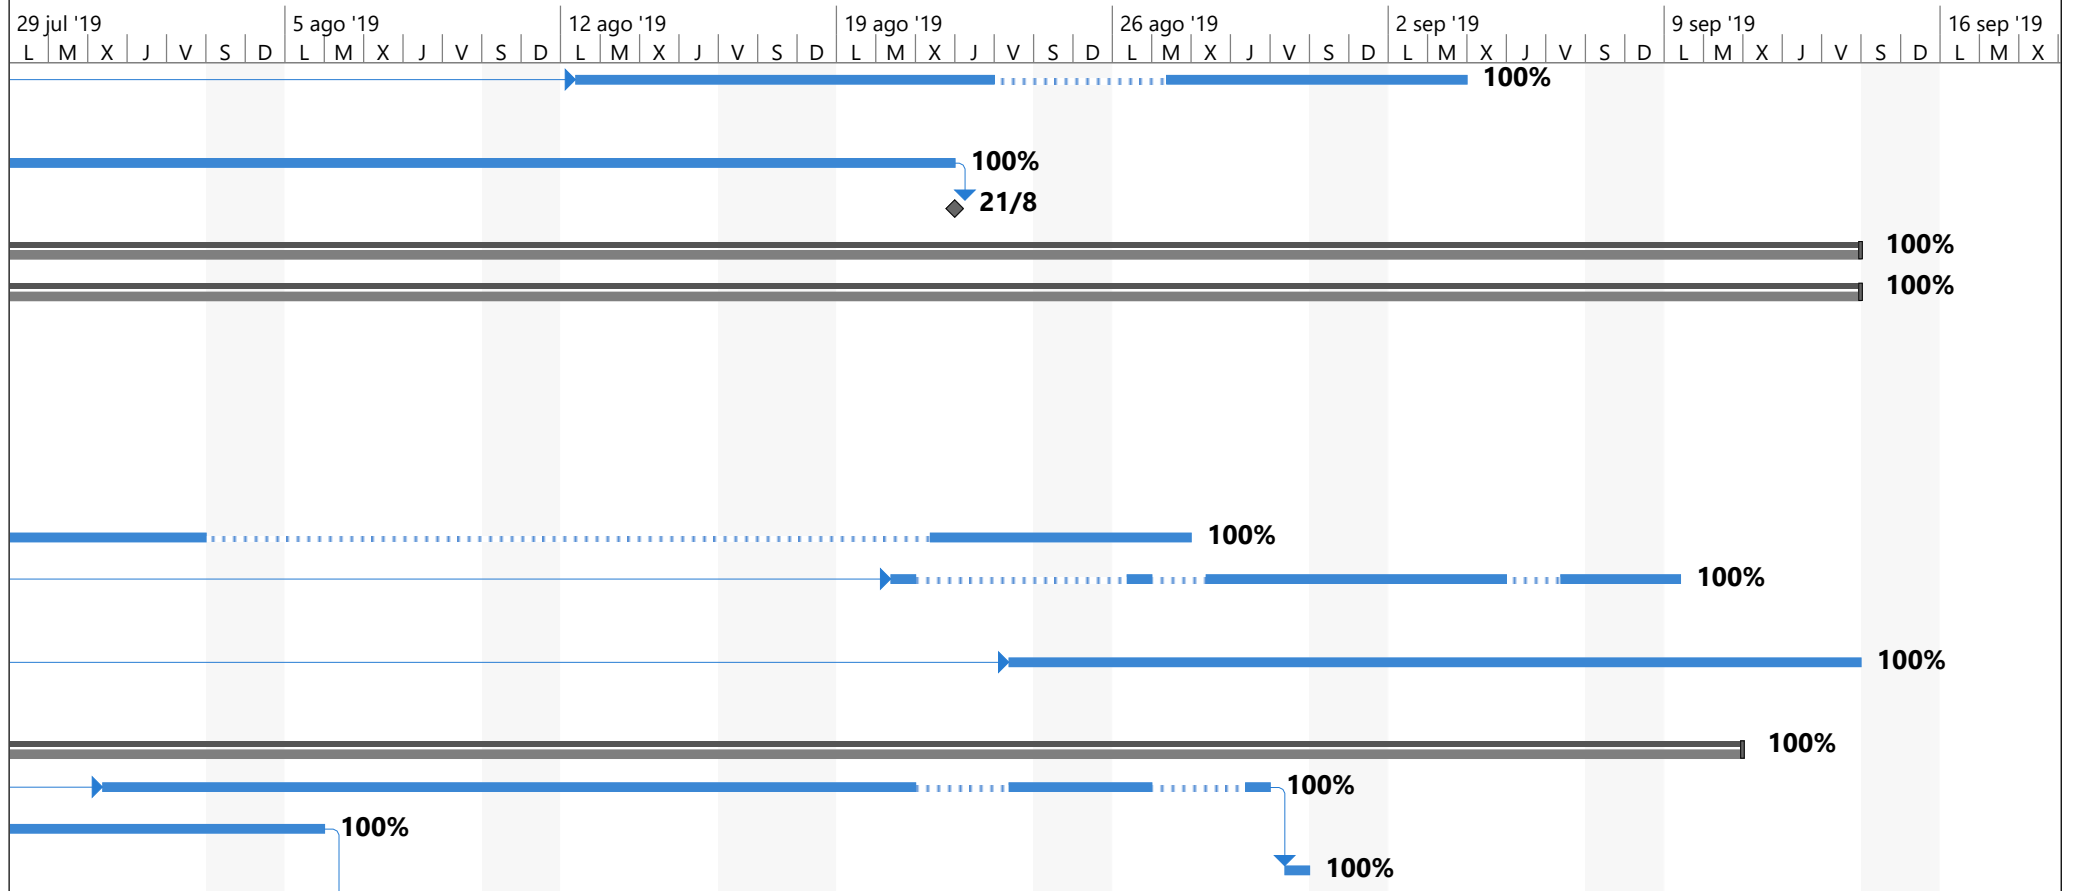





















# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021




|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

### Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

| 29 jul '19 |   |   |   |   |   |   | 5 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 12 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 19 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 26 ago '19 |   |   |   |   |   |   | 2 sep '19 |   |   |   |   |   |   | 9 sep '19 |   |   |  |  |  |  | 16 sep '19 |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|
| L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D | L         | M | X |  |  |  |  |            |  |  |
|            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |  |  |  |  |            |  |  |


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

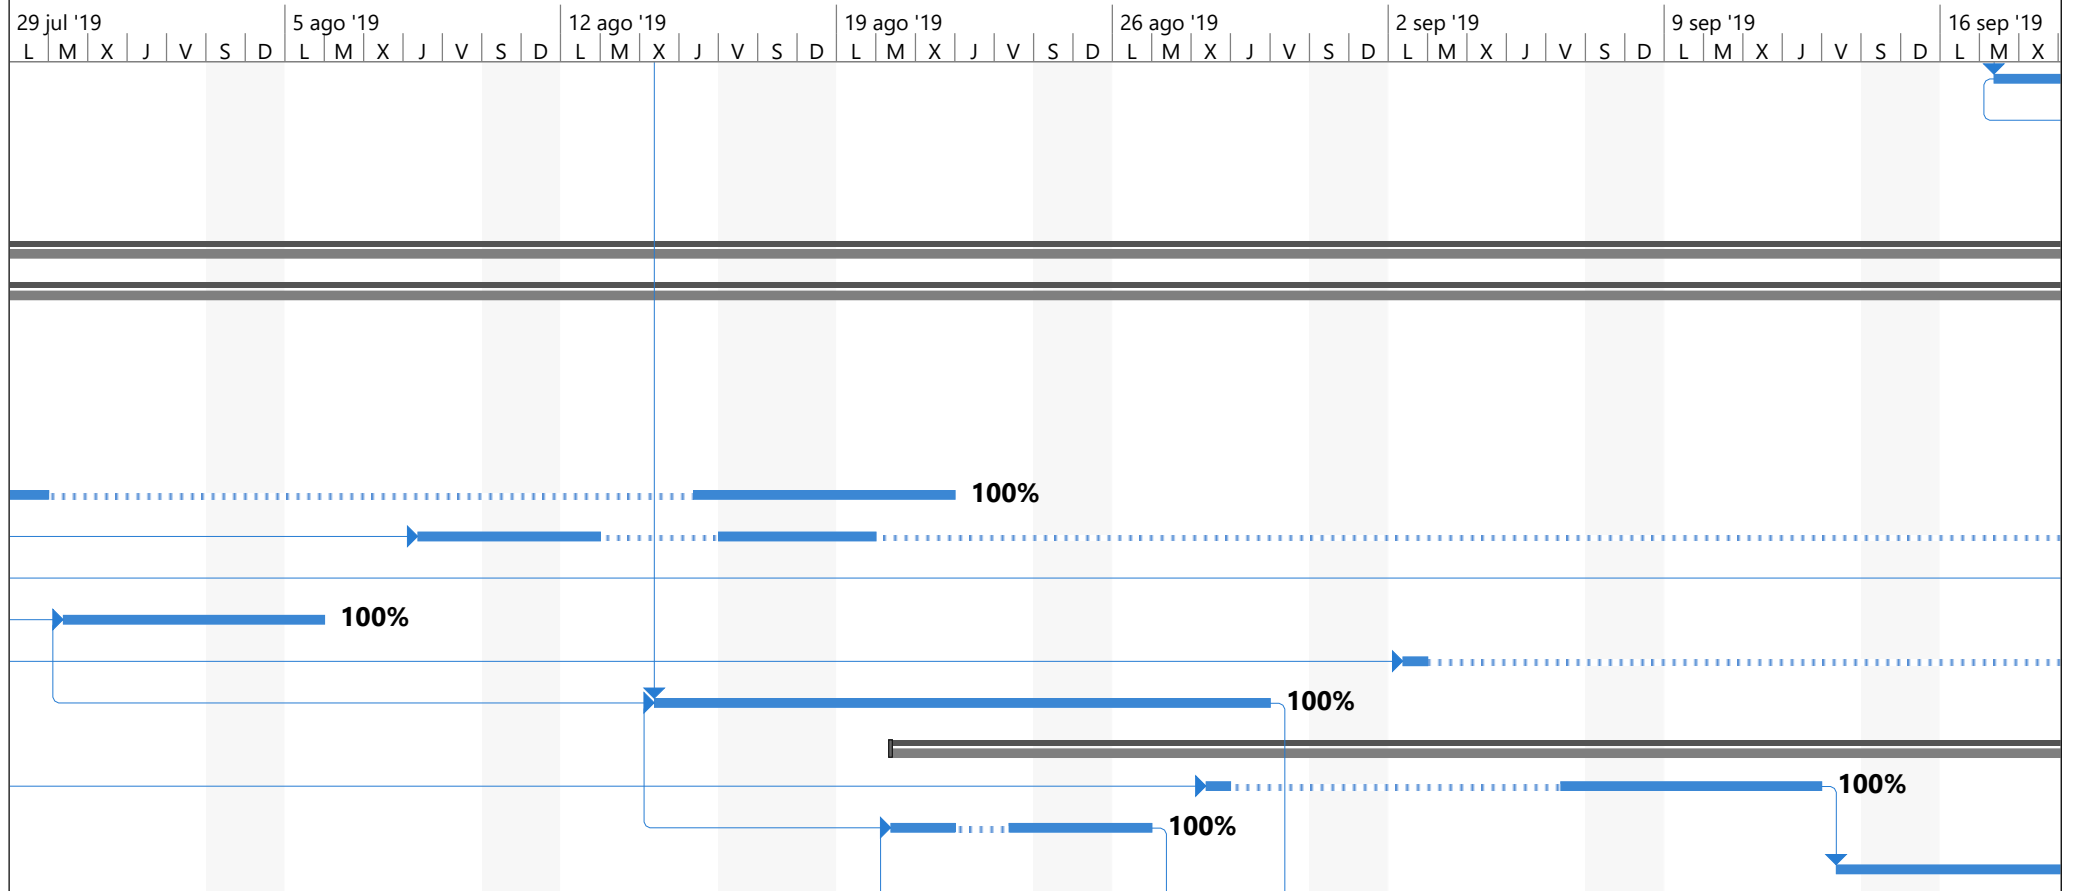

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

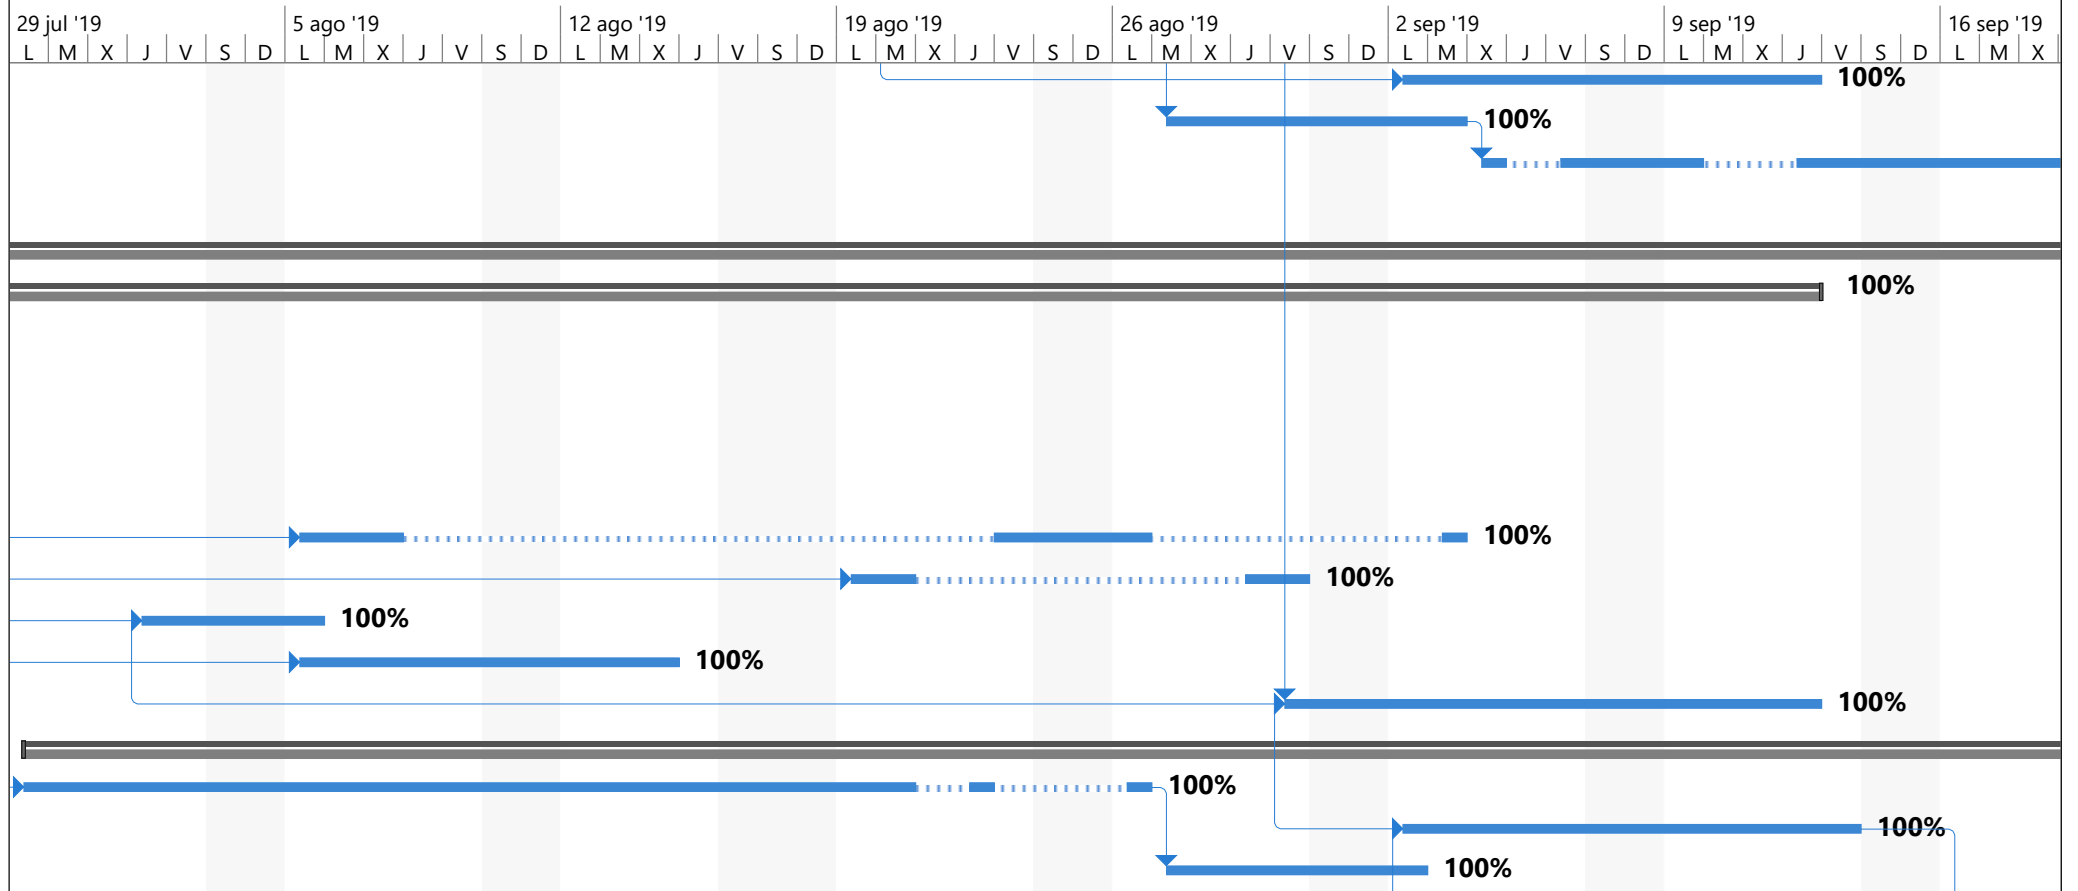

























|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




|  |
|--|
| <p>Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021</p> |
|--|

29 jul '19 5 ago '19 12 ago '19 19 ago '19 26 ago '19 2 sep '19 9 sep '19 16 sep '19  
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




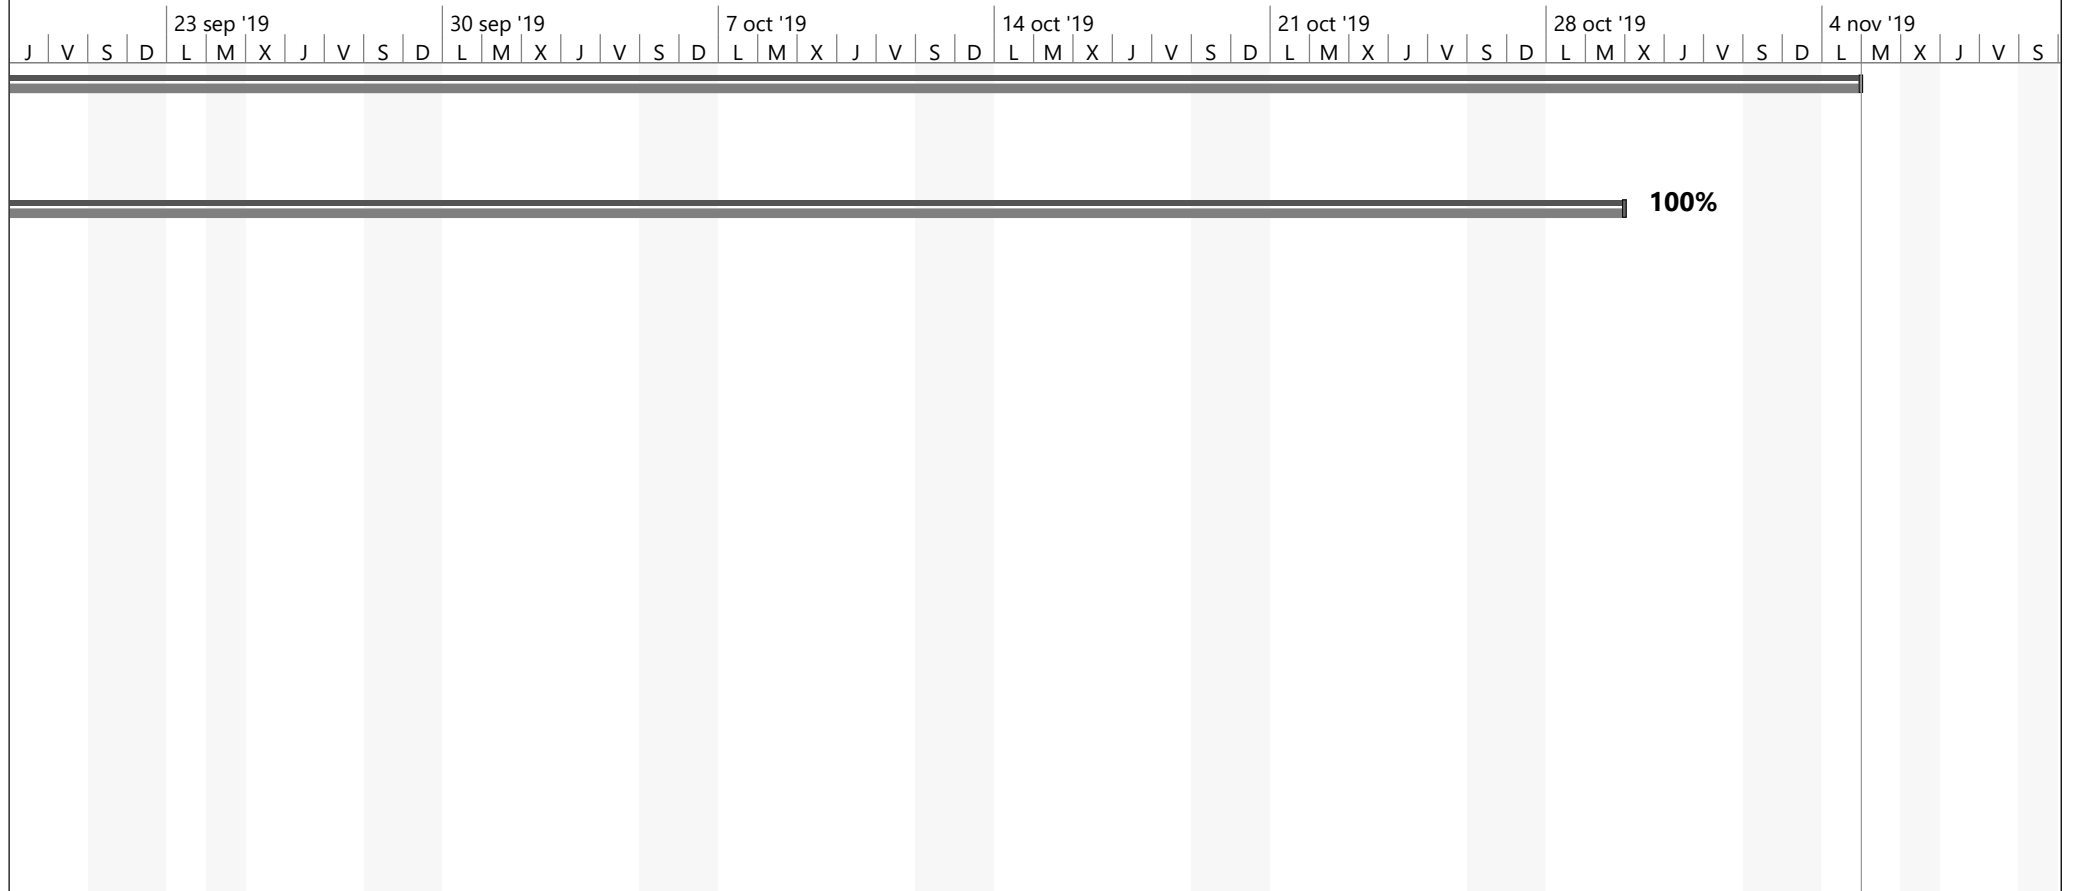




















# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

























# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |


|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

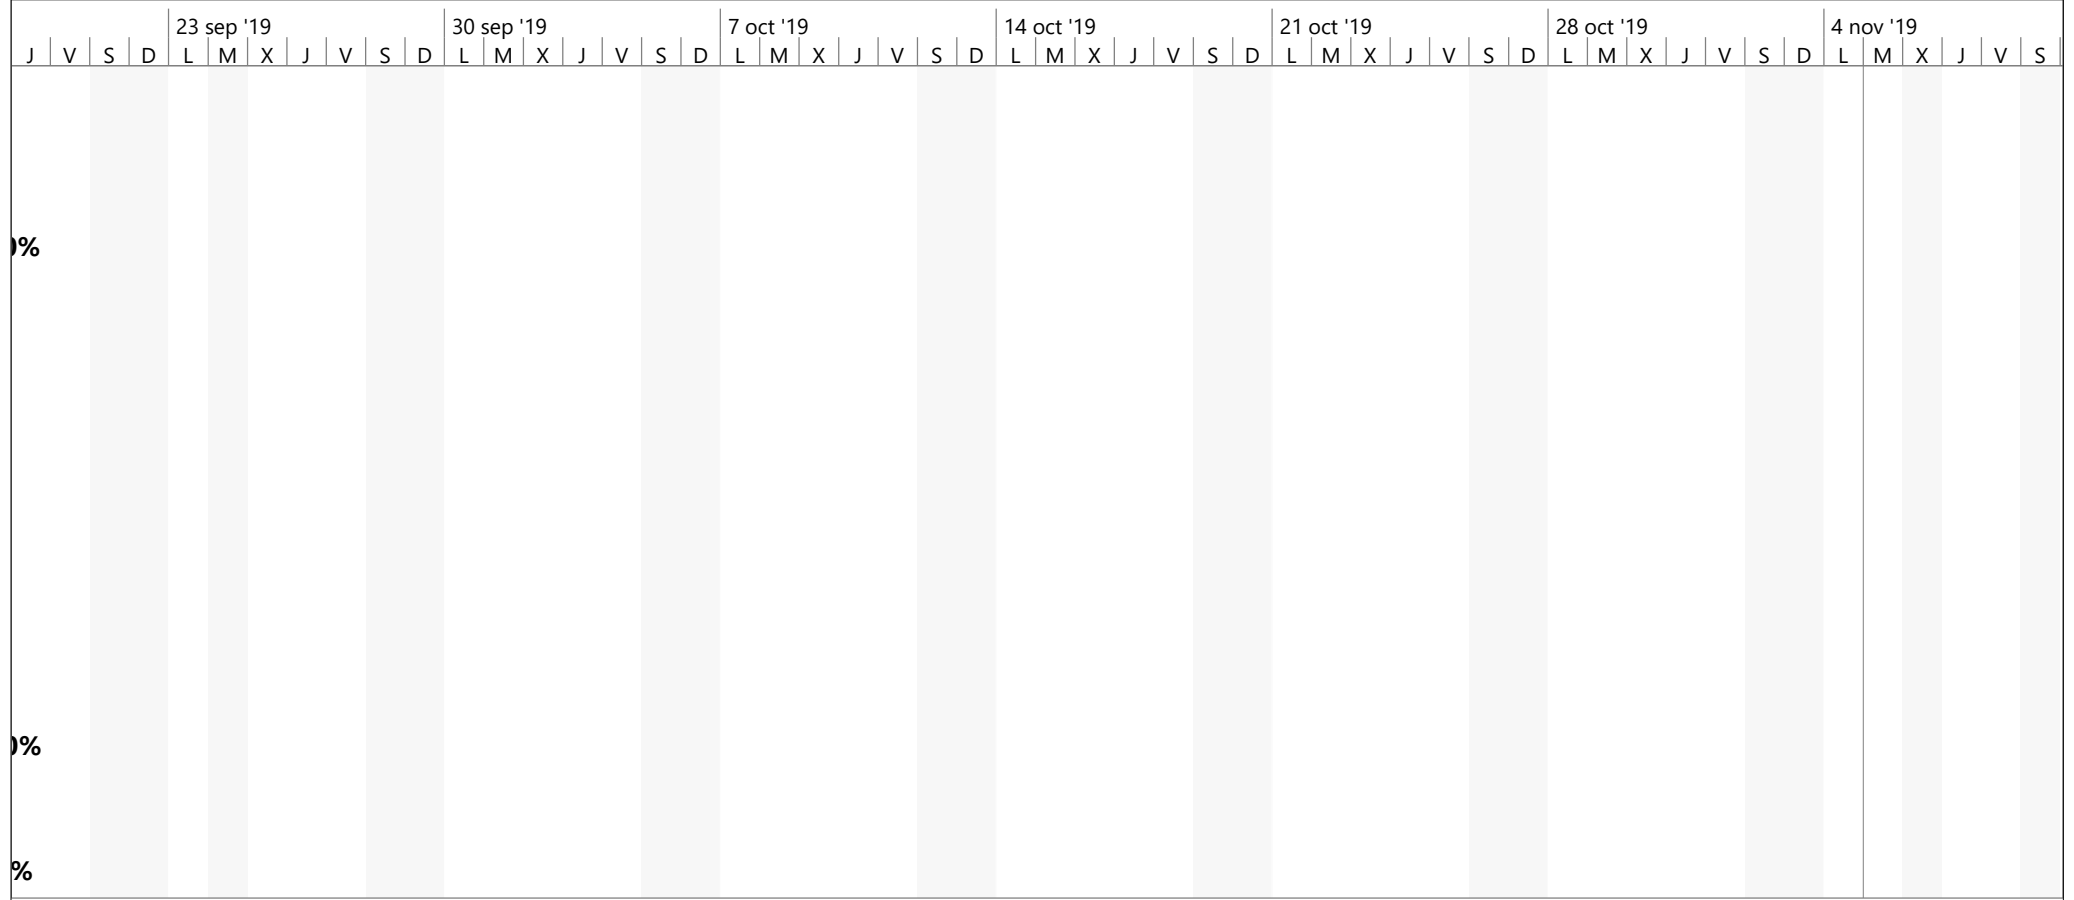

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

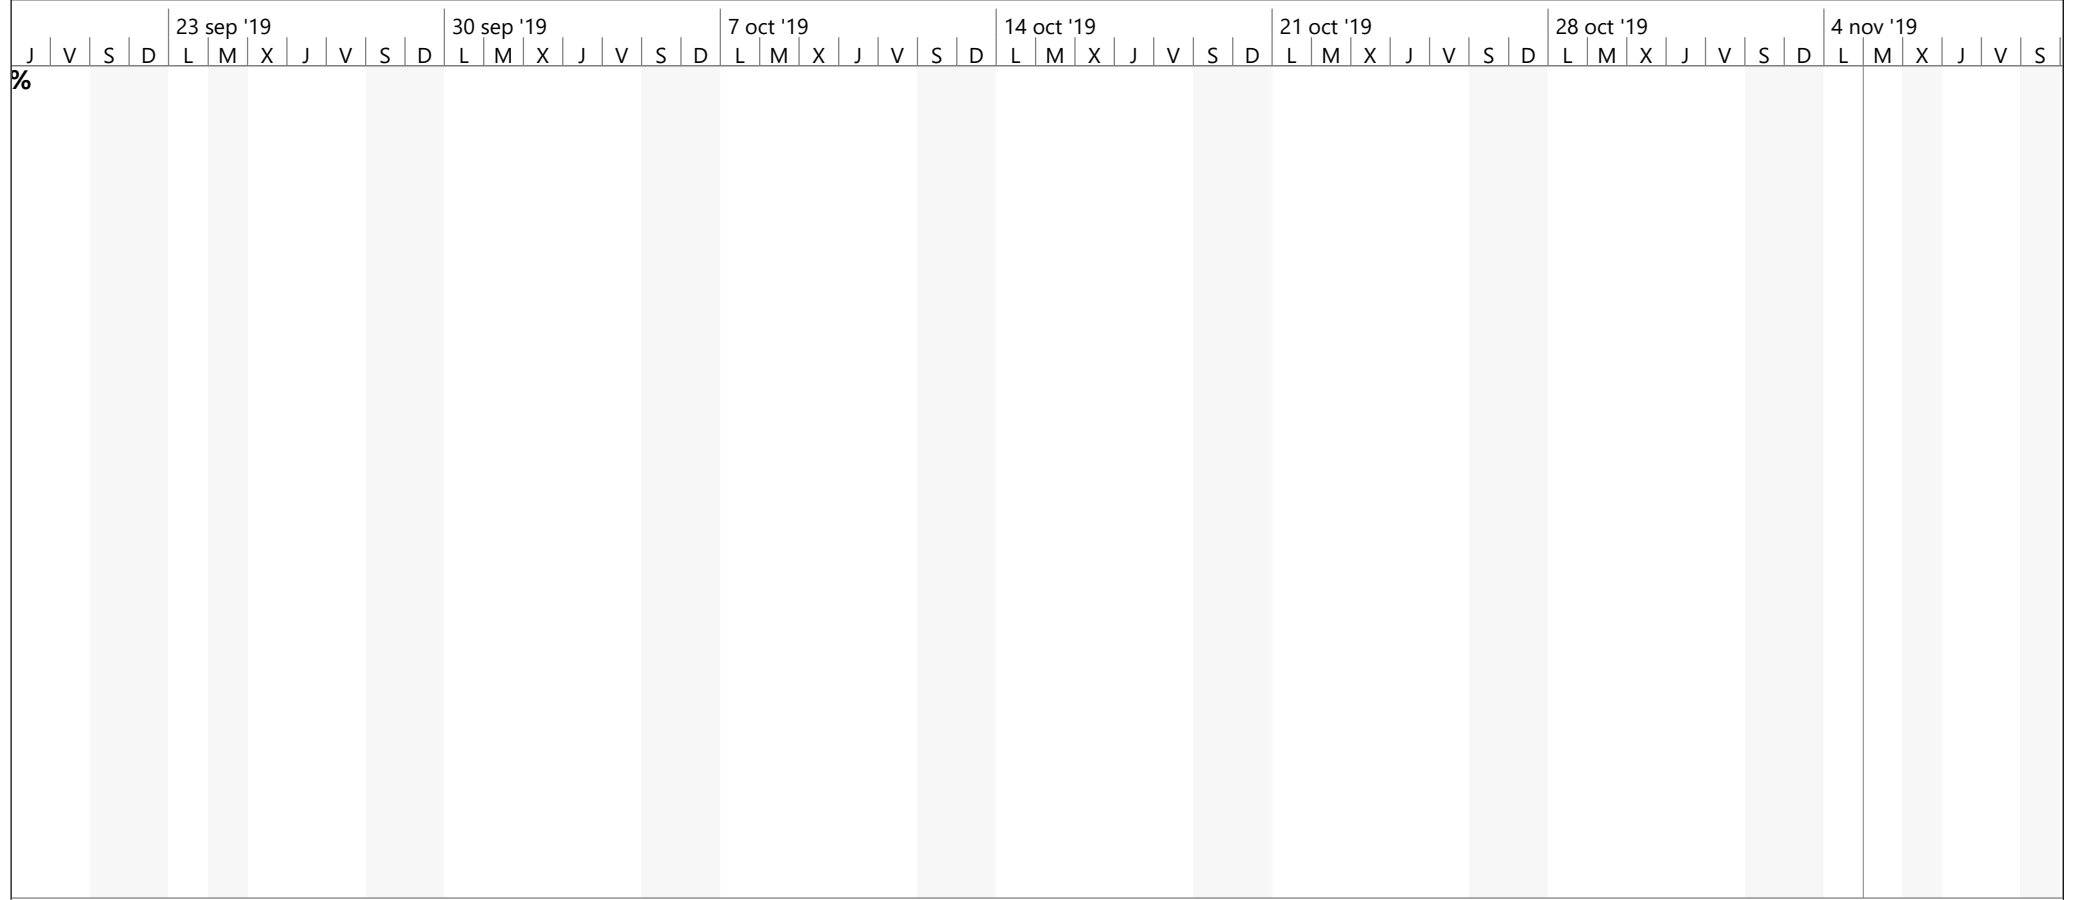

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

|   |   |   |   | 23 sep '19 |   |   |   | 30 sep '19 |   |   |   | 7 oct '19 |   |   |   | 14 oct '19 |   |   |   | 21 oct '19 |   |   |   | 28 oct '19 |   |   |   | 4 nov '19 |   |   |  |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|--|
| J | V | S | D | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M         | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D          | L | M | X | J         | V | S |  |
|   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |  |

|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

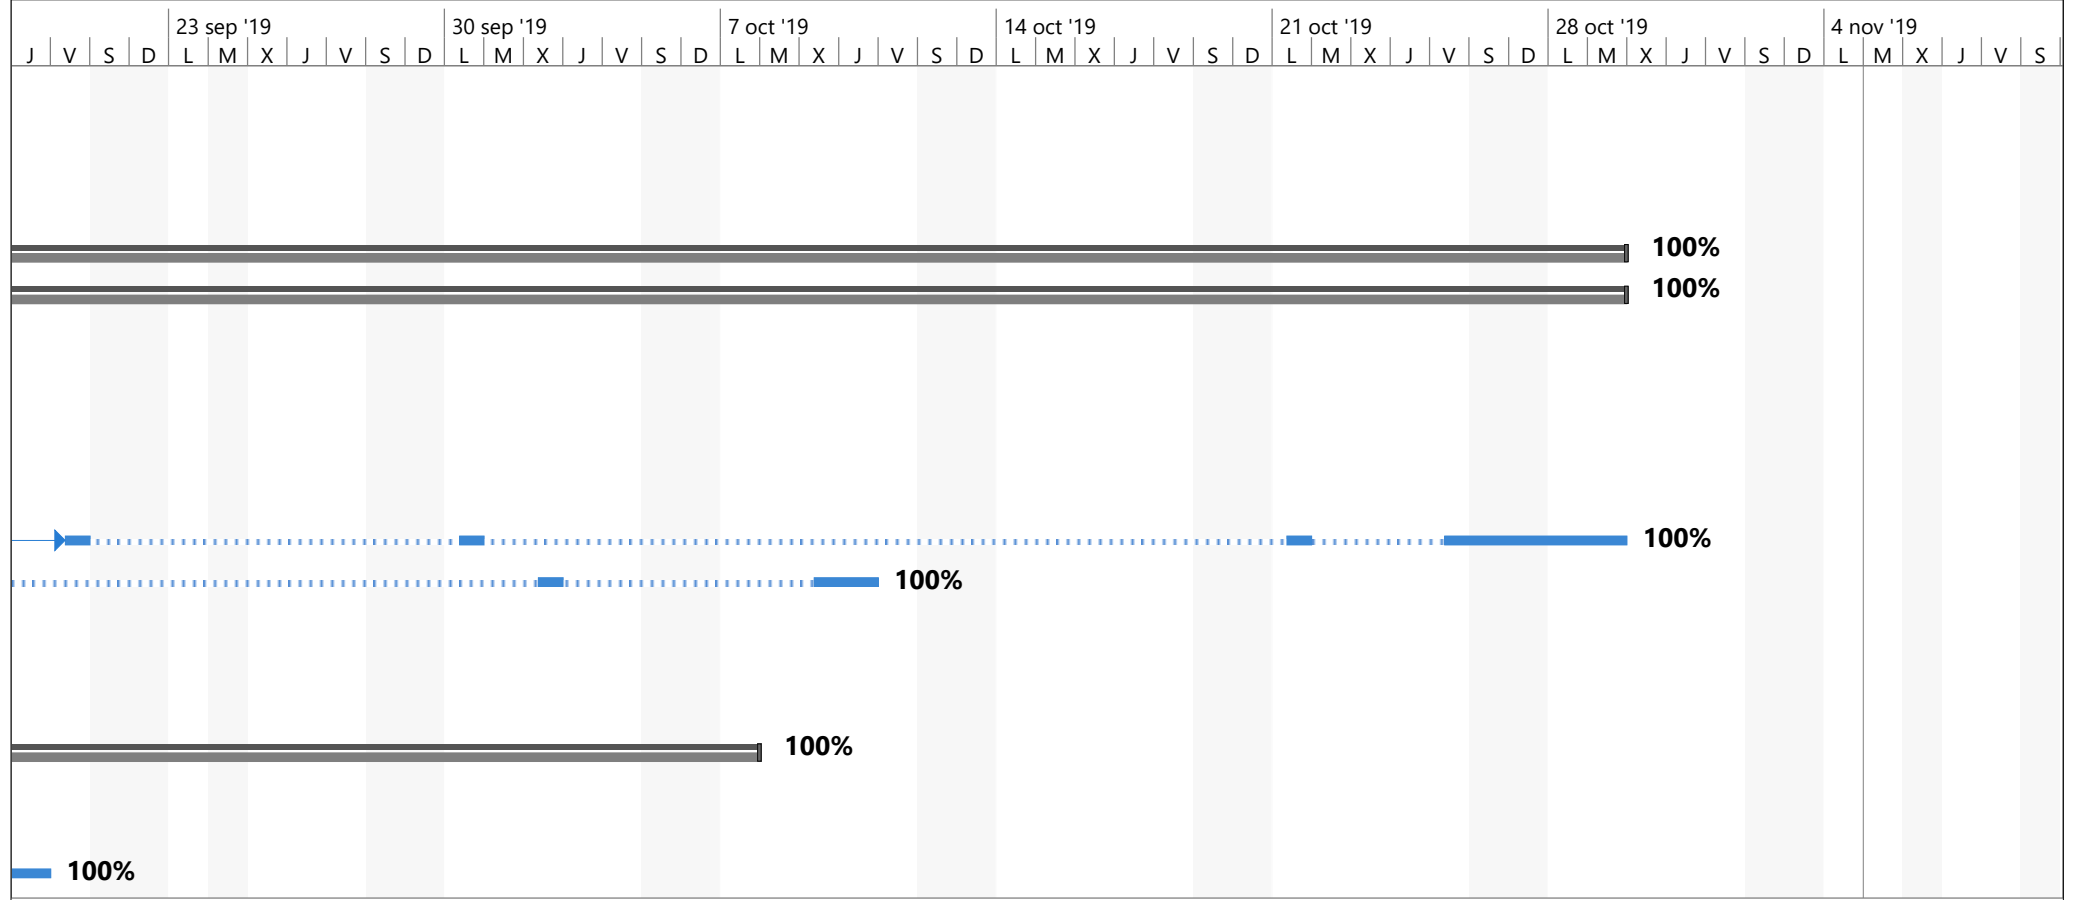


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

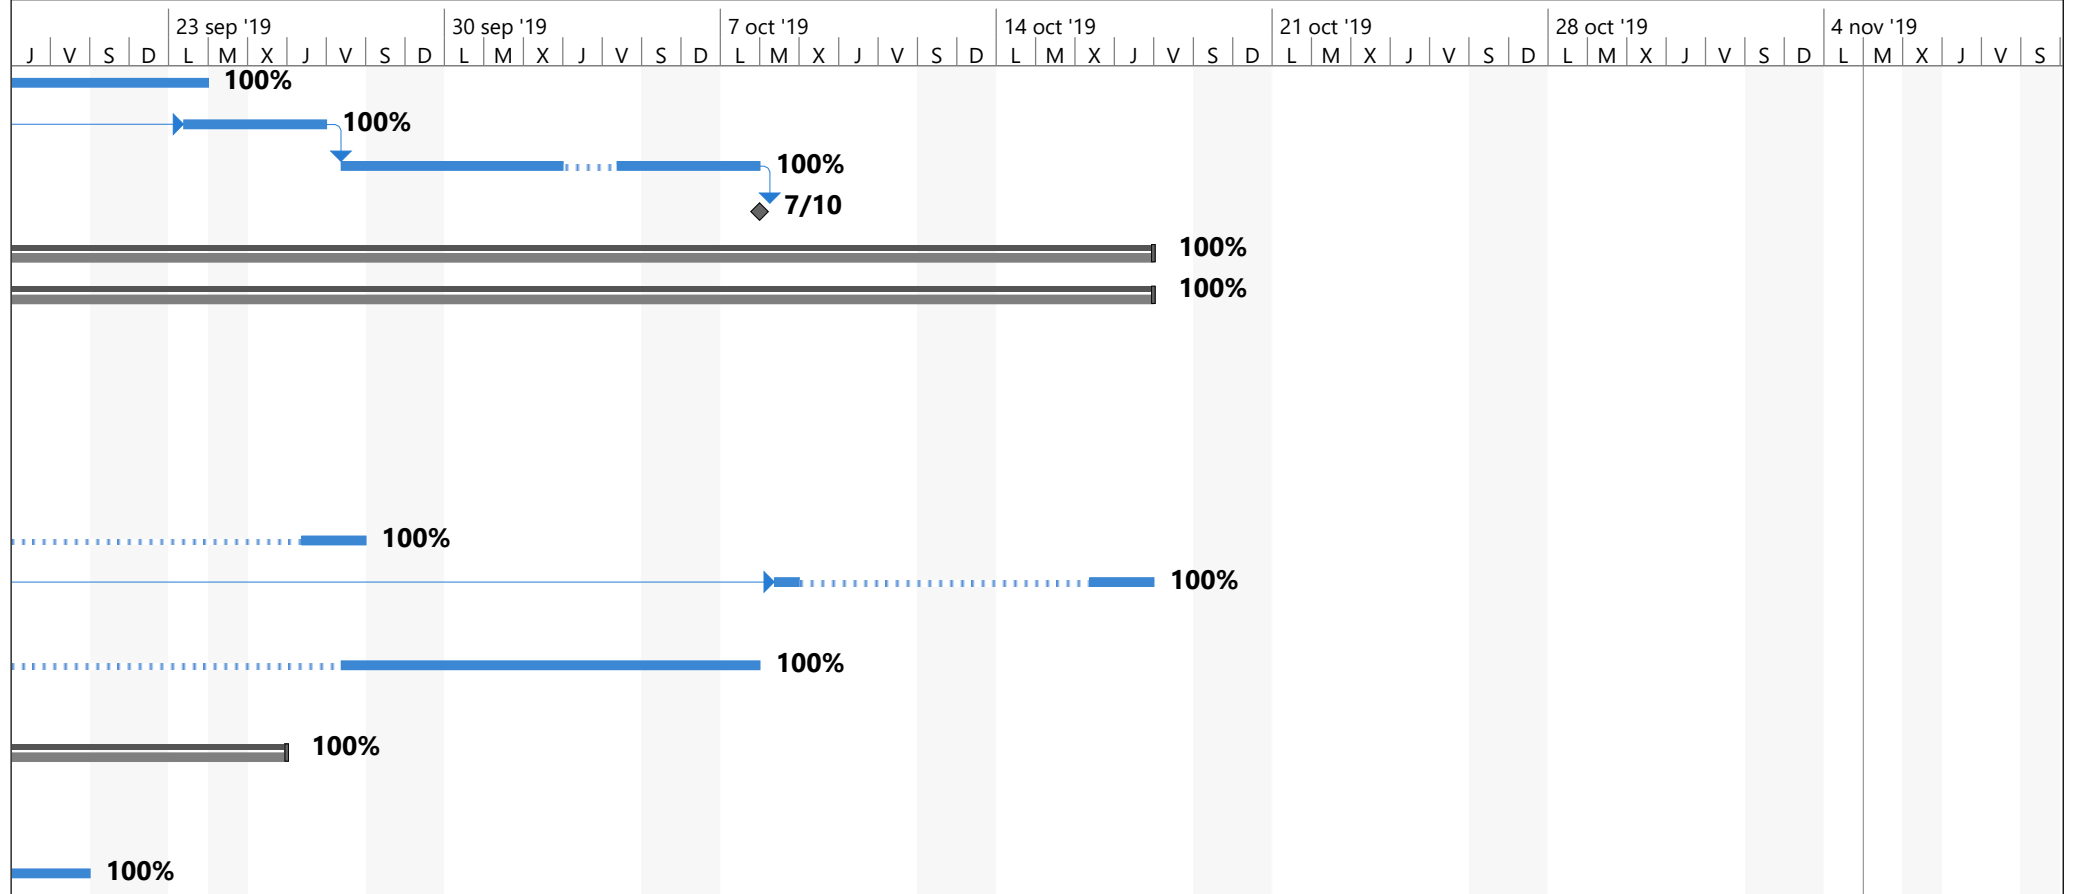


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

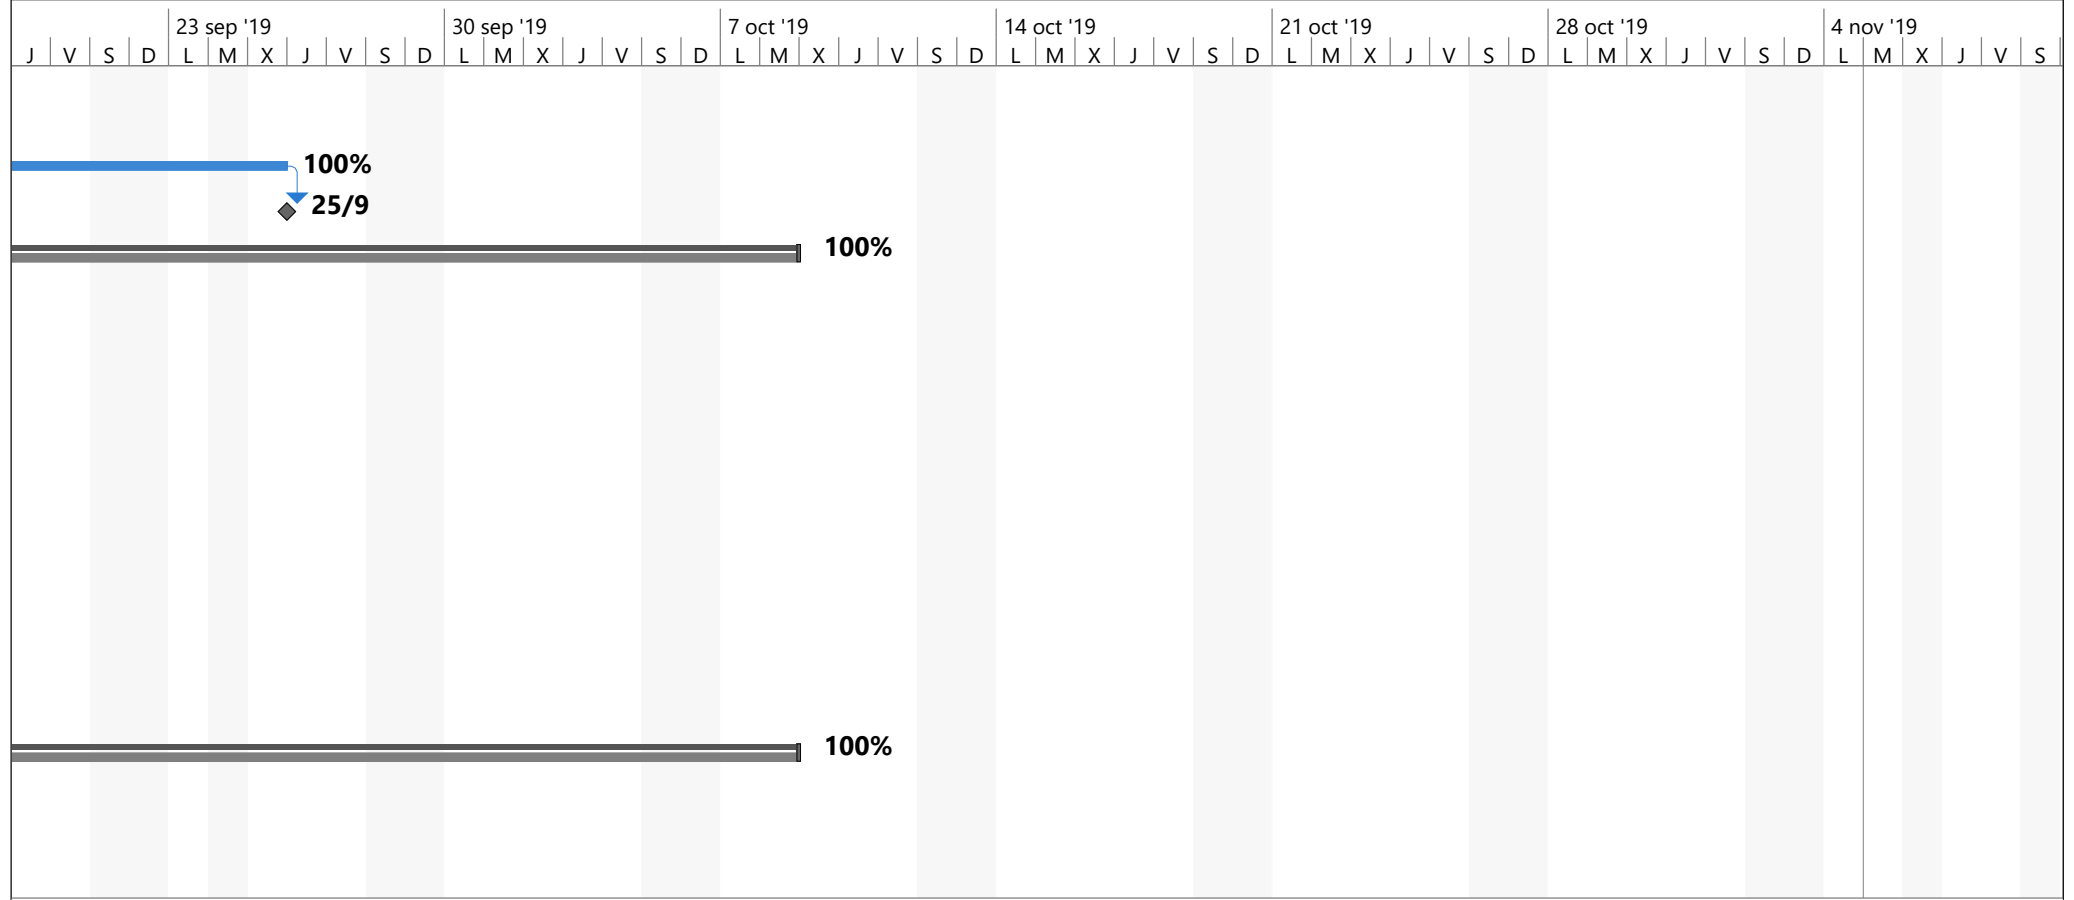

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

# Calendario de Ejecución CANA102 Marzo2021

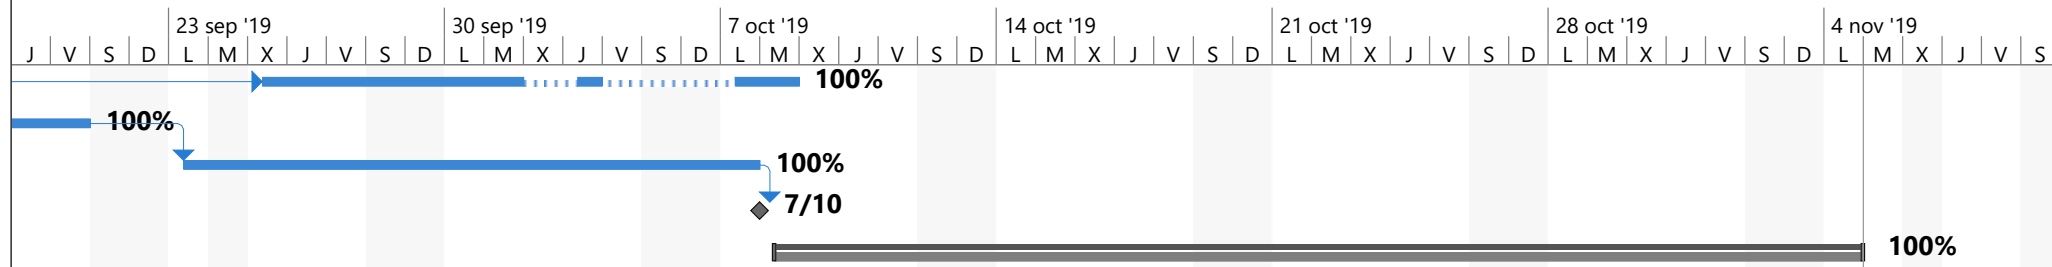

**Leonel Gabot Bonilla**

Coordinación de Planificación y Control de Gestión

Dirección de Proyectos Financiados

Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas

























Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: legabot@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:    



|                           |   |                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |
