

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                     | Duración          | Comienzo            | Fin                 | 1 may '16 |   |   | 19 jun '16 |   |   | 7 ago '16 |  |  | 2 |
|----|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|---|------------|---|---|-----------|--|--|---|
|    |               |                                     |                   |                     |                     | J         | S | L | X          | V | D | M         |  |  |   |
| 1  |               | <b>Circuito CESP101</b>             | <b>284 días</b>   | <b>lun 27/6/16</b>  | <b>jue 27/7/17</b>  |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 2  |               | <b>Adquisiciones</b>                | <b>89 días</b>    | <b>lun 27/6/16</b>  | <b>jue 27/10/16</b> |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 3  |               | Postes                              | 56 días           | lun 27/6/16         | lun 12/9/16         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 4  |               | Herrajes y Conectores               | 66 días           | lun 27/6/16         | lun 26/9/16         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 5  |               | Conductores<br>MT/BT/Acometidas     | 71 días           | lun 27/6/16         | lun 3/10/16         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 6  |               | Transformadores y<br>Eq. Protección | 76 días           | lun 27/6/16         | lun 10/10/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 7  |               | Equipos de Medición                 | 89 días           | lun 27/6/16         | jue 27/10/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 8  |               | Evaluación                          | 0 días            | jue 27/10/16        | jue 27/10/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 9  |               | <b>Etapas 1 y 2</b>                 | <b>51.21 días</b> | <b>jue 27/10/16</b> | <b>vie 6/1/17</b>   |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 10 |               | Izaje de Postes                     | 8.94 días         | jue 27/10/16        | mar 8/11/16         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 11 |               | Armado de Estructura                | 5.37 días         | mar 8/11/16         | mié 16/11/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 12 |               | Tendido de Conducto                 | 7.45 días         | mié 16/11/16        | vie 25/11/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 13 |               | Montaje de<br>Transformadores       | 5.37 días         | vie 25/11/16        | lun 5/12/16         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 14 |               | Instalación de<br>Luminarias        | 5.37 días         | lun 5/12/16         | lun 12/12/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 15 |               | Correcciones                        | 1.34 días         | lun 12/12/16        | mar 13/12/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 16 |               | Remociones                          | 2.68 días         | mar 13/12/16        | vie 16/12/16        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |

Proyecto: Cronograma Modelo CE  
Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea              | Duración          | Comienzo           | Fin                | 1 may '16 |   |   | 19 jun '16 |   |   | 7 ago '16 |  |  | 2 |
|----|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|------------|---|---|-----------|--|--|---|
|    |               |                              |                   |                    |                    | J         | S | L | X          | V | D | M         |  |  |   |
| 17 |               | Normalización de Suministros | 14.69 días        | vie 16/12/16       | vie 6/1/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 18 |               | Evaluación                   | 0 días            | vie 6/1/17         | vie 6/1/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 19 |               | <b>Etapas 3 y 4</b>          | <b>51.21 días</b> | <b>mar 6/12/16</b> | <b>mié 15/2/17</b> |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 20 |               | Izaje de Postes              | 8.94 días         | mar 6/12/16        | vie 16/12/16       |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 21 |               | Armado de Estructur          | 5.37 días         | vie 16/12/16       | lun 26/12/16       |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 22 |               | Tendido de Conducto          | 7.45 días         | lun 26/12/16       | mié 4/1/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 23 |               | Montaje de Transformadores   | 5.37 días         | mié 4/1/17         | jue 12/1/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 24 |               | Instalación de Luminarias    | 5.37 días         | jue 12/1/17        | jue 19/1/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 25 |               | Correcciones                 | 1.34 días         | jue 19/1/17        | vie 20/1/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 26 |               | Remociones                   | 2.68 días         | vie 20/1/17        | mié 25/1/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 27 |               | Normalización de Su          | 14.69 días        | mié 25/1/17        | mié 15/2/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 28 |               | Evaluación                   | 0 días            | mié 15/2/17        | mié 15/2/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 29 |               | <b>Etapas 5 y 6</b>          | <b>51.21 días</b> | <b>lun 16/1/17</b> | <b>mar 28/3/17</b> |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 30 |               | Izaje de Postes              | 8.94 días         | lun 16/1/17        | jue 26/1/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 31 |               | Armado de Estructur          | 5.37 días         | jue 26/1/17        | vie 3/2/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 32 |               | Tendido de Conductor         | 7.45 días         | vie 3/2/17         | mar 14/2/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |

Proyecto: Cronograma Modelo CE  
Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea              | Duración          | Comienzo           | Fin                | 1 may '16 |   |   | 19 jun '16 |   |   | 7 ago '16 |  |  | 2 |
|----|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|------------|---|---|-----------|--|--|---|
|    |               |                              |                   |                    |                    | J         | S | L | X          | V | D | M         |  |  |   |
| 33 |               | Montaje de Transformadores   | 5.37 días         | mar 14/2/17        | mié 22/2/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 34 |               | Instalación de Luminarias    | 5.37 días         | mié 22/2/17        | mié 1/3/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 35 |               | Correcciones                 | 1.34 días         | mié 1/3/17         | jue 2/3/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 36 |               | Remociones                   | 2.68 días         | jue 2/3/17         | mar 7/3/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 37 |               | Normalización de Suministros | 14.69 días        | mar 7/3/17         | mar 28/3/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 38 |               | Evaluación                   | 0 días            | mar 28/3/17        | mar 28/3/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 39 |               | <b>Etapas 7 y 8</b>          | <b>51.21 días</b> | <b>mar 28/2/17</b> | <b>mié 10/5/17</b> |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 40 |               | Izaje de Postes              | 8.94 días         | mar 28/2/17        | vie 10/3/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 41 |               | Armado de Estructur          | 5.37 días         | vie 10/3/17        | lun 20/3/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 42 |               | Tendido de Conductor         | 7.45 días         | lun 20/3/17        | mié 29/3/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 43 |               | Montaje de Transformadores   | 5.37 días         | mié 29/3/17        | jue 6/4/17         |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 44 |               | Instalación de Luminarias    | 5.37 días         | jue 6/4/17         | jue 13/4/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 45 |               | Correcciones                 | 1.34 días         | jue 13/4/17        | vie 14/4/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 46 |               | Remociones                   | 2.68 días         | vie 14/4/17        | mié 19/4/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |


Proyecto: Cronograma Modelo CE  
Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                         | Duración       | Comienzo           | Fin                | 1 may '16 |   |   | 19 jun '16 |   |   | 7 ago '16 |  |  | 2 |
|----|---------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|------------|---|---|-----------|--|--|---|
|    |               |   |                |                    |                    | J         | S | L | X          | V | D | M         |  |  |   |
| 47 |               | Normalización de Suministros            | 14.69 días     | mié 19/4/17        | mié 10/5/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 48 |               | Evaluación                              | 0 días         | mié 10/5/17        | mié 10/5/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 49 |               | <b>Cierres Técnico y Administrativo</b> | <b>46 días</b> | <b>jue 25/5/17</b> | <b>jue 27/7/17</b> |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 50 |               | Cierre Técnico                          | 24 días        | jue 25/5/17        | mar 27/6/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 51 |               | Cierre Administrativo                   | 22 días        | mié 28/6/17        | jue 27/7/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |
| 52 |               | Evaluación                              | 0 días         | jue 27/7/17        | jue 27/7/17        |           |   |   |            |   |   |           |  |  |   |


Proyecto: Cronograma Modelo CE  
Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

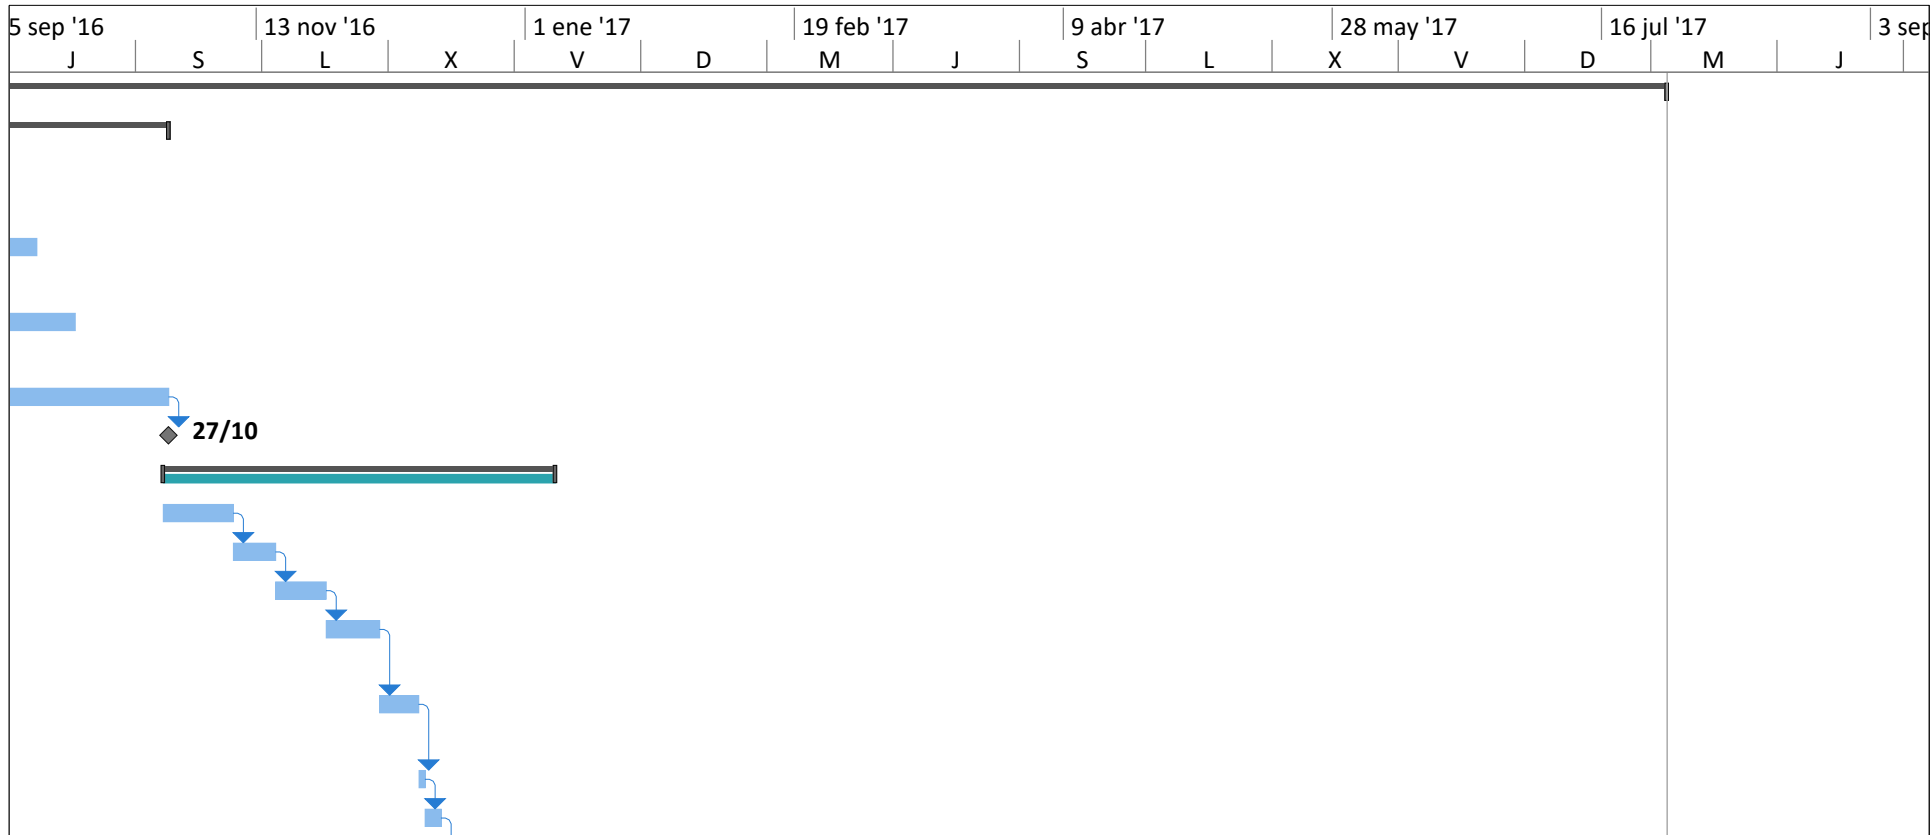


Proyecto: Cronograma Modelo CE  
 Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

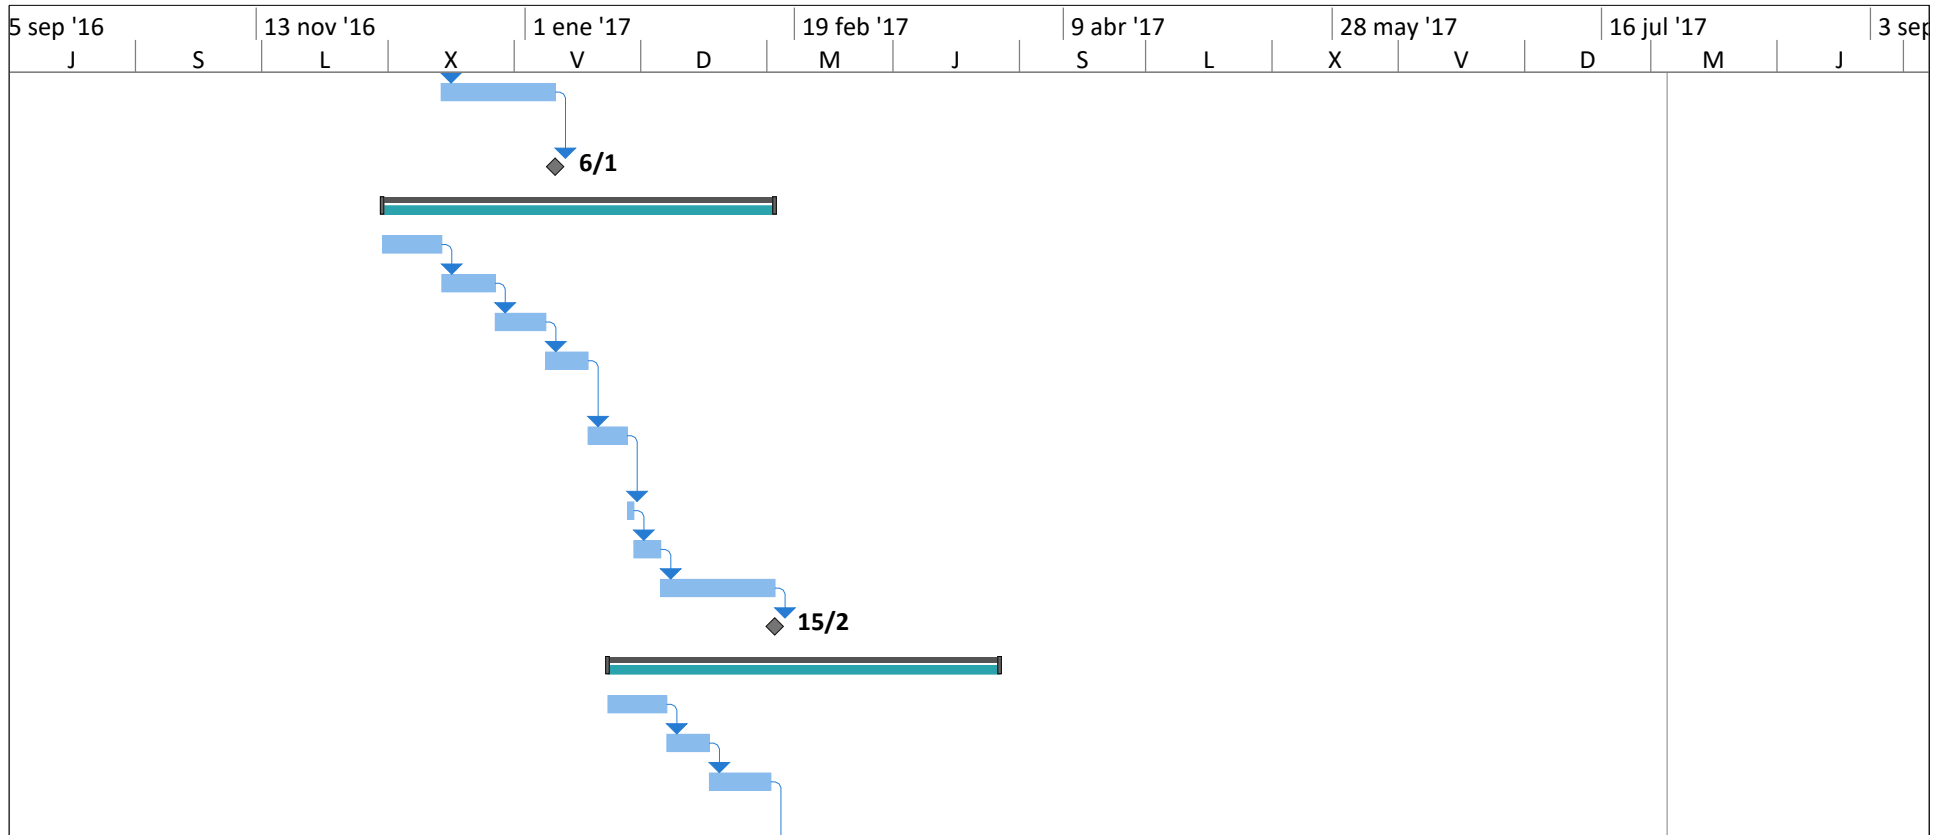


Proyecto: Cronograma Modelo CE  
 Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

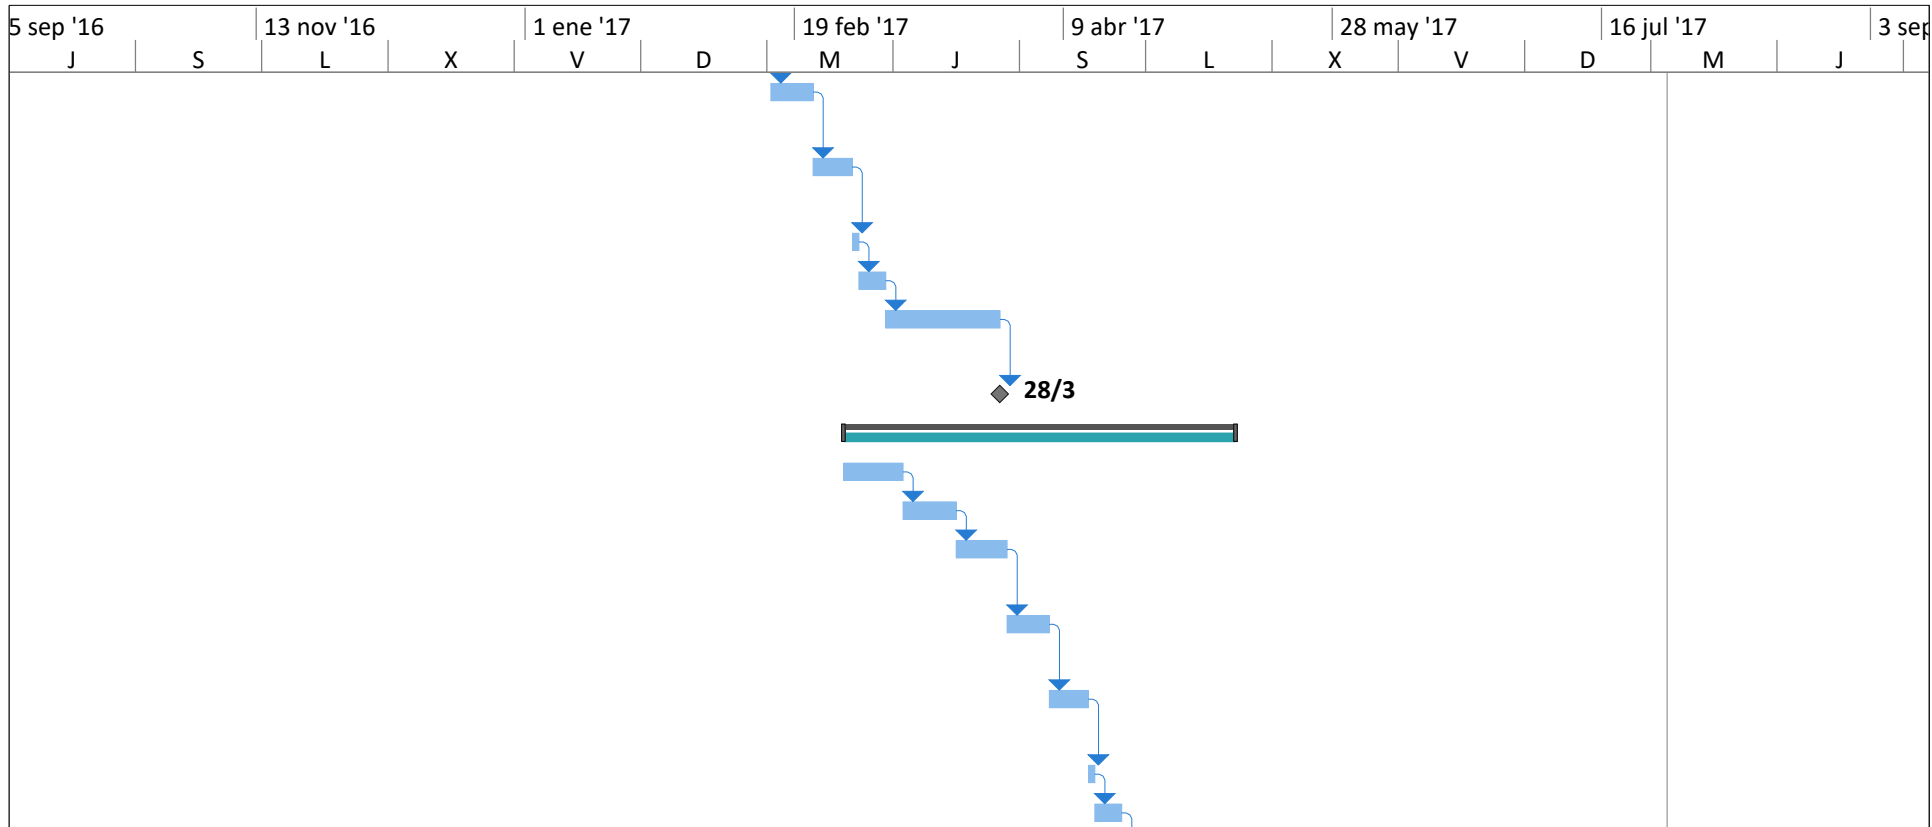

Proyecto: Cronograma Modelo CE  
 Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

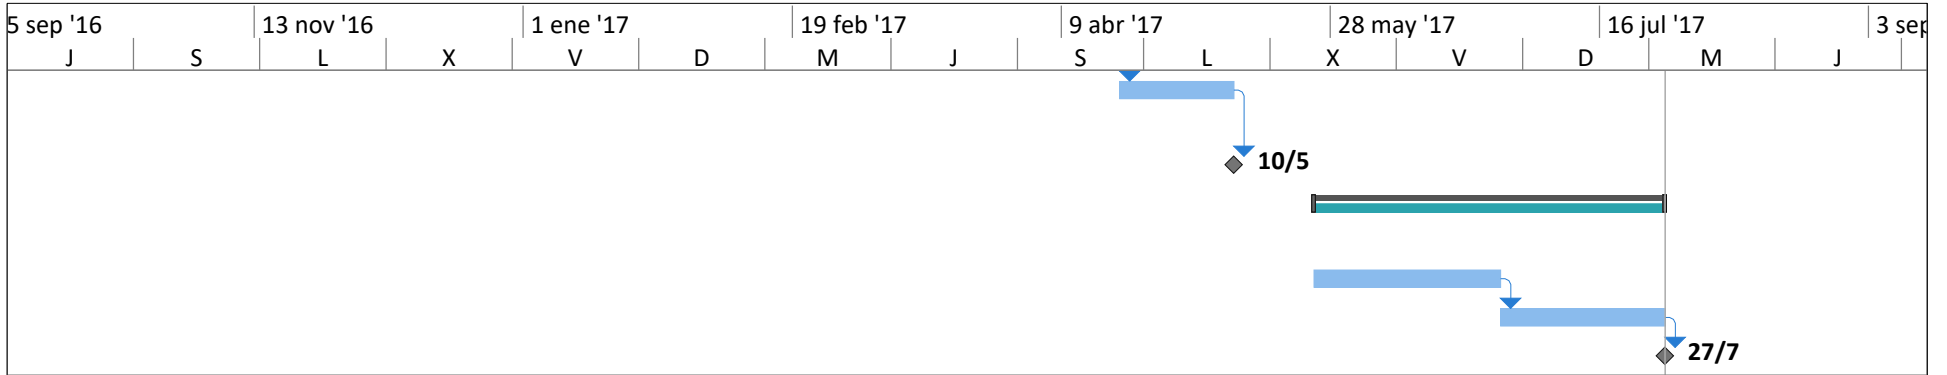

Proyecto: Cronograma Modelo CE  
 Fecha: mar 19/12/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |
