

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may '16			19 jun '16			7 ago '16		
							J	S	L	X	V	D			
1			Circuito SALC104	231 días	lun 27/6/16	lun 15/5/17									
2			Adquisiciones	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16									
3			Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16									
4			Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16									
5			Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16									
6			Transformadores y Eq. Protección	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16									
7			Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16									
8			Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16									
9			Etapa 1	51.21 días	jue 27/10/16	vie 6/1/17									
10			Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16									
11			Armado de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16									
12			Tendido de Conducto	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16									
13			Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16									
14			Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16									
15			Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16									
16			Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16									

Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may '16			19 jun '16			7 ago '16		
							J	S	L	X	V	D			
17			Normalización de Suministros	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17									
18			Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17									
19			Etapla 2	51.21 días	mar 6/12/16	mié 15/2/17									
20			Izaje de Postes	8.94 días	mar 6/12/16	vie 16/12/16									
21			Armado de Estructur	5.37 días	vie 16/12/16	lun 26/12/16									
22			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 26/12/16	mié 4/1/17									
23			Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 4/1/17	jue 12/1/17									
24			Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 12/1/17	jue 19/1/17									
25			Correcciones	1.34 días	jue 19/1/17	vie 20/1/17									
26			Remociones	2.68 días	vie 20/1/17	mié 25/1/17									
27			Normalización de Su	14.69 días	mié 25/1/17	mié 15/2/17									
28			Evaluación	0 días	mié 15/2/17	mié 15/2/17									
29			Etapla 3	51.21 días	lun 16/1/17	mar 28/3/17									
30			Izaje de Postes	8.94 días	lun 16/1/17	jue 26/1/17									
31			Armado de Estructur	5.37 días	jue 26/1/17	vie 3/2/17									
32			Tendido de Conductor	7.45 días	vie 3/2/17	mar 14/2/17									


Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 may '16			19 jun '16			7 ago '16	
							J	S	L	X	V	D		
33			Montaje de Transformadores	5.37 días	mar 14/2/17	mié 22/2/17								
34			Instalación de Luminarias	5.37 días	mié 22/2/17	mié 1/3/17								
35			Correcciones	1.34 días	mié 1/3/17	jue 2/3/17								
36			Remociones	2.68 días	jue 2/3/17	mar 7/3/17								
37			Normalización de Suministros	14.69 días	mar 7/3/17	mar 28/3/17								
38			Evaluación	0 días	mar 28/3/17	mar 28/3/17								
39			Cierres Técnico y Administrativo	20 días	mar 28/3/17	lun 24/4/17								
40			Cierre Técnico	20 días	mar 28/3/17	lun 24/4/17								
41			Cierre Administrativo	15 días	mar 25/4/17	lun 15/5/17								
42			Evaluación	0 días	lun 15/5/17	lun 15/5/17								


Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

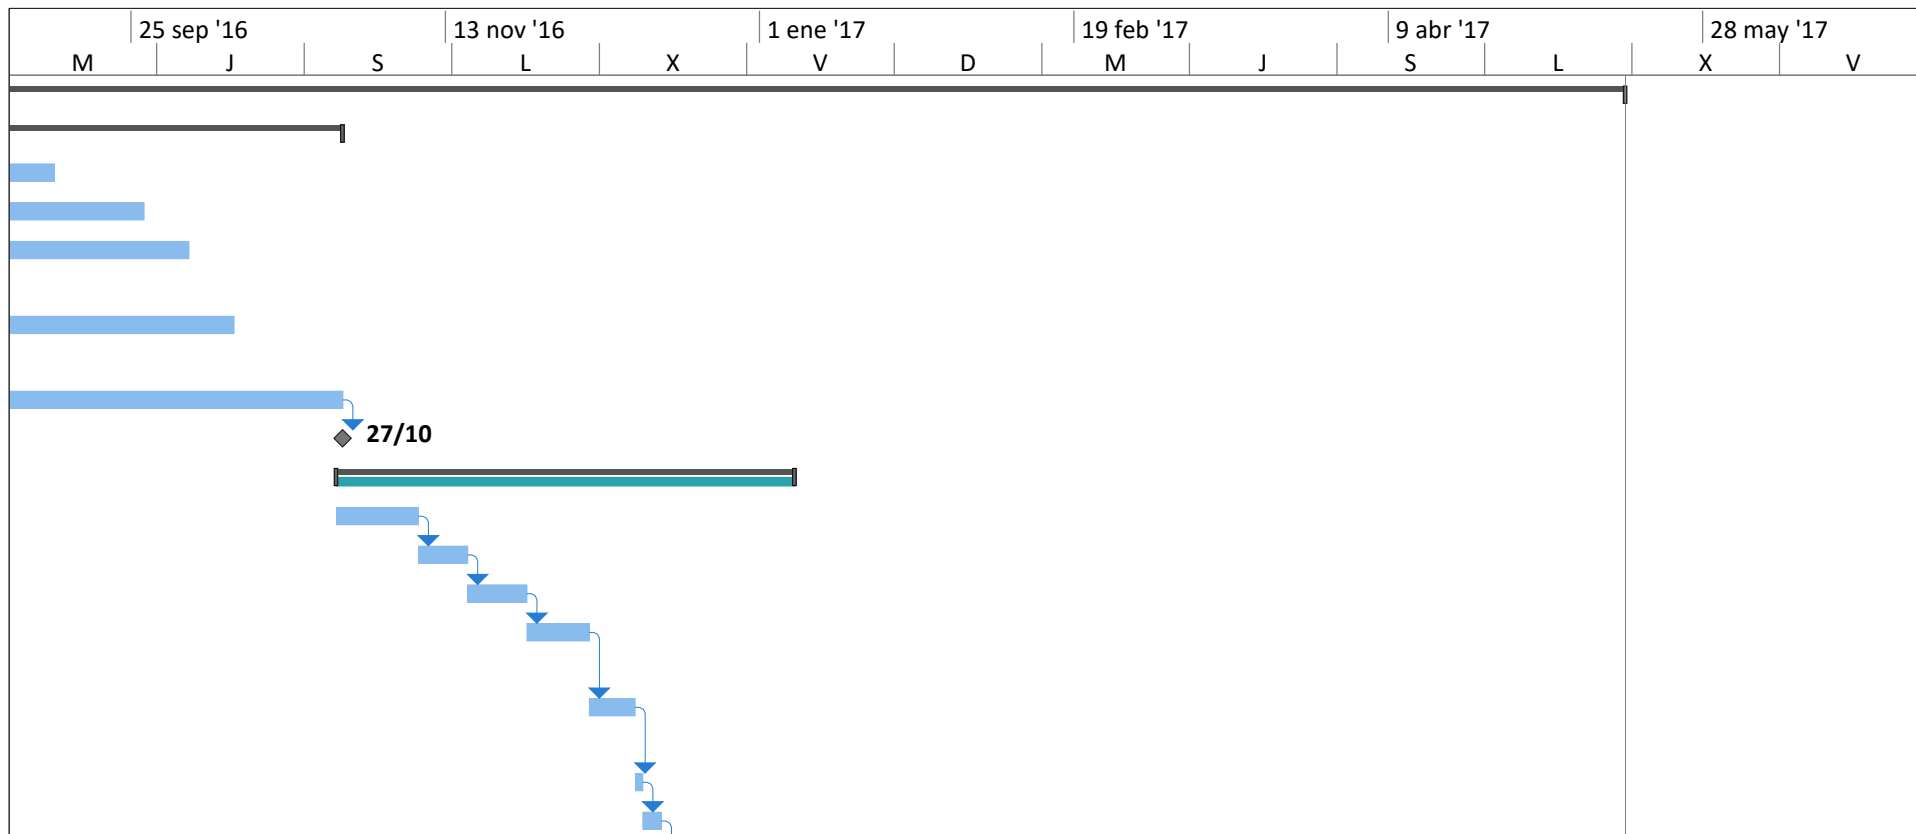

Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

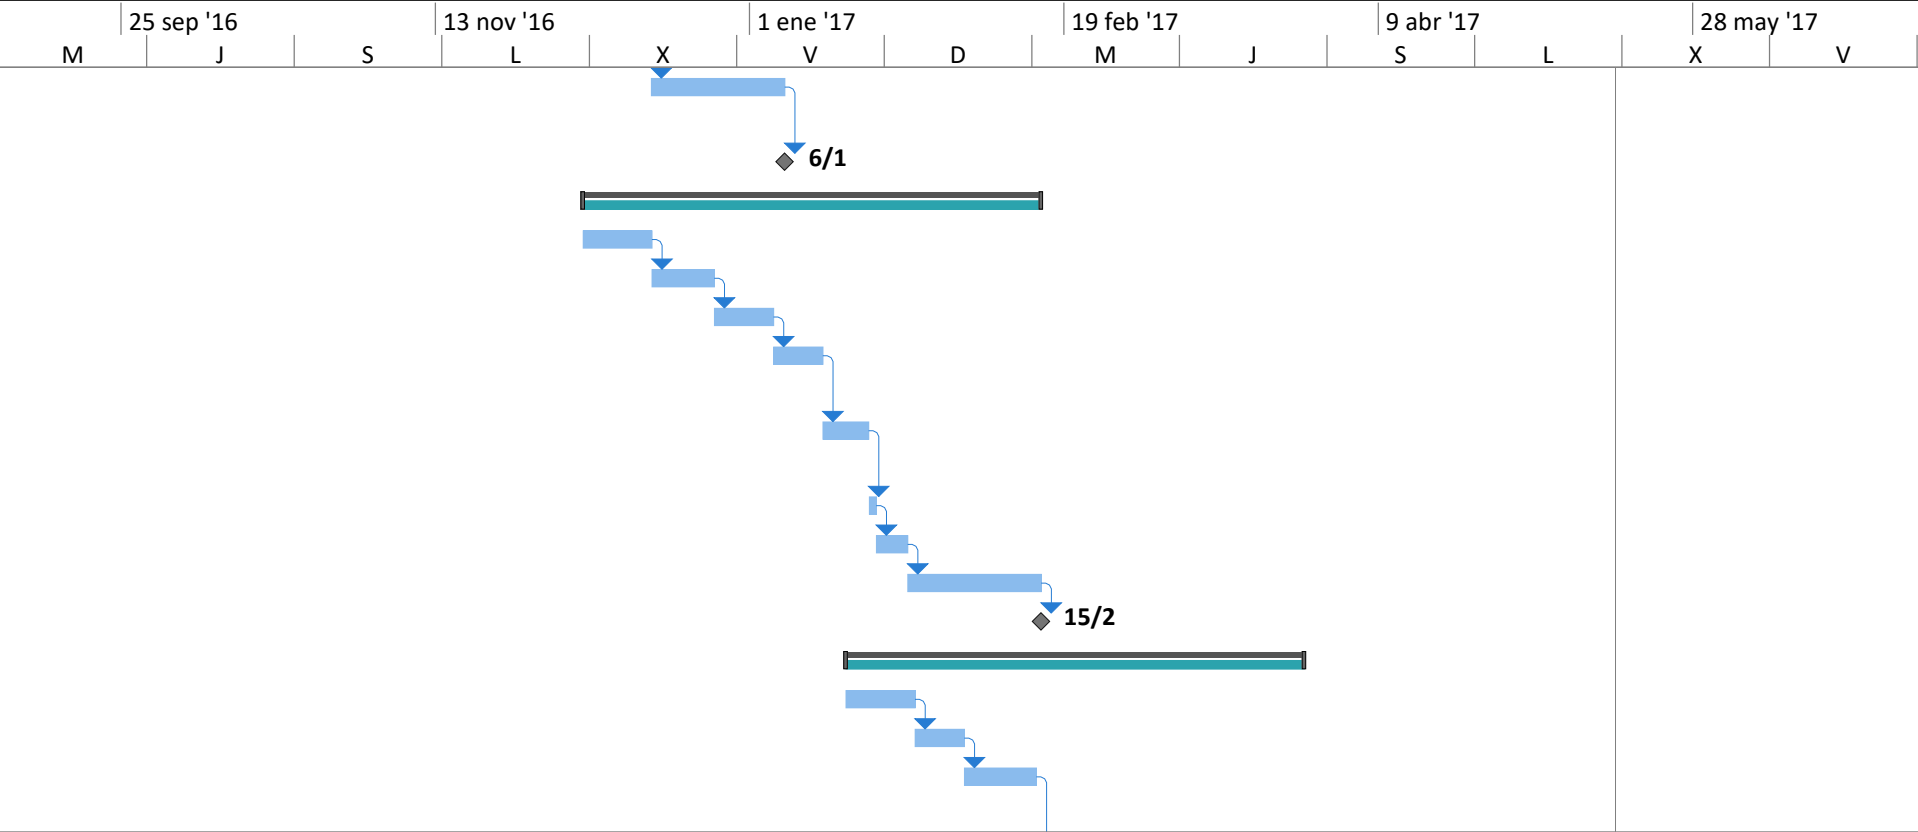

Proyecto: Cronograma Modelo SA Fecha: mar 19/12/17	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

