

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16		25 sep '16			13 nov '16	
						V	D	M	J	S	L	X
1		Circuito ZFSA114	292 días	vie 9/9/16	lun 23/10/17							
2		Adquisiciones	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17							
3		Postes	56 días	vie 9/9/16	vie 25/11/16							
4		Herrajes y Conectores	66 días	vie 9/9/16	vie 9/12/16							
5		Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	vie 9/9/16	vie 16/12/16							
6		Transformadores y Eq. Protección	76 días	vie 9/9/16	vie 23/12/16							
7		Equipos de Medición	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17							
8		Evaluación	0 días	mié 11/1/17	mié 11/1/17							
9		Etapa 1	51.21 días	mié 11/1/17	jue 23/3/17							
10		Izaje de Postes	8.94 días	mié 11/1/17	lun 23/1/17							
11		Armado de Estructura	5.37 días	lun 23/1/17	mar 31/1/17							
12		Tendido de Conducto	7.45 días	mar 31/1/17	jue 9/2/17							
13		Montaje de Transformadores	5.37 días	jue 9/2/17	vie 17/2/17							
14		Instalación de Luminarias	5.37 días	vie 17/2/17	vie 24/2/17							
15		Correcciones	1.34 días	vie 24/2/17	lun 27/2/17							
16		Remociones	2.68 días	lun 27/2/17	jue 2/3/17							

Proyecto: Cronograma Modelo ZF
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16		
						V	D	M	J	S	L	X		
17		Normalización de Suministros	14.69 días	jue 2/3/17	jue 23/3/17									
18		Evaluación	0 días	jue 23/3/17	jue 23/3/17									
19		Etapas 2 y 3	51.21 días	jue 23/2/17	vie 5/5/17									
20		Izaje de Postes	8.94 días	jue 23/2/17	mar 7/3/17									
21		Armado de Estructur	5.37 días	mar 7/3/17	mié 15/3/17									
22		Tendido de Conducto	7.45 días	mié 15/3/17	vie 24/3/17									
23		Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 24/3/17	lun 3/4/17									
24		Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 3/4/17	lun 10/4/17									
25		Correcciones	1.34 días	lun 10/4/17	mar 11/4/17									
26		Remociones	2.68 días	mar 11/4/17	vie 14/4/17									
27		Normalización de Su	14.69 días	vie 14/4/17	vie 5/5/17									
28		Evaluación	0 días	vie 5/5/17	vie 5/5/17									
29		Etapas 4 y 5	51.21 días	mar 25/4/17	mié 5/7/17									
30		Izaje de Postes	8.94 días	mar 25/4/17	vie 5/5/17									
31		Armado de Estructur	5.37 días	vie 5/5/17	lun 15/5/17									
32		Tendido de Conductor	7.45 días	lun 15/5/17	mié 24/5/17									

Proyecto: Cronograma Modelo ZF
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16		
						V	D	M	J	S	L	X		
33		Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 24/5/17	jue 1/6/17									
34		Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 1/6/17	jue 8/6/17									
35		Correcciones	1.34 días	jue 8/6/17	vie 9/6/17									
36		Remociones	2.68 días	vie 9/6/17	mié 14/6/17									
37		Normalización de Suministros	14.69 días	mié 14/6/17	mié 5/7/17									
38		Evaluación	0 días	mié 5/7/17	mié 5/7/17									
39		Etapas 6 y 7	51.21 días	vie 9/6/17	lun 21/8/17									
40		Izaje de Postes	8.94 días	vie 9/6/17	mié 21/6/17									
41		Armado de Estructur	5.37 días	mié 21/6/17	jue 29/6/17									
42		Tendido de Conductor	7.45 días	jue 29/6/17	lun 10/7/17									
43		Montaje de Transformadores	5.37 días	lun 10/7/17	mar 18/7/17									
44		Instalación de Luminarias	5.37 días	mar 18/7/17	mar 25/7/17									
45		Correcciones	1.34 días	mar 25/7/17	mié 26/7/17									
46		Remociones	2.68 días	mié 26/7/17	lun 31/7/17									


Proyecto: Cronograma Modelo ZF
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	7 ago '16			25 sep '16			13 nov '16		
						V	D	M	J	S	L	X		
47		Normalización de Suministros	14.69 días	lun 31/7/17	lun 21/8/17									
48		Evaluación	0 días	lun 21/8/17	lun 21/8/17									
49		Cierres Técnico y Administrativo	46 días	lun 21/8/17	lun 23/10/17									
50		Cierre Técnico	24 días	lun 21/8/17	jue 21/9/17									
51		Cierre Administrativo	22 días	vie 22/9/17	lun 23/10/17									
52		Evaluación	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17									


Proyecto: Cronograma Modelo ZF
Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

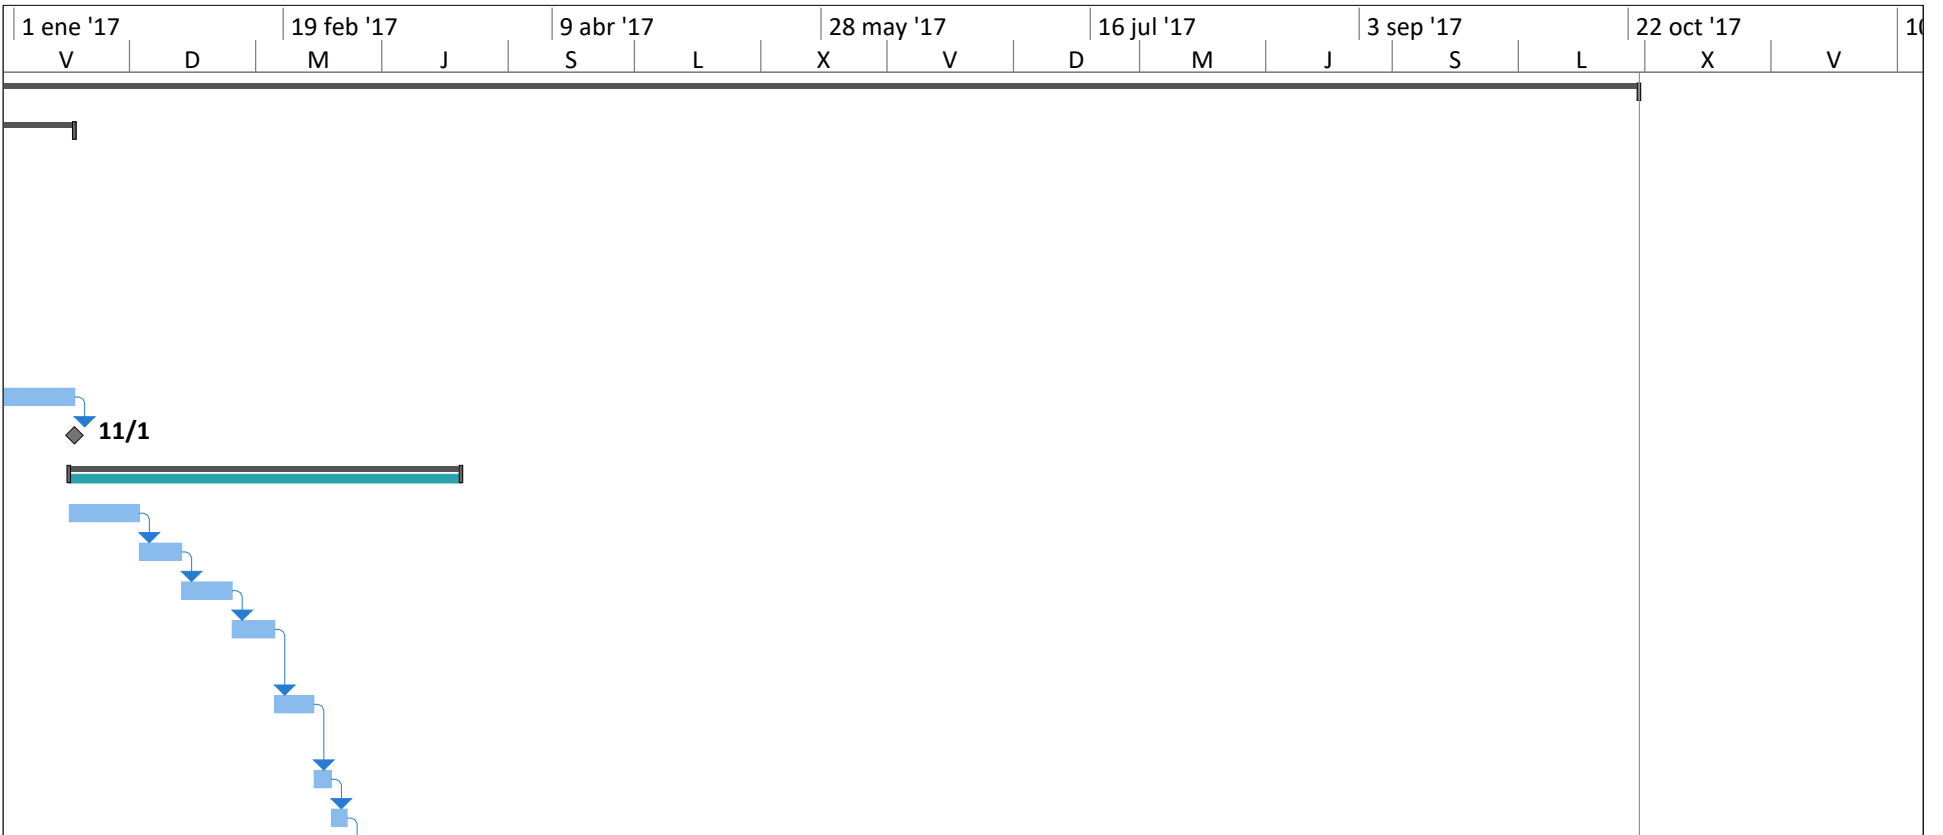


Proyecto: Cronograma Modelo ZF
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

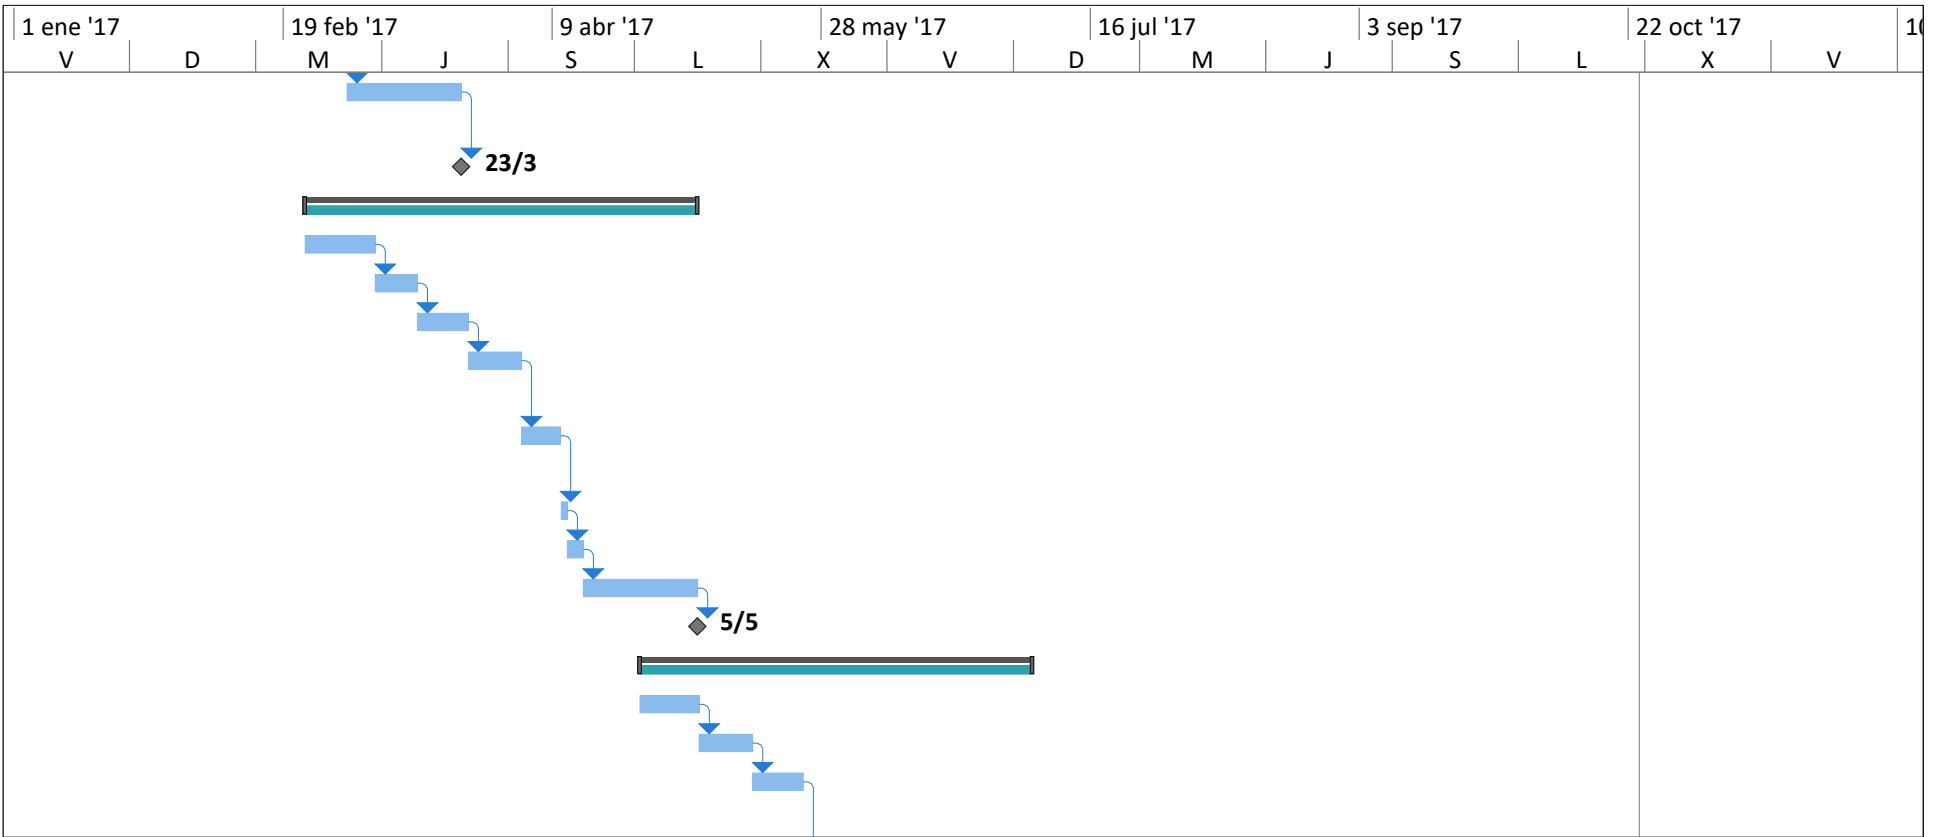


Proyecto: Cronograma Modelo ZF
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

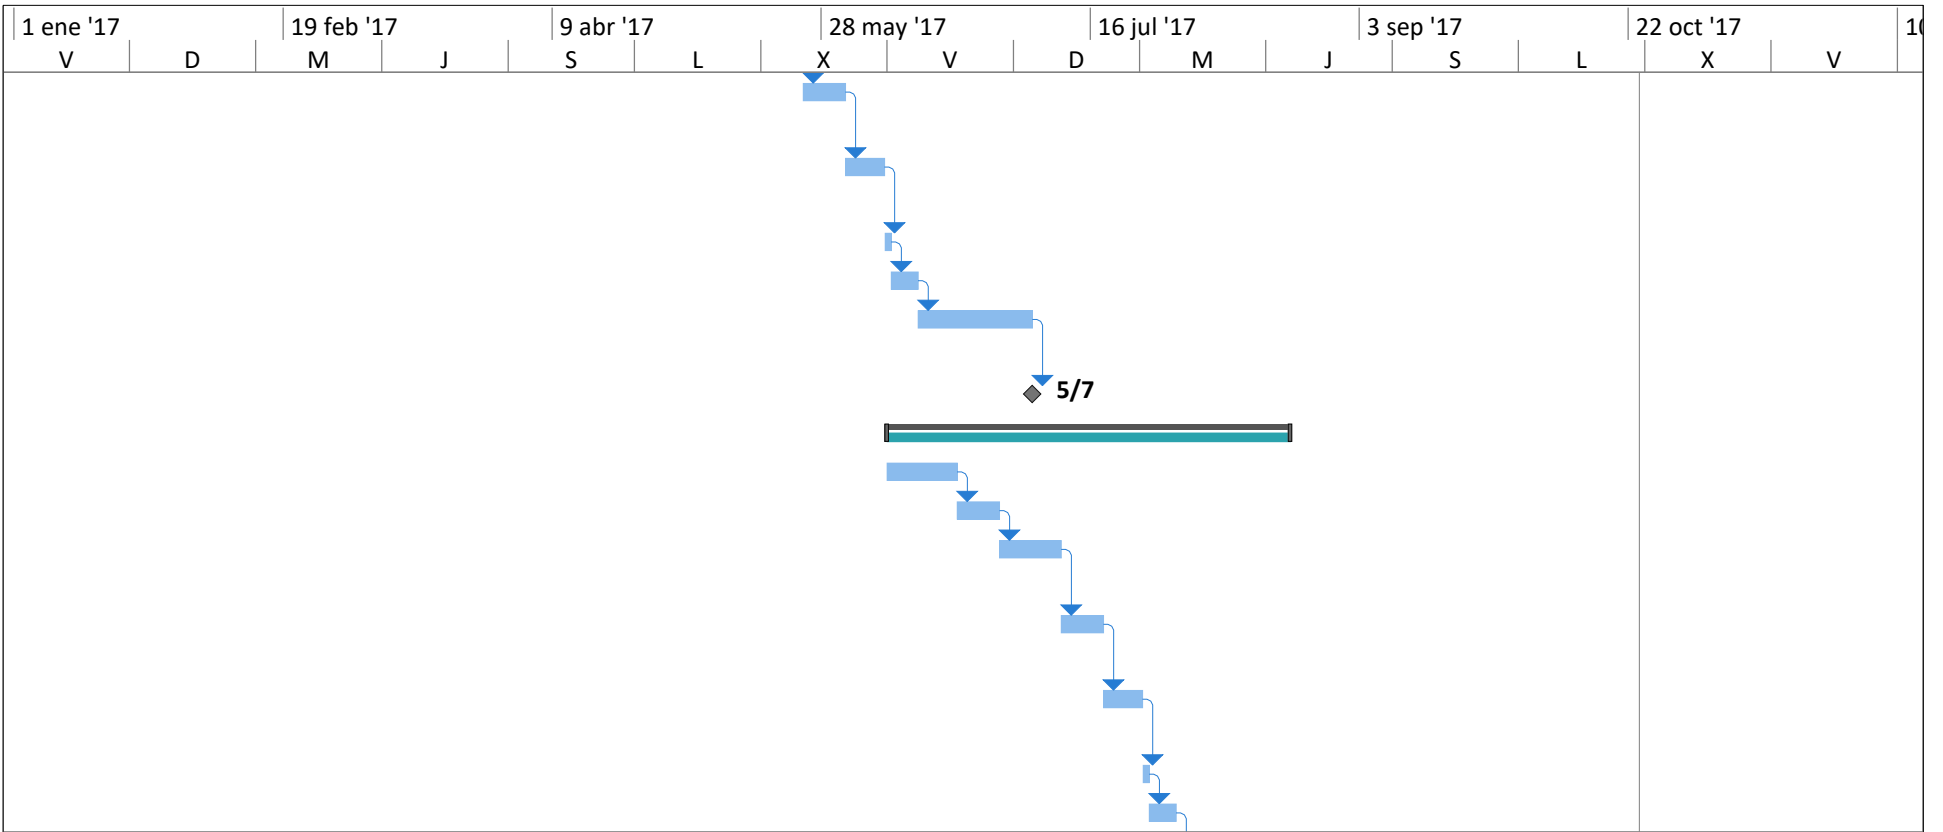

Proyecto: Cronograma Modelo ZF
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

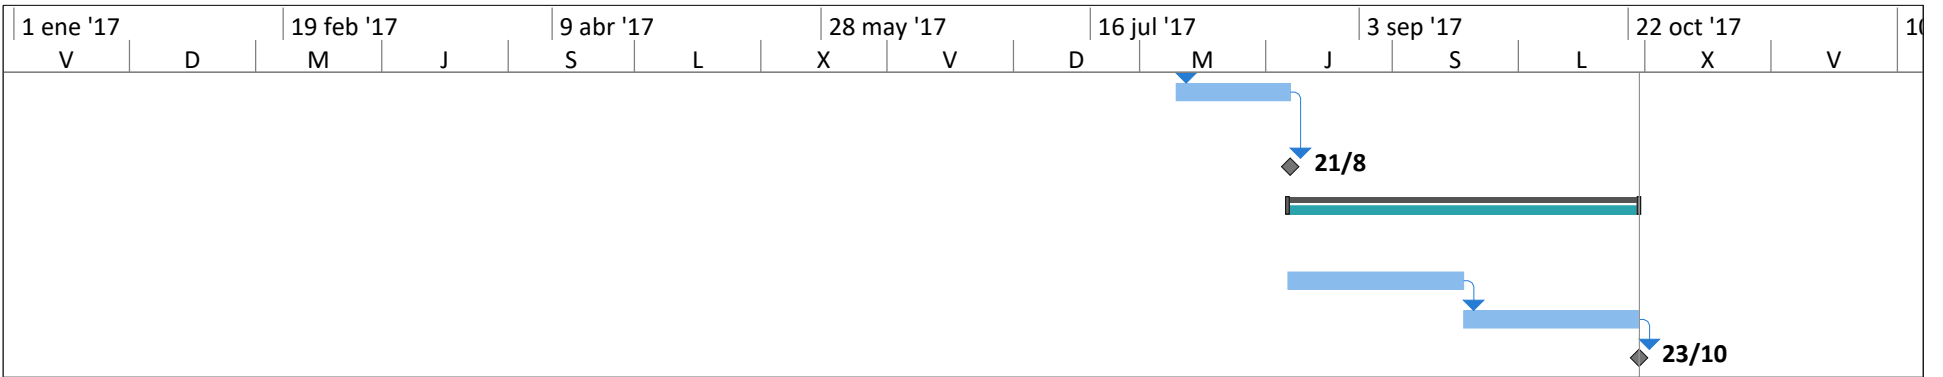

Proyecto: Cronograma Modelo ZF
 Fecha: mar 19/12/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			
