



Cronograma Modelo CESP101

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16			
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1			Circuito CESP101	284 días	lun 27/6/16	jue 27/7/17																			
2			Adquisiciones	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																			
3			Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16																			
4			Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16																			
5			Conductores MT/BT	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16																			
6			Transformadores y Equipos	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16																			
7			Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																			
8			Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16	7																		
9			Etapas 1 y 2	51.21 días	jue 27/10/16	vie 6/1/17																			
10			Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16																			
11			Armado de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16	10																		
12			Tendido de Conductores	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16	11																		
13			Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16	12																		
14			Instalación de luminarias	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16	13																		
15			Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16	14																		
16			Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16	15																		
17			Normalización de Suministro	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17	16																		
18			Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17	17																		
19			Etapas 3 y 4	51.21 días	mar 6/12/16	mié 15/2/17																			
20			Izaje de Postes	8.94 días	mar 6/12/16	vie 16/12/16																			
21			Armado de Estructura	5.37 días	vie 16/12/16	lun 26/12/16	20																		


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16			
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
22			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 26/12/16	mié 4/1/17	21																		
23			Montaje de Transfor	5.37 días	mié 4/1/17	jue 12/1/17	22																		
24			Instalación de Lumin	5.37 días	jue 12/1/17	jue 19/1/17	23																		
25			Correcciones	1.34 días	jue 19/1/17	vie 20/1/17	24																		
26			Remociones	2.68 días	vie 20/1/17	mié 25/1/17	25																		
27			Normalización de Sur	14.69 días	mié 25/1/17	mié 15/2/17	26																		
28			Evaluación	0 días	mié 15/2/17	mié 15/2/17	27																		
29			Etapas 5 y 6	51.21 días	lun 16/1/17	mar 28/3/17																			
30			Izaje de Postes	8.94 días	lun 16/1/17	jue 26/1/17																			
31			Armado de Estructur	5.37 días	jue 26/1/17	vie 3/2/17	30																		
32			Tendido de Conducto	7.45 días	vie 3/2/17	mar 14/2/17	31																		
33			Montaje de Transfor	5.37 días	mar 14/2/17	mié 22/2/17	32																		
34			Instalación de Lumin	5.37 días	mié 22/2/17	mié 1/3/17	33																		
35			Correcciones	1.34 días	mié 1/3/17	jue 2/3/17	34																		
36			Remociones	2.68 días	jue 2/3/17	mar 7/3/17	35																		
37			Normalización de Sur	14.69 días	mar 7/3/17	mar 28/3/17	36																		
38			Evaluación	0 días	mar 28/3/17	mar 28/3/17	37																		
39			Etapas 7 y 8	51.21 días	mar 28/2/17	mié 10/5/17																			
40			Izaje de Postes	8.94 días	mar 28/2/17	vie 10/3/17																			
41			Armado de Estructur	5.37 días	vie 10/3/17	lun 20/3/17	40																		
42			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 20/3/17	mié 29/3/17	41																		


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16			
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
43			Montaje de Transfor	5.37 días	mié 29/3/17	jue 6/4/17	42																		
44			Instalación de Lumin	5.37 días	jue 6/4/17	jue 13/4/17	43																		
45			Correcciones	1.34 días	jue 13/4/17	vie 14/4/17	44																		
46			Remociones	2.68 días	vie 14/4/17	mié 19/4/17	45																		
47			Normalización de Sur	14.69 días	mié 19/4/17	mié 10/5/17	46																		
48			Evaluación	0 días	mié 10/5/17	mié 10/5/17	47																		
49			Cierres Técnico y Admin	46 días	jue 25/5/17	jue 27/7/17																			
50			Cierre Técnico	24 días	jue 25/5/17	mar 27/6/17																			
51			Cierre Administrativo	22 días	mié 28/6/17	jue 27/7/17	50																		
52			Evaluación	0 días	jue 27/7/17	jue 27/7/17	51																		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

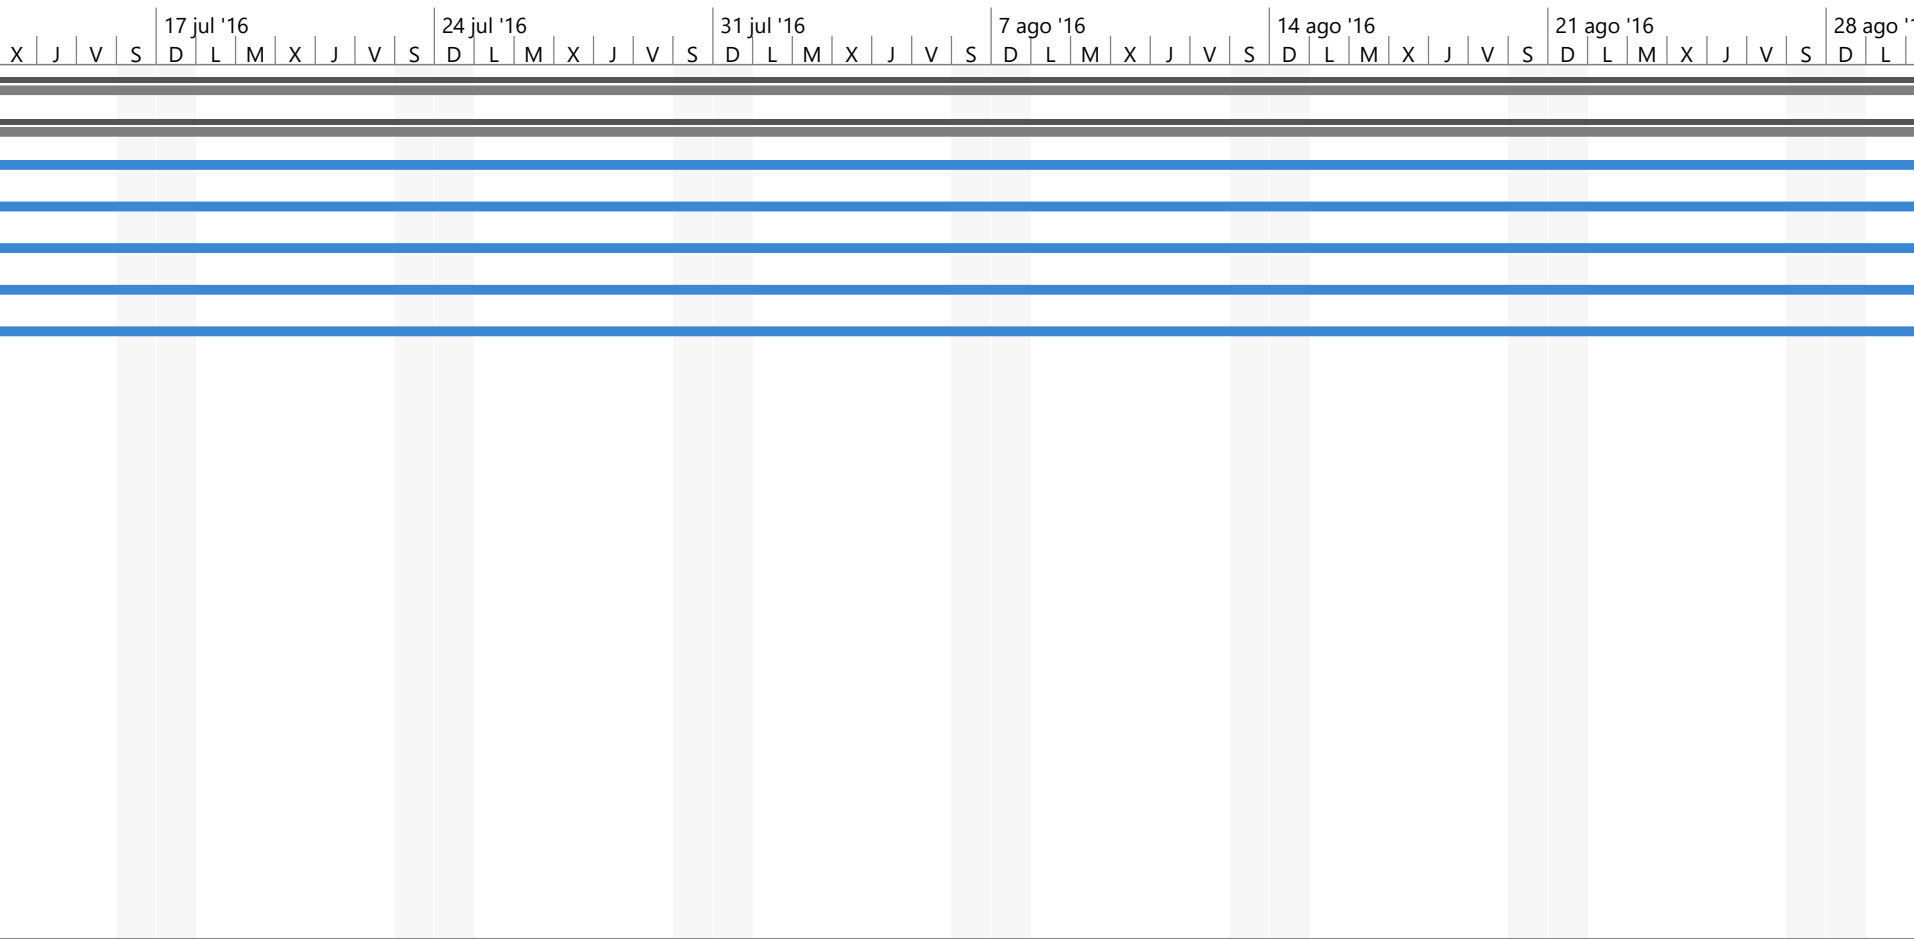

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

X J V S 17 jul '16 D L M X J V S 24 jul '16 D L M X J V S 31 jul '16 D L M X J V S 7 ago '16 D L M X J V S 14 ago '16 D L M X J V S 21 ago '16 D L M X J V S 28 ago '16 D L M X J V S

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División




Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Cronograma Modelo CESP101

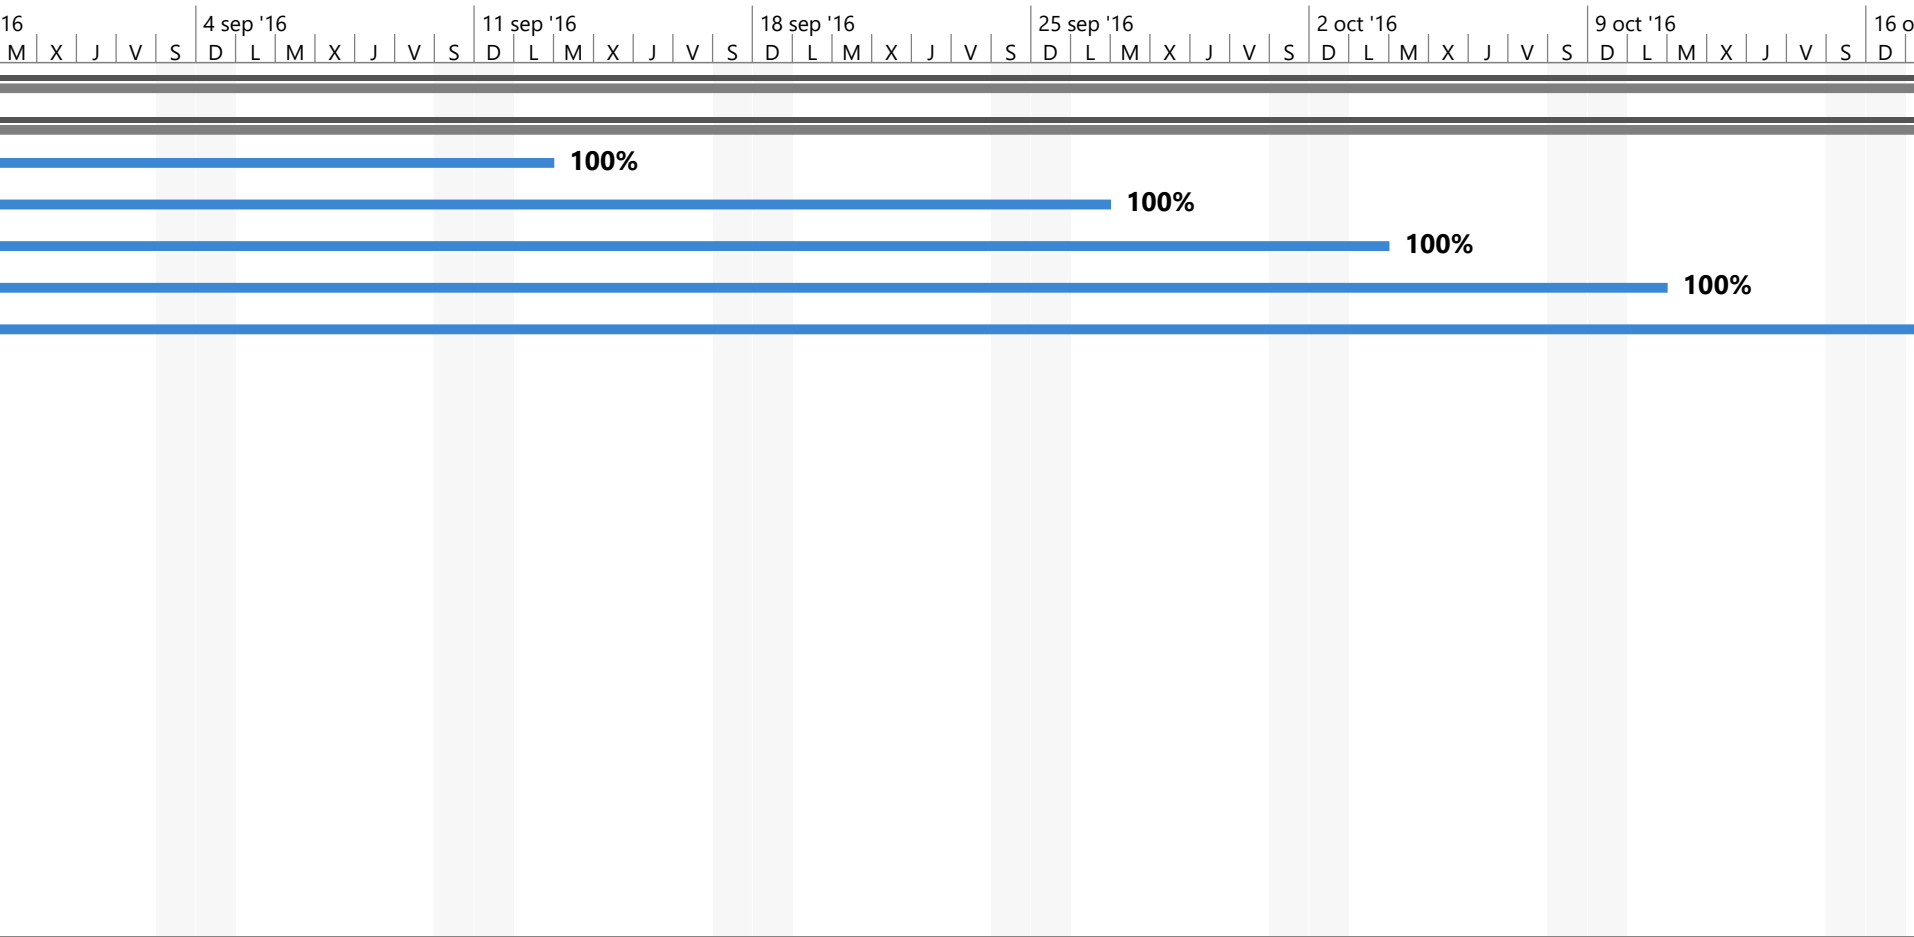

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101

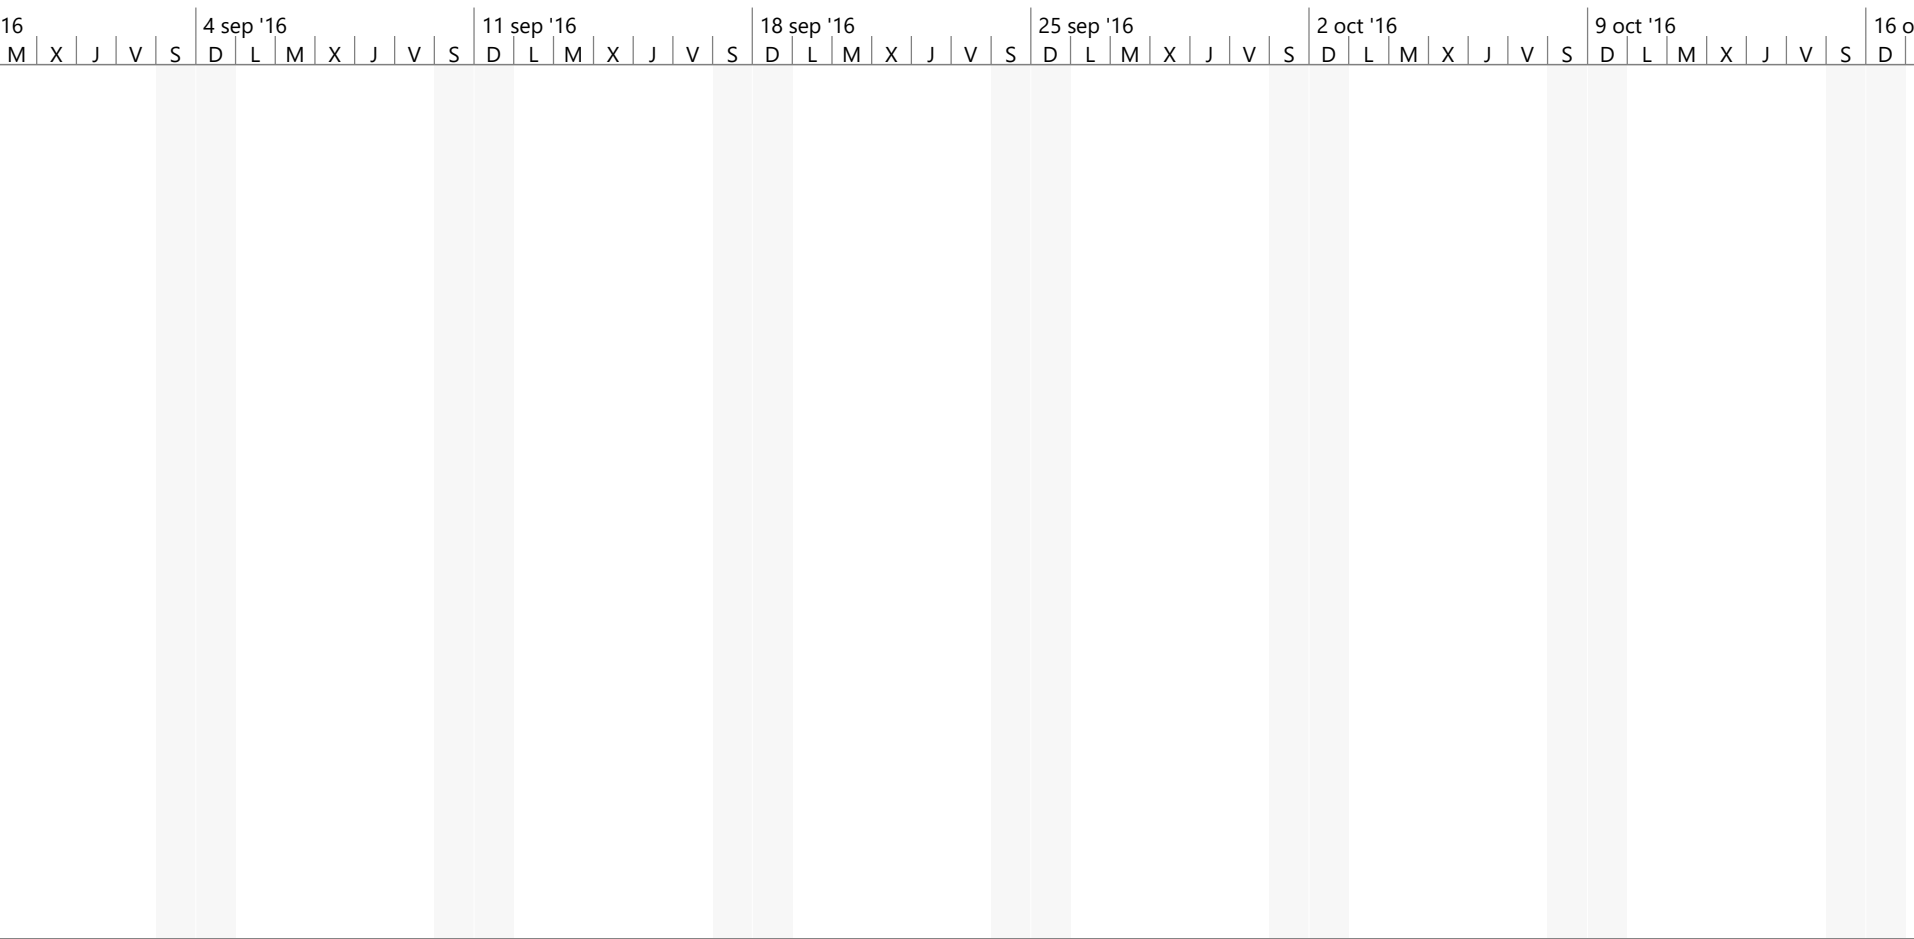

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101

16 M X J V S 4 sep '16 D L M X J V S 11 sep '16 D L M X J V S 18 sep '16 D L M X J V S 25 sep '16 D L M X J V S 2 oct '16 D L M X J V S 9 oct '16 D L M X J V S 16 o

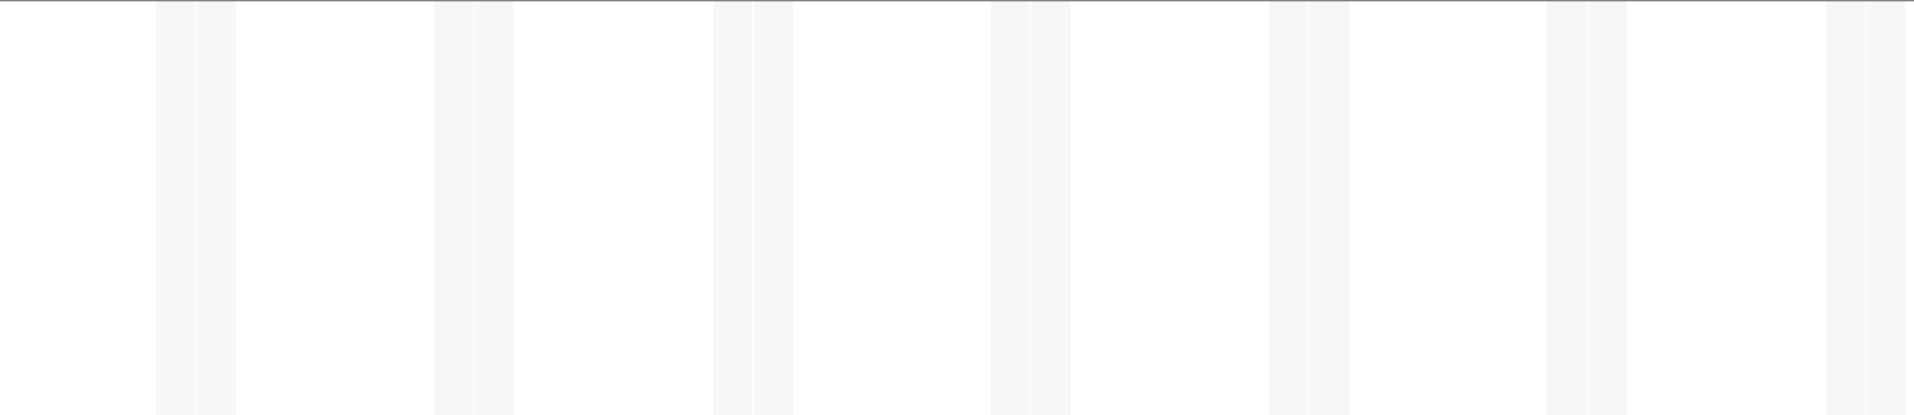


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

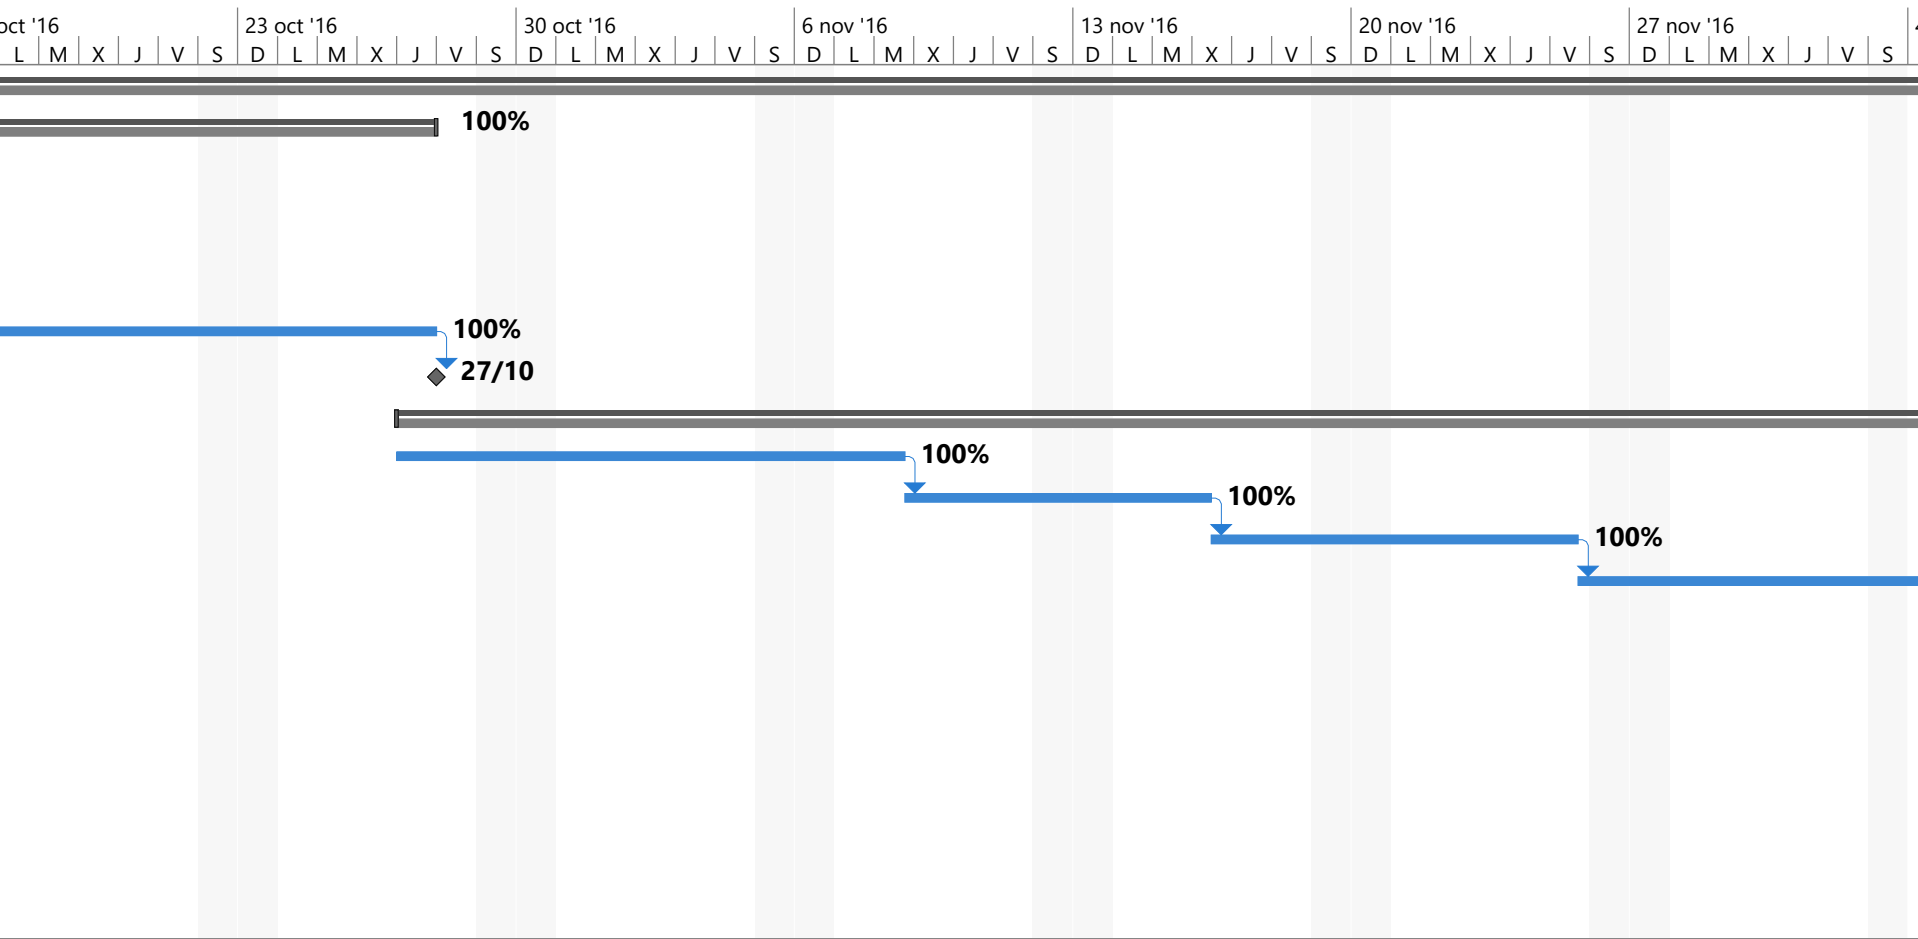


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

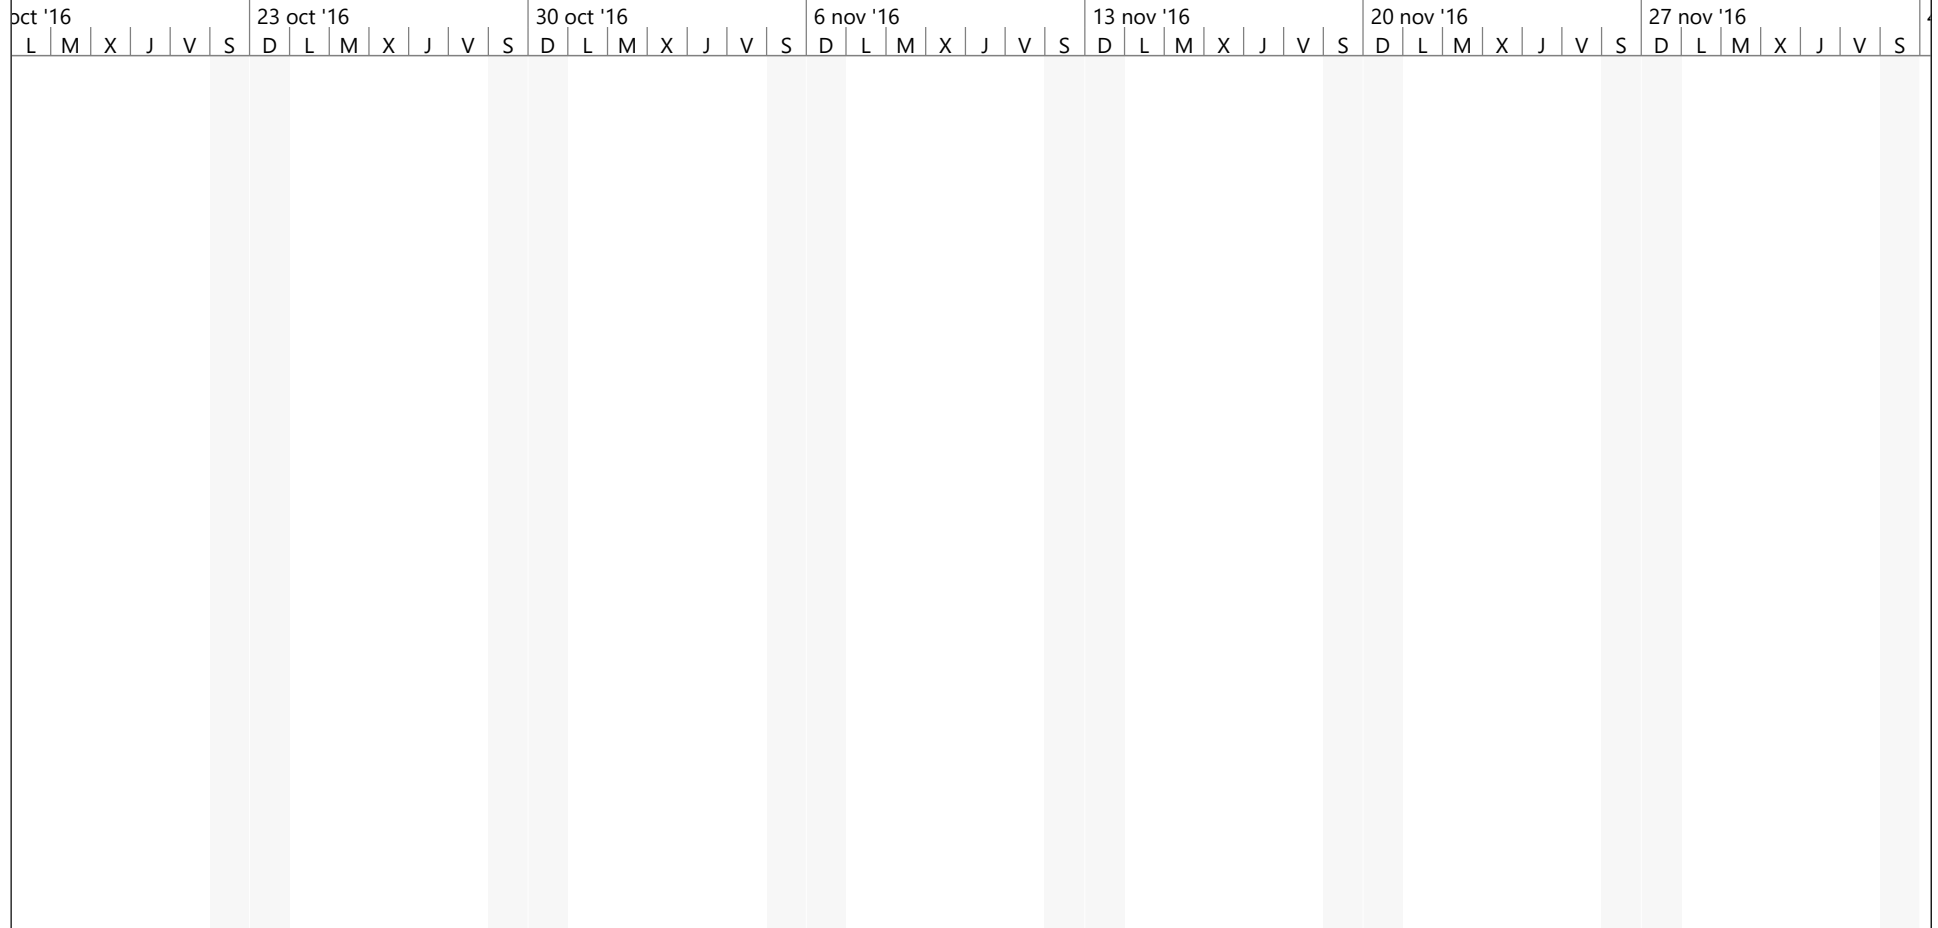

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101

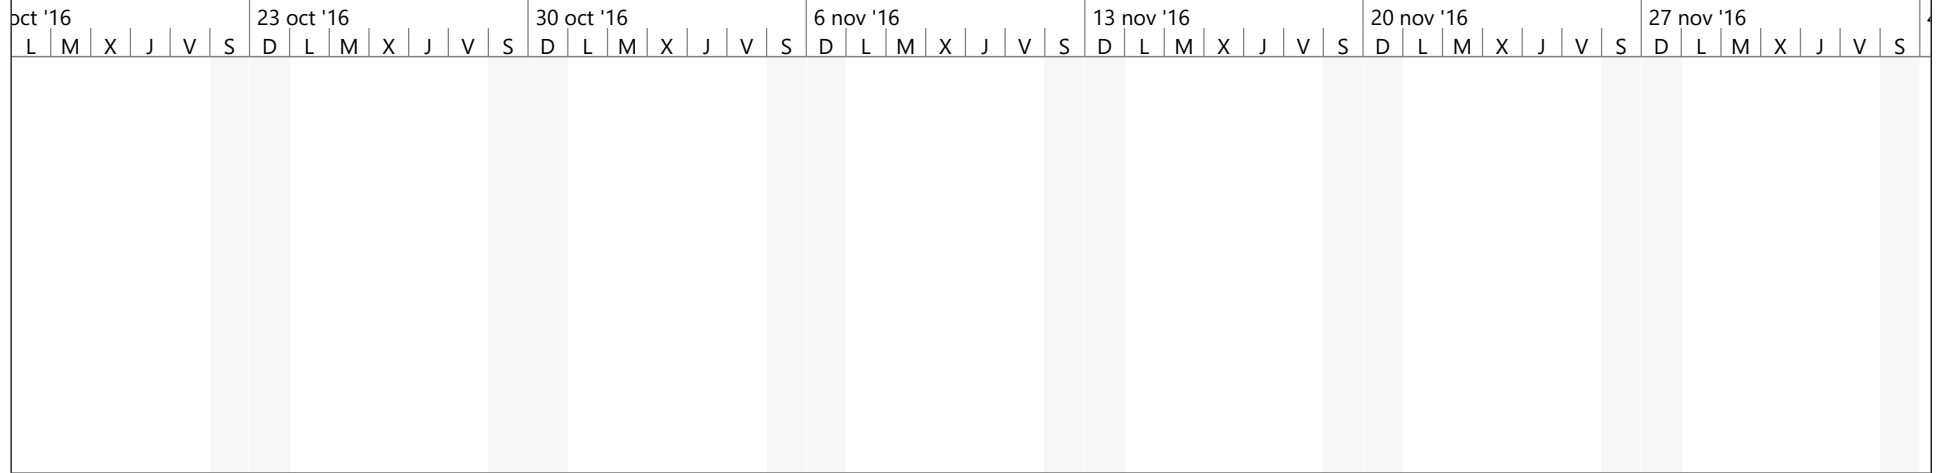

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101

4 dic '16 11 dic '16 18 dic '16 25 dic '16 1 ene '17 8 ene '17 15 ene '17
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

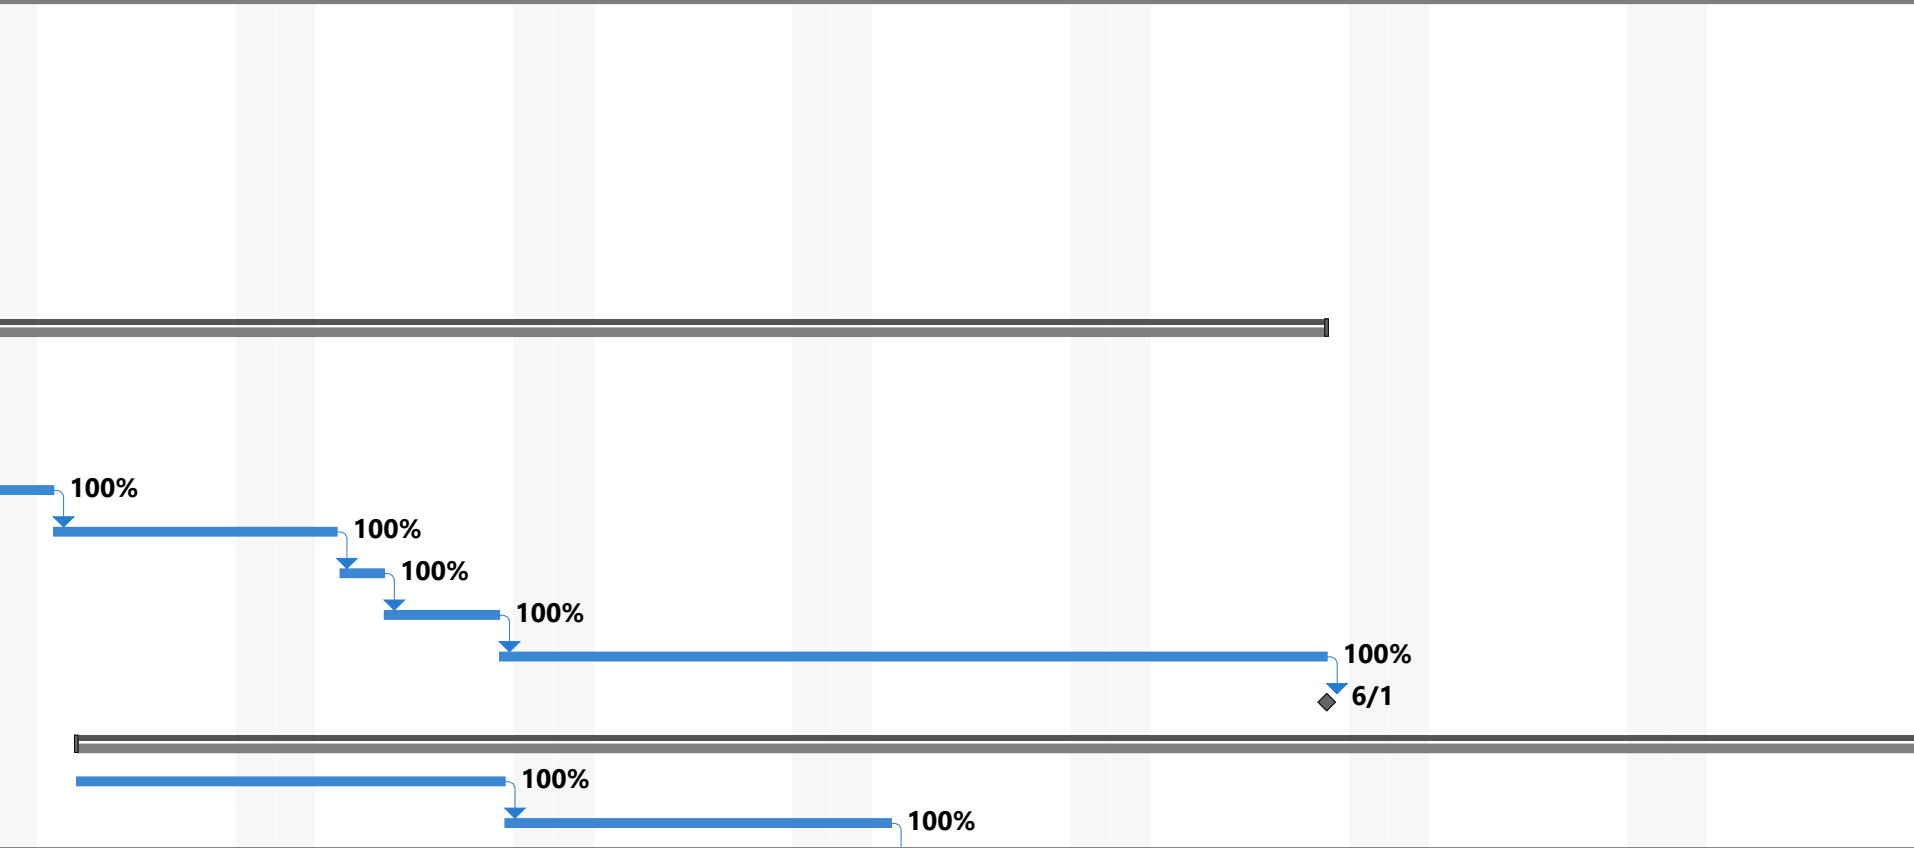

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

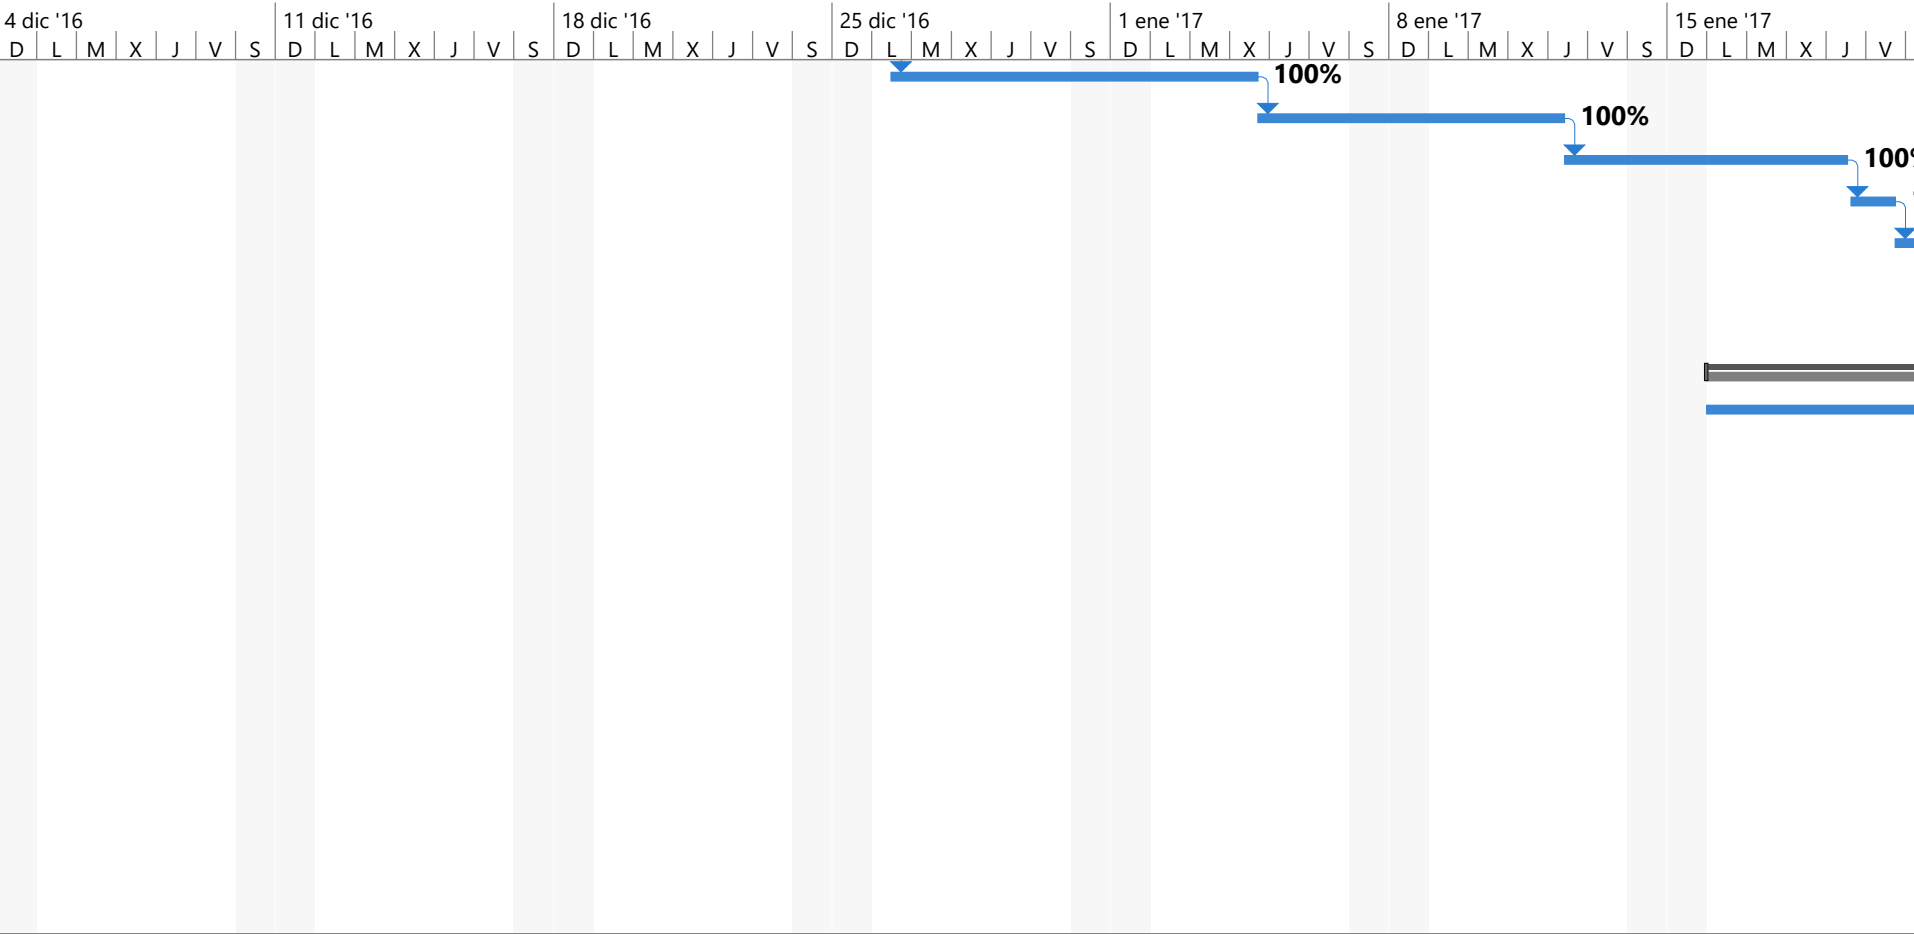

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

22 ene '17							29 ene '17							5 feb '17							12 feb '17							19 feb '17							26 feb '17							5 mar '17				
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J						


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

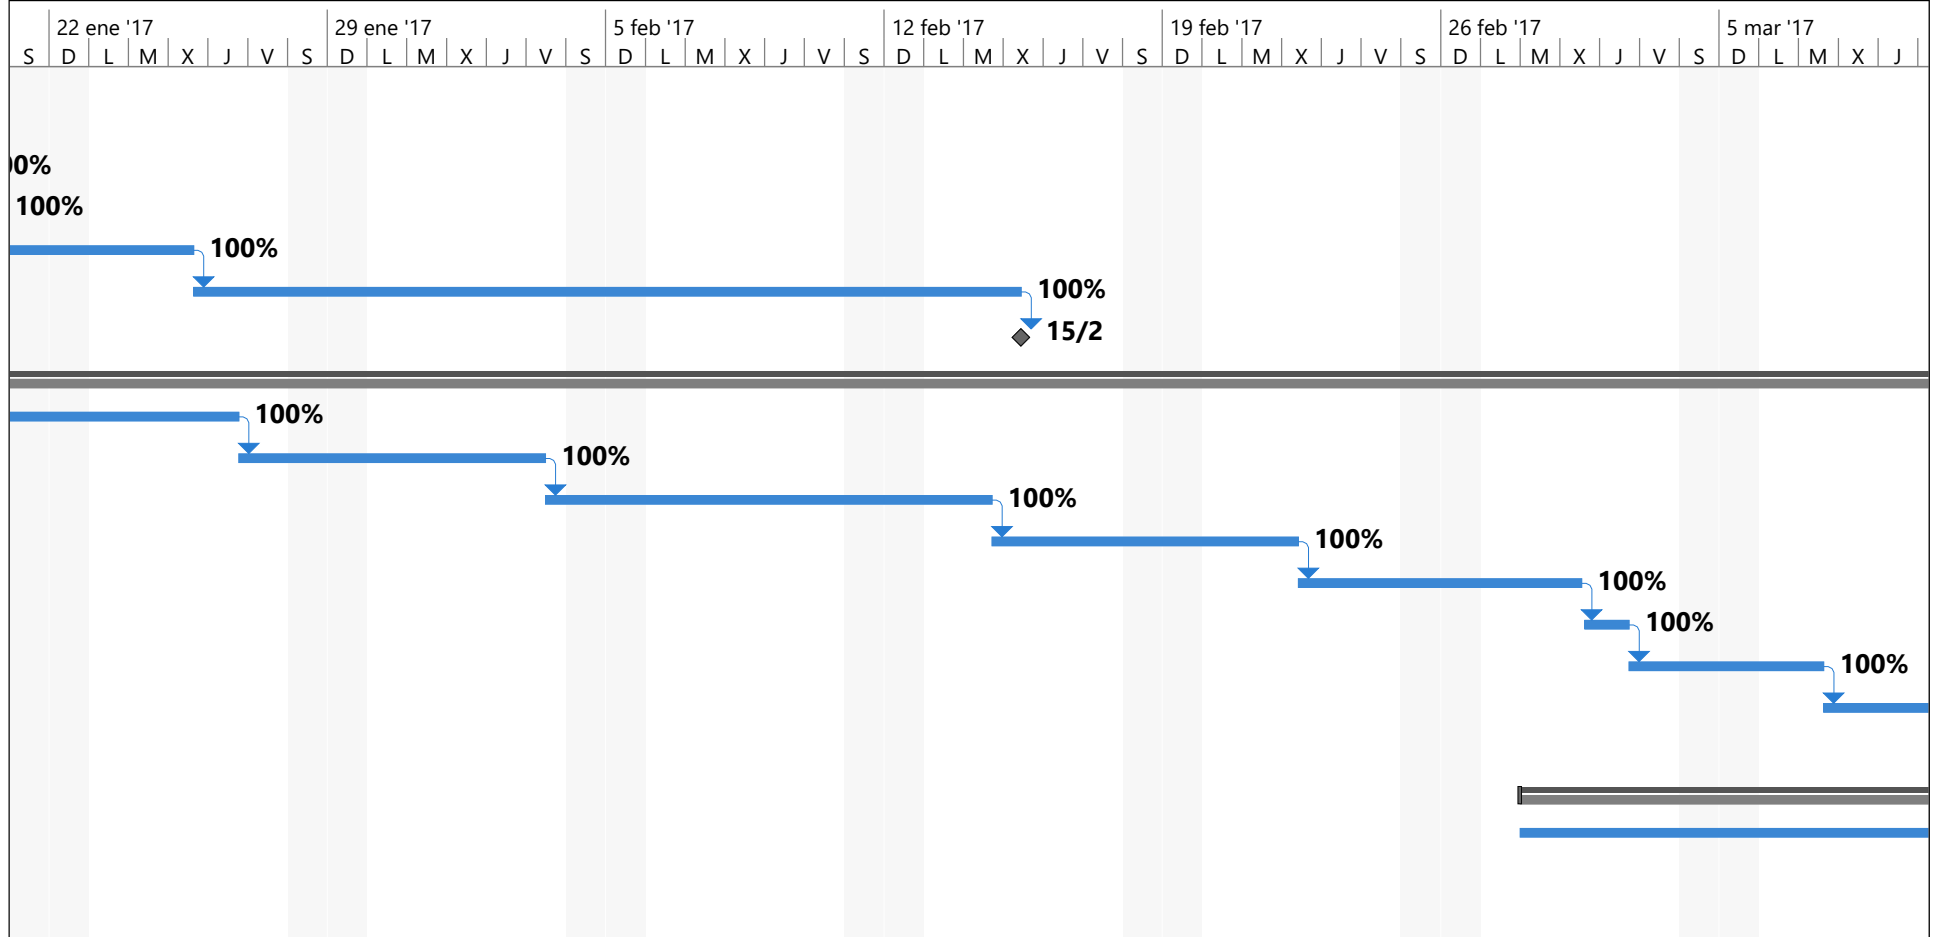

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101

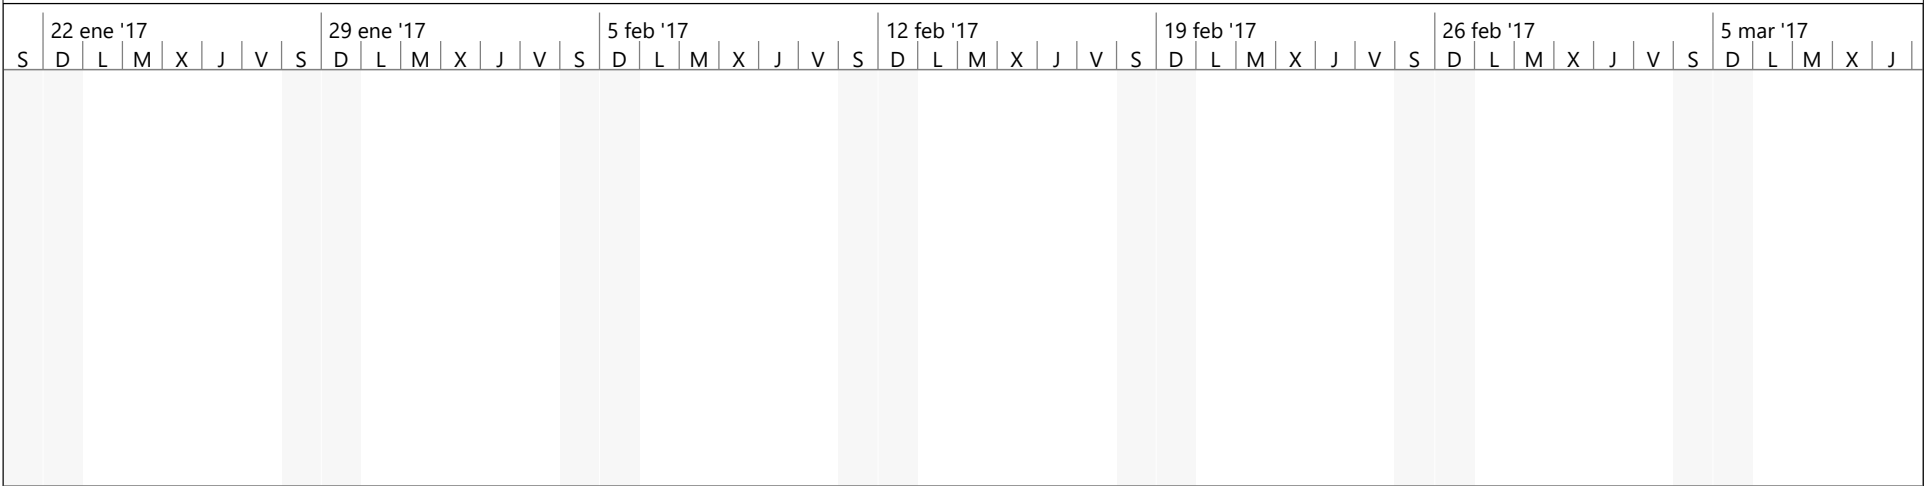

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo CESP101

12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17							2 abr '17							9 abr '17							16 abr '17							23 abr '17			
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X					

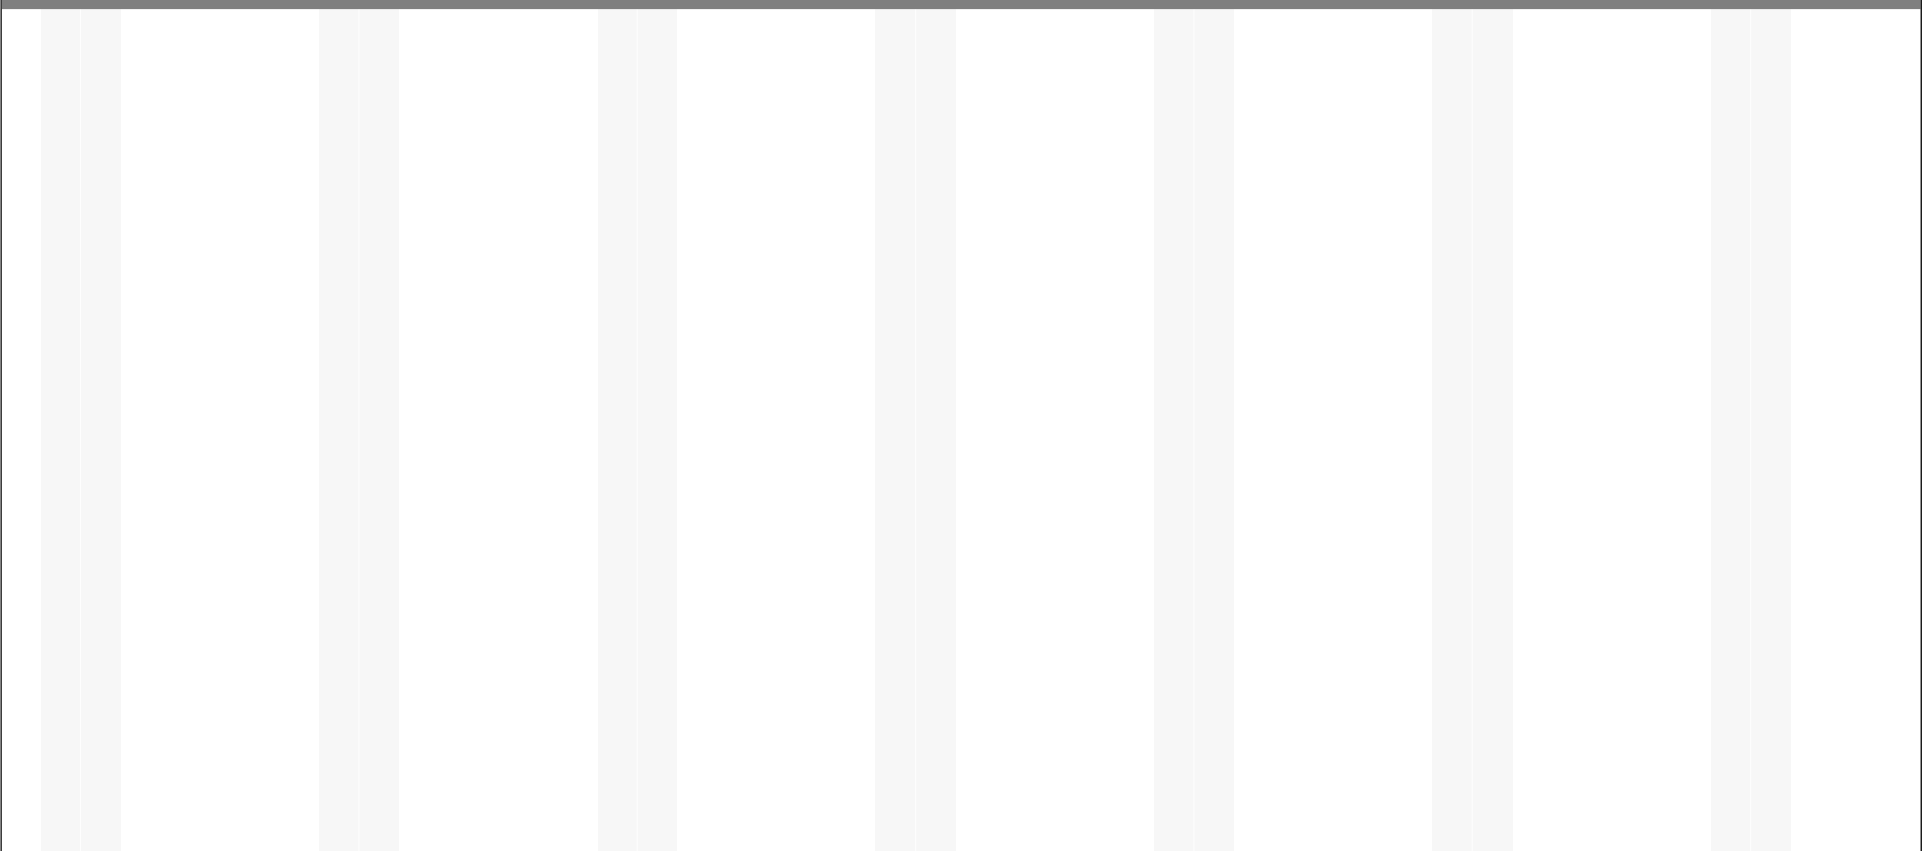


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

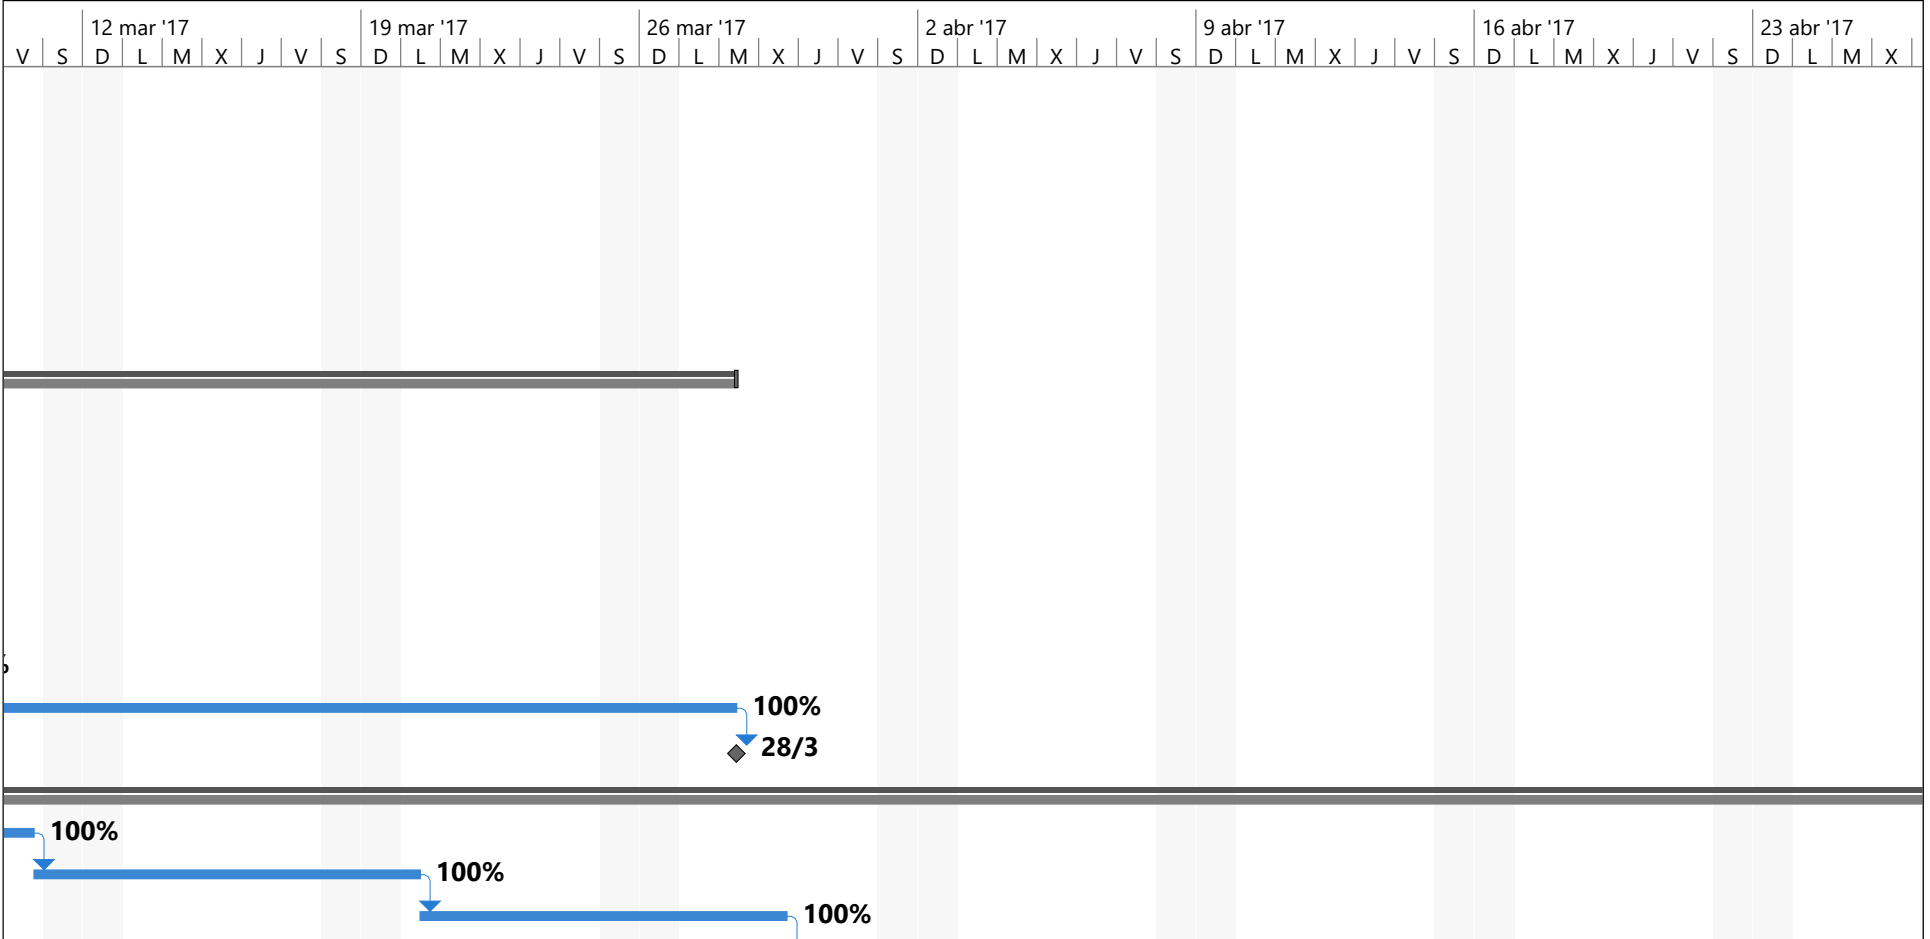


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

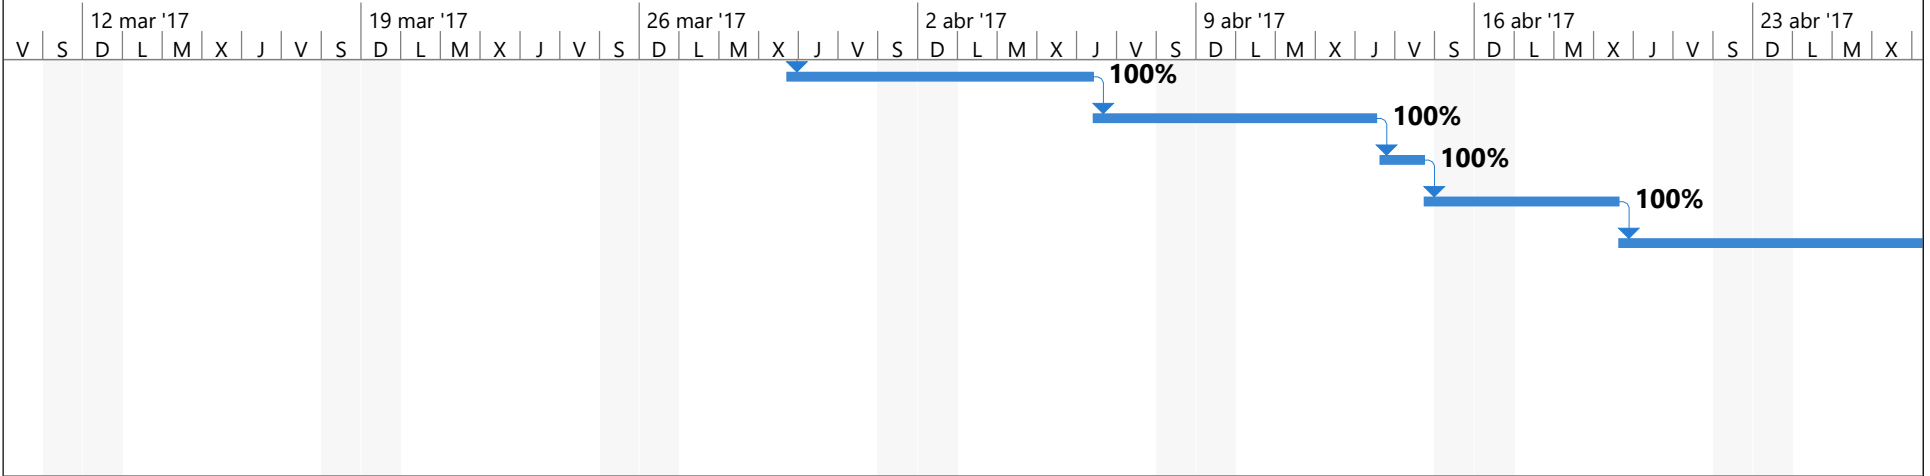


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

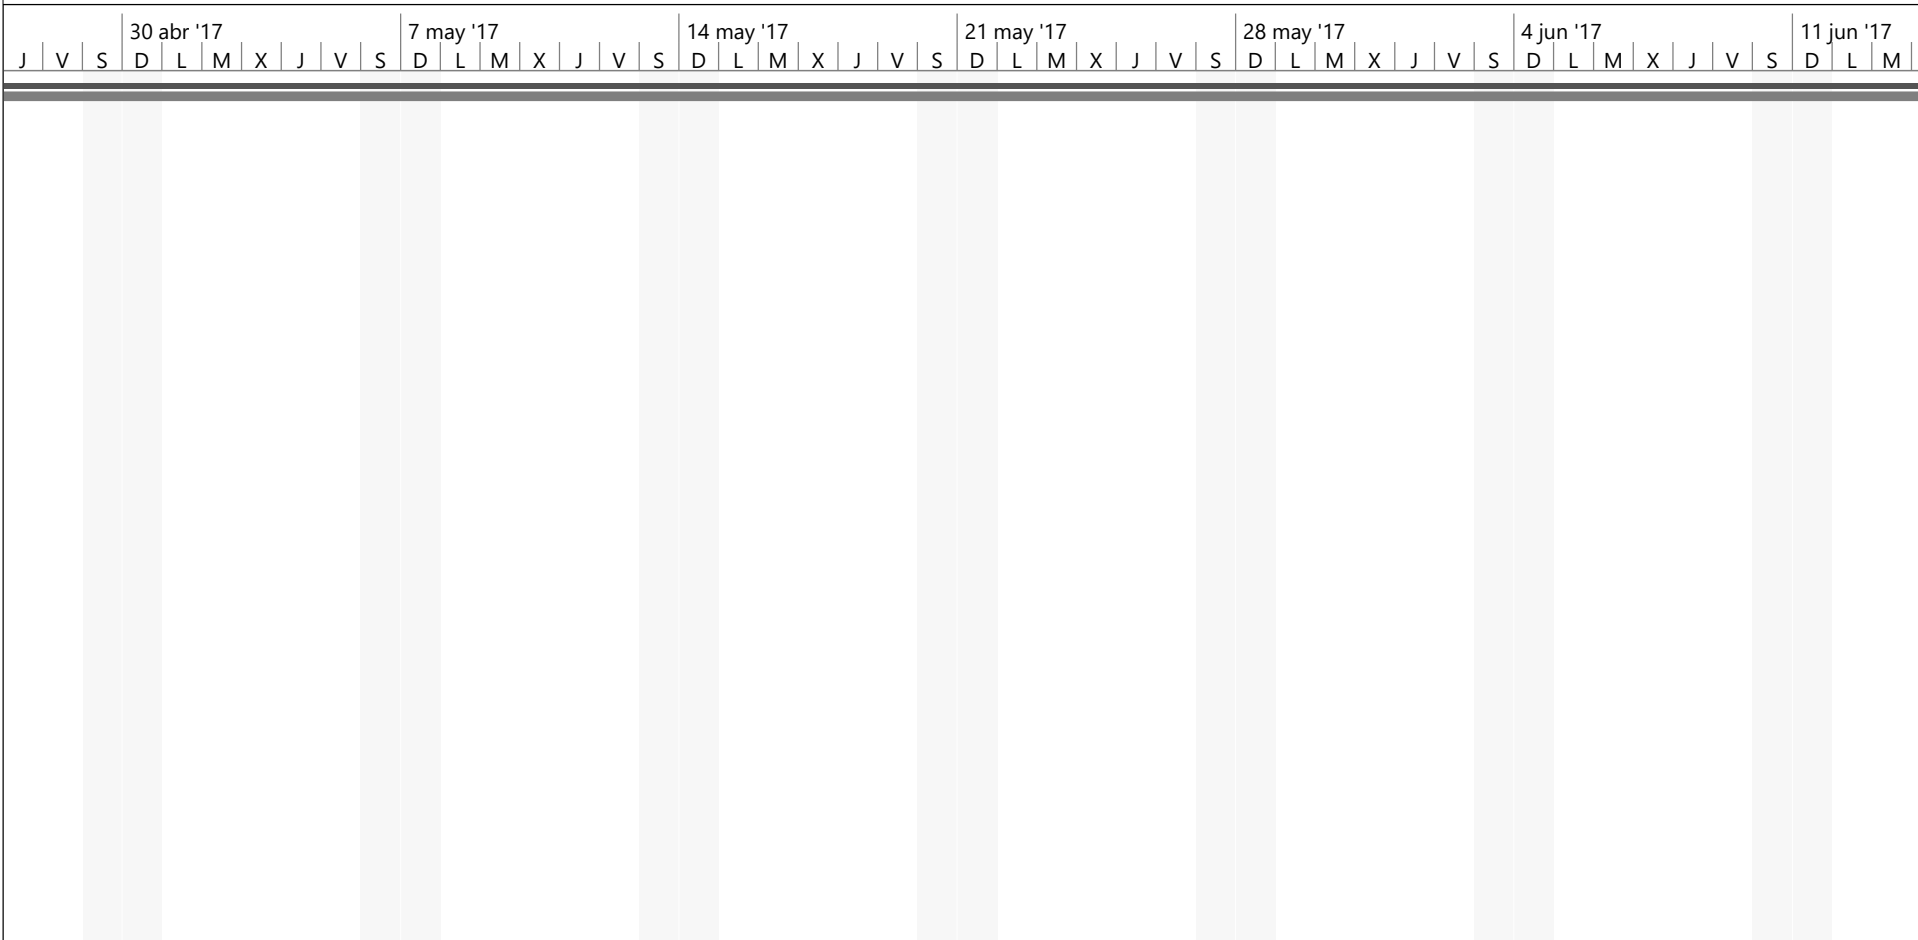

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Cronograma Modelo CESP101

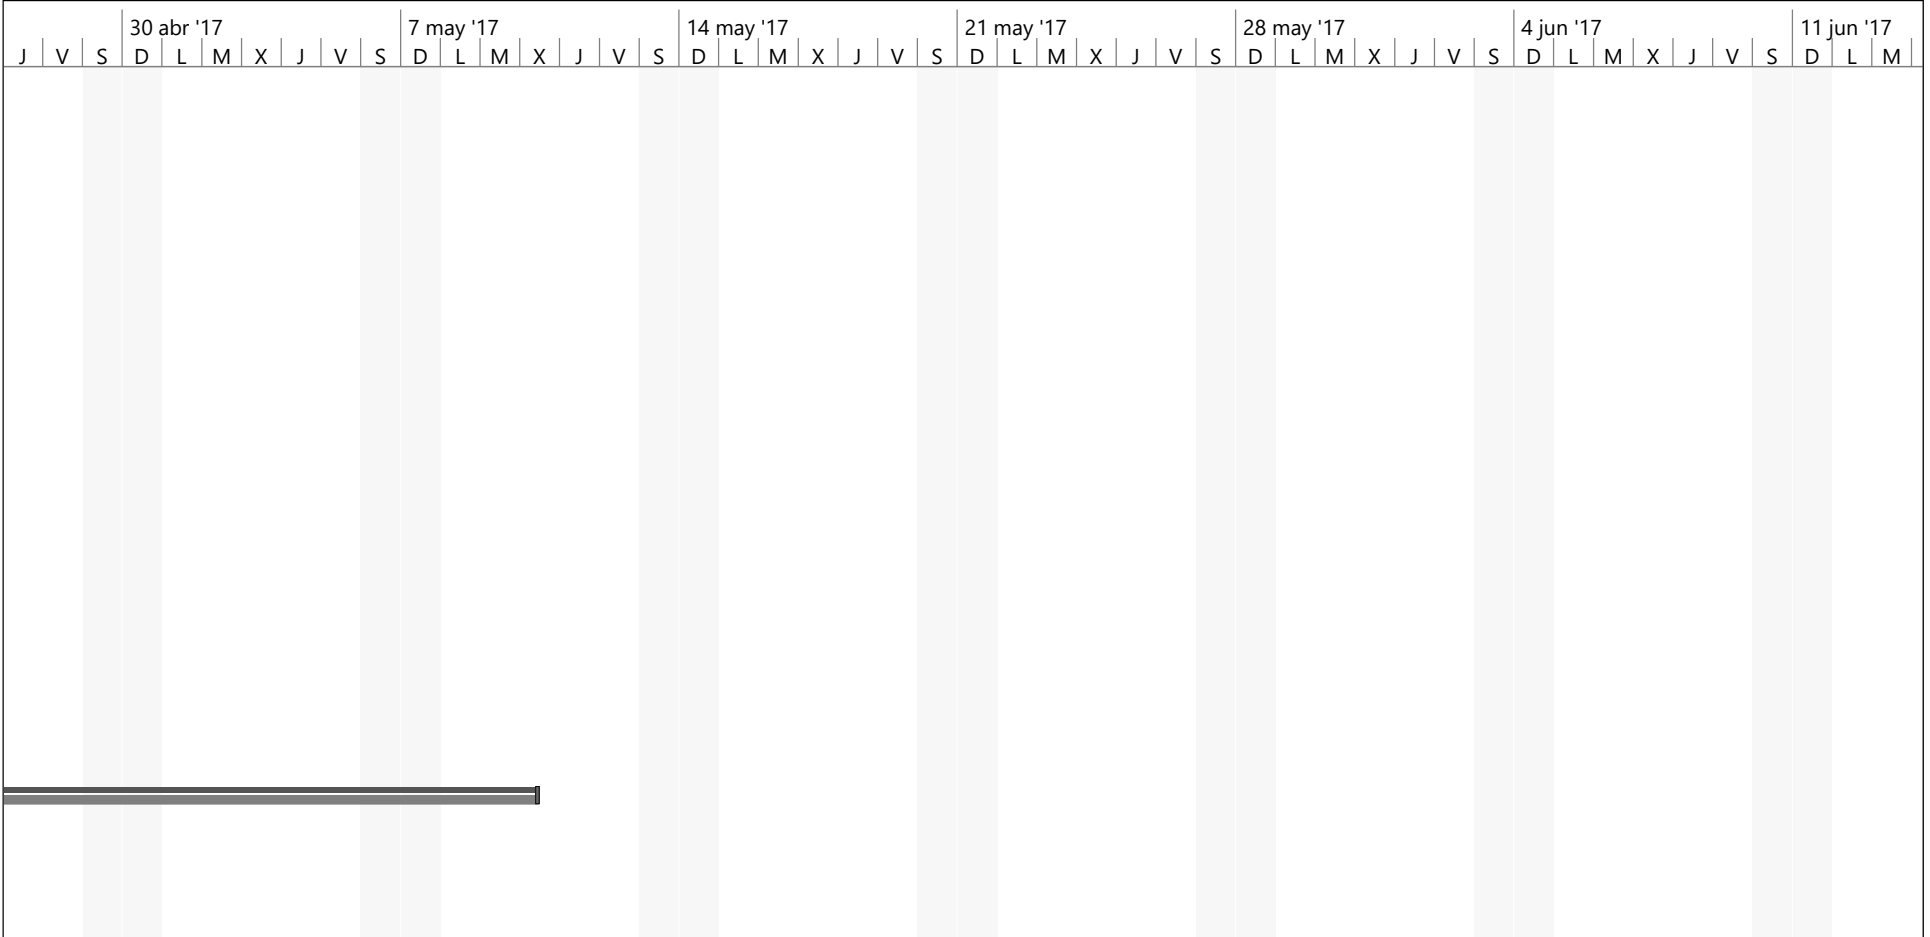

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

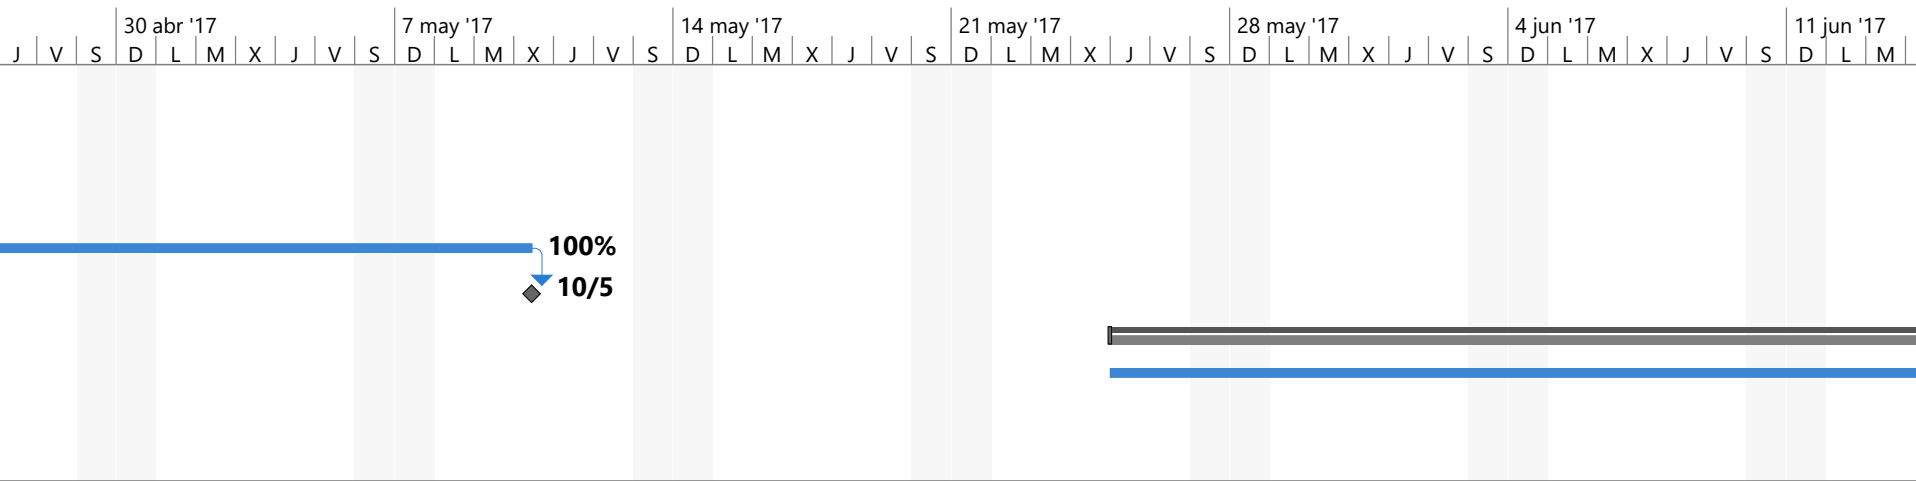


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

X	J	V	S	18 jun '17				25 jun '17				2 jul '17				9 jul '17				16 jul '17				23 jul '17				30 jul '17			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L		

100%

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo




Resumen



Fecha límite




Cronograma Modelo CESP101

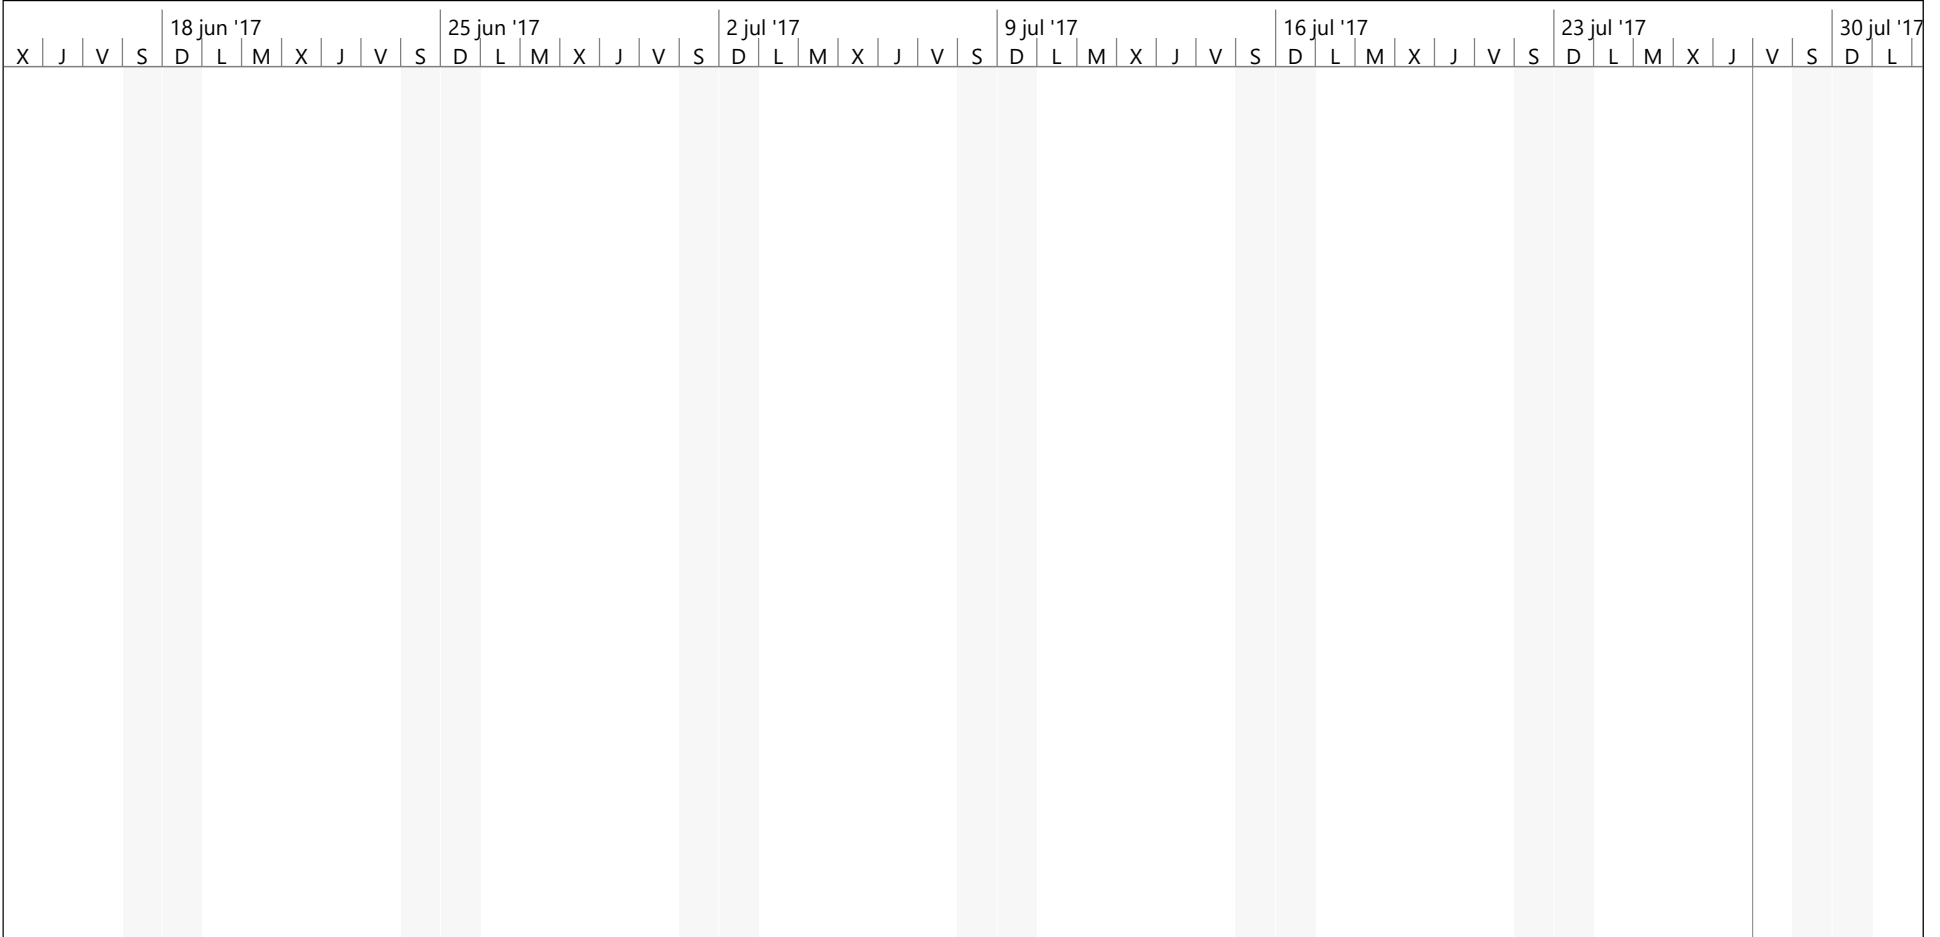

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo CESP101

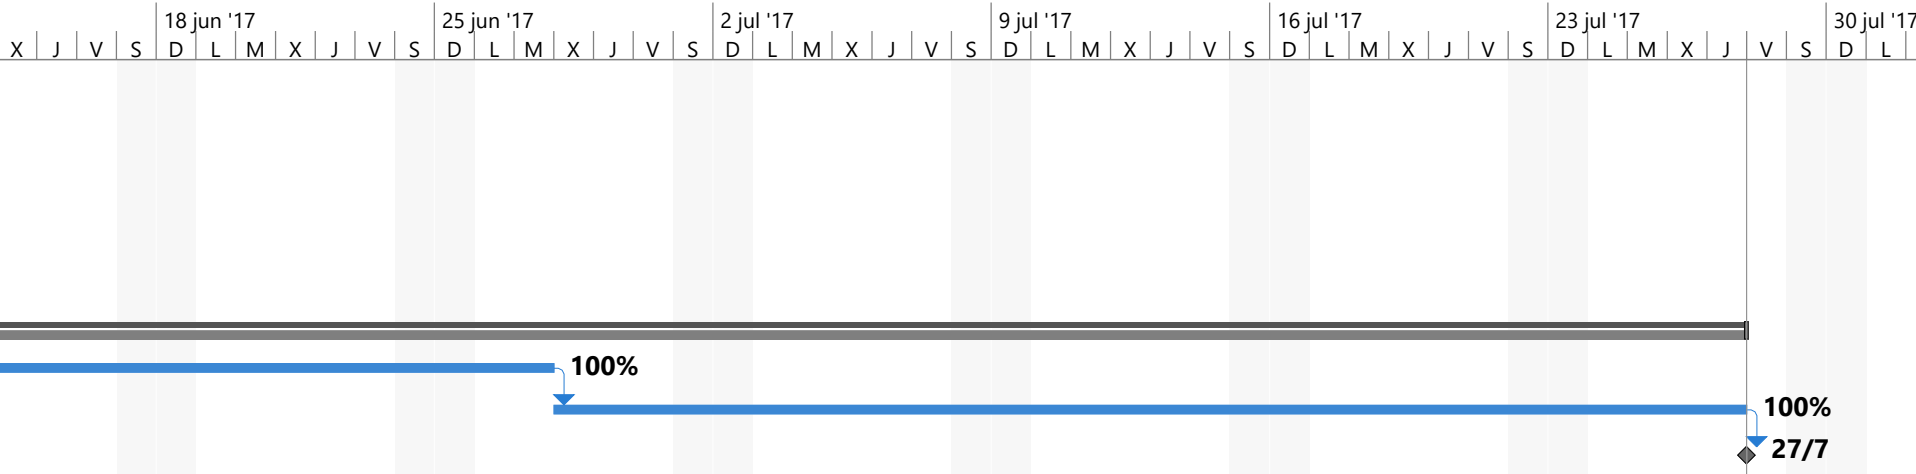

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
