

Cronograma Modelo NIBA101

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16											
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X								
1			Circuito NIBA101	285 días	lun 27/6/16	vie 28/7/17																										
2			Adquisiciones	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																										
3			Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16																										
4			Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16																										
5			Conductores MT/BT/	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16																										
6			Transformadores y Ec	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16																										
7			Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																										
8			Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16	7																									
9			Etapa 1	51.21 días	jue 27/10/16	vie 6/1/17																										
10			Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16																										
11			Armado de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16	10																									
12			Tendido de Conducto	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16	11																									
13			Montaje de Transfor	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16	12																									
14			Instalación de Lumina	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16	13																									
15			Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16	14																									
16			Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16	15																									
17			Normalización de Sun	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17	16																									
18			Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17	17																									
19			Etapa 2	93 días	jue 1/12/16	lun 10/4/17																										
20			Izaje de Postes	10 días	jue 1/12/16	mié 14/12/16																										
21			Armado de Estructur	10 días	jue 15/12/16	mié 28/12/16	20																									

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16							
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X				
22			Tendido de Conducto	13 días	jue 29/12/16	lun 16/1/17	21																					
23			Montaje de Transform	10 días	mar 17/1/17	lun 30/1/17	22																					
24			Instalación de Lumin	10 días	mar 31/1/17	lun 13/2/17	23																					
25			Correcciones	10 días	mar 14/2/17	lun 27/2/17	24																					
26			Remociones	10 días	mar 28/2/17	lun 13/3/17	25																					
27			Normalización de Sur	20 días	mar 14/3/17	lun 10/4/17	26																					
28			Evaluación	0 días	lun 10/4/17	lun 10/4/17	27																					
29			Etapa 3	68 días	mié 22/2/17	vie 26/5/17																						
30			Izaje de Postes	7 días	mié 22/2/17	jue 2/3/17																						
31			Armado de Estructur	7 días	vie 3/3/17	lun 13/3/17	30																					
32			Tendido de Conducto	10 días	mar 14/3/17	lun 27/3/17	31																					
33			Montaje de Transform	6 días	mar 28/3/17	mar 4/4/17	32																					
34			Instalación de Lumin	7 días	mié 5/4/17	jue 13/4/17	33																					
35			Correcciones	8 días	vie 14/4/17	mar 25/4/17	34																					
36			Remociones	8 días	mié 26/4/17	vie 5/5/17	35																					
37			Normalización de Sur	15 días	lun 8/5/17	vie 26/5/17	36																					
38			Evaluación	0 días	vie 26/5/17	vie 26/5/17	37																					
39			Cierres Técnico y Admin	46 días	vie 26/5/17	vie 28/7/17																						
40			Cierre Técnico	23 días	vie 26/5/17	mar 27/6/17																						
41			Cierre Administrativo	22 días	mié 28/6/17	jue 27/7/17	40																					
42			Evaluación	0 días	jue 27/7/17	jue 27/7/17	41																					

- Tareas críticas solo fin
- División crítica solo duración
- Progreso de tarea crítica Línea base
- Tarea División de la línea base
- División Hito de línea base
- Progreso de tarea Hito
- Tarea manual Progreso del resumen
- solo el comienzo Resumen
- Resumen manual
- Resumen del proyecto
- Tareas externas
- Hito externo
- Tarea inactiva
- Hito inactivo
- Resumen inactivo
- Fecha límite

Cronograma Modelo NIBA101


17 jul '16
24 jul '16
31 jul '16
7 ago '16
14 ago '16
21 ago '16
28 ago '16

J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X

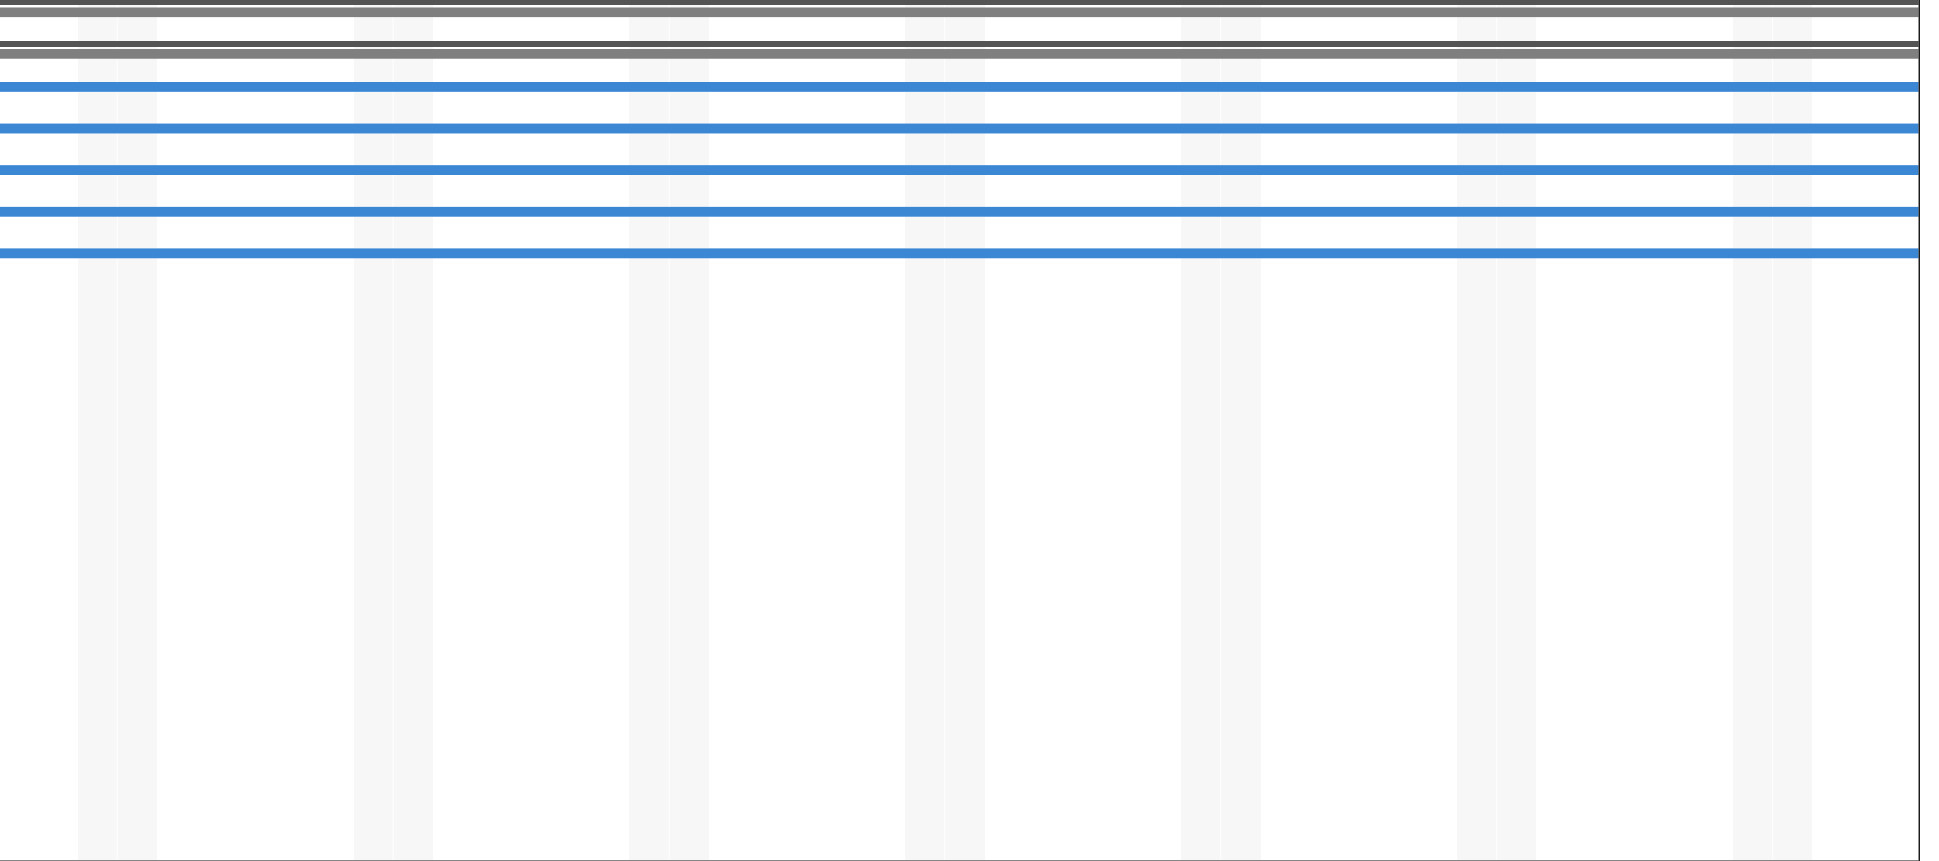

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

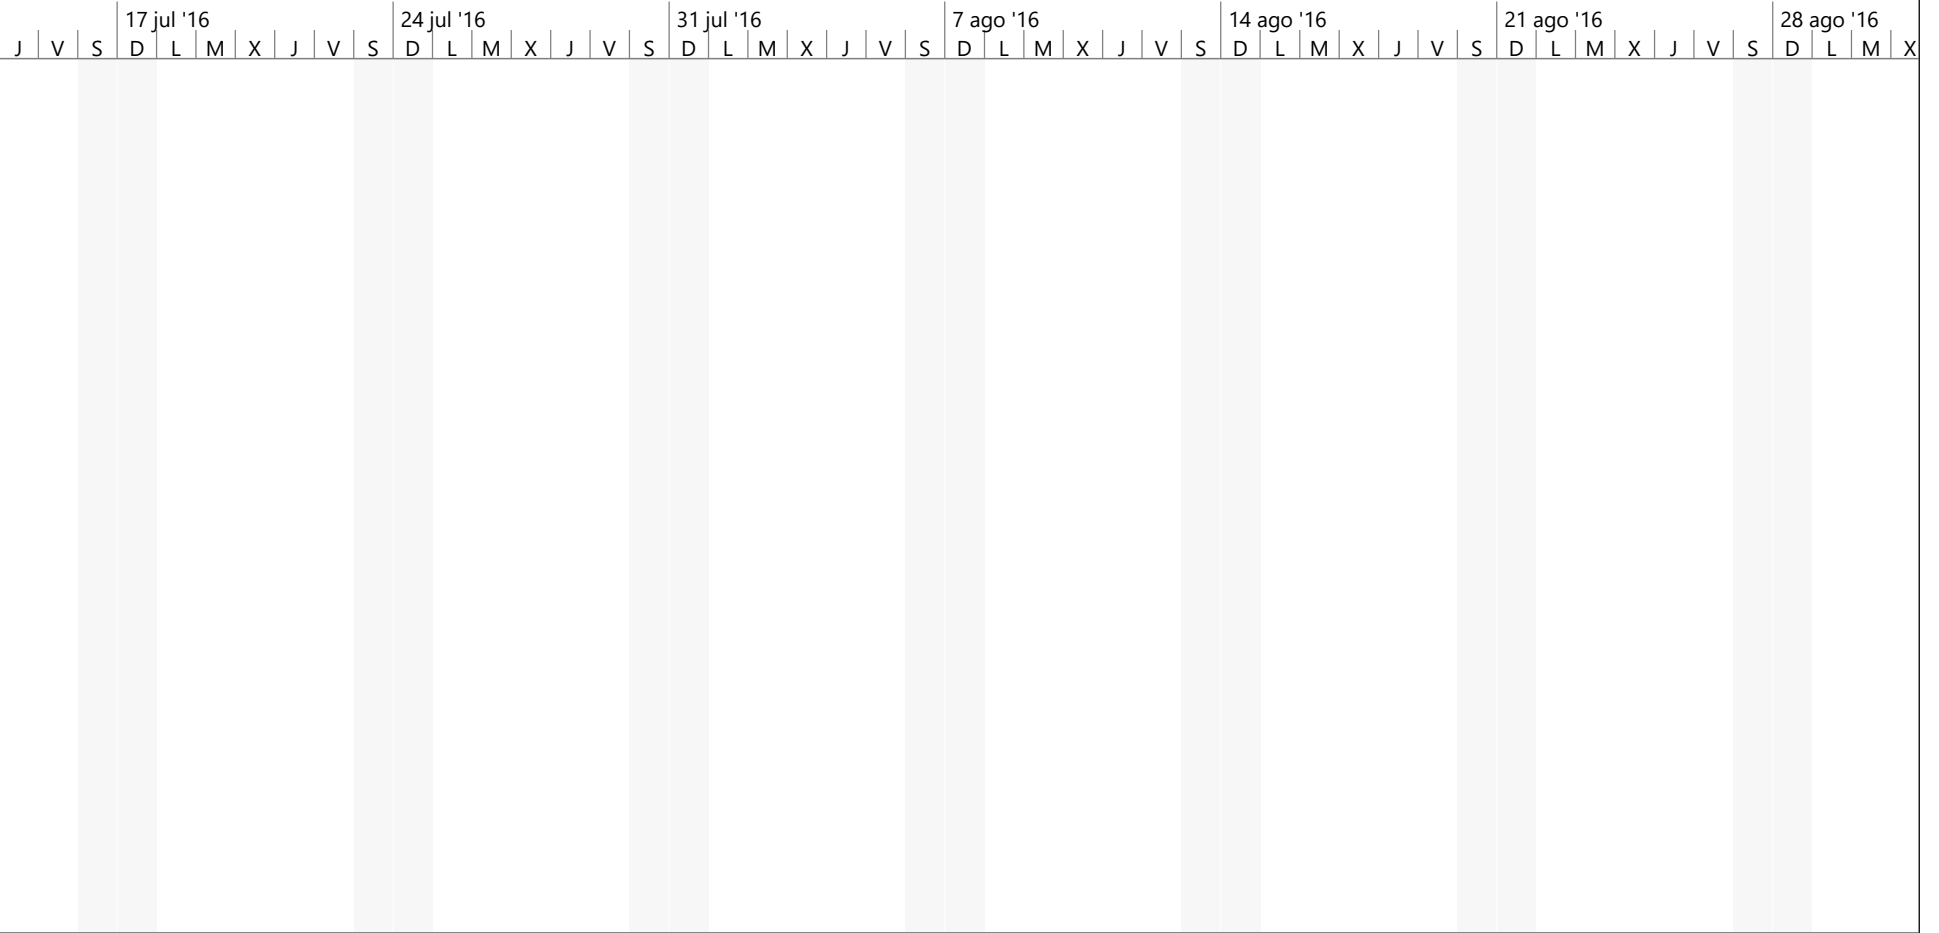

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

4 sep '16
11 sep '16
18 sep '16
25 sep '16
2 oct '16
9 oct '16
16 oct '16

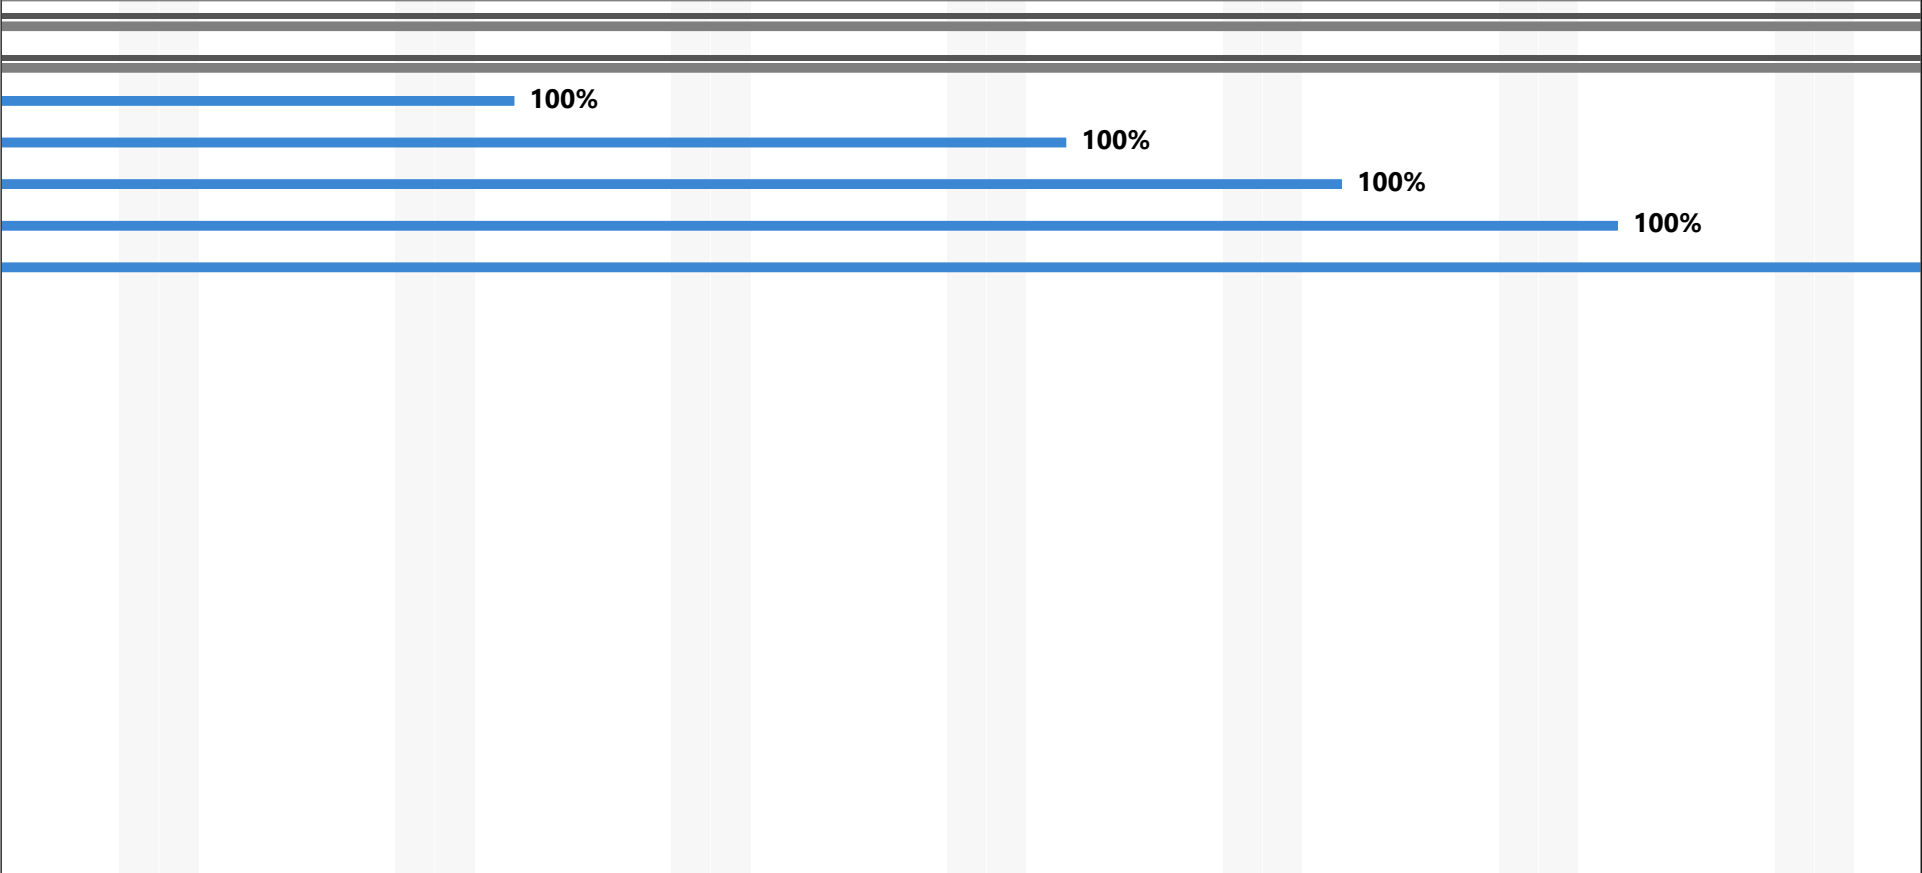

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

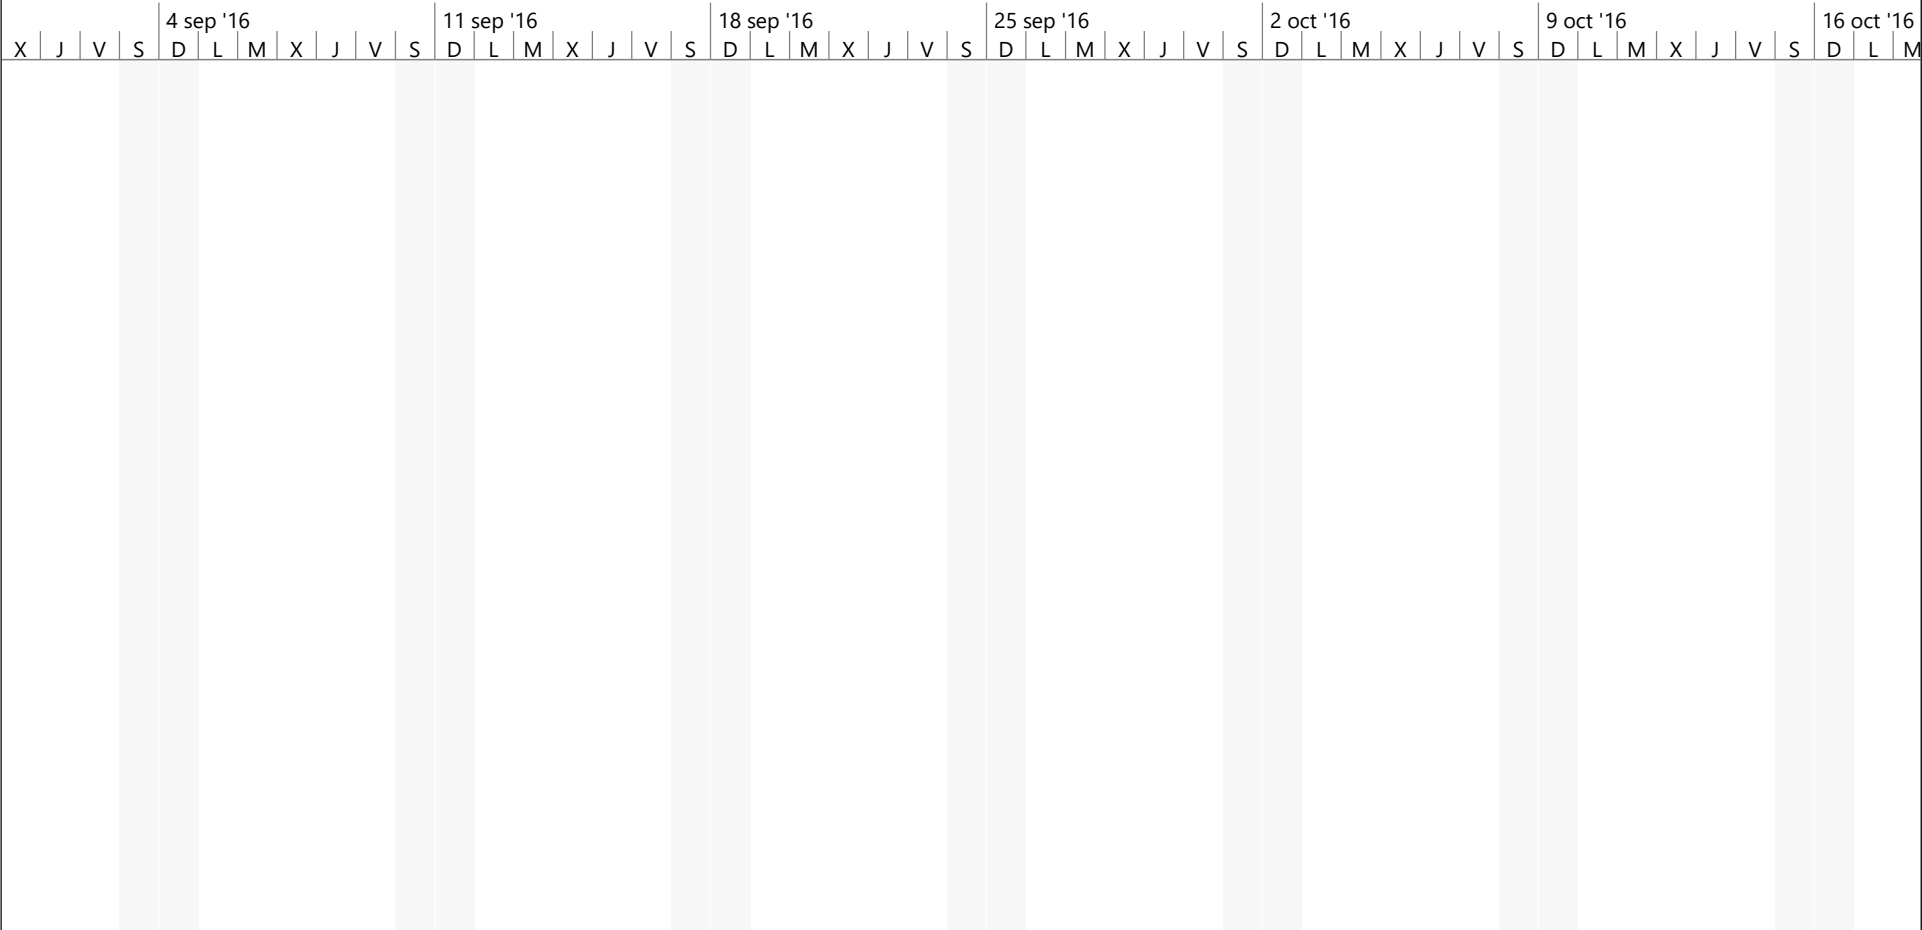

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

16 M X J V S 23 oct '16 D L M X J V S 30 oct '16 D L M X J V S 6 nov '16 D L M X J V S 13 nov '16 D L M X J V S 20 nov '16 D L M X J V S 27 nov '16 D L M X J V S 4 dic '16 D L

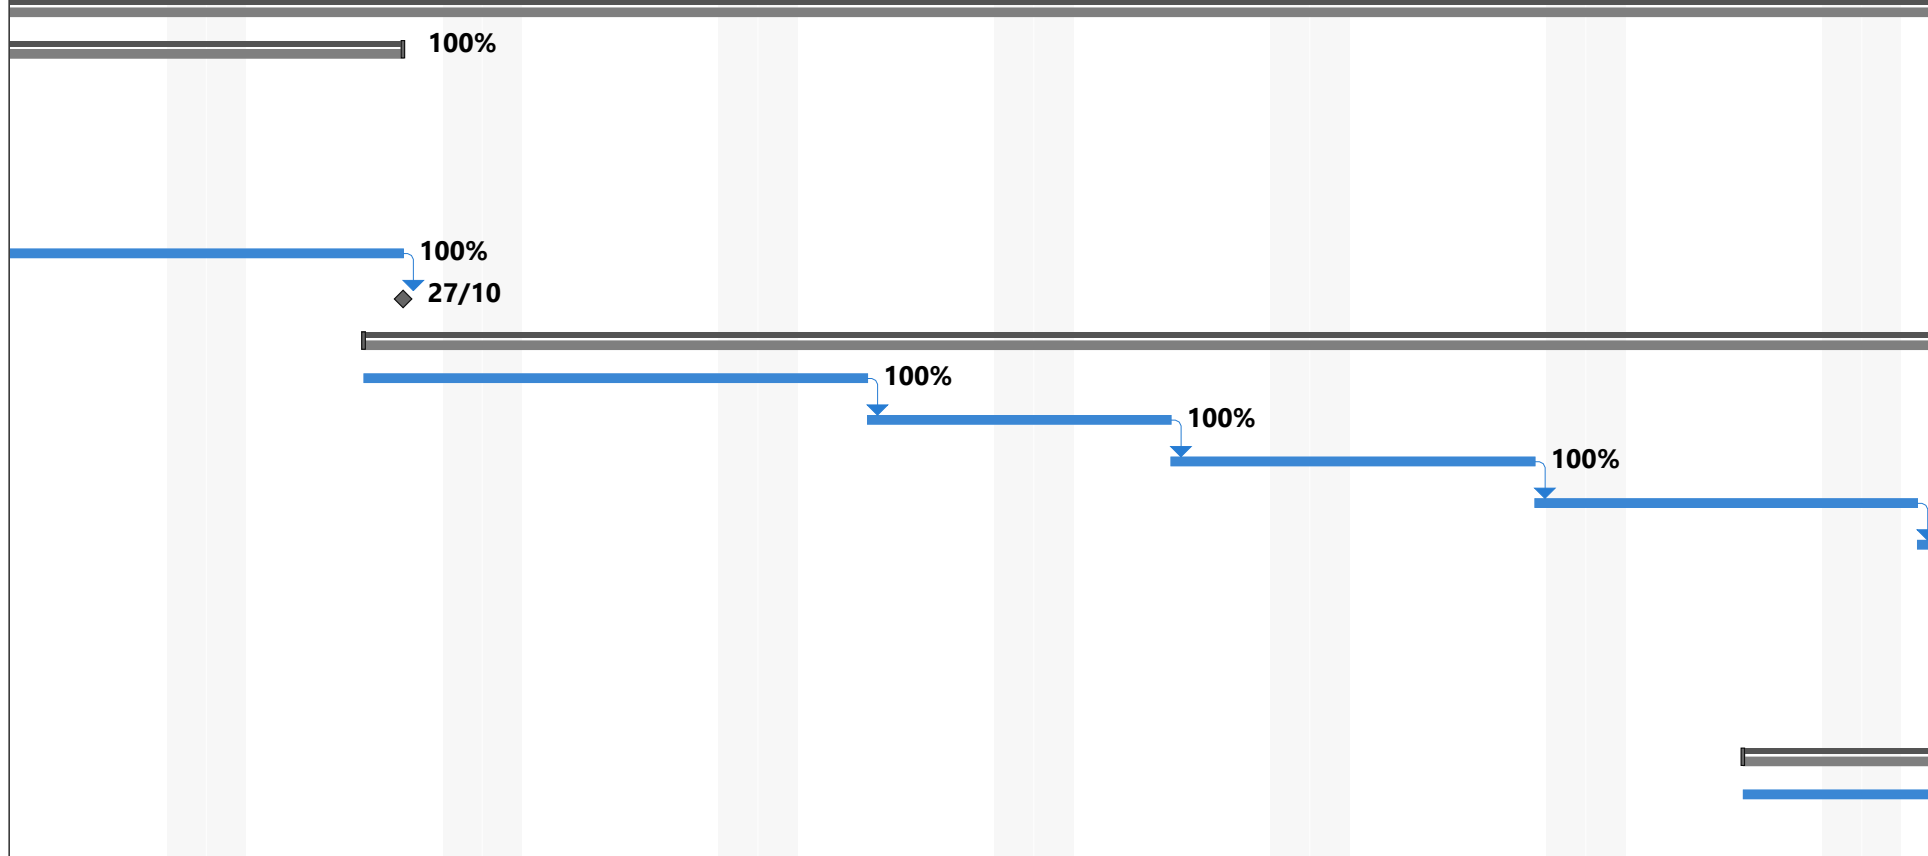

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

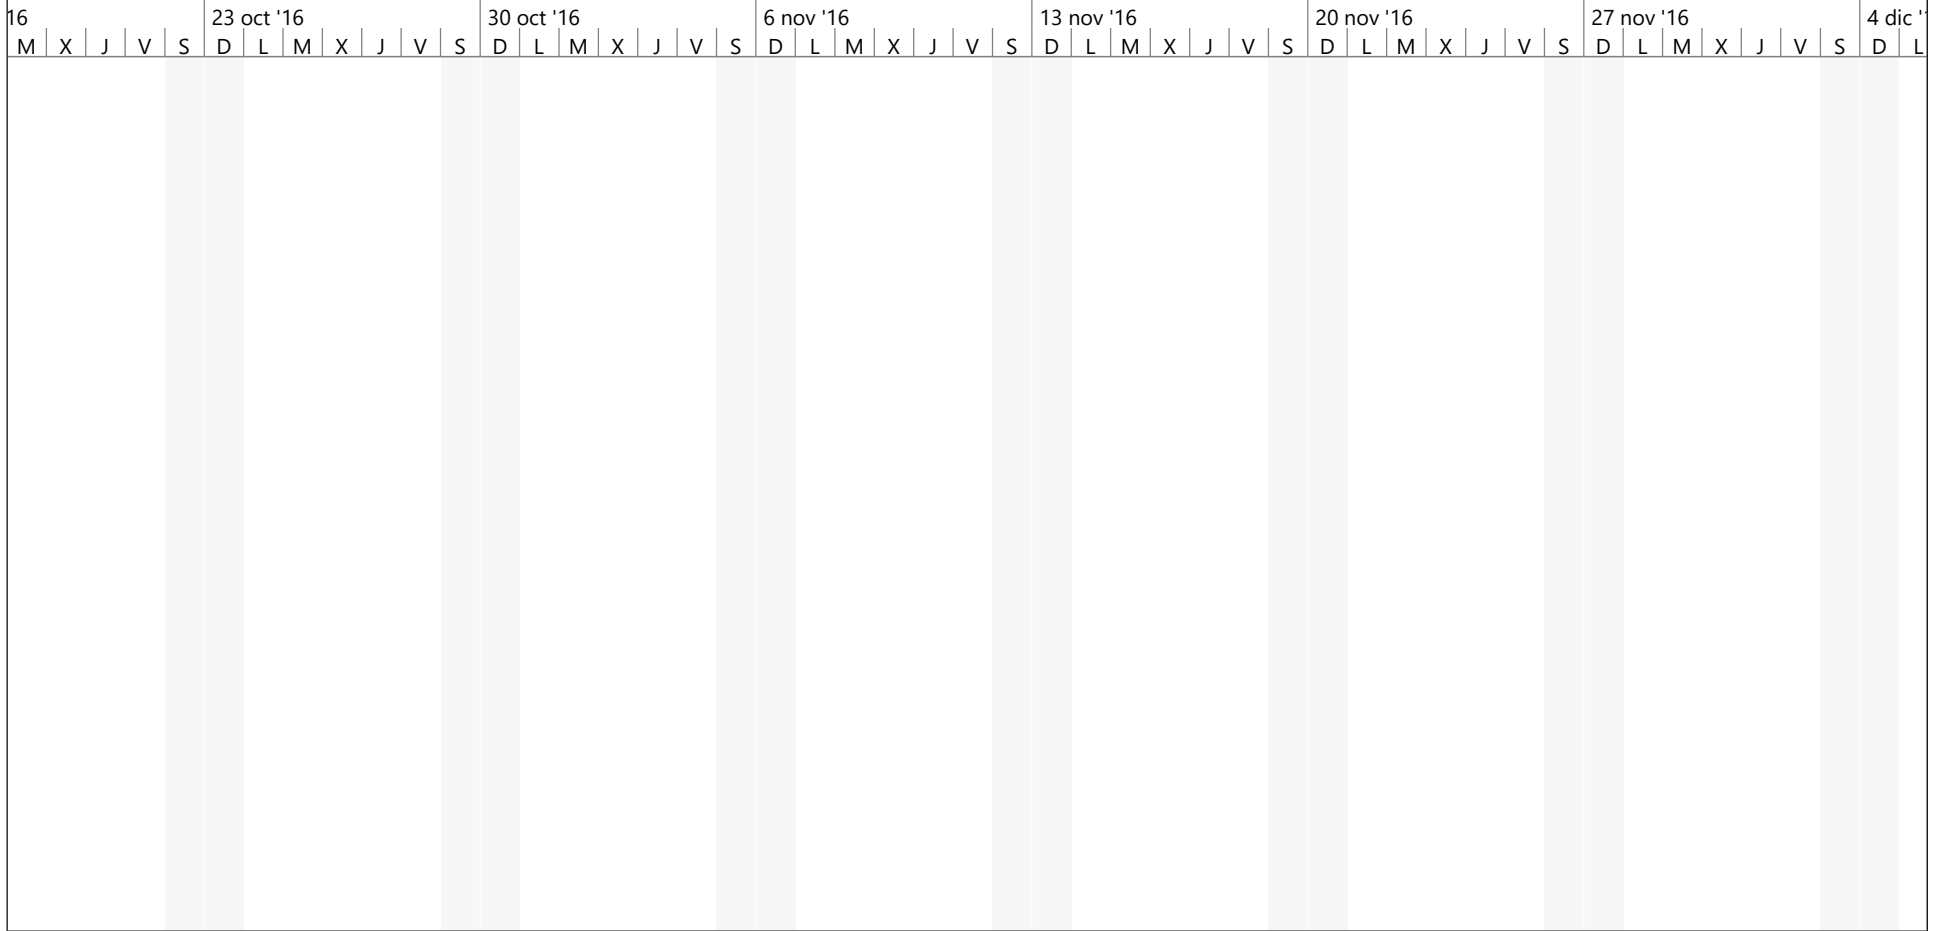

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

c '16 | L | M | X | J | V | S | 11 dic '16 | D | L | M | X | J | V | S | 18 dic '16 | D | L | M | X | J | V | S | 25 dic '16 | D | L | M | X | J | V | S | 1 ene '17 | D | L | M | X | J | V | S | 8 ene '17 | D | L | M | X | J | V | S | 15 ene '17 | D | L | M | X | J | V | S | 22 ene '17 | D

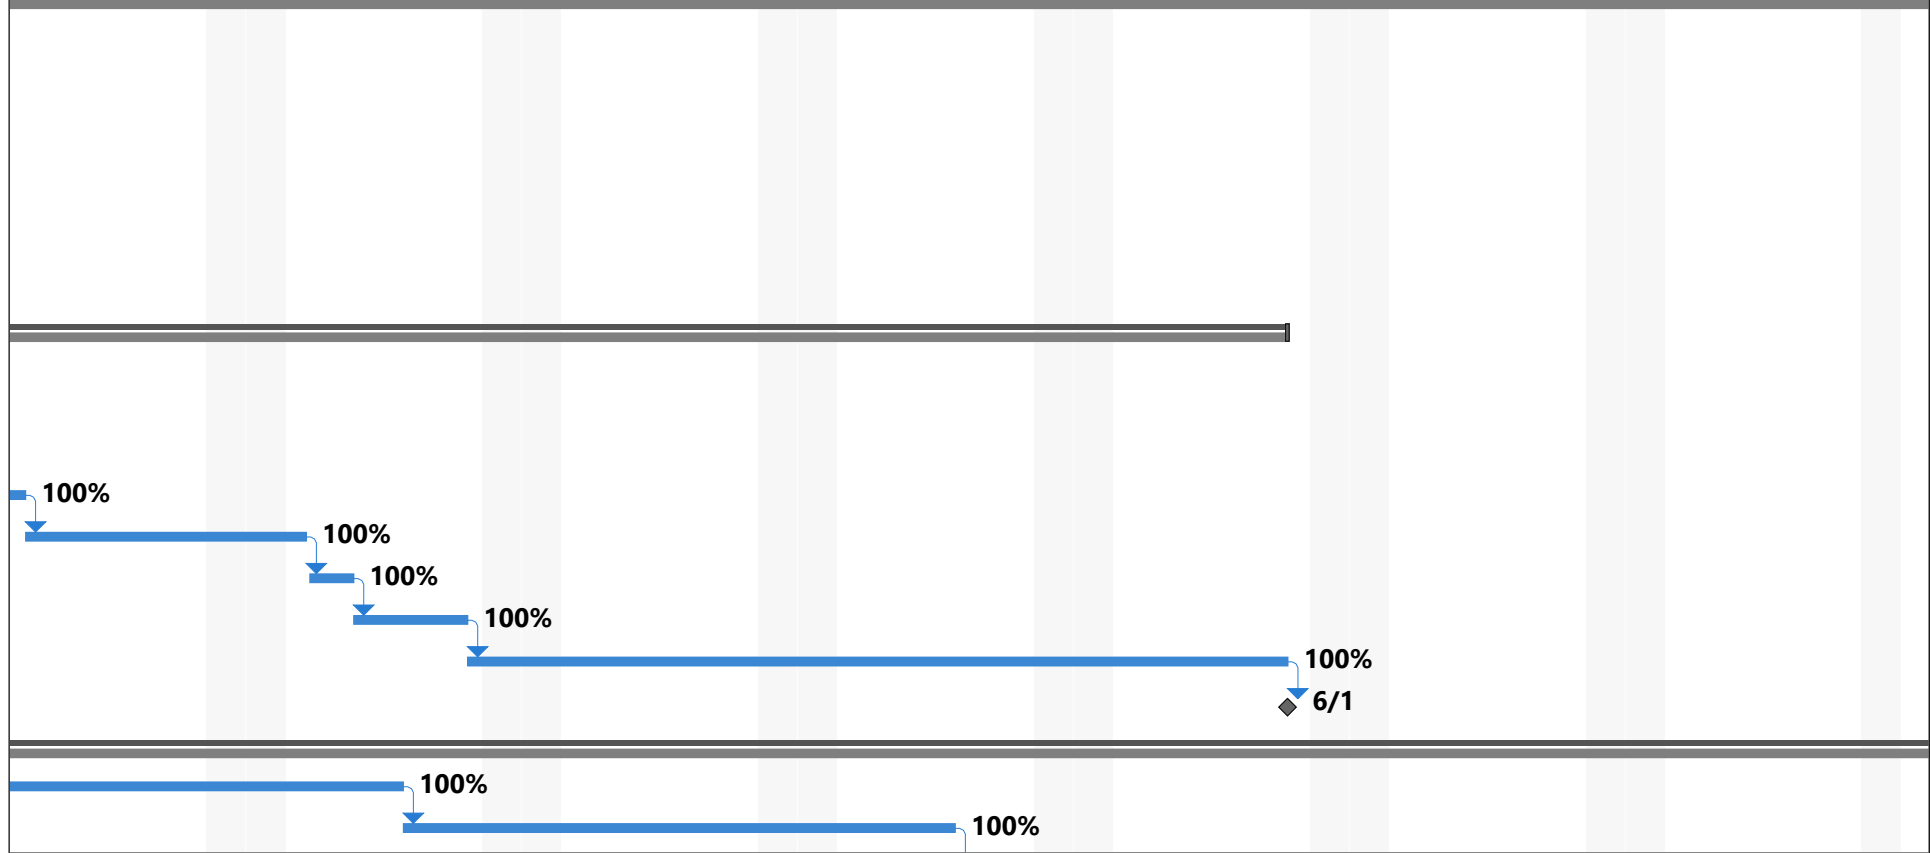

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101

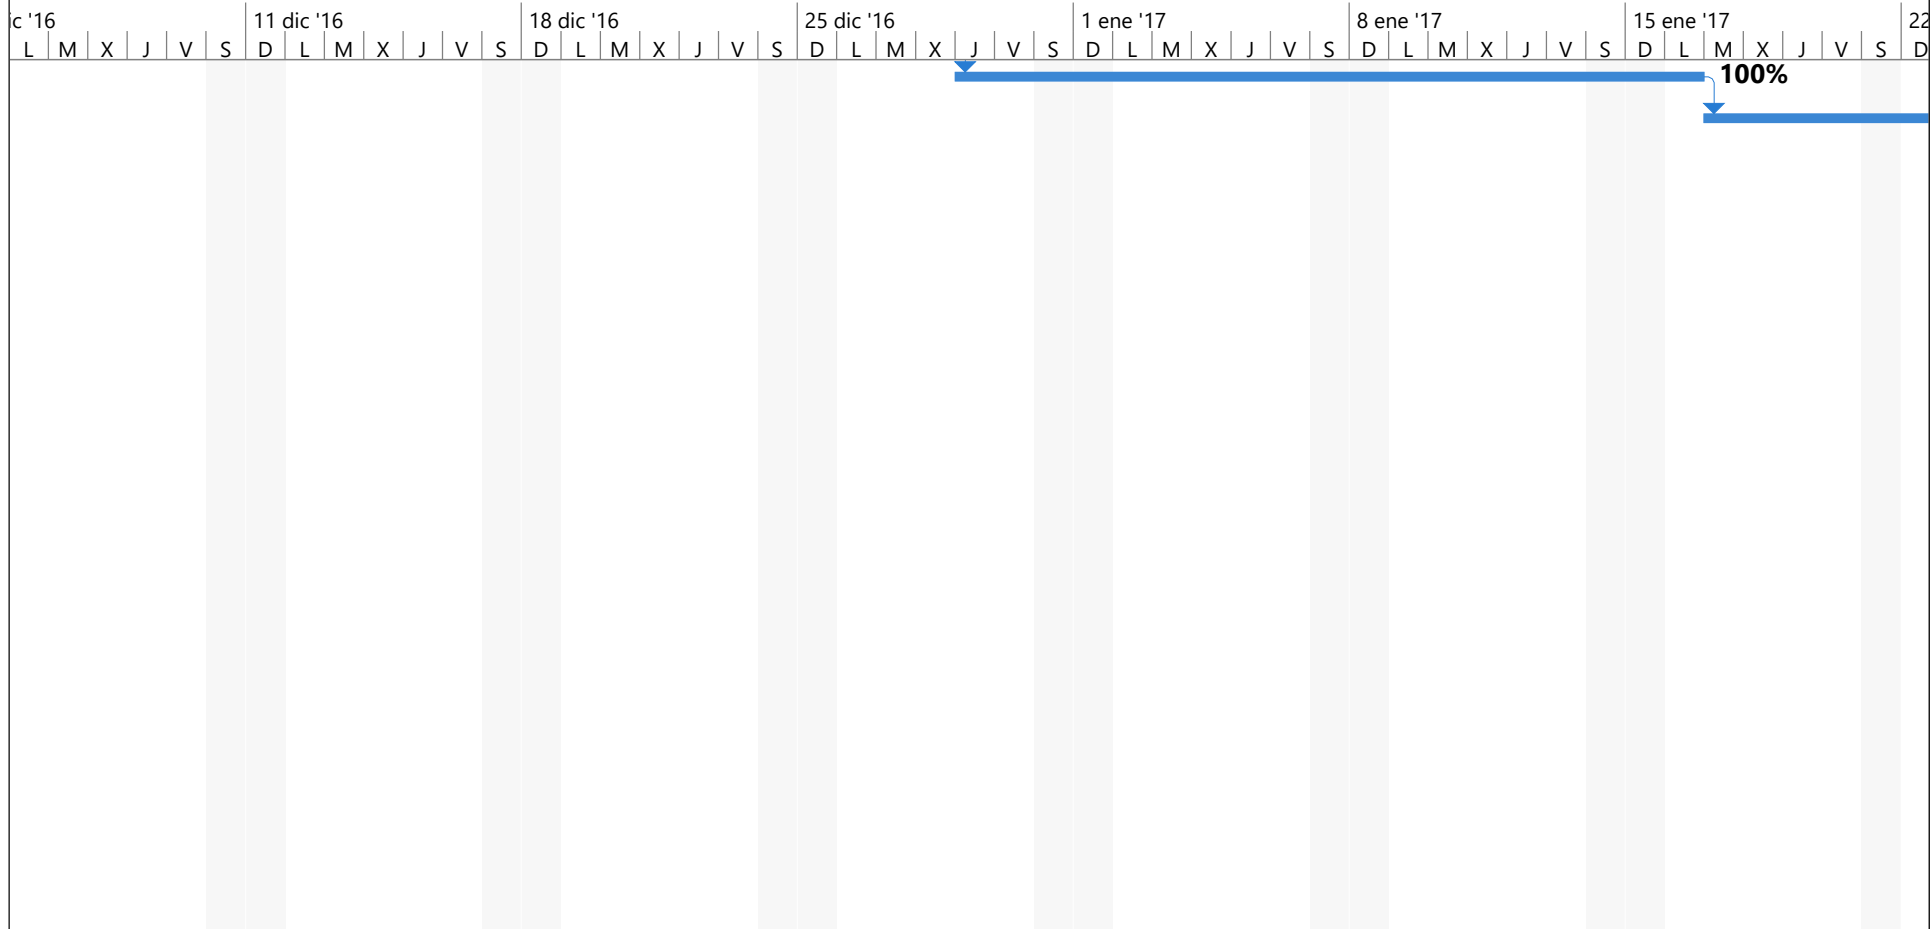

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

22 ene '17 | 29 ene '17 | 5 feb '17 | 12 feb '17 | 19 feb '17 | 26 feb '17 | 5 mar '17
 D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101

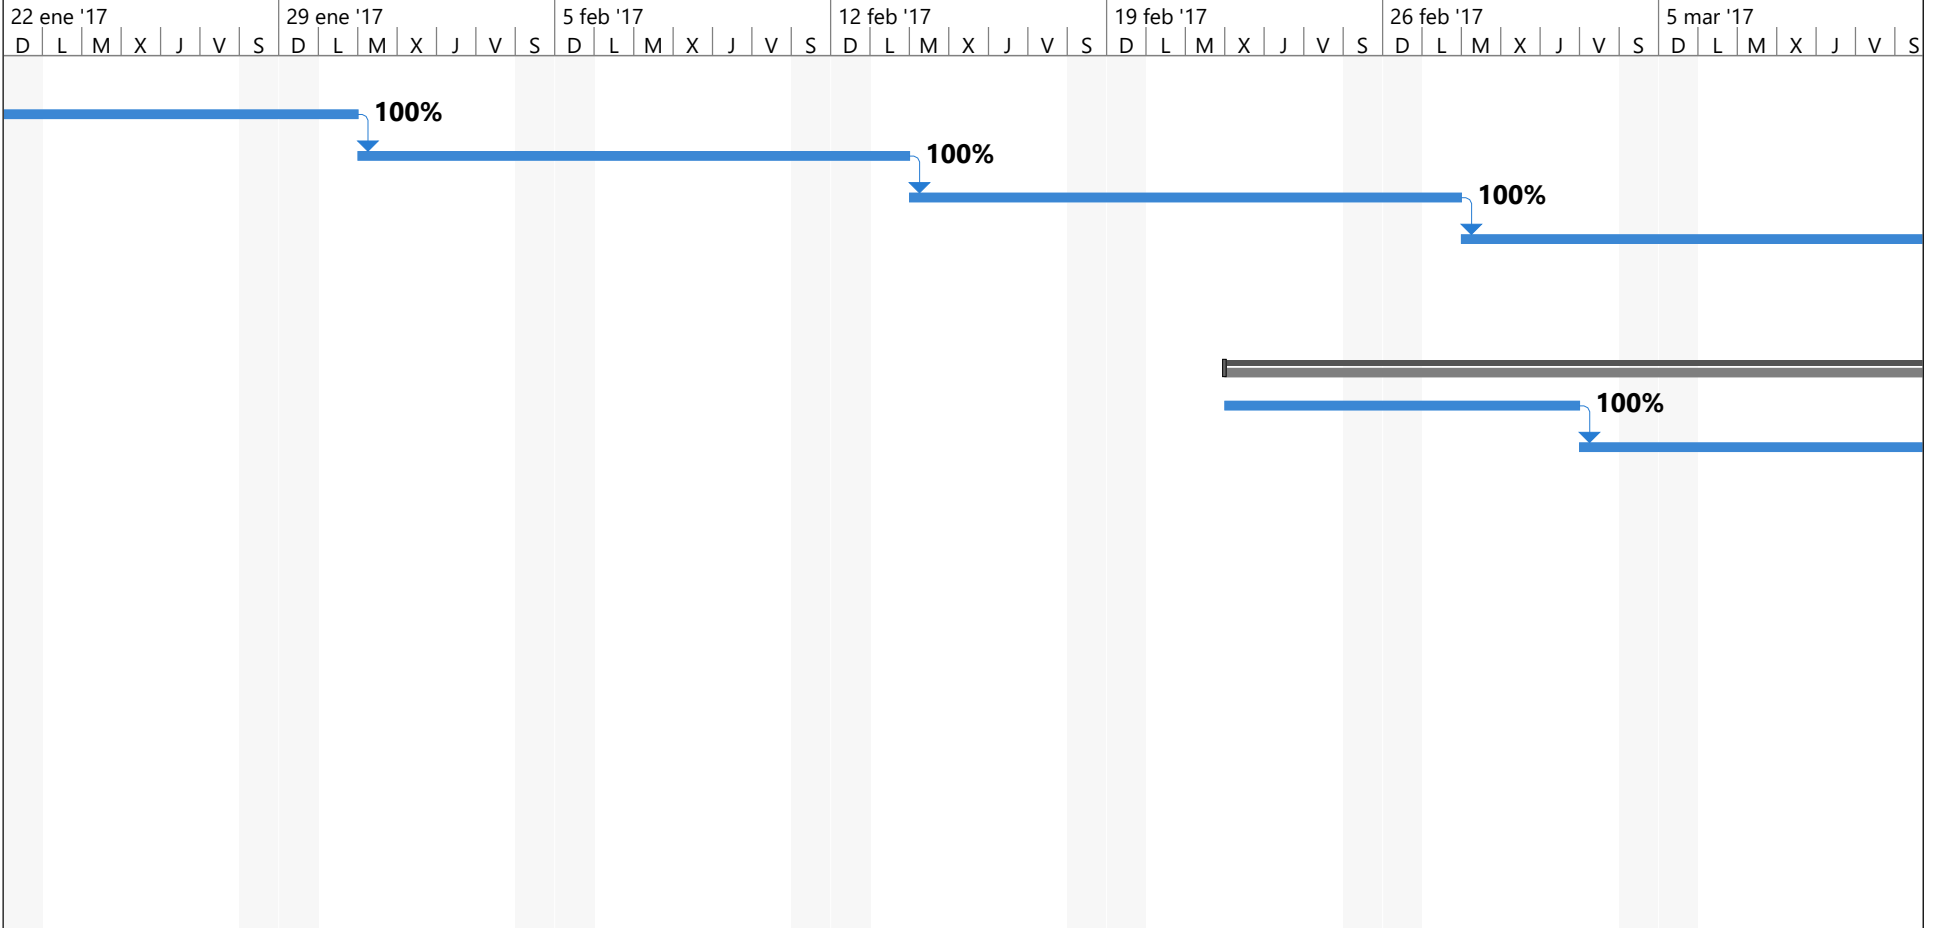

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

12 mar '17							19 mar '17							26 mar '17							2 abr '17							9 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA101

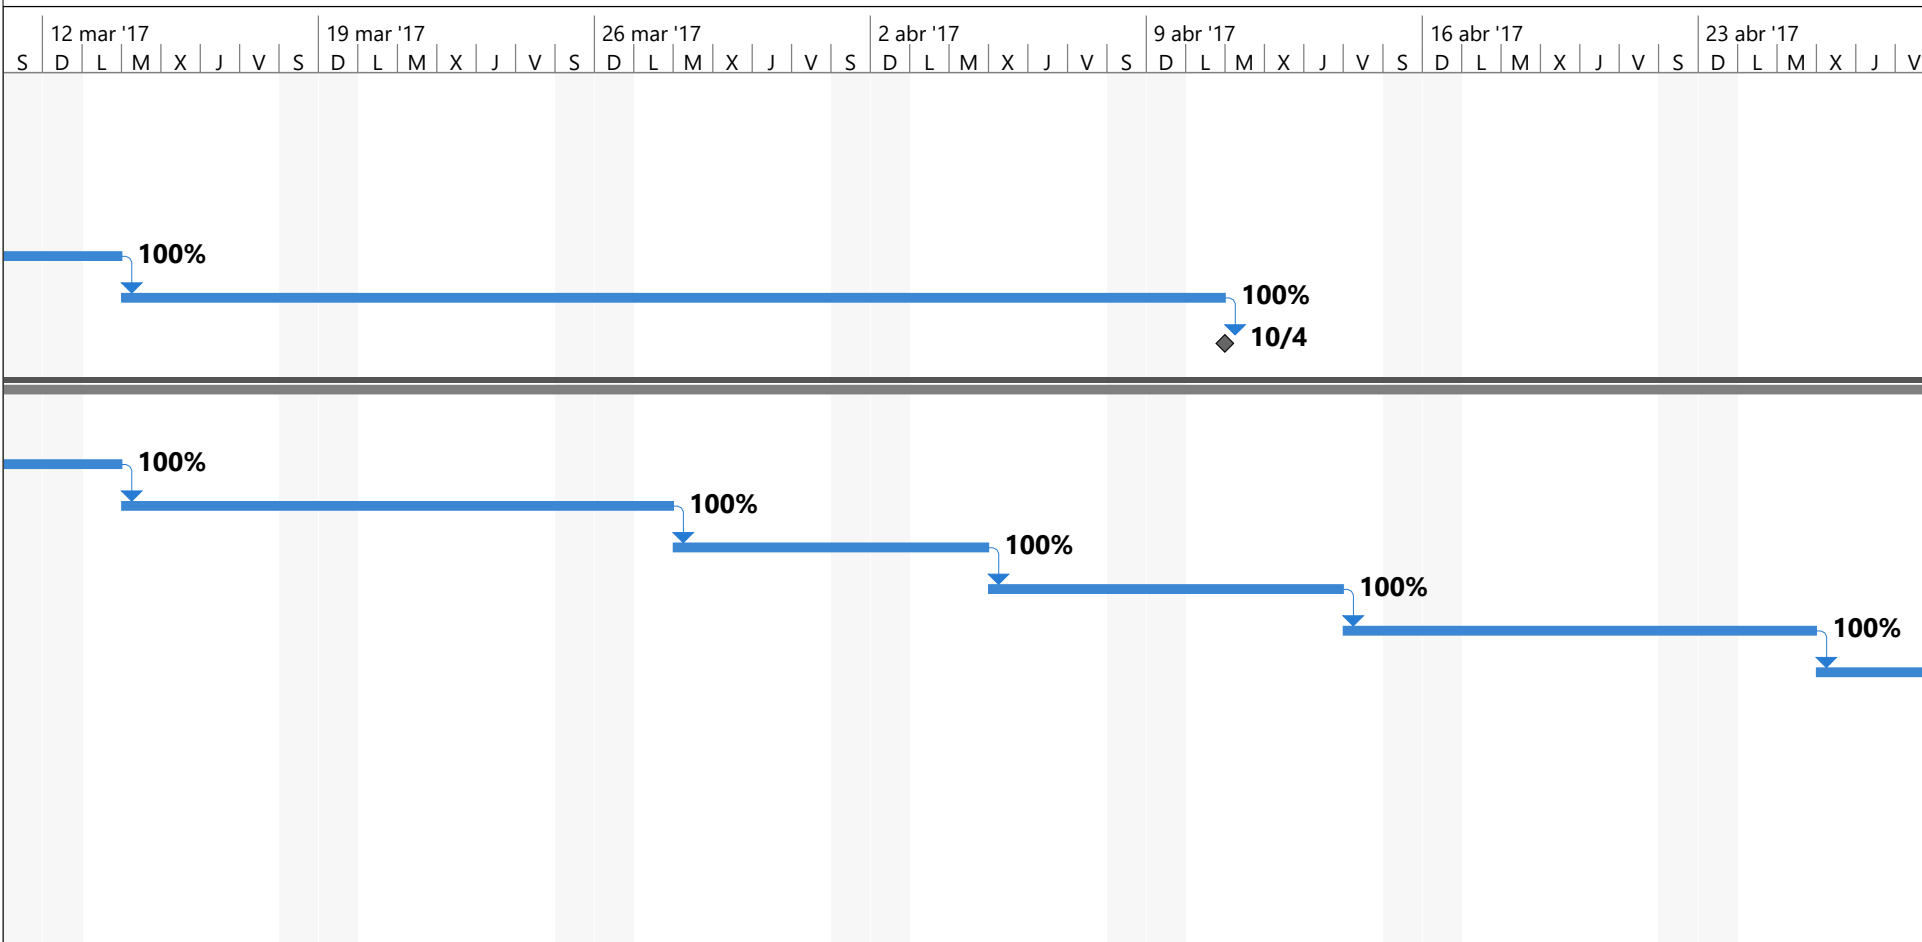

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101

V S | 30 abr '17 | 7 may '17 | 14 may '17 | 21 may '17 | 28 may '17 | 4 jun '17 | 11 jun '17
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

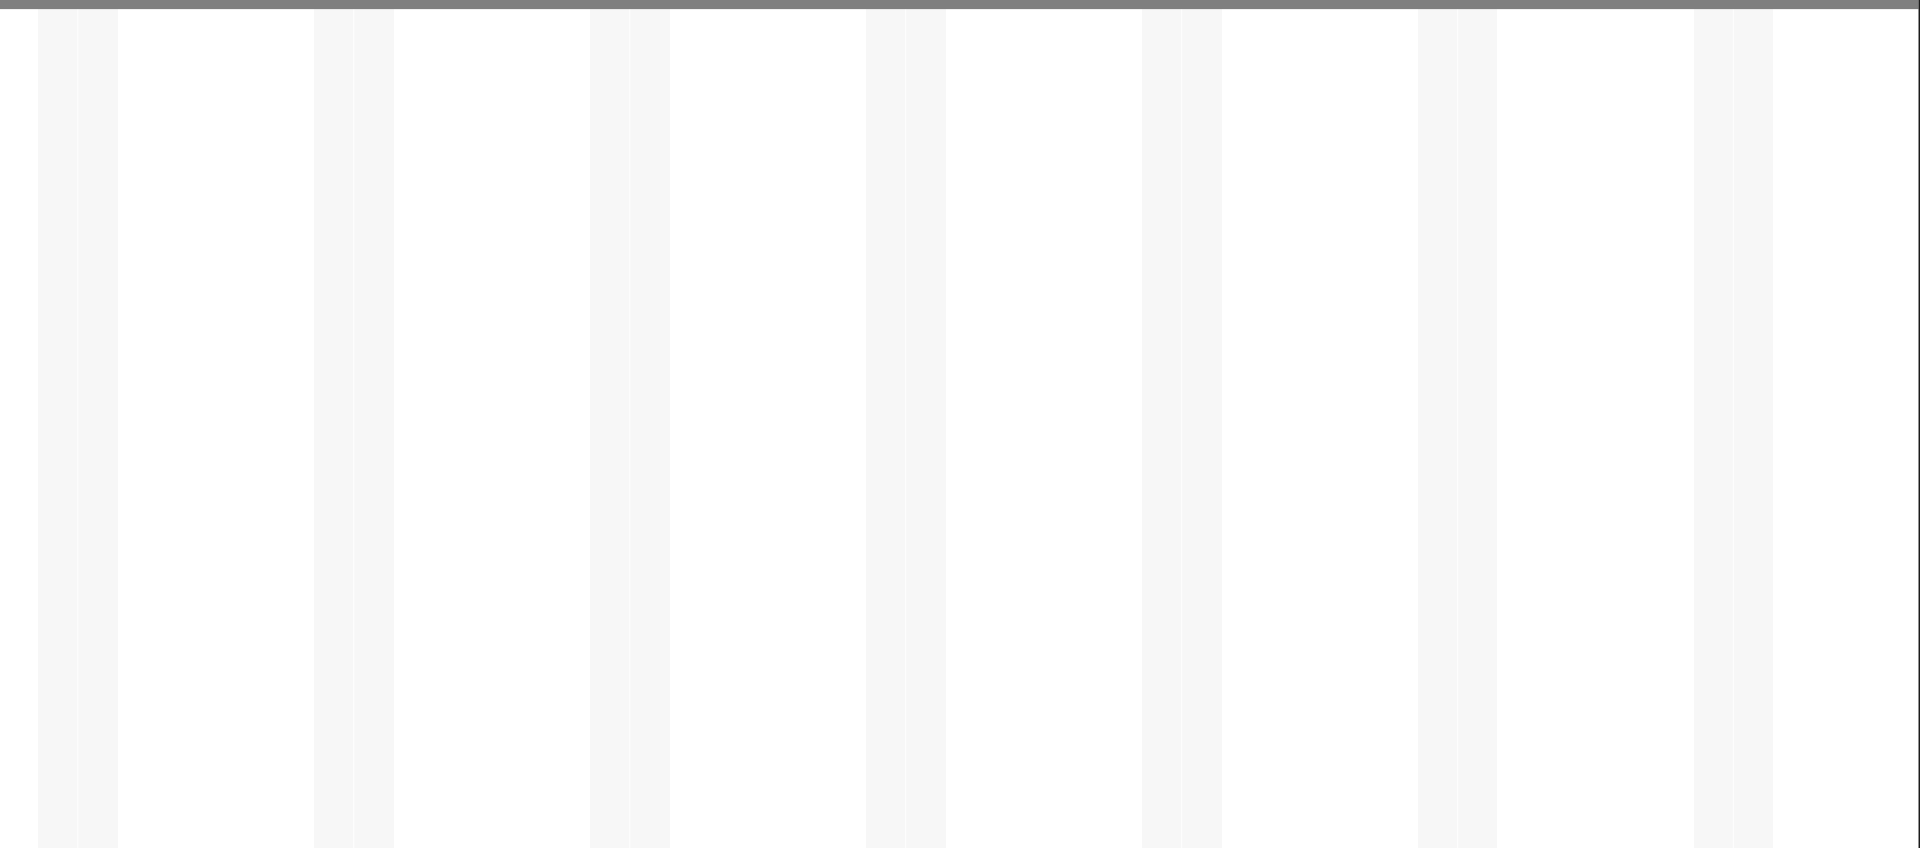


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101

30 abr '17
7 may '17
14 may '17
21 may '17
28 may '17
4 jun '17
11 jun '17

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

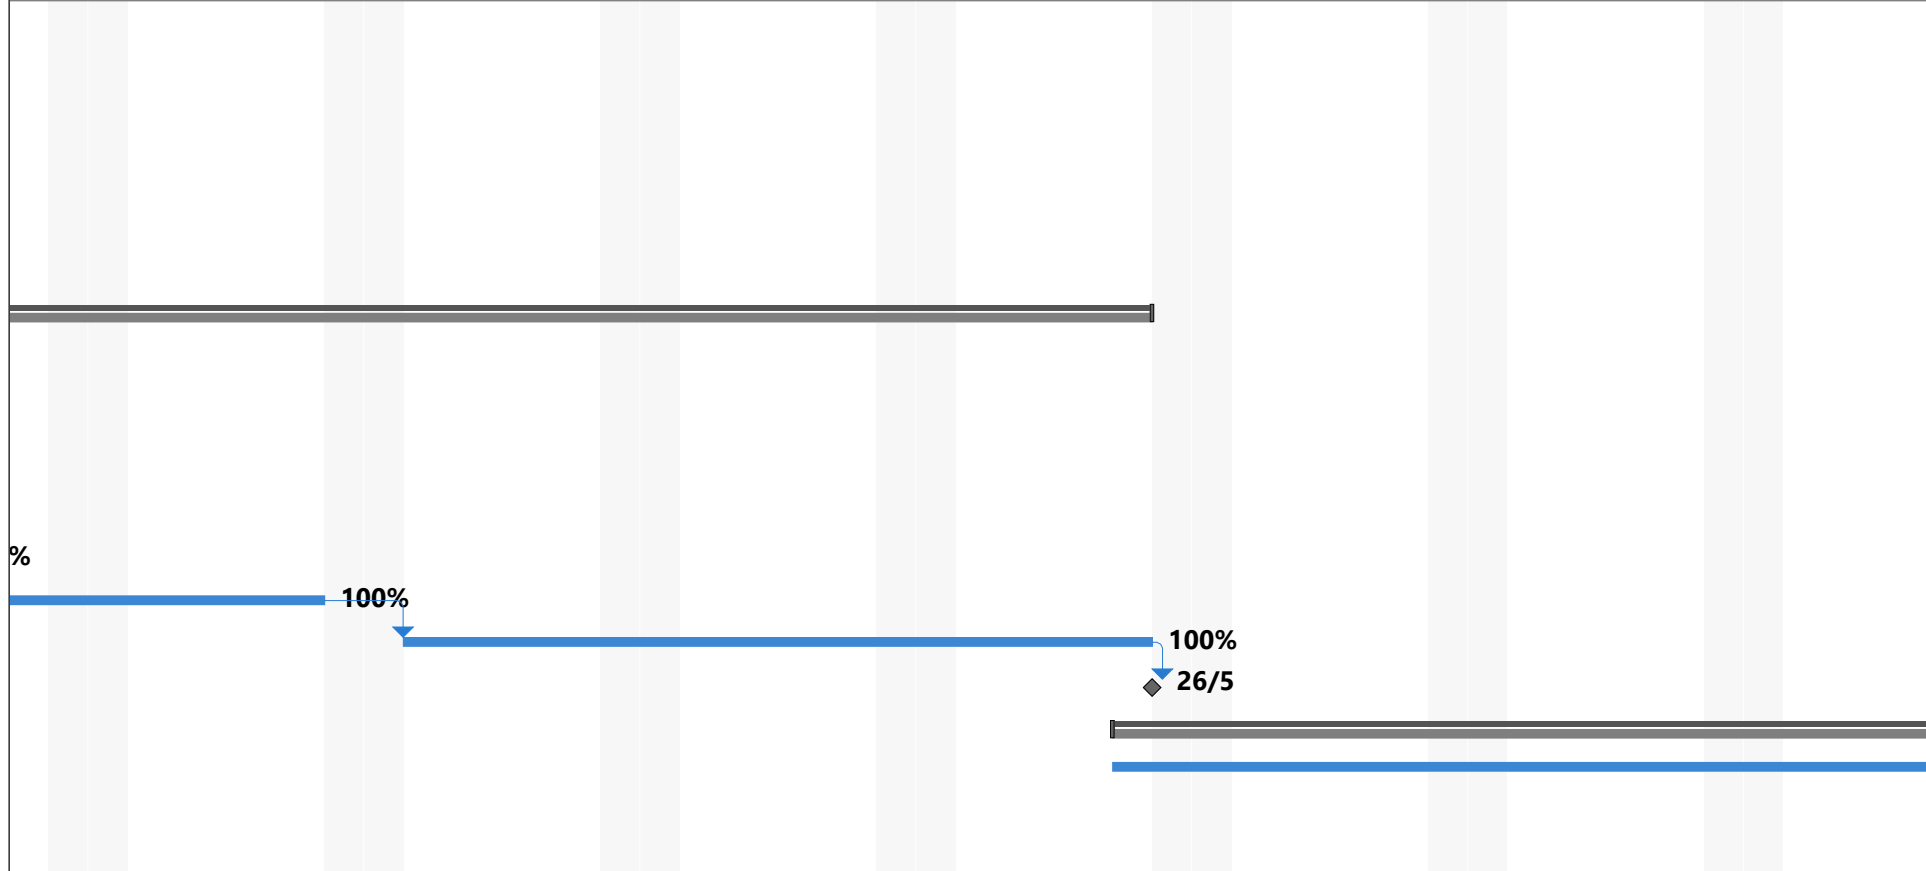

%

100%

100%

26/5

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101


18 jun '17
25 jun '17
2 jul '17
9 jul '17
16 jul '17
23 jul '17
30 jul '17

J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X

100%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA101

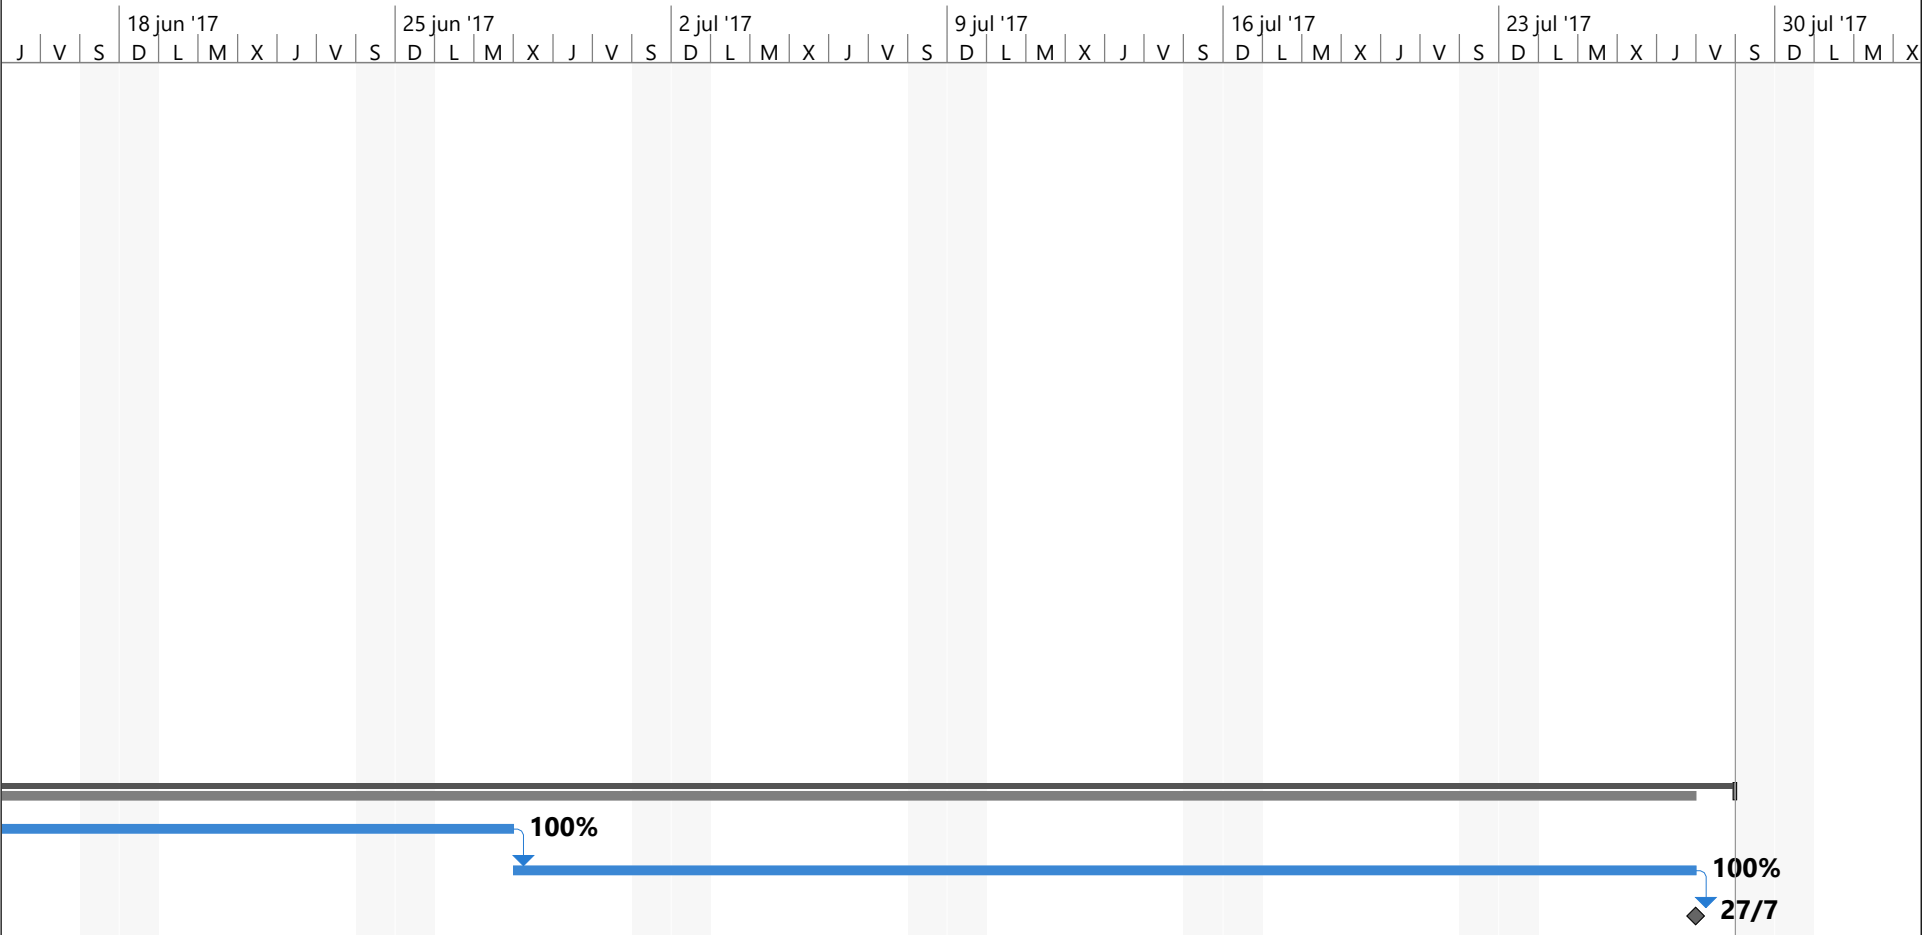

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
