

Cronograma Modelo NIBA104

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16						
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1			Circuito NIBA104	277 días	vie 9/9/16	lun 2/10/17														
2			Adquisiciones	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17														
3			Postes	56 días	vie 9/9/16	vie 25/11/16														
4			Herrajes y Conectores	66 días	vie 9/9/16	vie 9/12/16														
5			Conductores MT/BT/	71 días	vie 9/9/16	vie 16/12/16														
6			Transformadores y Ec	76 días	vie 9/9/16	vie 23/12/16														
7			Equipos de Medición	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17														
8			Evaluación	0 días	mié 11/1/17	mié 11/1/17	7													
9			Etapa 1	51.21 días	mié 11/1/17	jue 23/3/17														
10			Izaje de Postes	8.94 días	mié 11/1/17	lun 23/1/17														
11			Armado de Estructura	5.37 días	lun 23/1/17	mar 31/1/17	10													
12			Tendido de Conducto	7.45 días	mar 31/1/17	jue 9/2/17	11													
13			Montaje de Transfor	5.37 días	jue 9/2/17	vie 17/2/17	12													
14			Instalación de Lumina	5.37 días	vie 17/2/17	vie 24/2/17	13													
15			Correcciones	1.34 días	vie 24/2/17	lun 27/2/17	14													
16			Remociones	2.68 días	lun 27/2/17	jue 2/3/17	15													
17			Normalización de Sun	14.69 días	jue 2/3/17	jue 23/3/17	16													
18			Evaluación	0 días	jue 23/3/17	jue 23/3/17	17													
19			Etapa 2	51.21 días	jue 23/2/17	vie 5/5/17														
20			Izaje de Postes	8.94 días	jue 23/2/17	mar 7/3/17														
21			Armado de Estructur	5.37 días	mar 7/3/17	mié 15/3/17	20													

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16									
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
22	✓	☛	Tendido de Conducto	7.45 días	mié 15/3/17	vie 24/3/17	21																
23	✓	☛	Montaje de Transfor	5.37 días	vie 24/3/17	lun 3/4/17	22																
24	✓	☛	Instalación de Lumin	5.37 días	lun 3/4/17	lun 10/4/17	23																
25		☛	Correcciones	1.34 días	lun 10/4/17	mar 11/4/17	24																
26		☛	Remociones	2.68 días	mar 11/4/17	vie 14/4/17	25																
27		☛	Normalización de Su	14.69 días	vie 14/4/17	vie 5/5/17	26																
28	✓	☛	Evaluación	0 días	vie 5/5/17	vie 5/5/17	27																
29		☛	Etapa 3	51.21 días	mié 5/4/17	jue 15/6/17																	
30	✓	☛	Izaje de Postes	8.94 días	mié 5/4/17	lun 17/4/17																	
31	✓	☛	Armado de Estructur	5.37 días	lun 17/4/17	mar 25/4/17	30																
32	✓	☛	Tendido de Conducto	7.45 días	mar 25/4/17	jue 4/5/17	31																
33	✓	☛	Montaje de Transfor	5.37 días	jue 4/5/17	vie 12/5/17	32																
34	✓	☛	Instalación de Lumin	5.37 días	vie 12/5/17	vie 19/5/17	33																
35		☛	Correcciones	1.34 días	vie 19/5/17	lun 22/5/17	34																
36		☛	Remociones	2.68 días	lun 22/5/17	jue 25/5/17	35																
37		☛	Normalización de Su	14.69 días	jue 25/5/17	jue 15/6/17	36																
38		☛	Evaluación	0 días	jue 15/6/17	jue 15/6/17	37																
39		☛	Etapa 4	51.21 días	lun 15/5/17	mar 25/7/17																	
40		☛	Izaje de Postes	10 días	lun 15/5/17	vie 26/5/17																	
41		☛	Armado de Estructur	5.37 días	lun 29/5/17	lun 5/6/17	40																
42		☛	Tendido de Conducto	7.45 días	lun 5/6/17	mié 14/6/17	41																

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16										
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
43		Montaje de Transfor	5.37 días	mié 14/6/17	jue 22/6/17	42																		
44		Instalación de Lumin.	5.37 días	jue 22/6/17	jue 29/6/17	43																		
45		Correcciones	1.34 días	jue 29/6/17	vie 30/6/17	44																		
46		Remociones	2.68 días	vie 30/6/17	mié 5/7/17	45																		
47		Normalización de Sur	14.69 días	mié 5/7/17	mié 26/7/17	46																		
48		Evaluación	0 días	mié 26/7/17	mié 26/7/17	47																		
49		Cierres Técnico y Admin	46 días	mar 25/7/17	mar 26/9/17																			
50		Cierre Técnico	28 días	mar 25/7/17	jue 31/8/17																			
51		Cierre Administrativo	22 días	vie 1/9/17	lun 2/10/17	50																		
52		Evaluación	0 días	lun 2/10/17	lun 2/10/17	51																		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha limite	

Cronograma Modelo NIBA104


25 sep '16 2 oct '16 9 oct '16 16 oct '16 23 oct '16 30 oct '16 6 nov '16

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

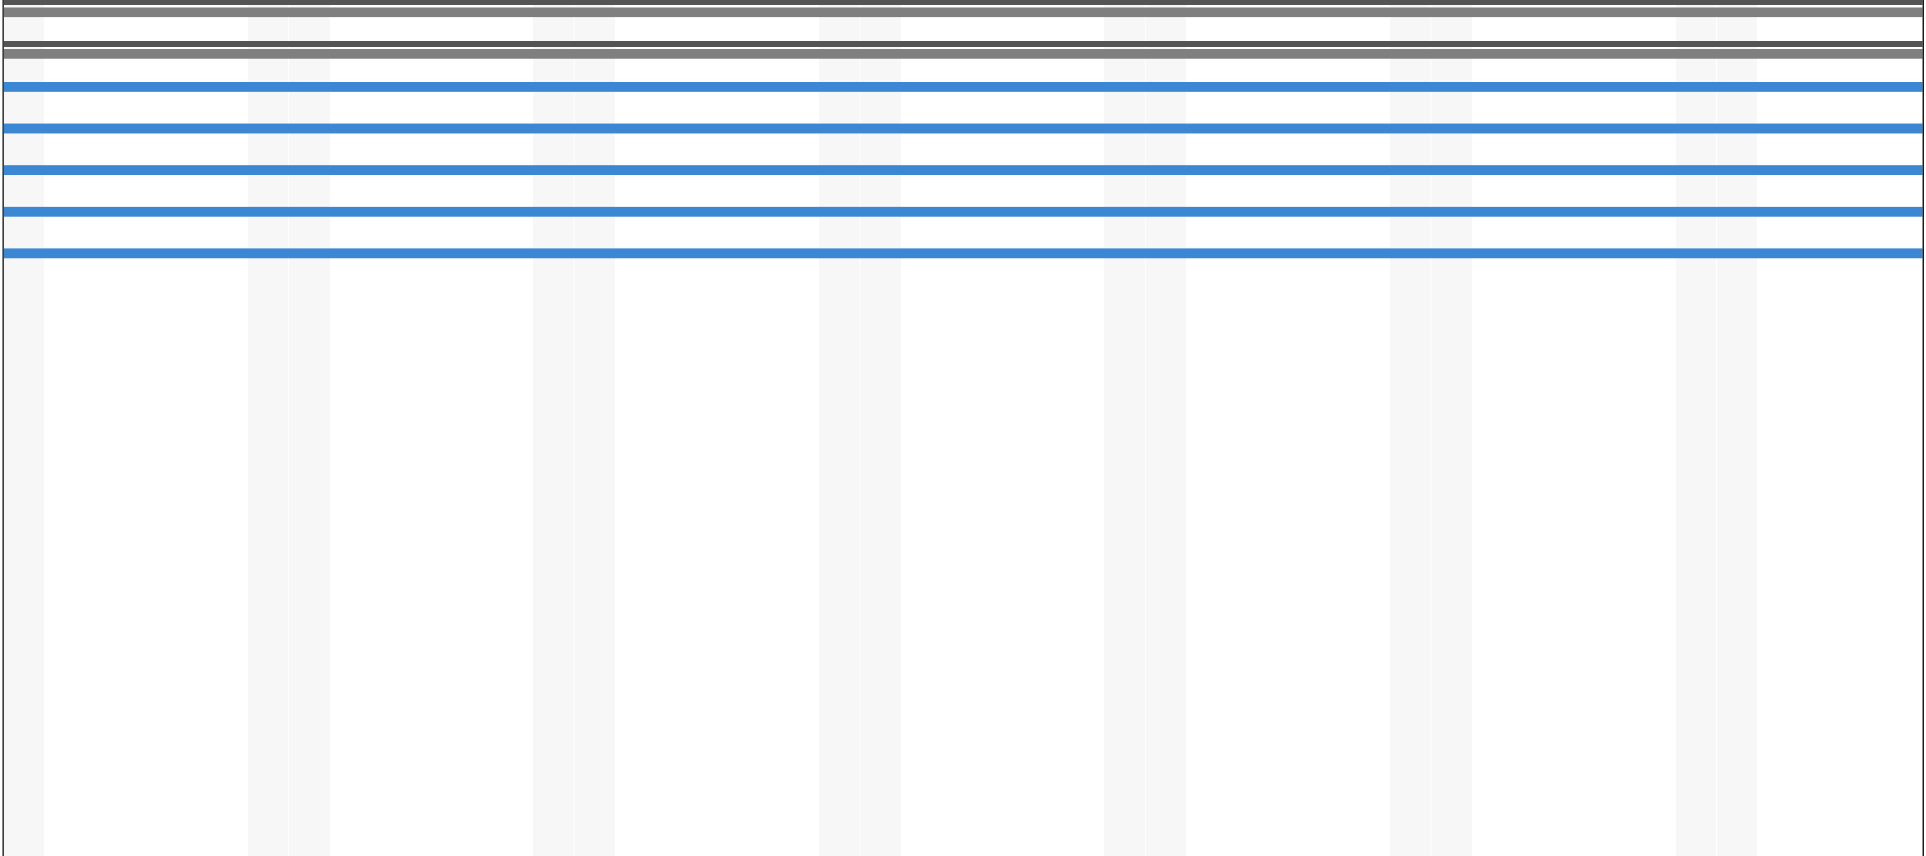

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

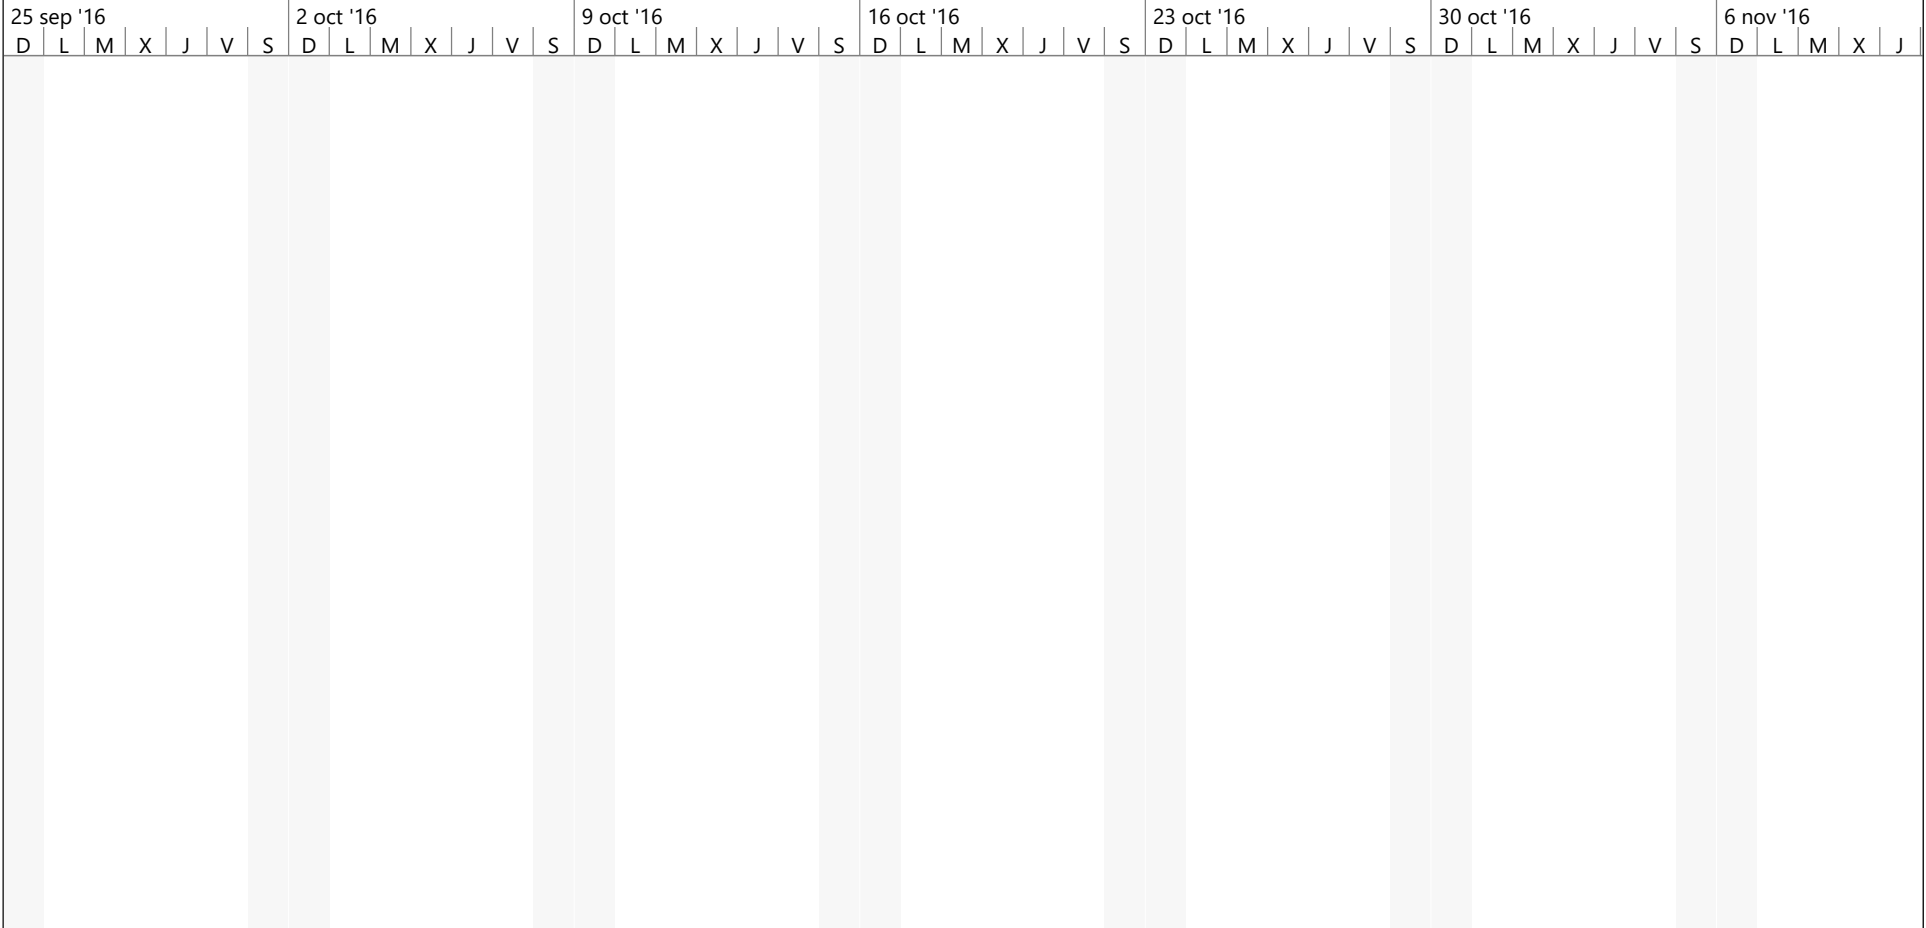


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

25 sep '16 2 oct '16 9 oct '16 16 oct '16 23 oct '16 30 oct '16 6 nov '16


D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

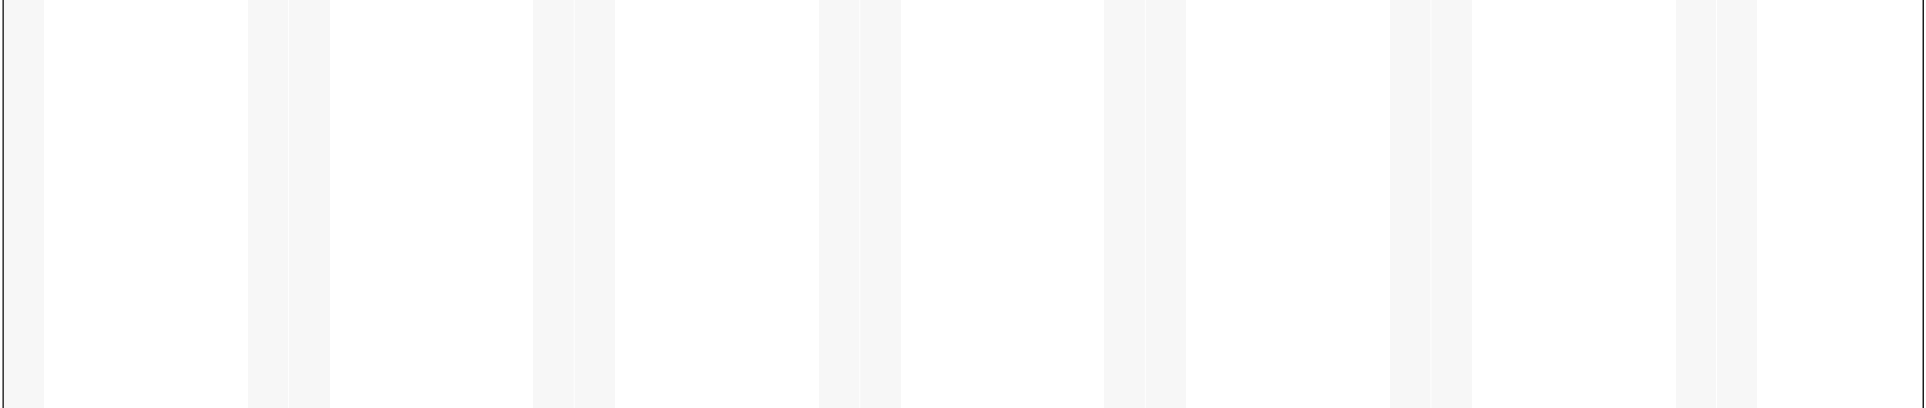

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104

13 nov '16
20 nov '16
27 nov '16
4 dic '16
11 dic '16
18 dic '16
25 dic '16

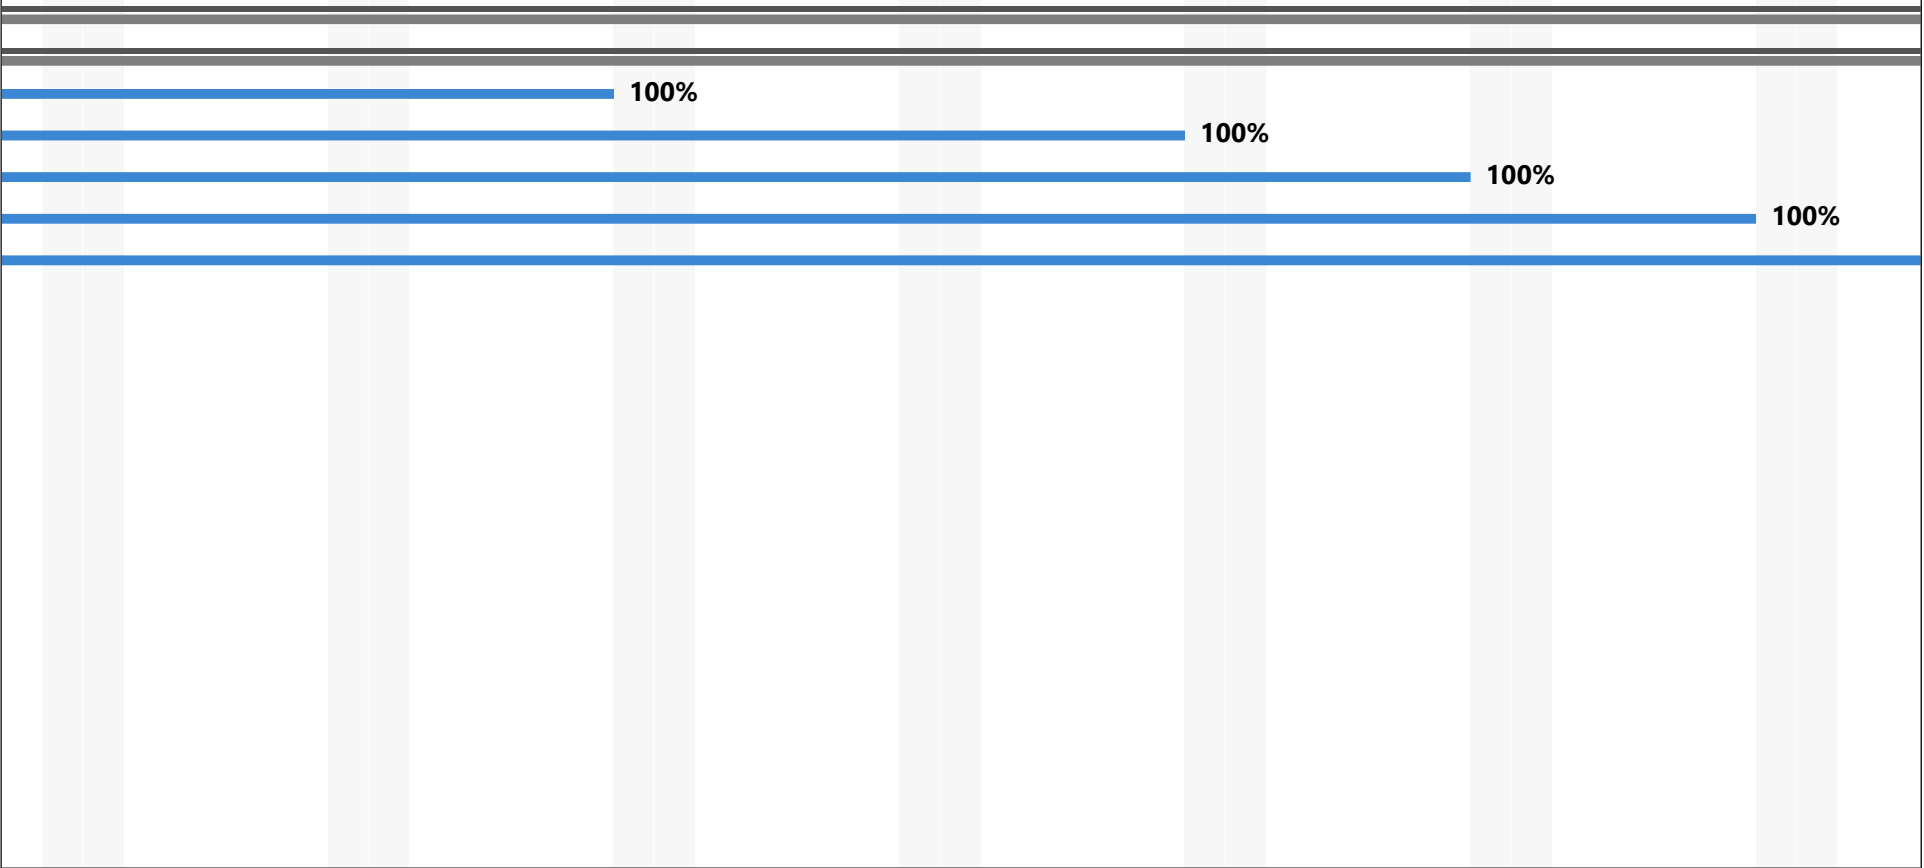

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

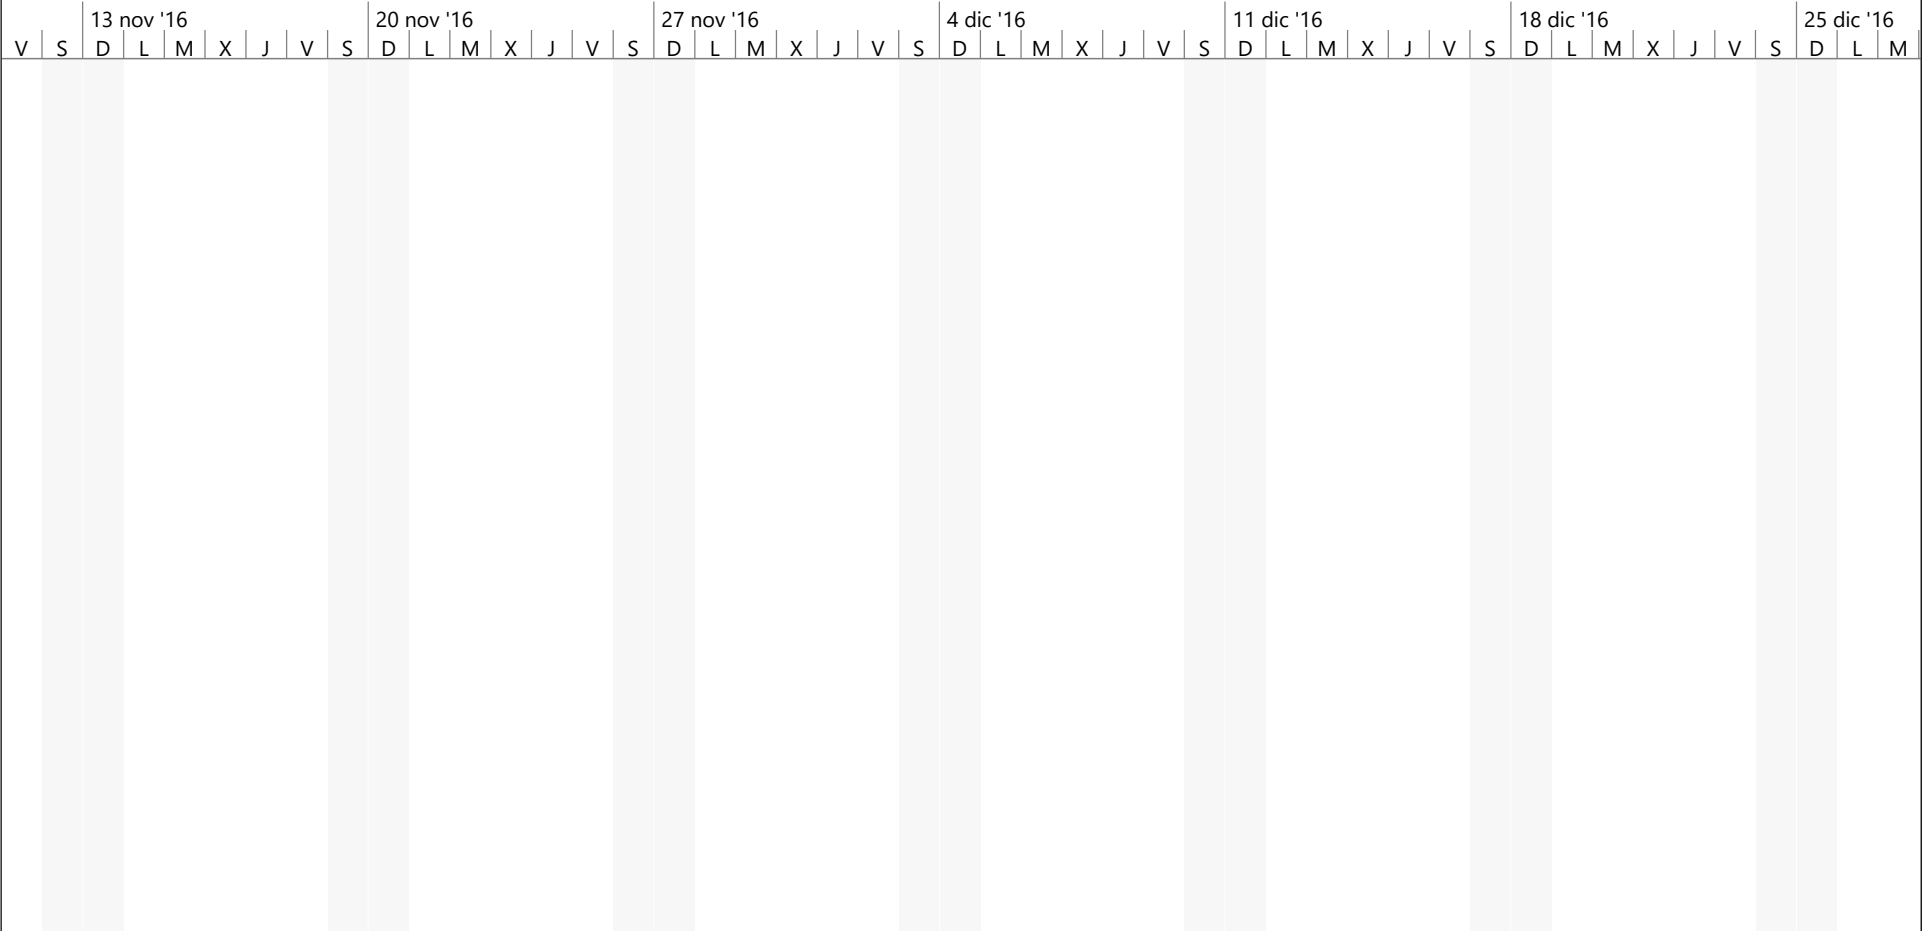

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

X J V S 1 ene '17 D L M X J V S 8 ene '17 D L M X J V S 15 ene '17 D L M X J V S 22 ene '17 D L M X J V S 29 ene '17 D L M X J V S 5 feb '17 D L M X J V S 12 feb '17

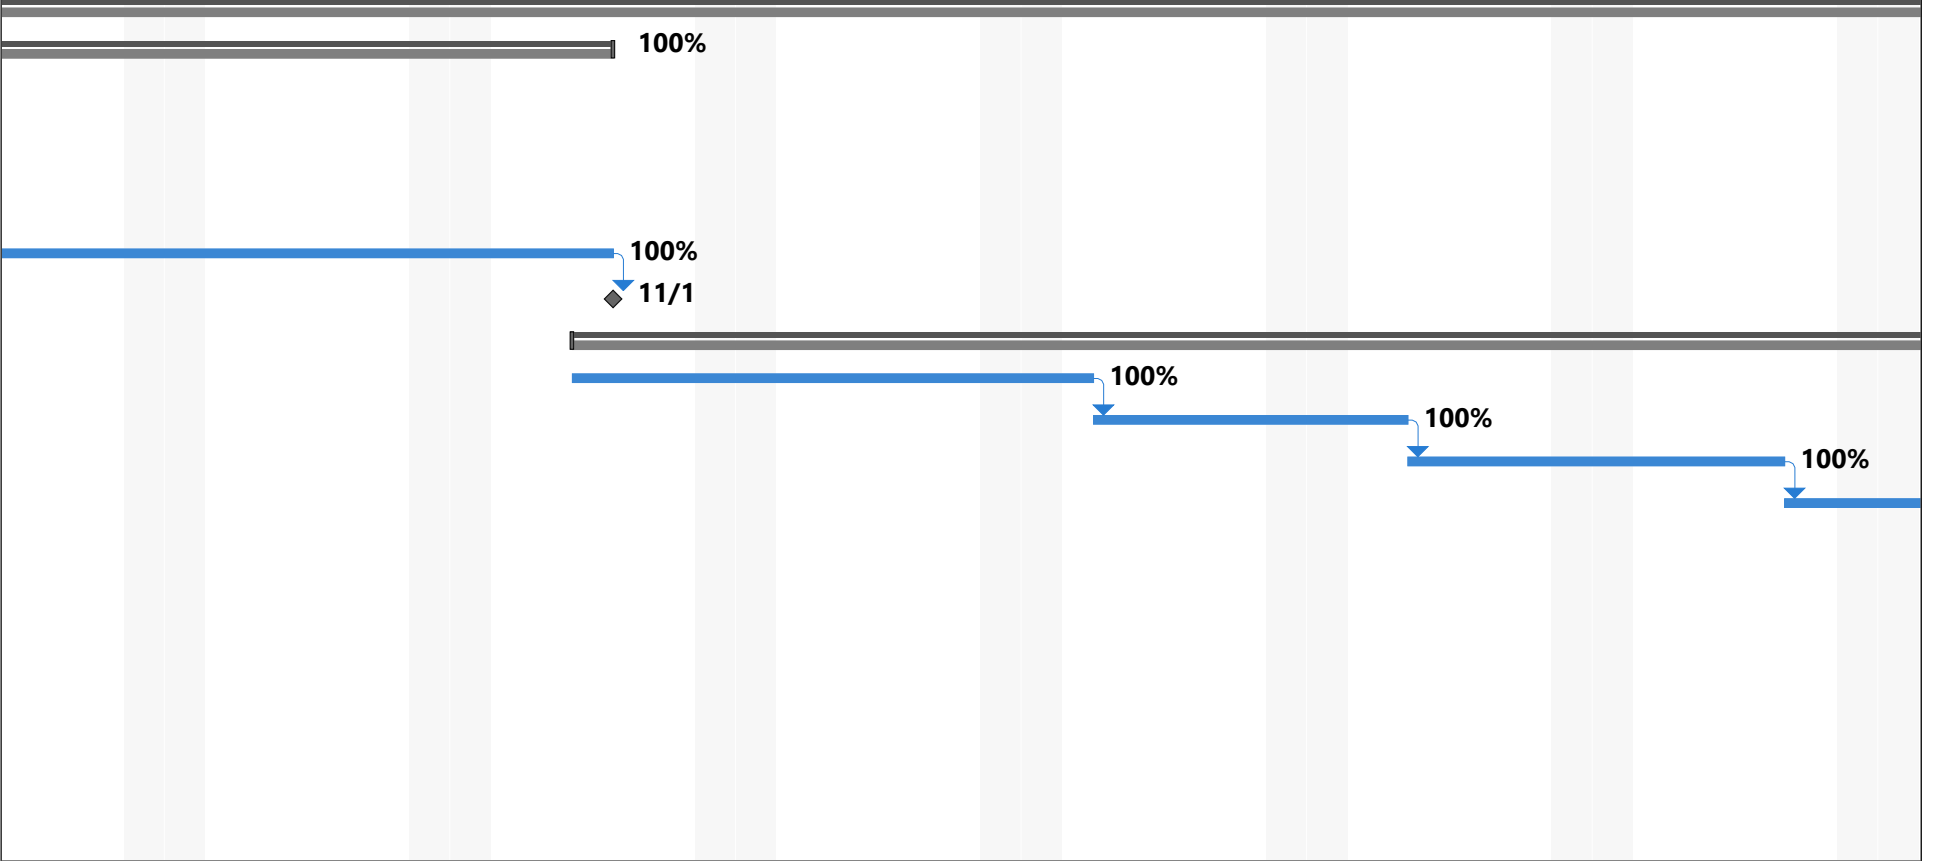


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104

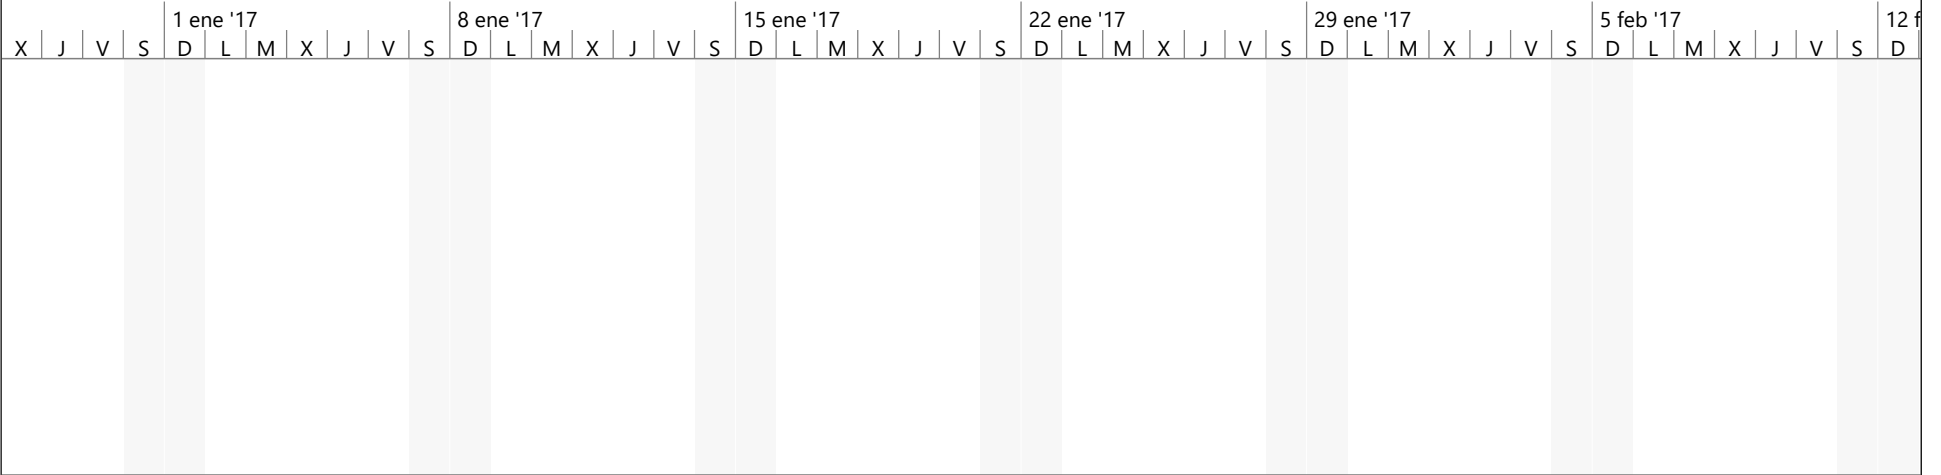

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

feb '17 | 19 feb '17 | 26 feb '17 | 5 mar '17 | 12 mar '17 | 19 mar '17 | 26 mar '17
 L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S

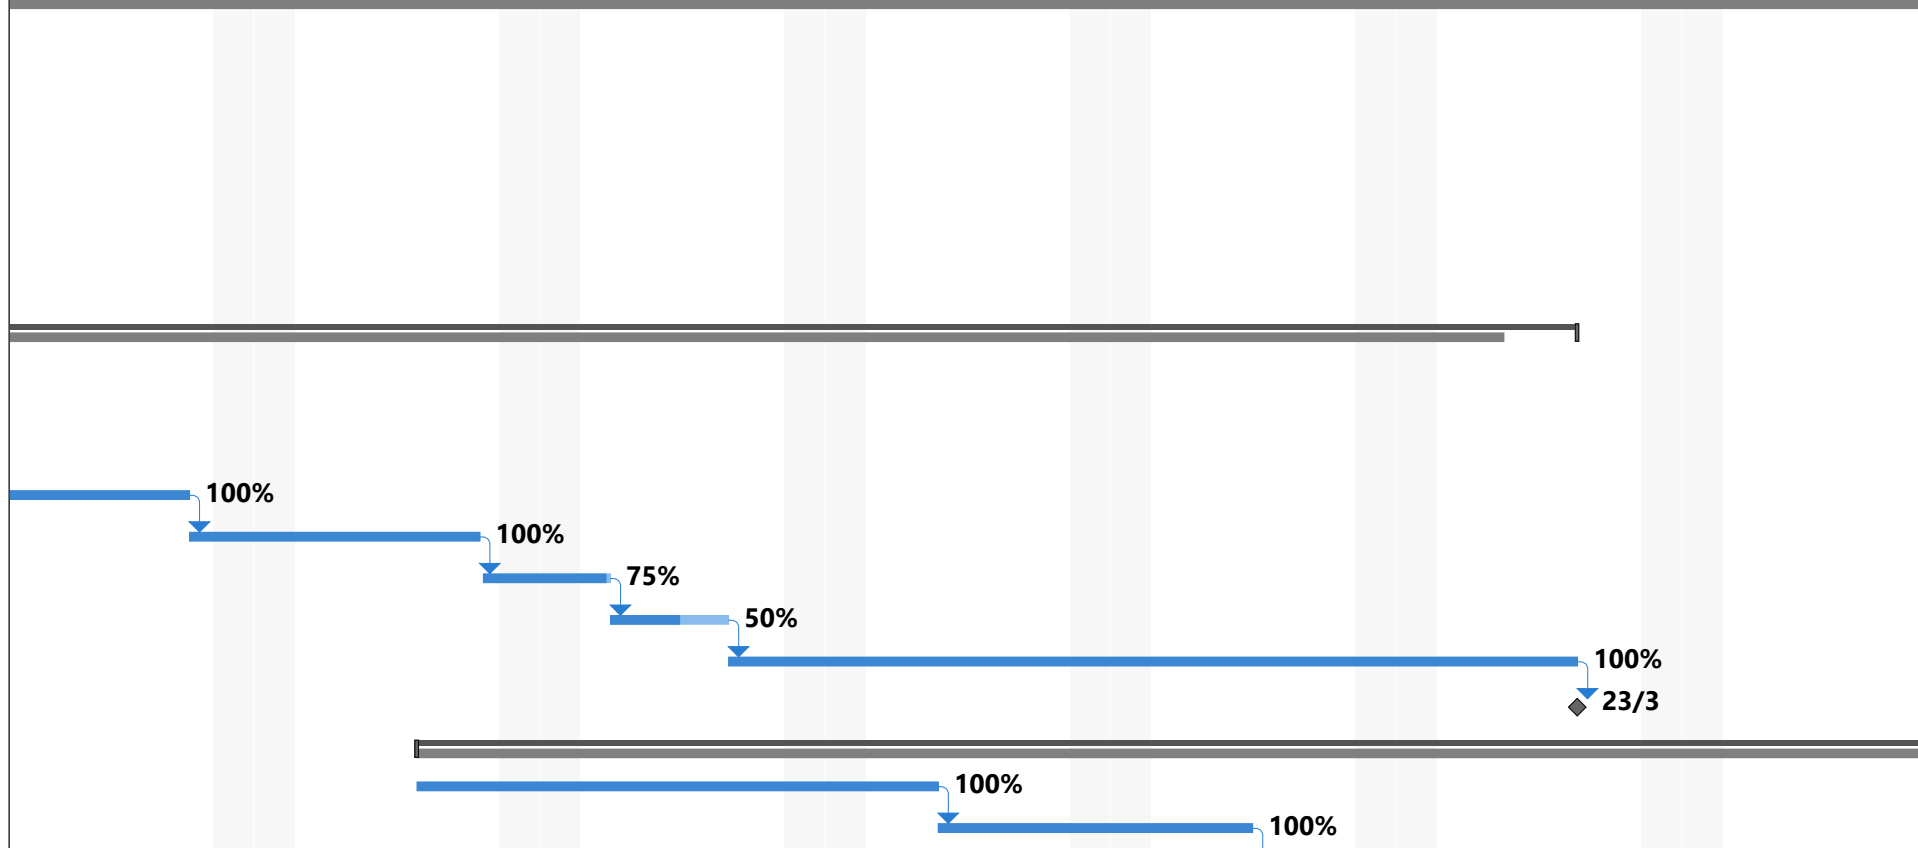

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104


feb '17 | 19 feb '17 | 26 feb '17 | 5 mar '17 | 12 mar '17 | 19 mar '17 | 26 mar '17
 L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V

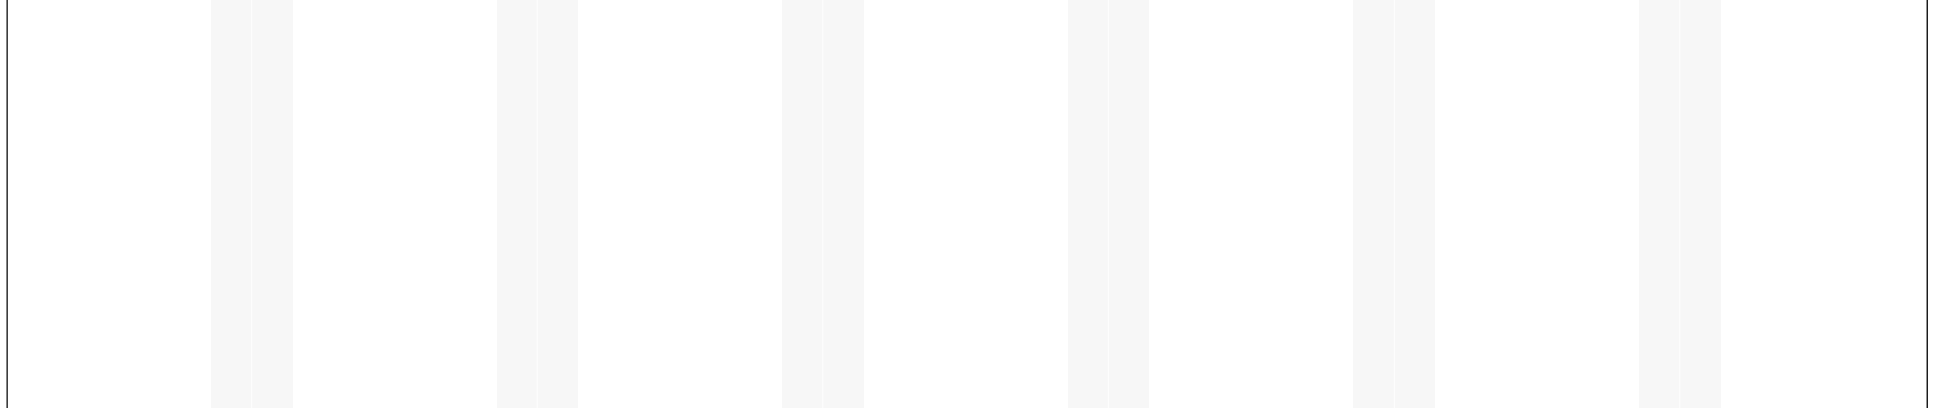

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104

2 abr '17							9 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							30 abr '17							7 may '17							14 may '17							
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

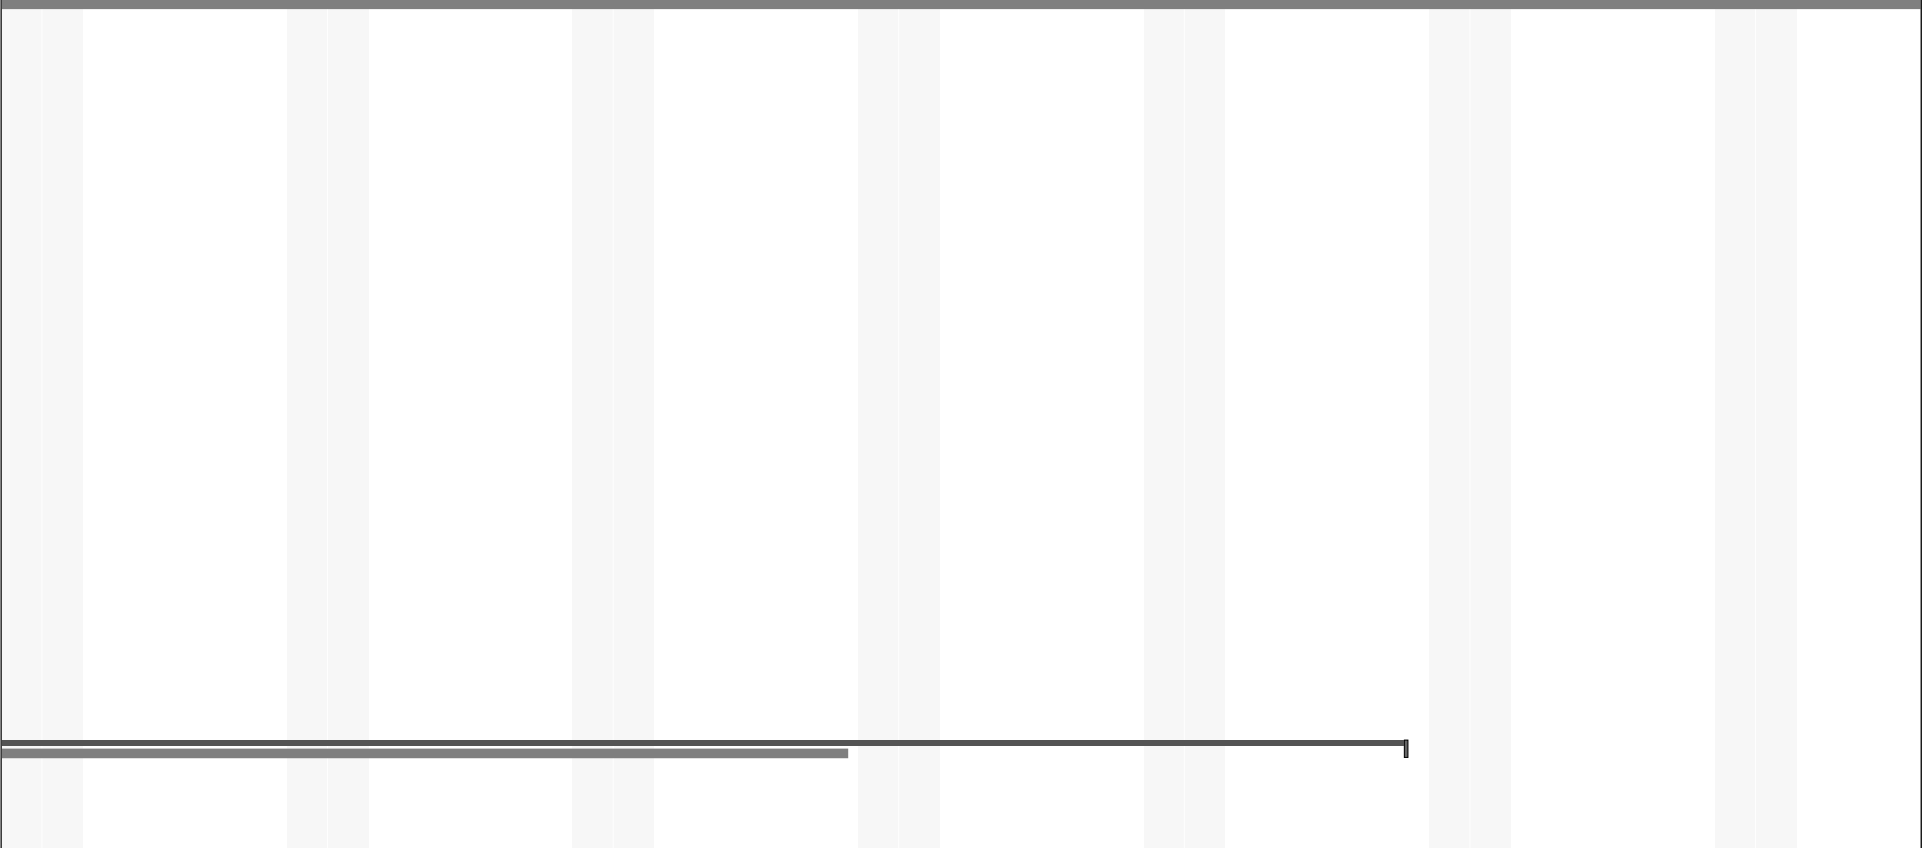


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

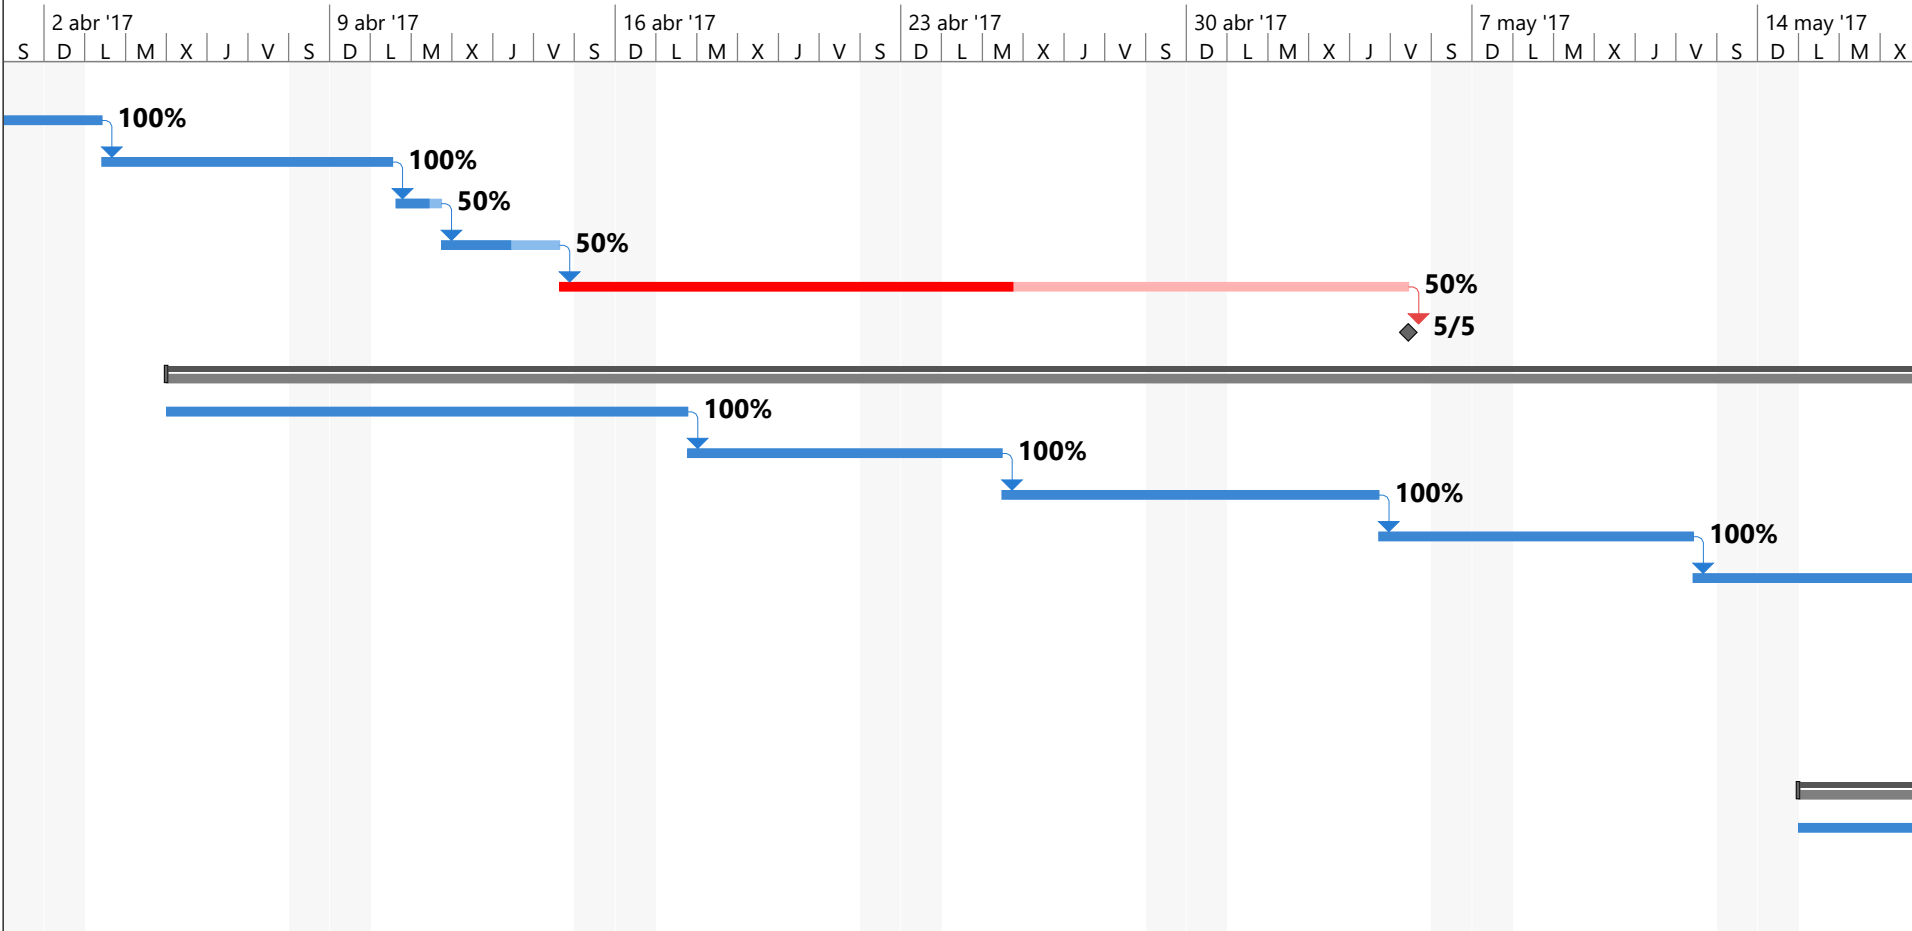

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

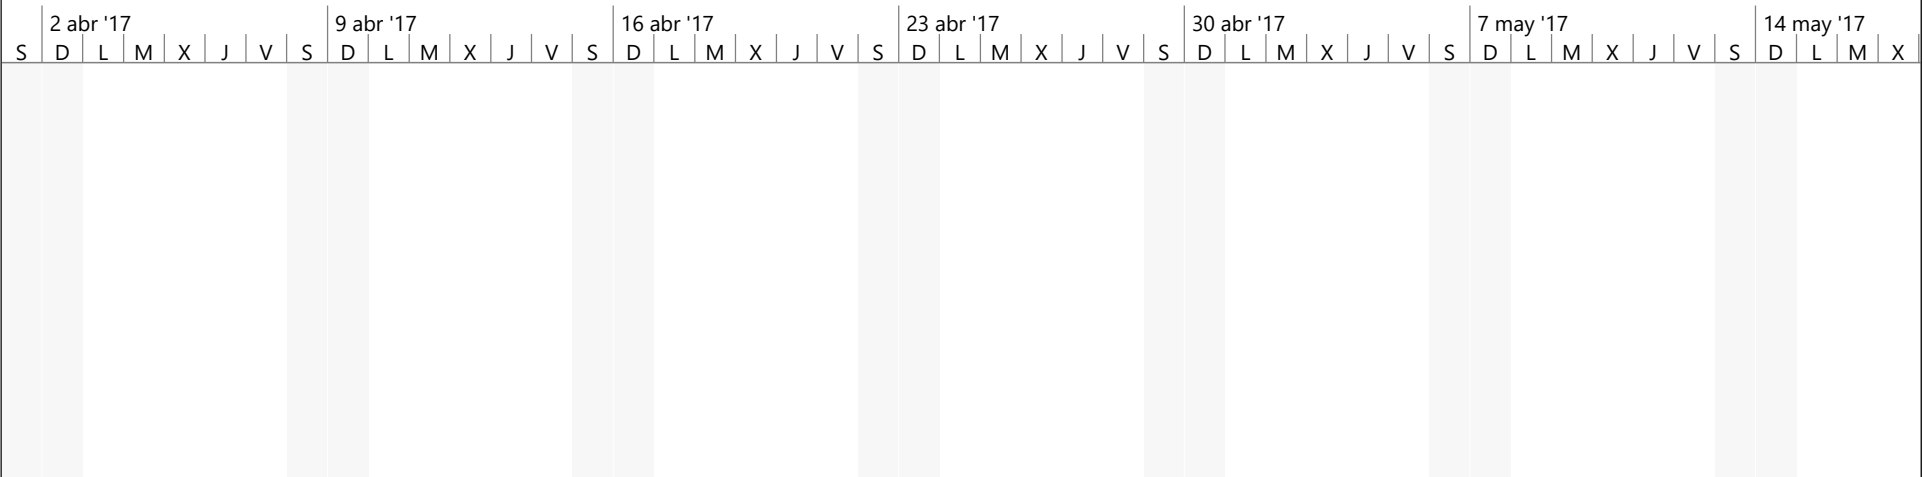

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104


21 may '17
28 may '17
4 jun '17
11 jun '17
18 jun '17
25 jun '17
2 jul '17

J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L




Tareas críticas División crítica Progreso de tarea crítica Tarea División Progreso de tarea Tarea manual solo el comienzo	 	solo fin solo duración Línea base División de la línea base Hito de línea base Hito Progreso del resumen Resumen	 	Resumen manual Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Fecha límite	
--	------------------------------	---	------------------------------	--	------------------------------

Cronograma Modelo NIBA104

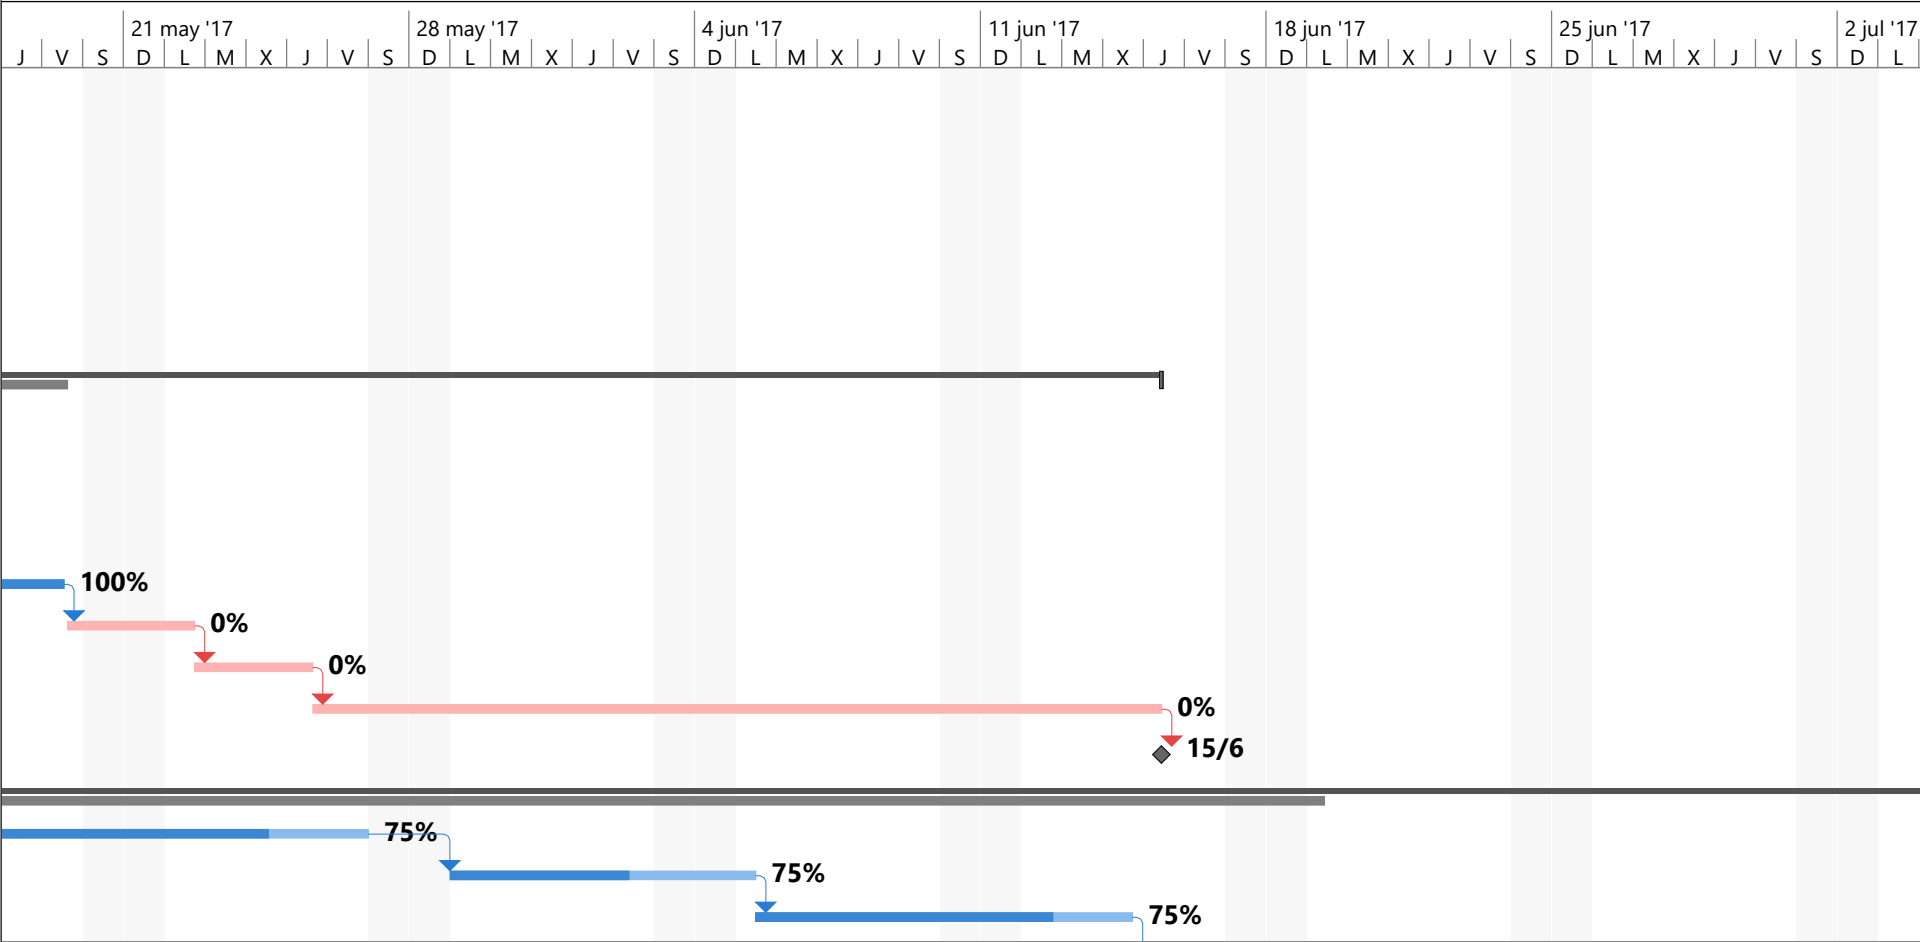

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104

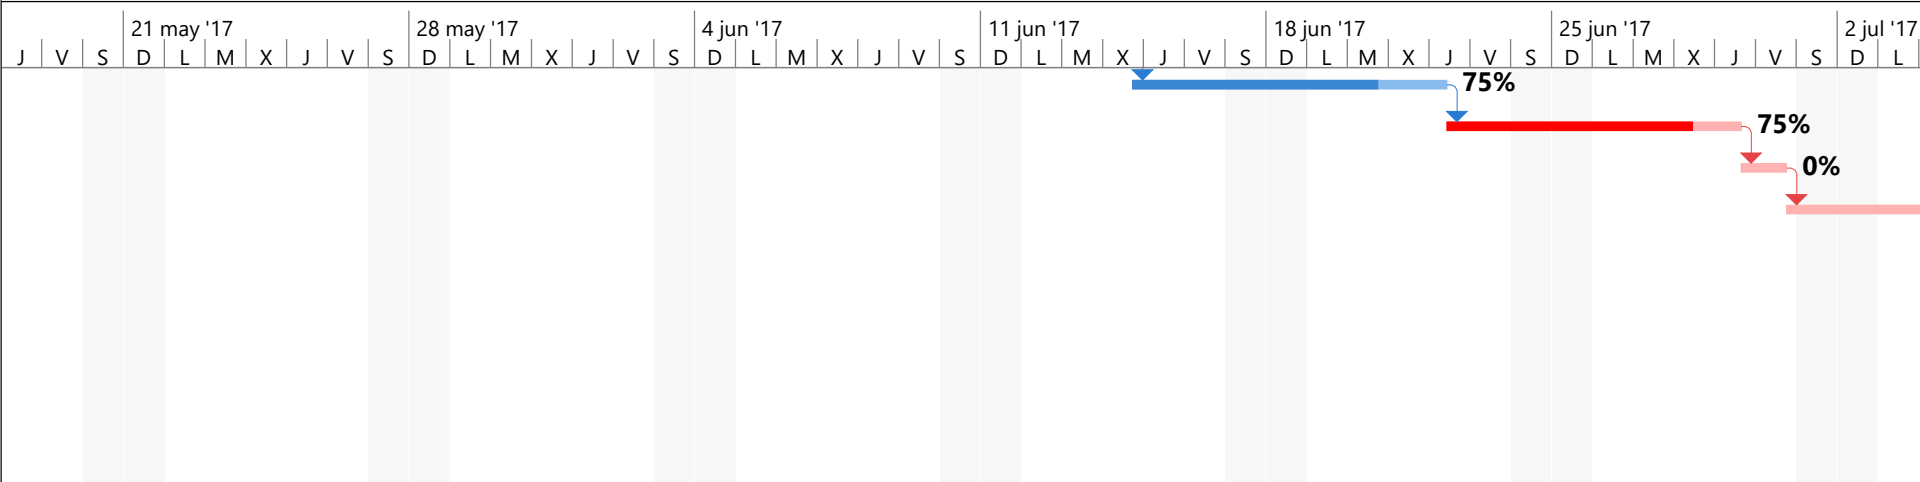

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo NIBA104

M | X | J | V | S
9 jul '17
D | L | M | X | J | V | S
16 jul '17
D | L | M | X | J | V | S
23 jul '17
D | L | M | X | J | V | S
30 jul '17
D | L | M | X | J | V | S
6 ago '17
D | L | M | X | J | V | S
13 ago '17
D | L | M | X | J | V | S

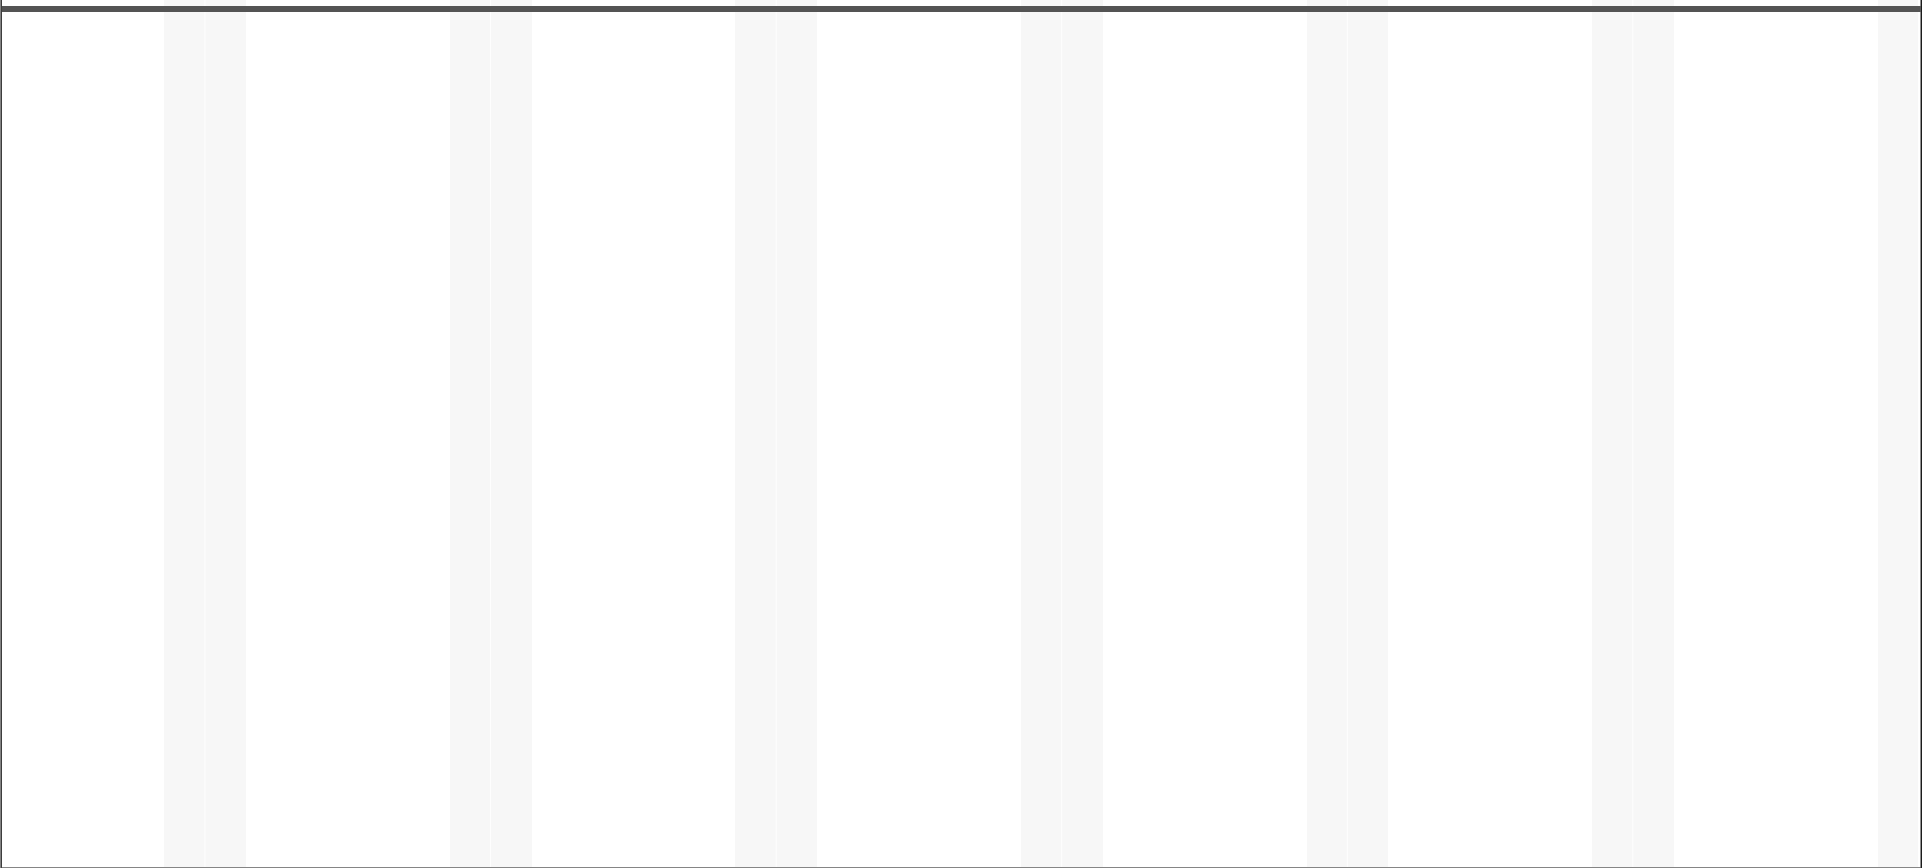


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

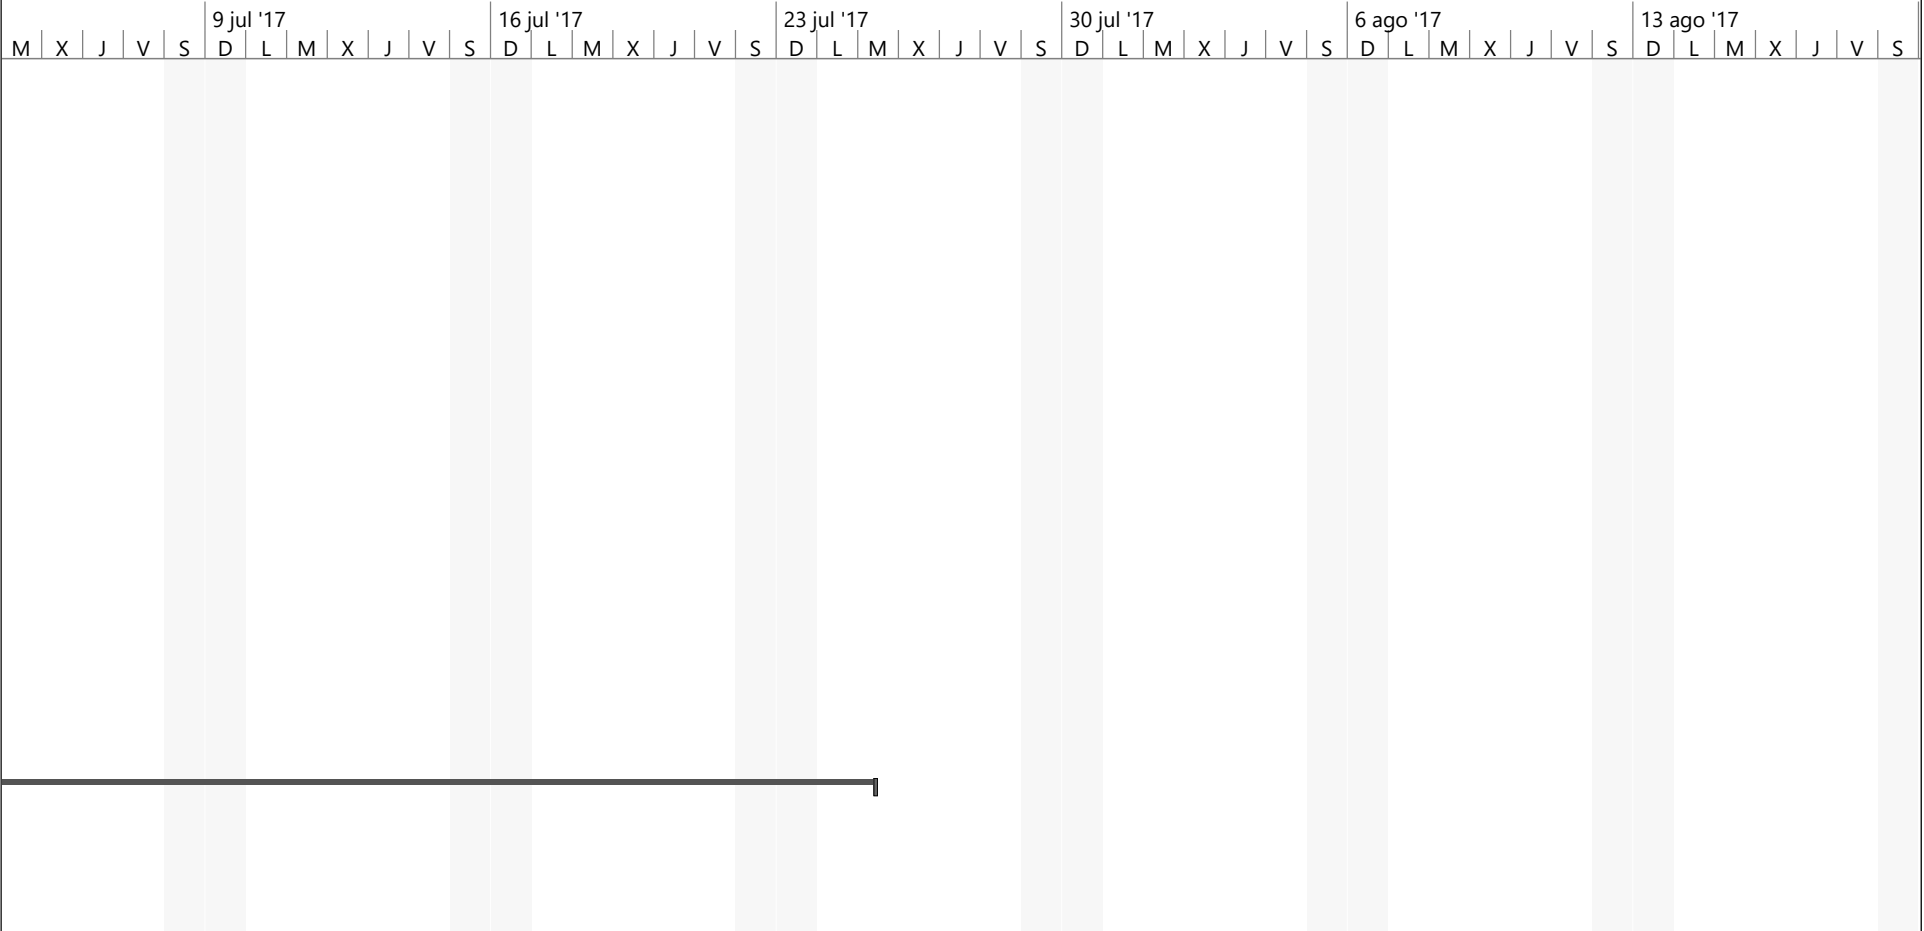

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha limite	

Cronograma Modelo NIBA104

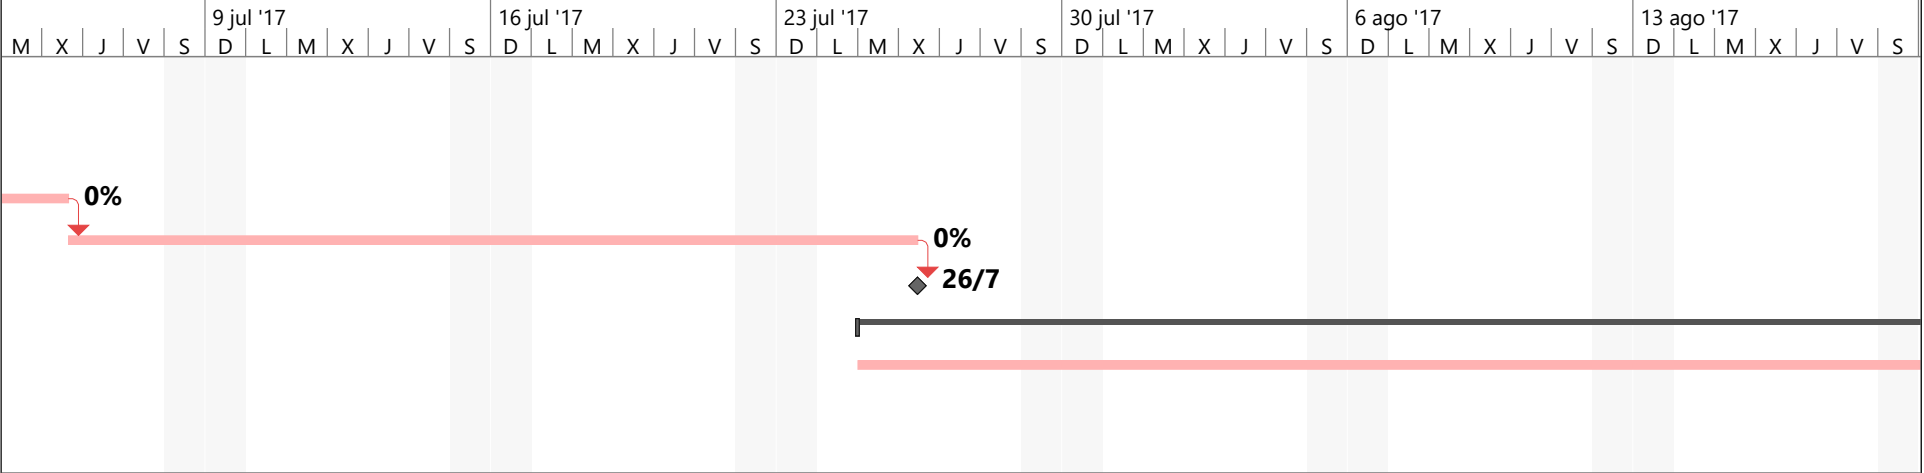


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

20 ago '17 | 27 ago '17 | 3 sep '17 | 10 sep '17 | 17 sep '17 | 24 sep '17 | 1 oct '17

D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J

83%

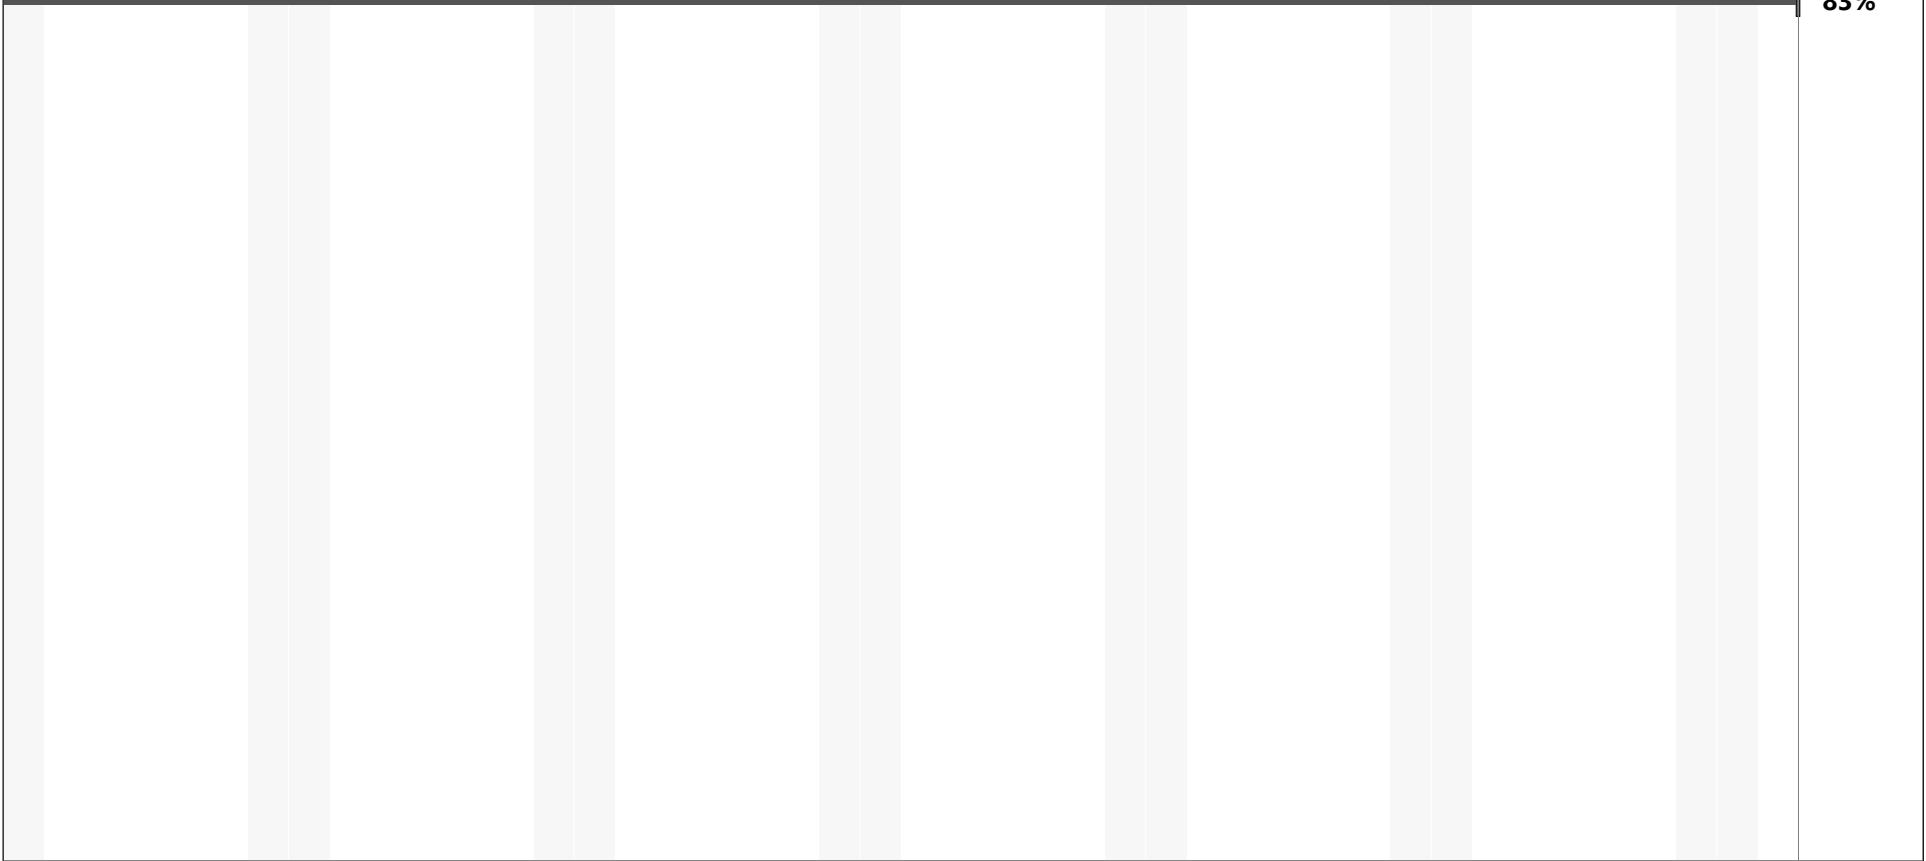


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo NIBA104

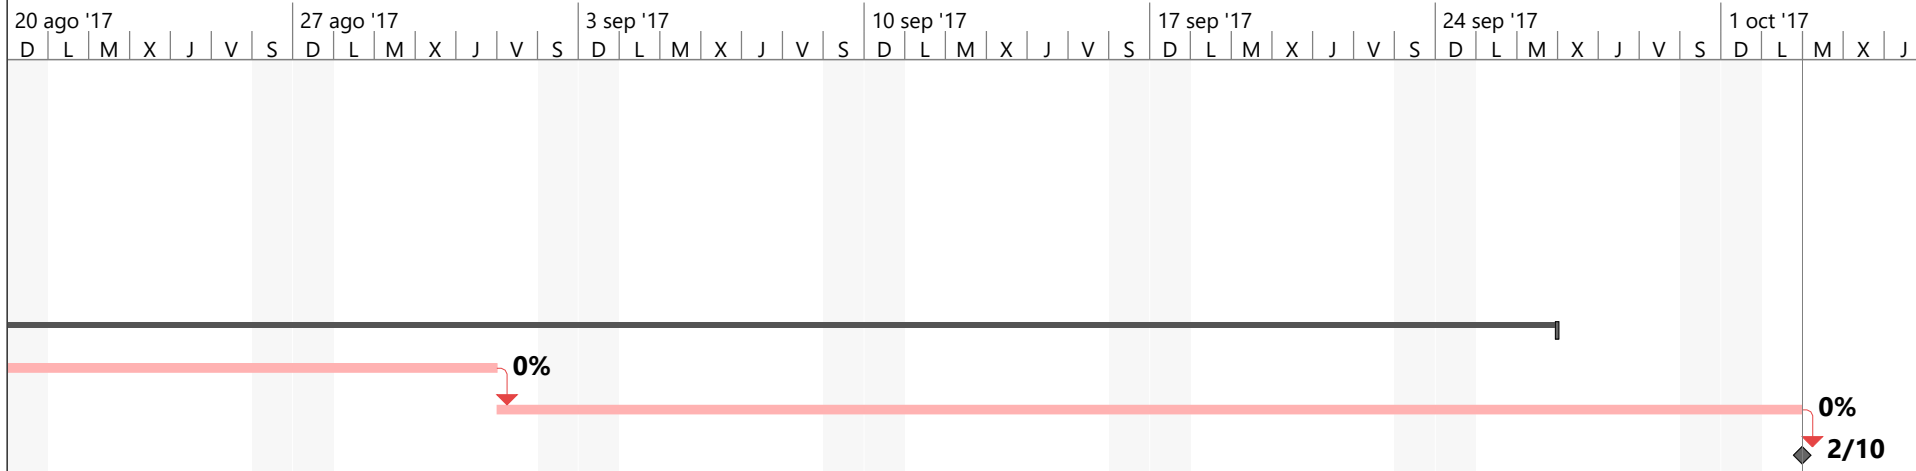

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
