

Cronograma Modelo SALC104

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16					
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M			
1			Circuito SALC104	231 días	lun 27/6/16	lun 15/5/17																				
2			Adquisiciones	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																				
3			Postes	56 días	lun 27/6/16	lun 12/9/16																				
4			Herrajes y Conectores	66 días	lun 27/6/16	lun 26/9/16																				
5			Conductores MT/BT/	71 días	lun 27/6/16	lun 3/10/16																				
6			Transformadores y Ec	76 días	lun 27/6/16	lun 10/10/16																				
7			Equipos de Medición	89 días	lun 27/6/16	jue 27/10/16																				
8			Evaluación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16	7																			
9			Etapa 1	51.21 días	jue 27/10/16	vie 6/1/17																				
10			Izaje de Postes	8.94 días	jue 27/10/16	mar 8/11/16																				
11			Armado de Estructura	5.37 días	mar 8/11/16	mié 16/11/16	10																			
12			Tendido de Conducto	7.45 días	mié 16/11/16	vie 25/11/16	11																			
13			Montaje de Transfor	5.37 días	vie 25/11/16	lun 5/12/16	12																			
14			Instalación de Lumina	5.37 días	lun 5/12/16	lun 12/12/16	13																			
15			Correcciones	1.34 días	lun 12/12/16	mar 13/12/16	14																			
16			Remociones	2.68 días	mar 13/12/16	vie 16/12/16	15																			
17			Normalización de Sun	14.69 días	vie 16/12/16	vie 6/1/17	16																			
18			Evaluación	0 días	vie 6/1/17	vie 6/1/17	17																			
19			Etapa 2	51.21 días	mar 6/12/16	mié 15/2/17																				
20			Izaje de Postes	8.94 días	mar 6/12/16	vie 16/12/16																				
21			Armado de Estructur	5.37 días	vie 16/12/16	lun 26/12/16	20																			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun '16							3 jul '16							10 jul '16					
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M			
22			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 26/12/16	mié 4/1/17	21																				
23			Montaje de Transfor	5.37 días	mié 4/1/17	jue 12/1/17	22																				
24			Instalación de Lumin	5.37 días	jue 12/1/17	jue 19/1/17	23																				
25			Correcciones	1.34 días	jue 19/1/17	vie 20/1/17	24																				
26			Remociones	2.68 días	vie 20/1/17	mié 25/1/17	25																				
27			Normalización de Sur	14.69 días	mié 25/1/17	mié 15/2/17	26																				
28			Evaluación	0 días	mié 15/2/17	mié 15/2/17	27																				
29			Etapa 3	51.21 días	lun 16/1/17	mar 28/3/17																					
30			Izaje de Postes	8.94 días	lun 16/1/17	jue 26/1/17																					
31			Armado de Estructur	5.37 días	jue 26/1/17	vie 3/2/17	30																				
32			Tendido de Conducto	7.45 días	vie 3/2/17	mar 14/2/17	31																				
33			Montaje de Transfor	5.37 días	mar 14/2/17	mié 22/2/17	32																				
34			Instalación de Lumin	5.37 días	mié 22/2/17	mié 1/3/17	33																				
35			Correcciones	1.34 días	mié 1/3/17	jue 2/3/17	34																				
36			Remociones	2.68 días	jue 2/3/17	mar 7/3/17	35																				
37			Normalización de Sur	14.69 días	mar 7/3/17	mar 28/3/17	36																				
38			Evaluación	0 días	mar 28/3/17	mar 28/3/17	37																				
39			Cierres Técnico y Admin	20 días	mar 28/3/17	lun 24/4/17																					
40			Cierre Técnico	20 días	mar 28/3/17	lun 24/4/17																					
41			Cierre Administrativo	15 días	mar 25/4/17	lun 15/5/17	40																				
42			Evaluación	0 días	lun 15/5/17	lun 15/5/17	41																				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104


17 jul '16
24 jul '16
31 jul '16
7 ago '16
14 ago '16
21 ago '16

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

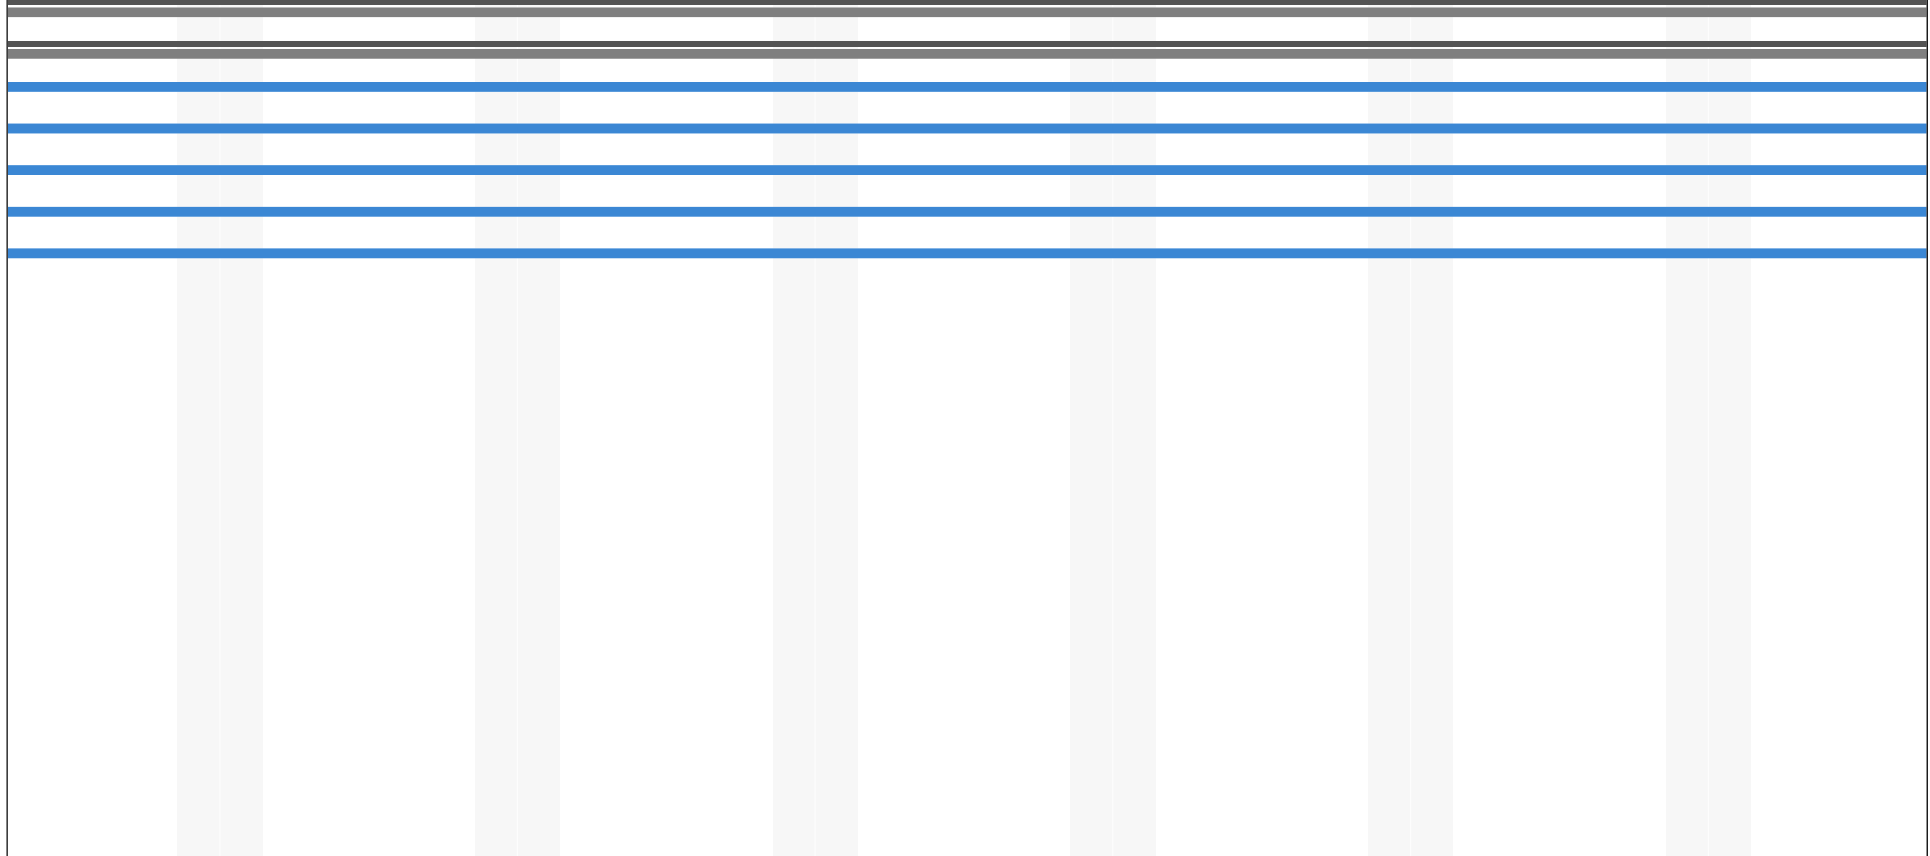


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

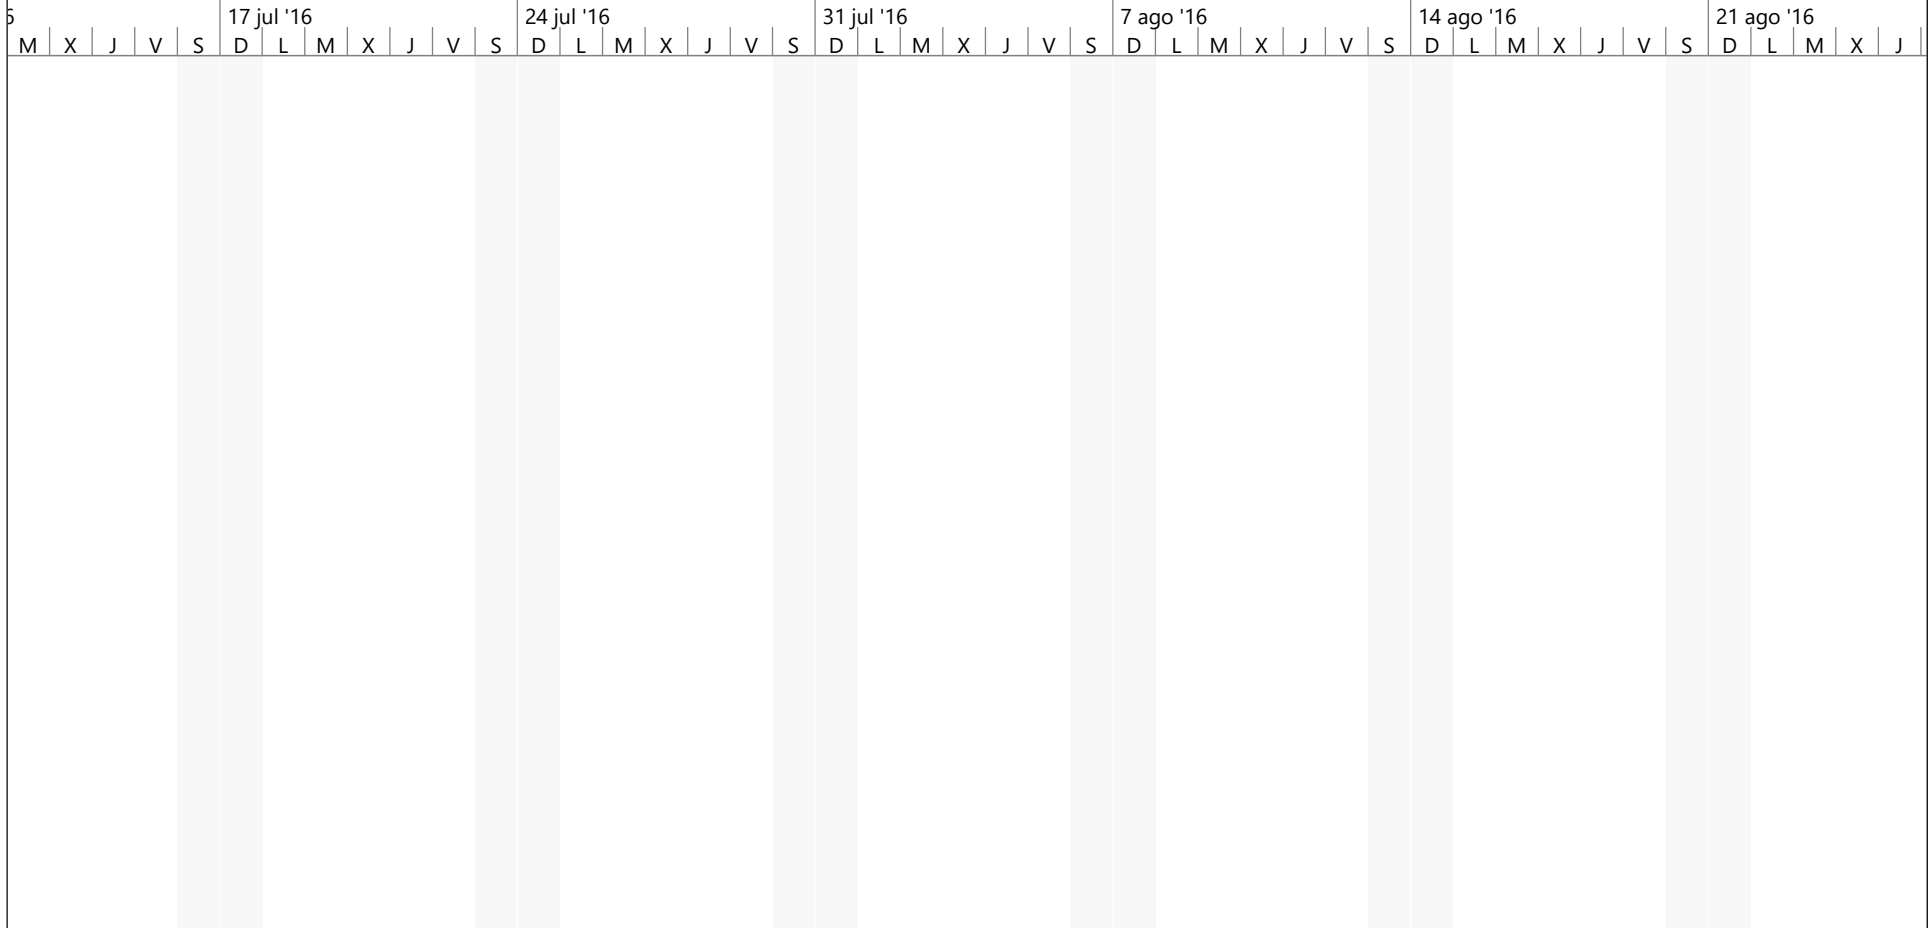


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

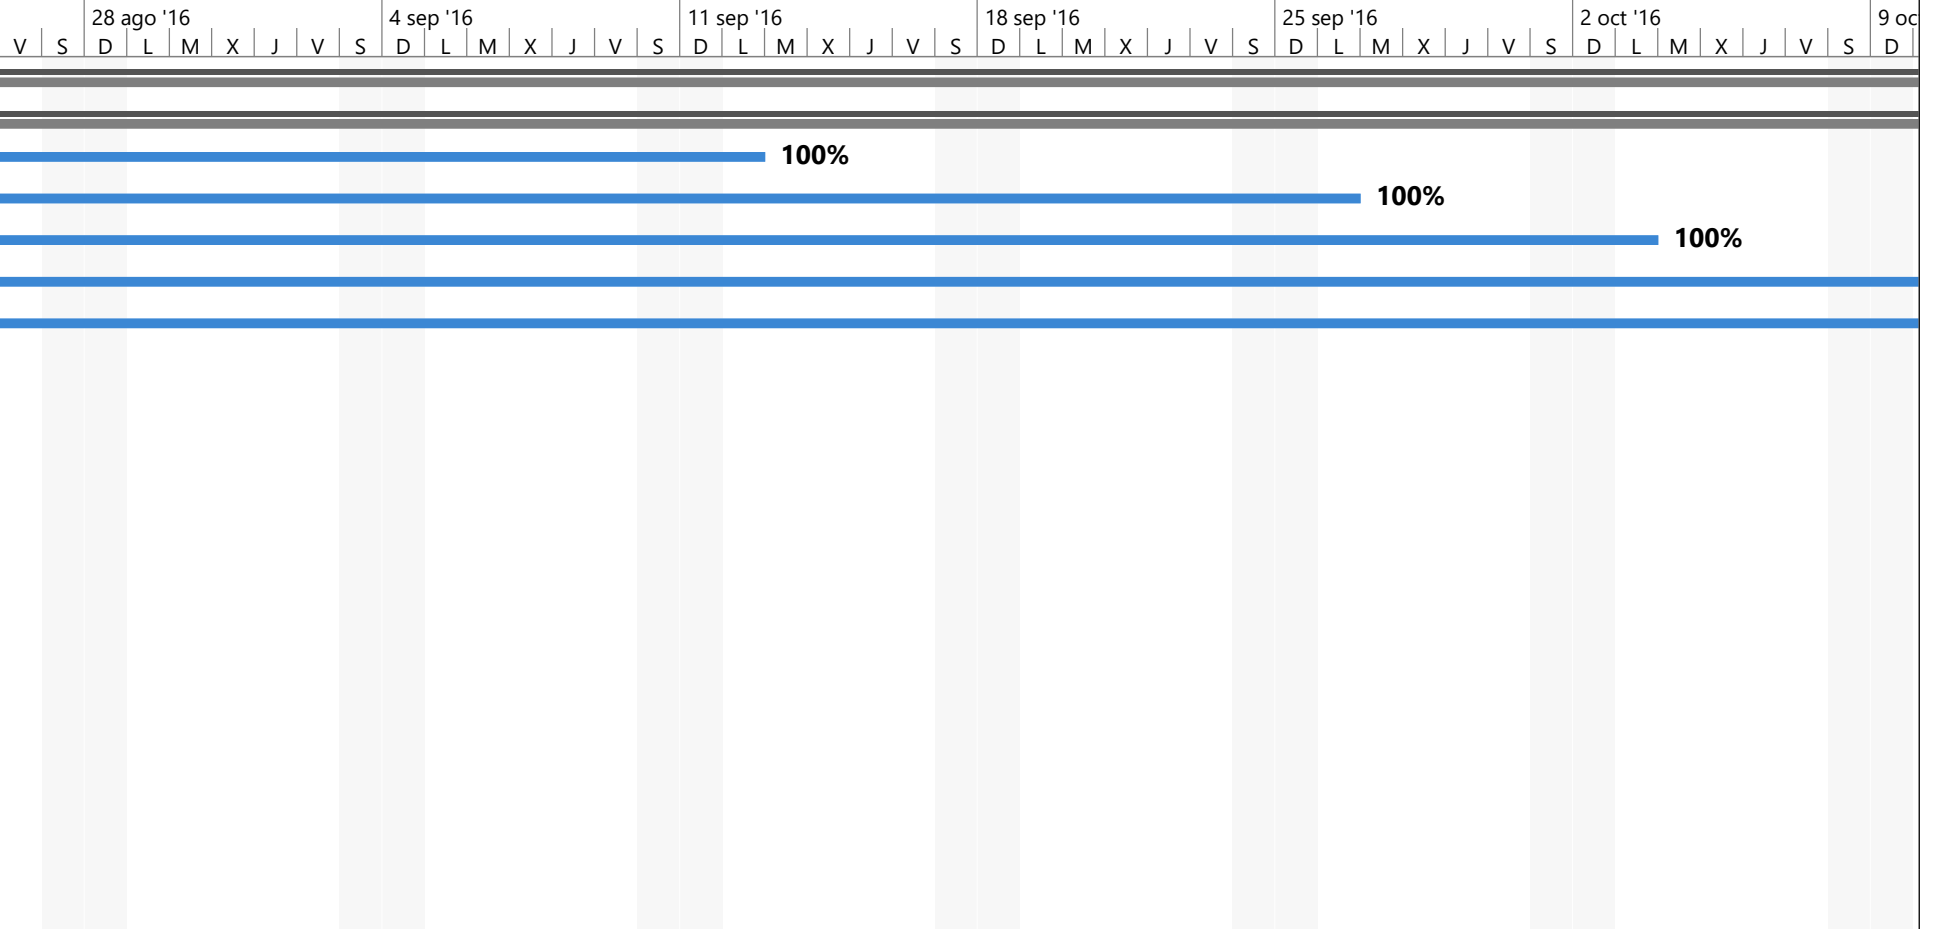

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo SALC104

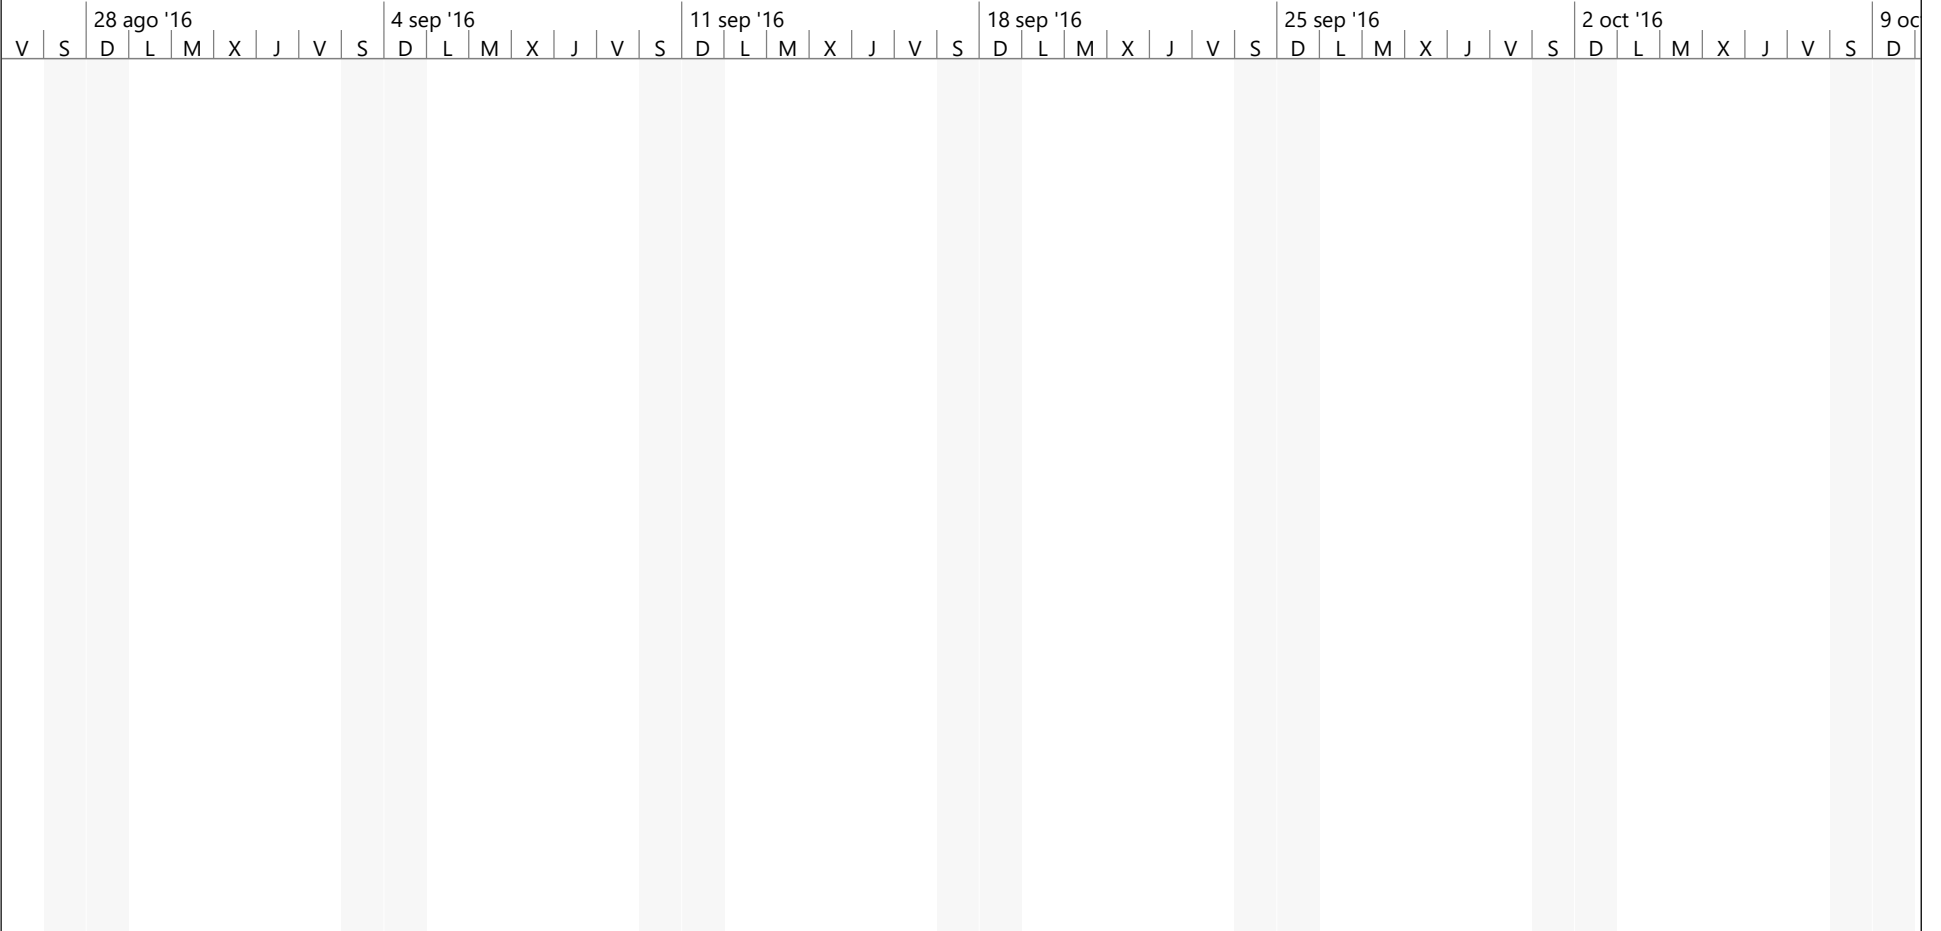

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

ct '16 | 16 oct '16 | 23 oct '16 | 30 oct '16 | 6 nov '16 | 13 nov '16 | 20 nov '16
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

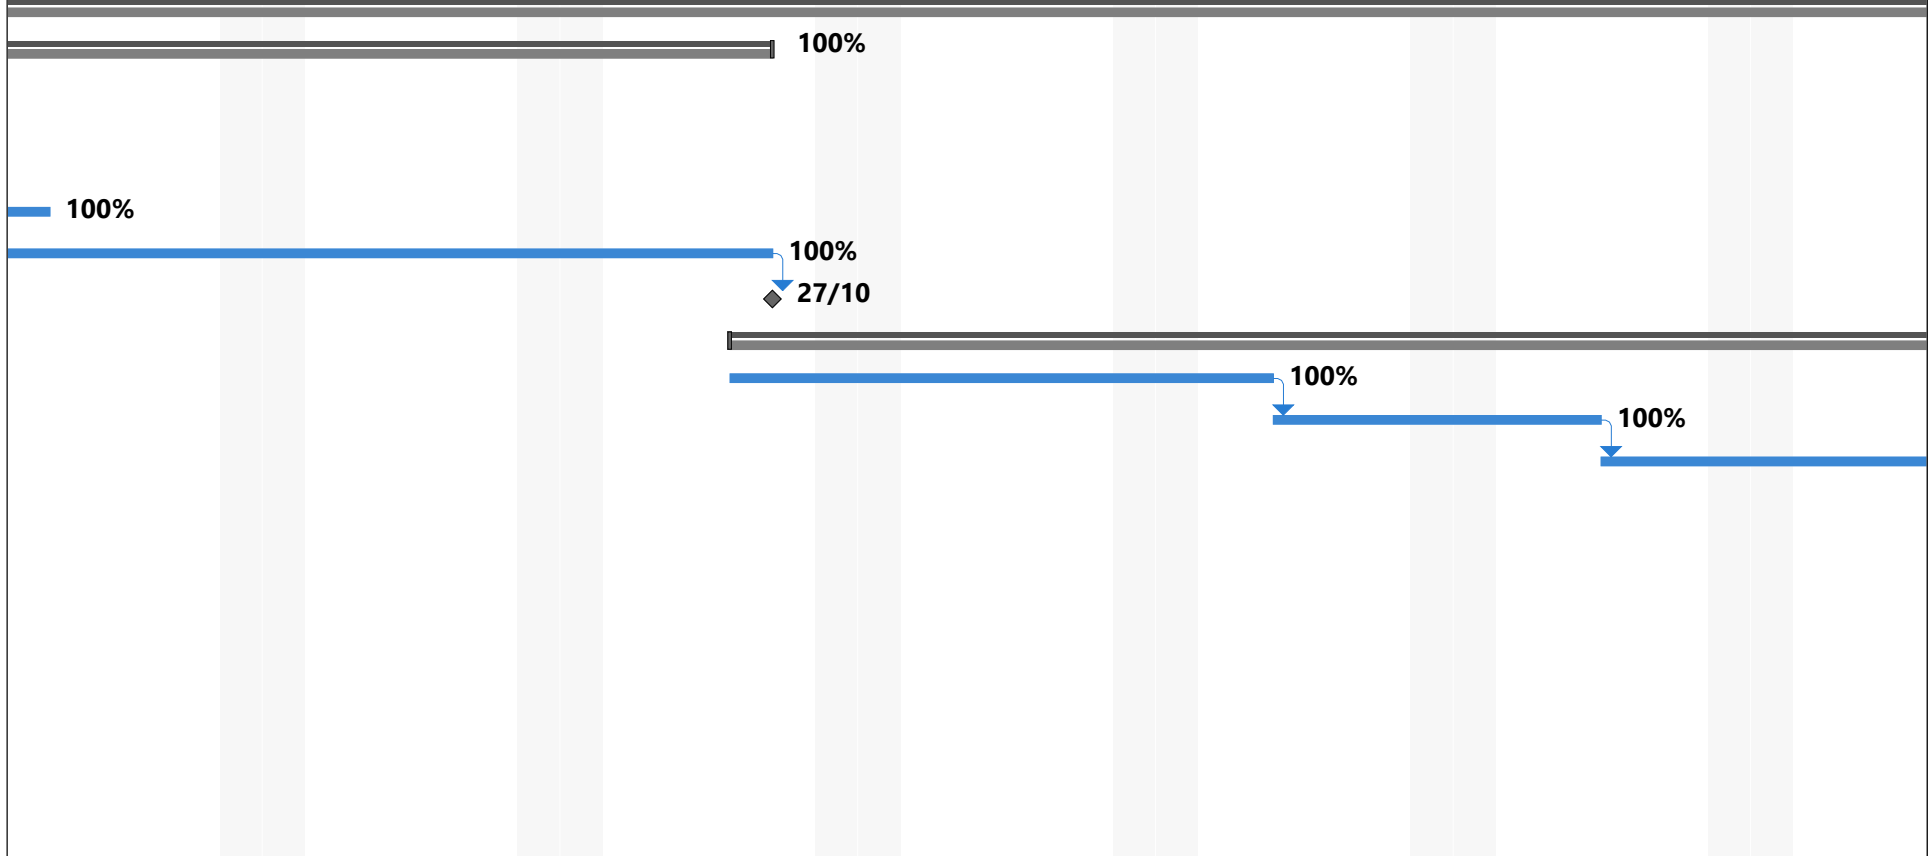

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo SALC104



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo SALC104

J V S | 27 nov '16 | D L M X J V S | 4 dic '16 | D L M X J V S | 11 dic '16 | D L M X J V S | 18 dic '16 | D L M X J V S | 25 dic '16 | D L M X J V S | 1 ene '17 | D L M X J V S

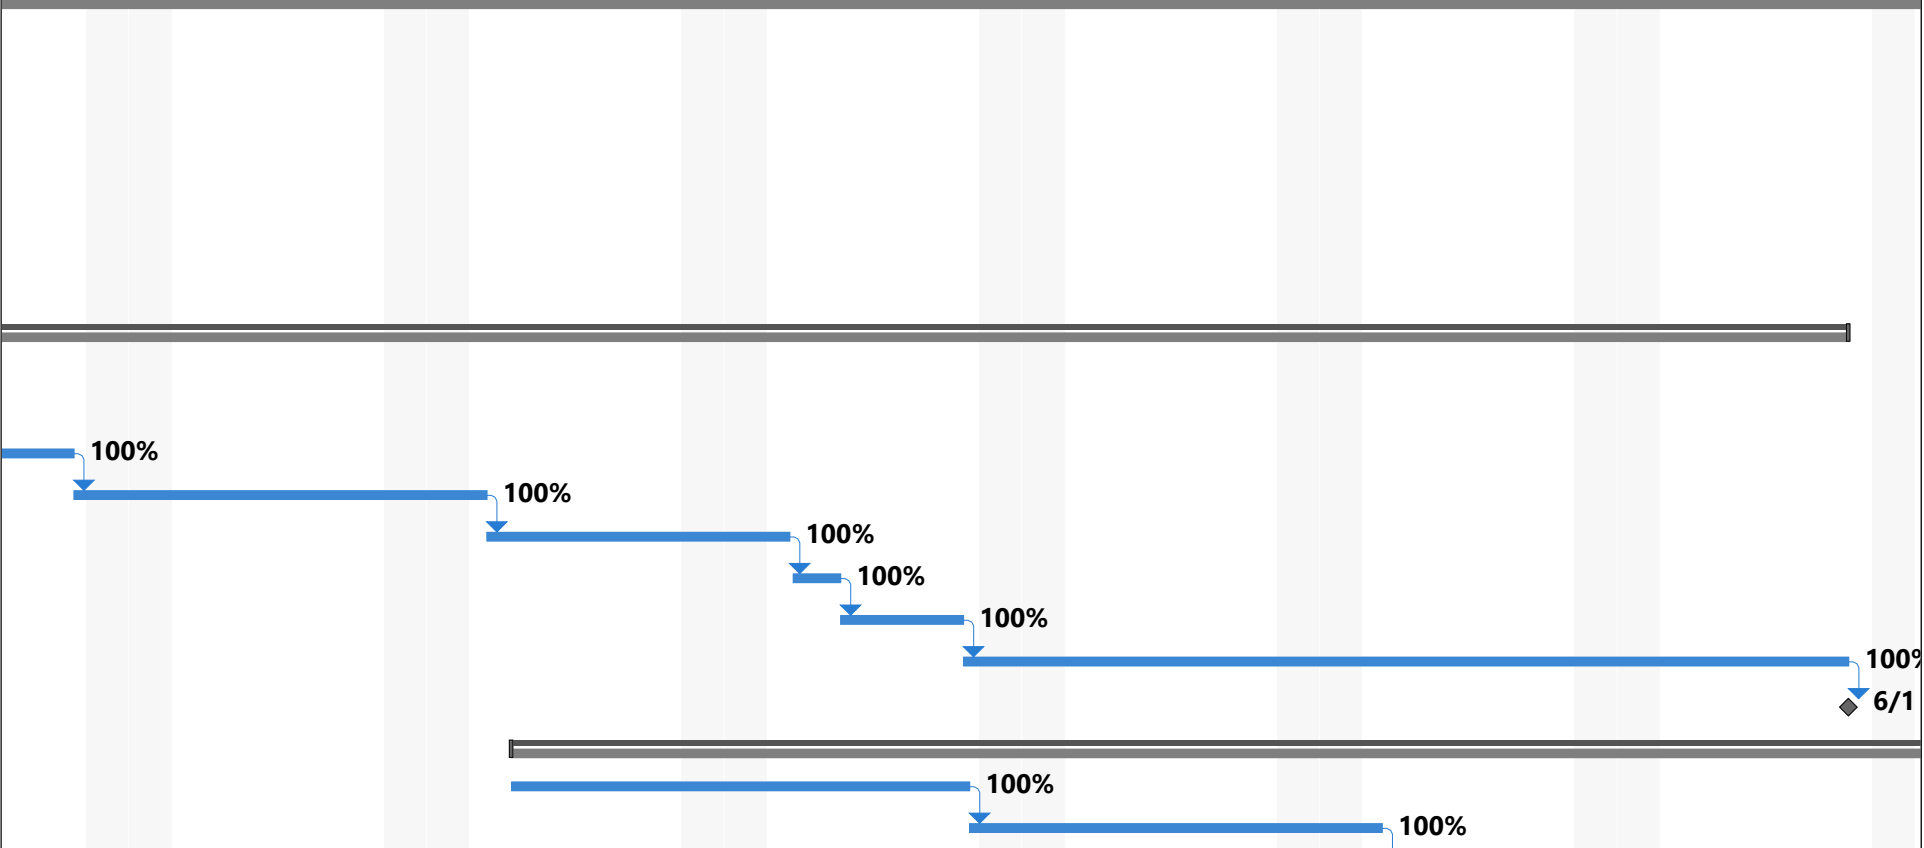

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

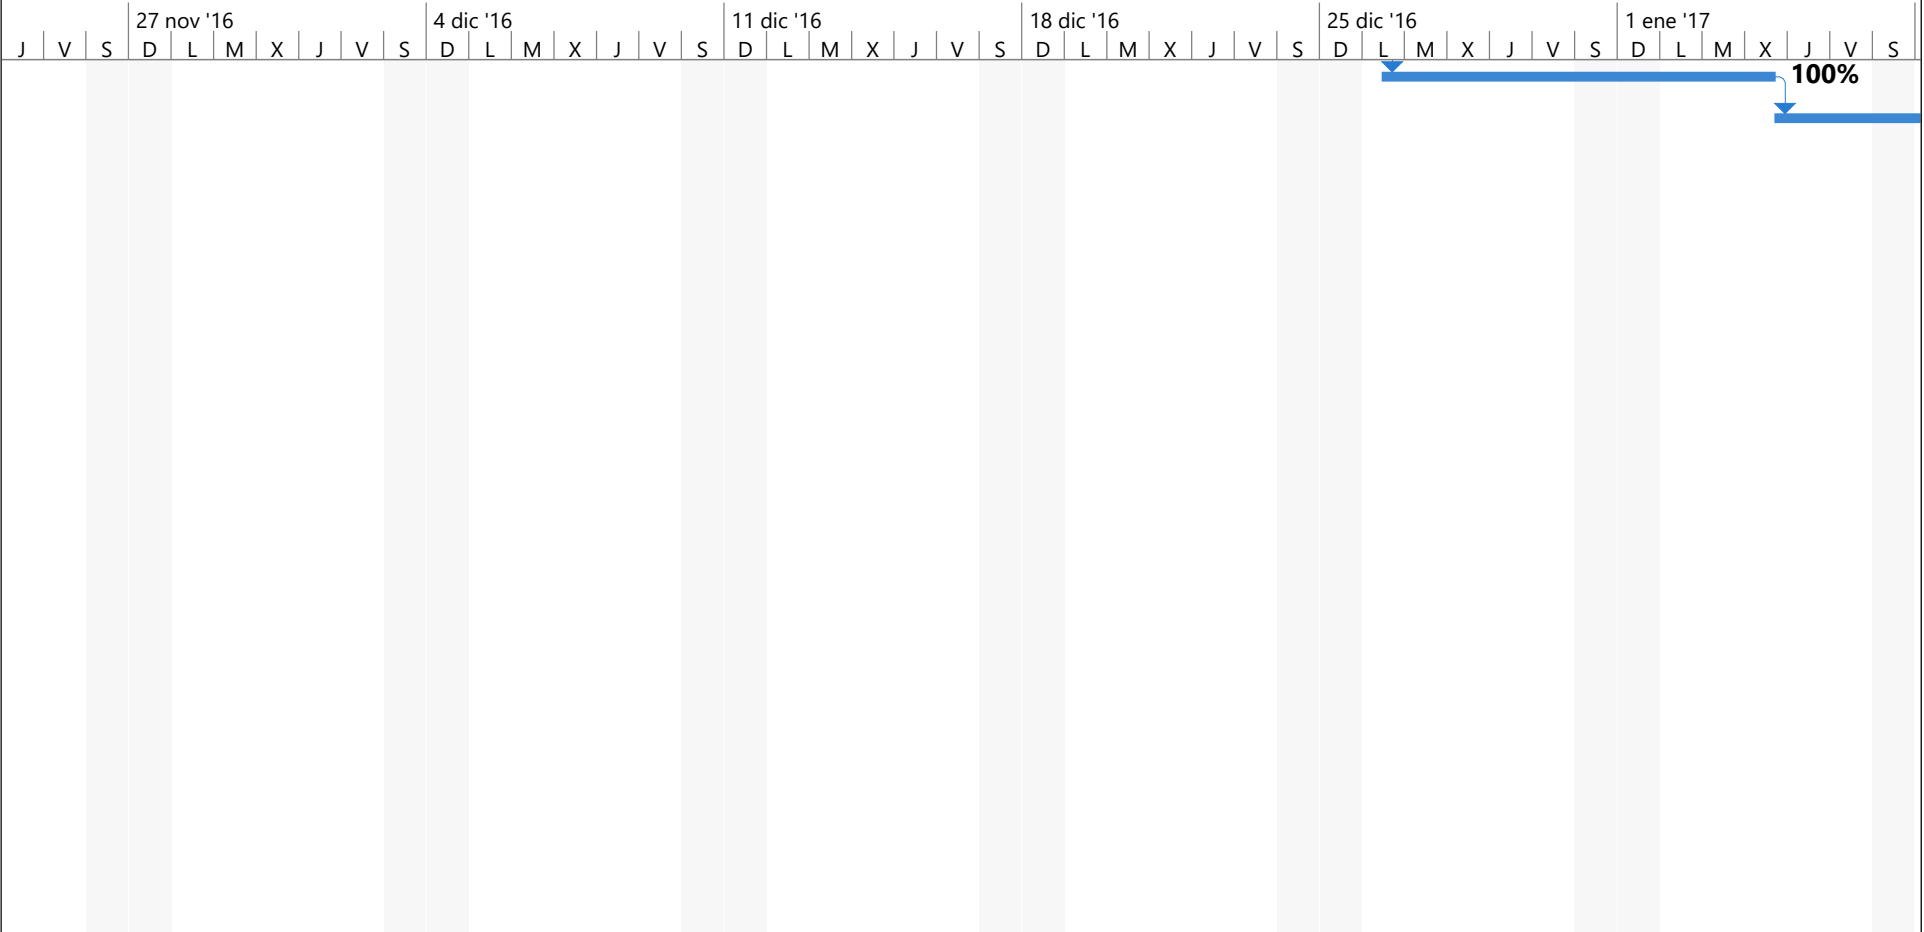

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha limite	

Cronograma Modelo SALC104

8 ene '17 15 ene '17 22 ene '17 29 ene '17 5 feb '17 12 feb '17 19 feb '17


D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M



0%
1

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

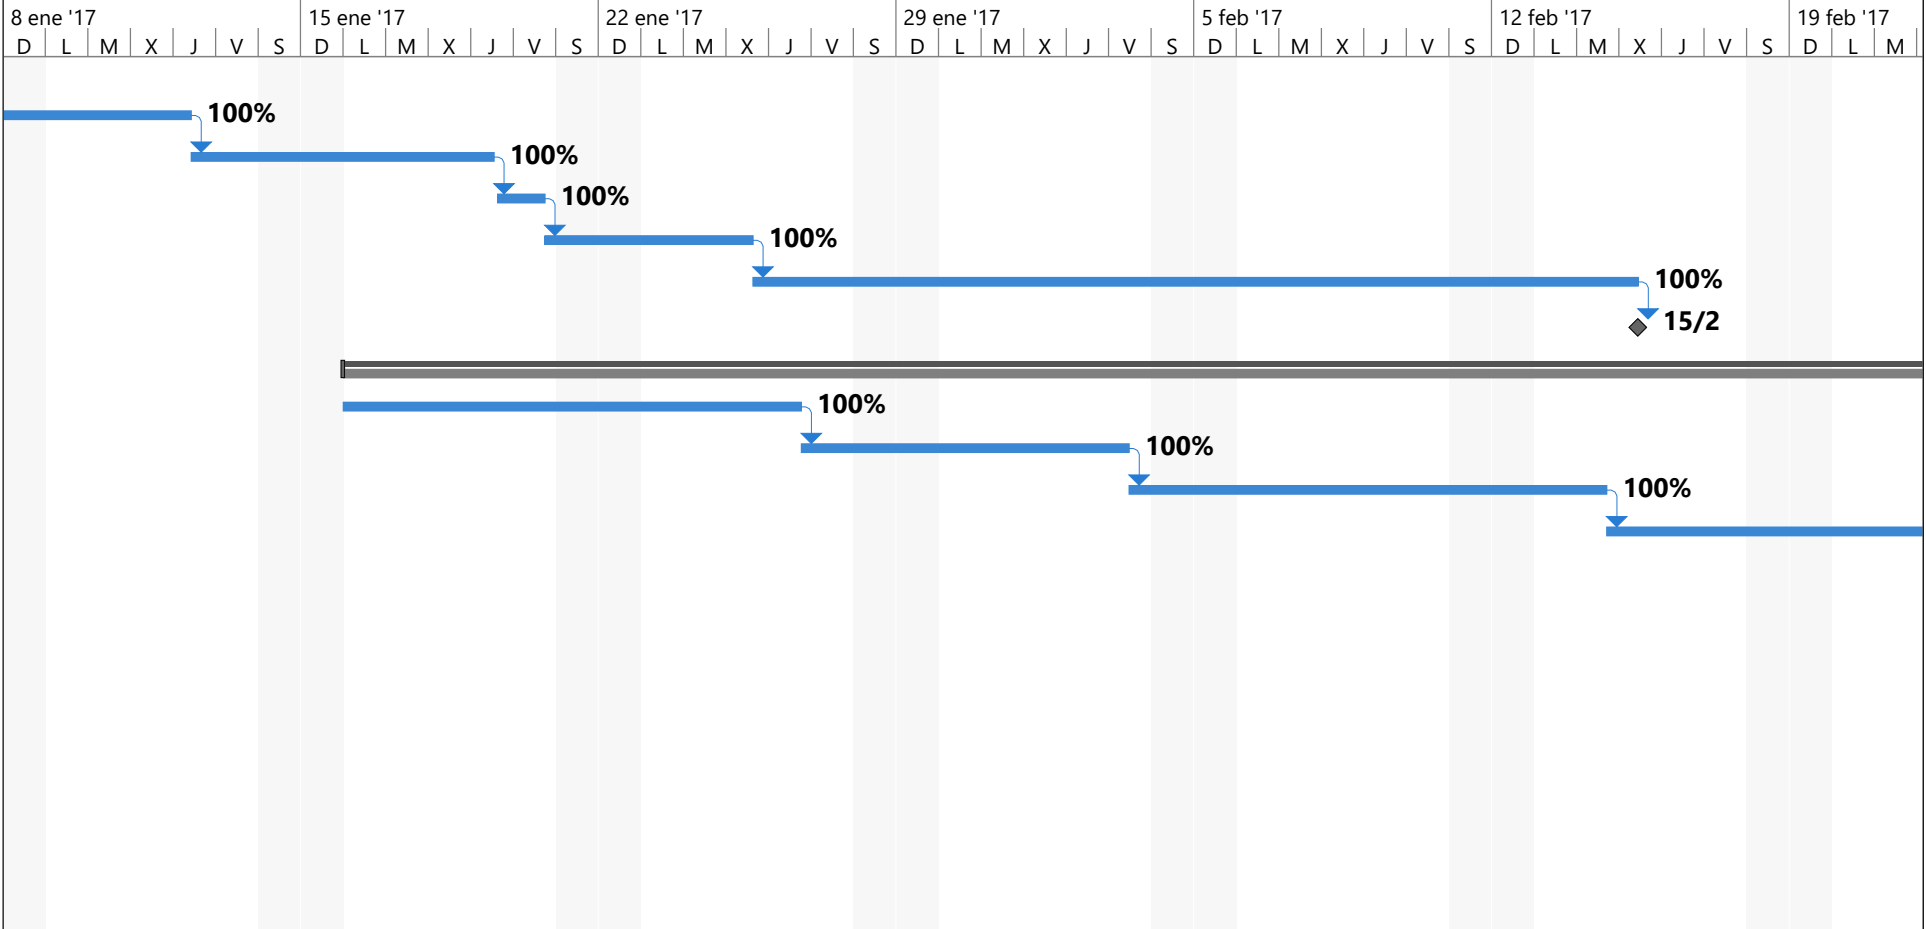


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

26 feb '17
5 mar '17
12 mar '17
19 mar '17
26 mar '17
2 abr '17


X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S

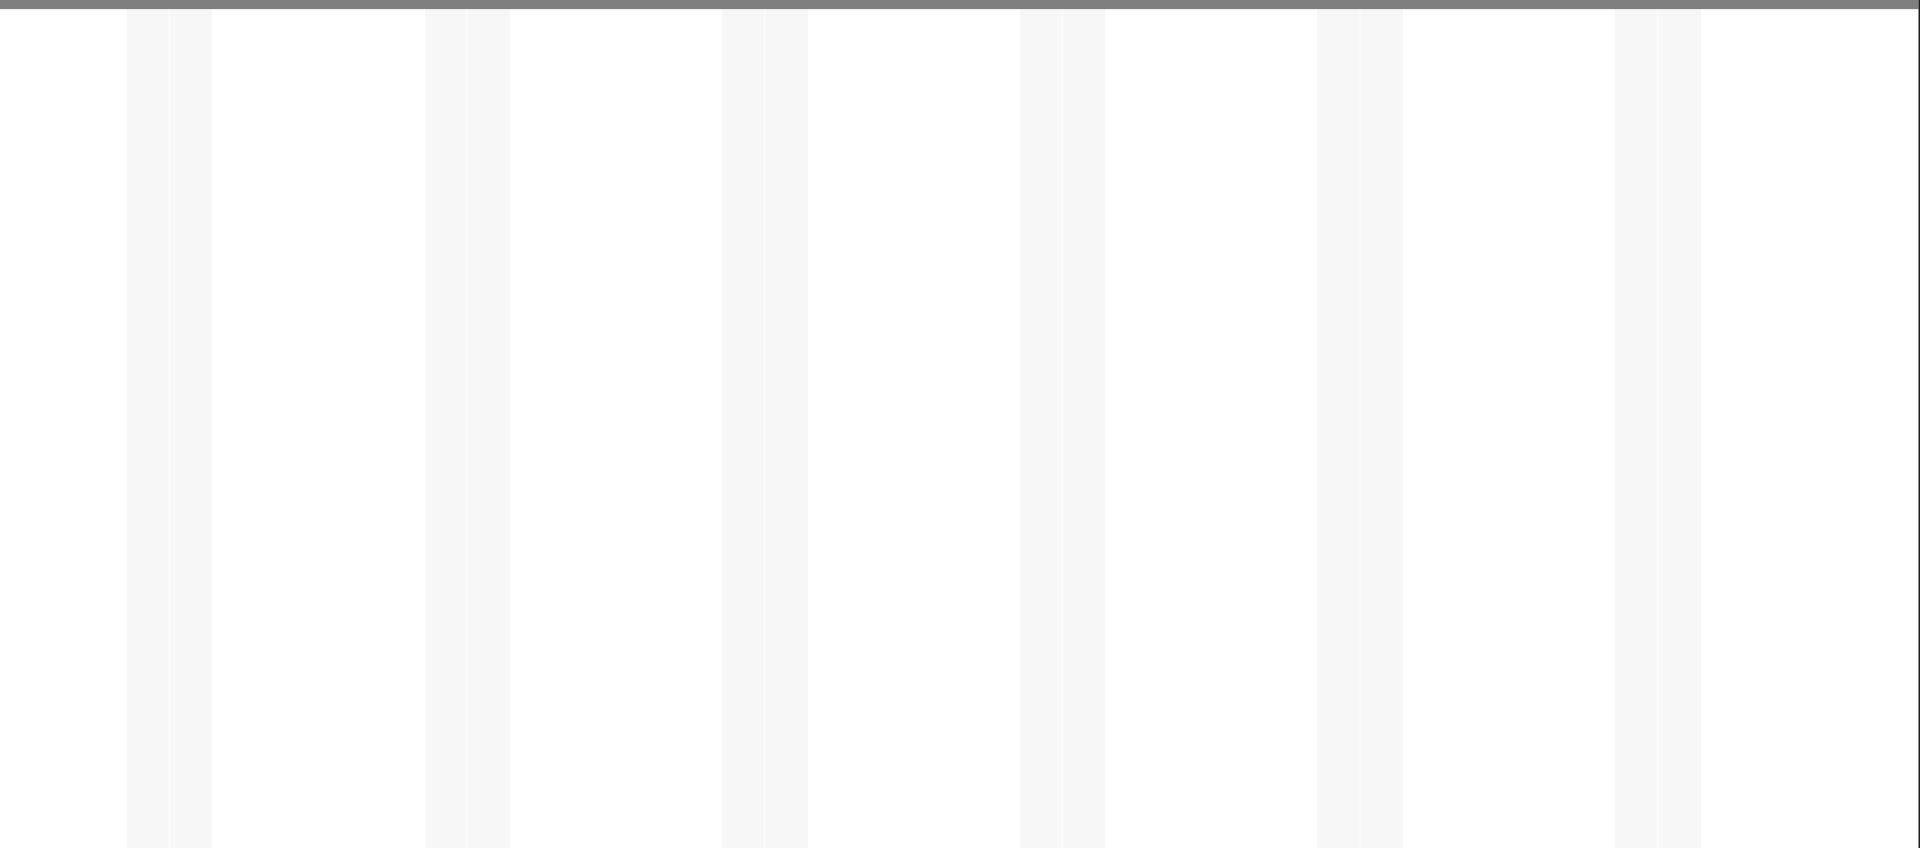

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo SALC104

X J V S 26 feb '17 D L M X J V S 5 mar '17 D L M X J V S 12 mar '17 D L M X J V S 19 mar '17 D L M X J V S 26 mar '17 D L M X J V S 2 abr '17 D L M X J V

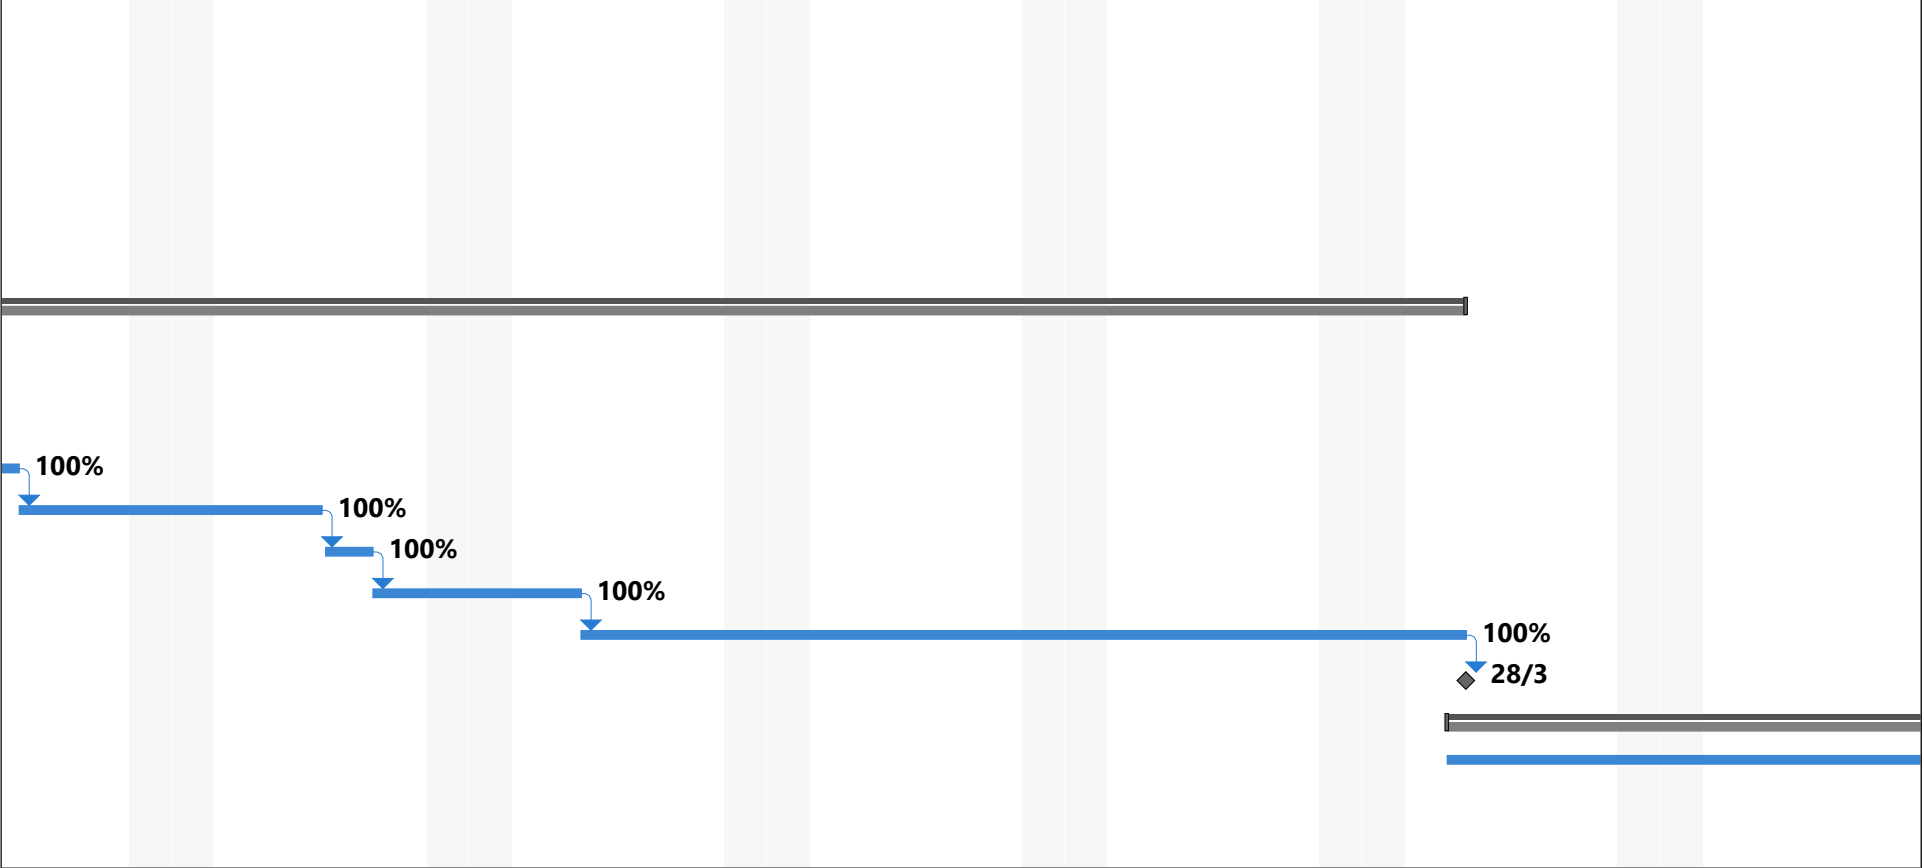


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

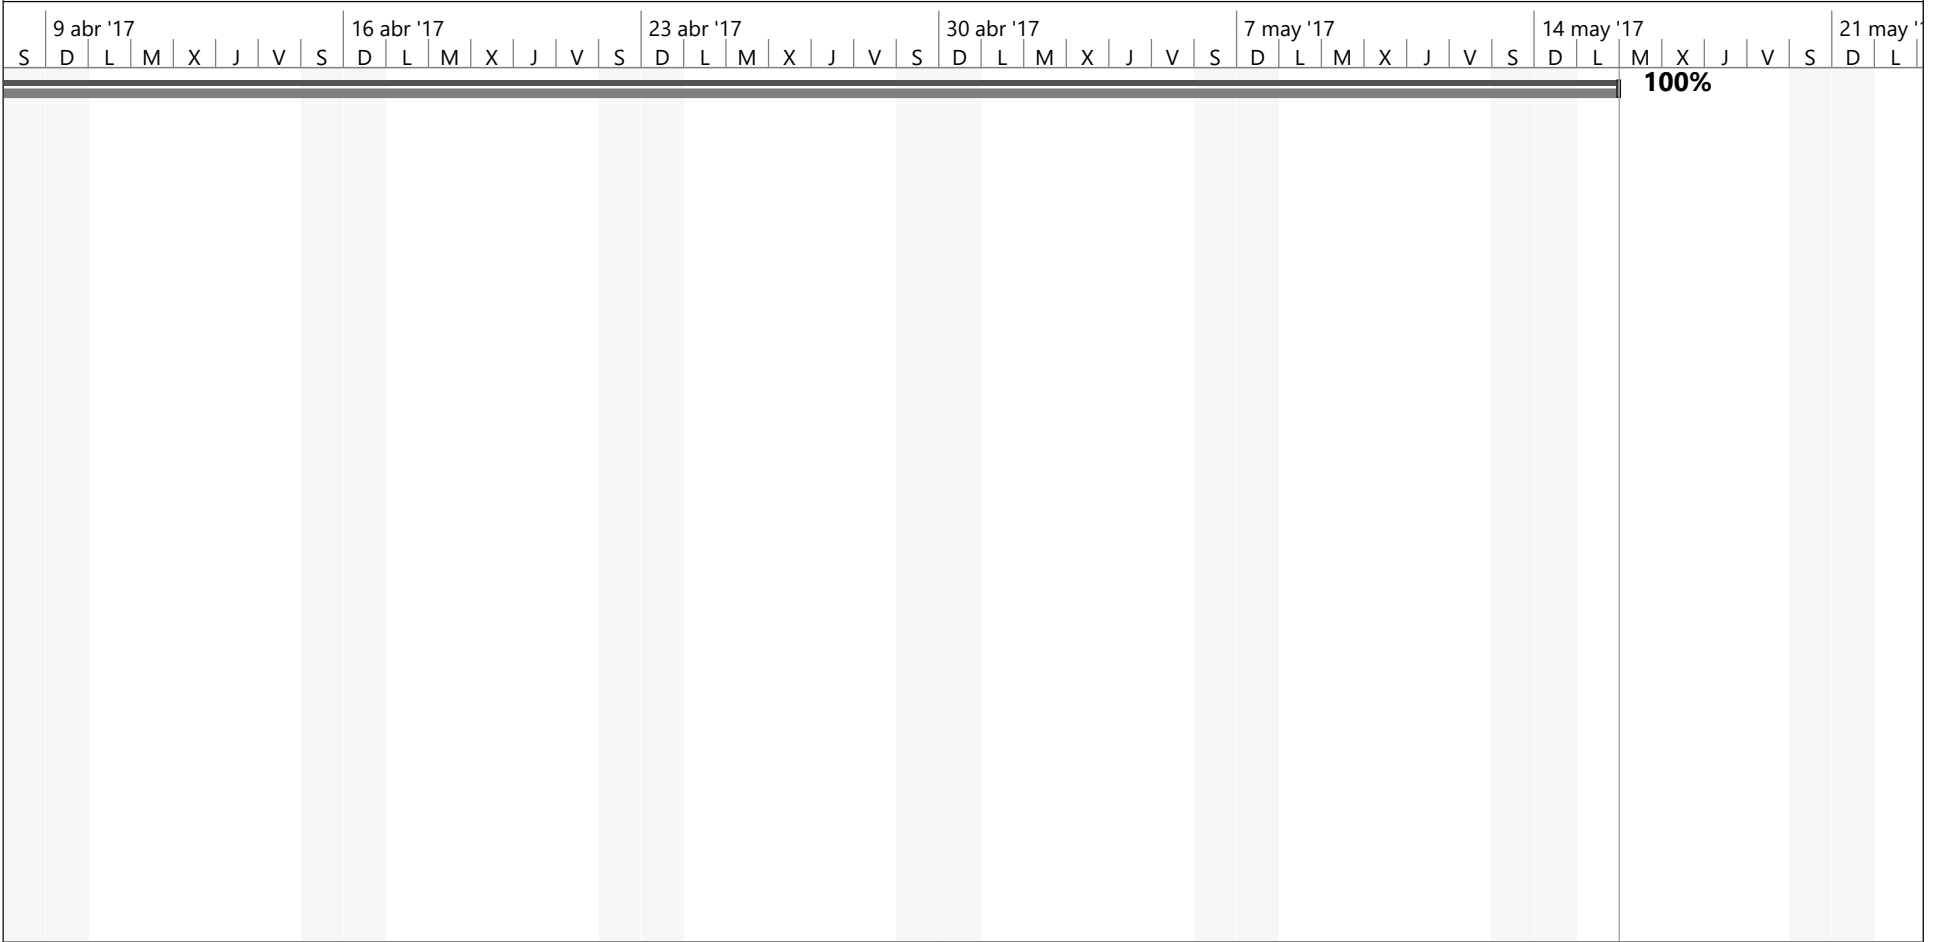

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo SALC104

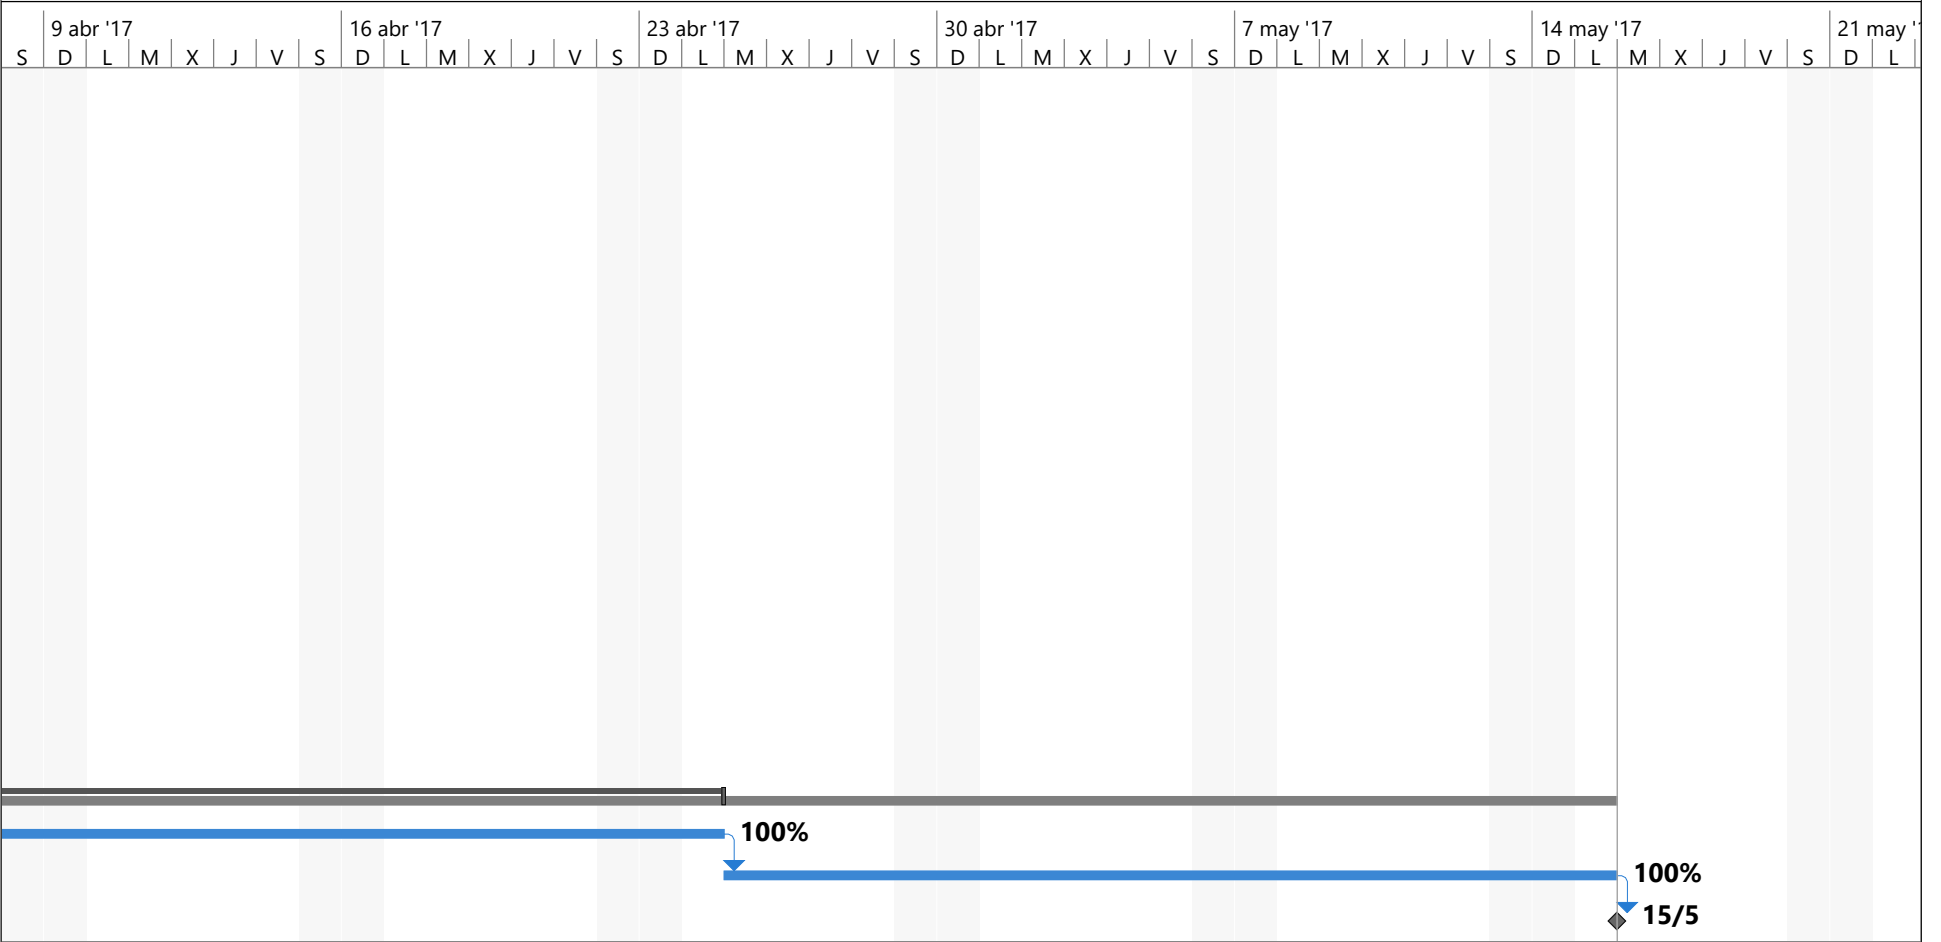

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
