




































Cronograma Modelo ZFSA114

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16												
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S			
22			Tendido de Conducto	7.45 días	mié 15/3/17	vie 24/3/17	21																			
23			Montaje de Transfor	5.37 días	vie 24/3/17	lun 3/4/17	22																			
24			Instalación de Lumin	5.37 días	lun 3/4/17	lun 10/4/17	23																			
25			Correcciones	1.34 días	lun 10/4/17	mar 11/4/17	24																			
26			Remociones	2.68 días	mar 11/4/17	vie 14/4/17	25																			
27			Normalización de Su	14.69 días	vie 14/4/17	vie 5/5/17	26																			
28			Evaluación	0 días	vie 5/5/17	vie 5/5/17	27																			
29			Etapas 4 y 5	51.21 días	mar 25/4/17	mié 5/7/17																				
30			Izaje de Postes	8.94 días	mar 25/4/17	vie 5/5/17																				
31			Armado de Estructur	5.37 días	vie 5/5/17	lun 15/5/17	30																			
32			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 15/5/17	mié 24/5/17	31																			
33			Montaje de Transfor	5.37 días	mié 24/5/17	jue 1/6/17	32																			
34			Instalación de Lumin	5.37 días	jue 1/6/17	jue 8/6/17	33																			
35			Correcciones	1.34 días	jue 8/6/17	vie 9/6/17	34																			
36			Remociones	2.68 días	vie 9/6/17	mié 14/6/17	35																			
37			Normalización de Su	14.69 días	mié 14/6/17	mié 5/7/17	36																			
38			Evaluación	0 días	mié 5/7/17	mié 5/7/17	37																			
39			Etapas 6 y 7	51.21 días	vie 9/6/17	lun 21/8/17																				
40			Izaje de Postes	8.94 días	vie 9/6/17	mié 21/6/17																				
41			Armado de Estructur	5.37 días	mié 21/6/17	jue 29/6/17	40																			
42			Tendido de Conducto	7.45 días	jue 29/6/17	lun 10/7/17	41																			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16												
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S			
43			Montaje de Transfor	5.37 días	lun 10/7/17	mar 18/7/17	42																				
44			Instalación de Lumin	5.37 días	mar 18/7/17	mar 25/7/17	43																				
45			Correcciones	1.34 días	mar 25/7/17	mié 26/7/17	44																				
46			Remociones	2.68 días	mié 26/7/17	lun 31/7/17	45																				
47			Normalización de Sur	14.69 días	lun 31/7/17	lun 21/8/17	46																				
48			Evaluación	0 días	lun 21/8/17	lun 21/8/17	47																				
49			Cierres Técnico y Adm	46 días	lun 21/8/17	lun 23/10/17																					
50			Cierre Técnico	24 días	lun 21/8/17	jue 21/9/17																					
51			Cierre Administrativo	22 días	vie 22/9/17	lun 23/10/17	50																				
52			Evaluación	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	51																				

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114


25 sep '16
2 oct '16
9 oct '16
16 oct '16
23 oct '16
30 oct '16
6 nov '16

S D L M X J V S S D L M X J V S S D L M X J V S S D L M X J V S S D L M X J V S S D L M X J V S S D L M X J V S

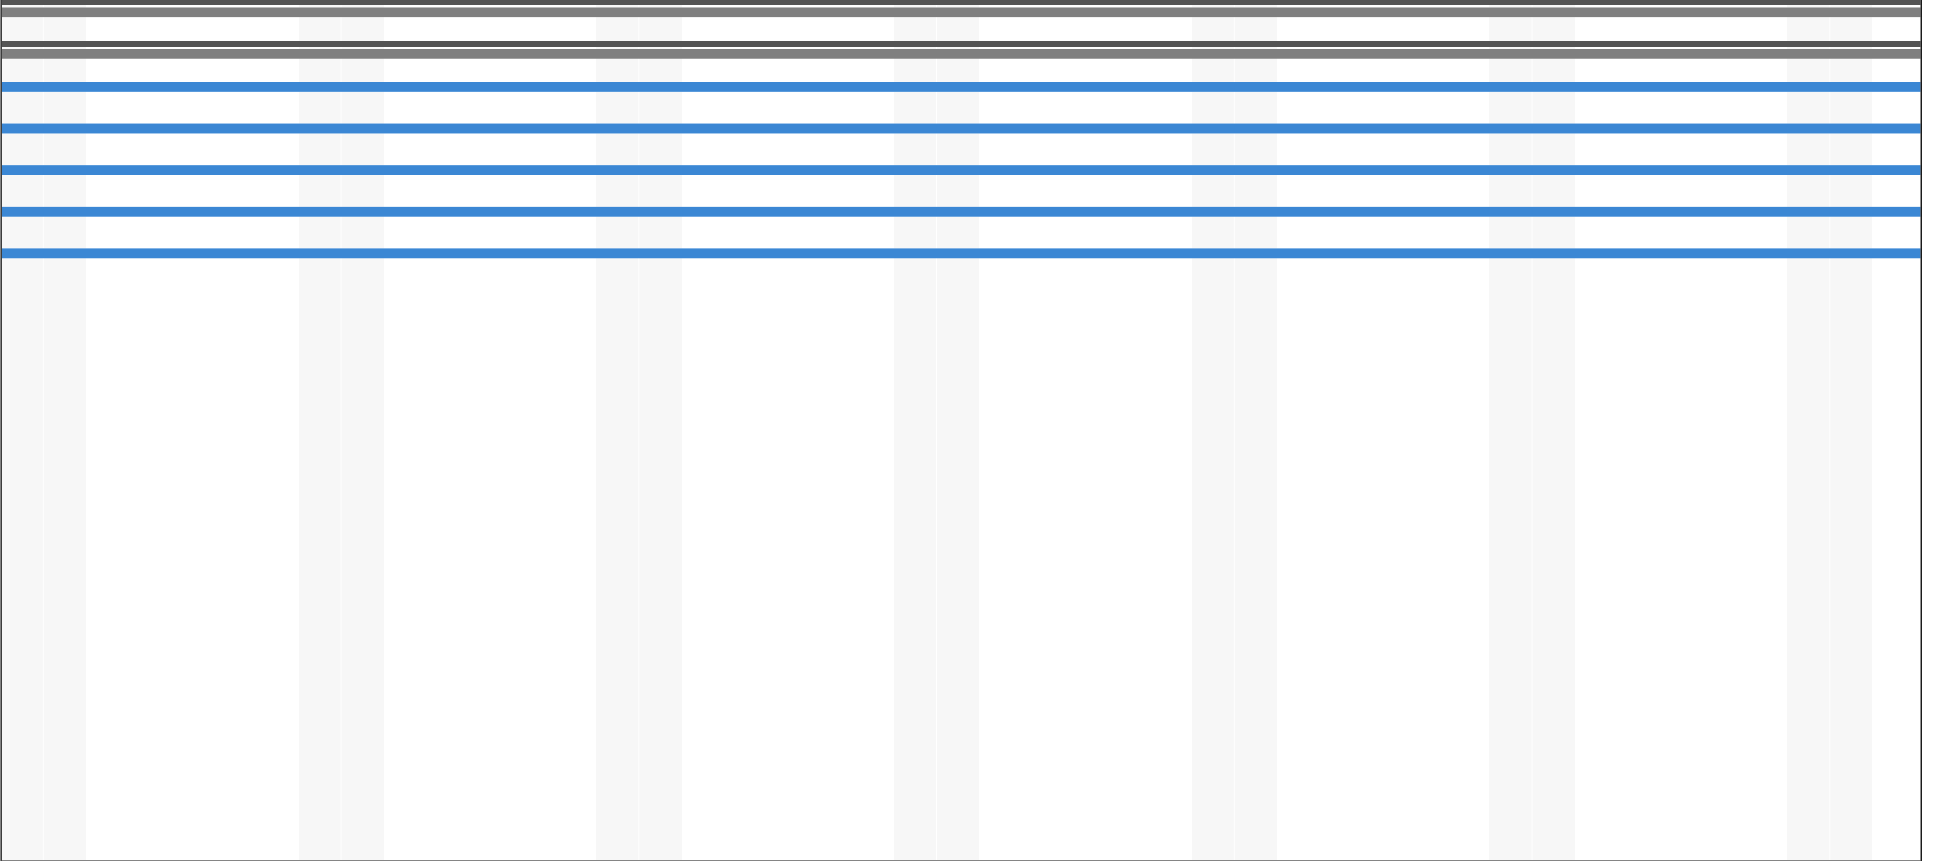


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

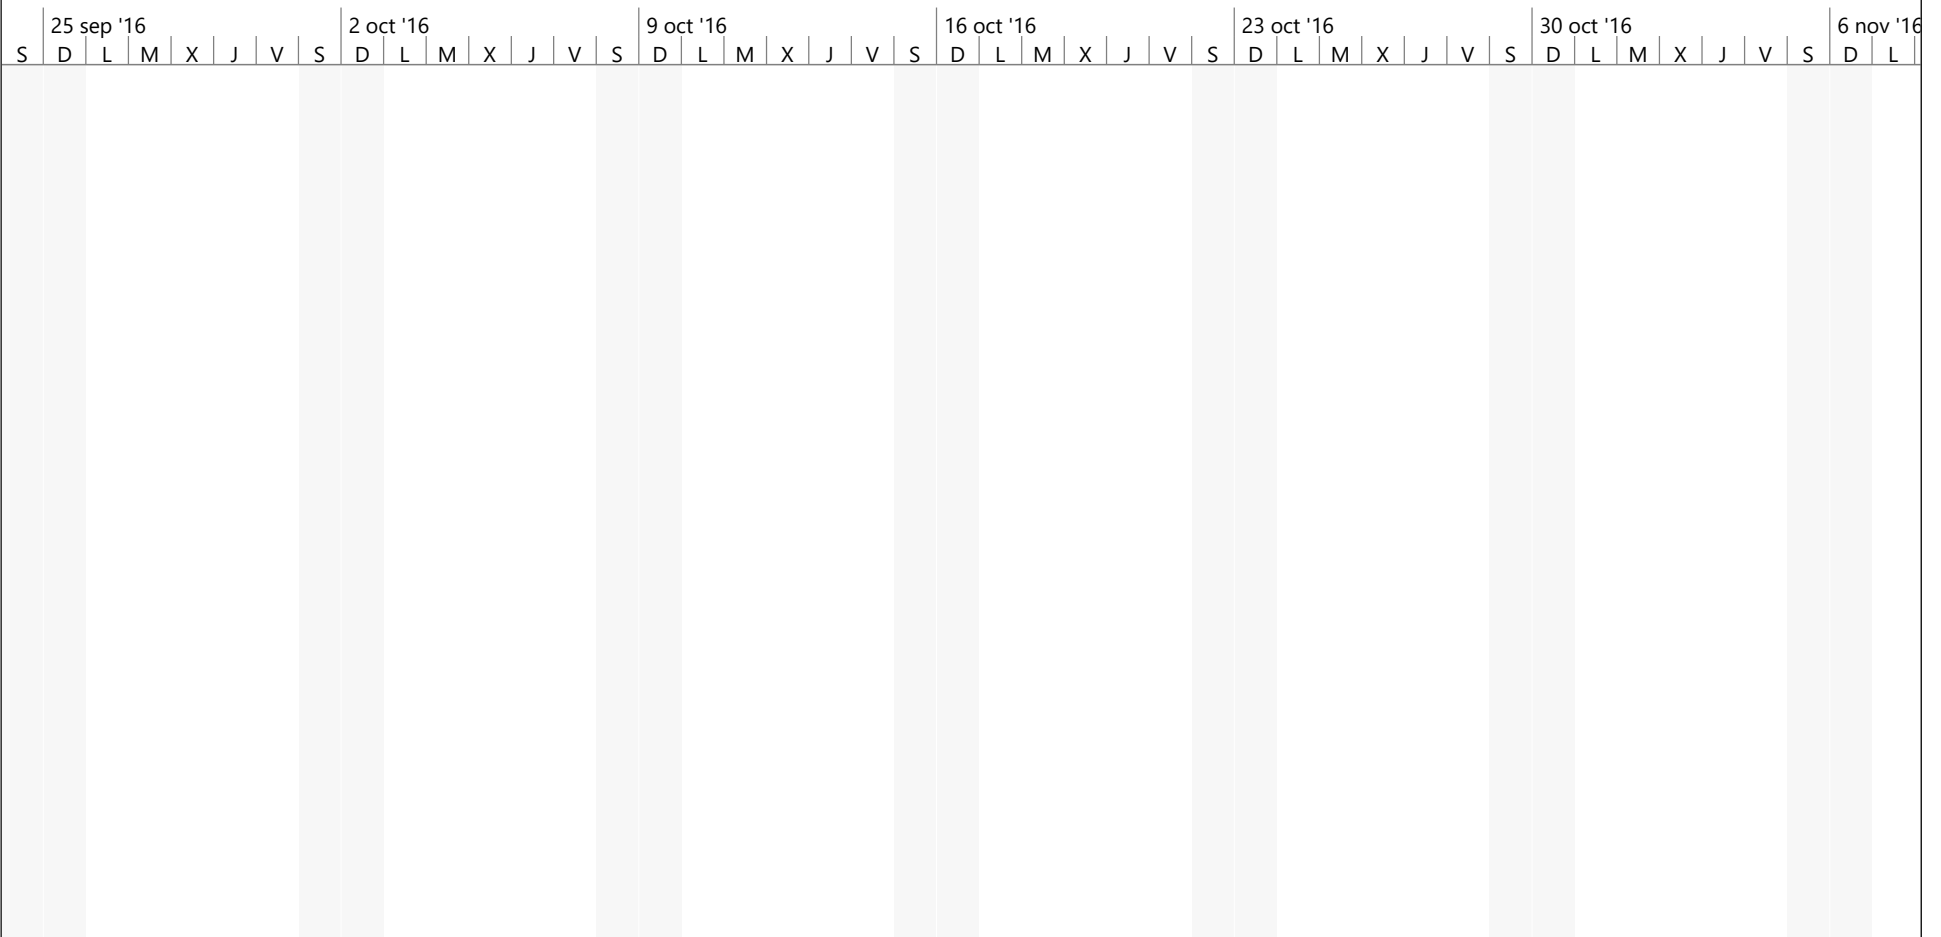

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

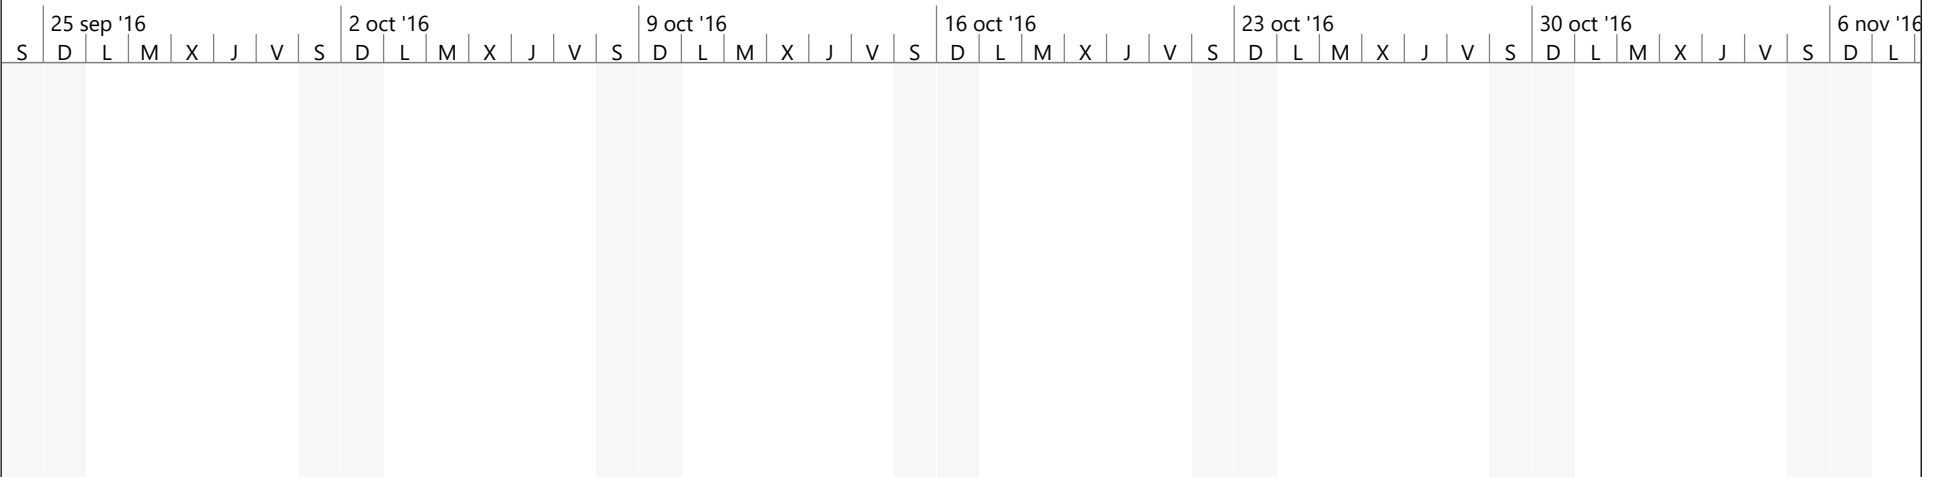

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

6 M X J V S 13 nov '16 20 nov '16 27 nov '16 4 dic '16 11 dic '16 18 dic '16
 M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

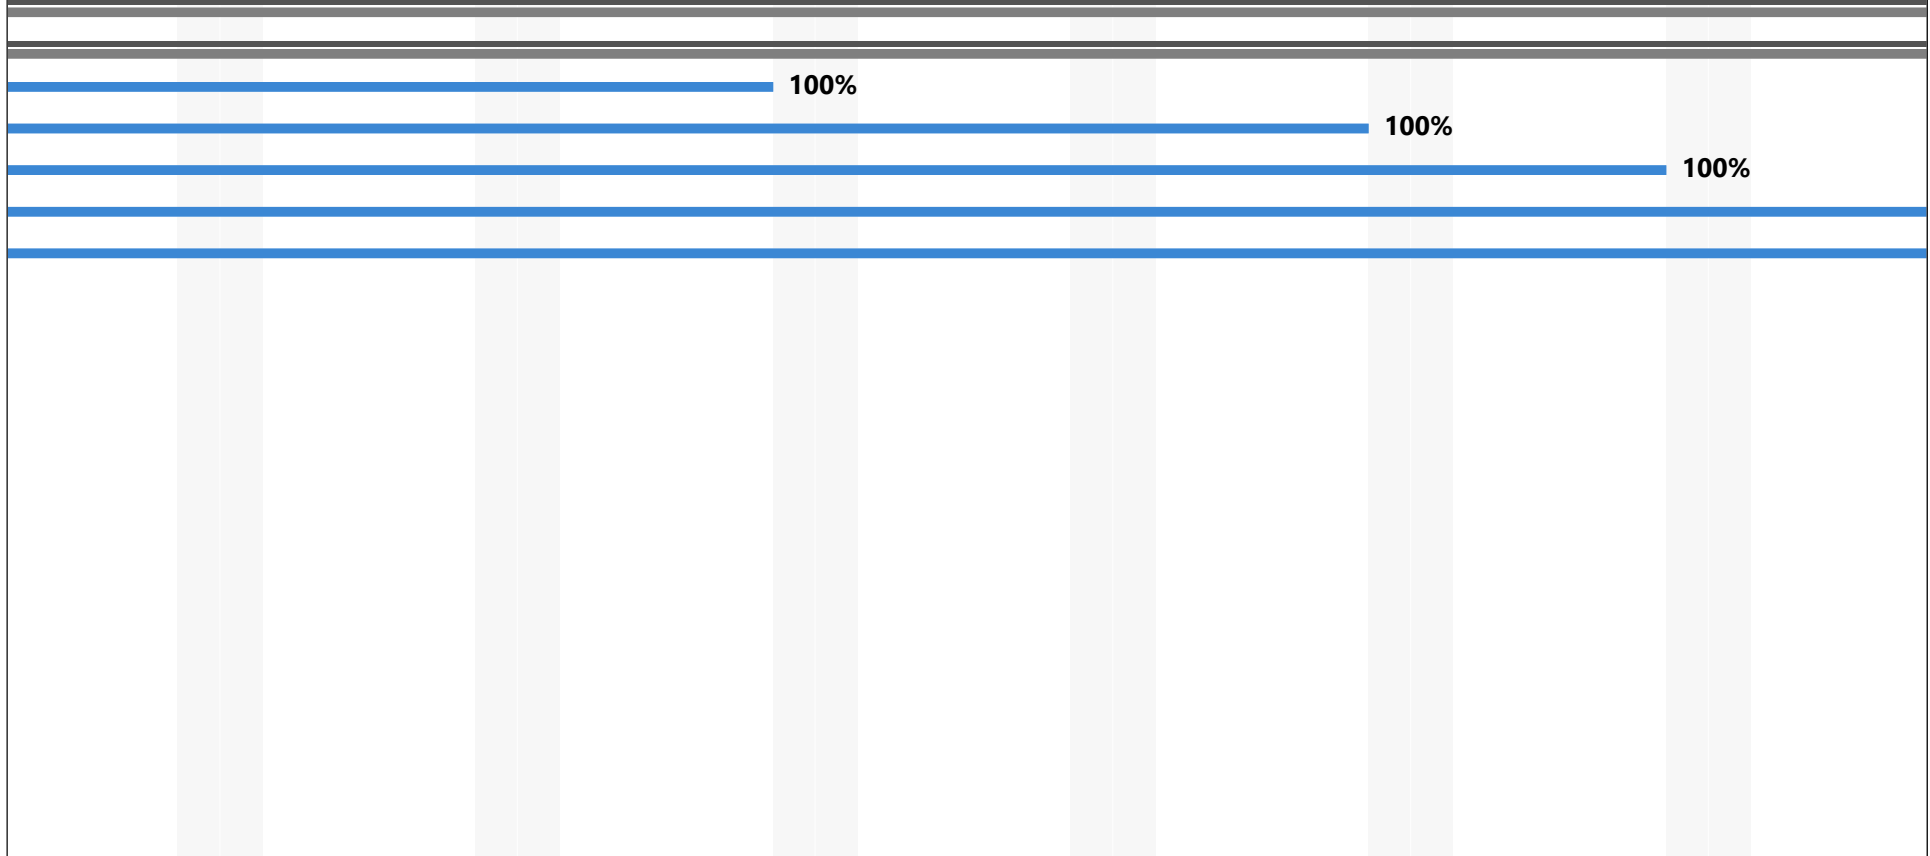

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

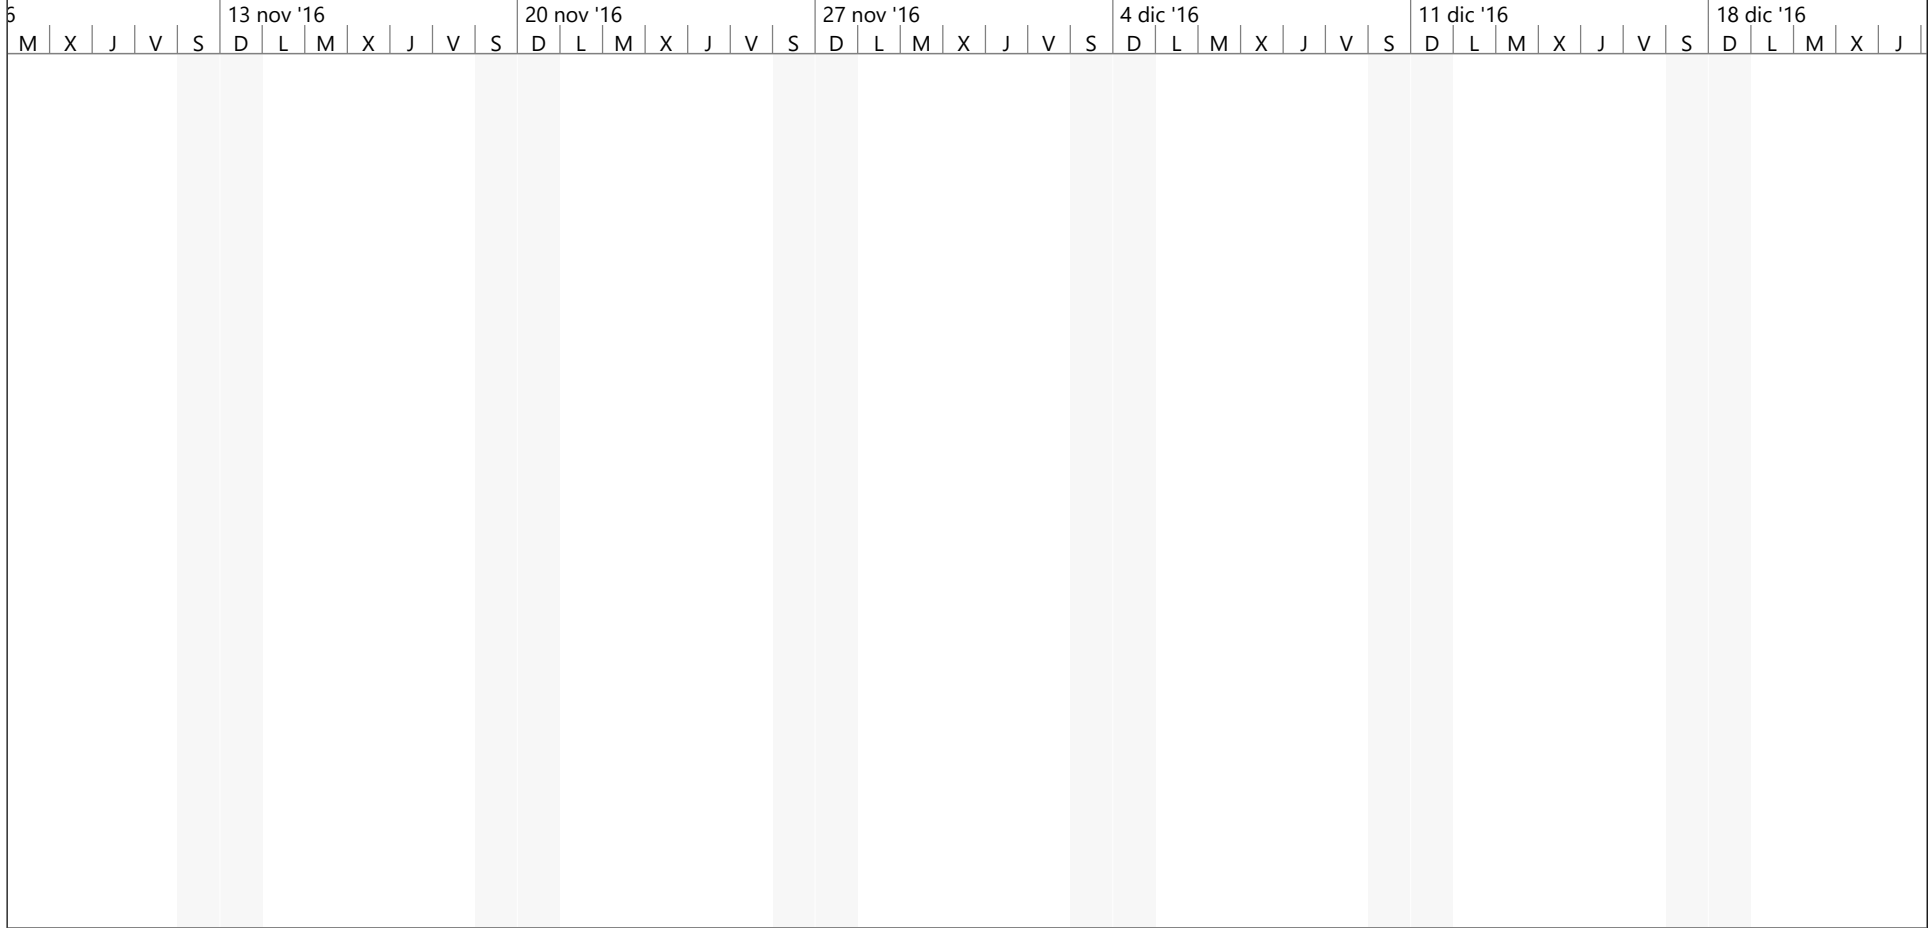

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

5 M X J V S 13 nov '16 D L M X J V S 20 nov '16 D L M X J V S 27 nov '16 D L M X J V S 4 dic '16 D L M X J V S 11 dic '16 D L M X J V S 18 dic '16 D L M X J

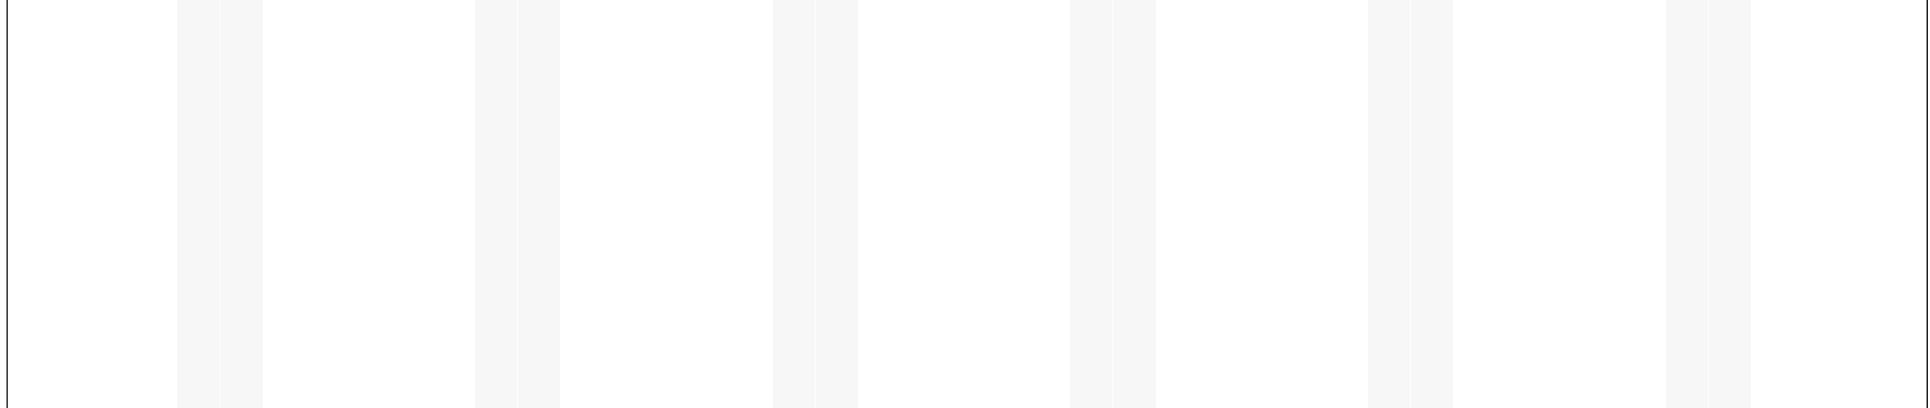


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

25 dic '16 1 ene '17 8 ene '17 15 ene '17 22 ene '17 29 ene '17 5 feb

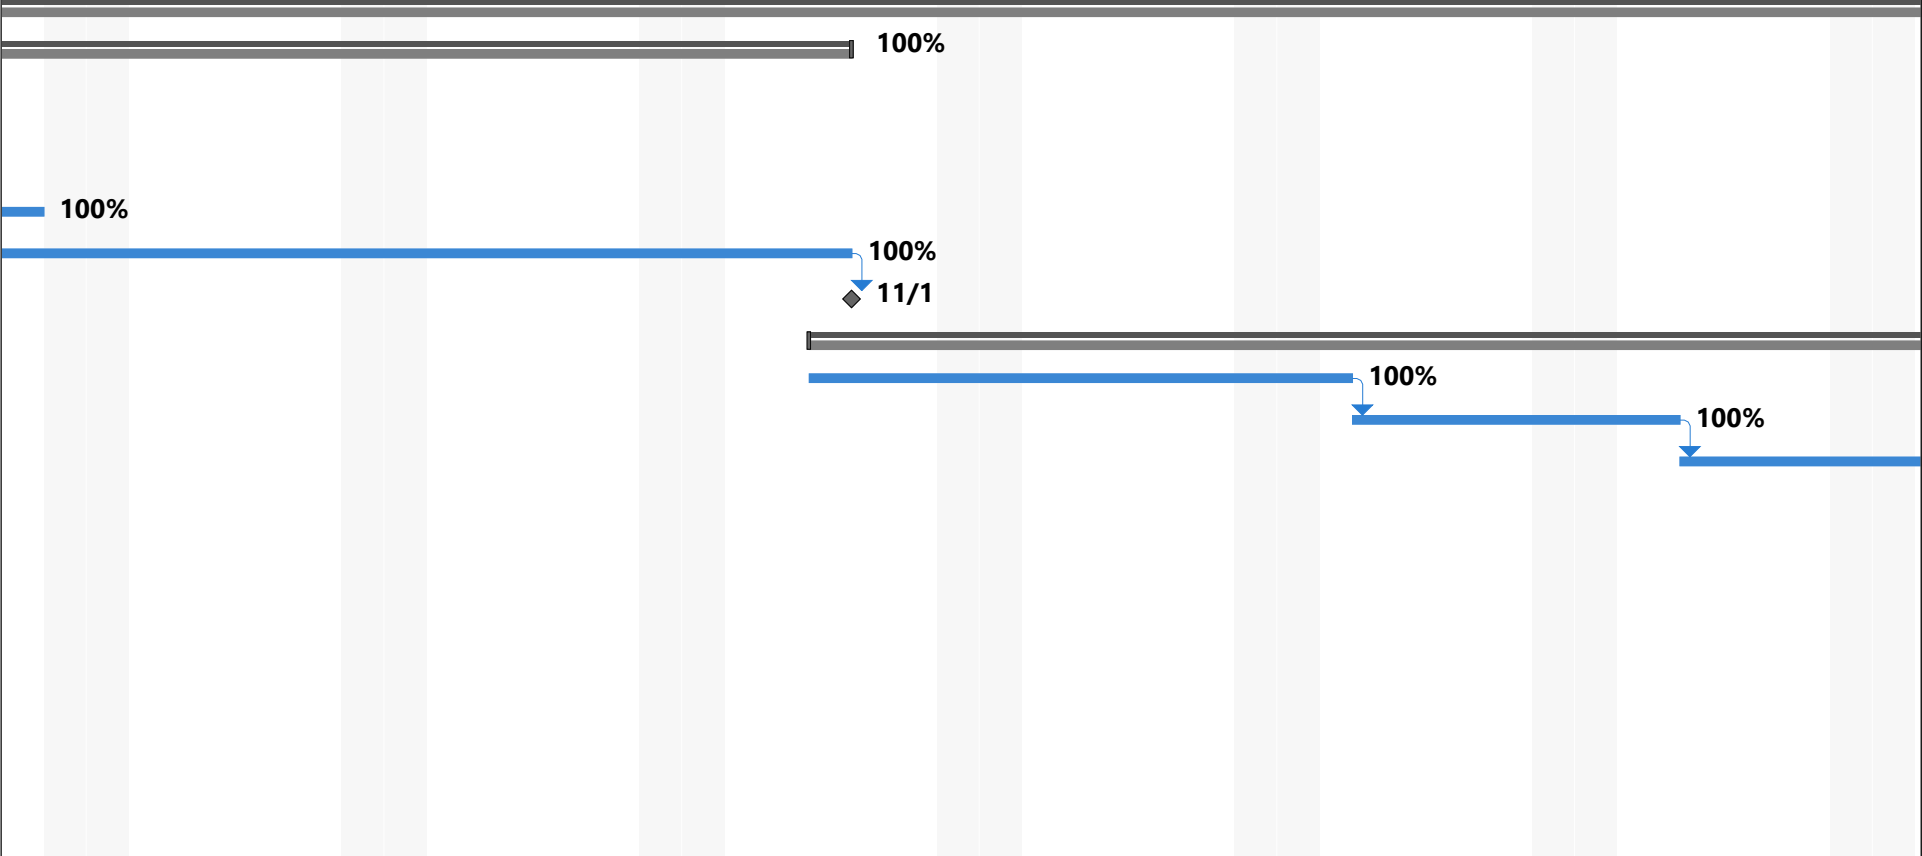


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

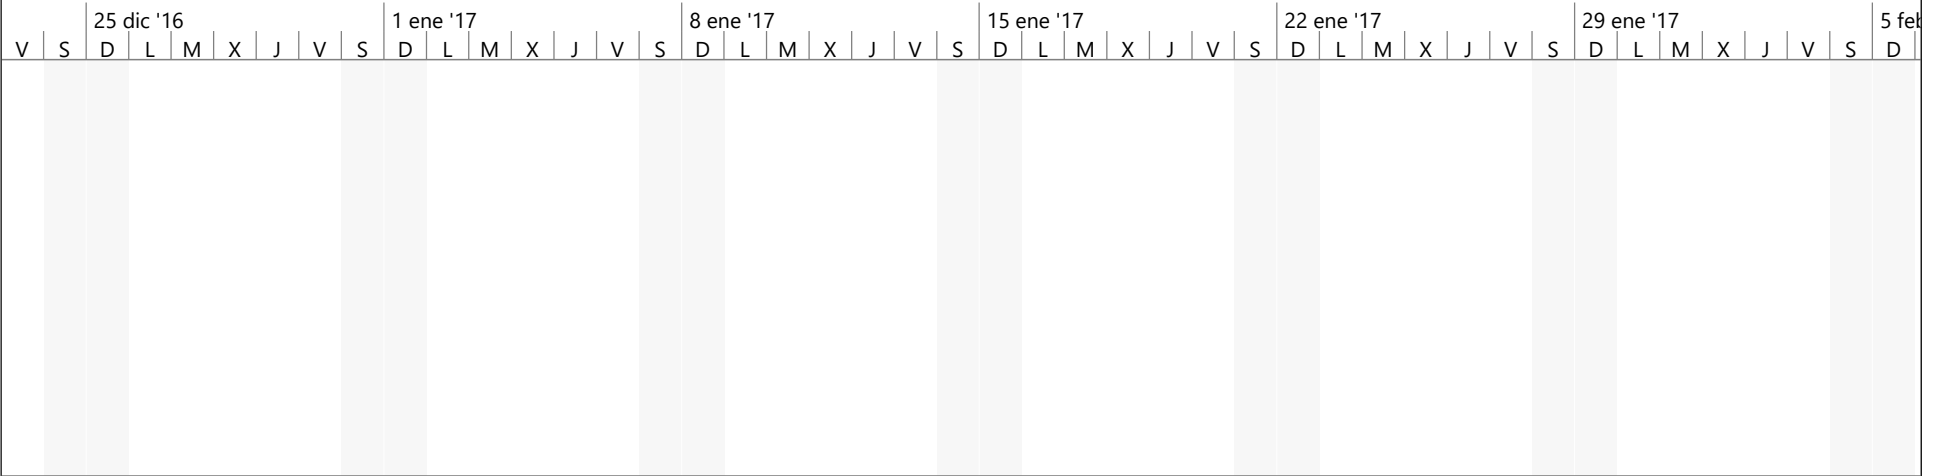


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

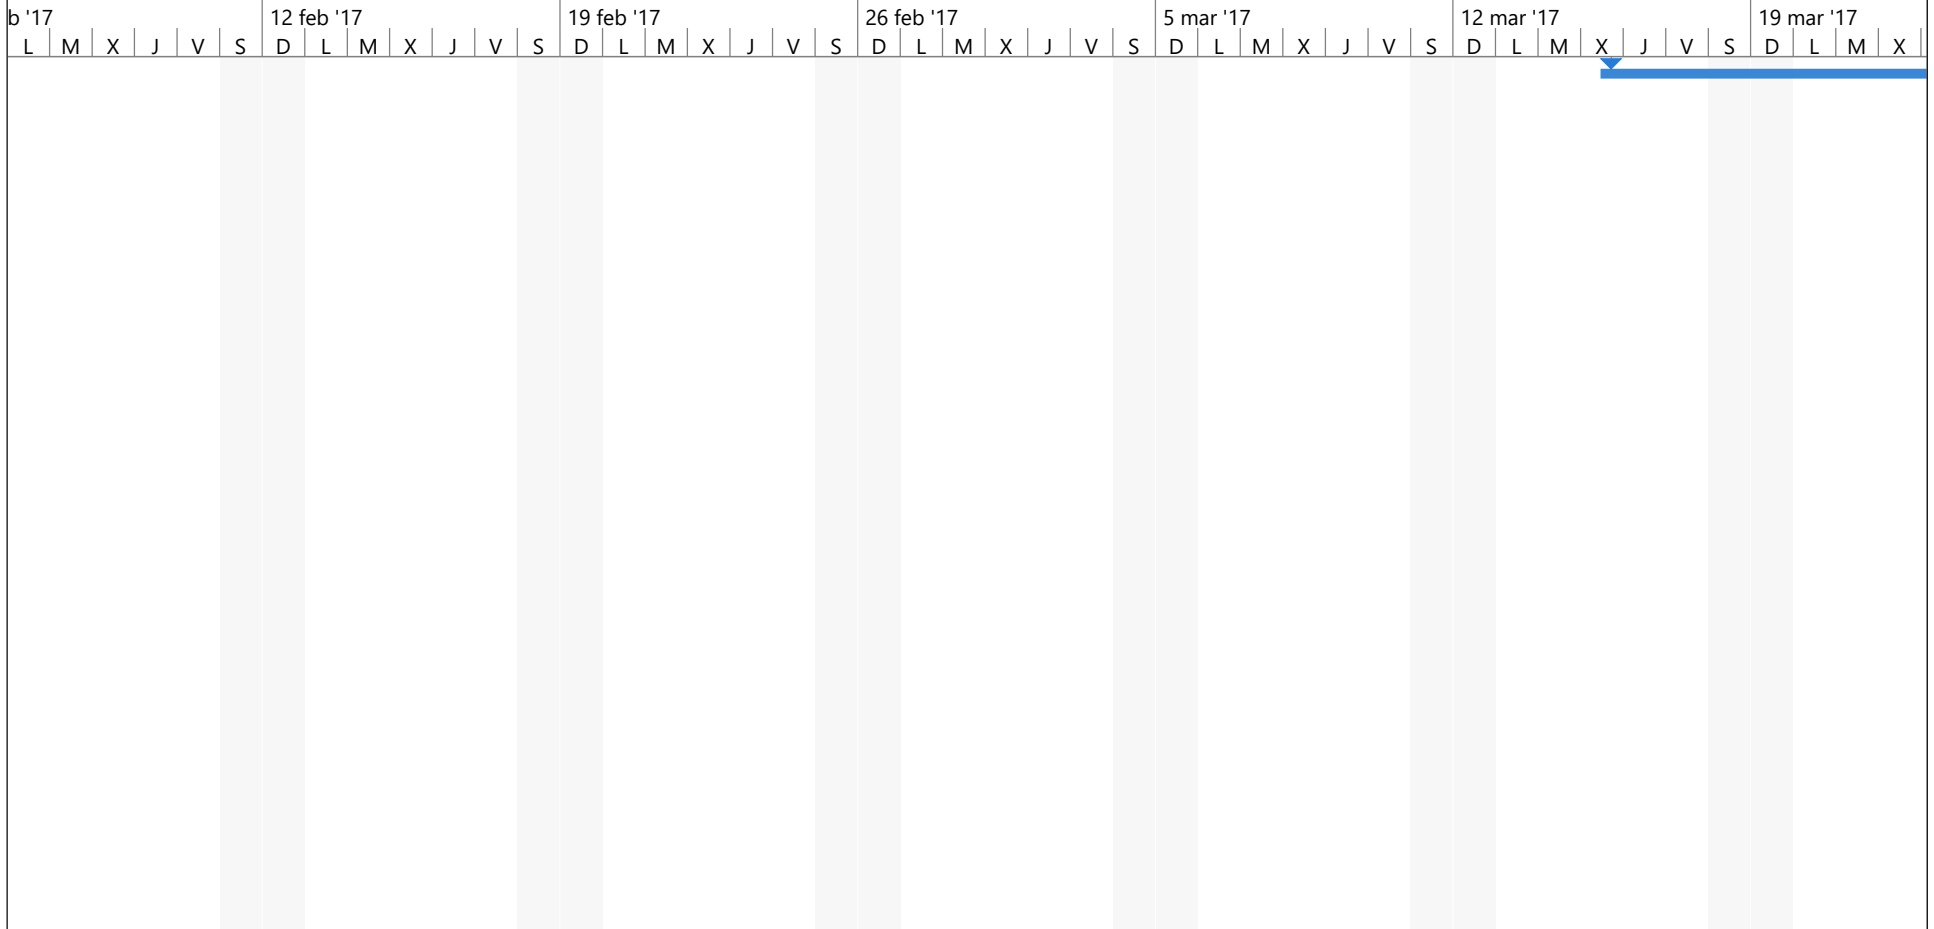

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

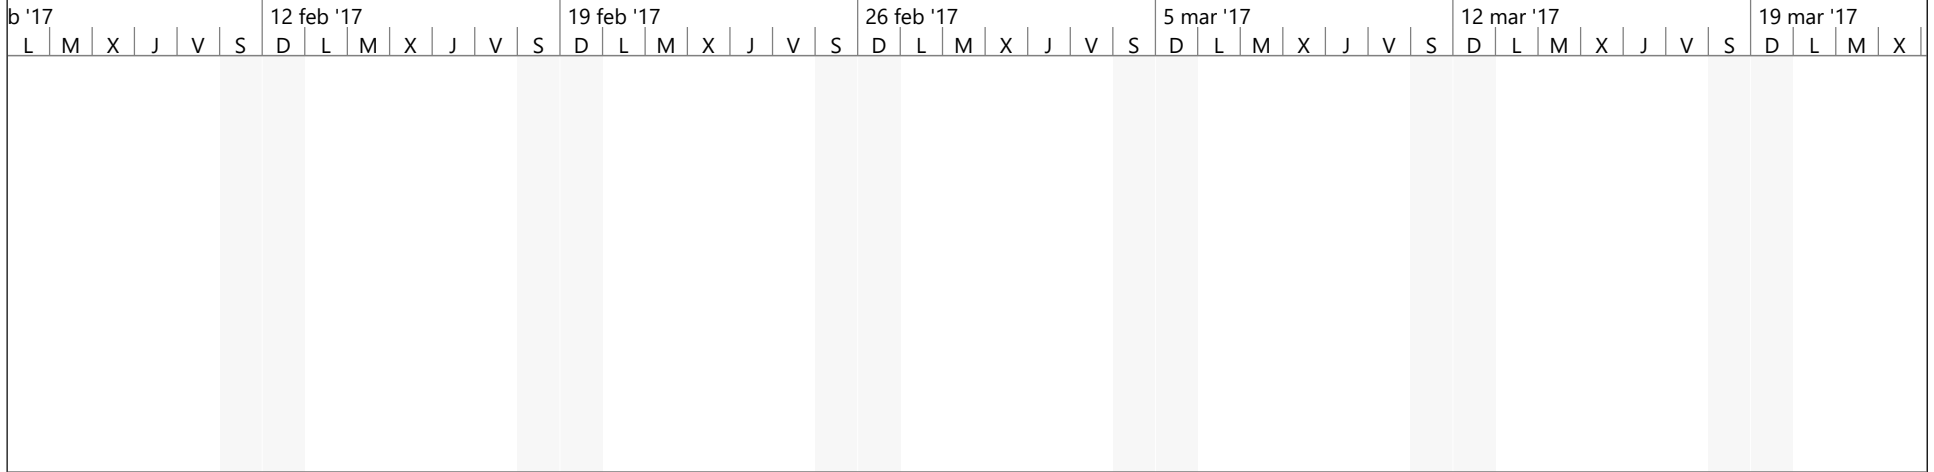

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114


26 mar '17
2 abr '17
9 abr '17
16 abr '17
23 abr '17
30 abr '17

J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

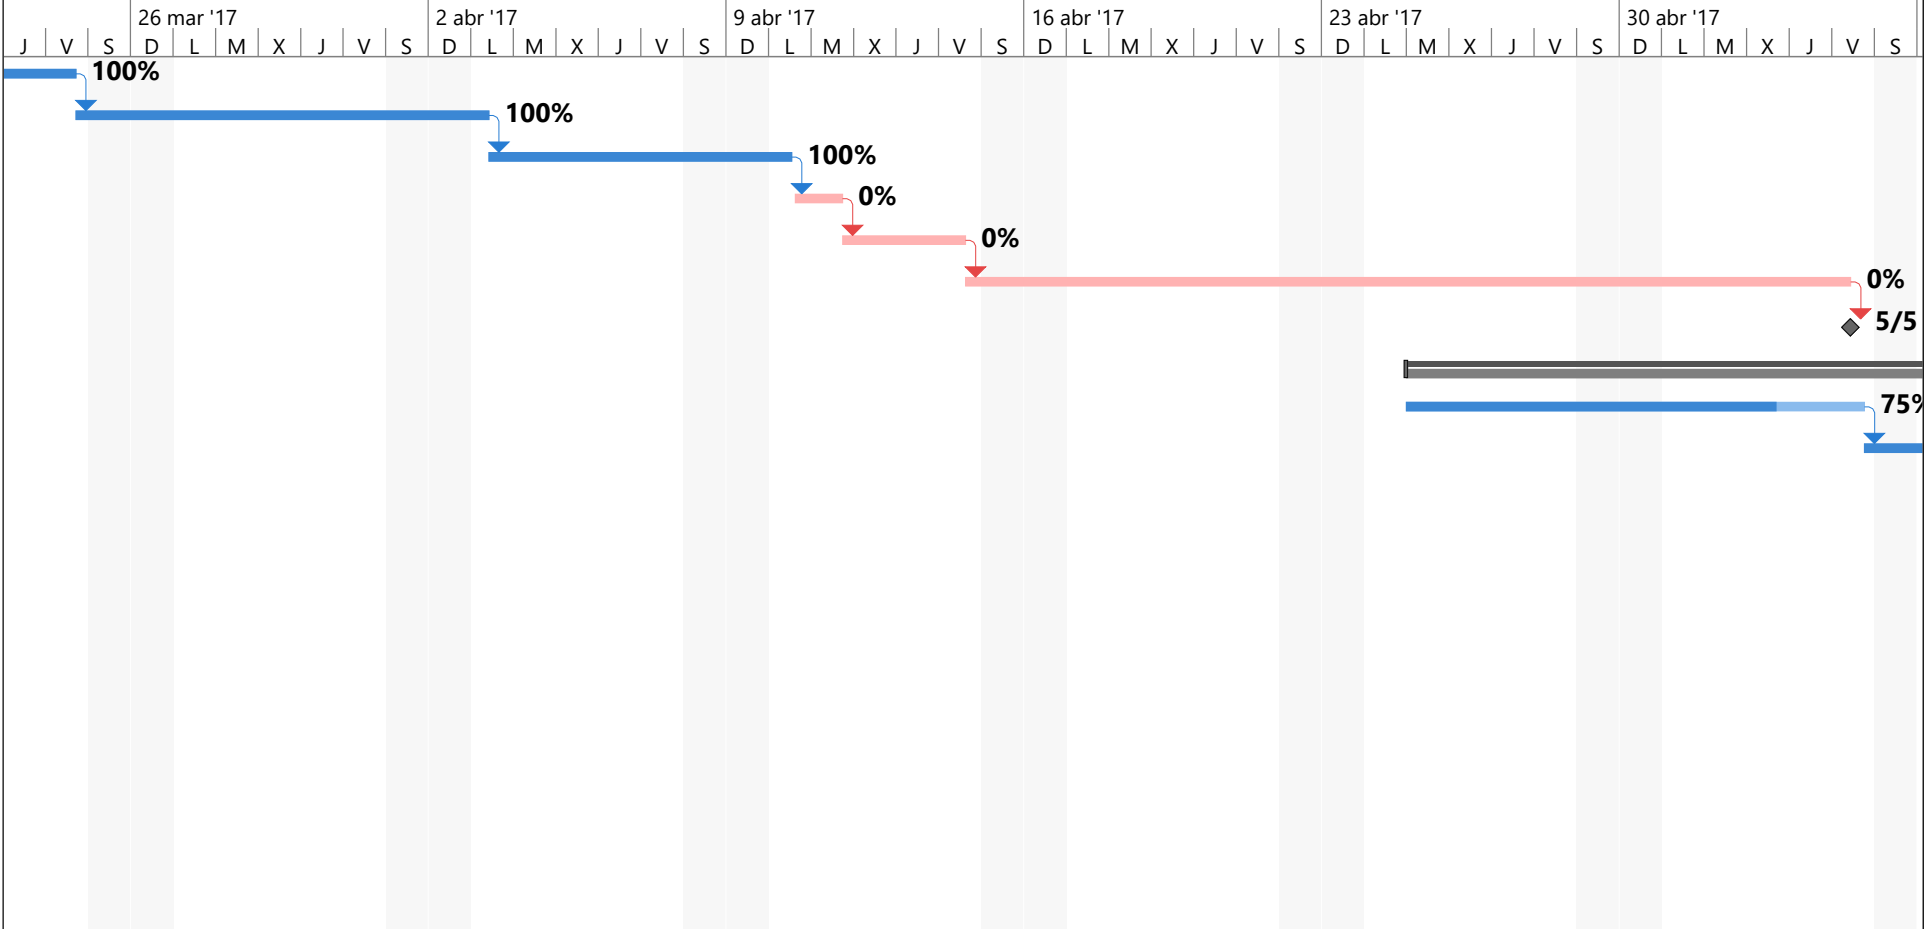

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

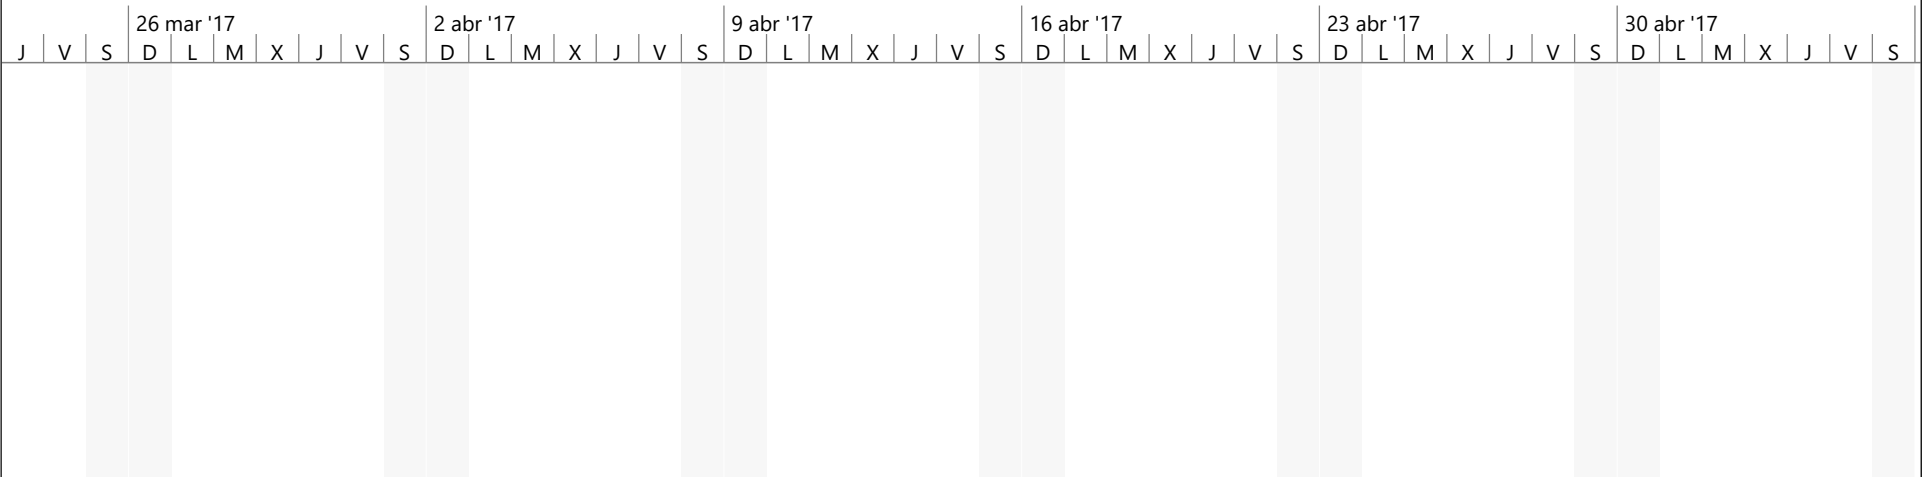


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

7 may '17 14 may '17 21 may '17 28 may '17 4 jun '17 11 jun '17 18 jun '17

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

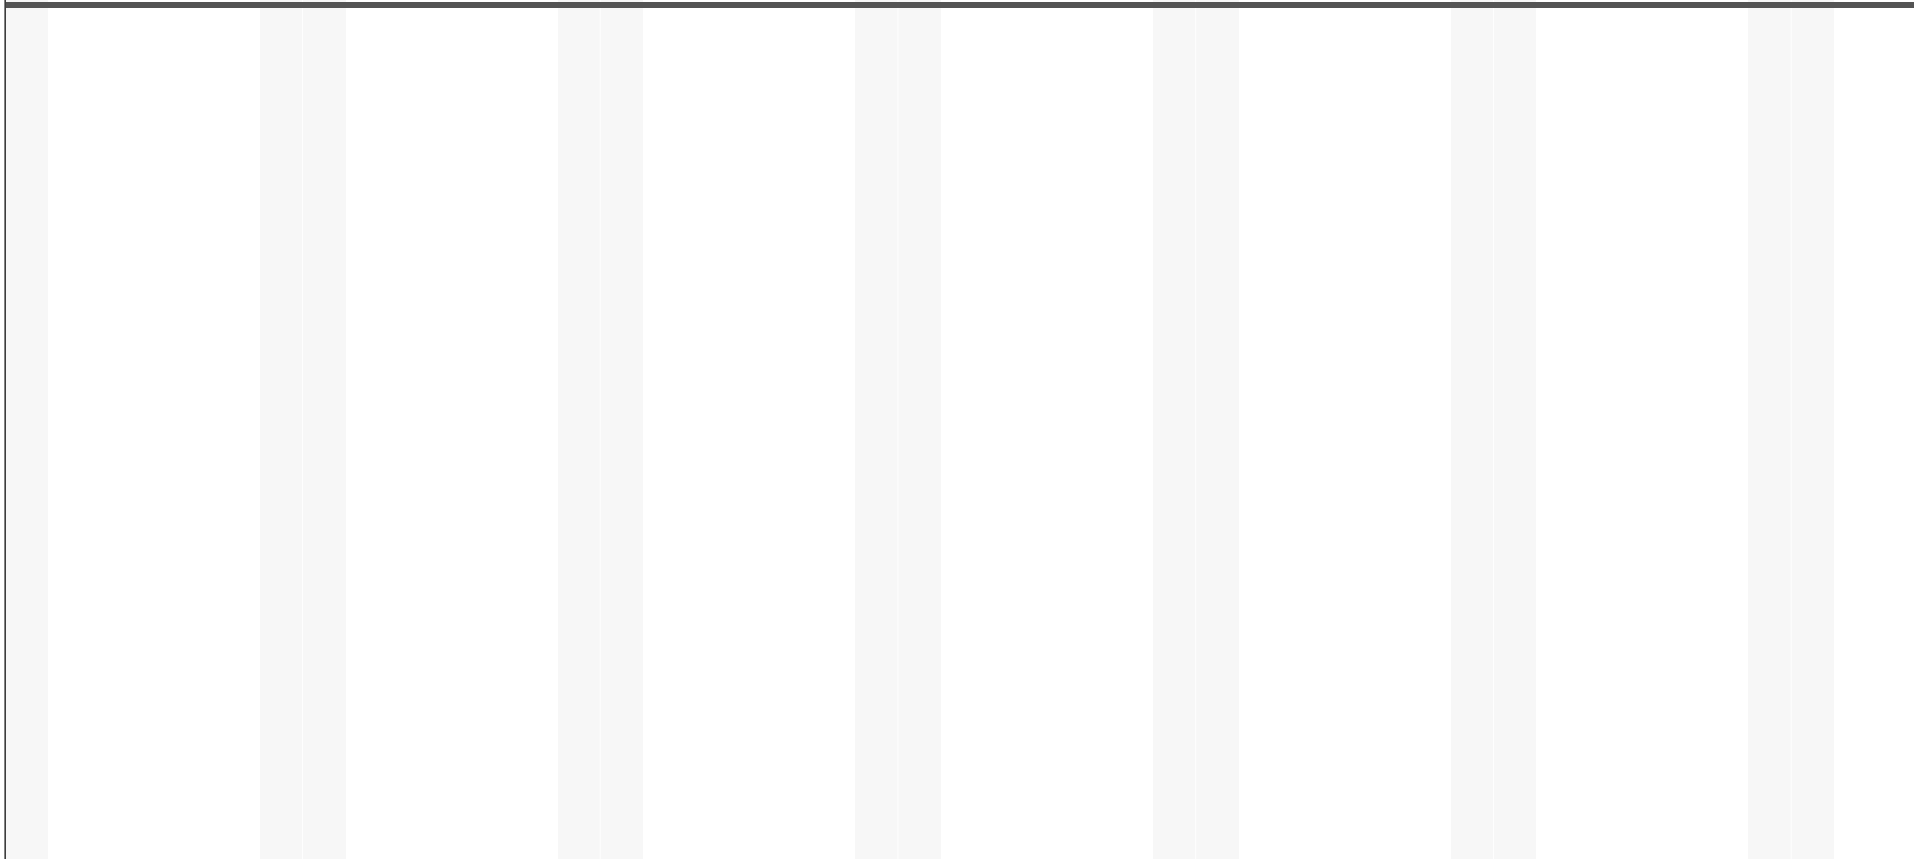


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

7 may '17 14 may '17 21 may '17 28 may '17 4 jun '17 11 jun '17 18 jun '17
 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

5

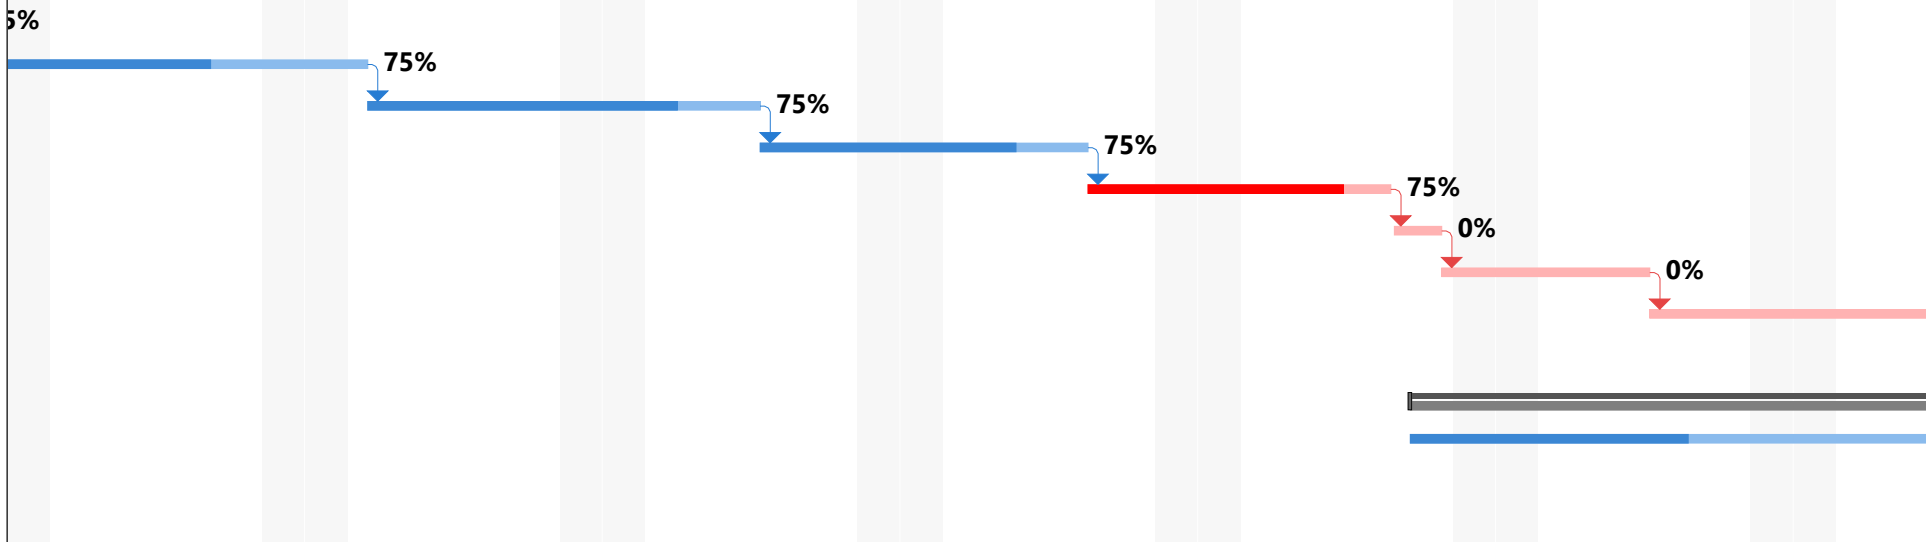

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114


X | J | V | S | 25 jun '17 | D | L | M | X | J | V | S | 2 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 9 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 16 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 23 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 30 jul '17

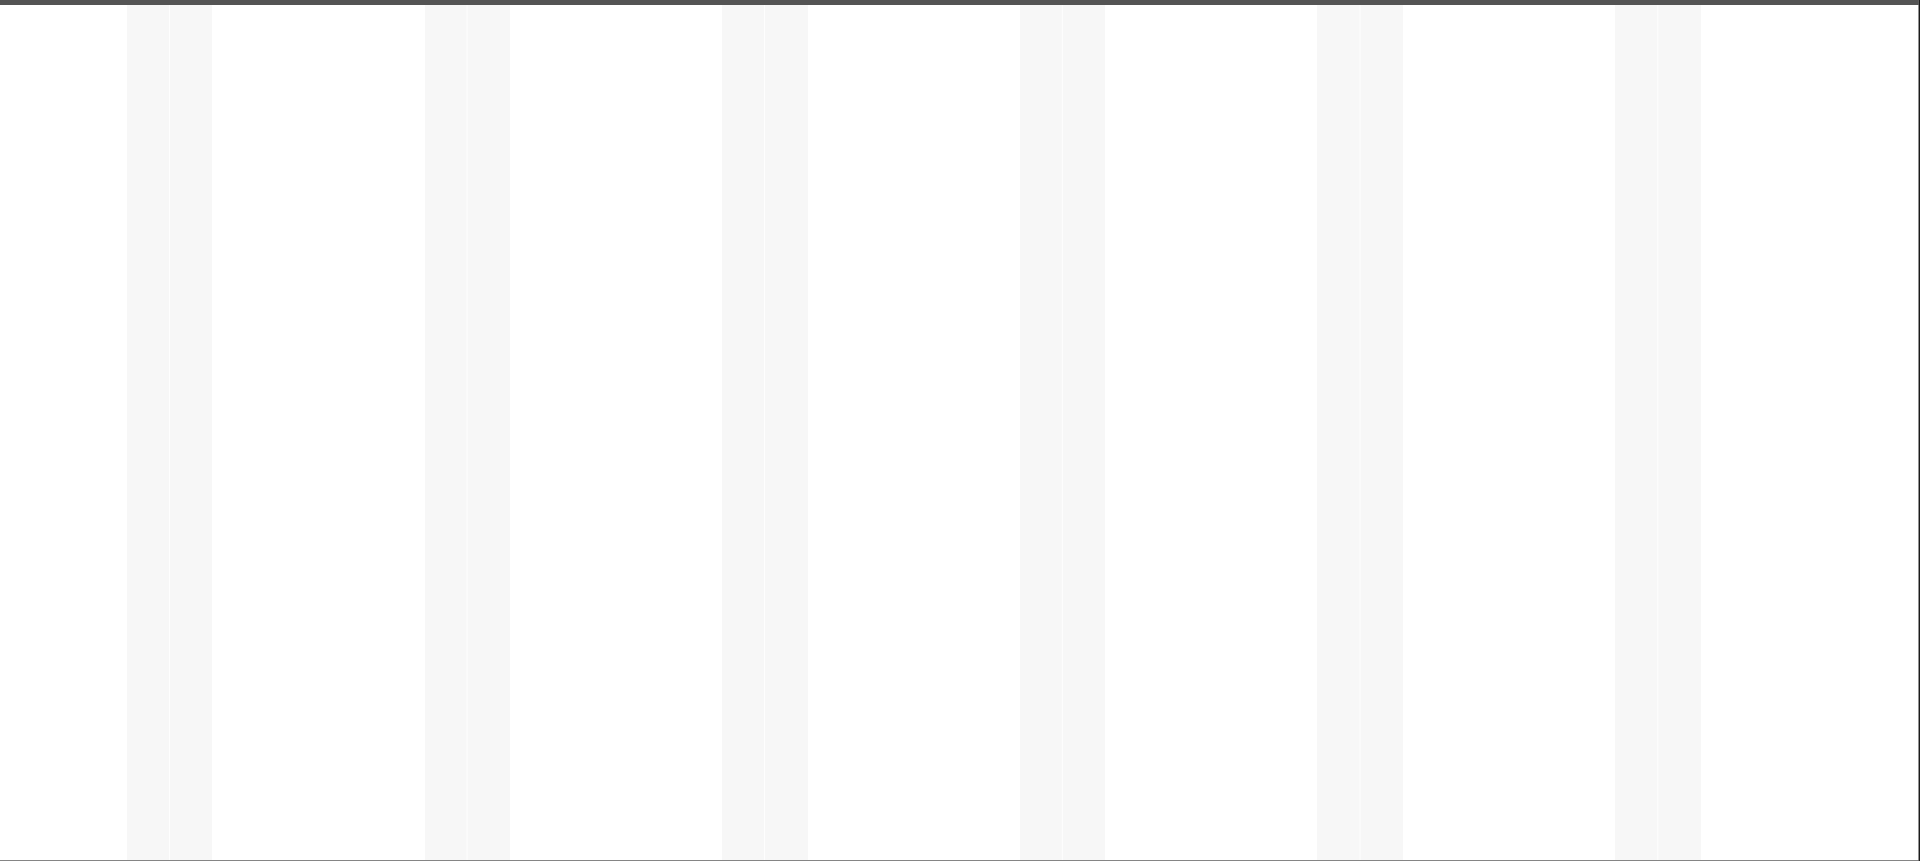

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

X J V S | 25 jun '17 | D L M X J V S | 2 jul '17 | D L M X J V S | 9 jul '17 | D L M X J V S | 16 jul '17 | D L M X J V S | 23 jul '17 | D L M X J V S | 30 jul '17

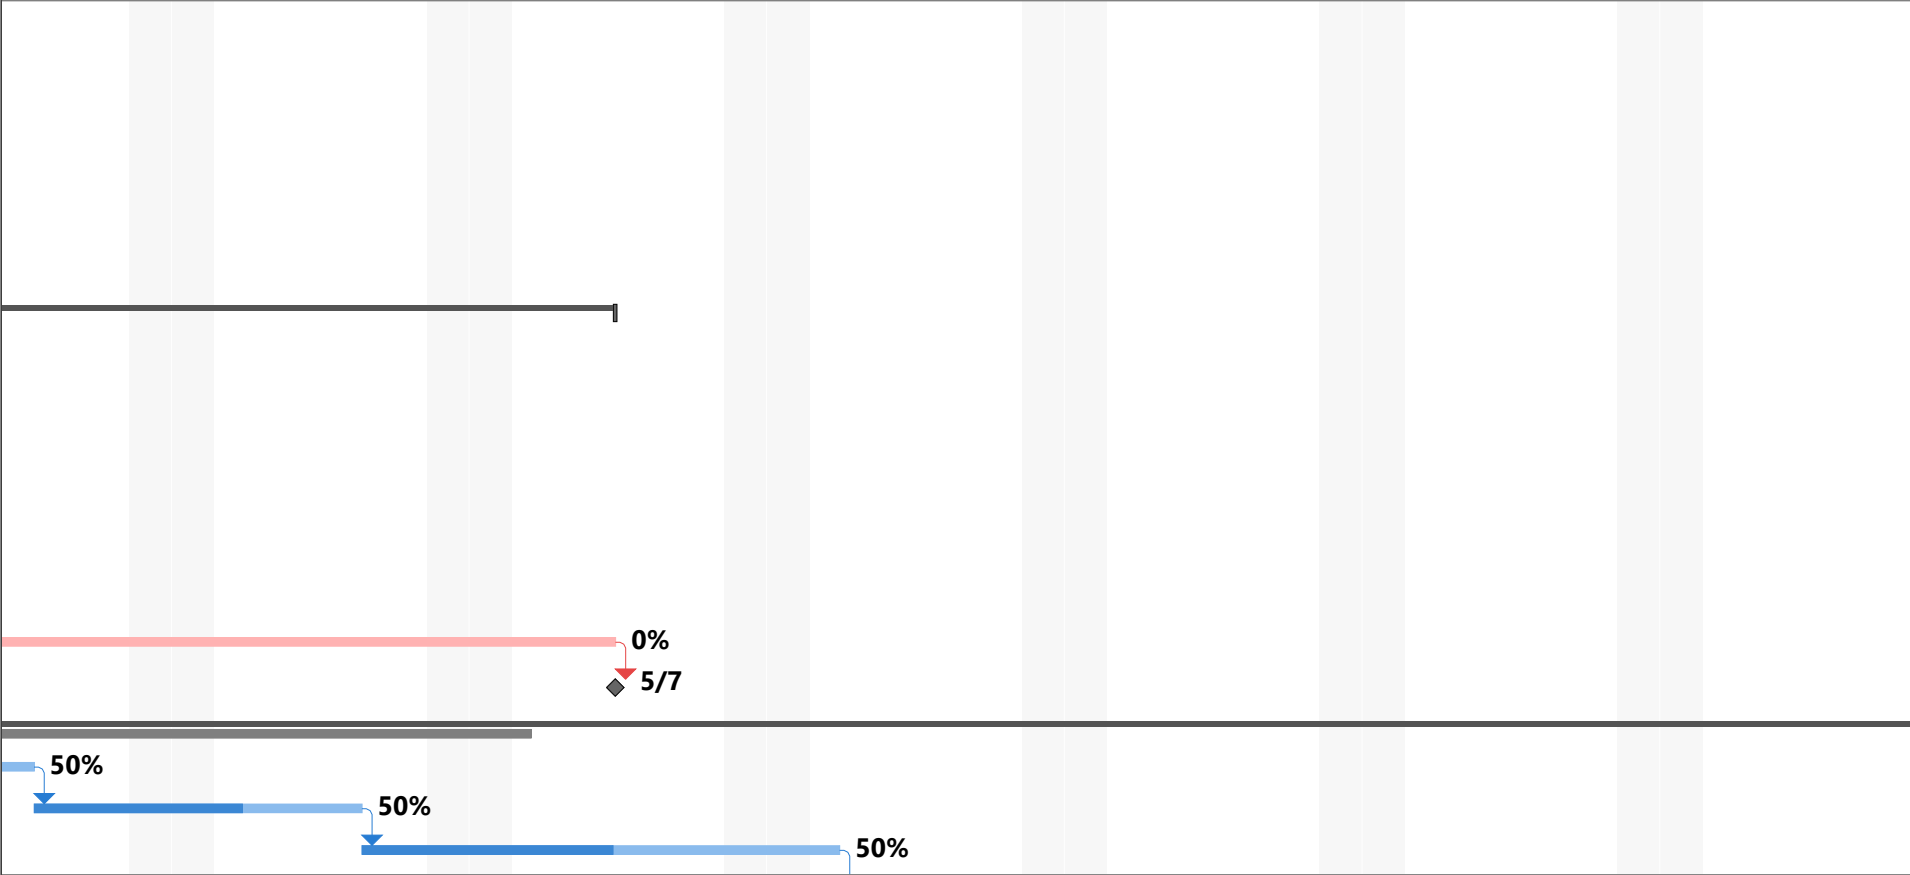

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

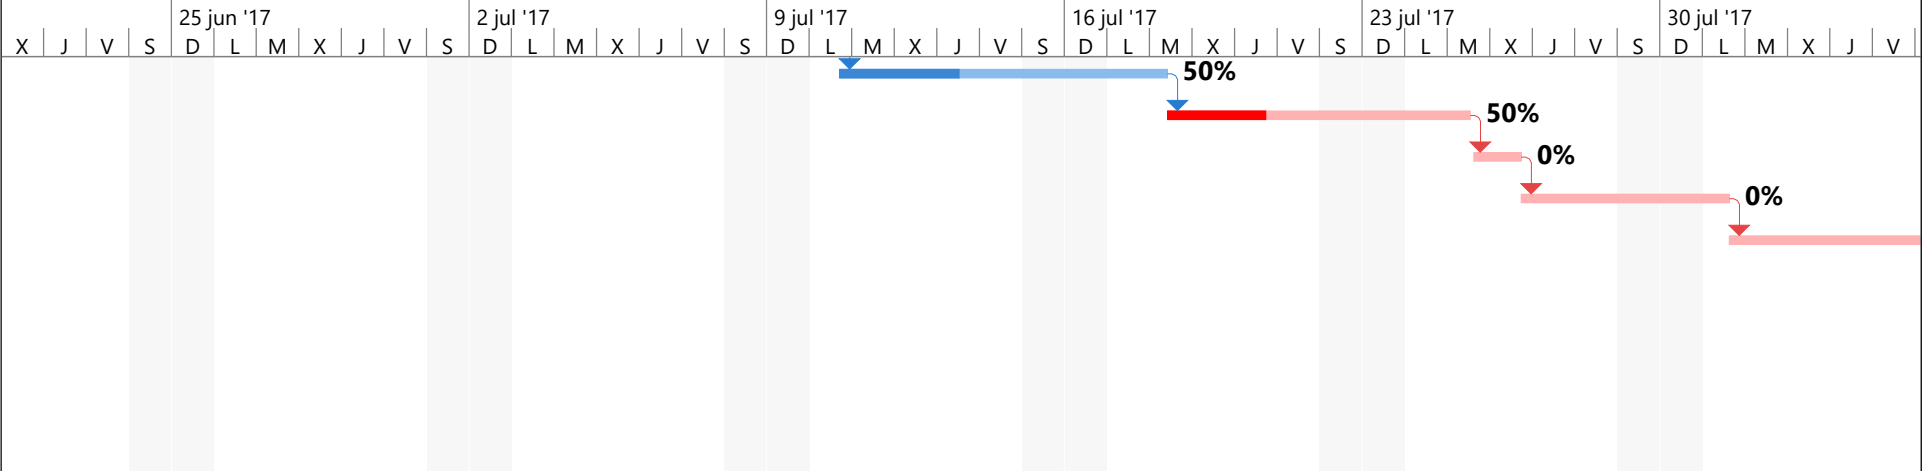

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

6 ago '17							13 ago '17							20 ago '17							27 ago '17							3 sep '17							10 sep '17							17 sep '17														
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

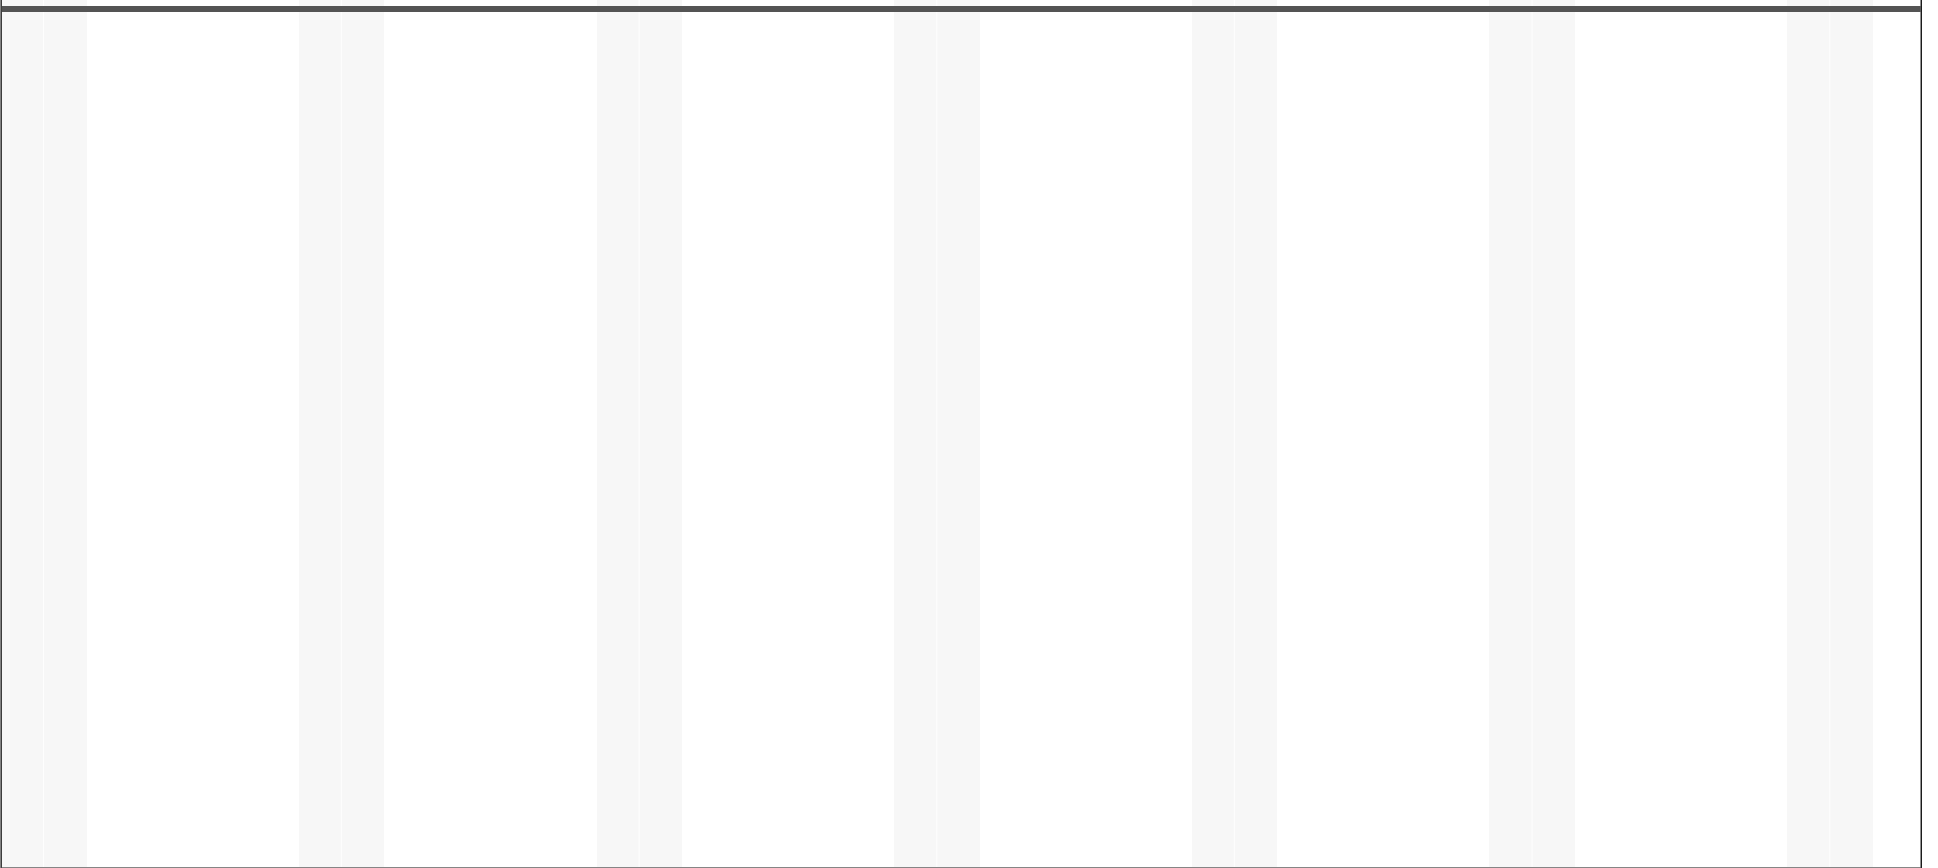


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

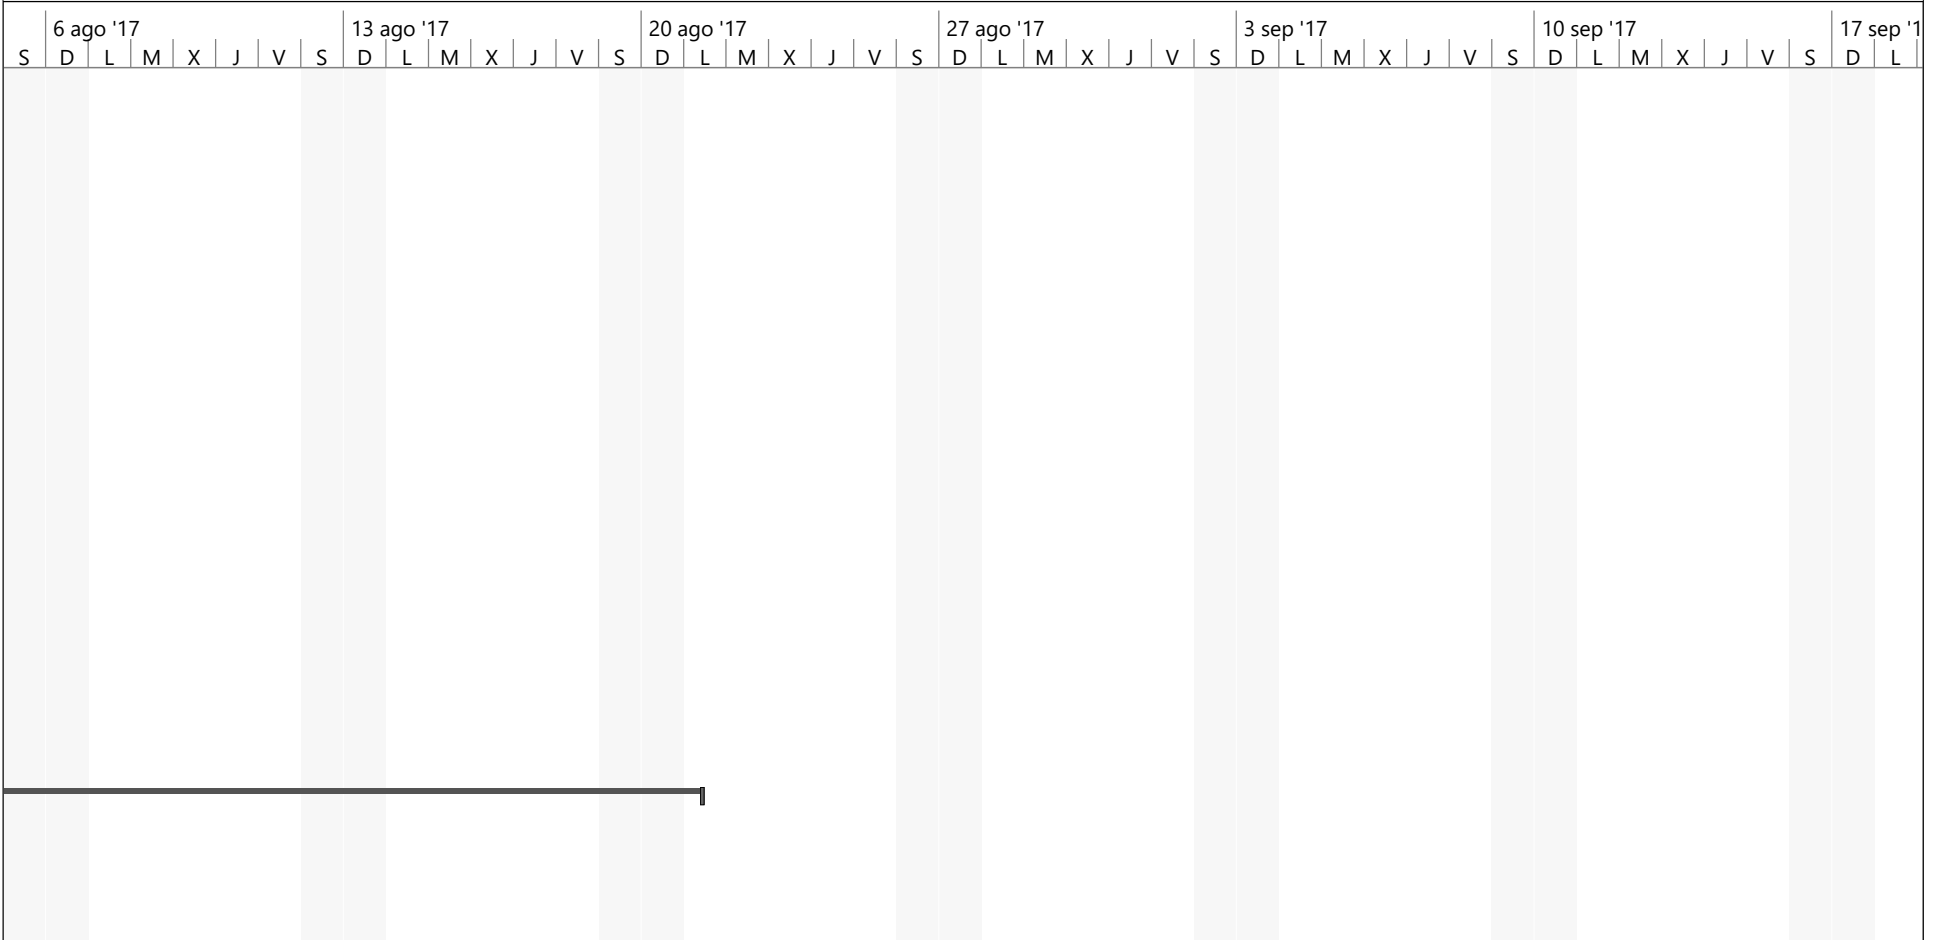

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

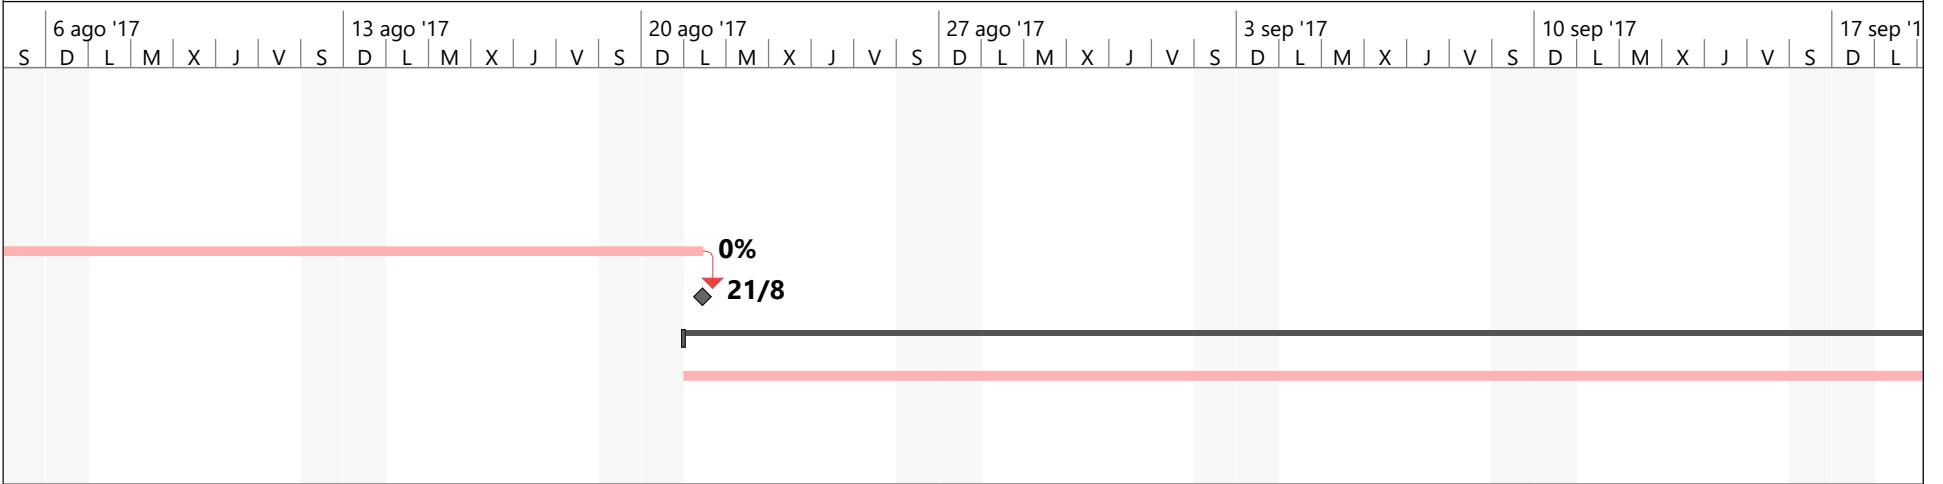

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Cronograma Modelo ZFSA114

7 | M | X | J | V | S | 24 sep '17 | D | L | M | X | J | V | S | 1 oct '17 | D | L | M | X | J | V | S | 8 oct '17 | D | L | M | X | J | V | S | 15 oct '17 | D | L | M | X | J | V | S | 22 oct '17 | D | L | M | X | J | V | S | 29 oct '17 | D | L | M | X | J | V | S

76%


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

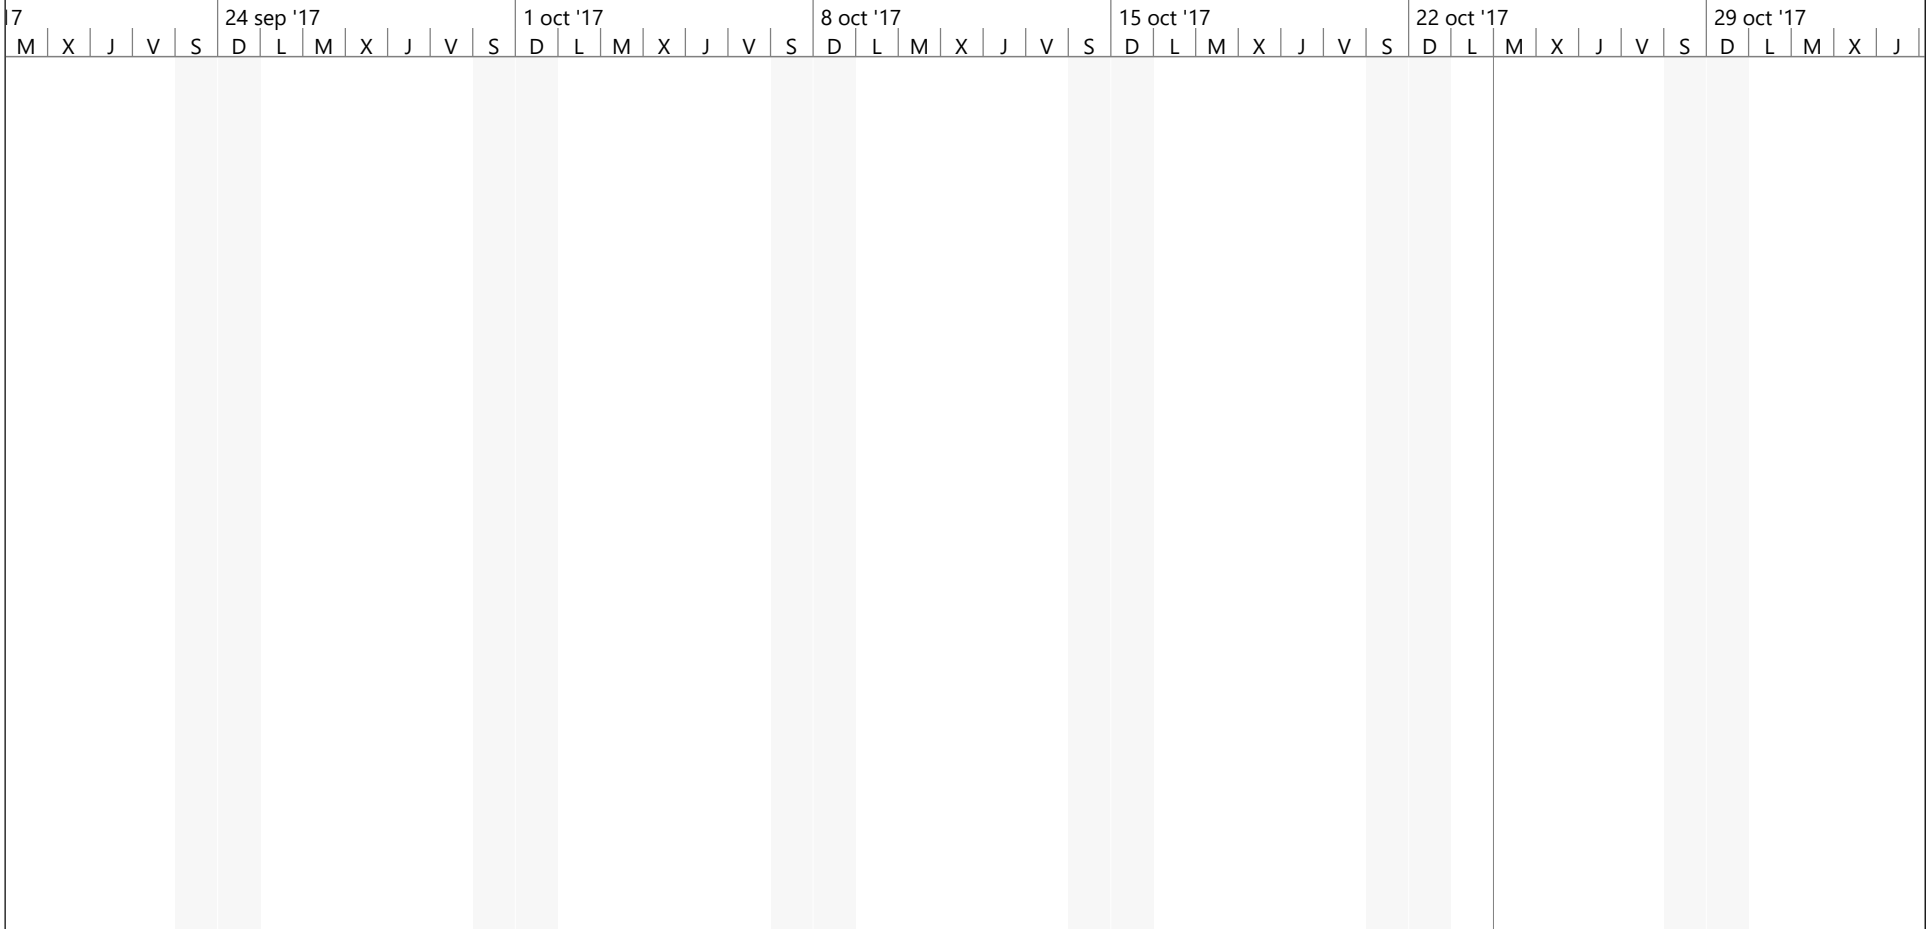

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Cronograma Modelo ZFSA114

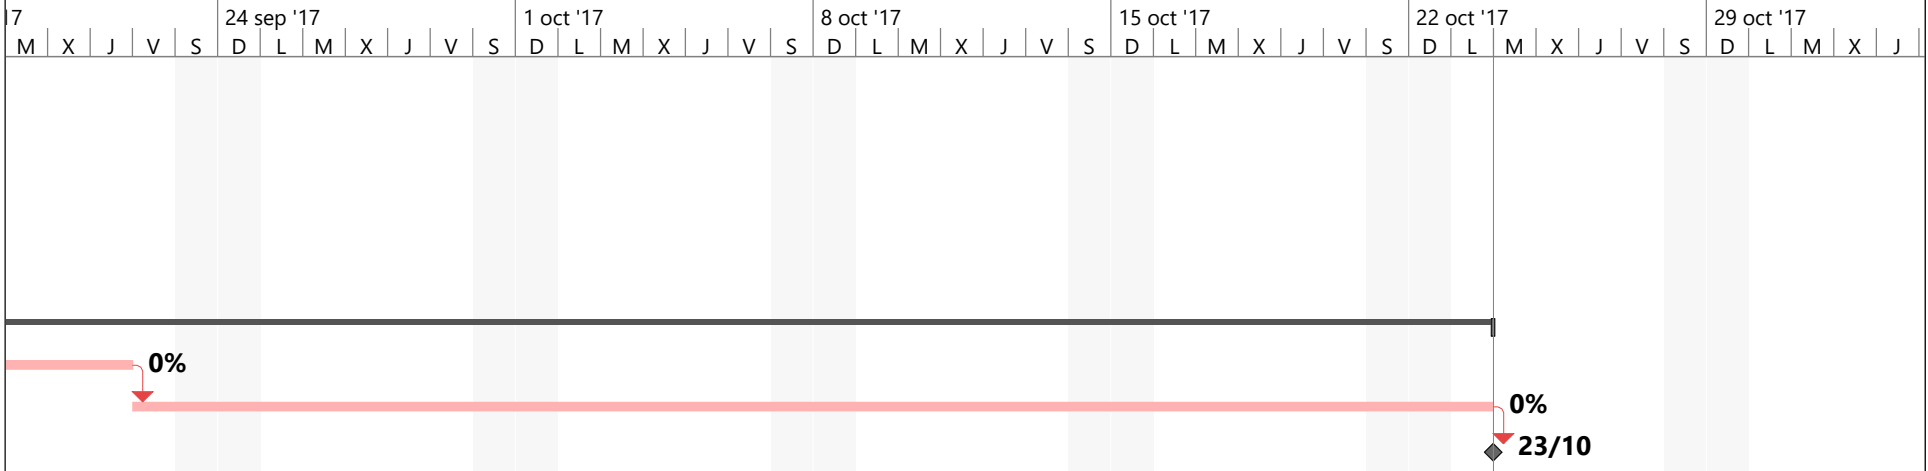

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
