

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                     | Duración          | Comienzo           | 24 may '15 |   |   | 12 jul '15 |   |   | 30 ago '15 |   |   | 18 oct '15 |  |
|----|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|--|
|    |               |                                     |                   |                    | M          | J | S | L          | X | V | D          | M | J |            |  |
| 1  |               | <b>Circuito NIBA112</b>             | <b>226 días</b>   | <b>lun 7/12/15</b> |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 2  |               | <b>Adquisiciones</b>                | <b>89 días</b>    | <b>lun 7/12/15</b> |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 3  |               | Postes                              | 56 días           | lun 7/12/15        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 4  |               | Herrajes y Conectores               | 66 días           | lun 7/12/15        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 5  |               | Conductores<br>MT/BT/Acometidas     | 71 días           | lun 7/12/15        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 6  |               | Transformadores y<br>Eq. Protección | 76 días           | lun 7/12/15        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 7  |               | Equipos de Medición                 | 89 días           | lun 7/12/15        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 8  |               | Evaluación                          | 0 días            | vie 8/4/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 9  |               | <b>Etapa 1</b>                      | <b>51.21 días</b> | <b>lun 7/3/16</b>  |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 10 |               | Izaje de Postes                     | 8.94 días         | lun 7/3/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 11 |               | Armado de Estructura                | 5.37 días         | jue 17/3/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 12 |               | Tendido de Conducto                 | 7.45 días         | vie 25/3/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 13 |               | Montaje de<br>Transformadores       | 5.37 días         | mar 5/4/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 14 |               | Instalación de<br>Luminarias        | 5.37 días         | mié 13/4/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 15 |               | Correcciones                        | 1.34 días         | mié 20/4/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 16 |               | Remociones                          | 2.68 días         | jue 21/4/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
Fecha: jue 29/6/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea              | Duración          | Comienzo           | 24 may '15 |   |   | 12 jul '15 |   |   | 30 ago '15 |   |   | 18 oct '15 |  |
|----|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|--|
|    |               |                              |                   |                    | M          | J | S | L          | X | V | D          | M | J |            |  |
| 17 |               | Normalización de Suministros | 14.69 días        | mar 26/4/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 18 |               | Evaluación                   | 0 días            | mar 17/5/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 19 |               | <b>Etapa 2</b>               | <b>51.21 días</b> | <b>jue 21/4/16</b> |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 20 |               | Izaje de Postes              | 8.94 días         | jue 21/4/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 21 |               | Armado de Estructur          | 5.37 días         | mar 3/5/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 22 |               | Tendido de Conducto          | 7.45 días         | mié 11/5/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 23 |               | Montaje de Transformadores   | 5.37 días         | vie 20/5/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 24 |               | Instalación de Luminarias    | 5.37 días         | lun 30/5/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 25 |               | Correcciones                 | 1.34 días         | lun 6/6/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 26 |               | Remociones                   | 2.68 días         | mar 7/6/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 27 |               | Normalización de Su          | 14.69 días        | vie 10/6/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 28 |               | Evaluación                   | 0 días            | vie 1/7/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 29 |               | <b>Etapa 3</b>               | <b>51.21 días</b> | <b>mar 7/6/16</b>  |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 30 |               | Izaje de Postes              | 8.94 días         | mar 7/6/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 31 |               | Armado de Estructur          | 5.37 días         | vie 17/6/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 32 |               | Tendido de Conductor         | 7.45 días         | lun 27/6/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |


Proyecto: Cronograma Modelo NI  
Fecha: jue 29/6/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                         | Duración       | Comienzo           | 24 may '15 |   |   | 12 jul '15 |   |   | 30 ago '15 |   |   | 18 oct '15 |  |
|----|---------------|---|----------------|--------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|--|
|    |               |   |                |                    | M          | J | S | L          | X | V | D          | M | J |            |  |
| 33 |               | Montaje de Transformadores              | 5.37 días      | mié 6/7/16         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 34 |               | Instalación de Luminarias               | 5.37 días      | jue 14/7/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 35 |               | Correcciones                            | 1.34 días      | jue 21/7/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 36 |               | Remociones                              | 2.68 días      | vie 22/7/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 37 |               | Normalización de Suministros            | 14.69 días     | mié 27/7/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 38 |               | Evaluación                              | 0 días         | mié 17/8/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 39 |               | <b>Cierres Técnico y Administrativo</b> | <b>44 días</b> | <b>mié 17/8/16</b> |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 40 |               | Cierre Técnico                          | 24 días        | mié 17/8/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 41 |               | Cierre Administrativo                   | 22 días        | sáb 17/9/16        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |
| 42 |               | Evaluación                              | 0 días         | mar 18/10/16       |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |  |


Proyecto: Cronograma Modelo NI  
Fecha: jue 29/6/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

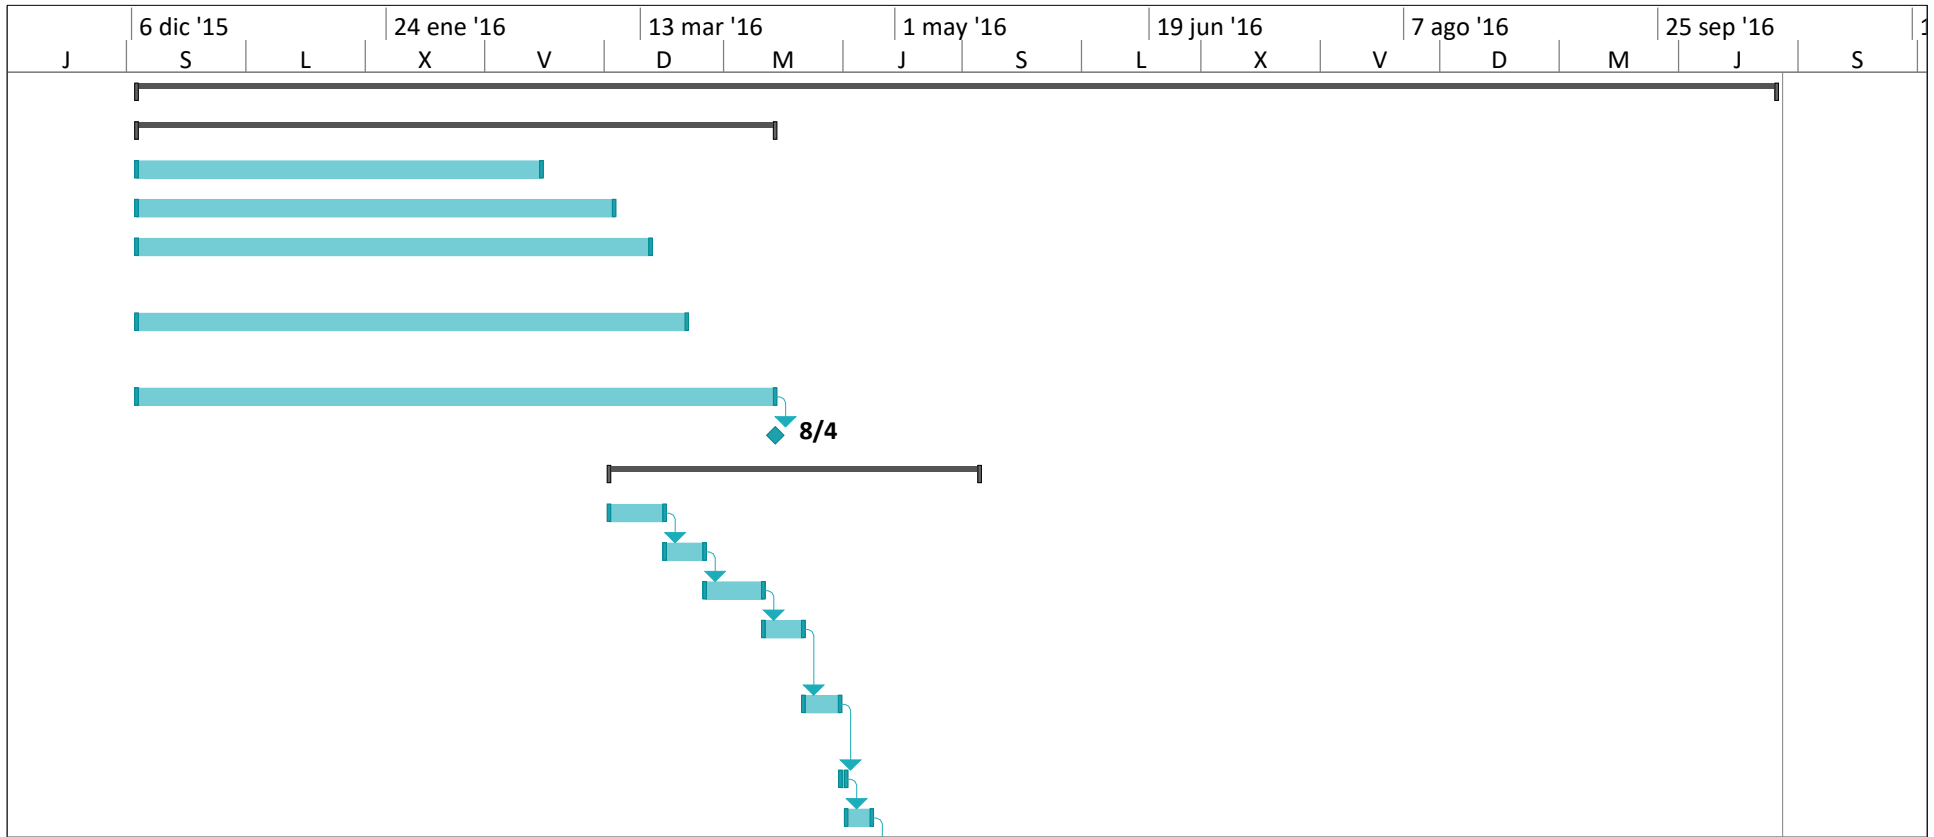


Proyecto: Cronograma Modelo NI  
 Fecha: jue 29/6/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

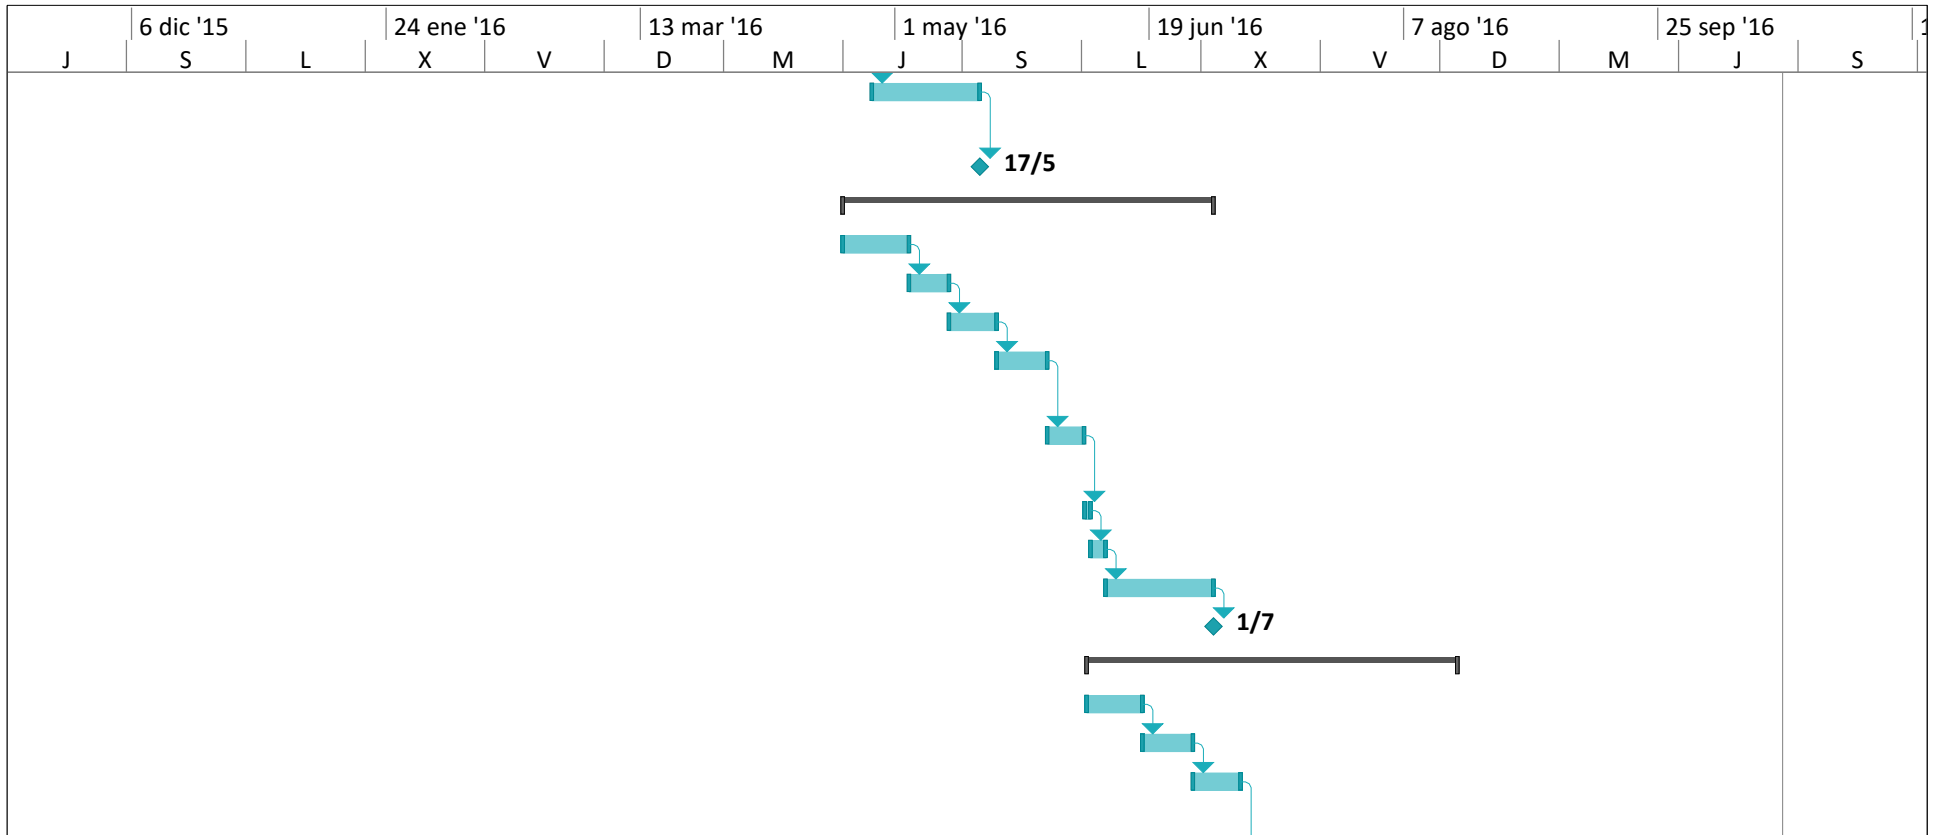

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
 Fecha: jue 29/6/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |

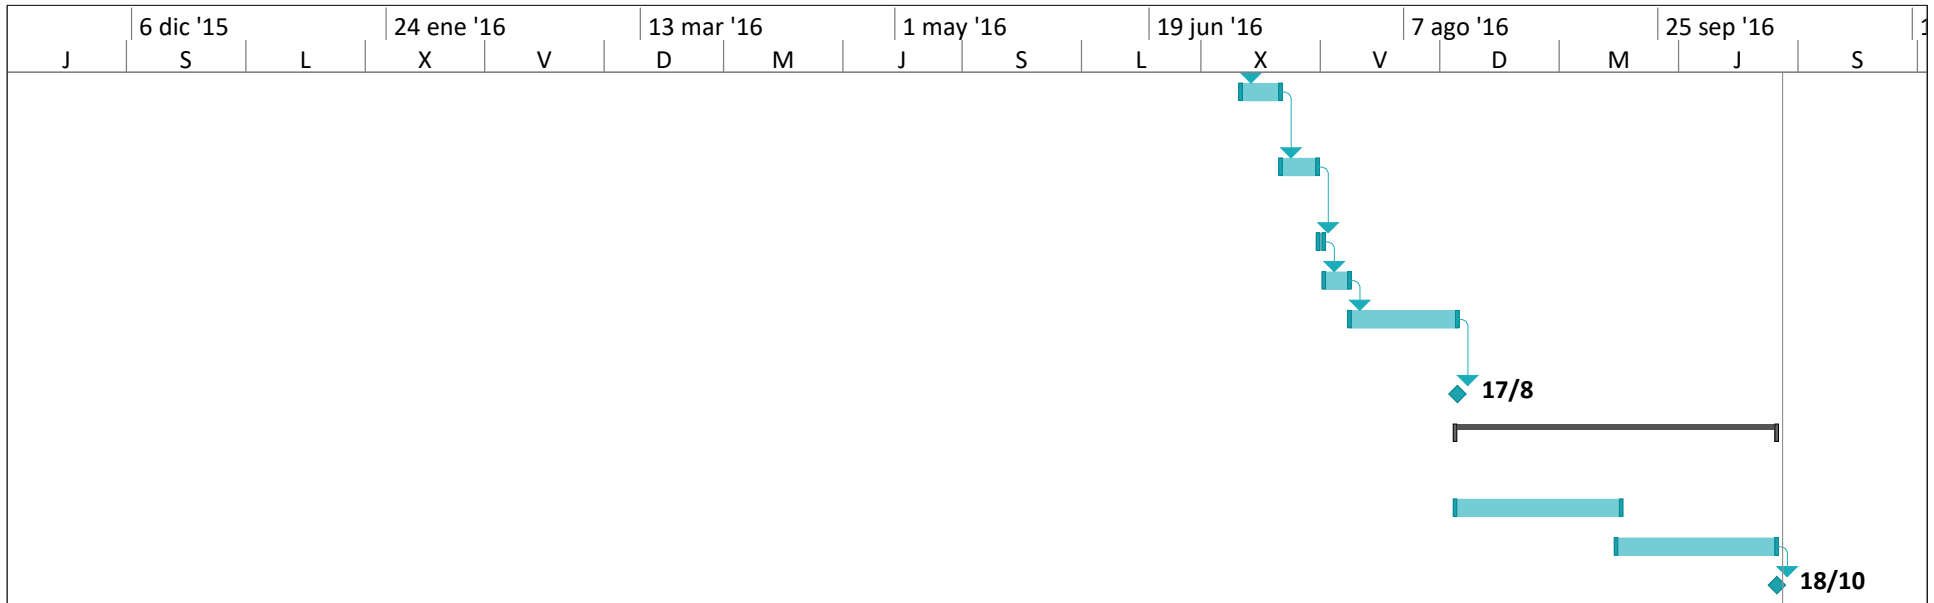

Proyecto: Cronograma Modelo NI  
 Fecha: jue 29/6/17

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Tarea                |  | Tarea manual              |  |
| División             |  | Sólo duración             |  |
| Hito                 |  | Informe de resumen manual |  |
| Resumen              |  | Resumen manual            |  |
| Resumen del proyecto |  | Sólo el comienzo          |  |
| Tareas externas      |  | Sólo fin                  |  |
| Hito externo         |  | Fecha límite              |  |
| Tarea inactiva       |  | Progreso                  |  |
| Hito inactivo        |  | Progreso manual           |  |
| Resumen inactivo     |  |                           |  |
