

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15			12 jul '15			30 ago '15			18 oct '15	
					M	J	S	L	X	V	D	M	J		
1		Circuito SALC104	226 días	lun 7/12/15											
2		Adquisiciones	89 días	lun 7/12/15											
3		Postes	56 días	lun 7/12/15											
4		Herrajes y Conectores	66 días	lun 7/12/15											
5		Conductores MT/BT/Acometidas	71 días	lun 7/12/15											
6		Transformadores y Eq. Protección	76 días	lun 7/12/15											
7		Equipos de Medición	89 días	lun 7/12/15											
8		Evaluación	0 días	vie 8/4/16											
9		Etapa 1	51.21 días	lun 7/3/16											
10		Izaje de Postes	8.94 días	lun 7/3/16											
11		Armado de Estructura	5.37 días	jue 17/3/16											
12		Tendido de Conducto	7.45 días	vie 25/3/16											
13		Montaje de Transformadores	5.37 días	mar 5/4/16											
14		Instalación de Luminarias	5.37 días	mié 13/4/16											
15		Correcciones	1.34 días	mié 20/4/16											
16		Remociones	2.68 días	jue 21/4/16											

Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: jue 29/6/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15			12 jul '15			30 ago '15			18 oct '15	
					M	J	S	L	X	V	D	M	J		
17		Normalización de Suministros	14.69 días	mar 26/4/16											
18		Evaluación	0 días	mar 17/5/16											
19		Etapa 2	51.21 días	jue 21/4/16											
20		Izaje de Postes	8.94 días	jue 21/4/16											
21		Armado de Estructur	5.37 días	mar 3/5/16											
22		Tendido de Conducto	7.45 días	mié 11/5/16											
23		Montaje de Transformadores	5.37 días	vie 20/5/16											
24		Instalación de Luminarias	5.37 días	lun 30/5/16											
25		Correcciones	1.34 días	lun 6/6/16											
26		Remociones	2.68 días	mar 7/6/16											
27		Normalización de Su	14.69 días	vie 10/6/16											
28		Evaluación	0 días	vie 1/7/16											
29		Etapa 3	51.21 días	mar 7/6/16											
30		Izaje de Postes	8.94 días	mar 7/6/16											
31		Armado de Estructur	5.37 días	vie 17/6/16											
32		Tendido de Conductor	7.45 días	lun 27/6/16											


Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: jue 29/6/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 may '15			12 jul '15			30 ago '15			18 oct '15	
					M	J	S	L	X	V	D	M	J		
33		Montaje de Transformadores	5.37 días	mié 6/7/16											
34		Instalación de Luminarias	5.37 días	jue 14/7/16											
35		Correcciones	1.34 días	jue 21/7/16											
36		Remociones	2.68 días	vie 22/7/16											
37		Normalización de Suministros	14.69 días	mié 27/7/16											
38		Evaluación	0 días	mié 17/8/16											
39		Cierres Técnico y Administrativo	44 días	mié 17/8/16											
40		Cierre Técnico	24 días	mié 17/8/16											
41		Cierre Administrativo	22 días	sáb 17/9/16											
42		Evaluación	0 días	mar 18/10/16											


Proyecto: Cronograma Modelo SA
Fecha: jue 29/6/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

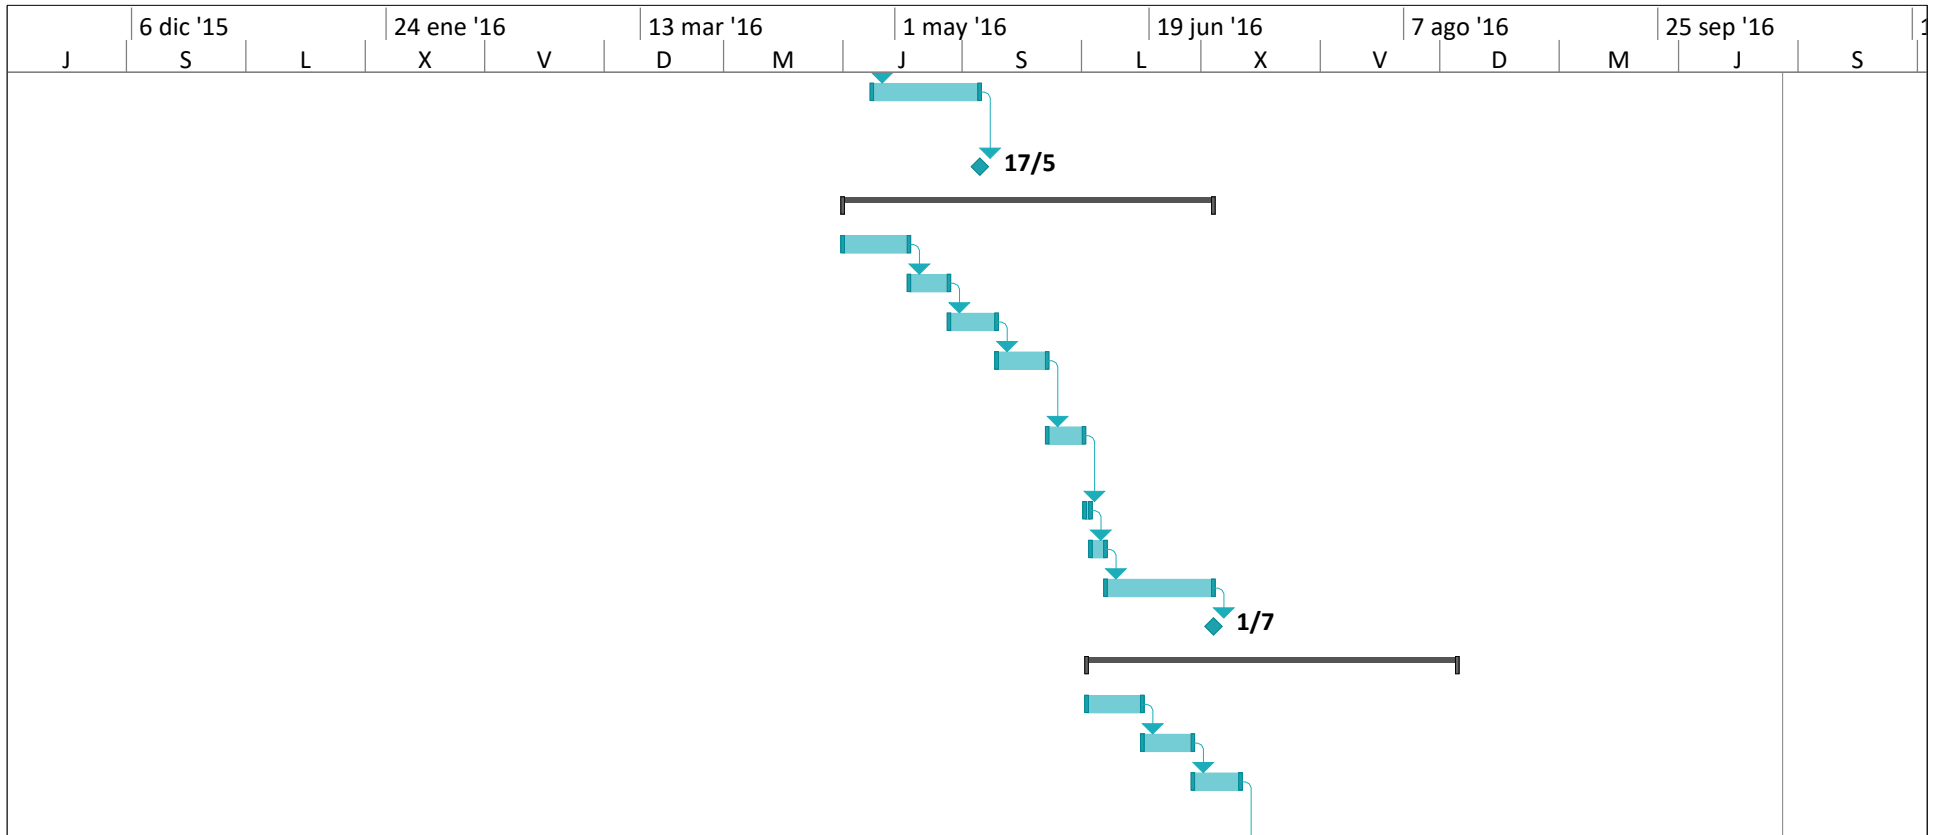

Proyecto: Cronograma Modelo SA
 Fecha: jue 29/6/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

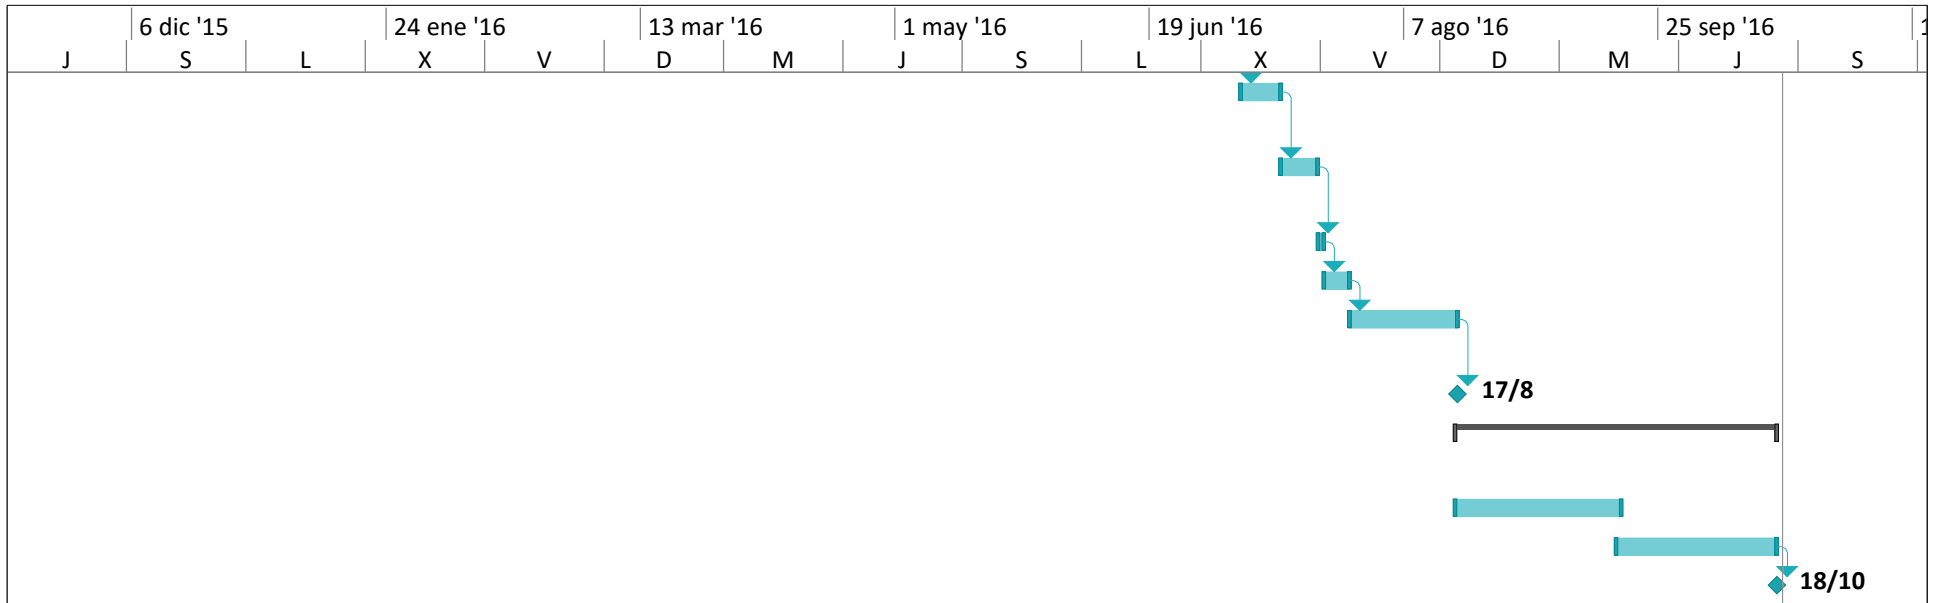

Proyecto: Cronograma Modelo SA
 Fecha: jue 29/6/17

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			
