



Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración             | Comienzo          | Fin                | Predecesoras       | 11 sep '16 |   |   |   |   |   |   | 18 sep '16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|    |               |                 |                      |                   |                    |                    | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J | V | S |  |  |  |  |
| 22 | ✓             | ☛               | Tendido de Conducto  | 7.45 días         | mié 15/3/17        | vie 24/3/17        | 21         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 23 | ✓             | ☛               | Montaje de Transform | 5.37 días         | vie 24/3/17        | lun 3/4/17         | 22         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 24 | ✓             | ☛               | Instalación de Lumin | 5.37 días         | lun 3/4/17         | lun 10/4/17        | 23         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 25 | ✓             | ☛               | Correcciones         | 1.34 días         | lun 10/4/17        | mar 11/4/17        | 24         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 26 | ✓             | ☛               | Remociones           | 2.68 días         | mar 11/4/17        | vie 14/4/17        | 25         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 27 | ✓             | ☛               | Normalización de Su  | 14.69 días        | vie 14/4/17        | vie 5/5/17         | 26         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 28 | ✓             | ☛               | Evaluación           | 0 días            | vie 5/5/17         | vie 5/5/17         | 27         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 29 |               | ☛               | <b>Etapa 3</b>       | <b>51.21 días</b> | <b>mié 5/4/17</b>  | <b>jue 15/6/17</b> |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 30 | ✓             | ☛               | Izaje de Postes      | 8.94 días         | mié 5/4/17         | lun 17/4/17        |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 31 | ✓             | ☛               | Armado de Estructur  | 5.37 días         | lun 17/4/17        | mar 25/4/17        | 30         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 32 | ✓             | ☛               | Tendido de Conducto  | 7.45 días         | mar 25/4/17        | jue 4/5/17         | 31         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 33 | ✓             | ☛               | Montaje de Transform | 5.37 días         | jue 4/5/17         | vie 12/5/17        | 32         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 34 | ✓             | ☛               | Instalación de Lumin | 5.37 días         | vie 12/5/17        | vie 19/5/17        | 33         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 35 | ✓             | ☛               | Correcciones         | 1.34 días         | vie 19/5/17        | lun 22/5/17        | 34         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 36 |               | ☛               | Remociones           | 2.68 días         | lun 22/5/17        | jue 25/5/17        | 35         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 37 | ✓             | ☛               | Normalización de Su  | 14.69 días        | jue 25/5/17        | jue 15/6/17        | 36         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 38 |               | ☛               | Evaluación           | 0 días            | jue 15/6/17        | jue 15/6/17        | 37         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 39 |               | ☛               | <b>Etapa 4</b>       | <b>51.21 días</b> | <b>lun 15/5/17</b> | <b>mar 25/7/17</b> |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 40 | ✓             | ☛               | Izaje de Postes      | 10 días           | lun 15/5/17        | vie 26/5/17        |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 41 | ✓             | ☛               | Armado de Estructur  | 5.37 días         | lun 29/5/17        | lun 5/6/17         | 40         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 42 | ✓             | ☛               | Tendido de Conducto  | 7.45 días         | lun 5/6/17         | mié 14/6/17        | 41         |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                         | Duración       | Comienzo           | Fin                | Predecesoras | 11 sep '16 |   |   |   |   |   |   | 18 sep '16 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |  |  |
|----|---------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|    |               |   |                |                    |                    |              | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X |   | J | V | S | D |  |  |
| 43 | ✓             | Montaje de Transformador                | 5.37 días      | mié 14/6/17        | jue 22/6/17        | 42           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 44 | ✓             | Instalación de luminarias               | 5.37 días      | jue 22/6/17        | jue 29/6/17        | 43           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 45 |               | Correcciones                            | 1.34 días      | jue 29/6/17        | vie 30/6/17        | 44           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 46 |               | Remociones                              | 2.68 días      | vie 30/6/17        | mié 5/7/17         | 45           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 47 |               | Normalización de Surcos                 | 14.69 días     | mié 5/7/17         | mié 26/7/17        | 46           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 48 |               | Evaluación                              | 0 días         | mié 26/7/17        | mié 26/7/17        | 47           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 49 |               | <b>Cierres Técnico y Administrativo</b> | <b>46 días</b> | <b>mar 25/7/17</b> | <b>mar 26/9/17</b> |              |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 50 |               | Cierre Técnico                          | 28 días        | mar 25/7/17        | jue 31/8/17        |              |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 51 |               | Cierre Administrativo                   | 22 días        | vie 1/9/17         | lun 2/10/17        | 50           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 52 |               | Evaluación                              | 0 días         | lun 2/10/17        | lun 2/10/17        | 51           |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

|            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep '16 |   |   |   |   |   |   | 2 oct '16 |   |   |   |   |   |   | 9 oct '16 |   |   |   |   |   |   | 16 oct '16 |   |   |   |   |   |   | 23 oct '16 |   |   |   |   |   |   | 30 oct '16 |   |   |   |   |   |   | 6 nov '16 |   |   |   |   |   |   |
| D          | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D          | L | M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S |

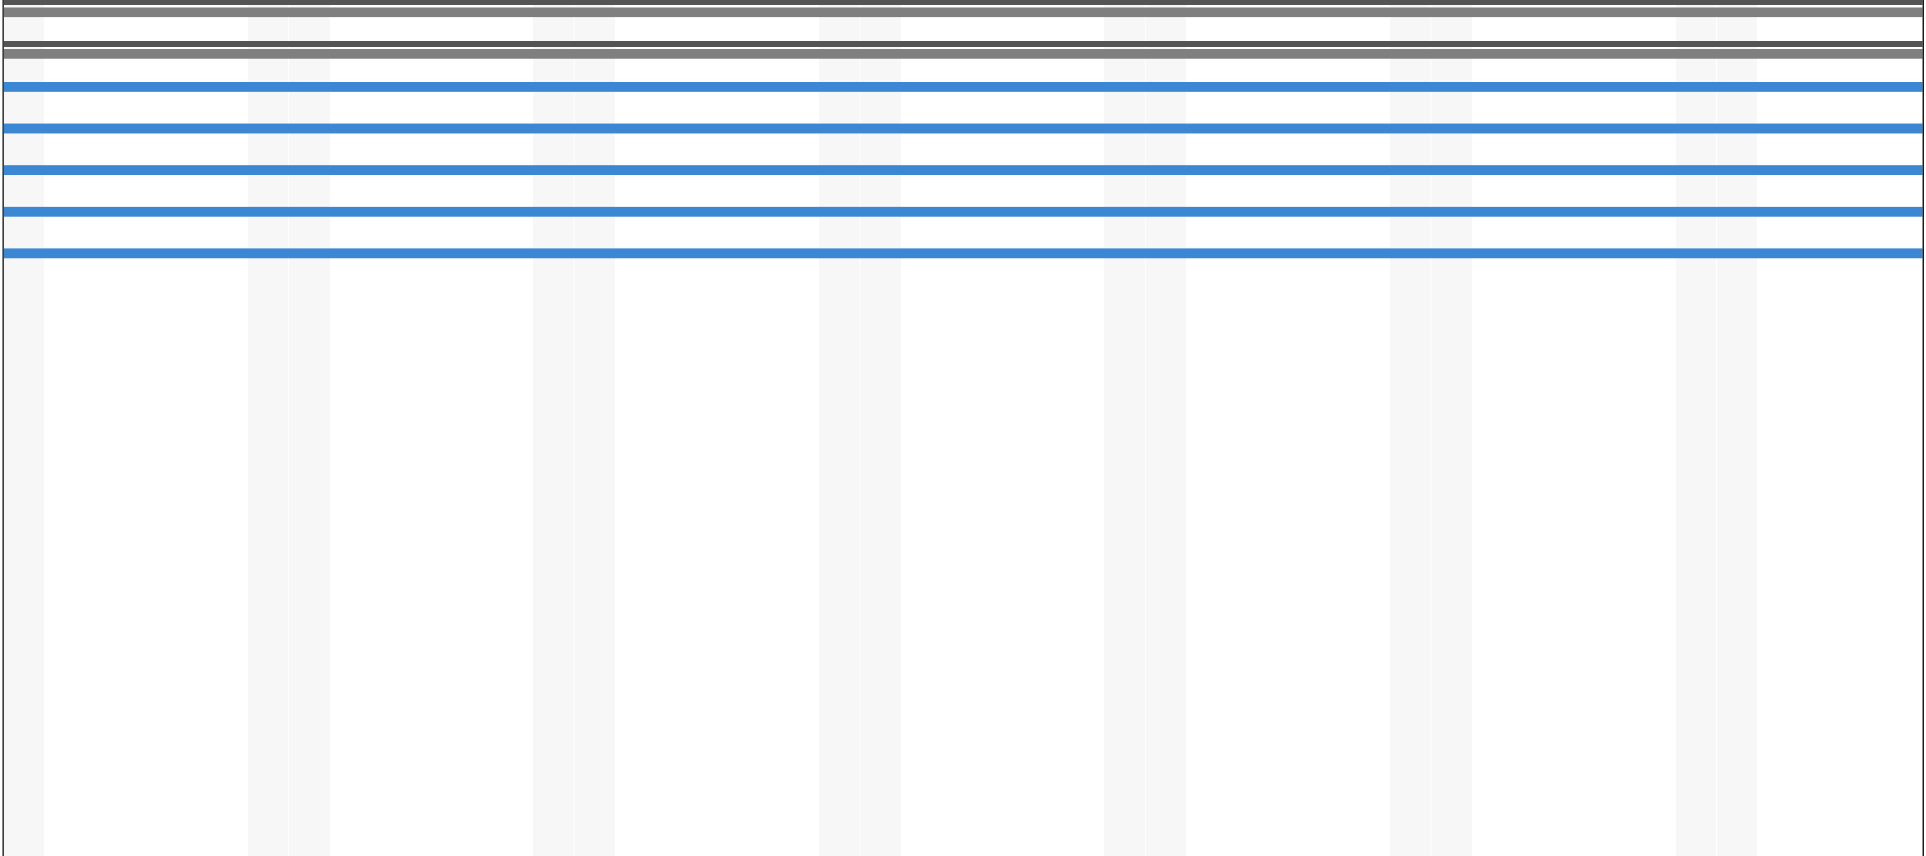


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

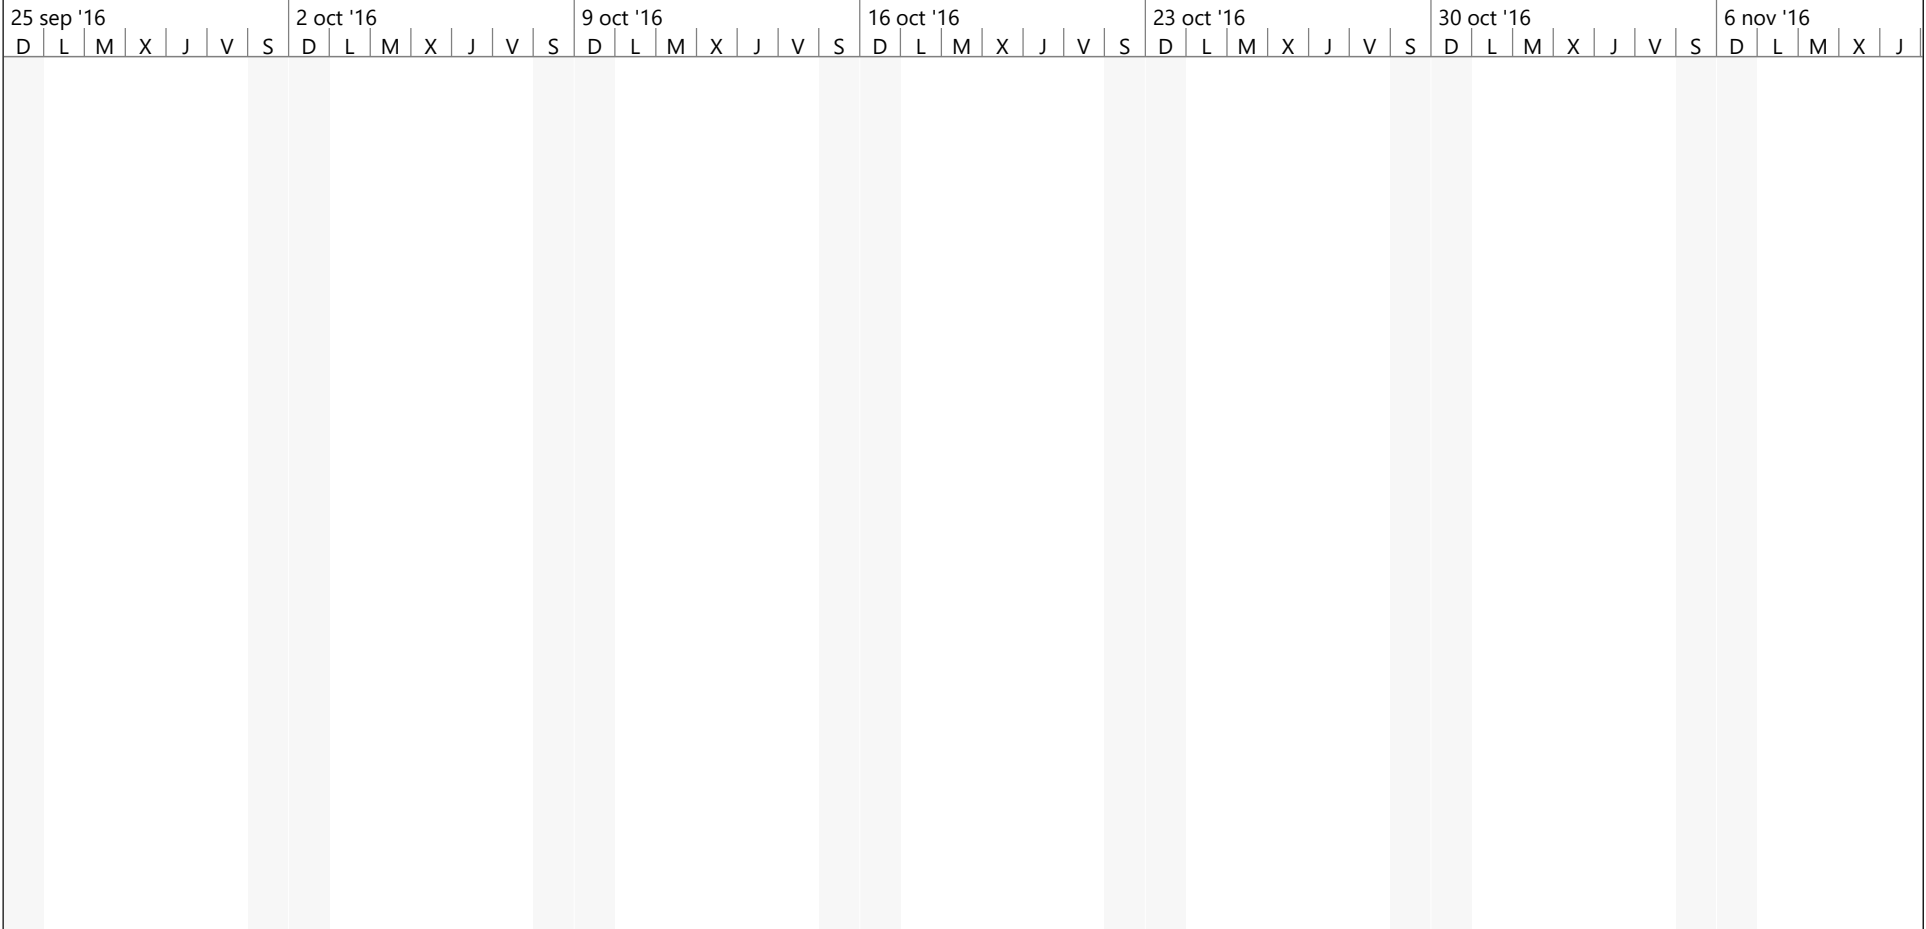

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

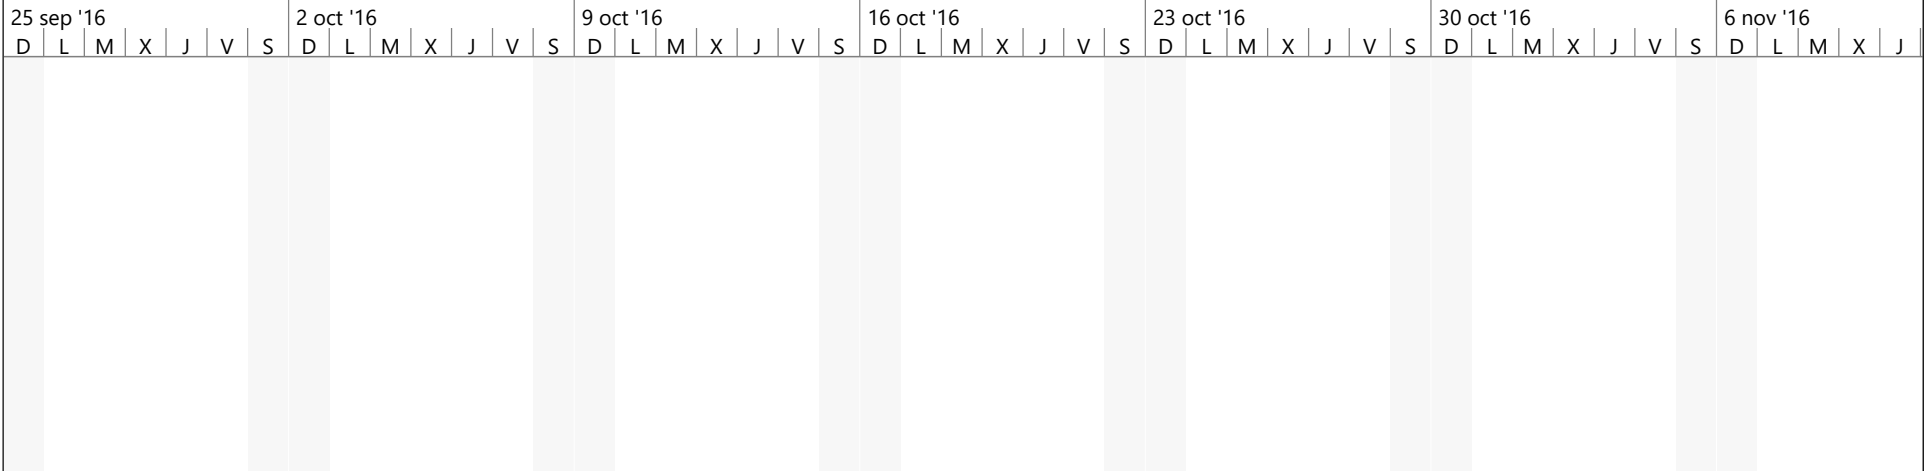

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecución NIBA104 Mar 2018

13 nov '16
20 nov '16
27 nov '16
4 dic '16
11 dic '16
18 dic '16
25 dic '16

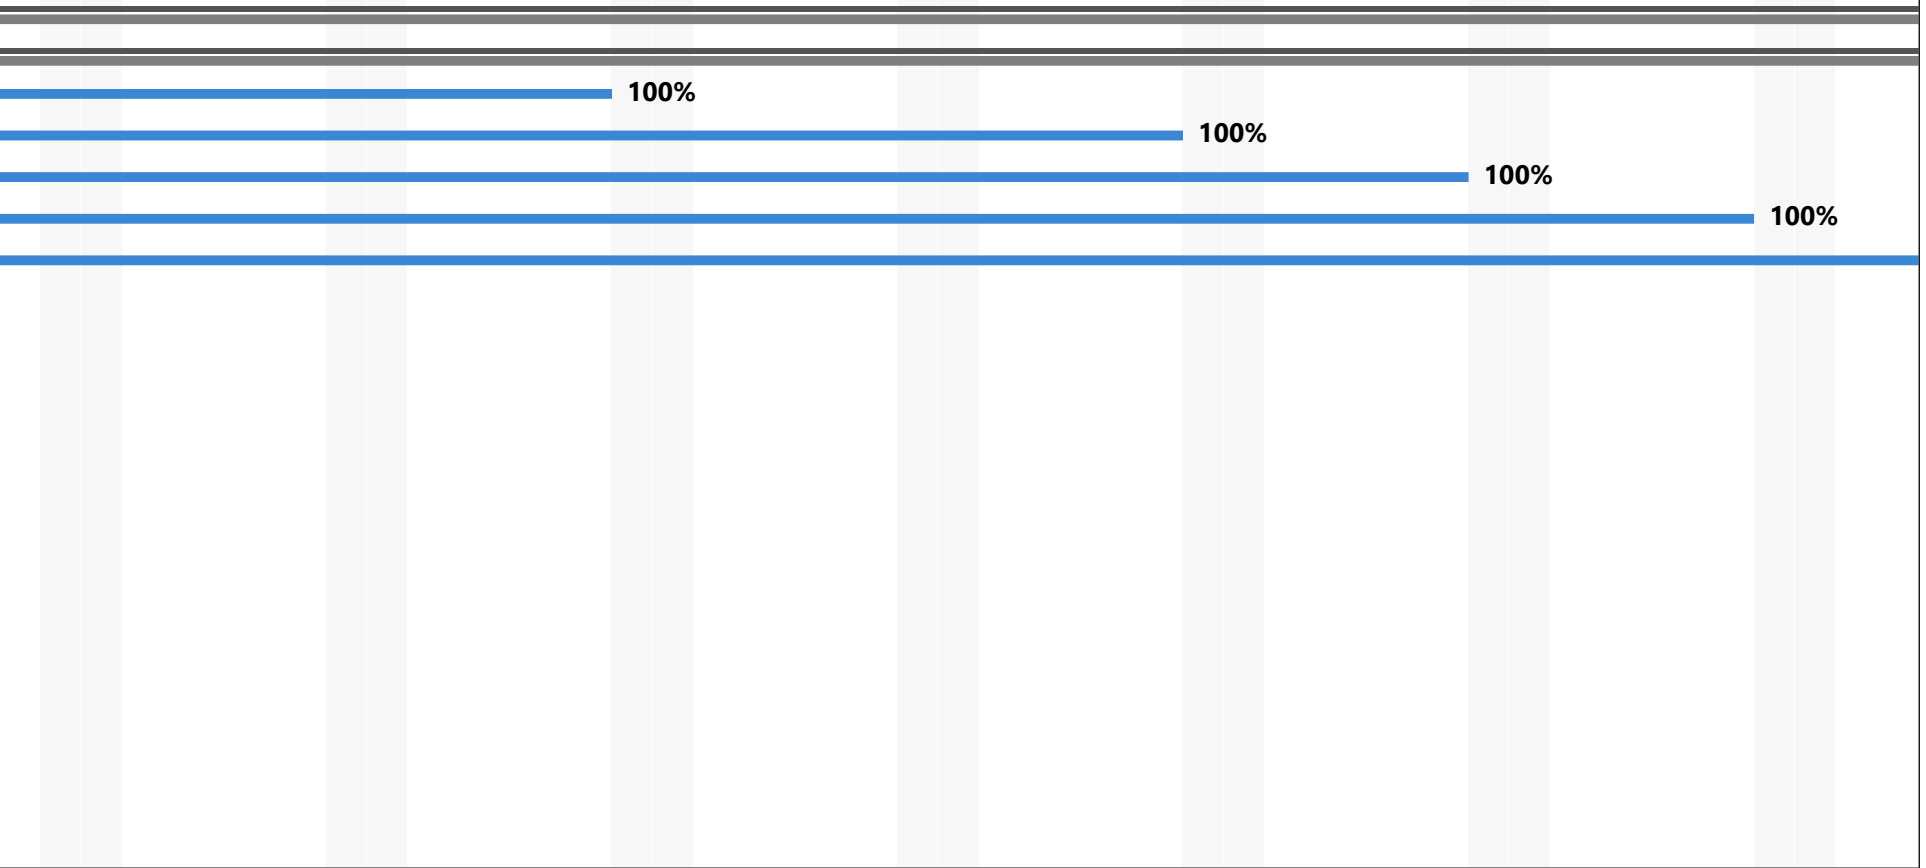

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

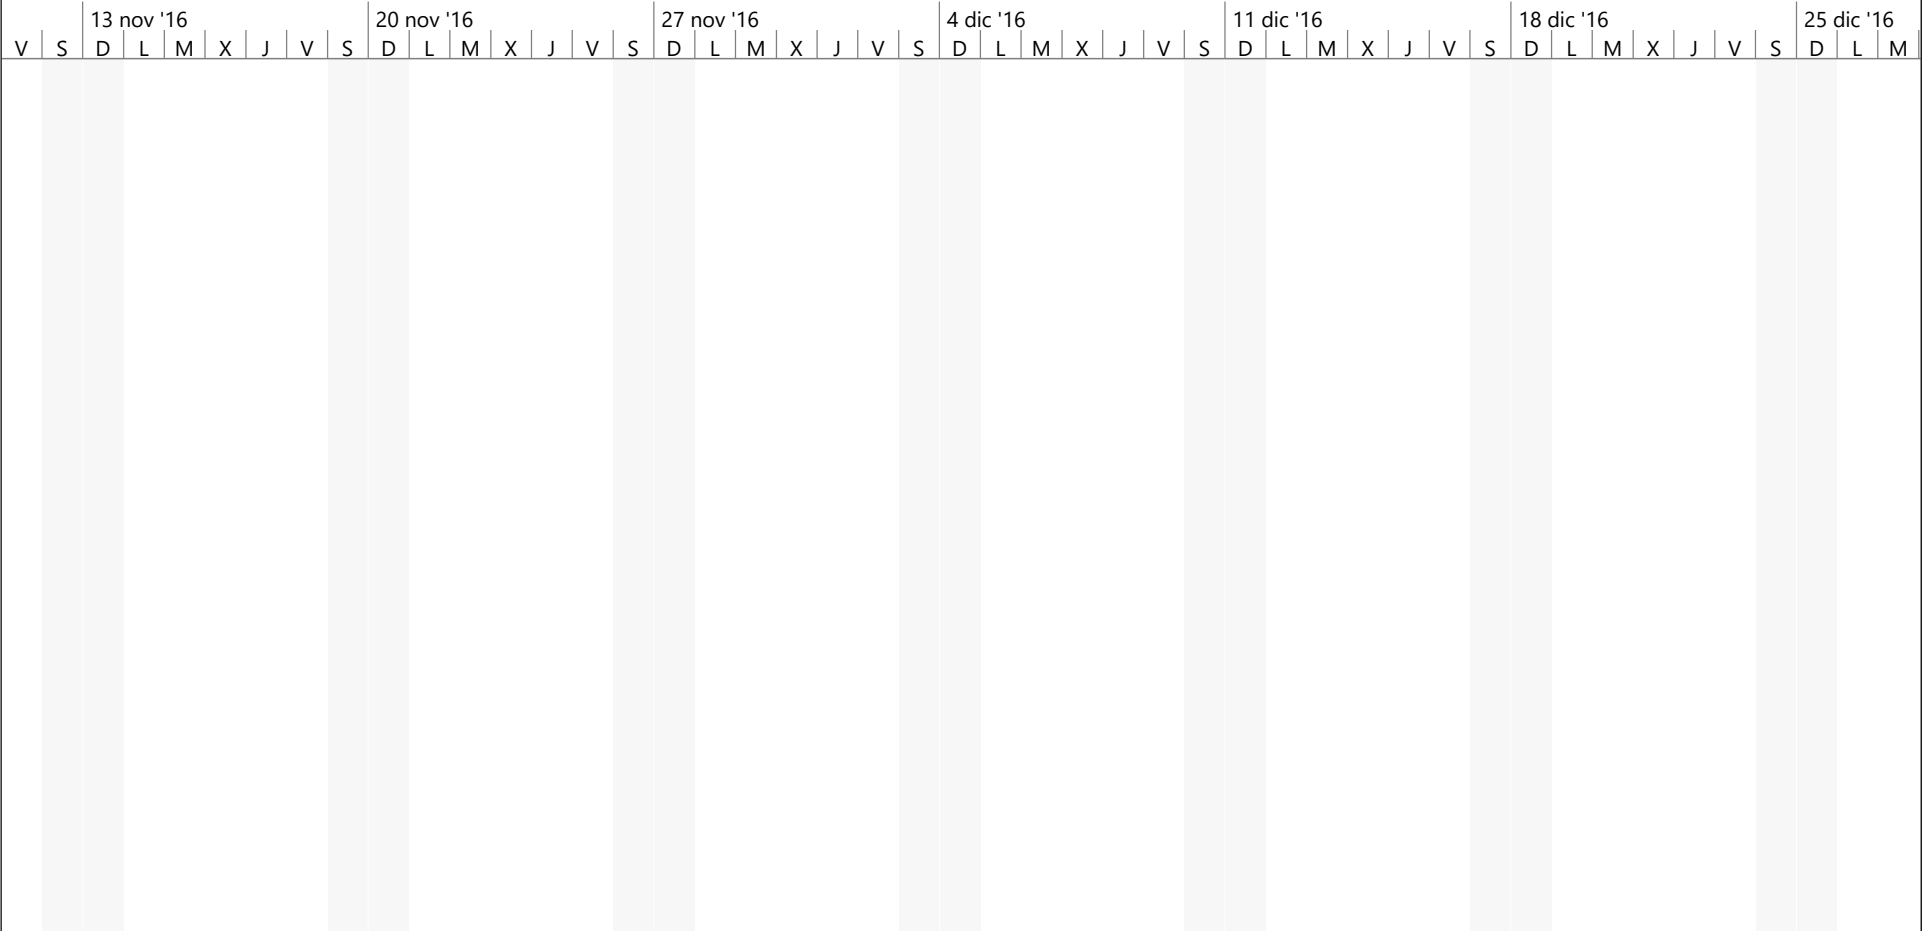

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |




## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

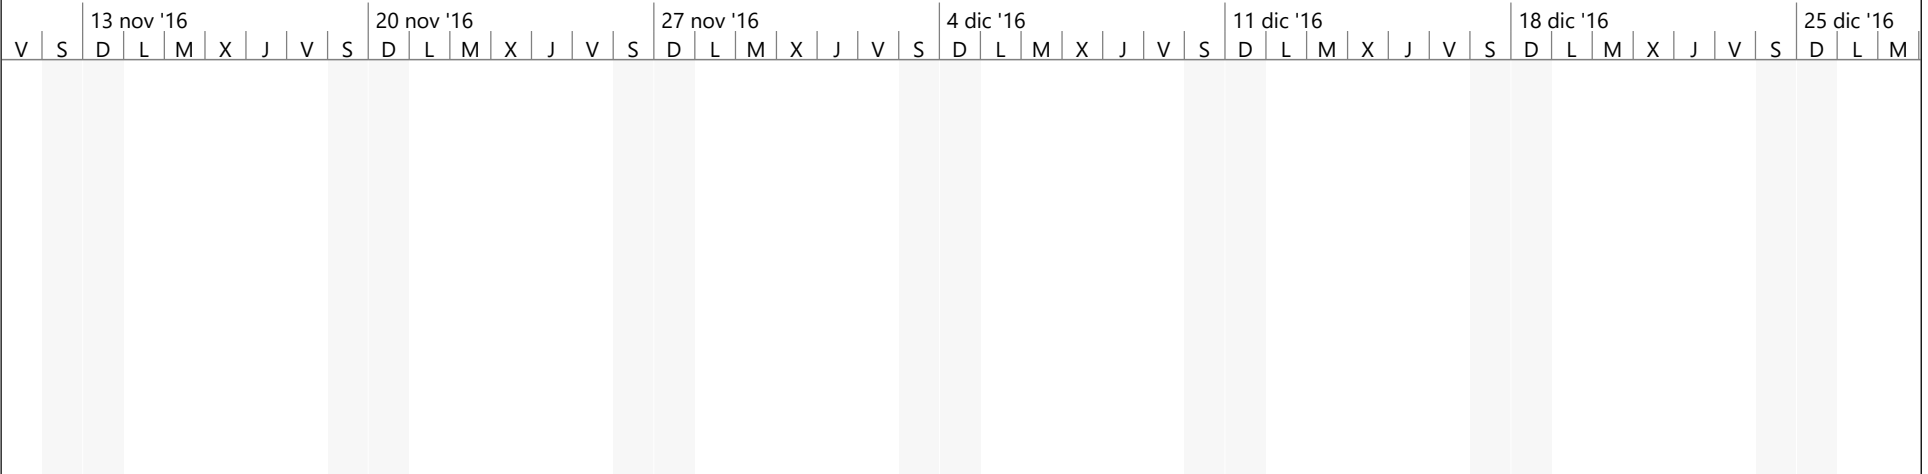

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

X J V S | 1 ene '17 | D L M X J V S | 8 ene '17 | D L M X J V S | 15 ene '17 | D L M X J V S | 22 ene '17 | D L M X J V S | 29 ene '17 | D L M X J V S | 5 feb '17 | D L M X J V S | 12 f

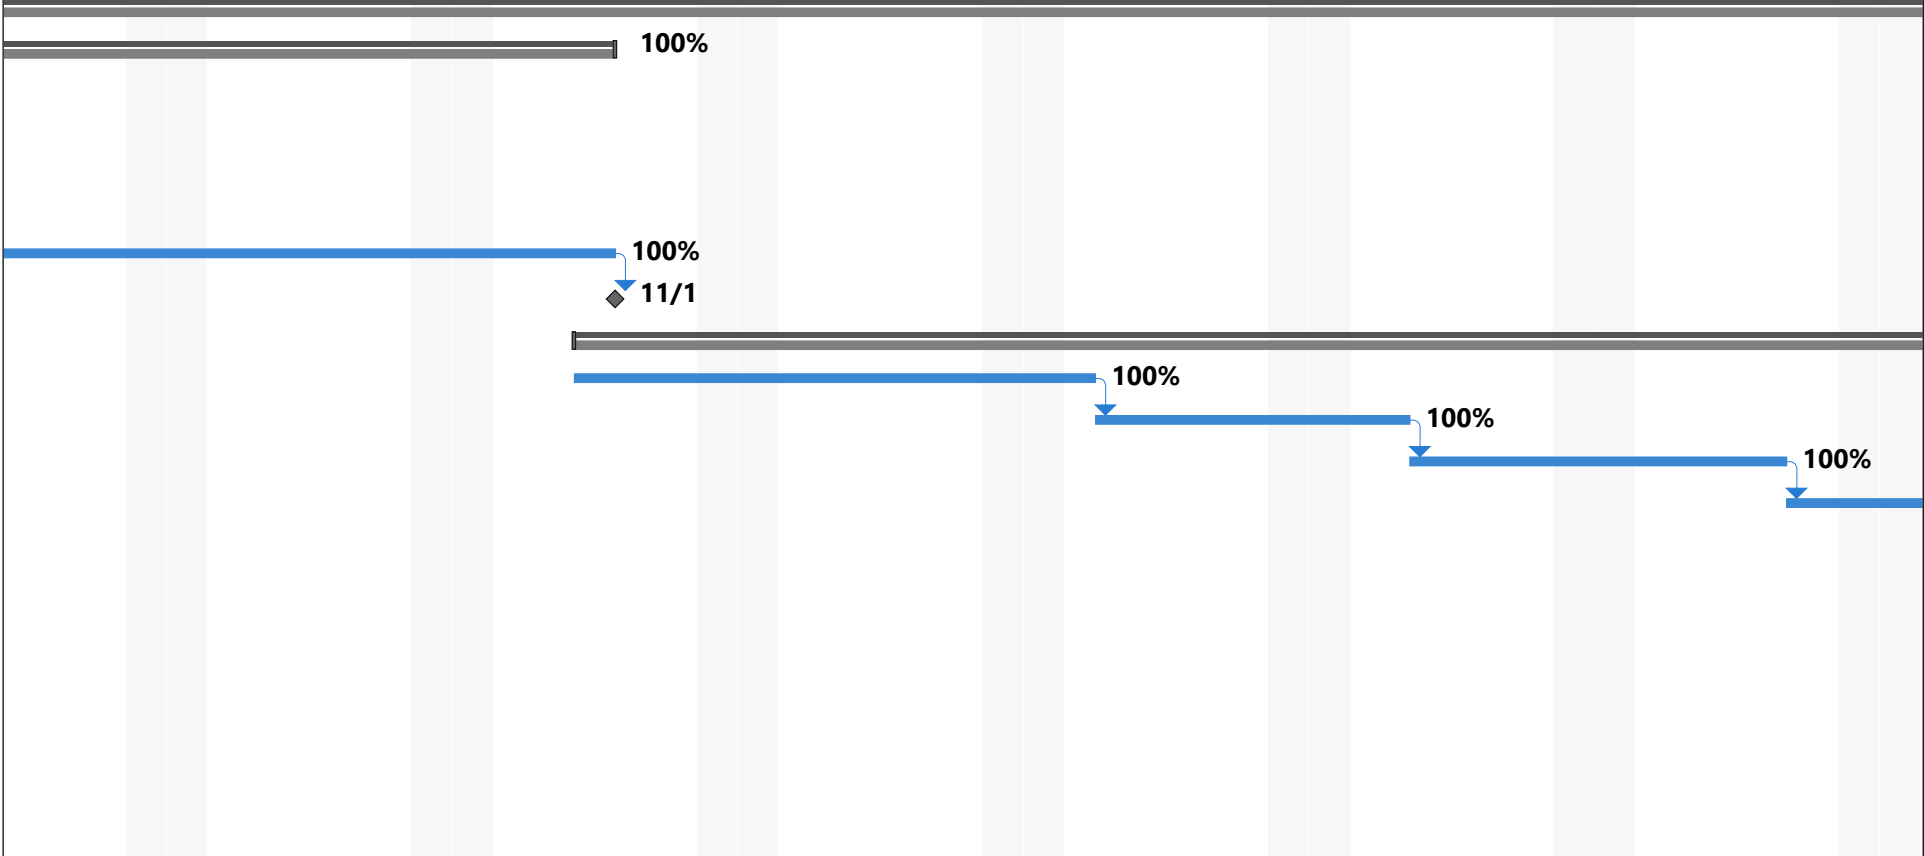


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

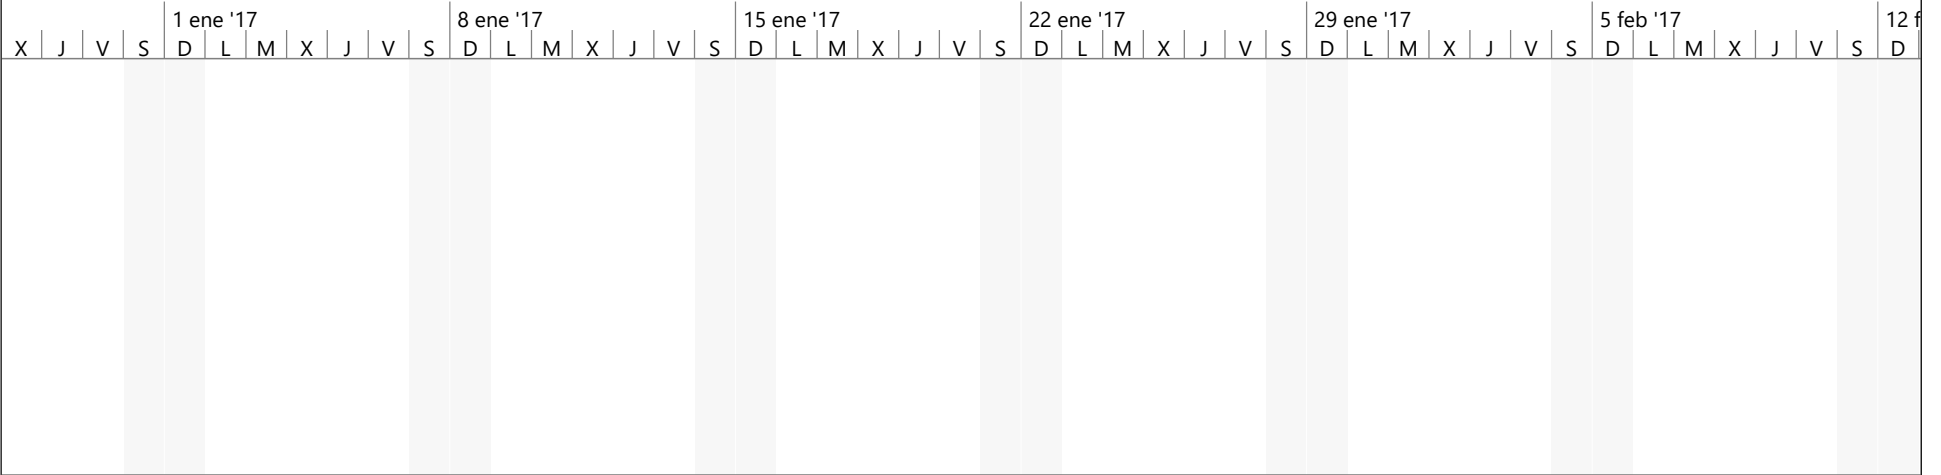

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

feb '17 | 19 feb '17 | 26 feb '17 | 5 mar '17 | 12 mar '17 | 19 mar '17 | 26 mar '17  
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

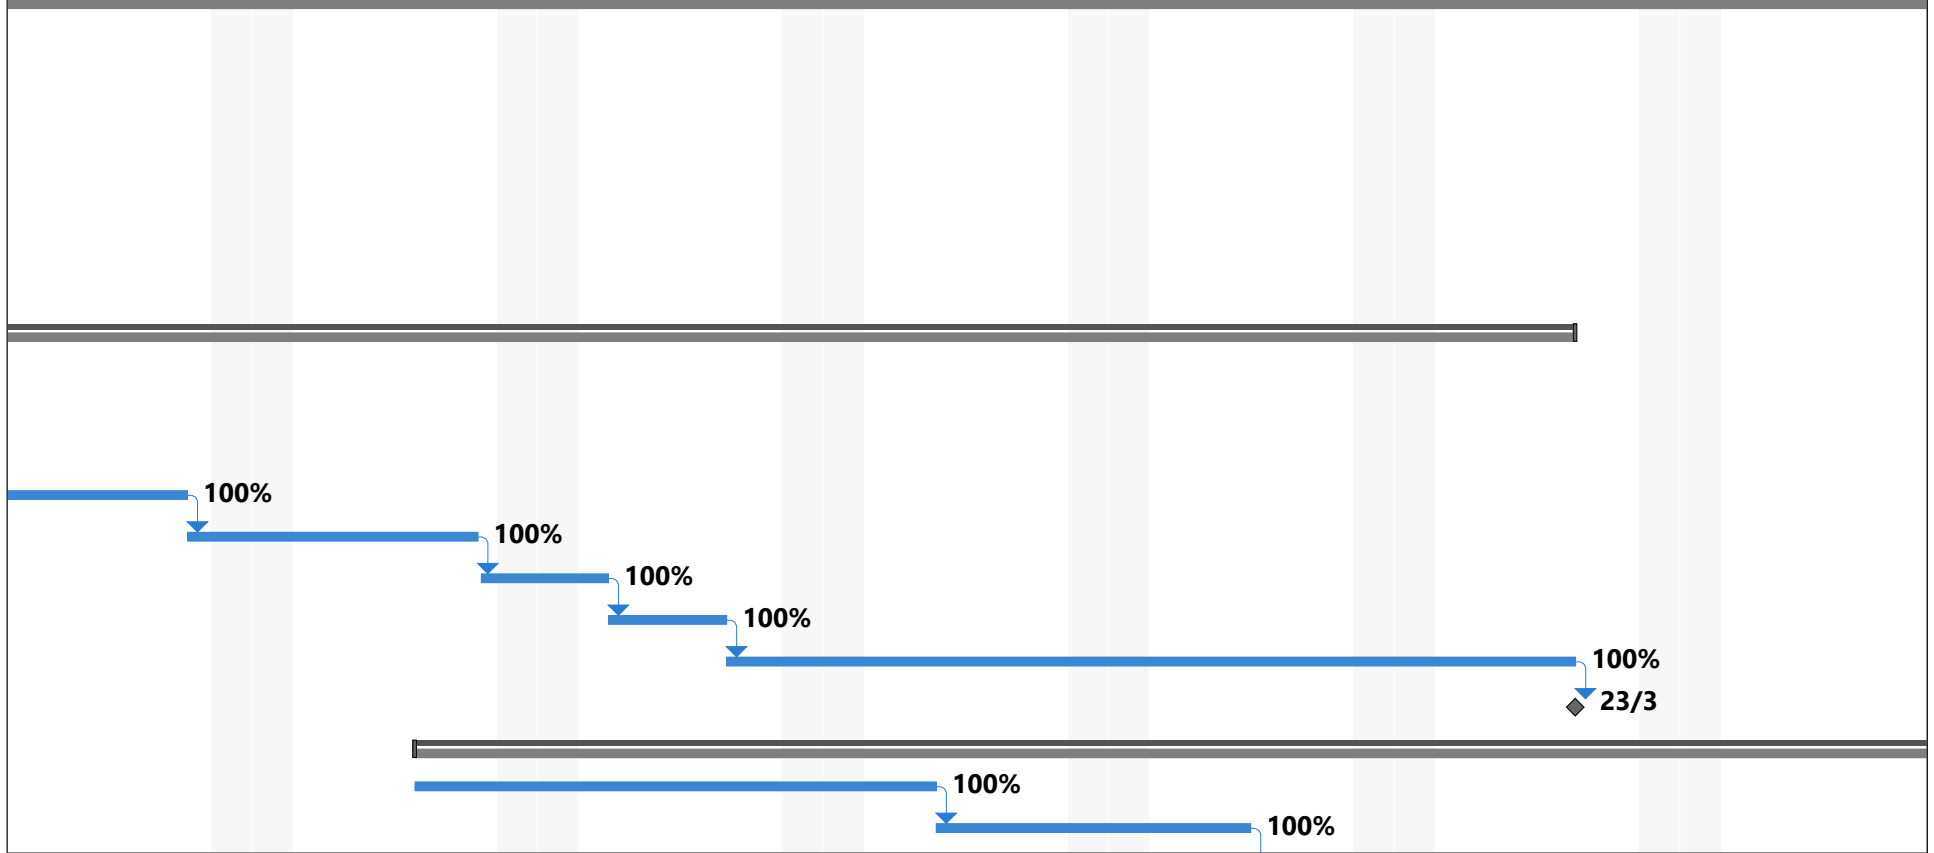

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


### Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

feb '17 | 19 feb '17 | 26 feb '17 | 5 mar '17 | 12 mar '17 | 19 mar '17 | 26 mar '17  
 L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V

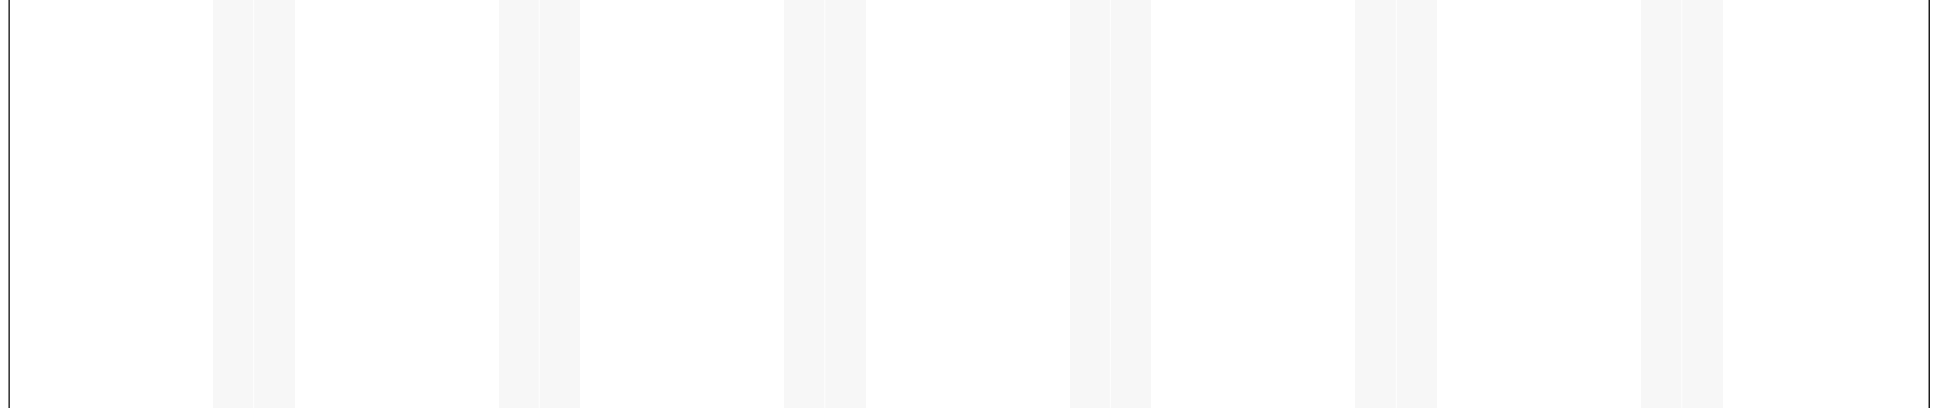

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018


|           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 abr '17 |   |   |   |   |   |   | 9 abr '17 |   |   |   |   |   |   | 16 abr '17 |   |   |   |   |   |   | 23 abr '17 |   |   |   |   |   |   | 30 abr '17 |   |   |   |   |   |   | 7 may '17 |   |   |   |   |   |   | 14 may '17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S         | D | L | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J | V | S          | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |




## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

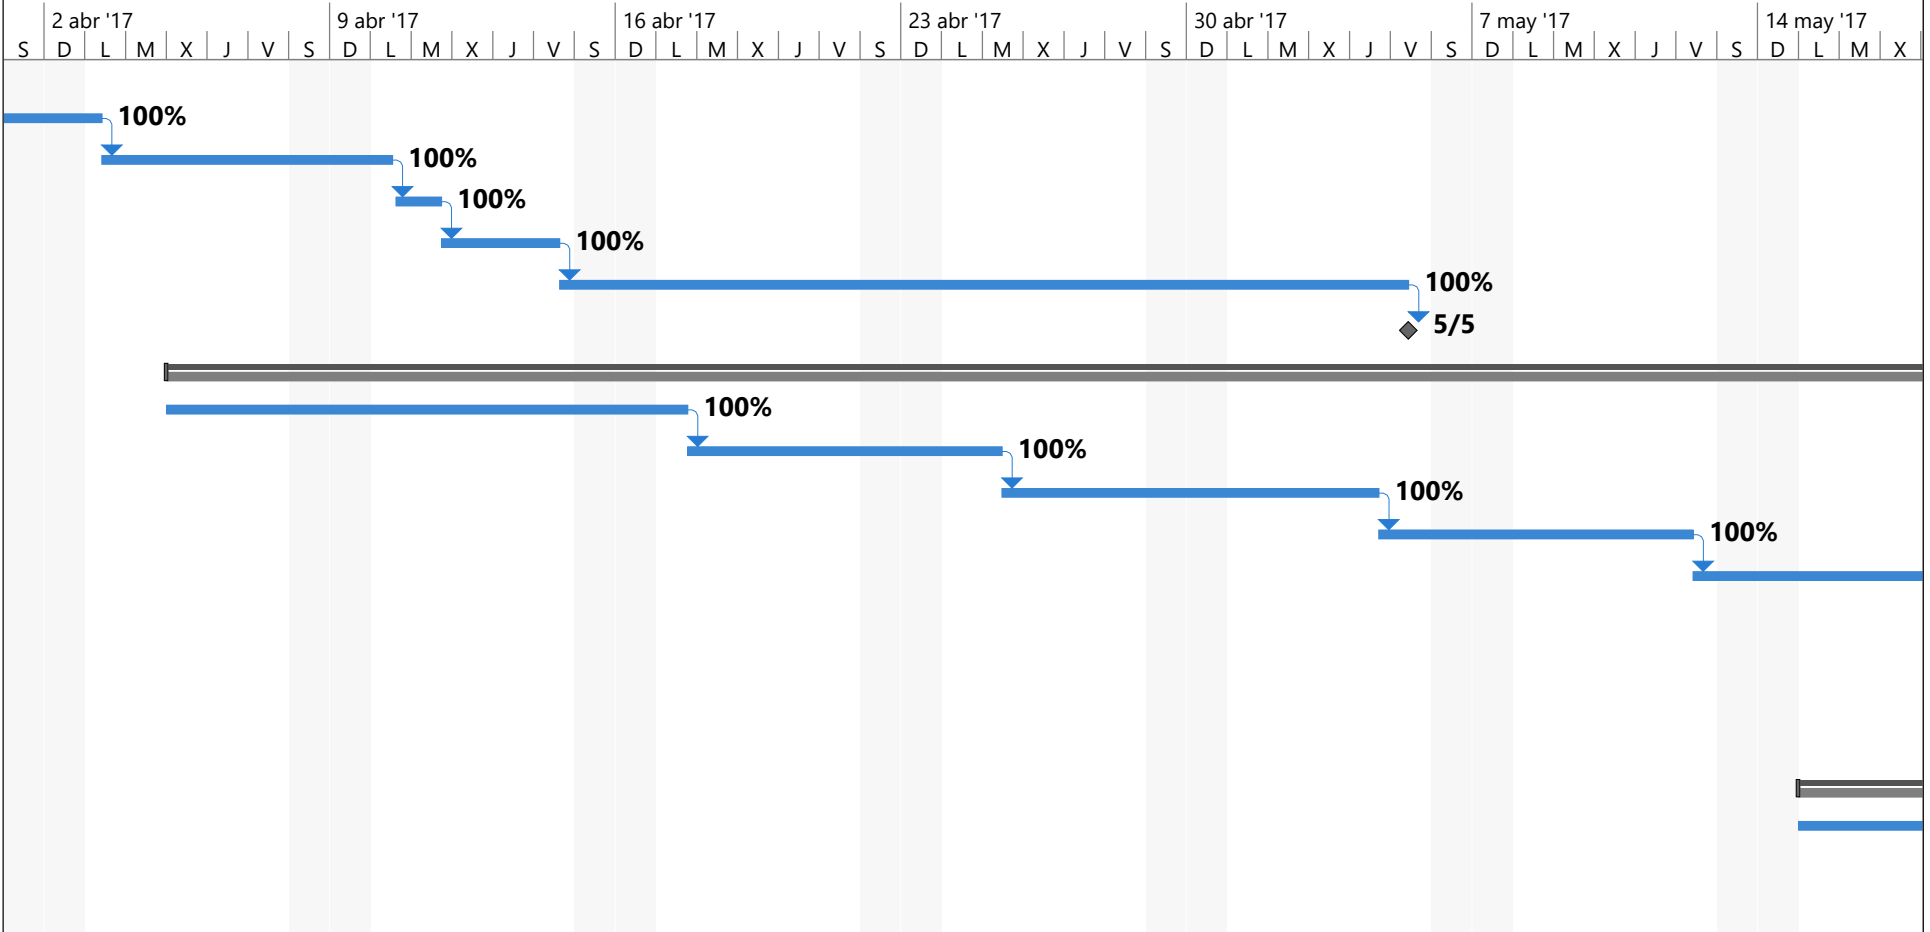

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |


### Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

|            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 may '17 |   |   |   | 28 may '17 |   |   |   | 4 jun '17 |   |   |   | 11 jun '17 |   |   |   | 18 jun '17 |   |   |   | 25 jun '17 |   |   |   | 2 jul '17 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| J          | V | S | D | L          | M | X | J | V         | S | D | L | M          | X | J | V | S          | D | L | M | X          | J | V | S | D         | L | M | X | J | V | S | D | L |

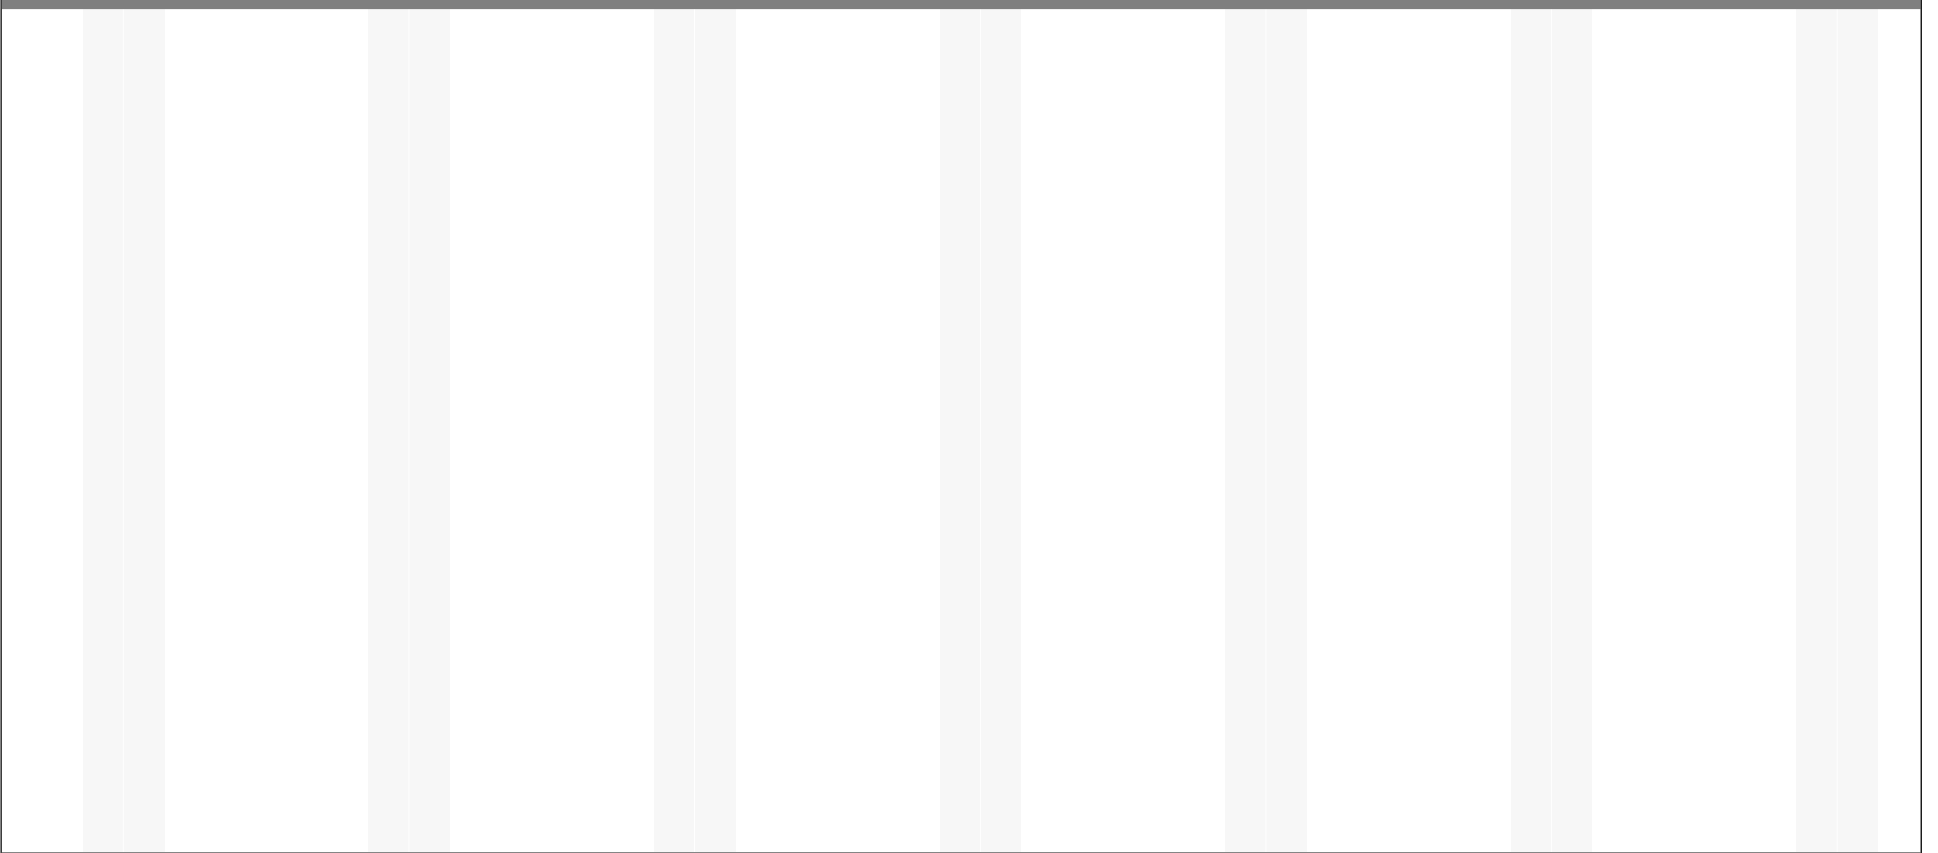


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

### Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

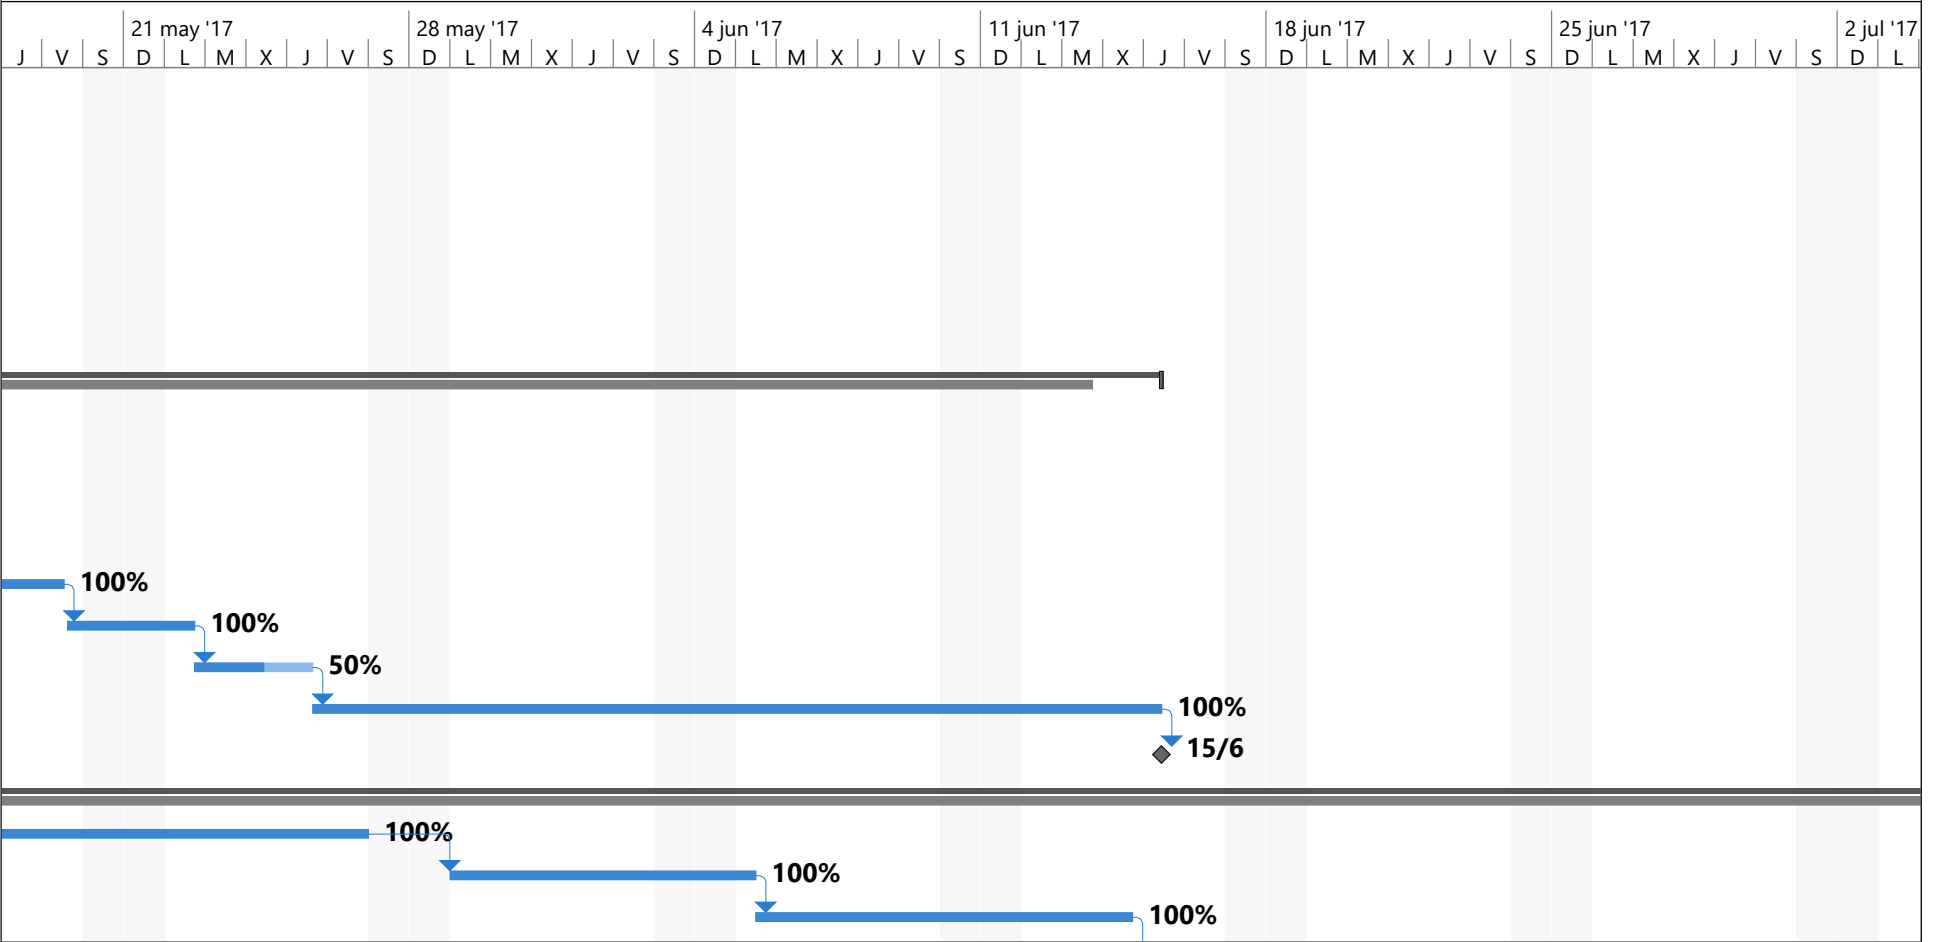

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

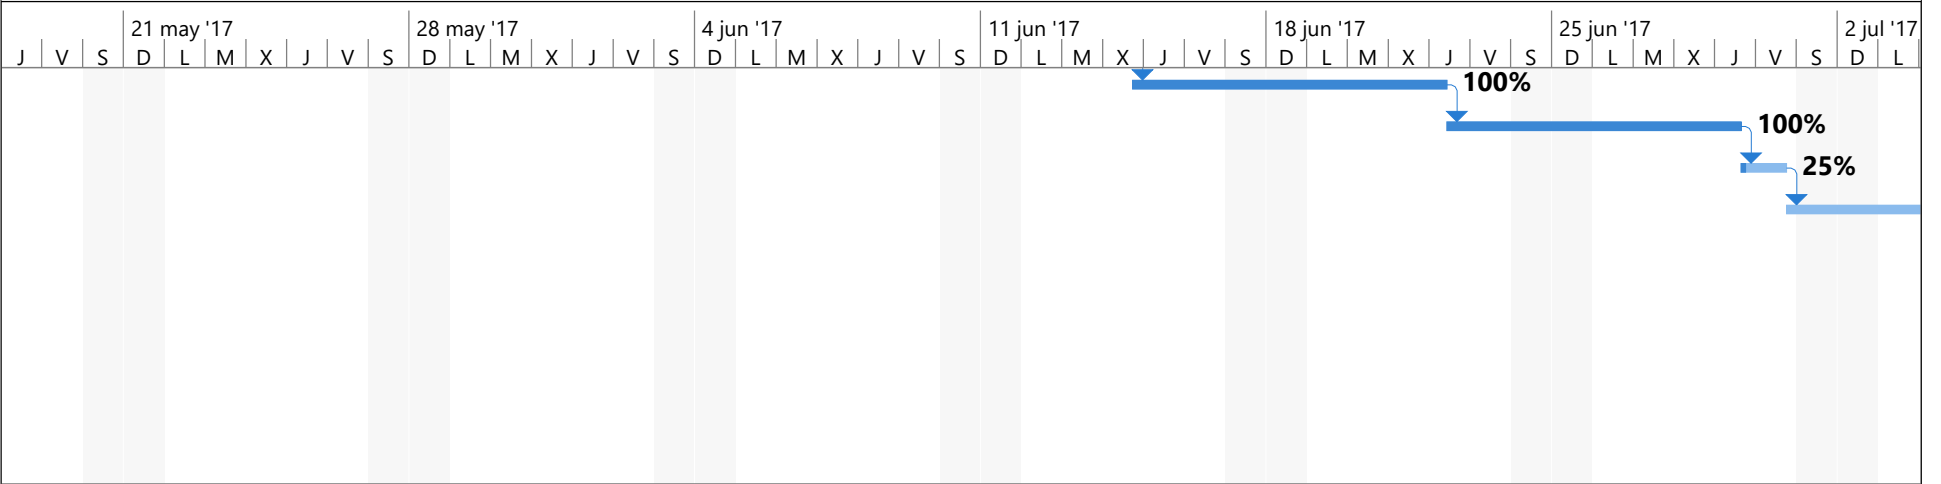

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |


## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

|   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 9 jul '17 |   |   |   |   | 16 jul '17 |   |   |   |   | 23 jul '17 |   |   |   |   | 30 jul '17 |   |   |   |   | 6 ago '17 |   |   |   |   | 13 ago '17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| M | X | J | V | S | D         | L | M | X | J | V          | S | D | L | M | X          | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S         | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S |

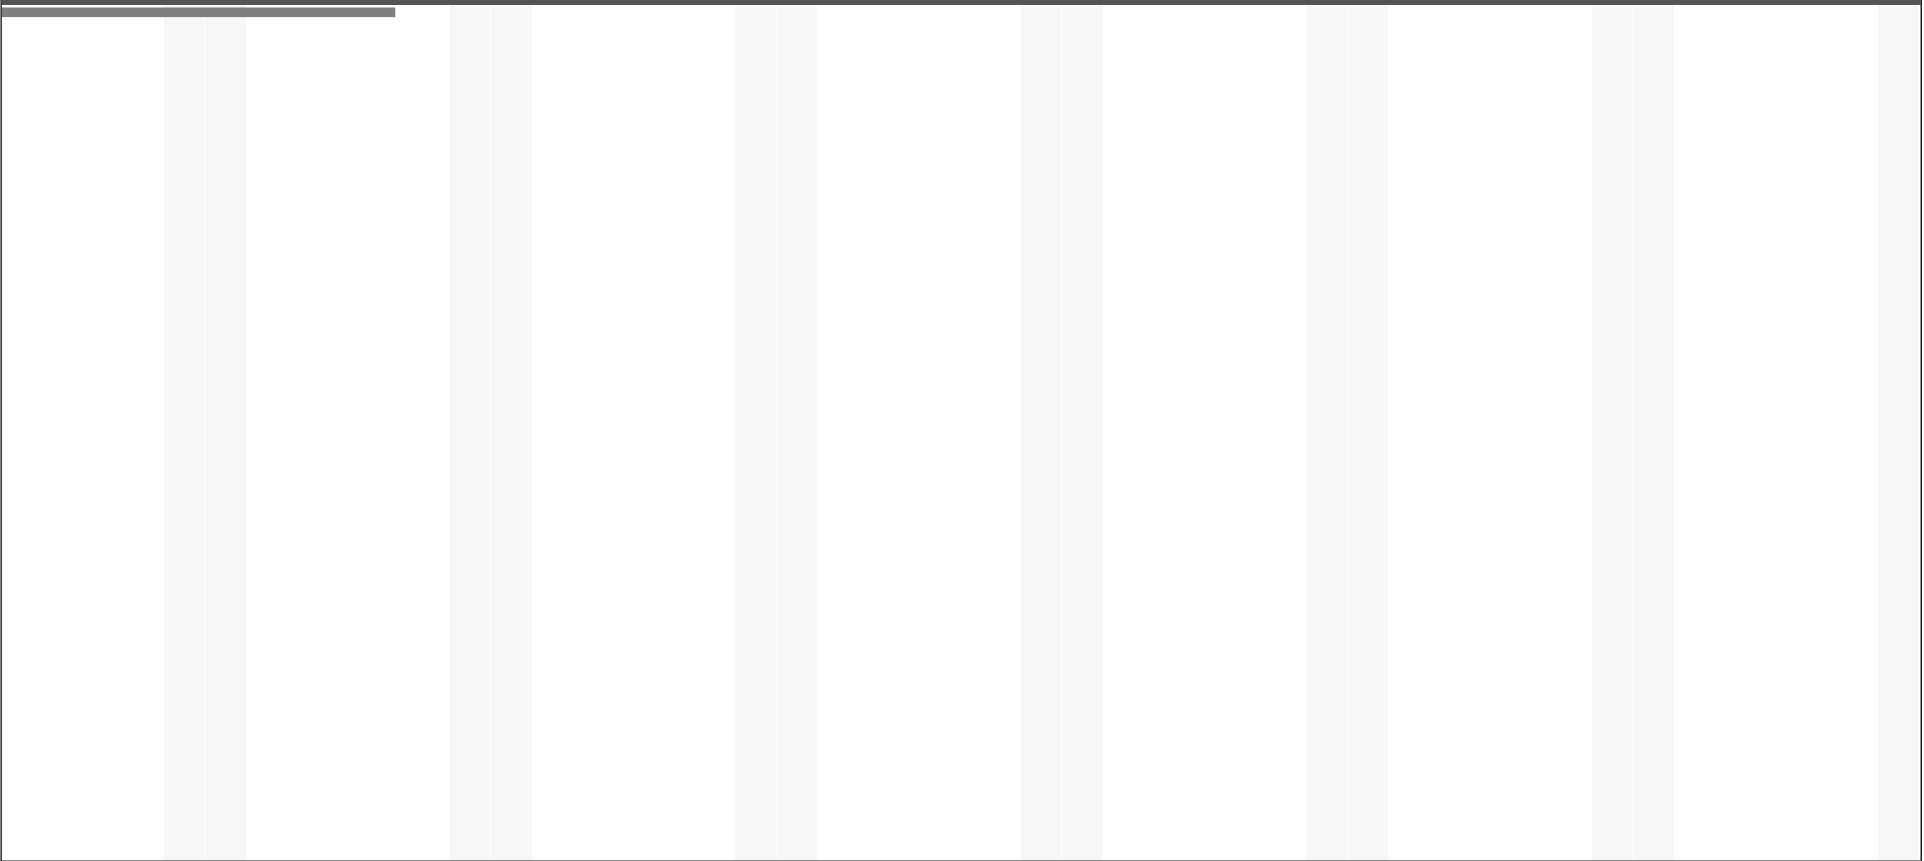


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

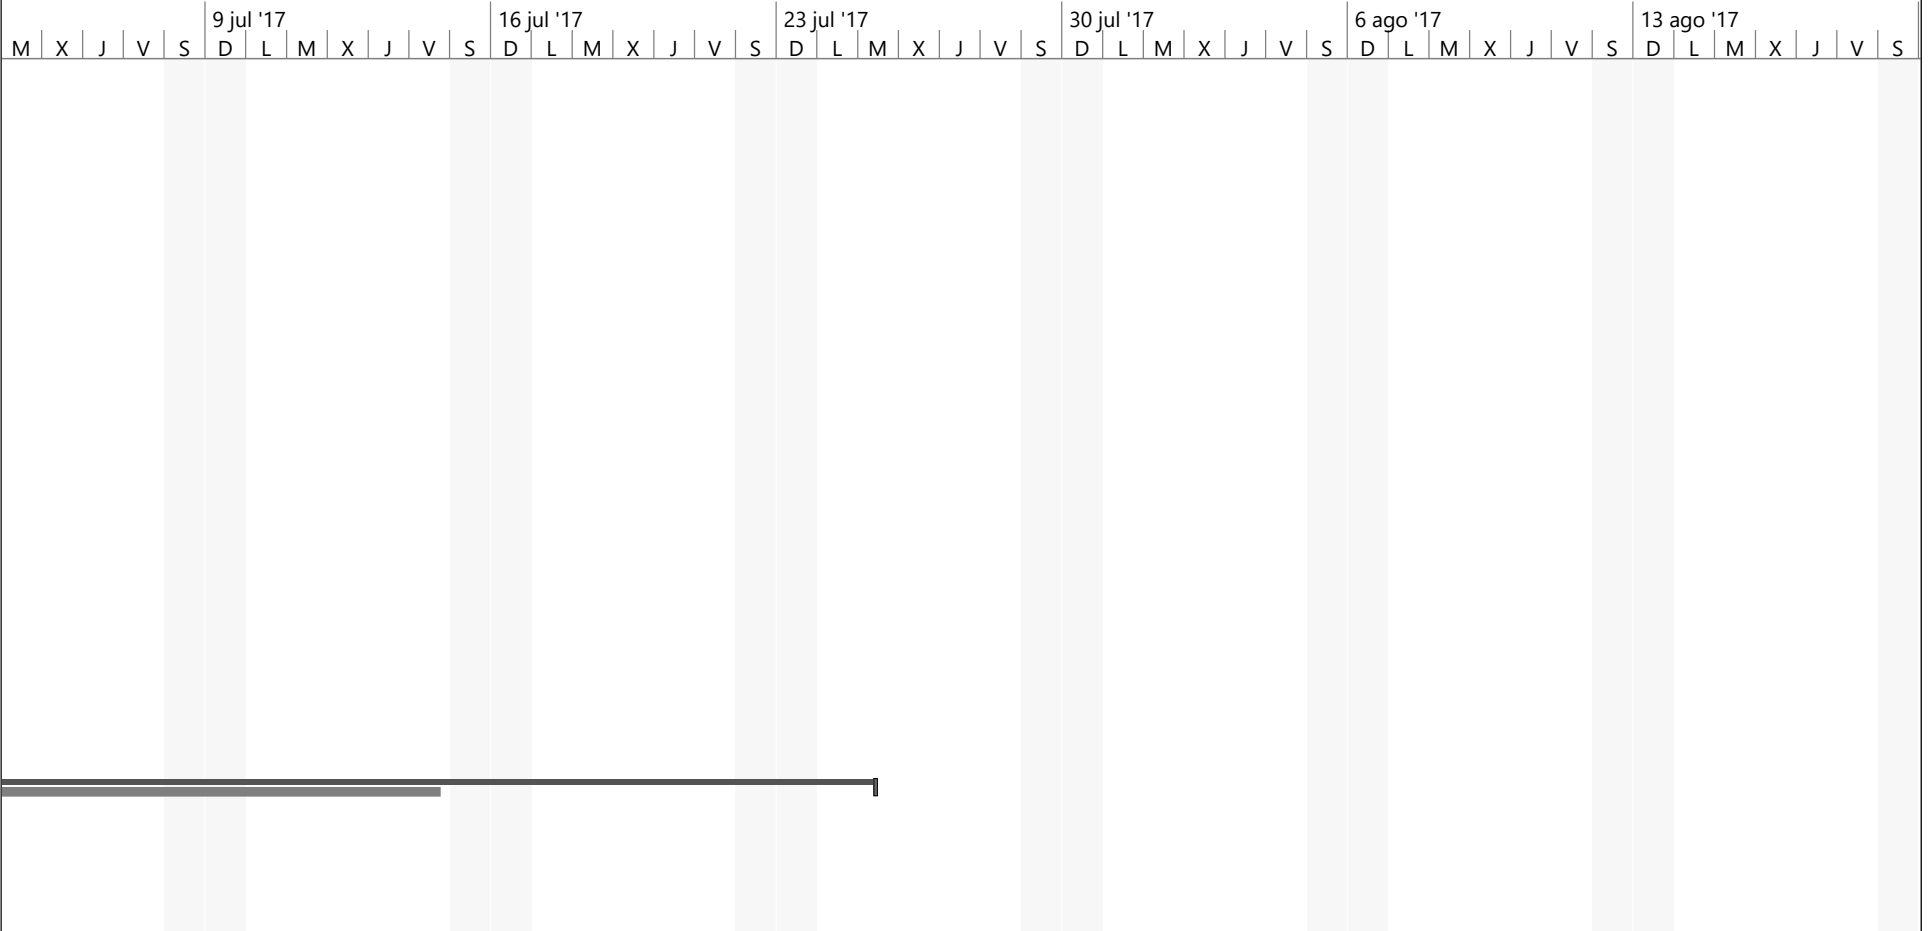

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |


### Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

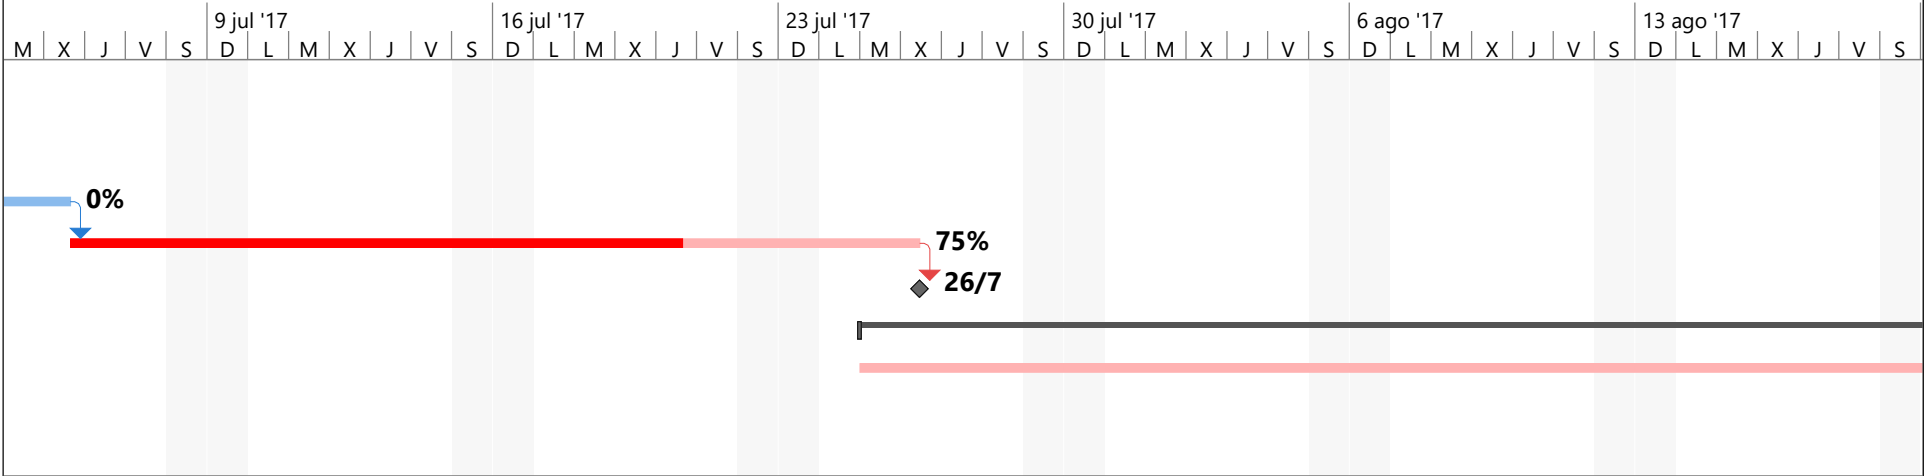

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |




## Calendario de ejecución NIBA104 Mar 2018

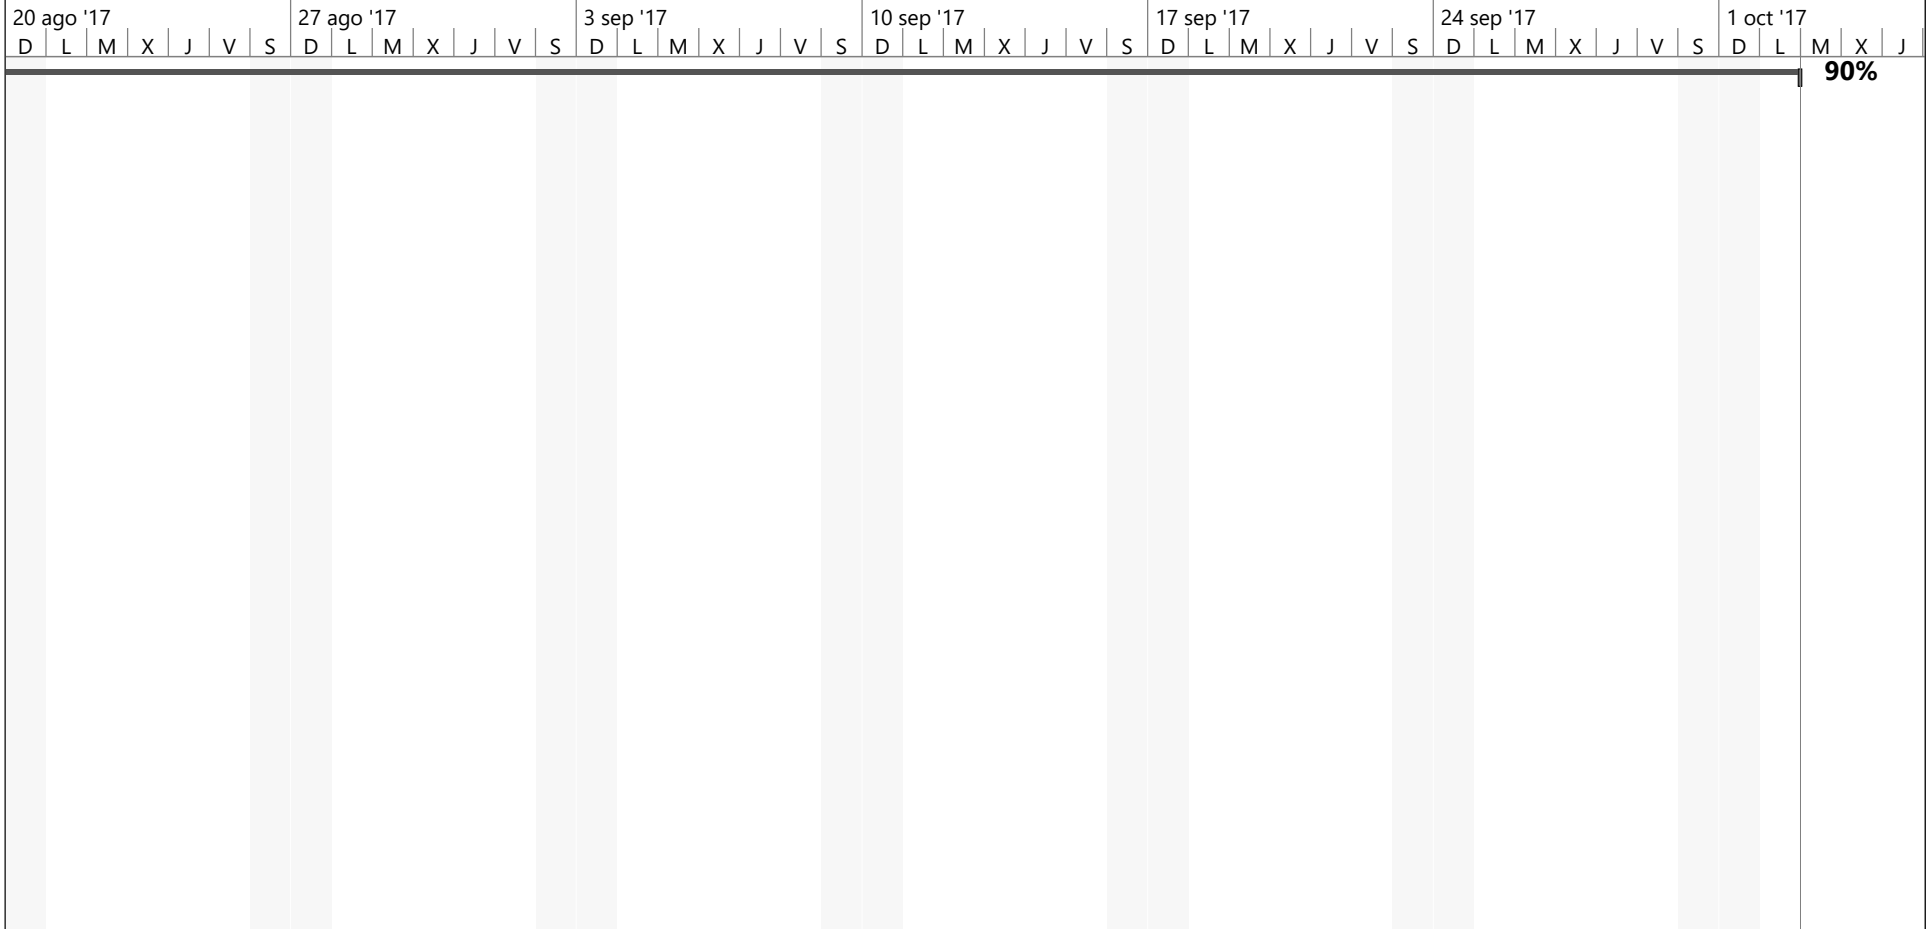

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

## Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

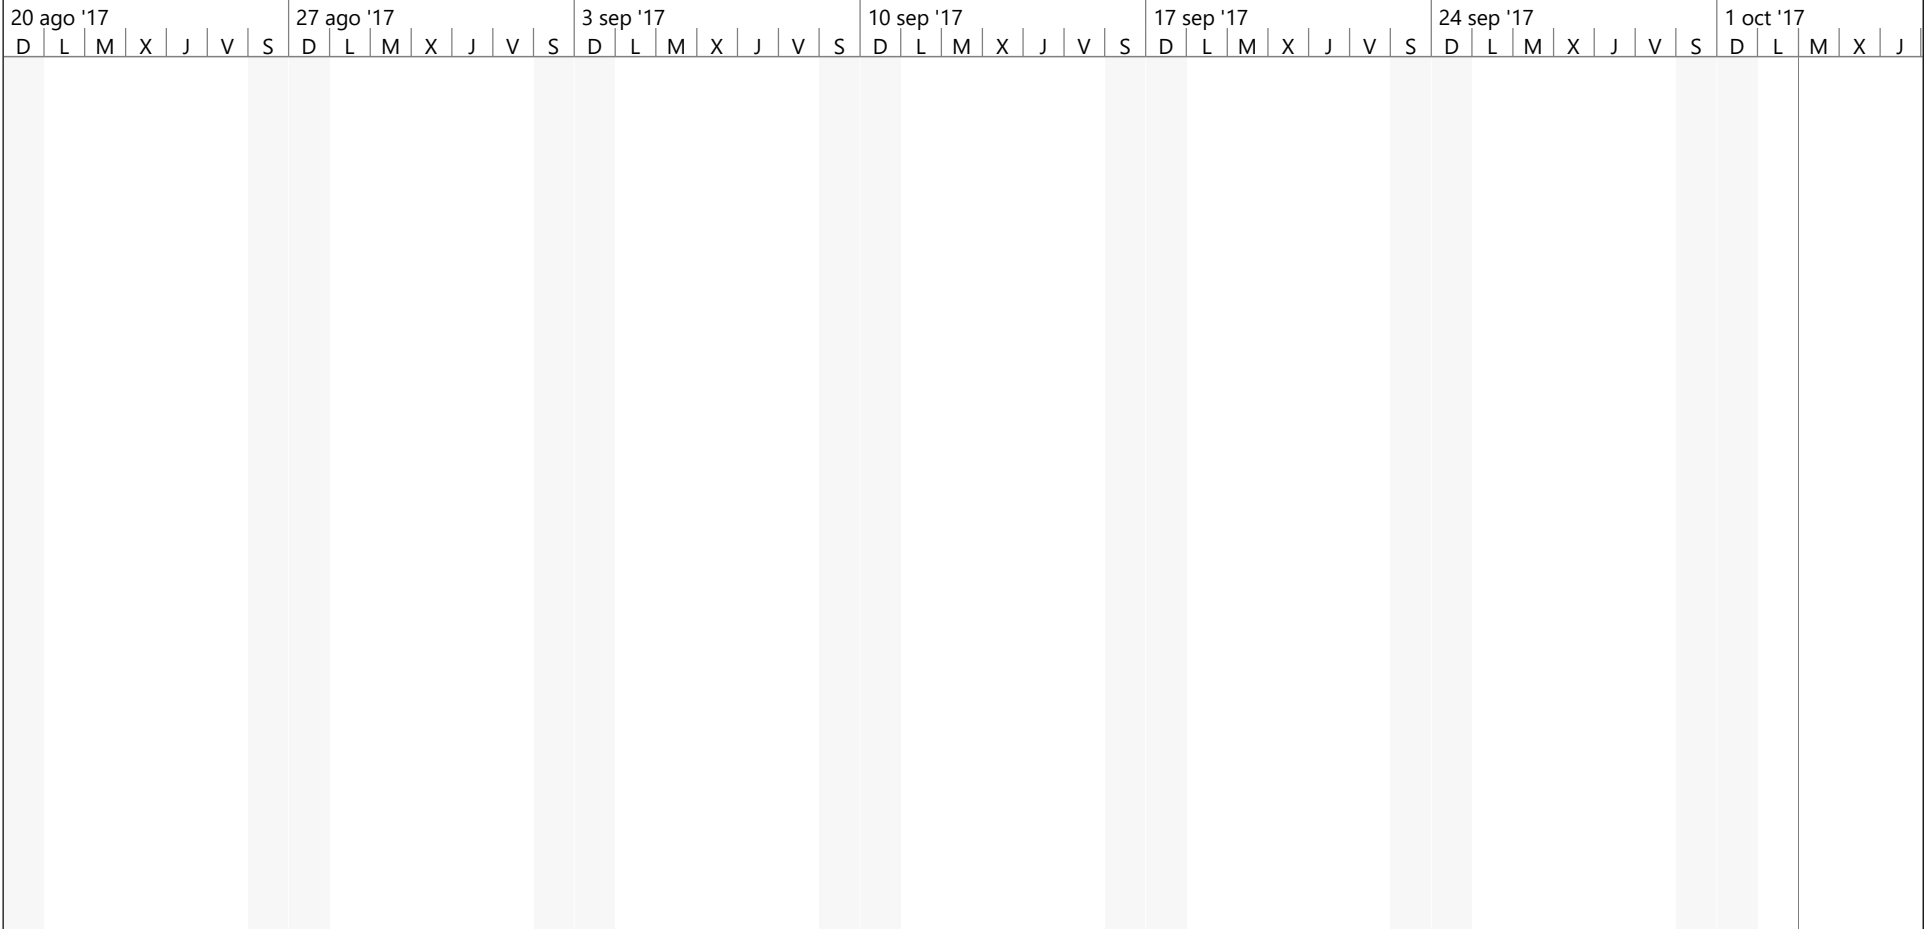

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Calendario de ejecucion NIBA104 Mar 2018

20 ago '17 | 27 ago '17 | 3 sep '17 | 10 sep '17 | 17 sep '17 | 24 sep '17 | 1 oct '17  
 D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |
