

Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16											
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S		
1			<b>Circuito ZFSA114</b>	<b>292 días</b>	<b>vie 9/9/16</b>	<b>lun 23/10/17</b>																				
2			<b>Adquisiciones</b>	<b>89 días</b>	<b>vie 9/9/16</b>	<b>mié 11/1/17</b>																				
3			Postes	56 días	vie 9/9/16	vie 25/11/16																				
4			Herrajes y Conectores	66 días	vie 9/9/16	vie 9/12/16																				
5			Conductores MT/BT/	71 días	vie 9/9/16	vie 16/12/16																				
6			Transformadores y Ec	76 días	vie 9/9/16	vie 23/12/16																				
7			Equipos de Medición	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17																				
8			Evaluación	0 días	mié 11/1/17	mié 11/1/17	7																			
9			<b>Etapas 1</b>	<b>51.21 días</b>	<b>mié 11/1/17</b>	<b>jue 23/3/17</b>																				
10			Izaje de Postes	8.94 días	mié 11/1/17	lun 23/1/17																				
11			Armado de Estructura	5.37 días	lun 23/1/17	mar 31/1/17	10																			
12			Tendido de Conducto	7.45 días	mar 31/1/17	jue 9/2/17	11																			
13			Montaje de Transfor	5.37 días	jue 9/2/17	vie 17/2/17	12																			
14			Instalación de Lumina	5.37 días	vie 17/2/17	vie 24/2/17	13																			
15			Correcciones	1.34 días	vie 24/2/17	lun 27/2/17	14																			
16			Remociones	2.68 días	lun 27/2/17	jue 2/3/17	15																			
17			Normalización de Sun	14.69 días	jue 2/3/17	jue 23/3/17	16																			
18			Evaluación	0 días	jue 23/3/17	jue 23/3/17	17																			
19			<b>Etapas 2 y 3</b>	<b>51.21 días</b>	<b>jue 23/2/17</b>	<b>vie 5/5/17</b>																				
20			Izaje de Postes	8.94 días	jue 23/2/17	mar 7/3/17																				
21			Armado de Estructur	5.37 días	mar 7/3/17	mié 15/3/17	20																			

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16						
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
22			Tendido de Conducto	7.45 días	mié 15/3/17	vie 24/3/17	21														
23			Montaje de Transfor	5.37 días	vie 24/3/17	lun 3/4/17	22														
24			Instalación de Lumin	5.37 días	lun 3/4/17	lun 10/4/17	23														
25			Correcciones	1.34 días	lun 10/4/17	mar 11/4/17	24														
26			Remociones	2.68 días	mar 11/4/17	vie 14/4/17	25														
27			Normalización de Sur	14.69 días	vie 14/4/17	vie 5/5/17	26														
28			Evaluación	0 días	vie 5/5/17	vie 5/5/17	27														
29			<b>Etapas 4 y 5</b>	<b>51.21 días</b>	<b>mar 25/4/17</b>	<b>mié 5/7/17</b>															
30			Izaje de Postes	8.94 días	mar 25/4/17	vie 5/5/17															
31			Armado de Estructur	5.37 días	vie 5/5/17	lun 15/5/17	30														
32			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 15/5/17	mié 24/5/17	31														
33			Montaje de Transfor	5.37 días	mié 24/5/17	jue 1/6/17	32														
34			Instalación de Lumin	5.37 días	jue 1/6/17	jue 8/6/17	33														
35			Correcciones	1.34 días	jue 8/6/17	vie 9/6/17	34														
36			Remociones	2.68 días	vie 9/6/17	mié 14/6/17	35														
37			Normalización de Sur	14.69 días	mié 14/6/17	mié 5/7/17	36														
38			Evaluación	0 días	mié 5/7/17	mié 5/7/17	37														
39			<b>Etapas 6 y 7</b>	<b>51.21 días</b>	<b>vie 9/6/17</b>	<b>lun 21/8/17</b>															
40			Izaje de Postes	8.94 días	vie 9/6/17	mié 21/6/17															
41			Armado de Estructur	5.37 días	mié 21/6/17	jue 29/6/17	40														
42			Tendido de Conducto	7.45 días	jue 29/6/17	lun 10/7/17	41														

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha limite	


Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16										
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
43		Montaje de Transfor	5.37 días	lun 10/7/17	mar 18/7/17	42																		
44		Instalación de Lumin	5.37 días	mar 18/7/17	mar 25/7/17	43																		
45		Correcciones	1.34 días	mar 25/7/17	mié 26/7/17	44																		
46		Remociones	2.68 días	mié 26/7/17	lun 31/7/17	45																		
47		Normalización de Sur	14.69 días	lun 31/7/17	lun 21/8/17	46																		
48		Evaluación	0 días	lun 21/8/17	lun 21/8/17	47																		
49		<b>Cierres Técnico y Adm</b>	<b>46 días</b>	<b>lun 21/8/17</b>	<b>lun 23/10/17</b>																			
50		Cierre Técnico	24 días	lun 21/8/17	jue 21/9/17																			
51		Cierre Administrativo	22 días	vie 22/9/17	lun 23/10/17	50																		
52		Evaluación	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	51																		

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecución ZFSA114 Mar 2018

25 sep '16							2 oct '16							9 oct '16							16 oct '16							23 oct '16							30 oct '16							6 nov '16														
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

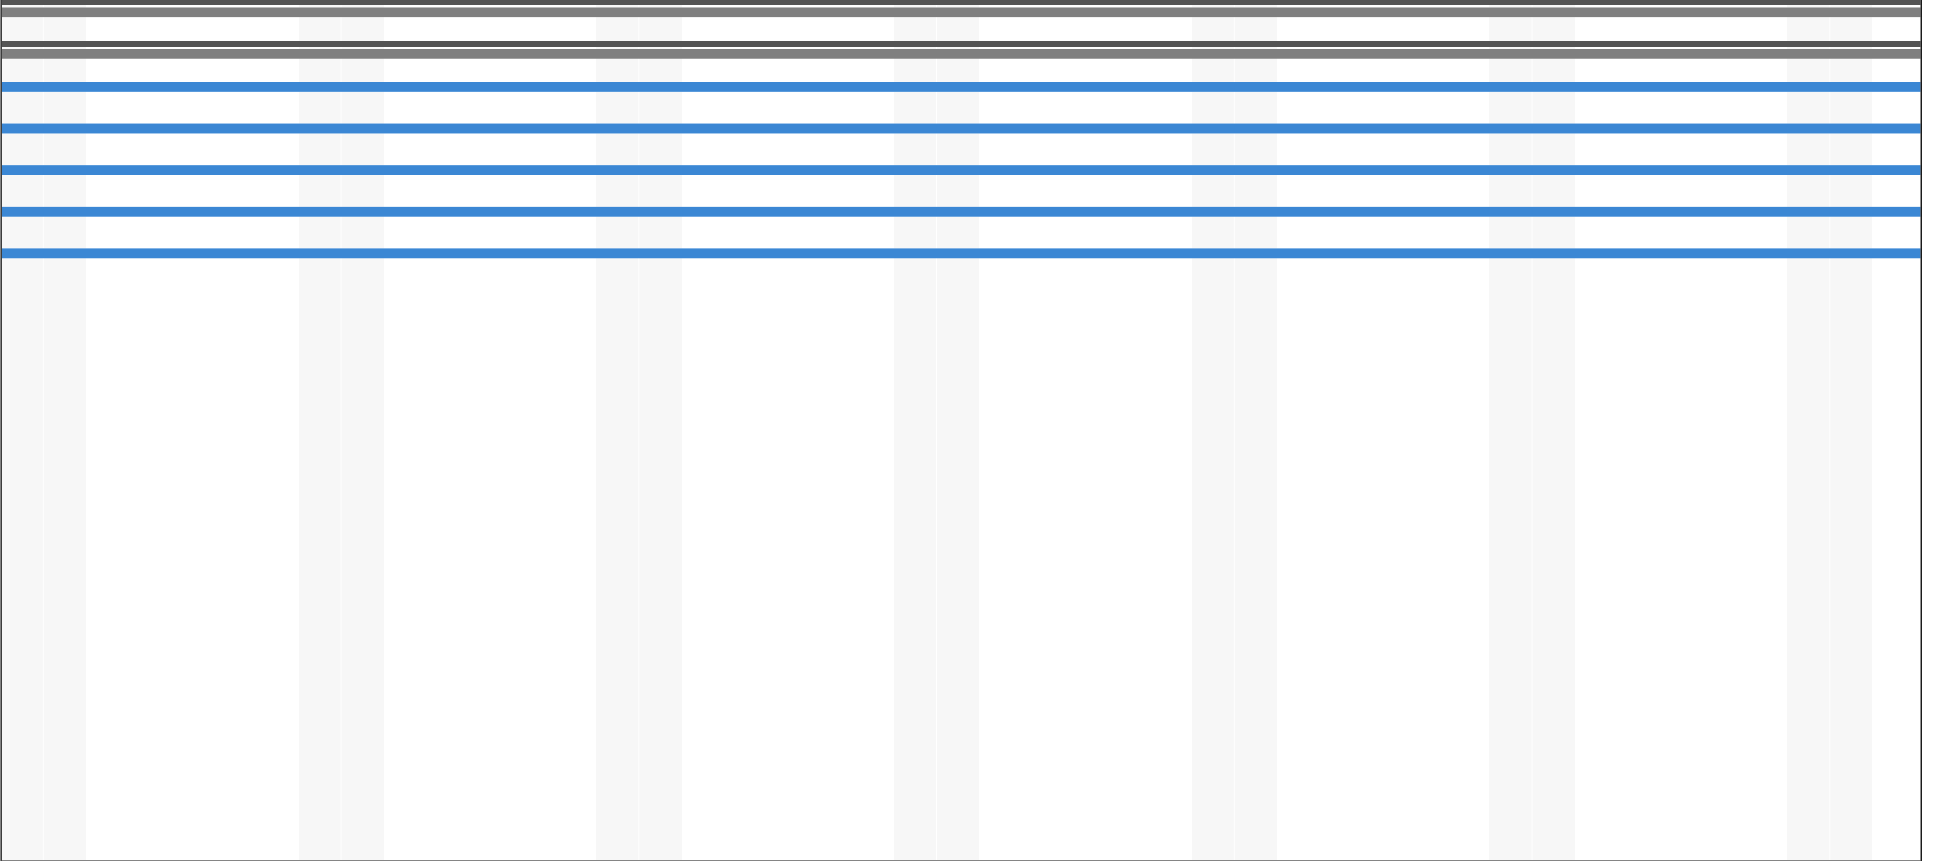


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

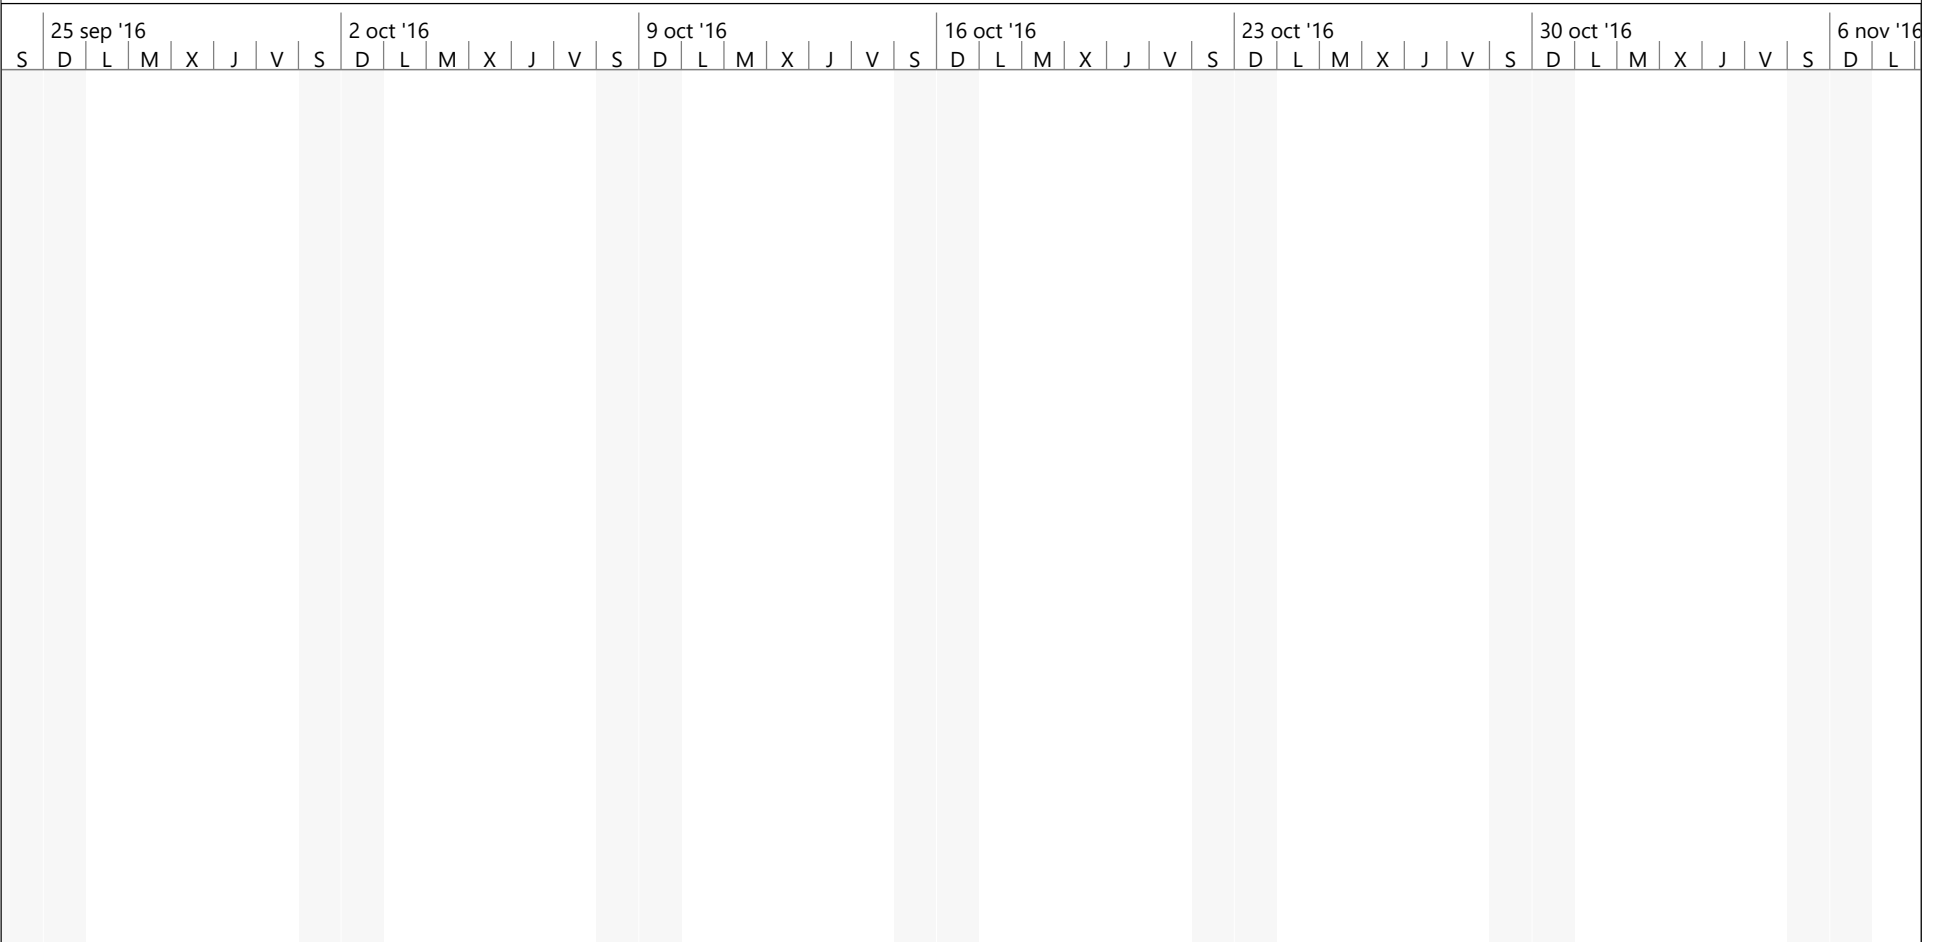

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecución ZFSA114 Mar 2018

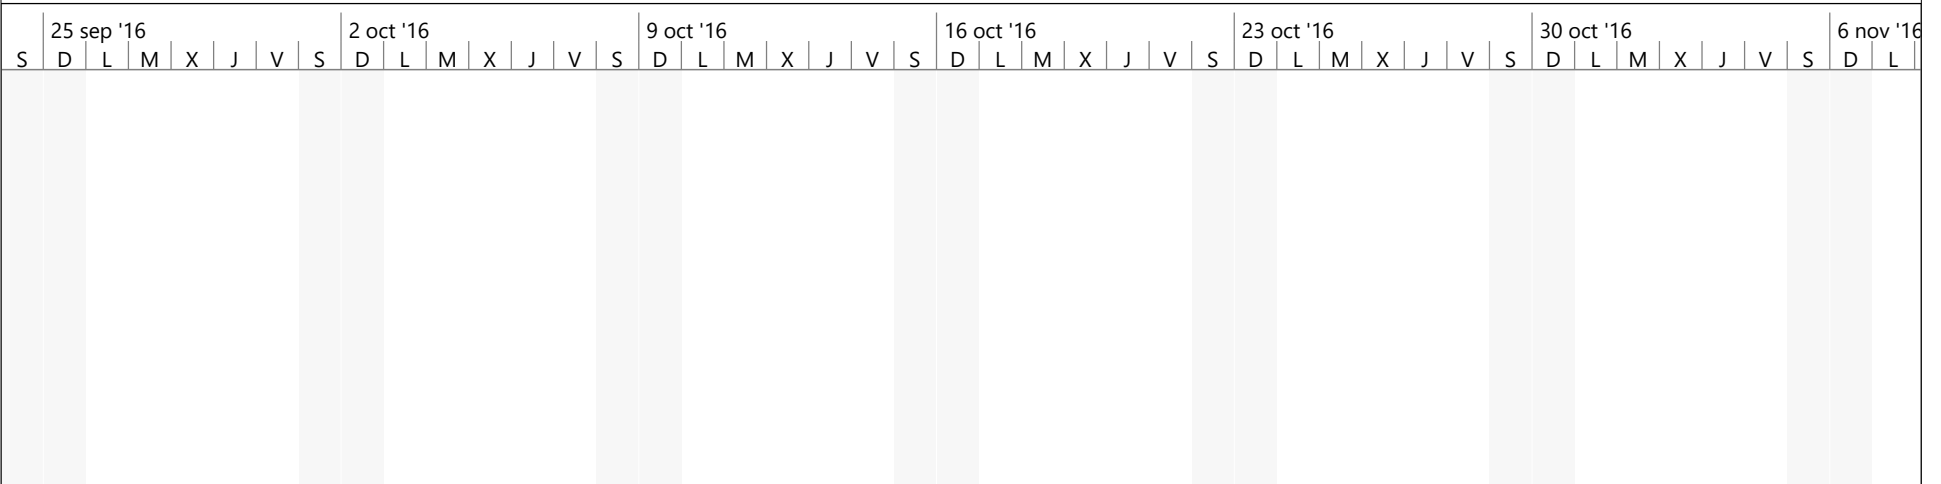

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

5 M X J V S 13 nov '16 20 nov '16 27 nov '16 4 dic '16 11 dic '16 18 dic '16  
 M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

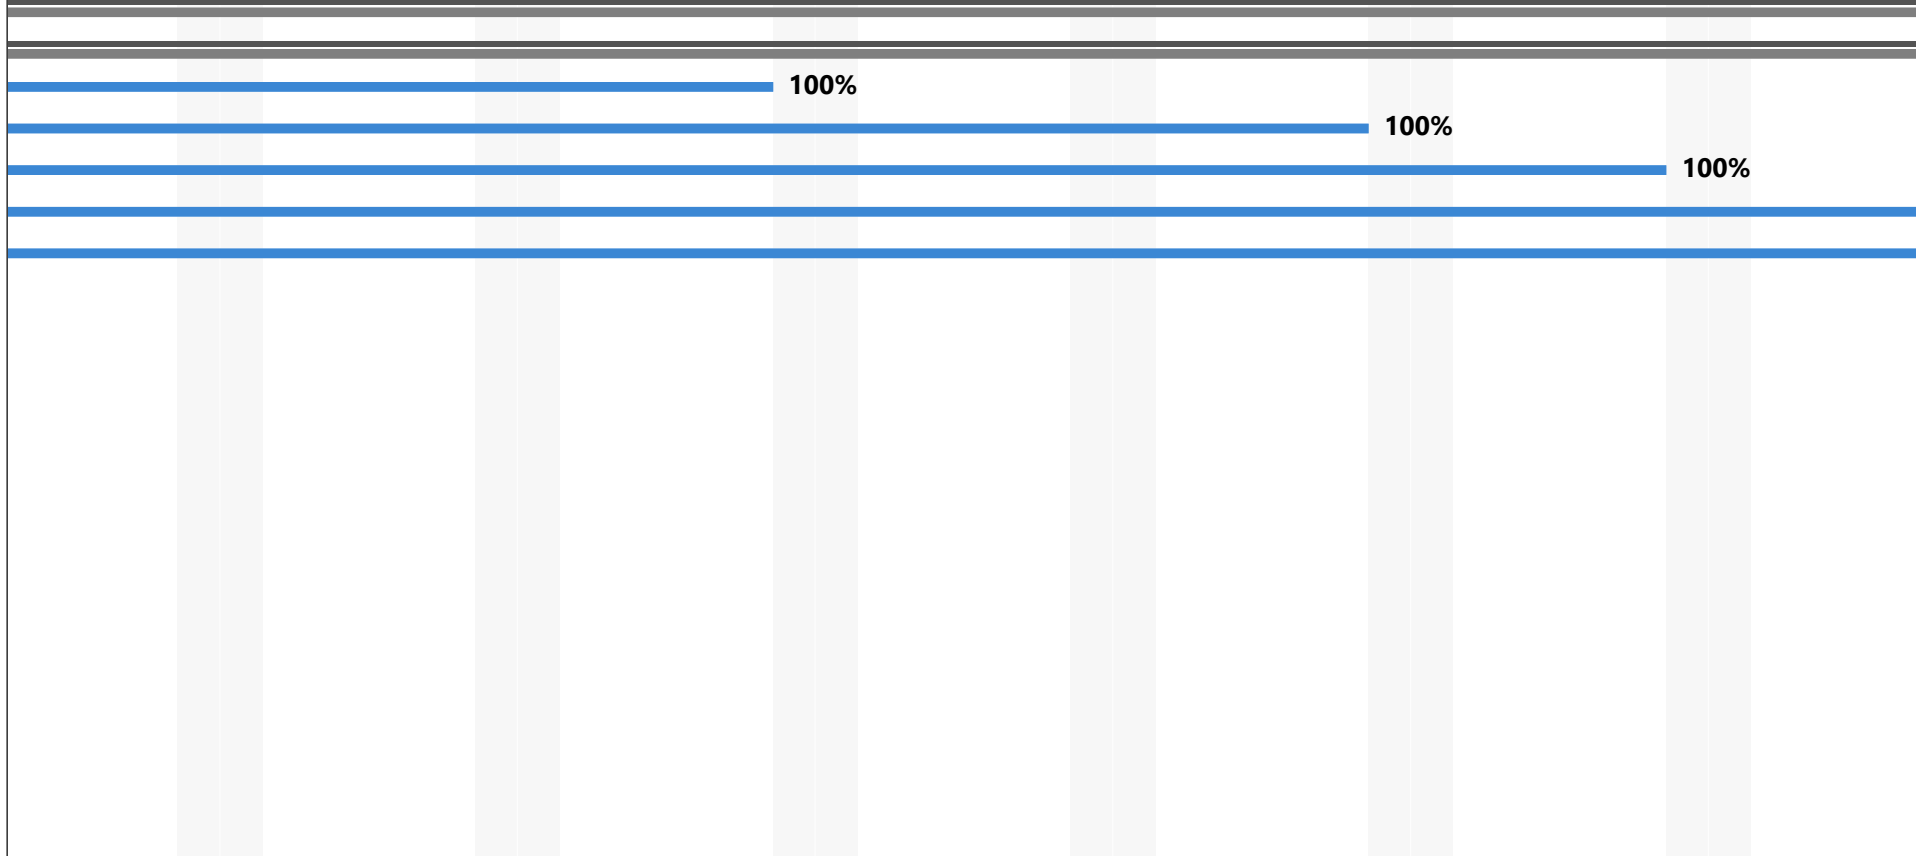

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

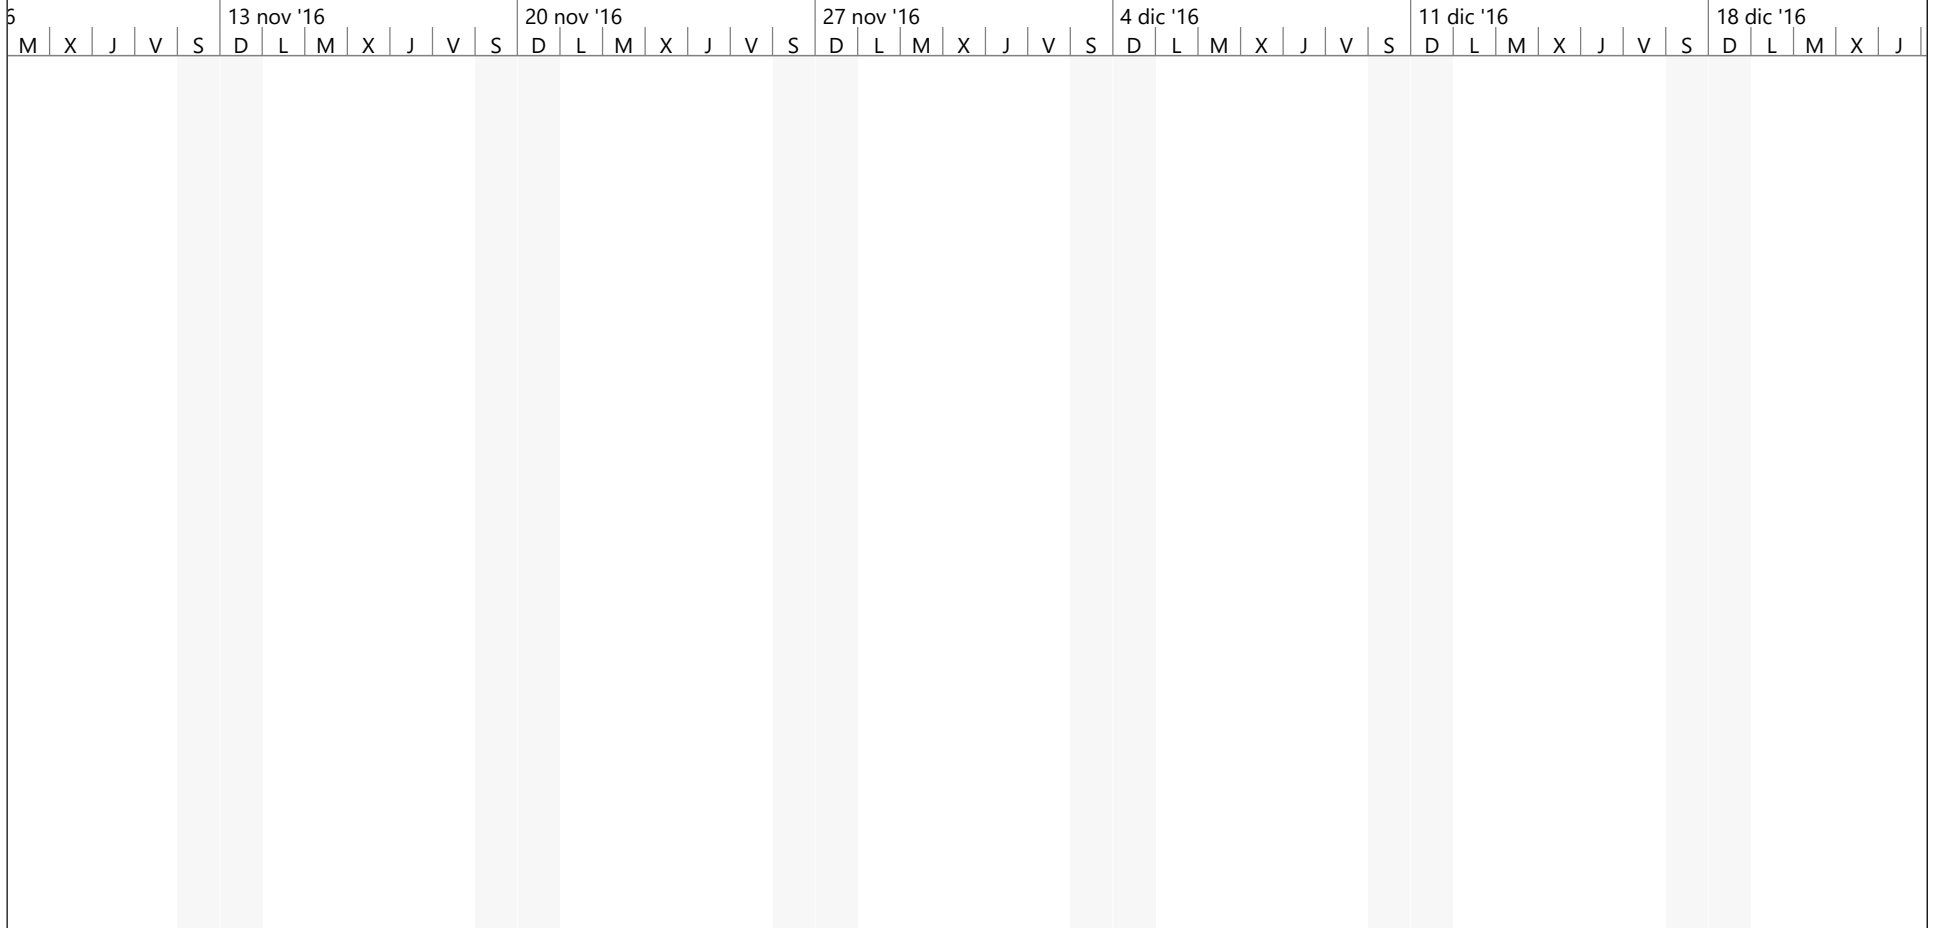

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

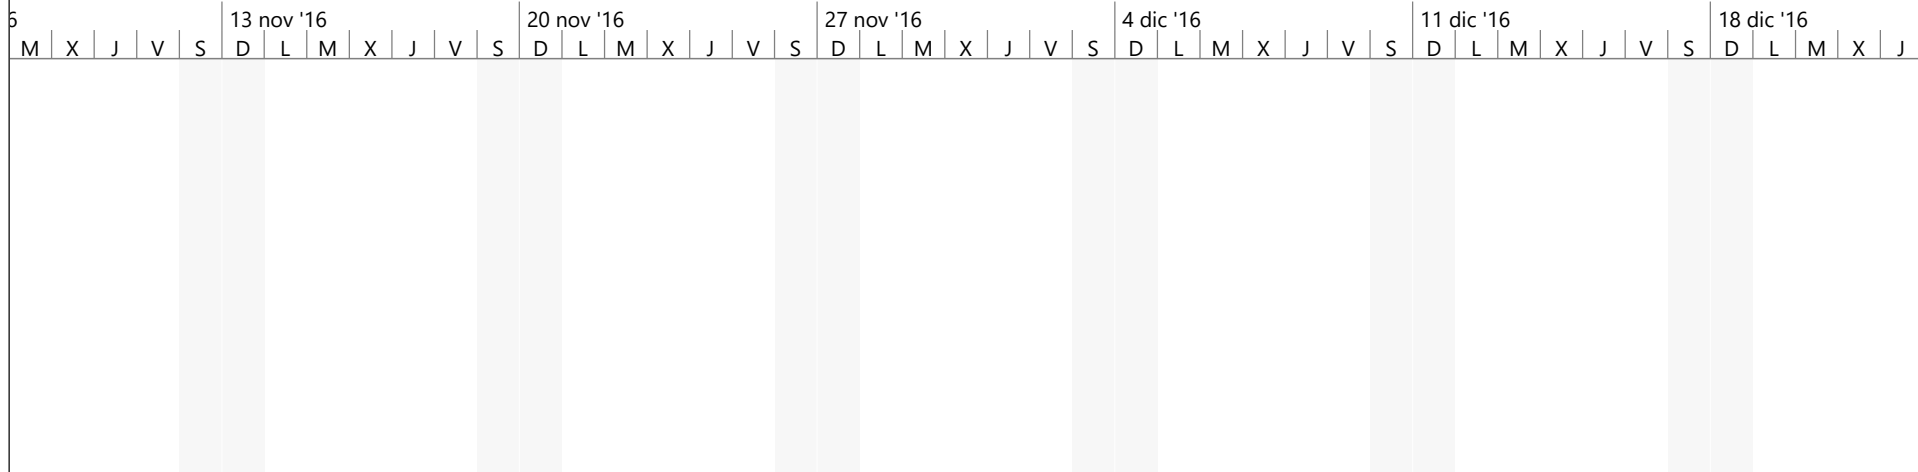

<p>Tareas críticas</p> <p>División crítica</p> <p>Progreso de tarea crítica</p> <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Progreso de tarea</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo el comienzo</p>	<p>solo fin</p> <p>solo duración</p> <p>Línea base</p> <p>División de la línea base</p> <p>Hito de línea base</p> <p>Hito</p> <p>Progreso del resumen</p> <p>Resumen</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Resumen manual</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> <p>Resumen inactivo</p> <p>Fecha límite</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
---	--	---	---	---	---


Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

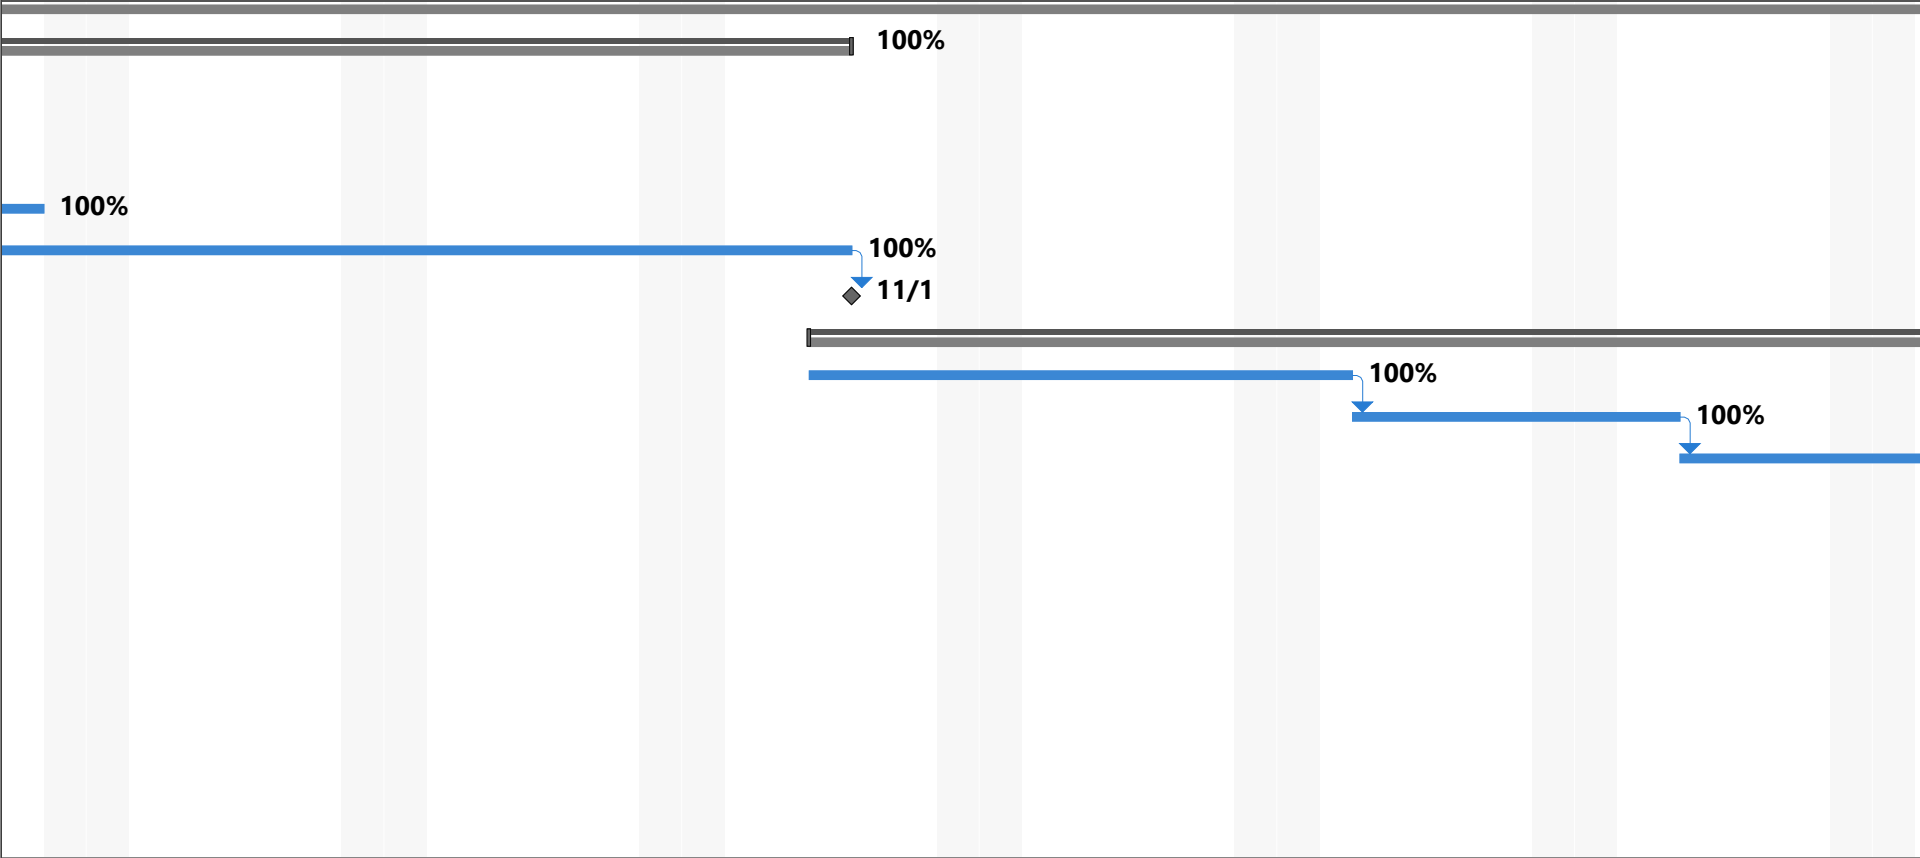


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

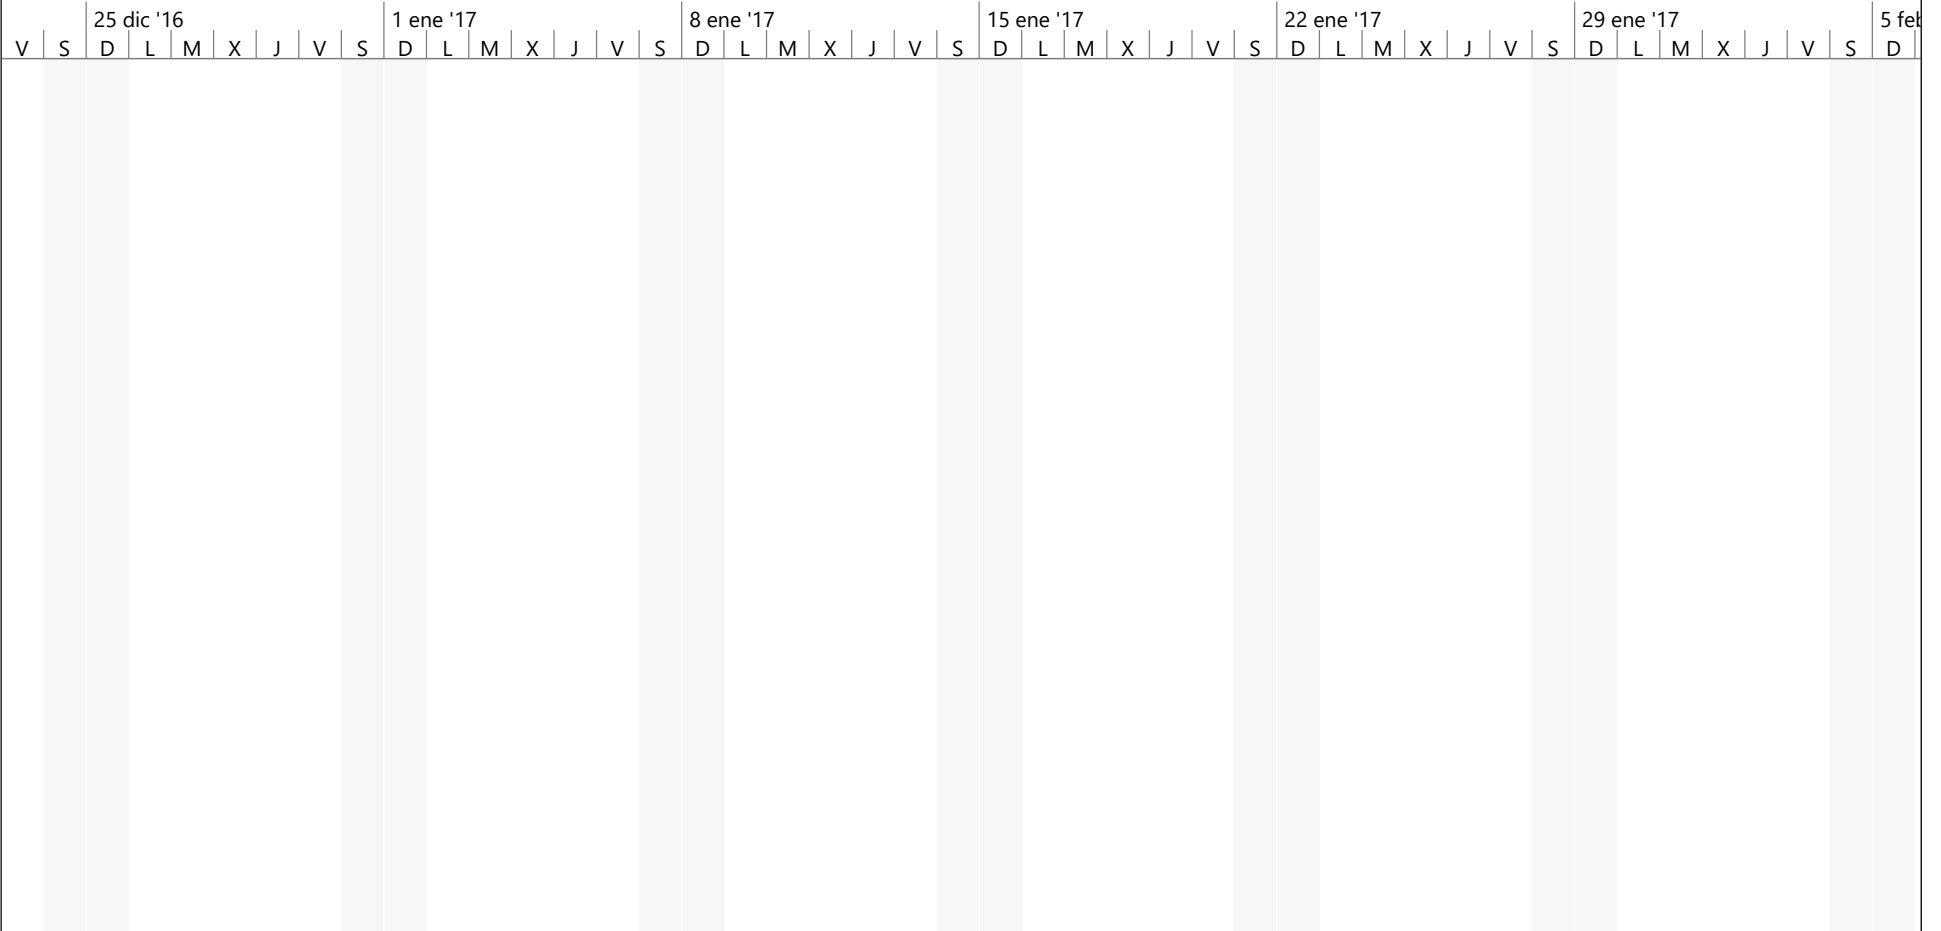

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

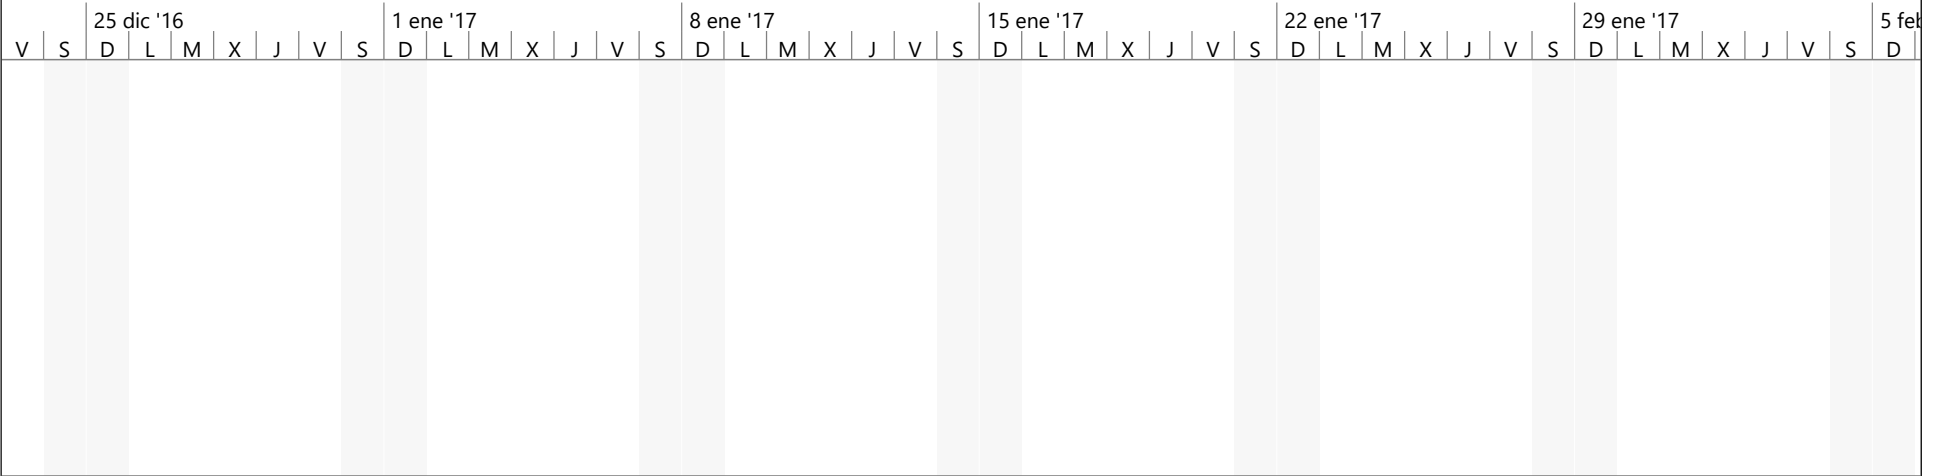


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018


b '17
12 feb '17
19 feb '17
26 feb '17
5 mar '17
12 mar '17
19 mar '17

L M X J V S |
 D L M X J V S |
 D L M X J V S |
 D L M X J V S |
 D L M X J V S |
 D L M X J V S |
 D L M X

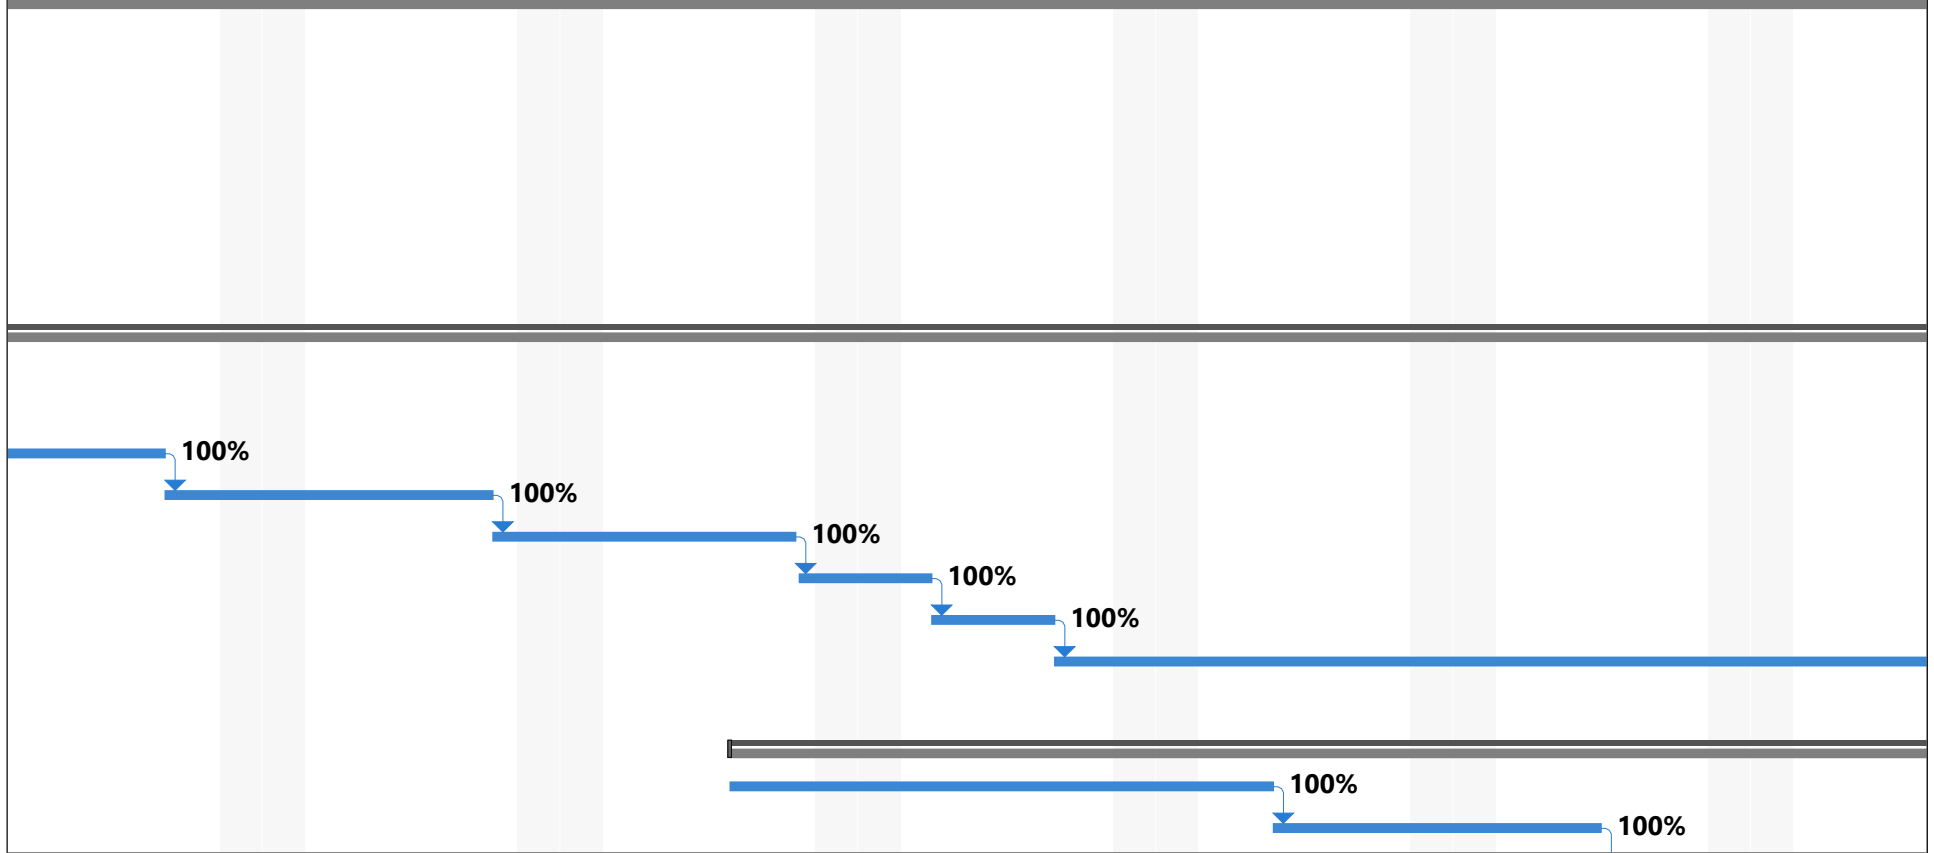

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución ZFSA114 Mar 2018

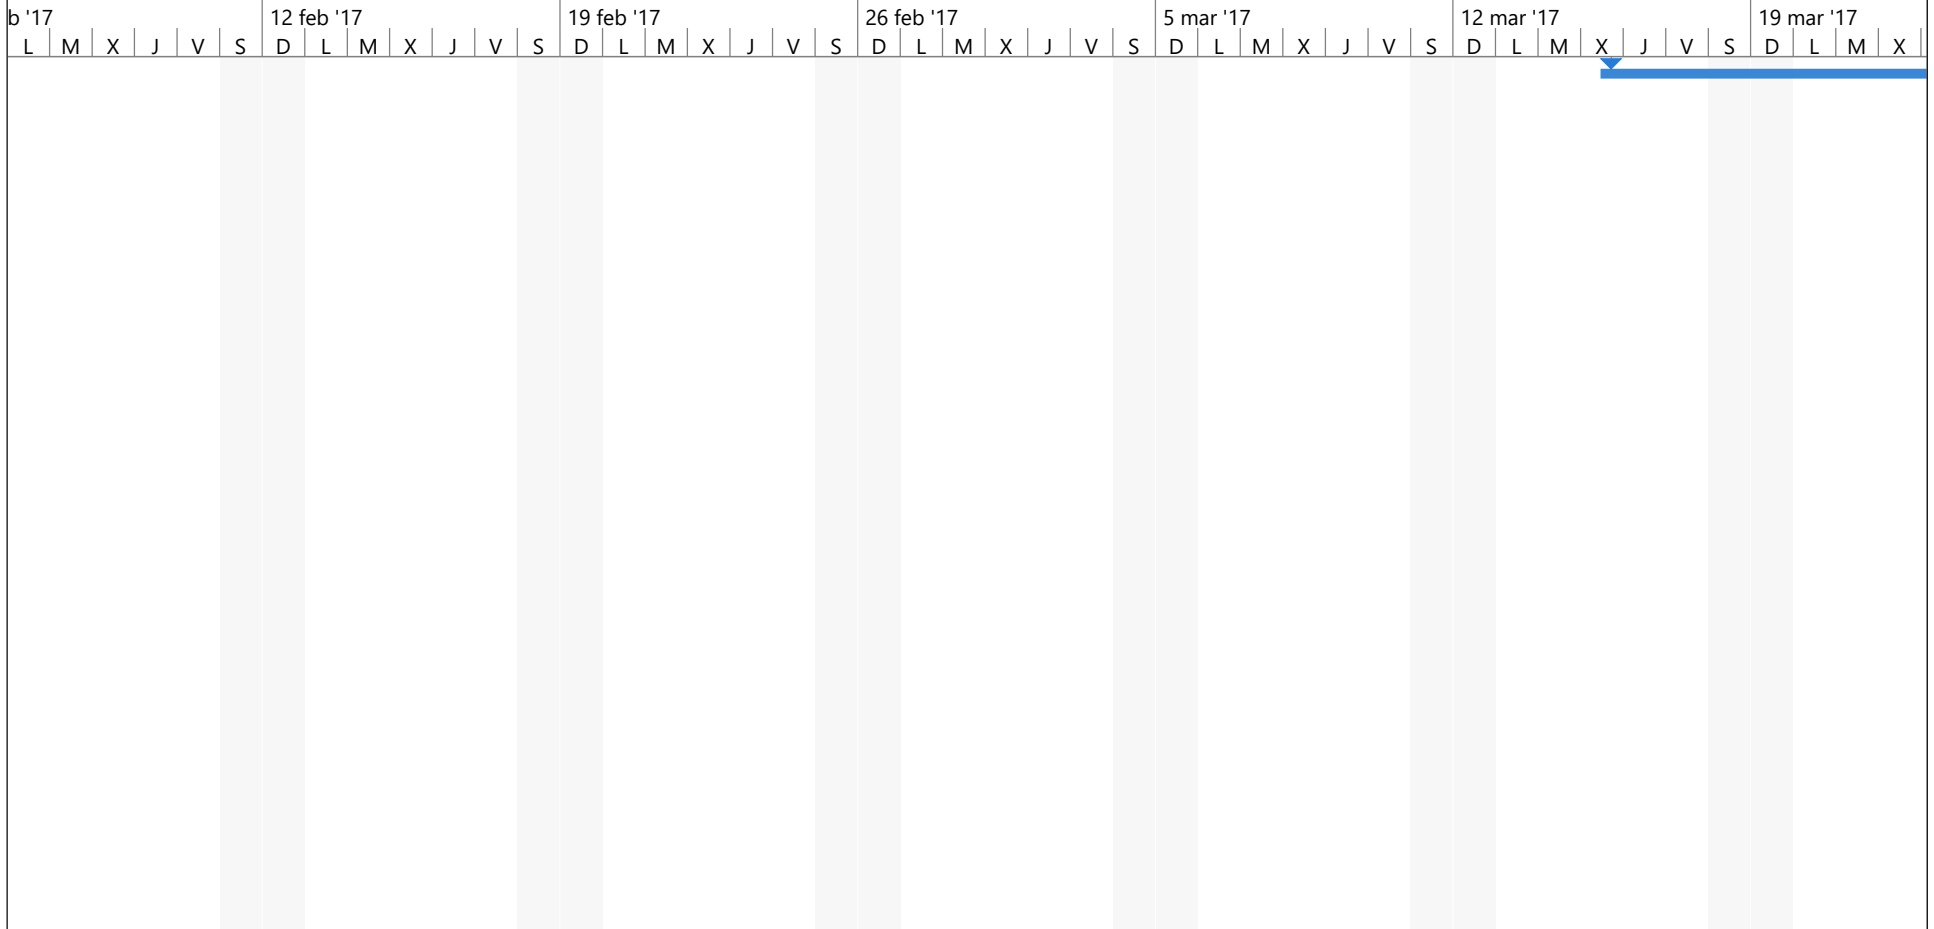

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

b '17
12 feb '17
19 feb '17
26 feb '17
5 mar '17
12 mar '17
19 mar '17

LMXJVS
DLMXJVS
DLMXJVS
DLMXJVS
DLMXJVS
DLMXJVS
DLMXJVS
DLMXJVS

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

# Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

26 mar '17
2 abr '17
9 abr '17
16 abr '17
23 abr '17
30 abr '17


J | V | S
D | L | M | X | J | V | S
D | L | M | X | J | V | S
D | L | M | X | J | V | S
D | L | M | X | J | V | S
D | L | M | X | J | V | S
D | L | M | X | J | V | S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




### Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

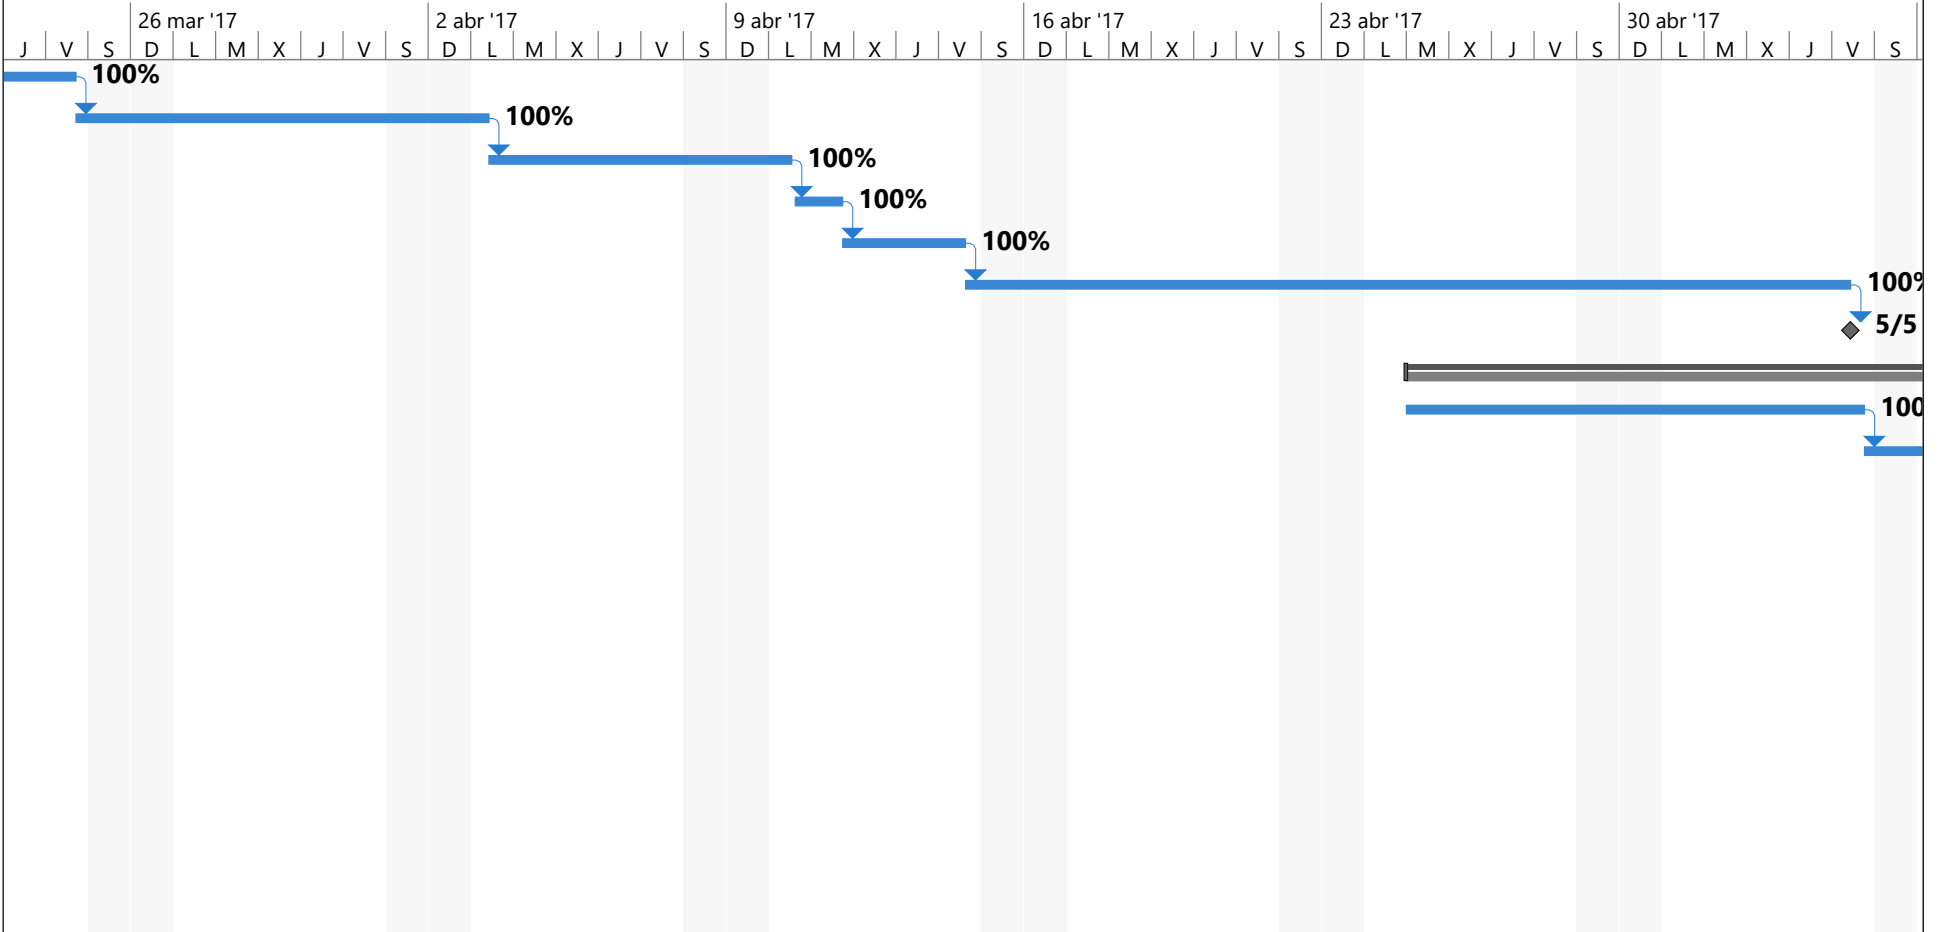

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

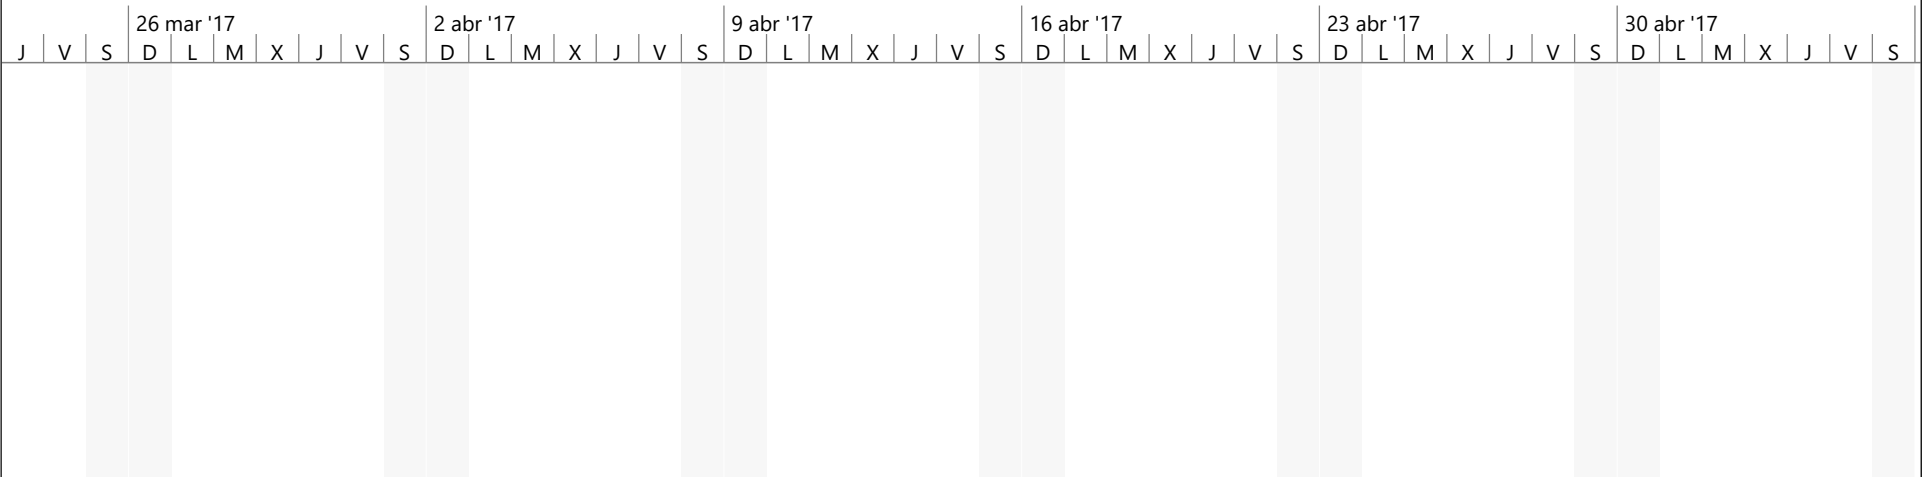

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

7 may '17							14 may '17							21 may '17							28 may '17							4 jun '17							11 jun '17							18 jun '17									
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M

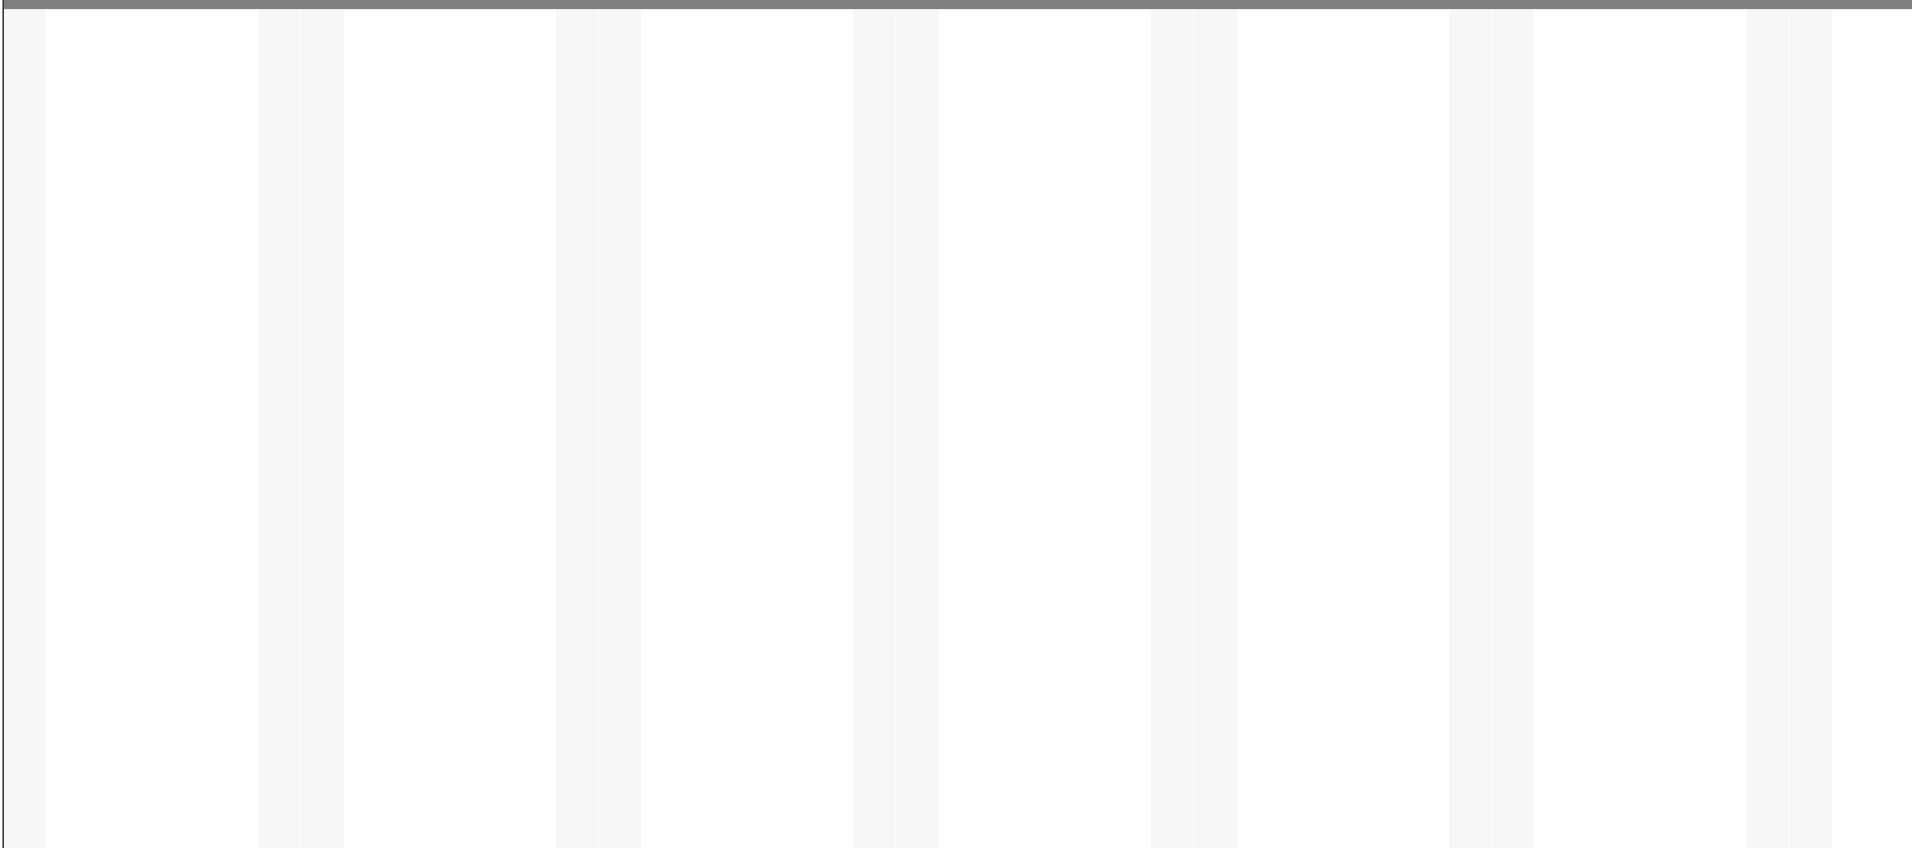

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

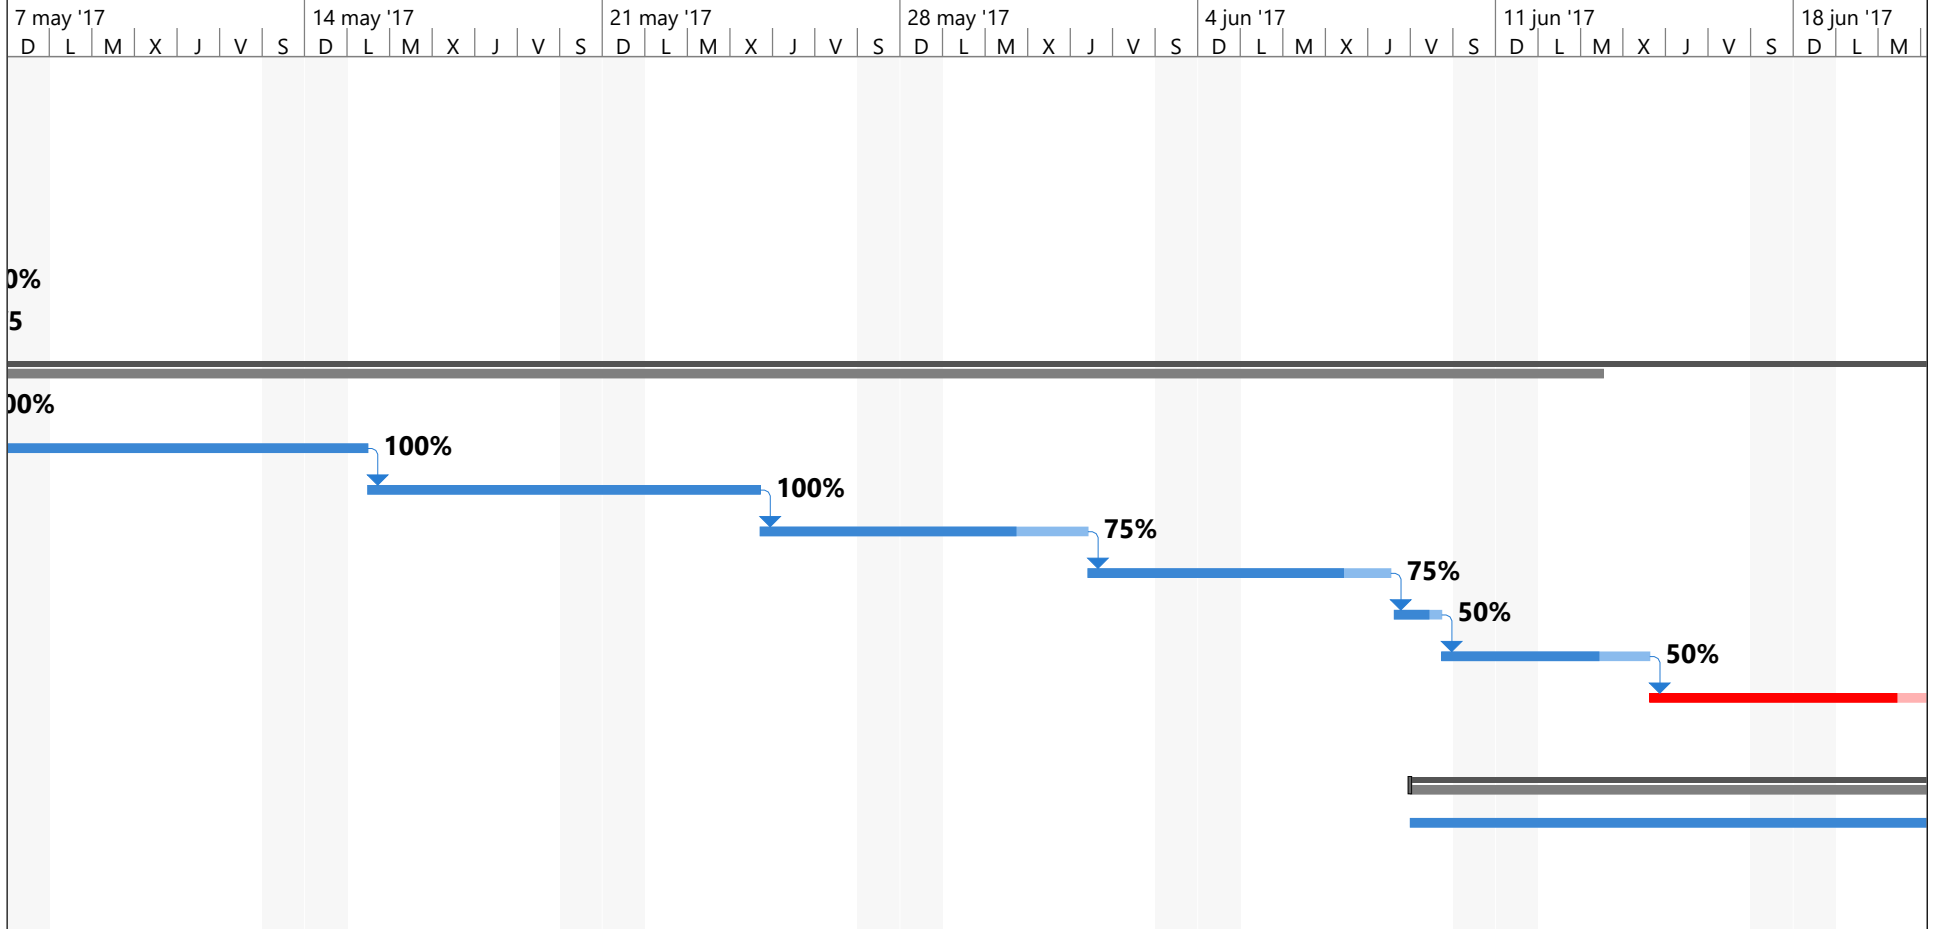

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

X	J	V	S	25 jun '17				D	L	M	X	J	V	S	2 jul '17				D	L	M	X	J	V	S	9 jul '17				D	L	M	X	J	V	S	16 jul '17				D	L	M	X	J	V	S	23 jul '17				D	L	M	X	J	V	S	30 jul '17				D	L	M	X	J	V	S
---	---	---	---	------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

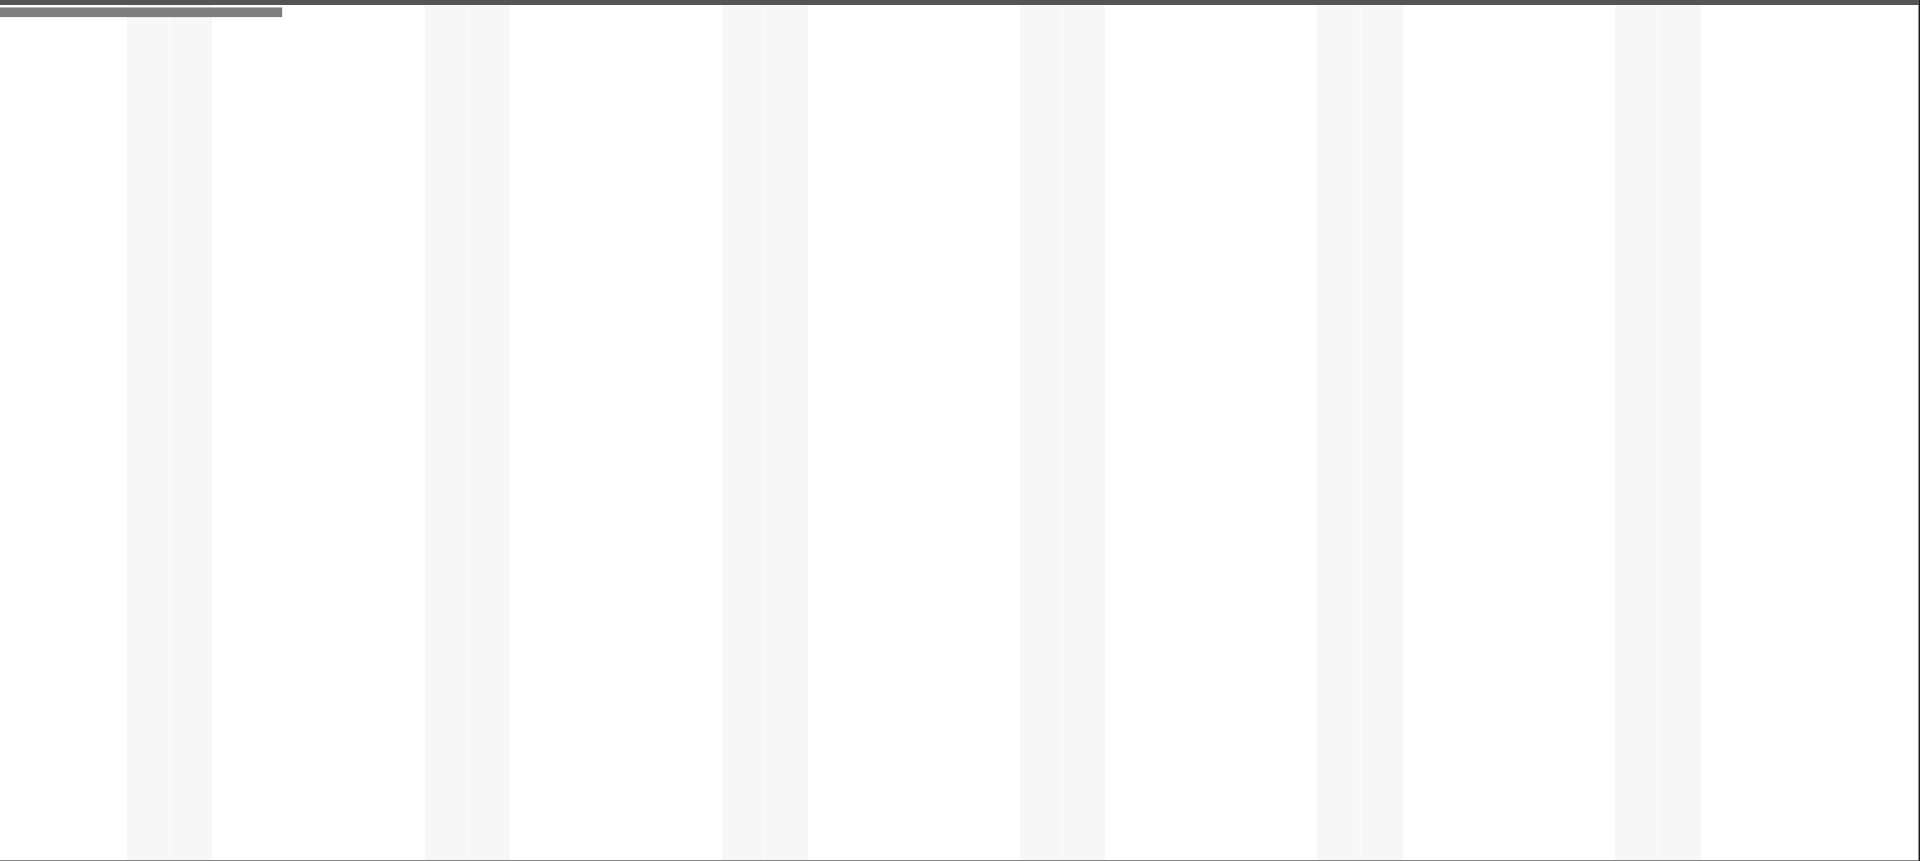


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

### Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

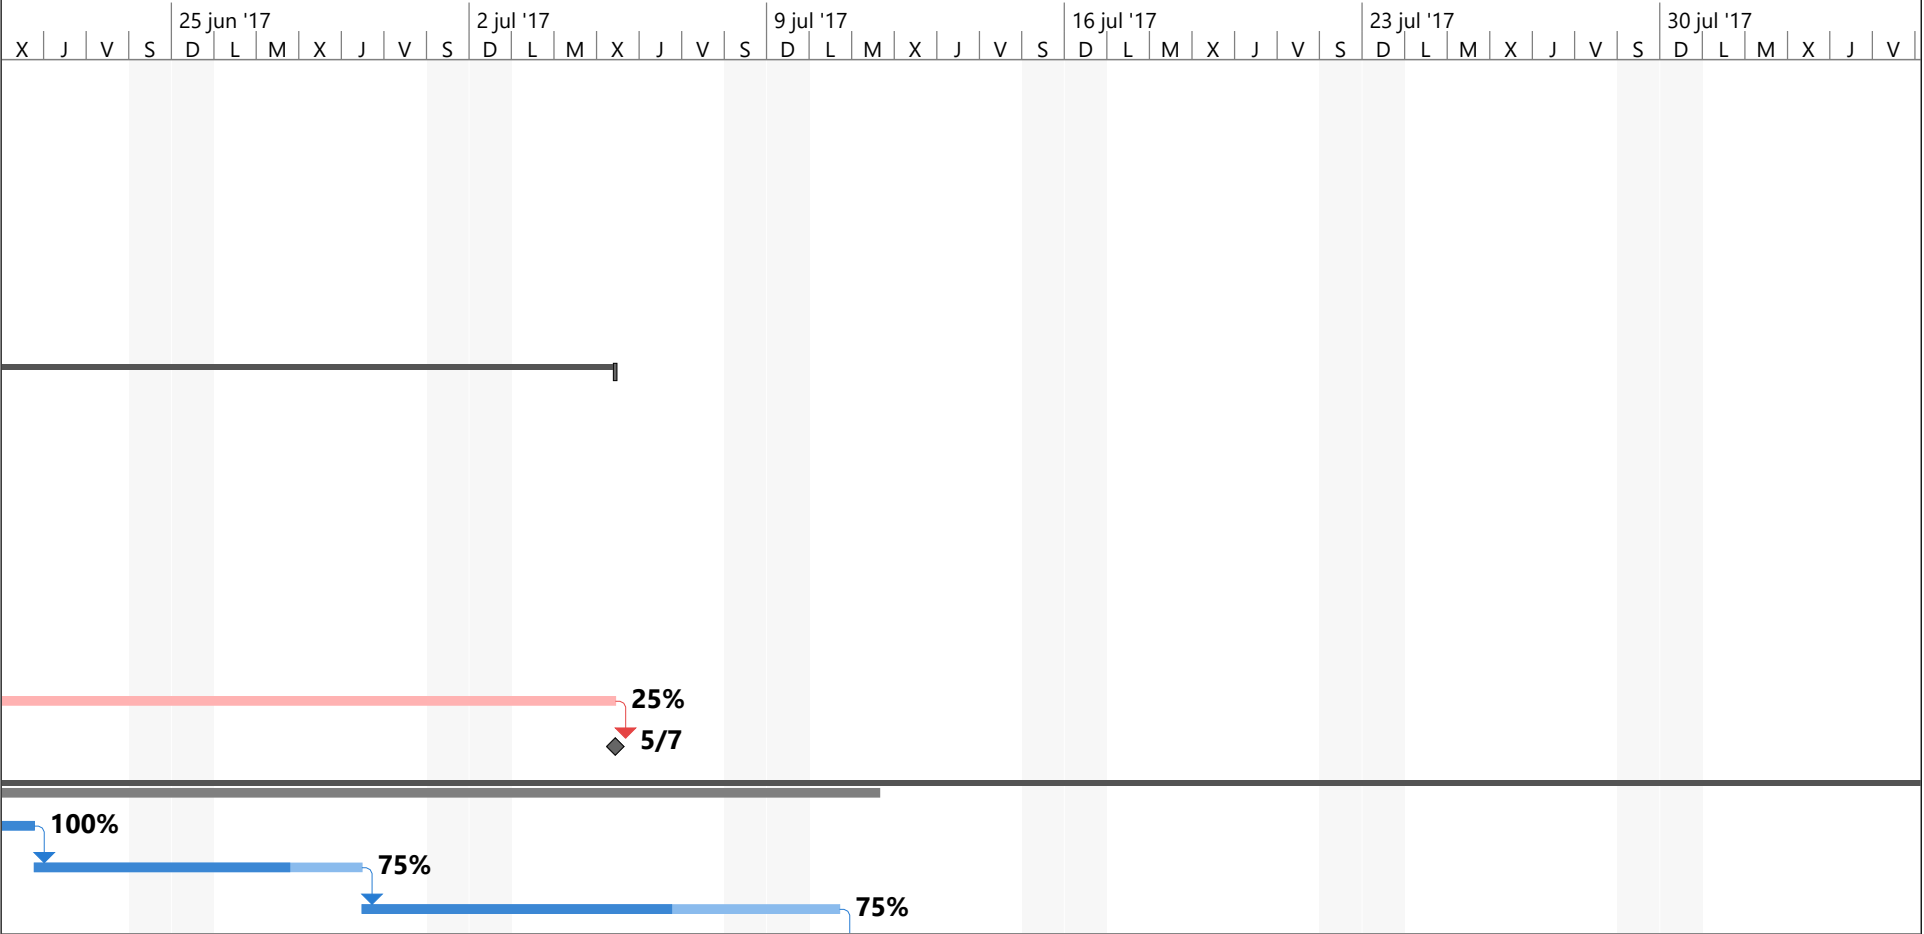

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha limite	

### Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

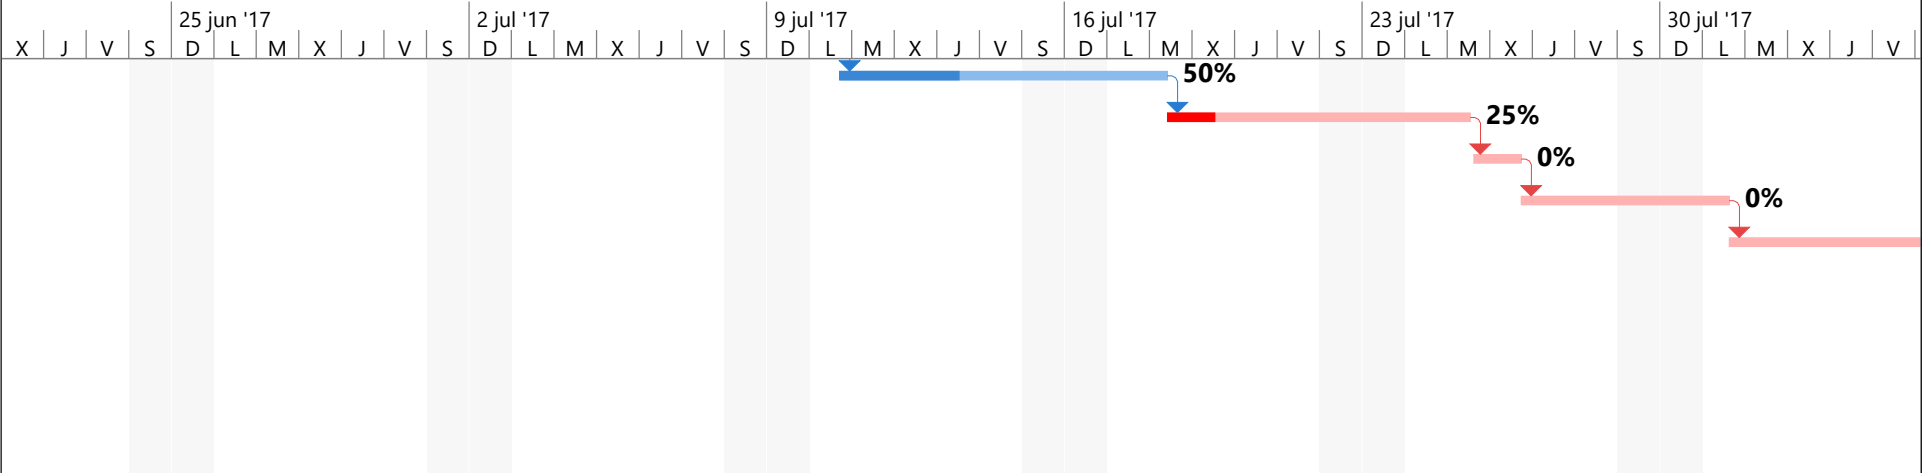


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	




## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

6 ago '17							13 ago '17							20 ago '17							27 ago '17							3 sep '17							10 sep '17							17 sep '17														
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

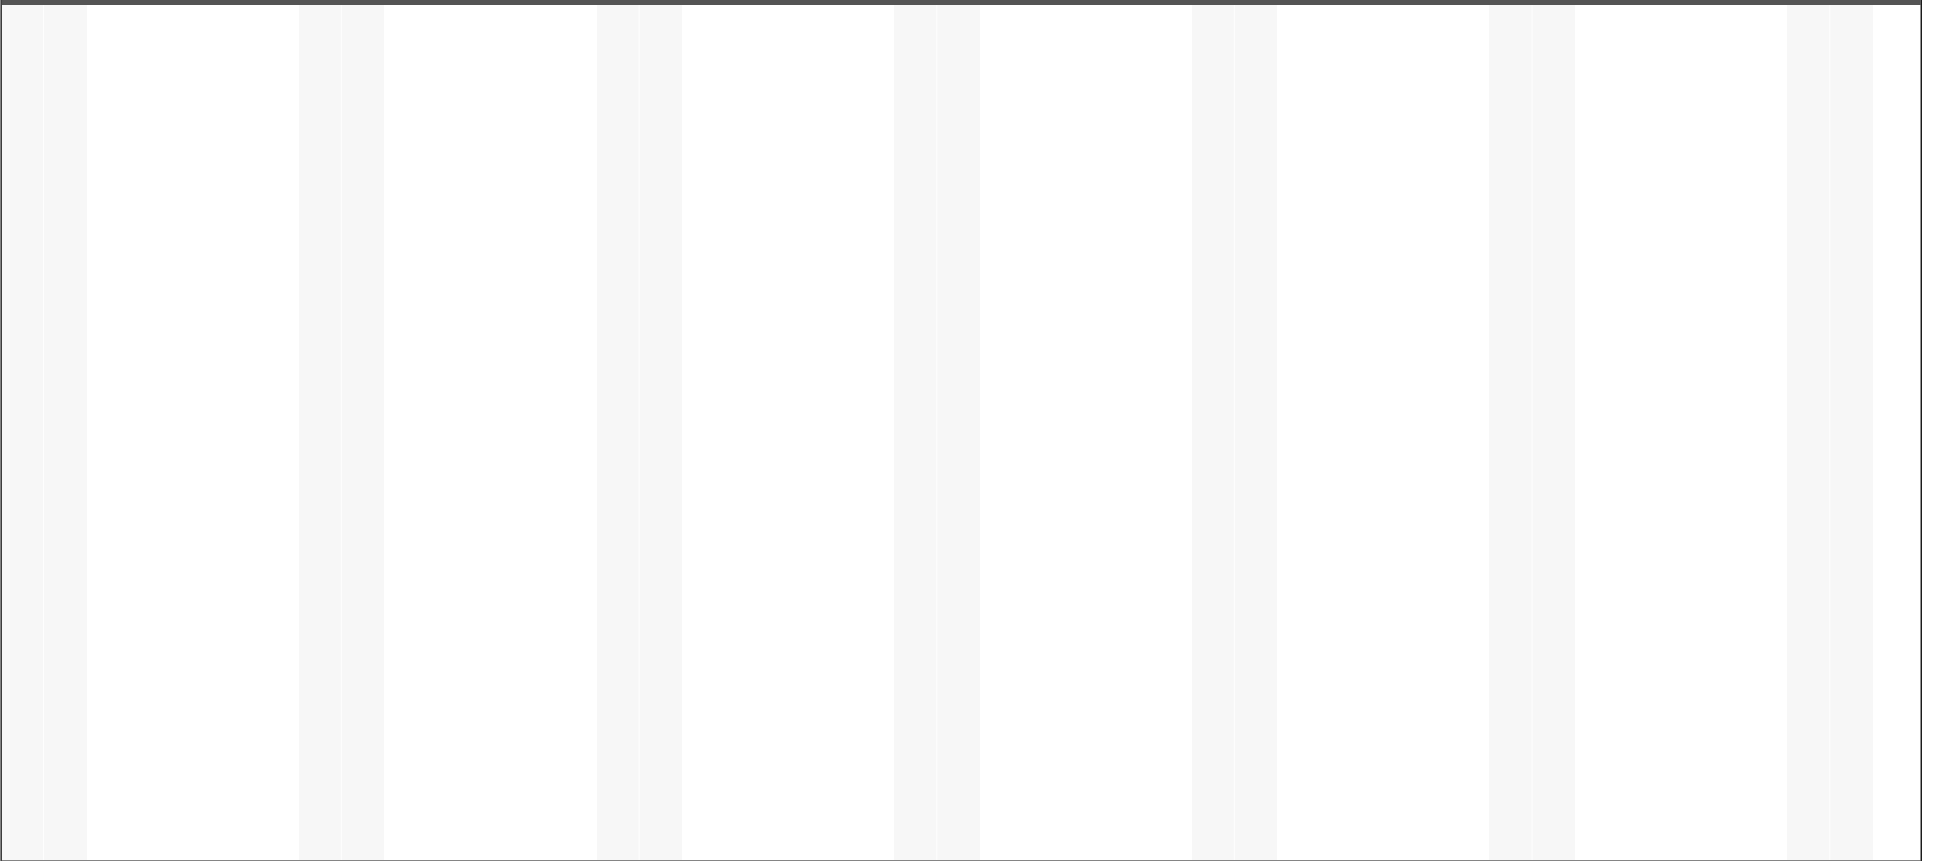


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución ZFSA114 Mar 2018

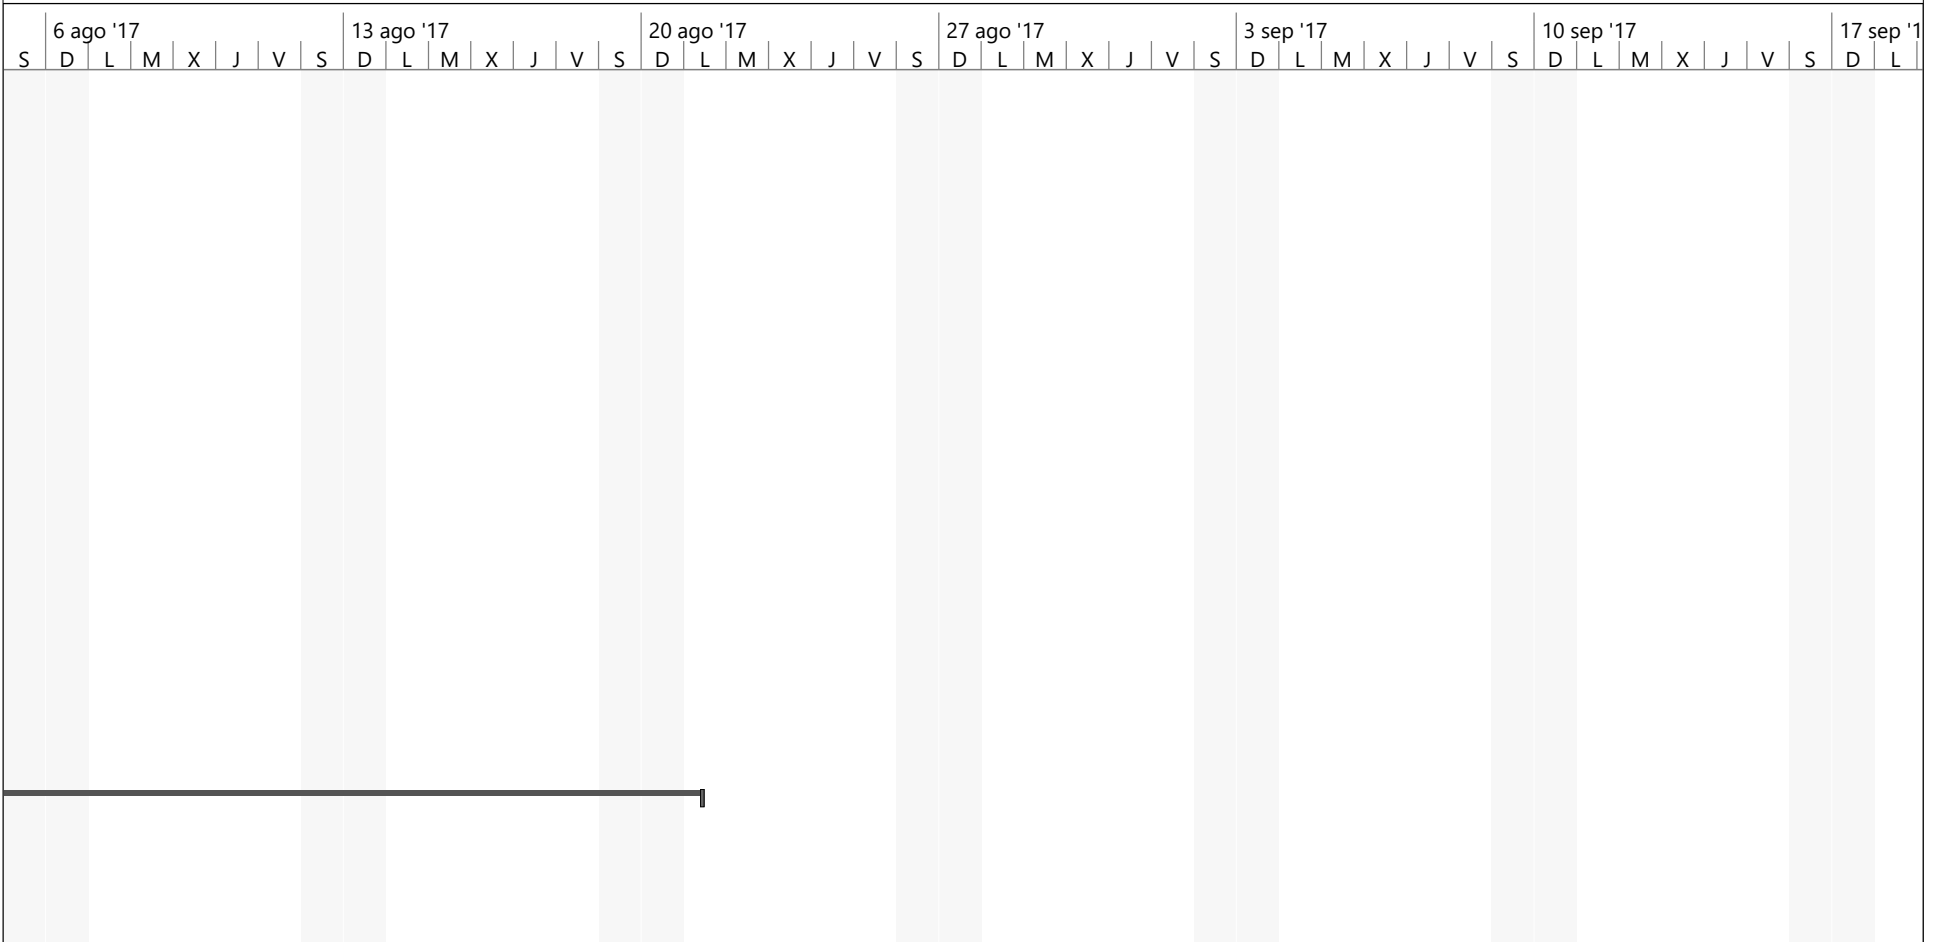


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecución ZFSA114 Mar 2018

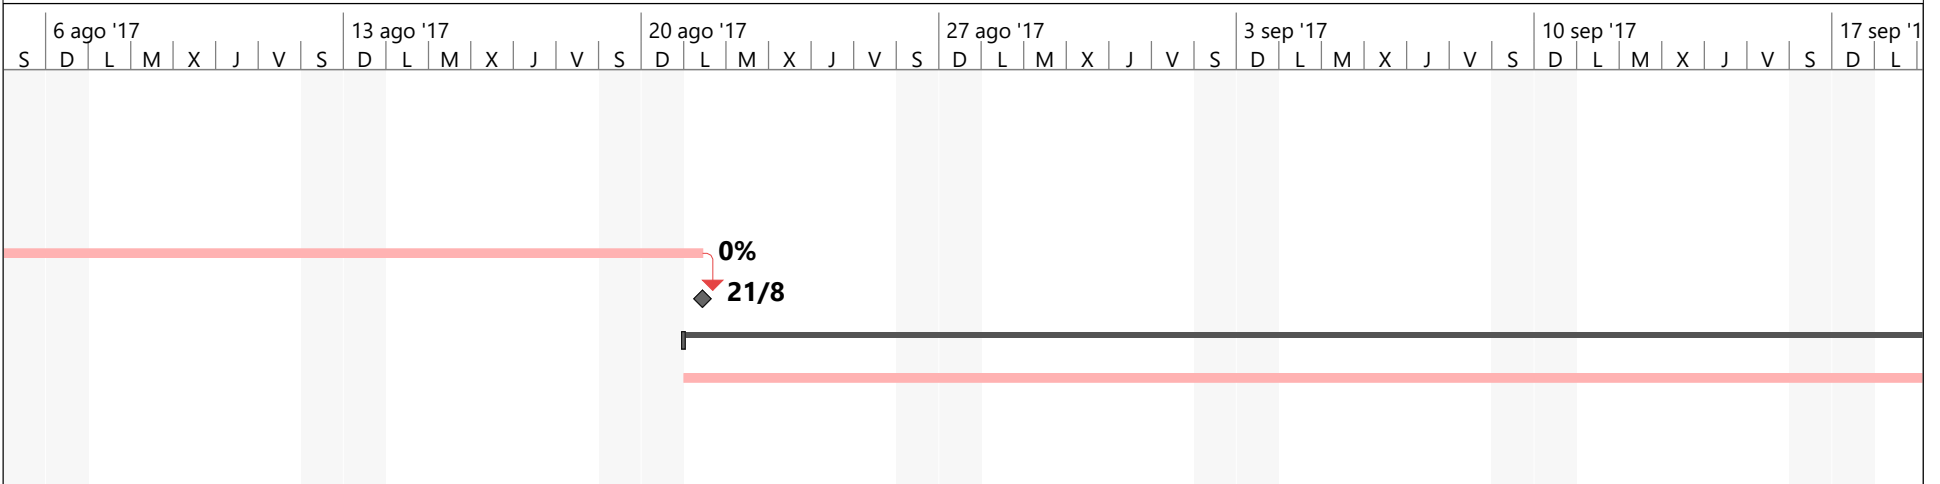


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

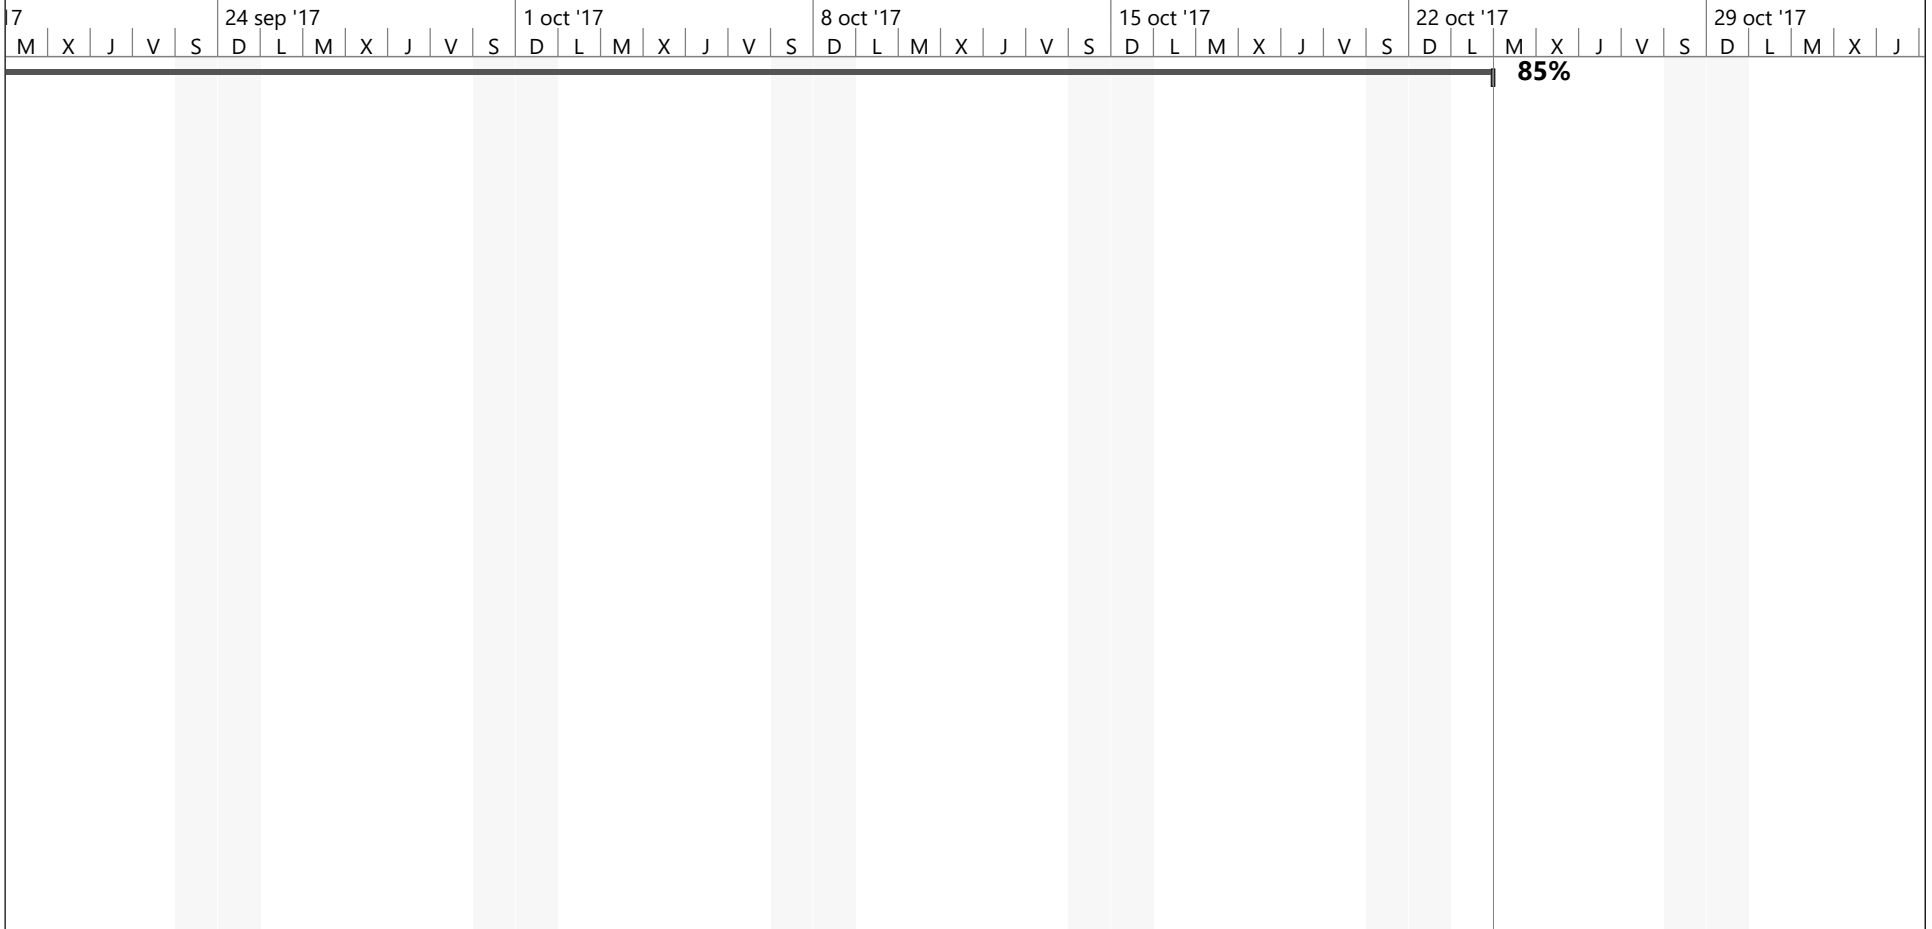


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

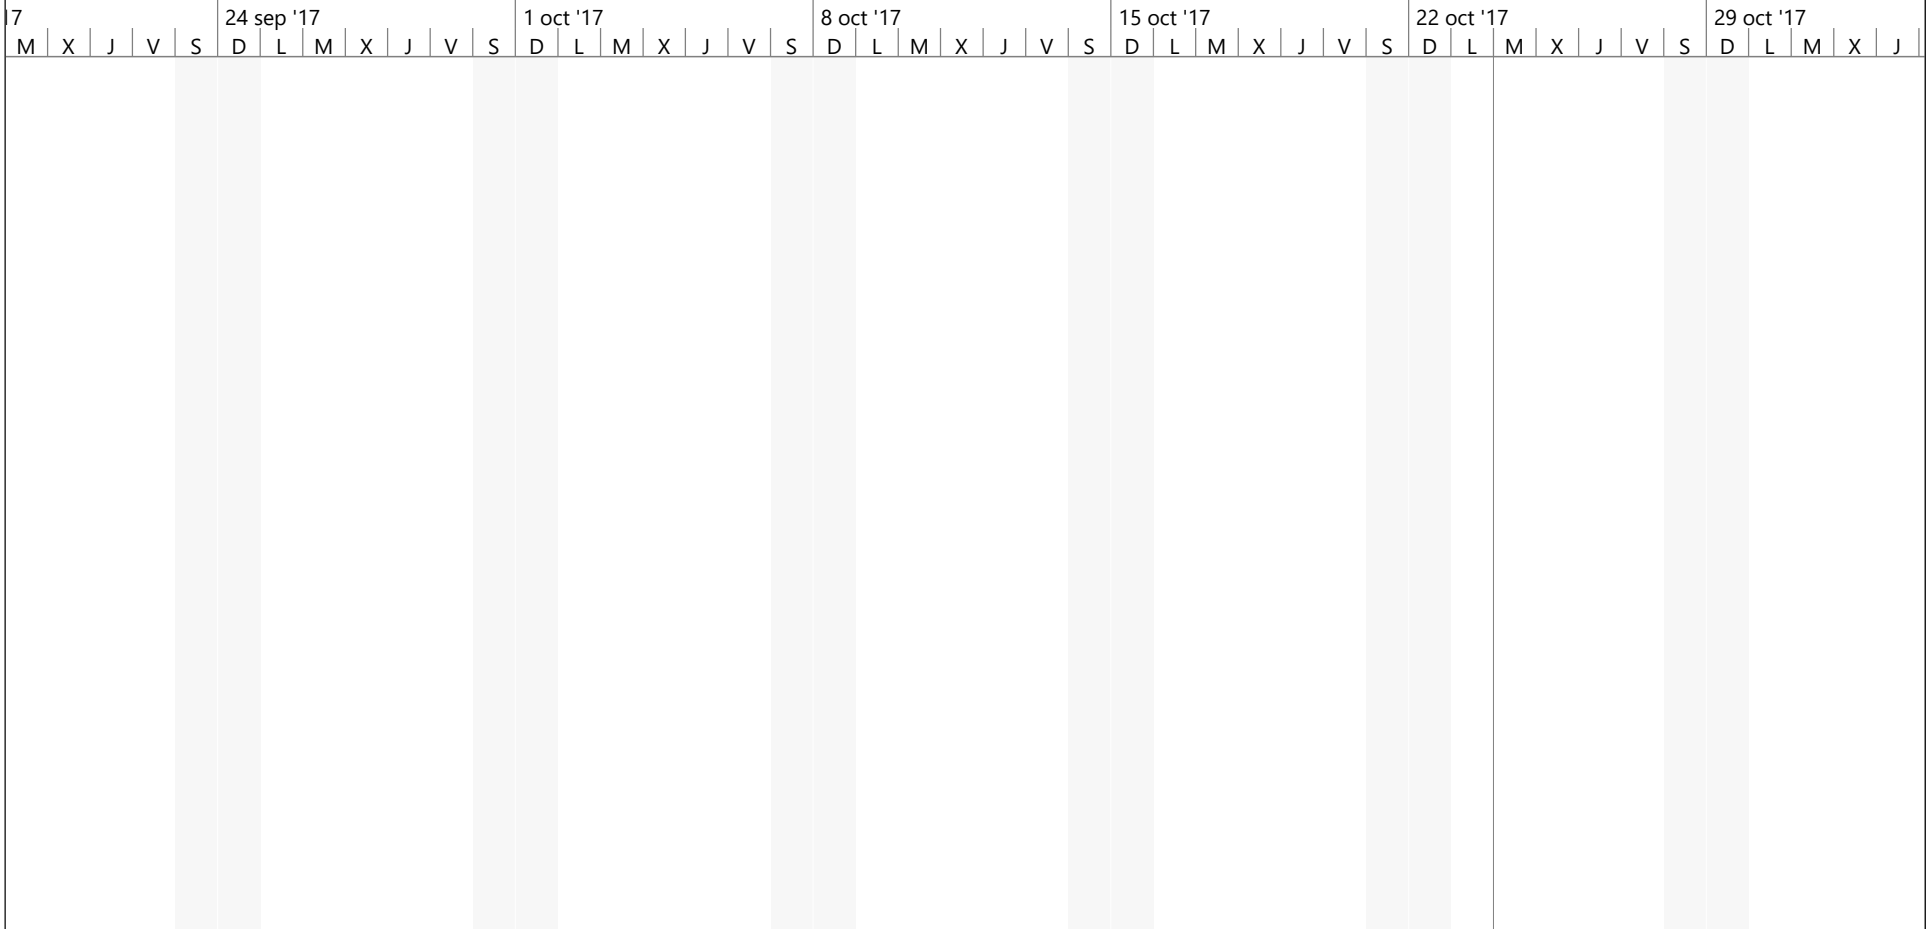

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

### Calendario de ejecucion ZFSA114 Mar 2018

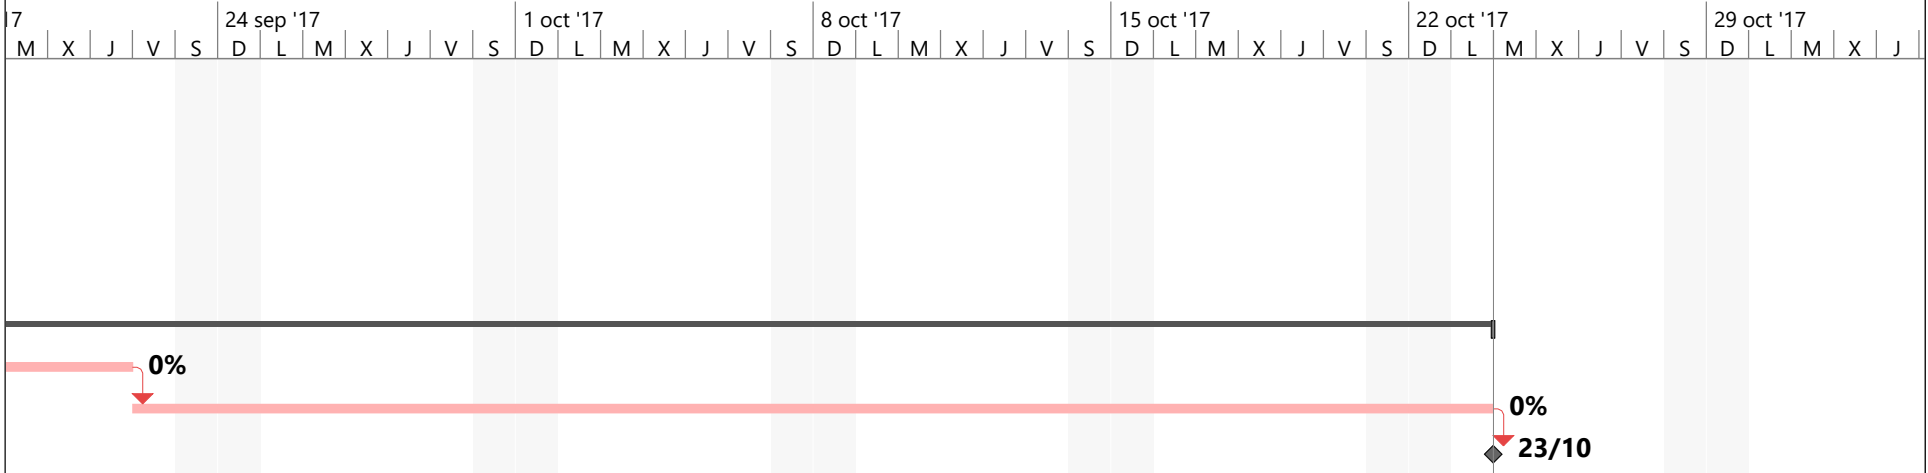

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
