


[illegible]


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16							2			
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		J	V	S
22			Tendido de Conducto	7.45 días	mié 15/3/17	vie 24/3/17	21																		
23			Montaje de Transfor	5.37 días	vie 24/3/17	lun 3/4/17	22																		
24			Instalación de Lumin	5.37 días	lun 3/4/17	lun 10/4/17	23																		
25			Correcciones	1.34 días	lun 10/4/17	mar 11/4/17	24																		
26			Remociones	2.68 días	mar 11/4/17	vie 14/4/17	25																		
27			Normalización de Sur	14.69 días	vie 14/4/17	vie 5/5/17	26																		
28			Evaluación	0 días	vie 5/5/17	vie 5/5/17	27																		
29			Etapla 3	51.21 días	mié 5/4/17	jue 15/6/17																			
30			Izaje de Postes	8.94 días	mié 5/4/17	lun 17/4/17																			
31			Armado de Estructur	5.37 días	lun 17/4/17	mar 25/4/17	30																		
32			Tendido de Conducto	7.45 días	mar 25/4/17	jue 4/5/17	31																		
33			Montaje de Transfor	5.37 días	jue 4/5/17	vie 12/5/17	32																		
34			Instalación de Lumin	5.37 días	vie 12/5/17	vie 19/5/17	33																		
35			Correcciones	1.34 días	vie 19/5/17	lun 22/5/17	34																		
36			Remociones	2.68 días	lun 22/5/17	jue 25/5/17	35																		
37			Normalización de Sur	14.69 días	jue 25/5/17	jue 15/6/17	36																		
38			Evaluación	0 días	jue 15/6/17	jue 15/6/17	37																		
39			Etapla 4	51.21 días	lun 15/5/17	mar 25/7/17																			
40			Izaje de Postes	10 días	lun 15/5/17	vie 26/5/17																			
41			Armado de Estructur	5.37 días	lun 29/5/17	lun 5/6/17	40																		
42			Tendido de Conducto	7.45 días	lun 5/6/17	mié 14/6/17	41																		


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018																									
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras				11 sep '16							18 sep '16							2
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
43			Montaje de Transfor	5.37 días	mié 14/6/17	jue 22/6/17	42																		
44			Instalación de Lumin	5.37 días	jue 22/6/17	jue 29/6/17	43																		
45			Correcciones	1.34 días	jue 29/6/17	vie 30/6/17	44																		
46			Remociones	2.68 días	vie 30/6/17	mié 5/7/17	45																		
47			Normalización de Sur	14.69 días	mié 5/7/17	mié 26/7/17	46																		
48			Evaluación	0 días	mié 26/7/17	mié 26/7/17	47																		
49			Cierres Técnico y Admin	46 días	mar 25/7/17	mar 26/9/17																			
50			Cierre Técnico	28 días	mar 25/7/17	jue 31/8/17																			
51			Cierre Administrativo	22 días	vie 1/9/17	lun 2/10/17	50																		
52			Evaluación	0 días	lun 2/10/17	lun 2/10/17	51																		
			Tareas críticas		solo fin		Resumen manual																		
			División crítica		solo duración		Resumen del proyecto																		
			Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas																		
			Tarea		División de la línea base		Hito externo																		
			División		Hito de línea base		Tarea inactiva																		
			Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo																		
			Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo																		
			solo el comienzo		Resumen		Fecha límite																		

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

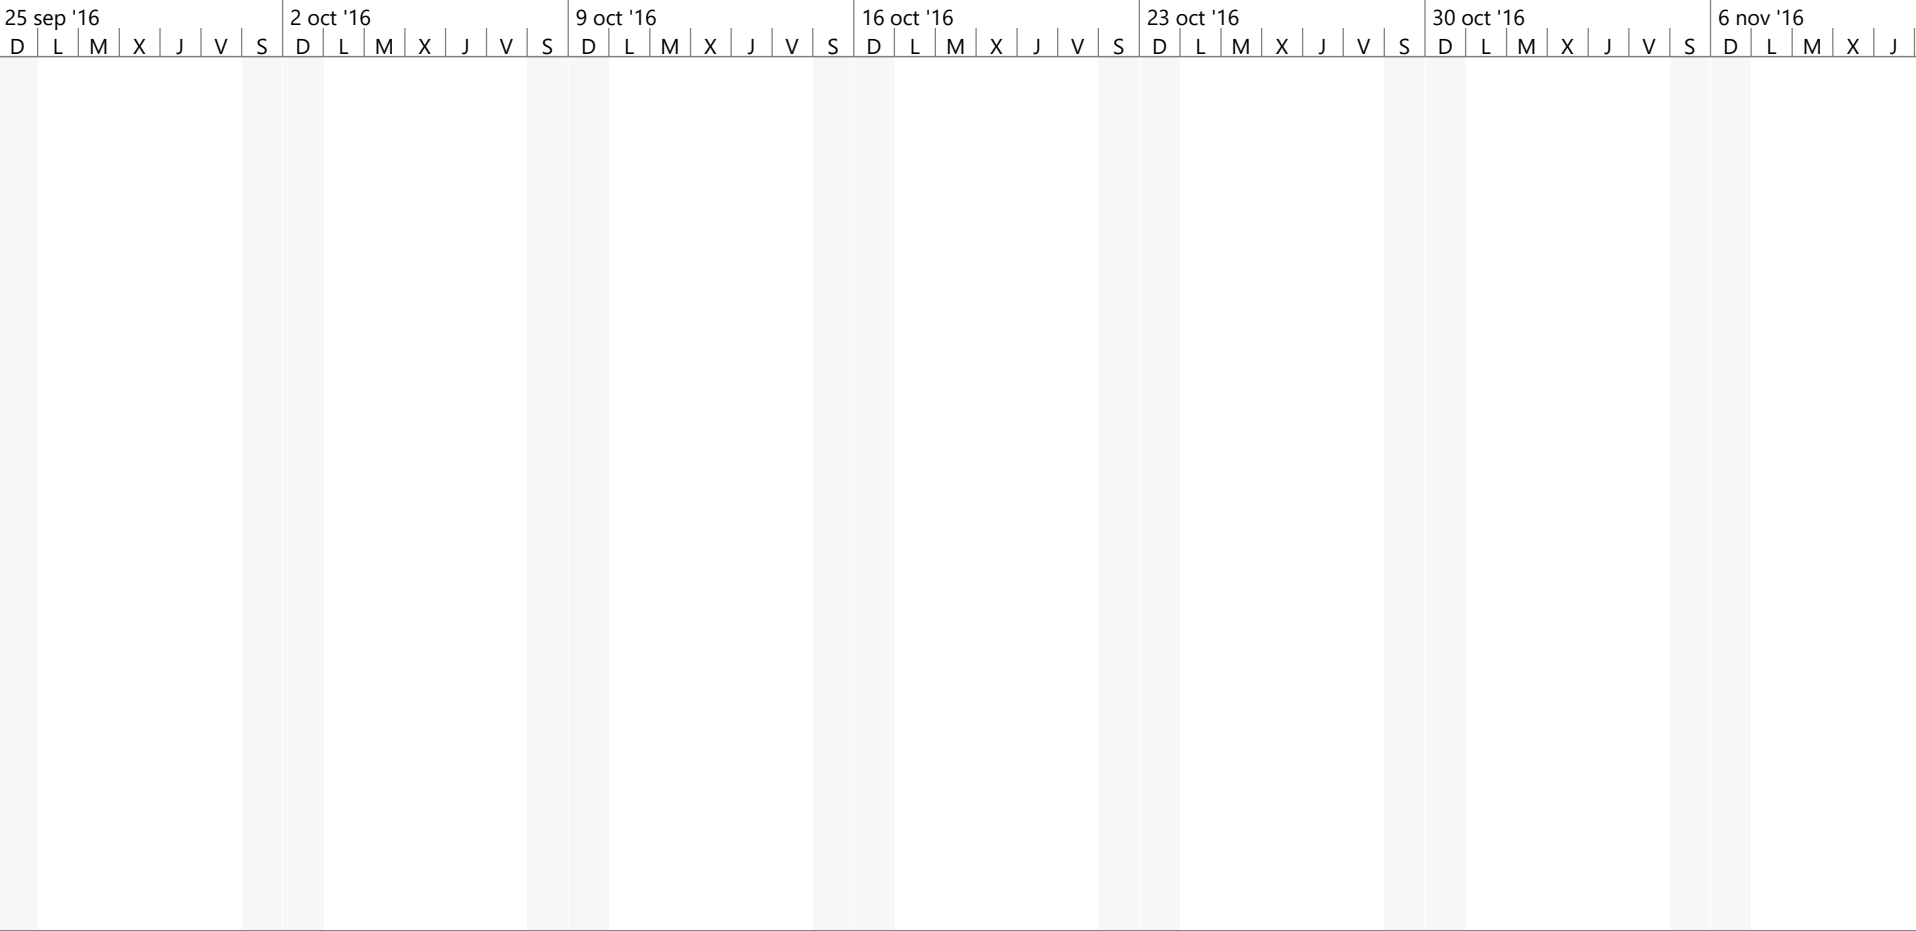

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

25 sep '16							2 oct '16							9 oct '16							16 oct '16							23 oct '16							30 oct '16							6 nov '16						
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S							

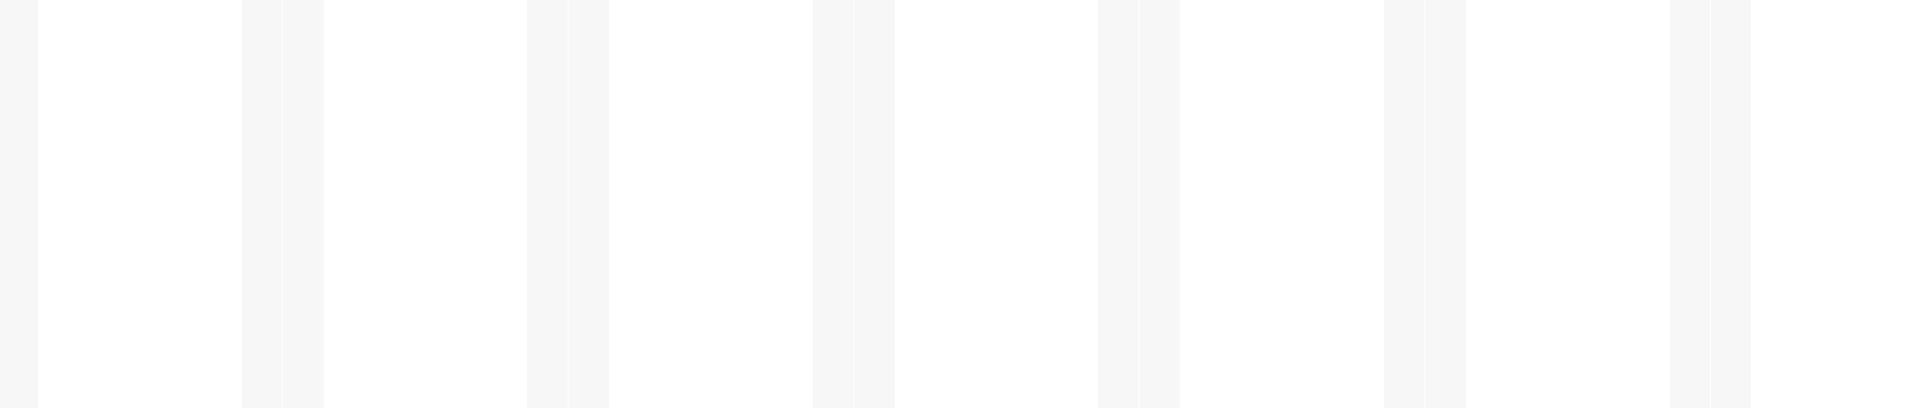


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

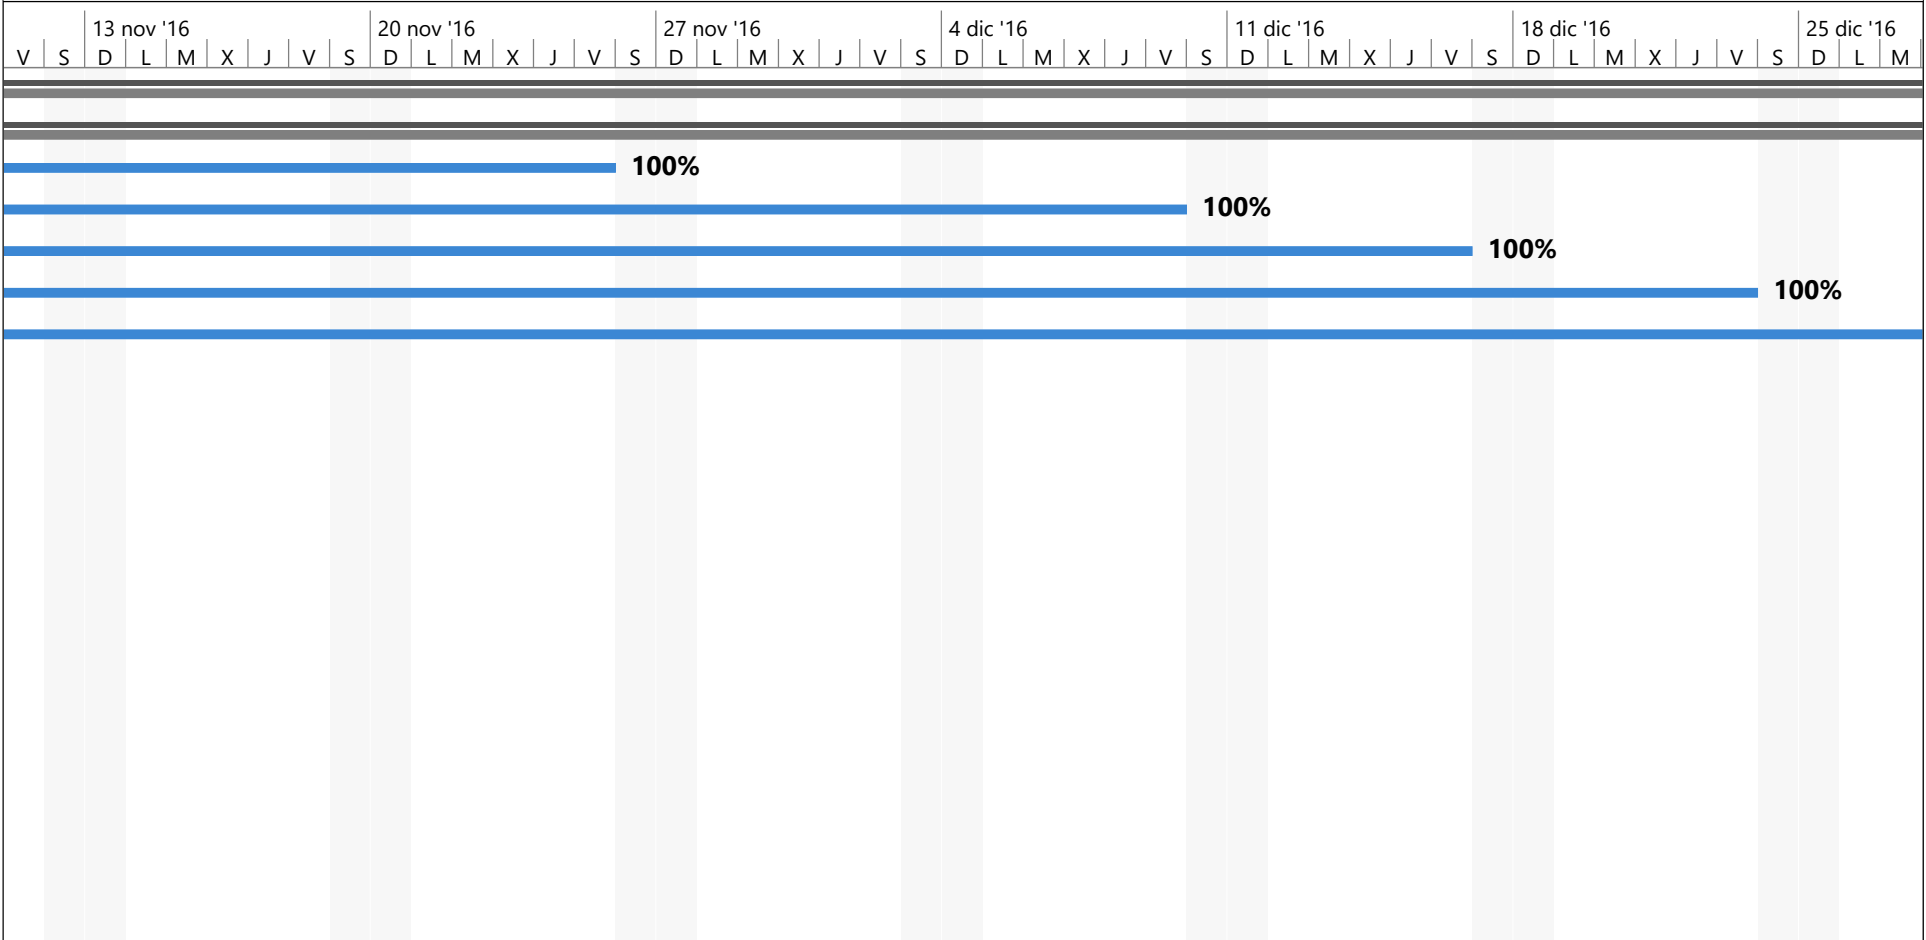


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

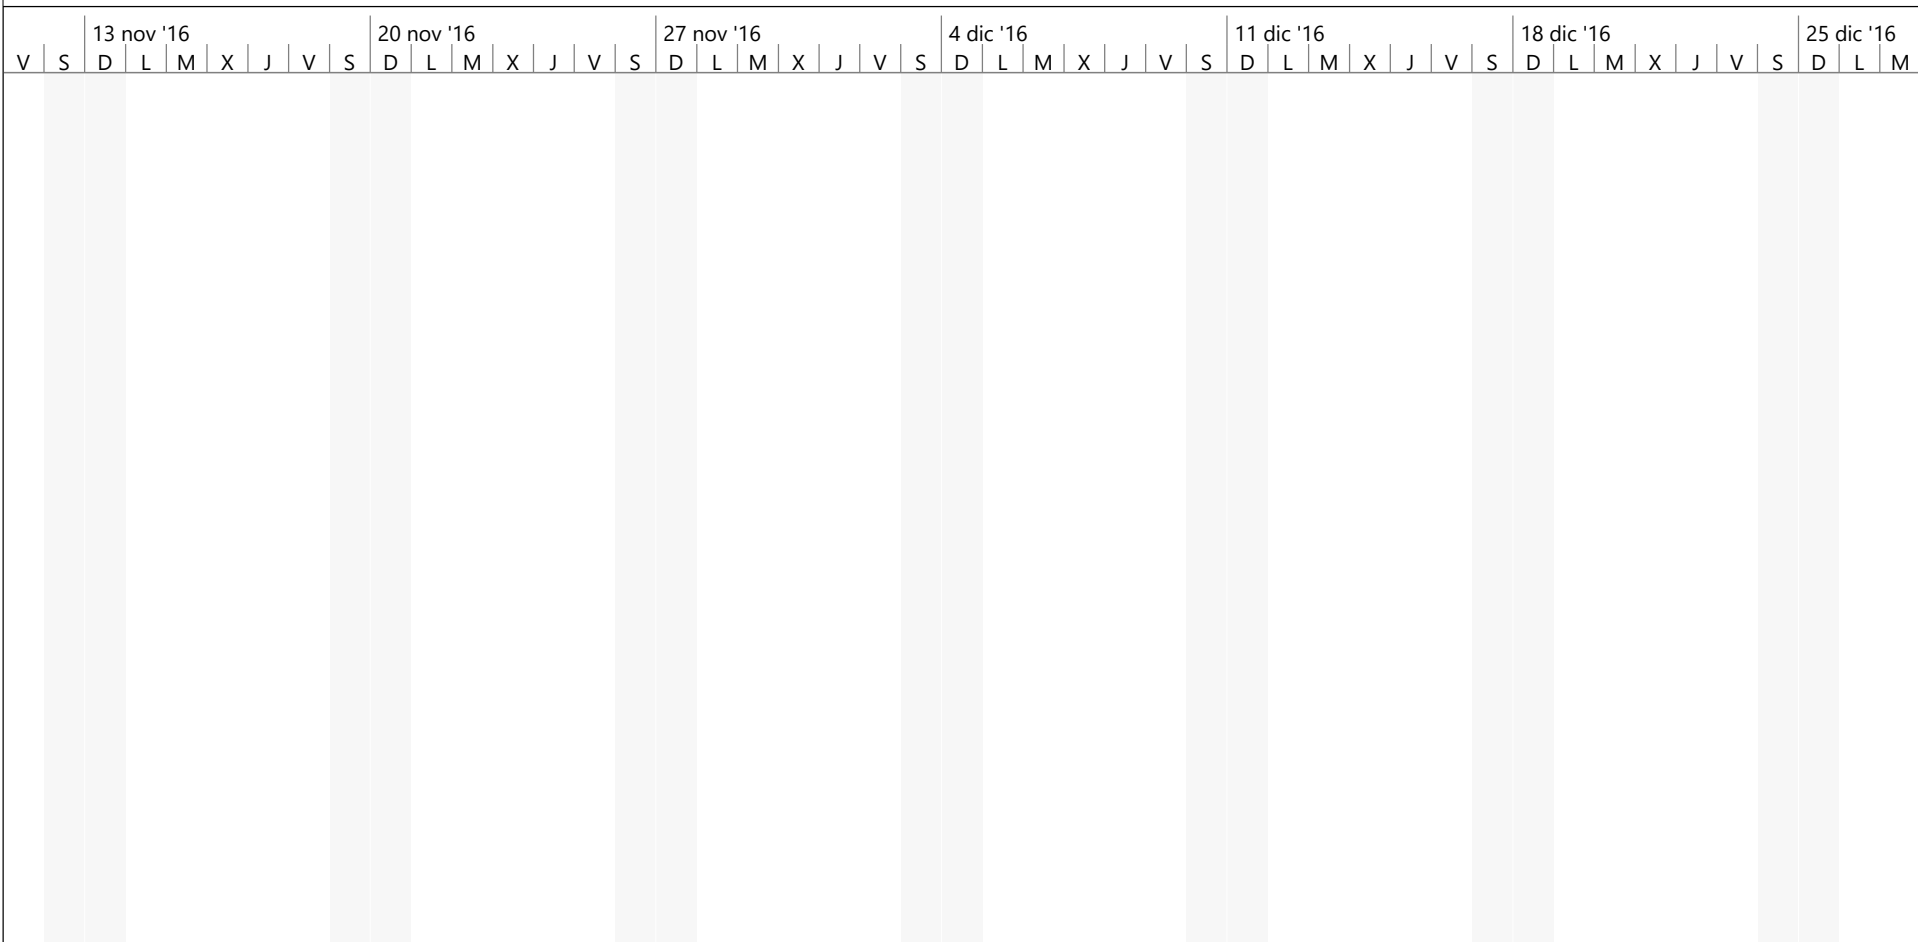

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen




Fecha límite




Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

V	S	13 nov '16							20 nov '16							27 nov '16							4 dic '16							11 dic '16							18 dic '16							25 dic '16			
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M			




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

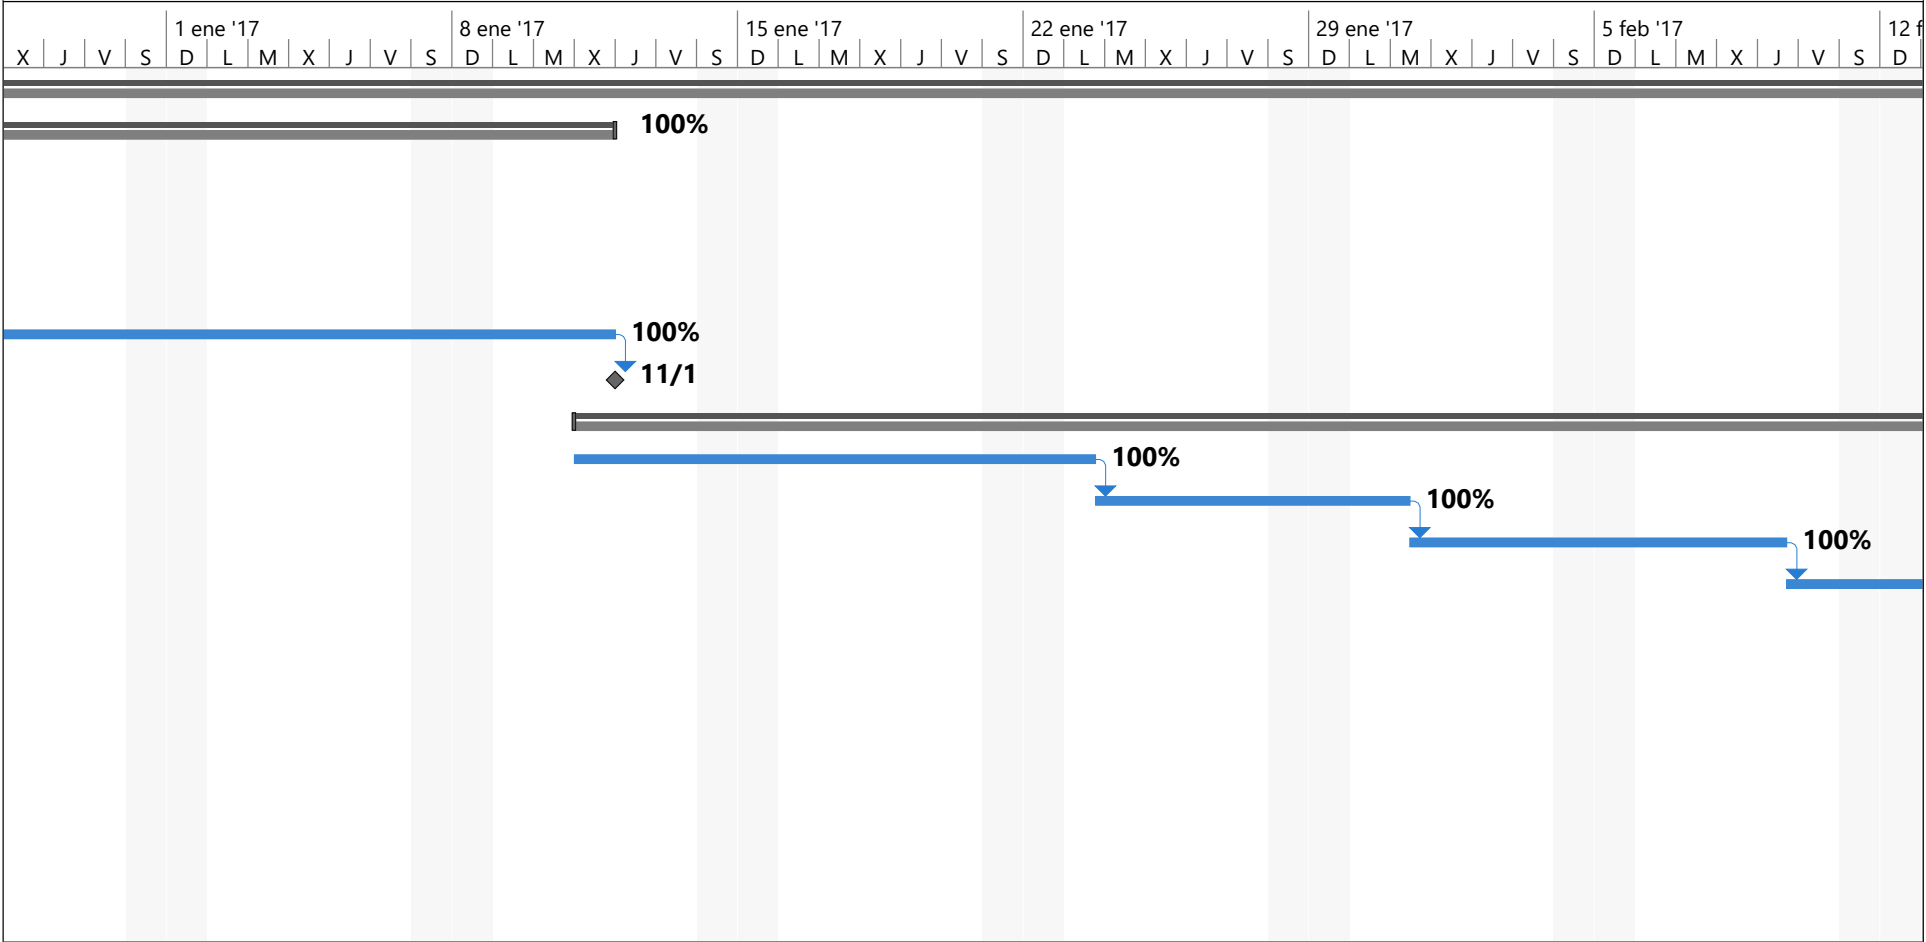

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

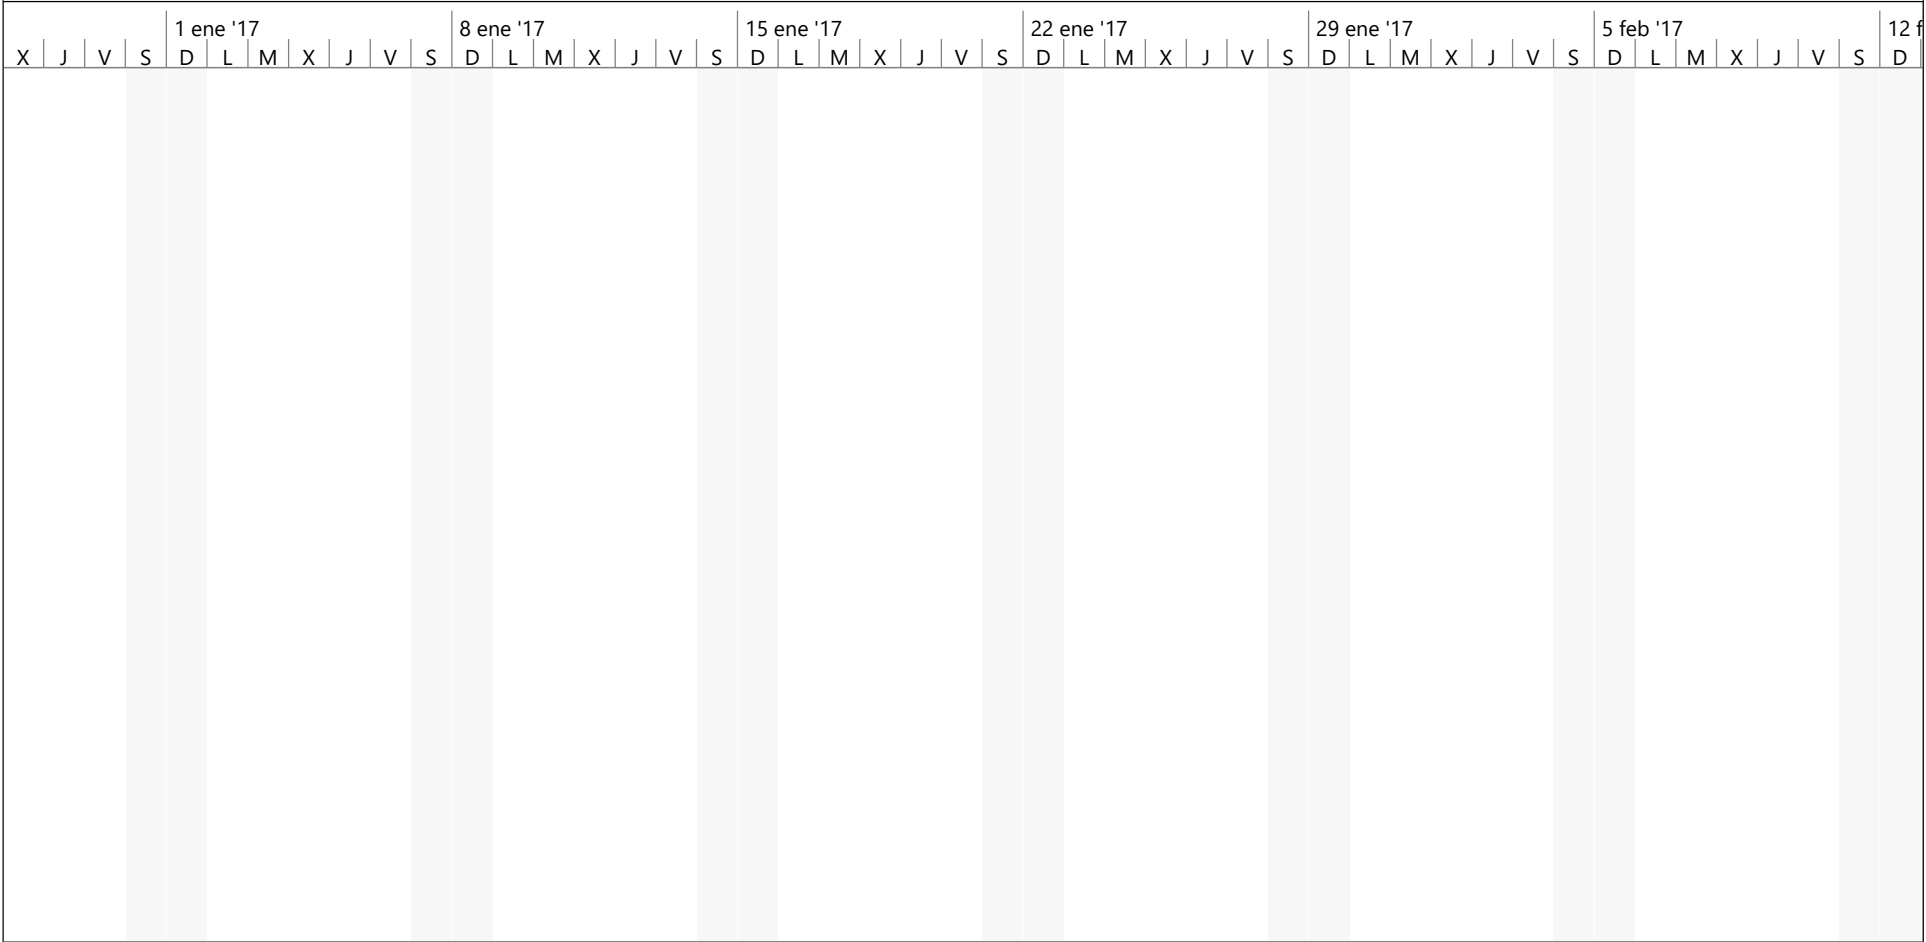


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

X	J	V	S	1 ene '17				S	8 ene '17				S	15 ene '17				S	22 ene '17				S	29 ene '17				S	5 feb '17				S	12 f
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D		

Tareas críticas



solo fin



Resumen manual



División crítica



solo duración



Resumen del proyecto



Progreso de tarea crítica



Línea base



Tareas externas



Tarea



División de la línea base



Hito externo



División



Hito de línea base



Tarea inactiva



Progreso de tarea



Hito



Hito inactivo



Tarea manual



Progreso del resumen



Resumen inactivo



solo el comienzo



Resumen




Fecha límite



Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

feb '17
 L M X J V S
 19 feb '17
 D L M X J V S
 26 feb '17
 D L M X J V S
 5 mar '17
 D L M X J V S
 12 mar '17
 D L M X J V S
 19 mar '17
 D L M X J V S
 26 mar '17
 D L M X J V

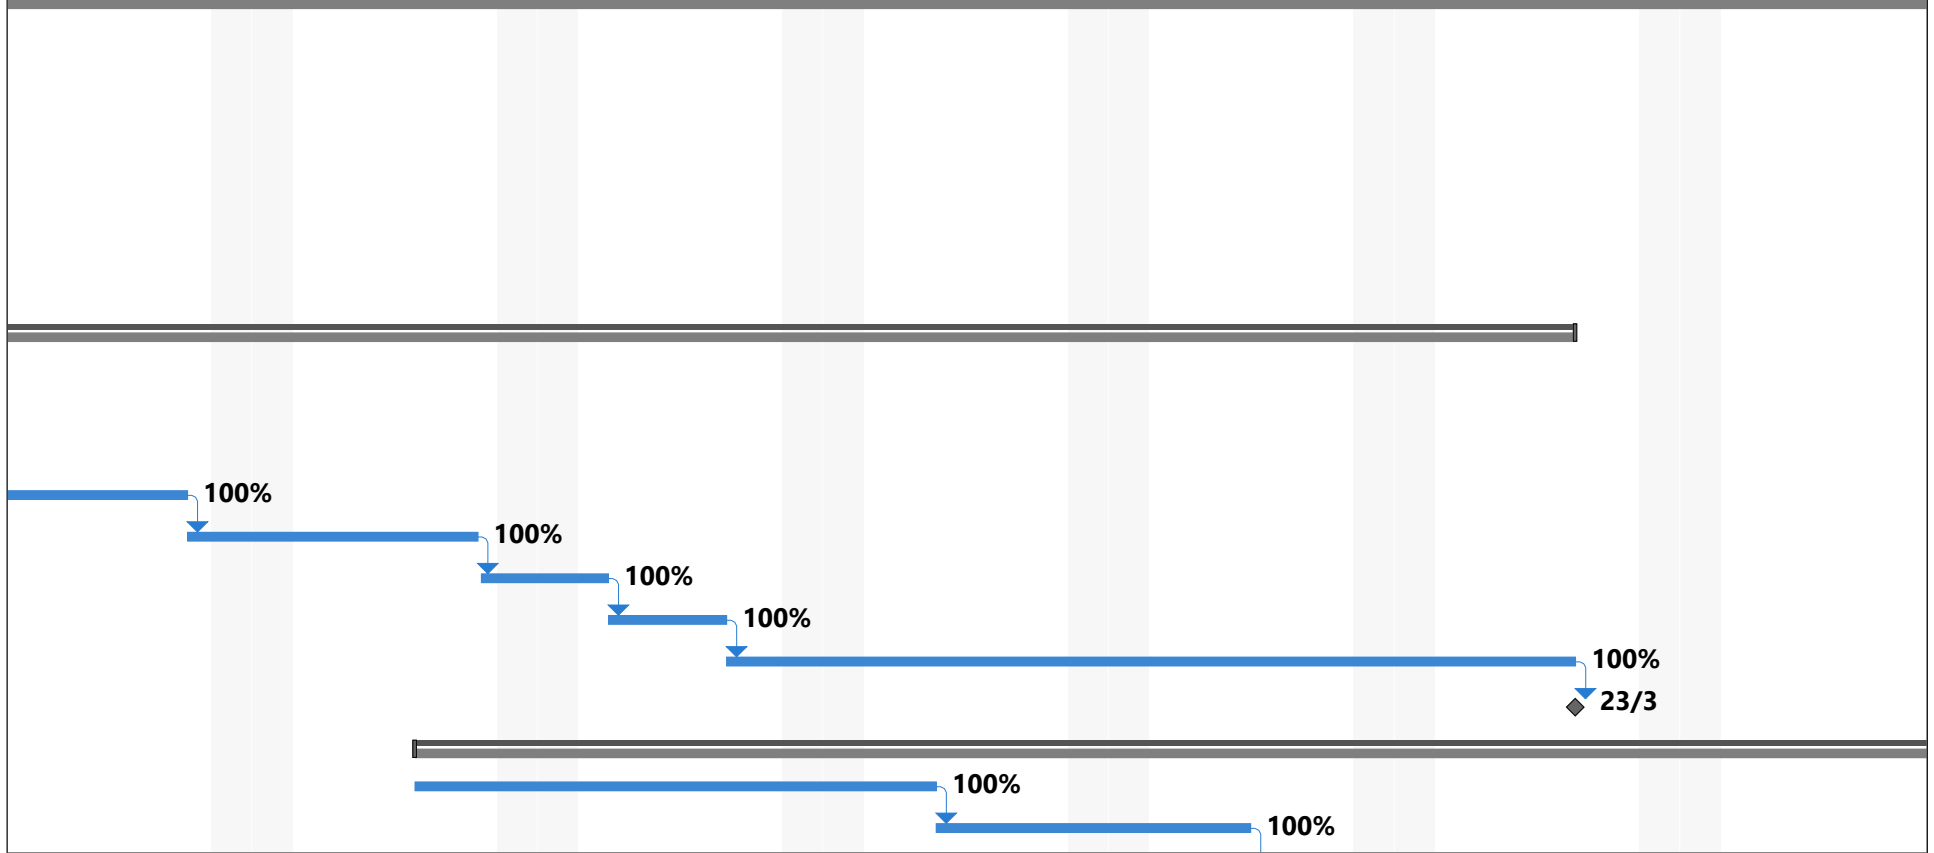

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

[illegible]


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

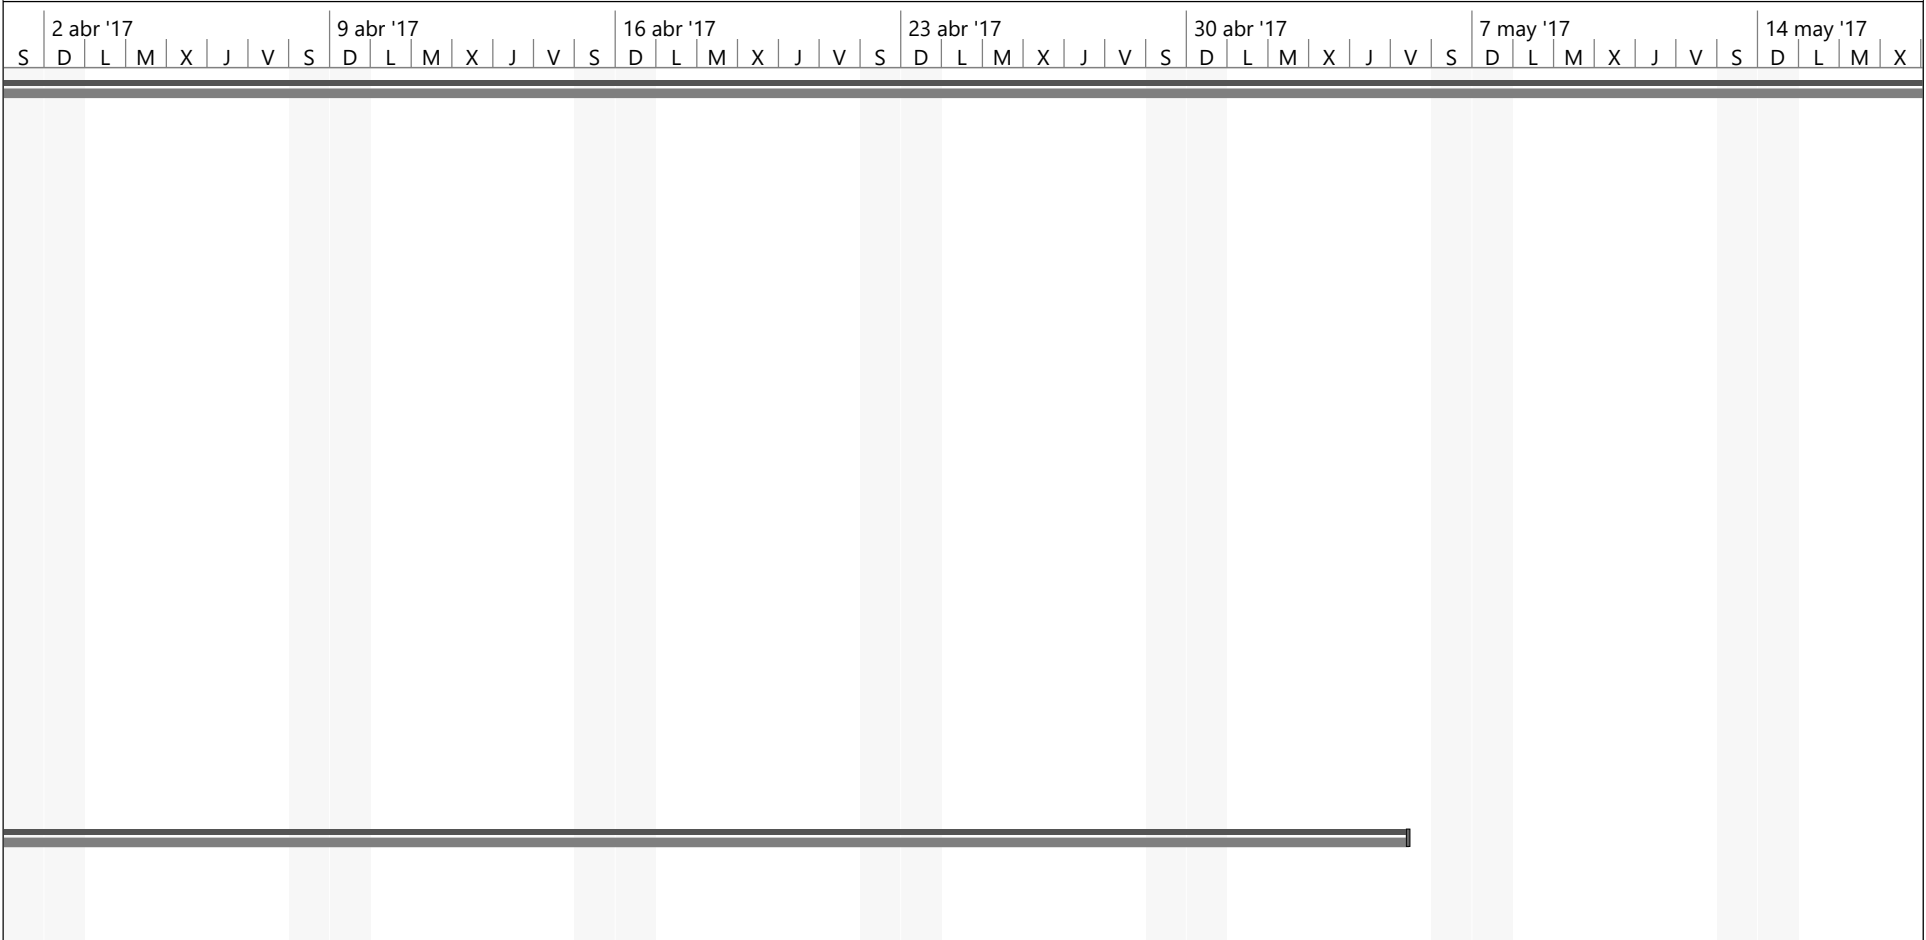


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

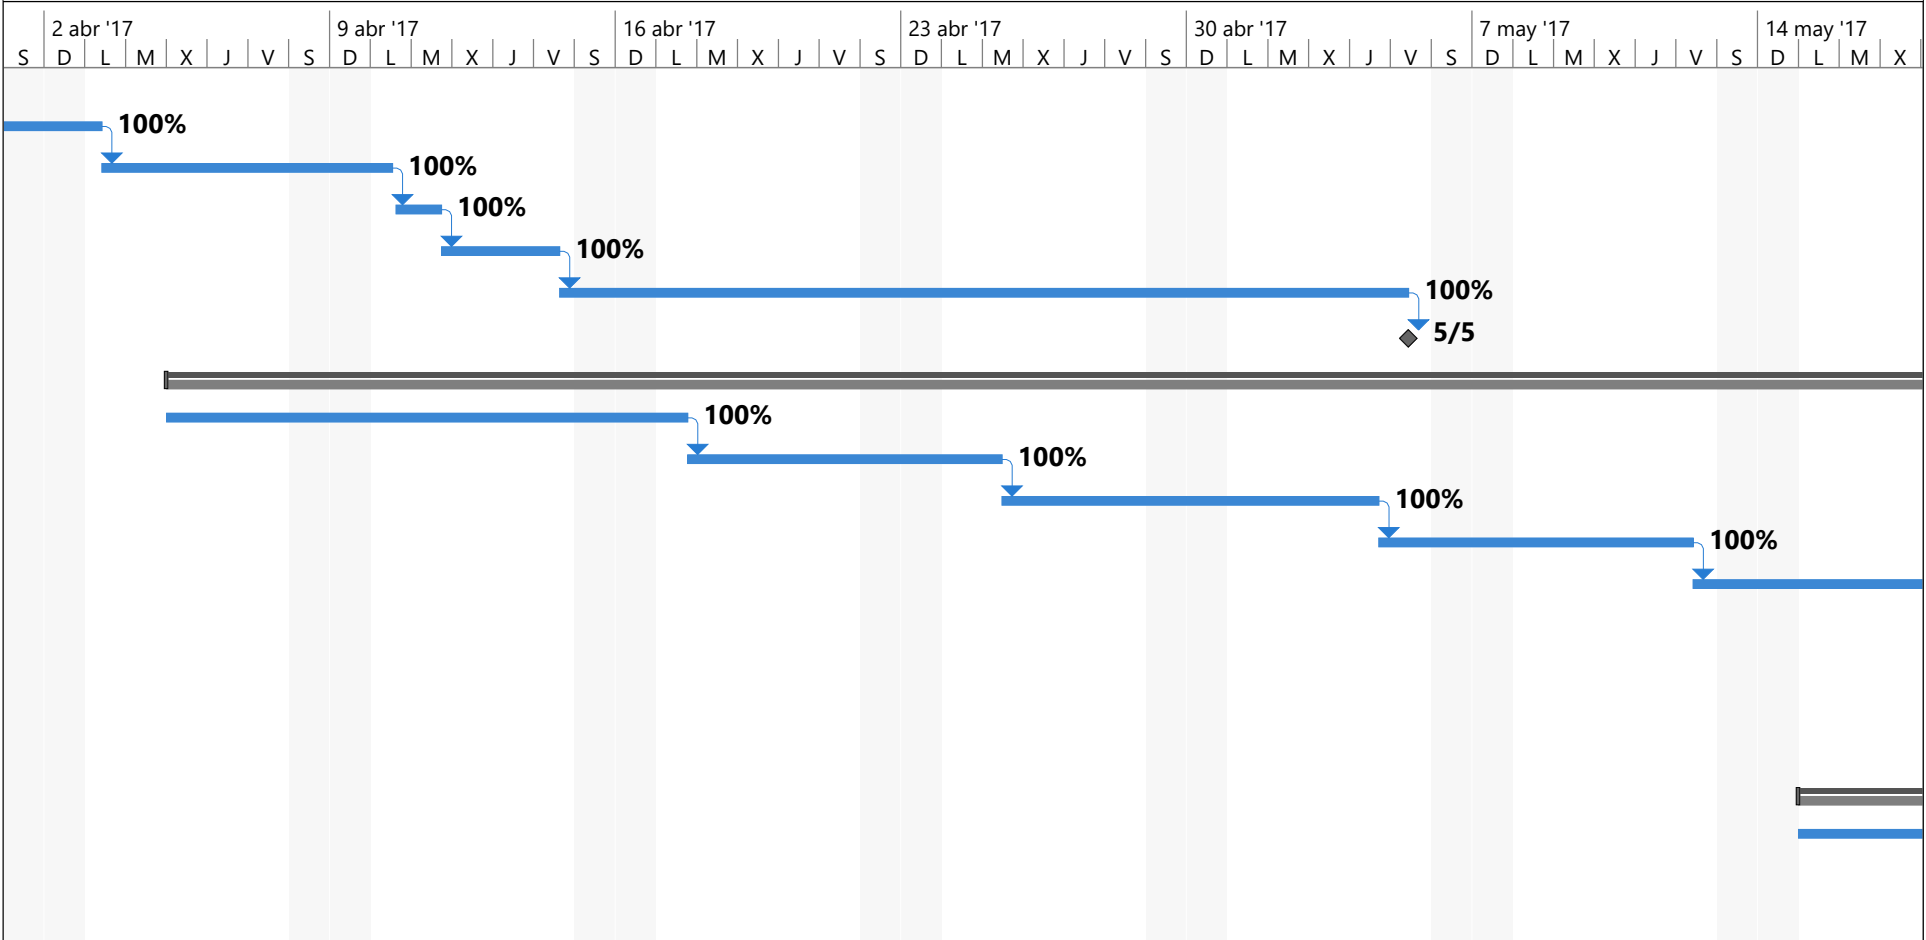


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

2 abr '17							9 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							30 abr '17							7 may '17							14 may '17						
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X									




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

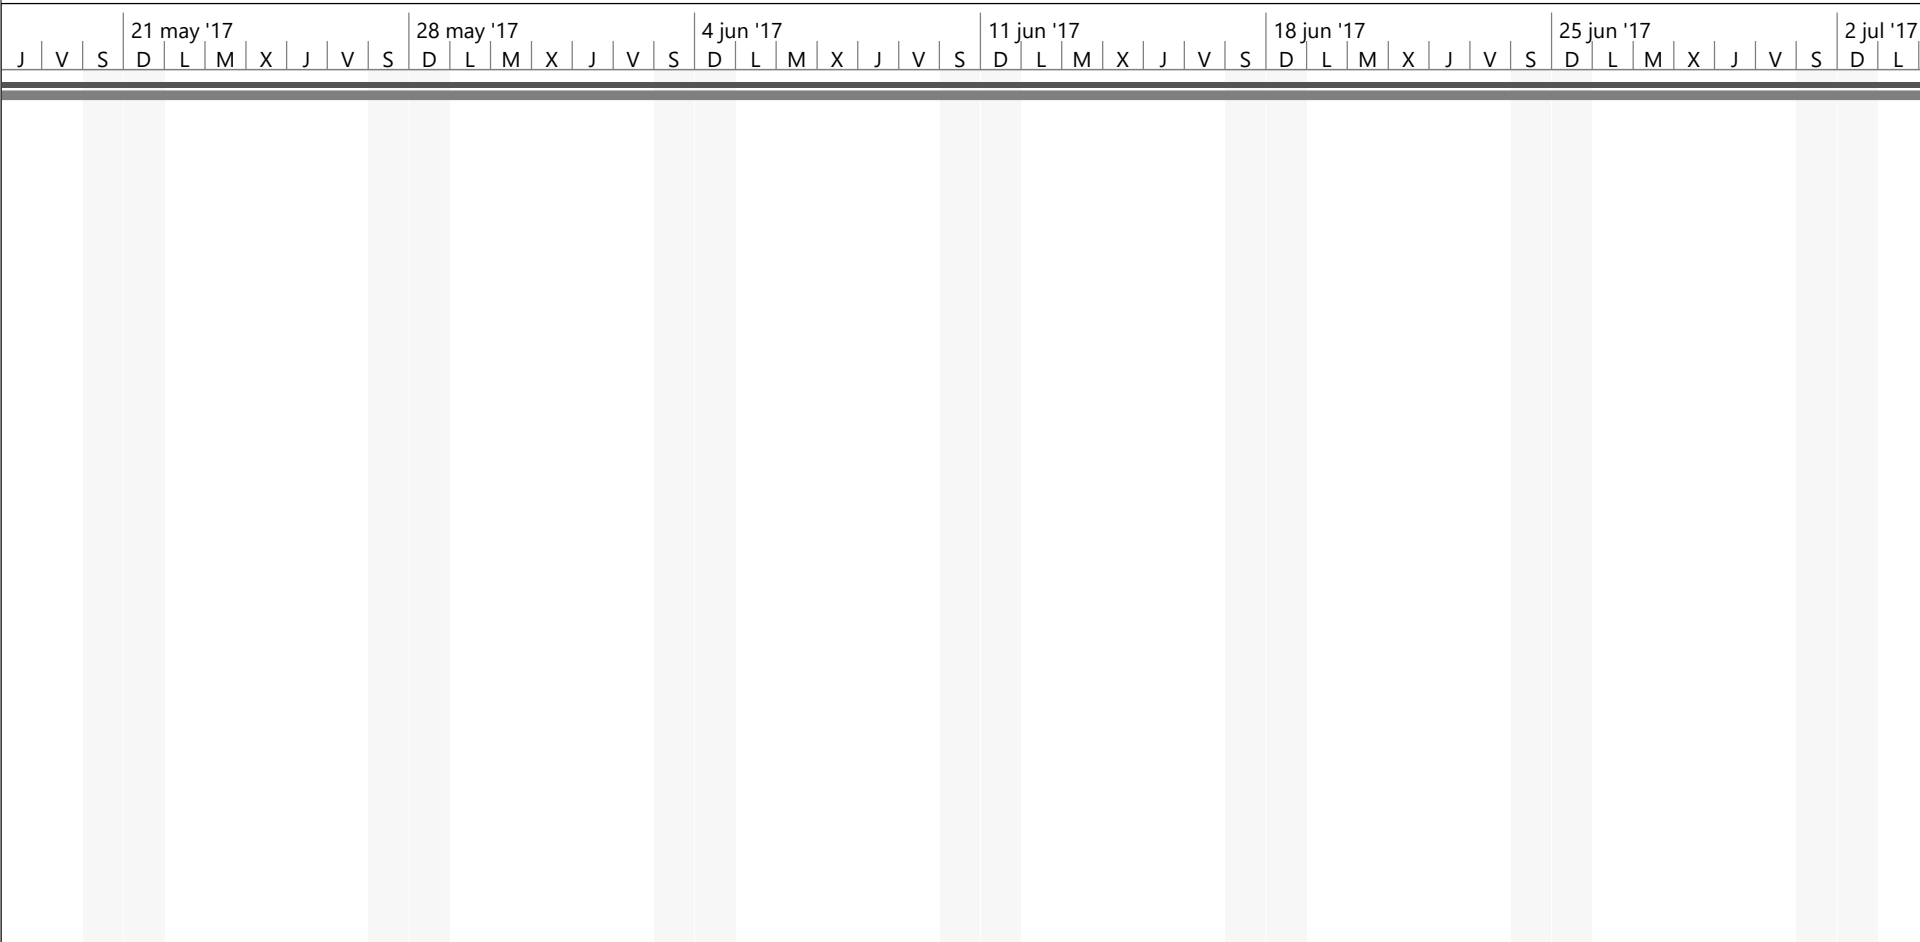


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

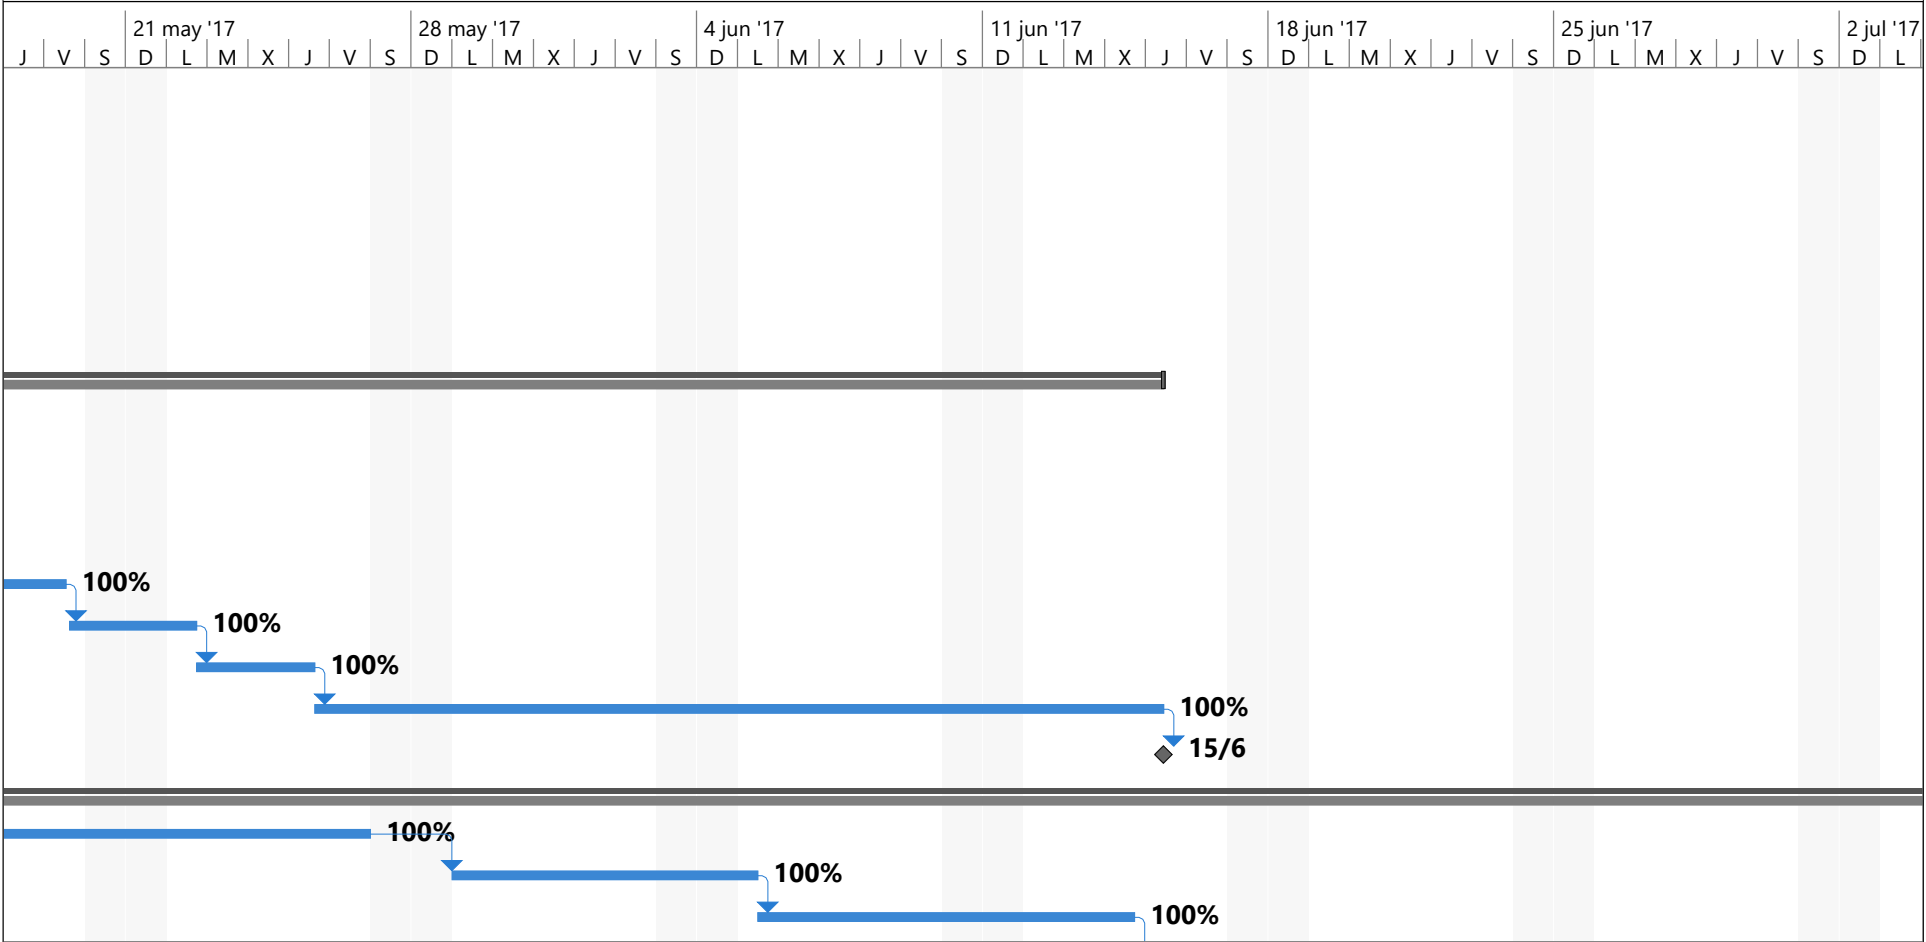

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

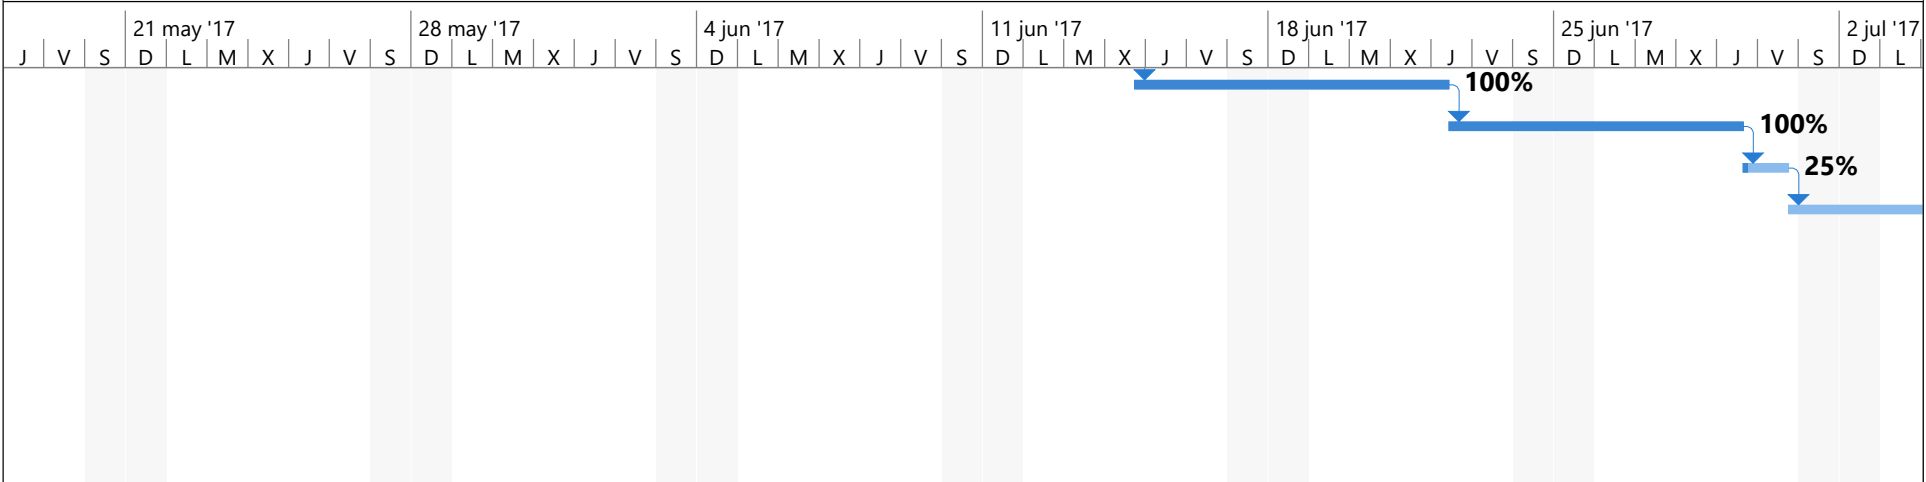

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

					9 jul '17					16 jul '17					23 jul '17					30 jul '17					6 ago '17					13 ago '17									
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

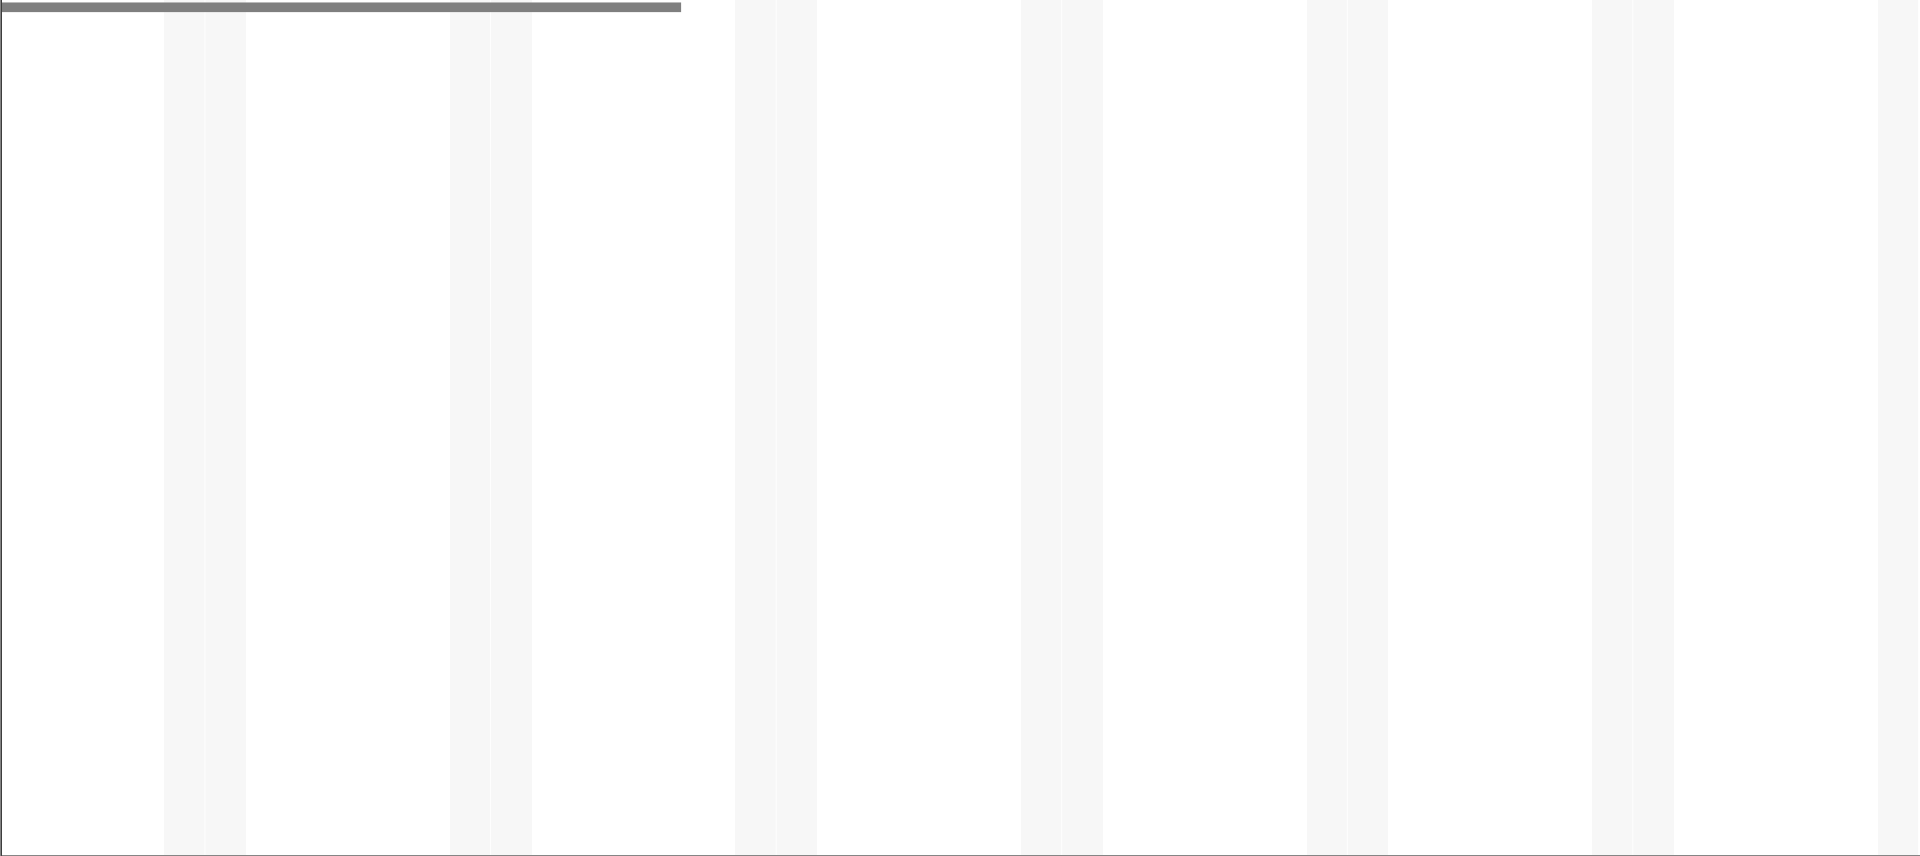


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

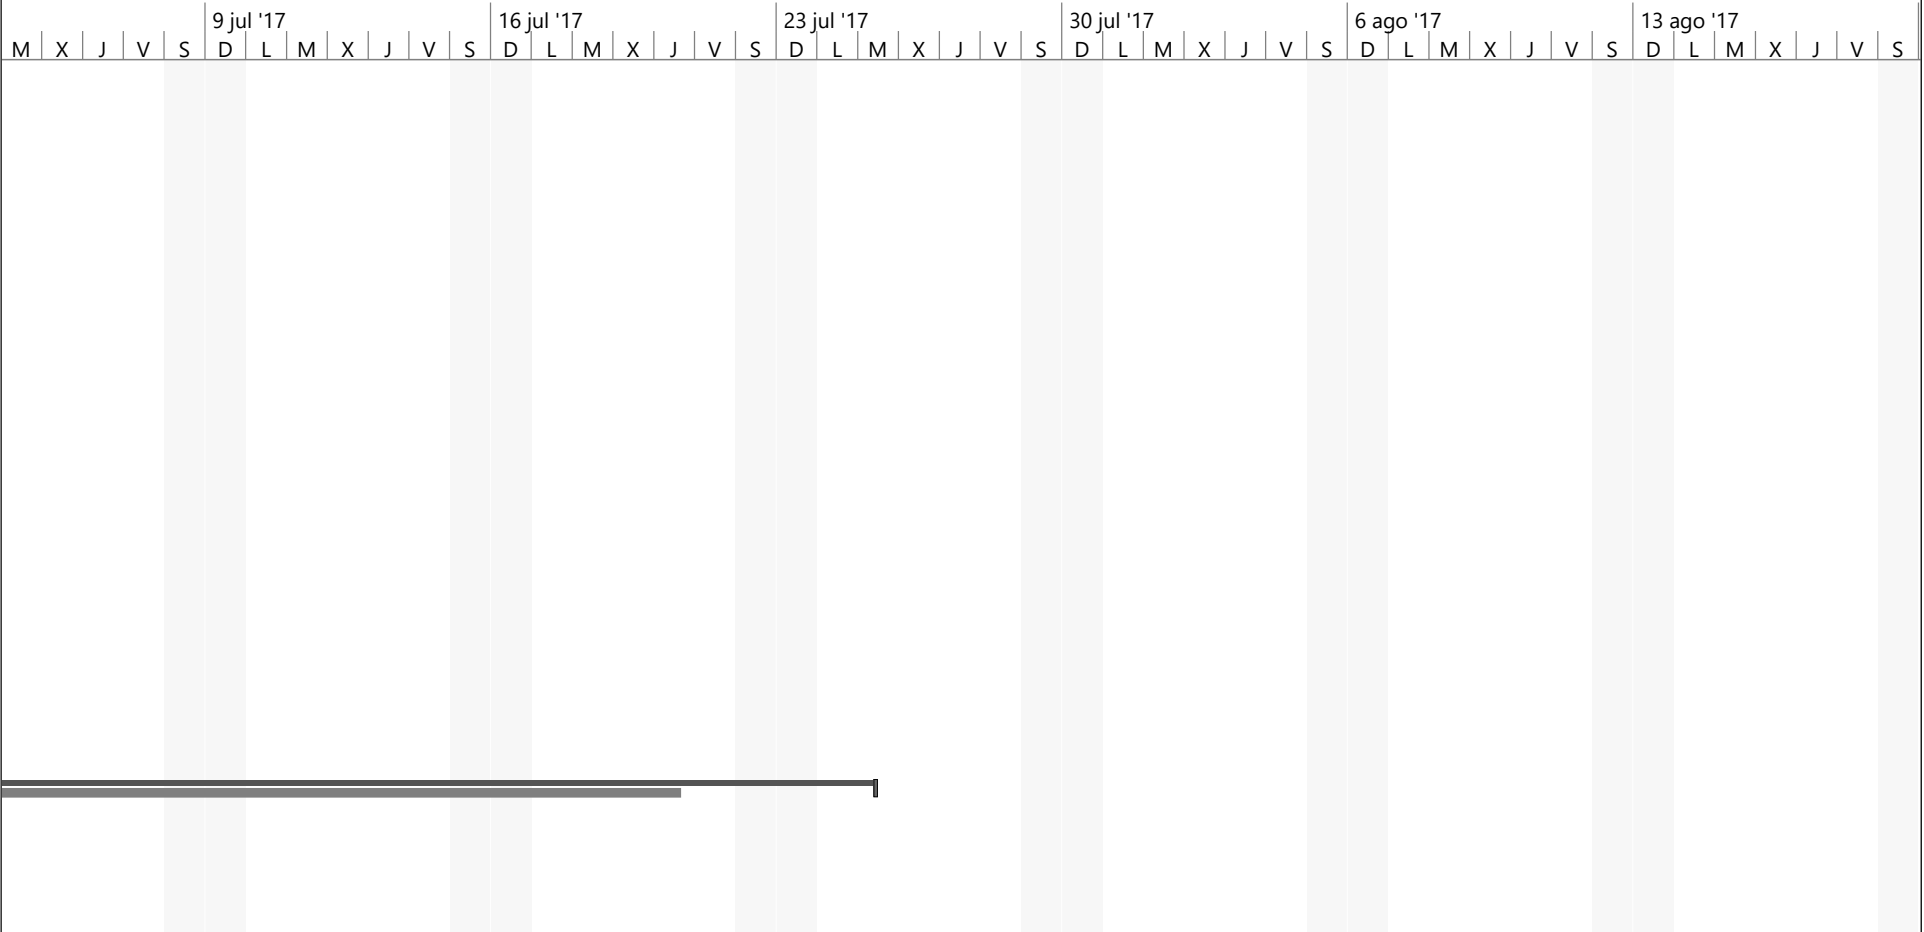

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

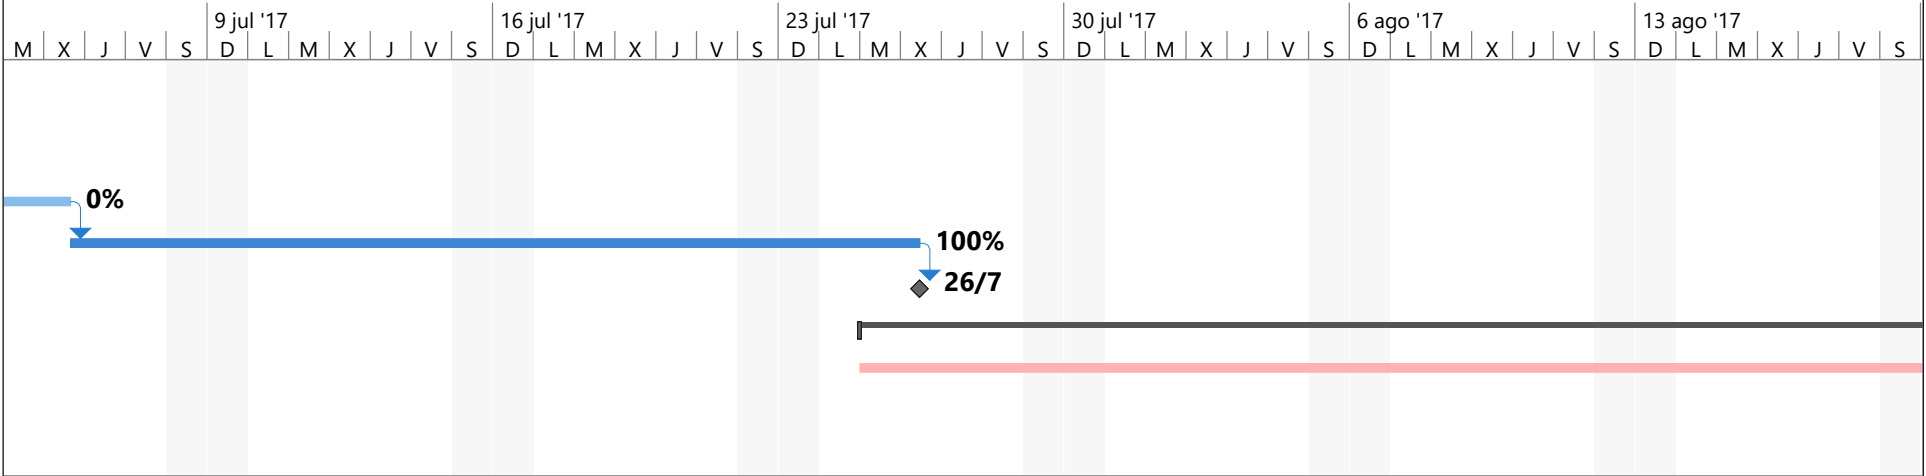

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

20 ago '17							27 ago '17							3 sep '17							10 sep '17							17 sep '17							24 sep '17							1 oct '17				
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J							
																																			91%											

91%


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

20 ago '17							27 ago '17							3 sep '17							10 sep '17							17 sep '17							24 sep '17							1 oct '17				
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J							

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA104 Abr 2018

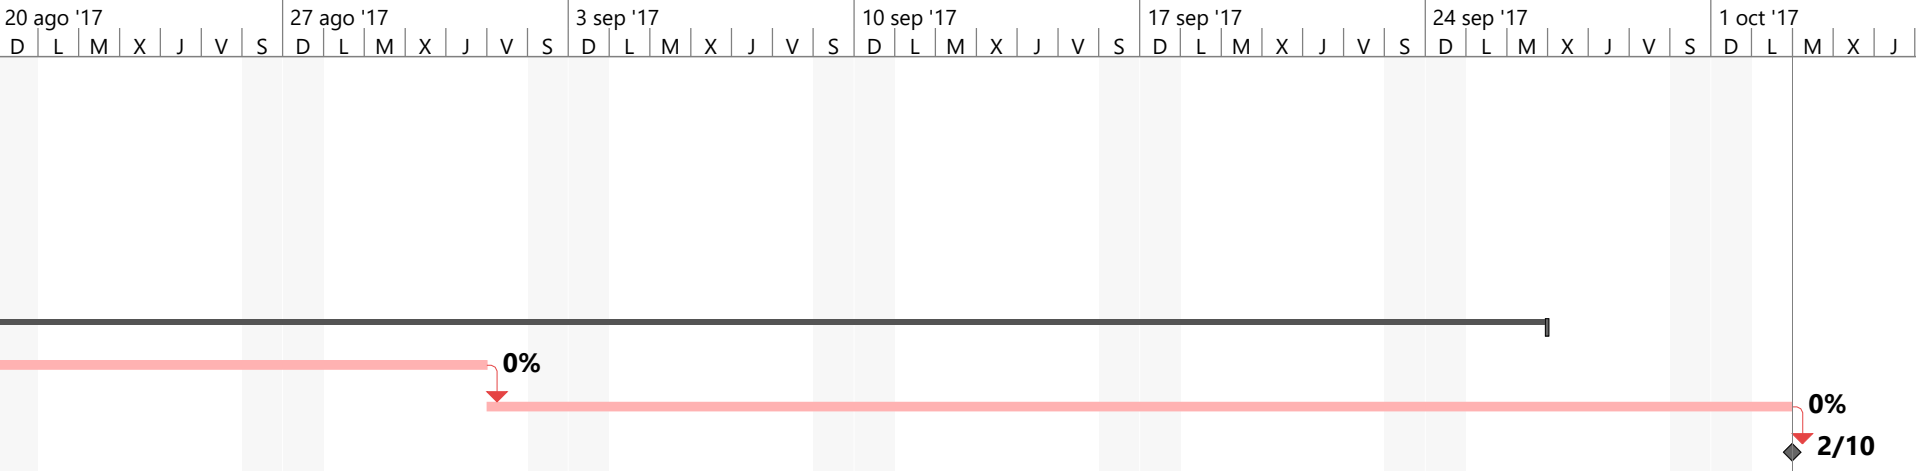

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
