

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16							25 sep '16																									
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M																				
1			Circuito NIBA112	277 días	vie 9/9/16	lun 2/10/17																																								
2			Adquisiciones	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17																																								
3			Postes	56 días	vie 9/9/16	vie 25/11/16																																								
4			Herrajes y Conectores	66 días	vie 9/9/16	vie 9/12/16																																								
5			Conductores MT/BT	71 días	vie 9/9/16	vie 16/12/16																																								
6			Transformadores y Ec	76 días	vie 9/9/16	vie 23/12/16																																								
7			Equipos de Medición	89 días	vie 9/9/16	mié 11/1/17																																								
8			Evaluación	0 días	mié 11/1/17	mié 11/1/17	7																																							
9			Etapa 1	51.21 días	mié 11/1/17	jue 23/3/17																																								
10			Izaje de Postes	8.94 días	mié 11/1/17	lun 23/1/17																																								
11			Armado de Estructura	5.37 días	lun 23/1/17	mar 31/1/17	10																																							
12			Tendido de Conducto	7.45 días	mar 31/1/17	jue 9/2/17	11																																							
13			Montaje de Transferr	5.37 días	jue 9/2/17	vie 17/2/17	12																																							
14			Instalación de Lumina	5.37 días	vie 17/2/17	vie 24/2/17	13																																							
15			Correcciones	1.34 días	vie 24/2/17	lun 27/2/17	14																																							
16			Remociones	2.68 días	lun 27/2/17	jue 2/3/17	15																																							
17			Normalización de Sun	14.69 días	jue 2/3/17	jue 23/3/17	16																																							
18			Evaluación	0 días	jue 23/3/17	jue 23/3/17	17																																							
19			Etapa 2	51.21 días	mar 28/2/17	mié 10/5/17																																								
20			Izaje de Postes	8.94 días	mar 28/2/17	vie 10/3/17																																								



Ing. Deivy Rodríguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana
 F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16							25 sep '16								
							J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L				
21	✓		Armado de Estructur	5.37 días	vie 10/3/17	lun 20/3/17	20																						
22	✓		Tendido de Conducto	7.45 días	lun 20/3/17	mié 29/3/17	21																						
23	✓		Montaje de Transfor	5.37 días	mié 29/3/17	jue 6/4/17	22																						
24	✓		Instalación de Lumin	5.37 días	jue 6/4/17	jue 13/4/17	23																						
25	✓		Correcciones	1.34 días	jue 13/4/17	vie 14/4/17	24																						
26	✓		Remociones	2.68 días	vie 14/4/17	mié 19/4/17	25																						
27	✓		Normalización de Sur	14.69 días	mié 19/4/17	mié 10/5/17	26																						
28	✓		Evaluación	0 días	mié 10/5/17	mié 10/5/17	27																						
29	✓		Etapas 3	51.21 días	mié 10/5/17	jue 20/7/17																							
30	✓		Izaje de Postes	8.94 días	mié 10/5/17	lun 22/5/17																							
31	✓		Armado de Estructur	5.37 días	lun 22/5/17	mar 30/5/17	30																						
32	✓		Tendido de Conducto	7.45 días	mar 30/5/17	jue 8/6/17	31																						
33	✓		Montaje de Transfor	5.37 días	jue 8/6/17	vie 16/6/17	32																						
34	✓		Instalación de Lumin	5.37 días	vie 16/6/17	vie 23/6/17	33																						
35	✓		Correcciones	1.34 días	vie 23/6/17	lun 26/6/17	34																						
36	✓		Remociones	2.68 días	lun 26/6/17	jue 29/6/17	35																						
37	✓		Normalización de Sur	14.69 días	jue 29/6/17	jue 20/7/17	36																						
38	✓		Evaluación	0 días	jue 20/7/17	jue 20/7/17	37																						
39	✓		Cierres Técnico y Adm	46 días	lun 31/7/17	lun 2/10/17																							
40	✓		Cierre Técnico	24 días	lun 31/7/17	jue 31/8/17																							


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	11 sep '16							18 sep '16							25 sep '16															
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L											
41			Cierre Administrativo	22 días	vie 1/9/17	lun 2/10/17	40																														
42			Evaluación	0 días	lun 2/10/17	lun 2/10/17	41																														

- | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

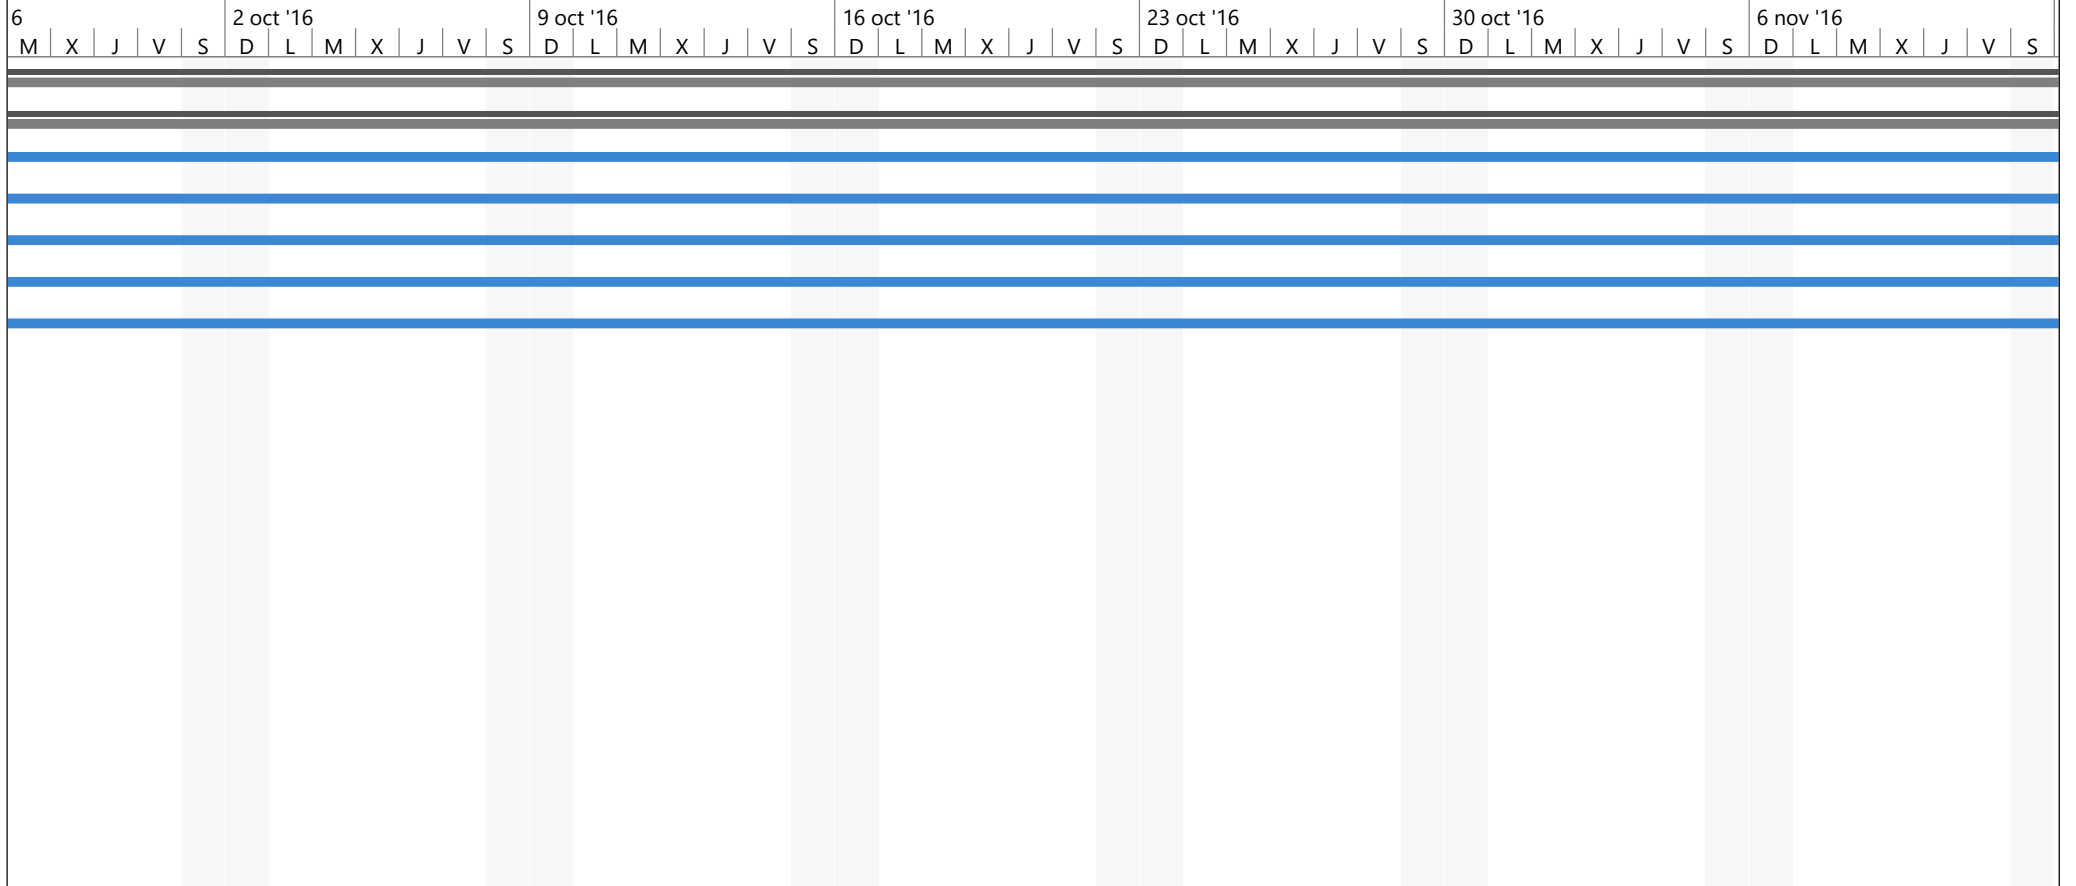

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018


6	2 oct '16					9 oct '16					16 oct '16					23 oct '16					30 oct '16					6 nov '16													
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

13 nov '16 | 20 nov '16 | 27 nov '16 | 4 dic '16 | 11 dic '16 | 18 dic '16 | 25 dic '16
 D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S

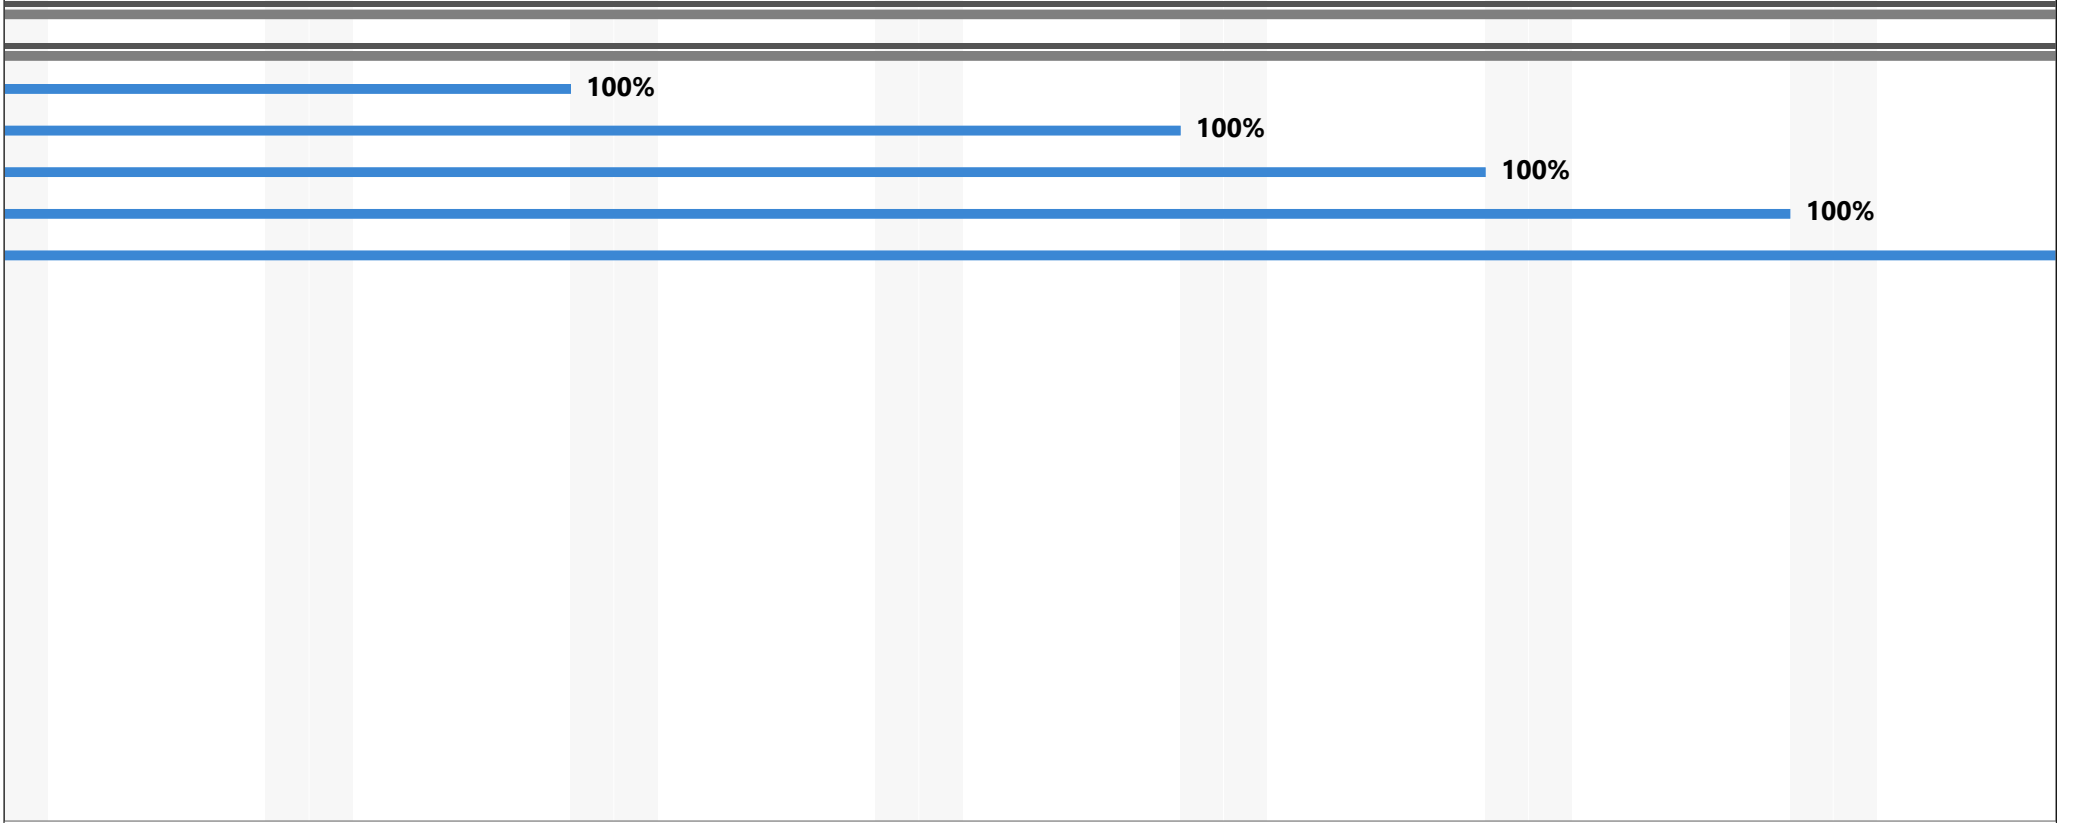

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

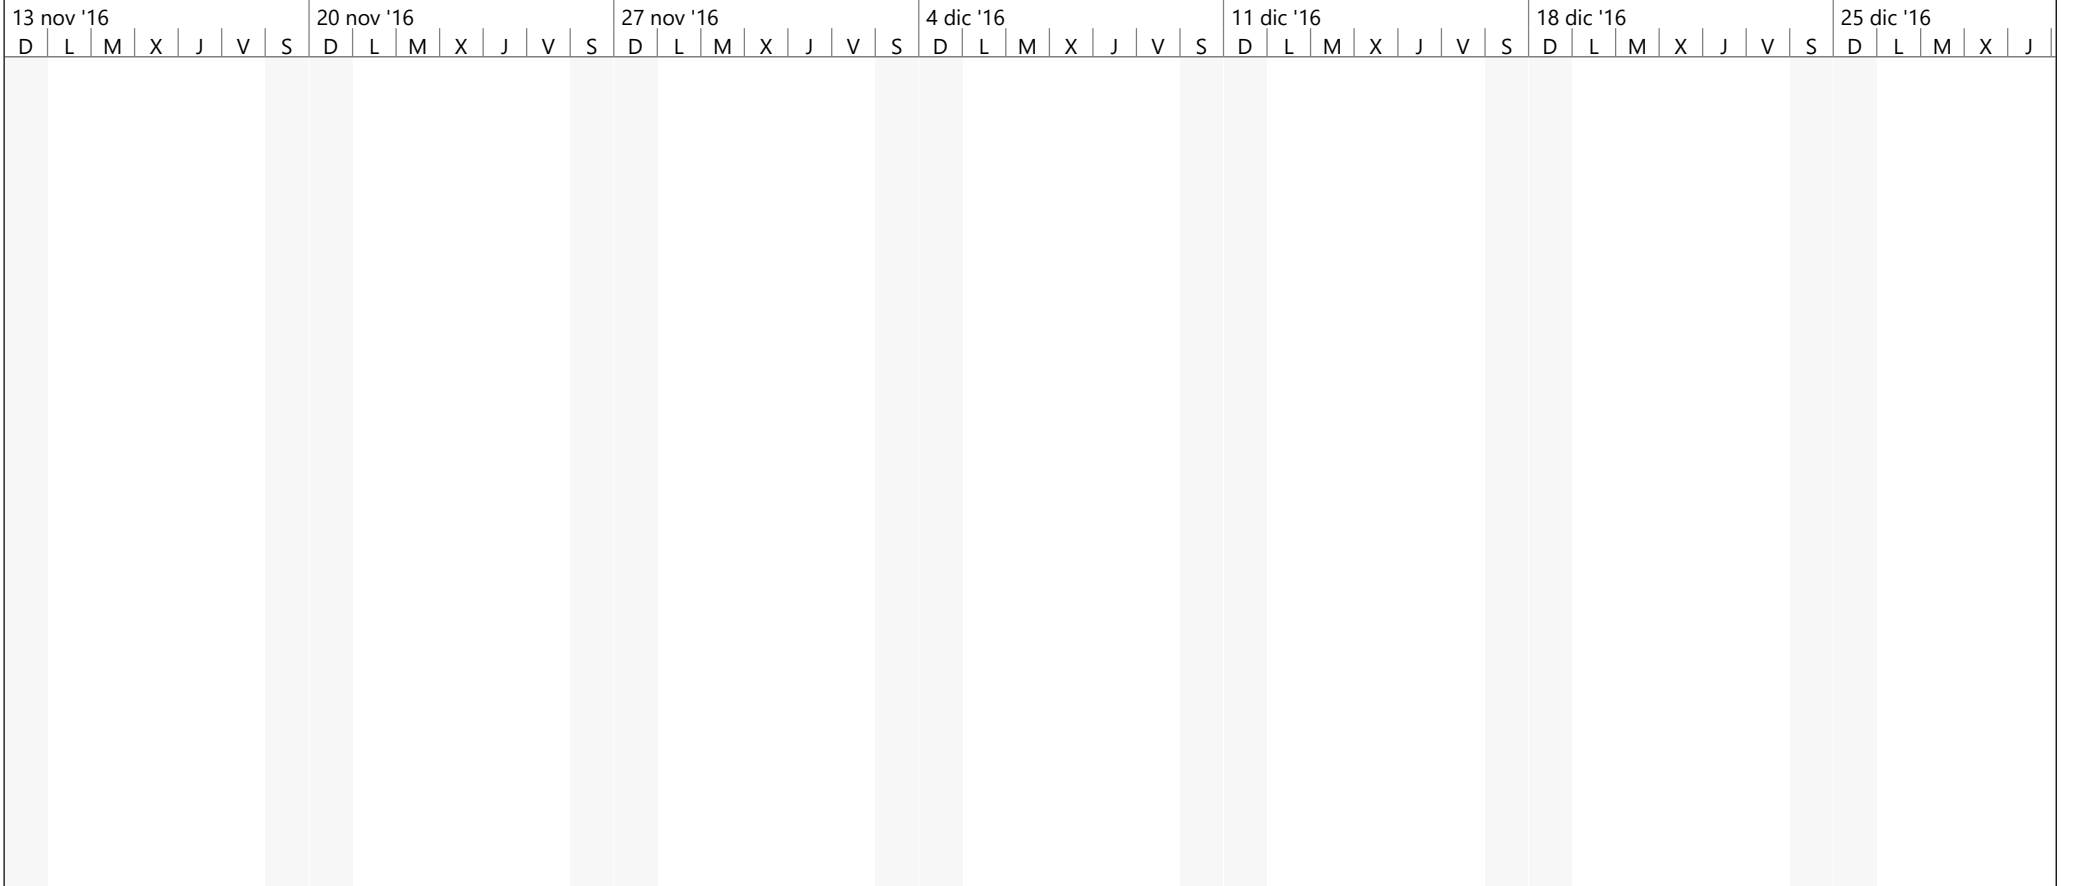

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

13 nov '16							20 nov '16							27 nov '16							4 dic '16							11 dic '16							18 dic '16							25 dic '16													
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018




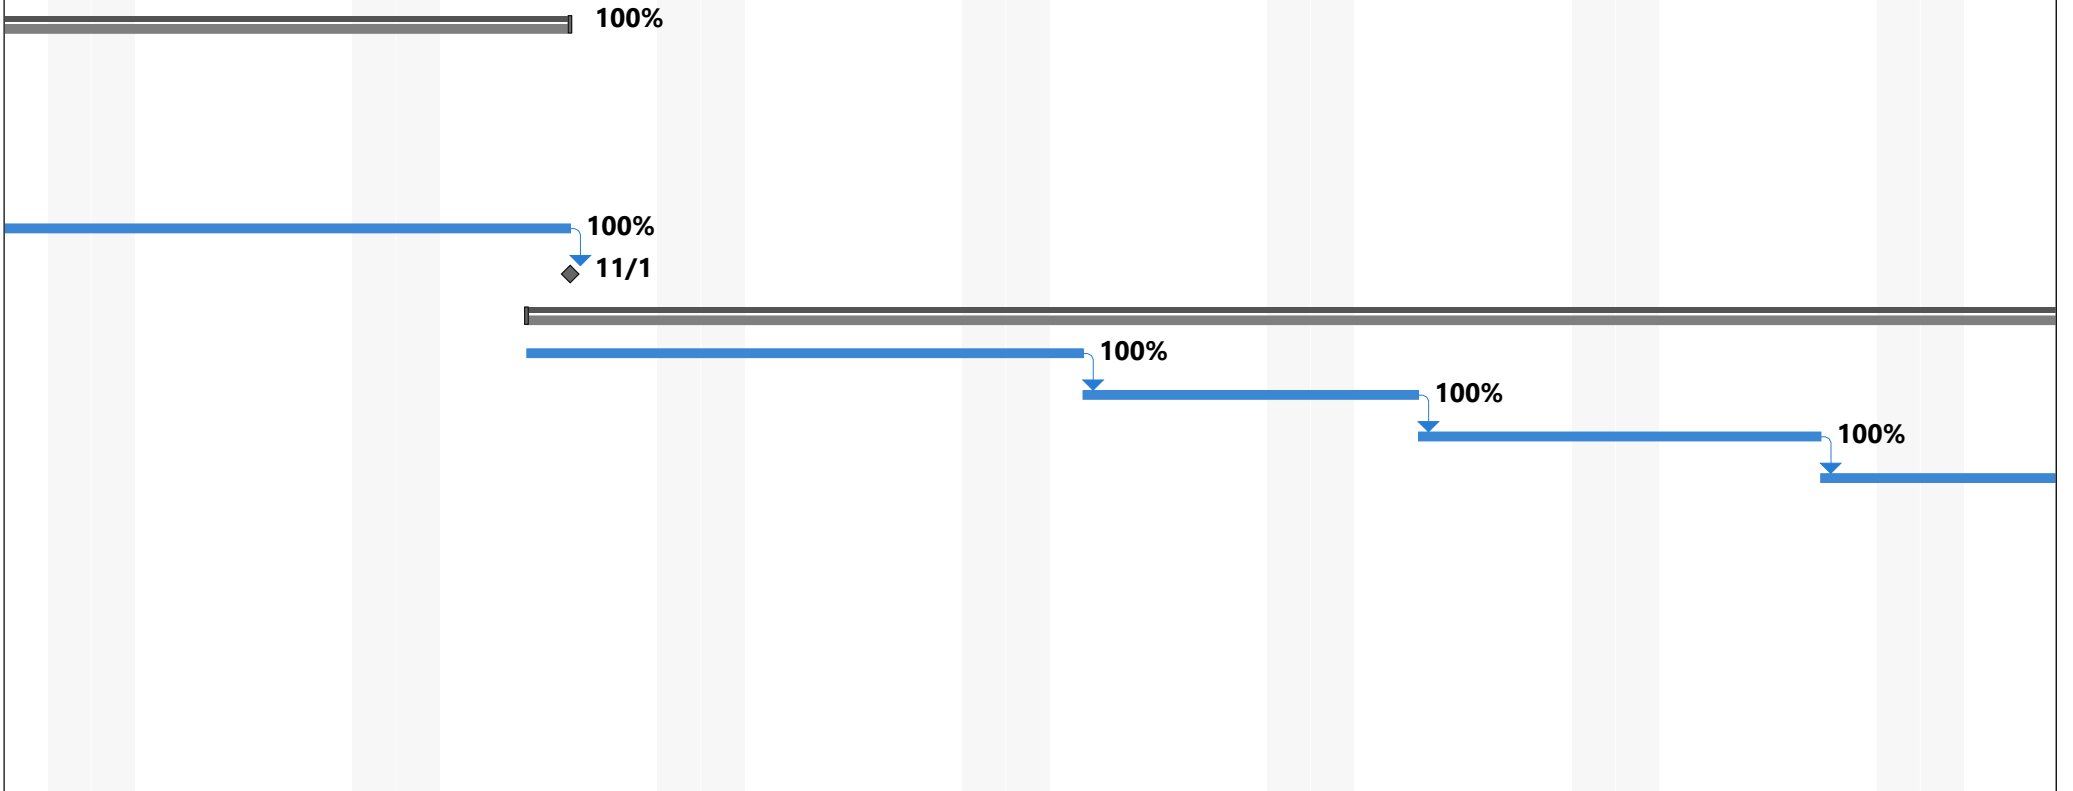





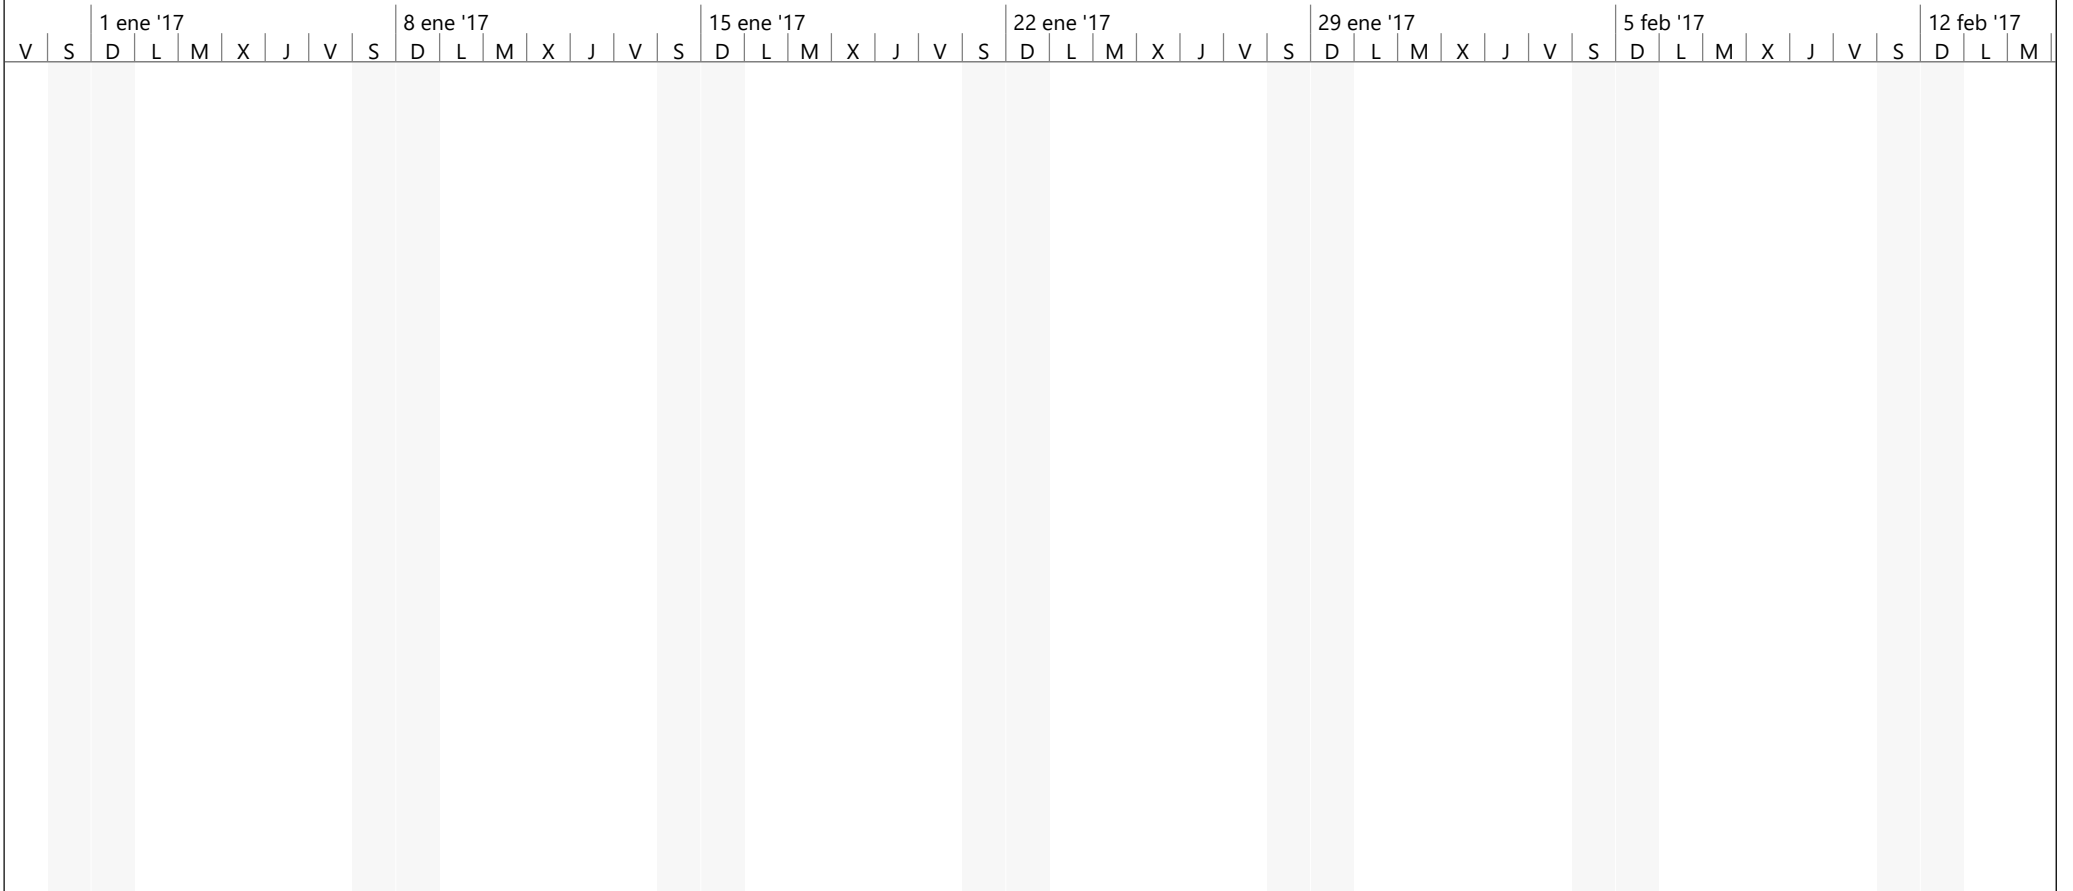














1 ene '17 8 ene '17 15 ene '17 22 ene '17 29 ene '17 5 feb '17 12 feb '17
 V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018


1 ene '17							8 ene '17							15 ene '17							22 ene '17							29 ene '17							5 feb '17							12 feb '17						
V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M									



<p>Tareas críticas</p> <p>División crítica</p> <p>Progreso de tarea crítica</p> <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Progreso de tarea</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo el comienzo</p>	<p>solo fin</p> <p>solo duración</p> <p>Línea base</p> <p>División de la línea base</p> <p>Hito de línea base</p> <p>Hito</p> <p>Progreso del resumen</p> <p>Resumen</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Resumen manual</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> <p>Resumen inactivo</p> <p>Fecha límite</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
---	--	---	---	---	---


Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

X J V S 19 feb '17 D L M X J V S 26 feb '17 D L M X J V S 5 mar '17 D L M X J V S 12 mar '17 D L M X J V S 19 mar '17 D L M X J V S 26 mar '17 D L M X J V S 2 ab D

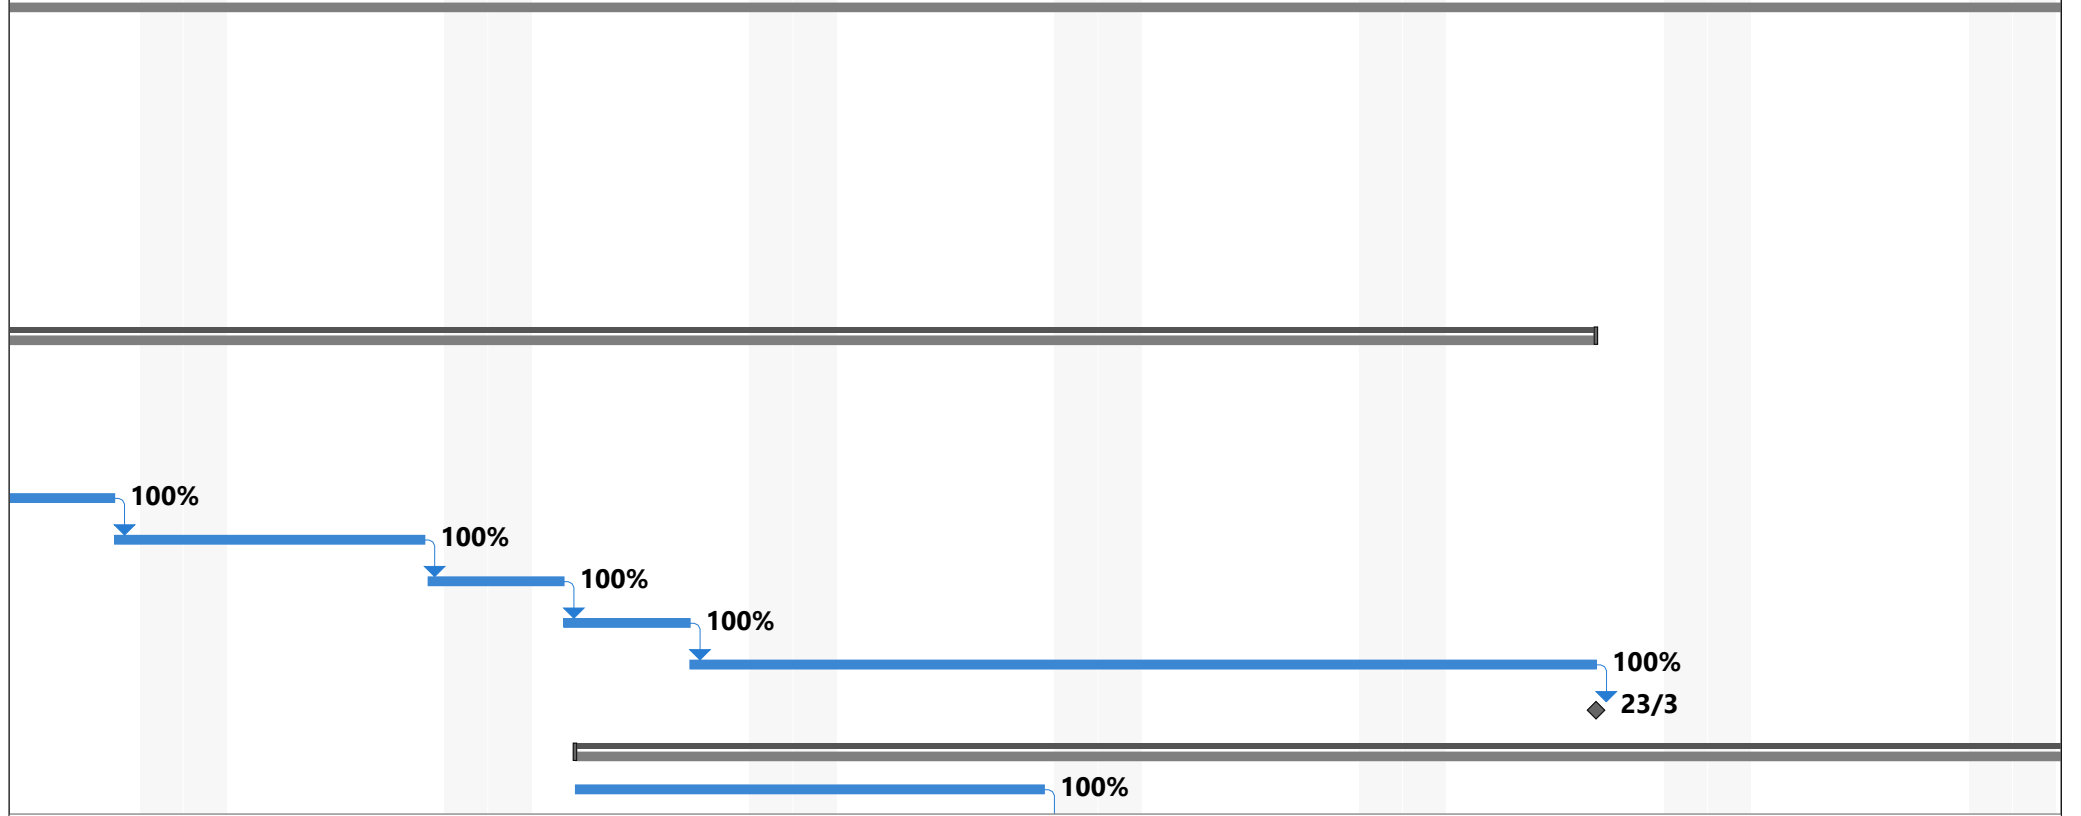

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

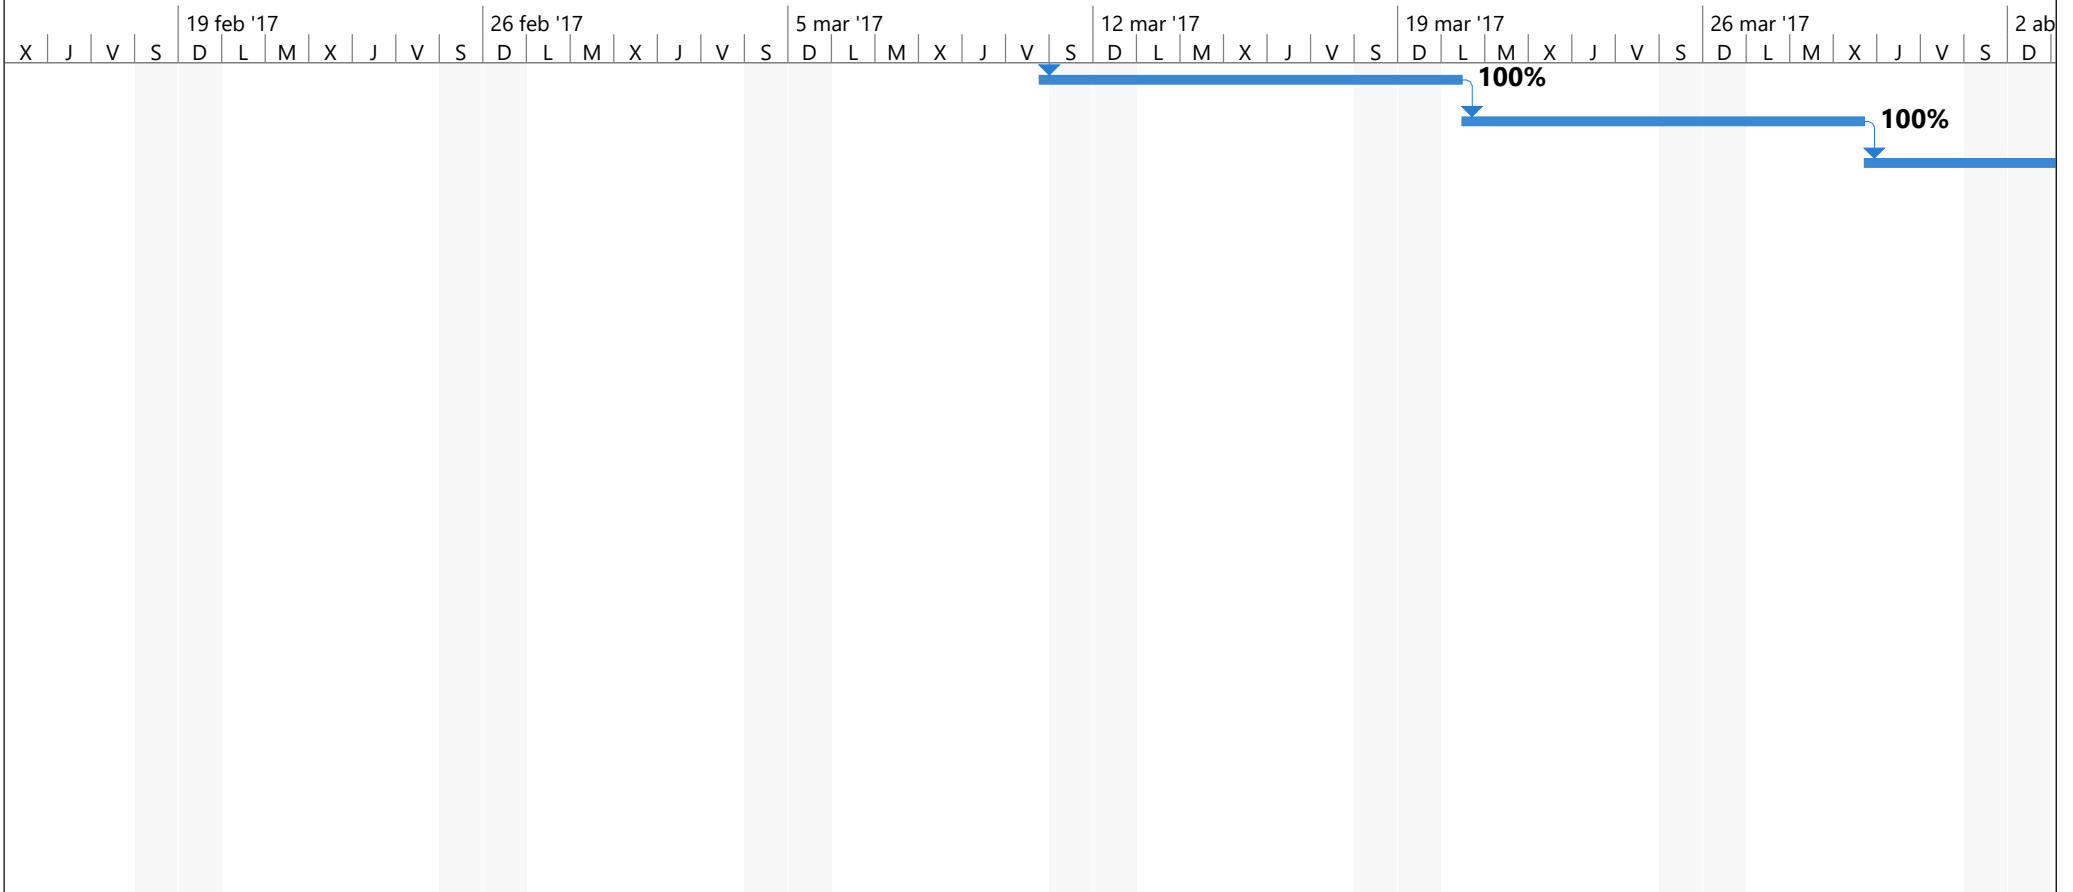

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

X	J	V	S	19 feb '17				26 feb '17				5 mar '17				12 mar '17				19 mar '17				26 mar '17				2 ab							
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

9 abr '17 | 16 abr '17 | 23 abr '17 | 30 abr '17 | 7 may '17 | 14 may '17
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

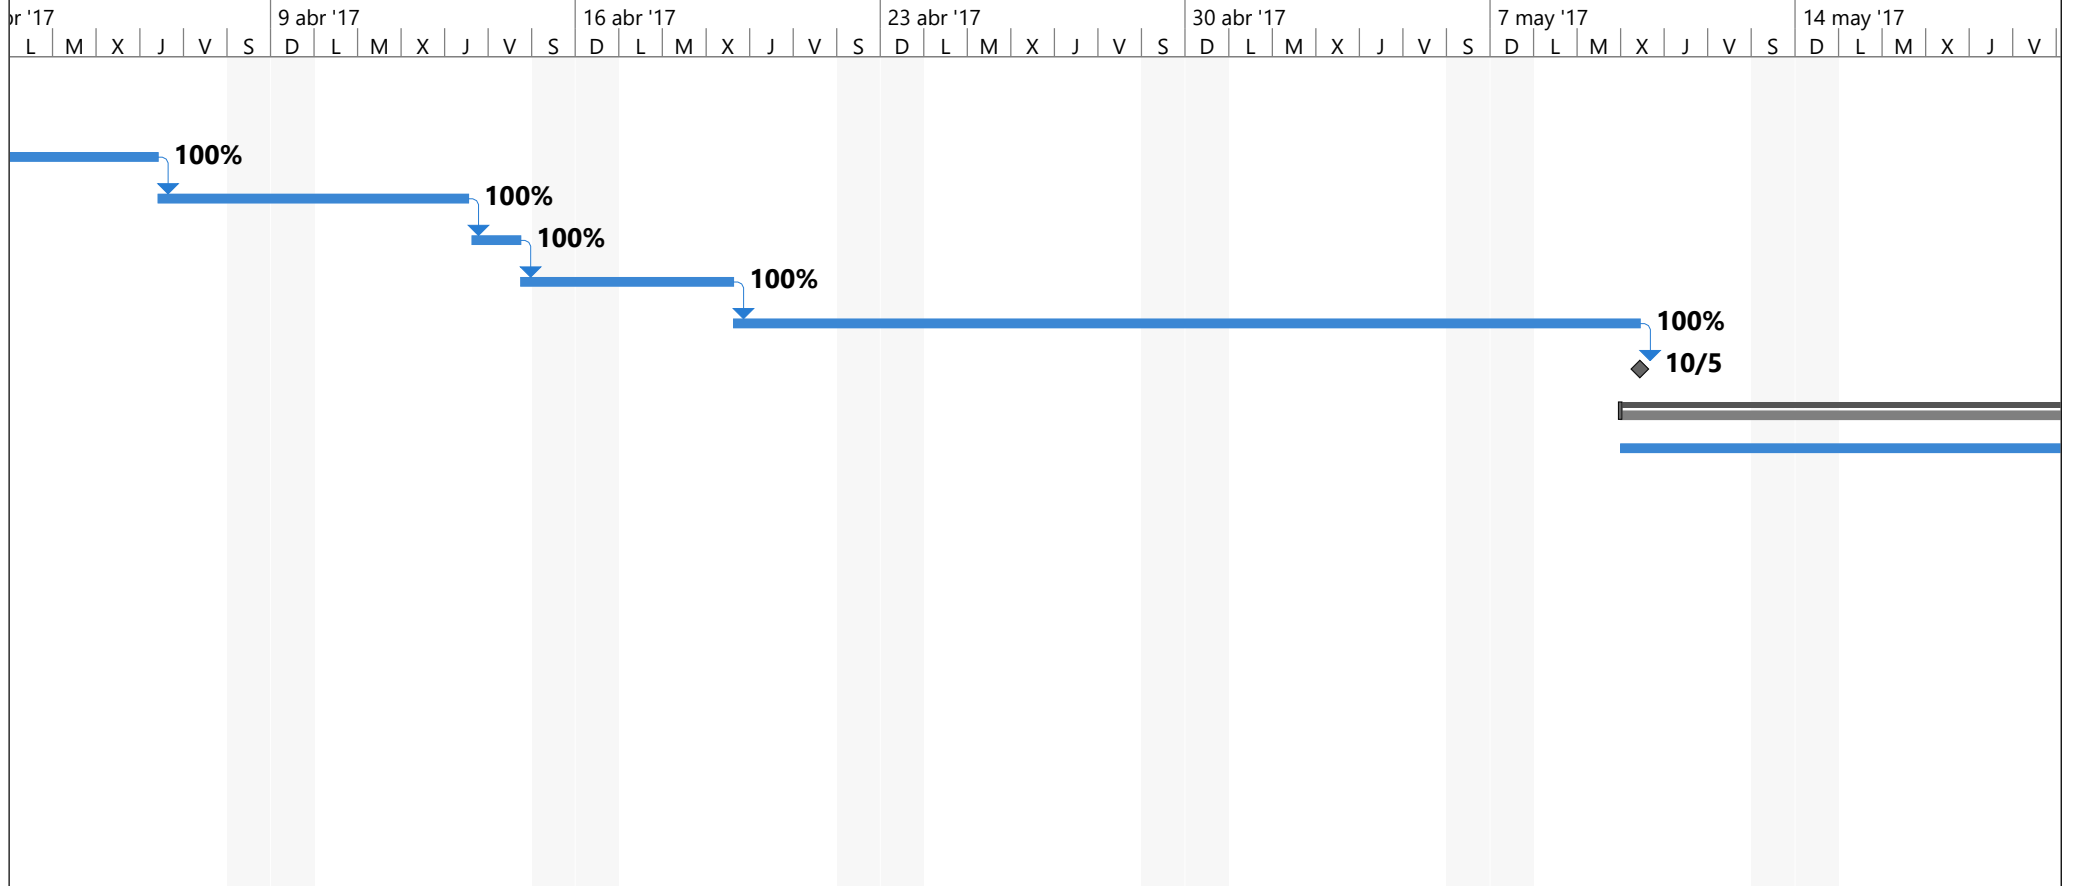

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

abr '17	9 abr '17							16 abr '17							23 abr '17							30 abr '17							7 may '17							14 may '17											
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

21 may '17							28 may '17							4 jun '17							11 jun '17							18 jun '17							25 jun '17							2 jul '17				
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

21 may '17							28 may '17							4 jun '17							11 jun '17							18 jun '17							25 jun '17							2 jul '17				
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

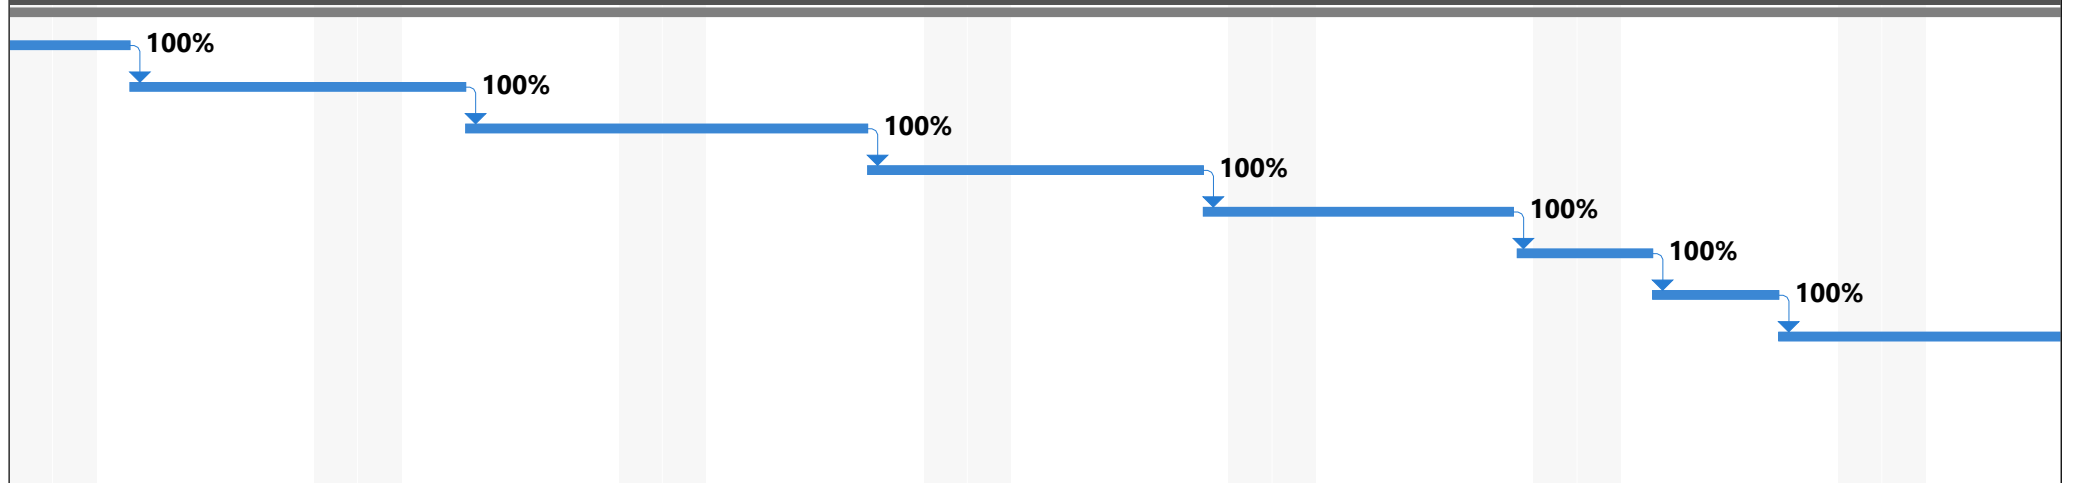

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecución NIBA112 Agosto 2018

21 may '17							28 may '17							4 jun '17							11 jun '17							18 jun '17							25 jun '17							2 jul '17				
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

J | V | S | 9 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 16 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 23 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 30 jul '17 | D | L | M | X | J | V | S | 6 ago '17 | D | L | M | X | J | V | S | 13 ago '17 | D | L | M | X | J | V | S | 20 ago '17 | D | L | M | X | J | V | S

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

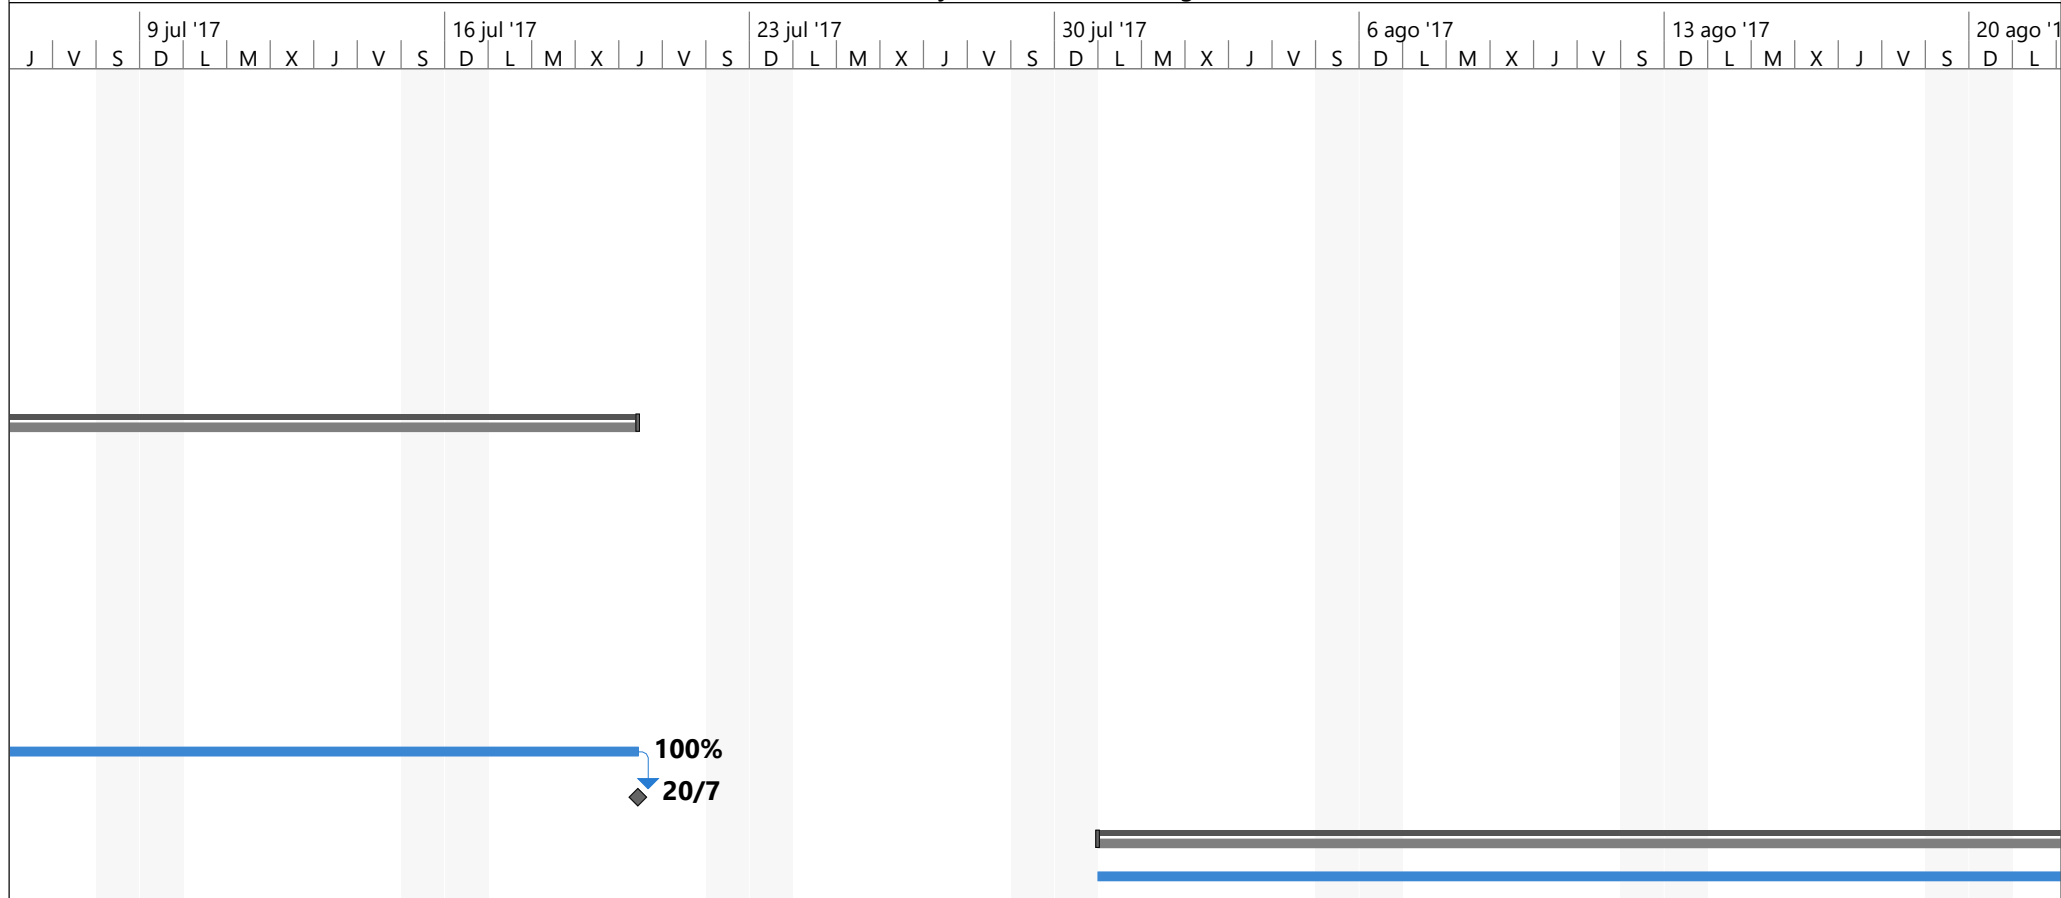


Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

9 jul '17			16 jul '17			23 jul '17			30 jul '17			6 ago '17			13 ago '17			20 ago '17																										
J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

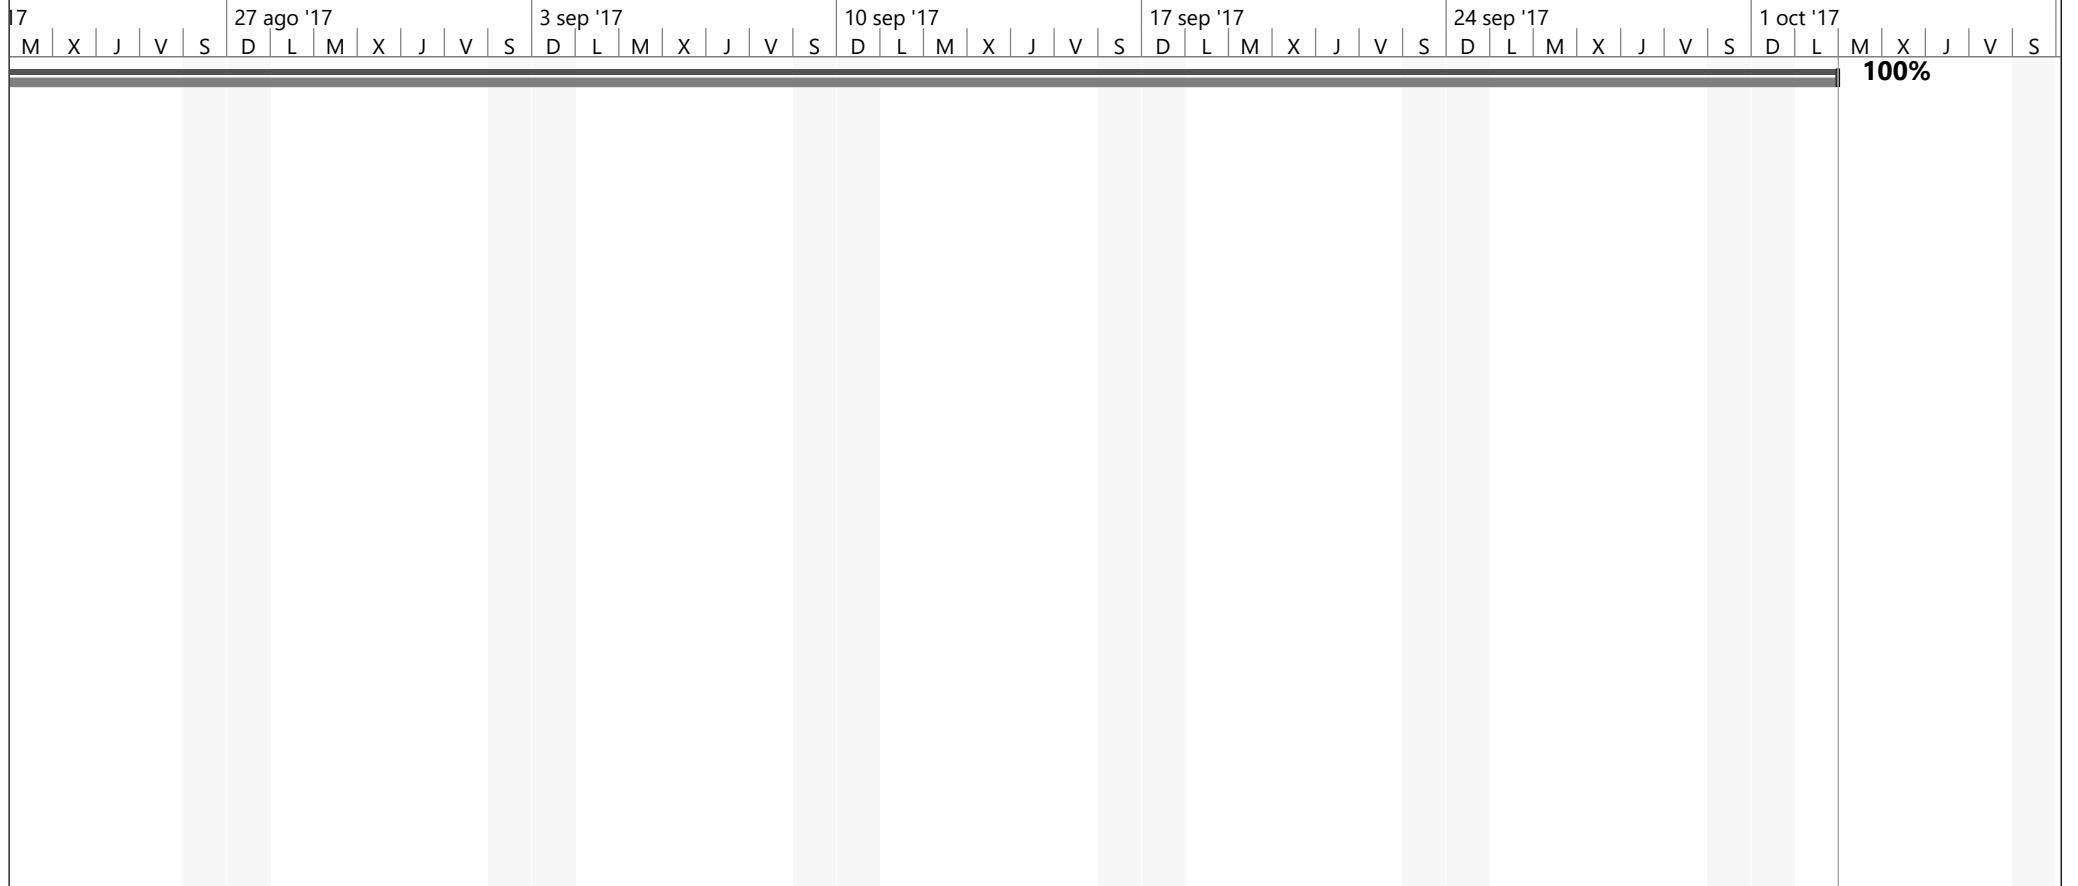

100%


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018

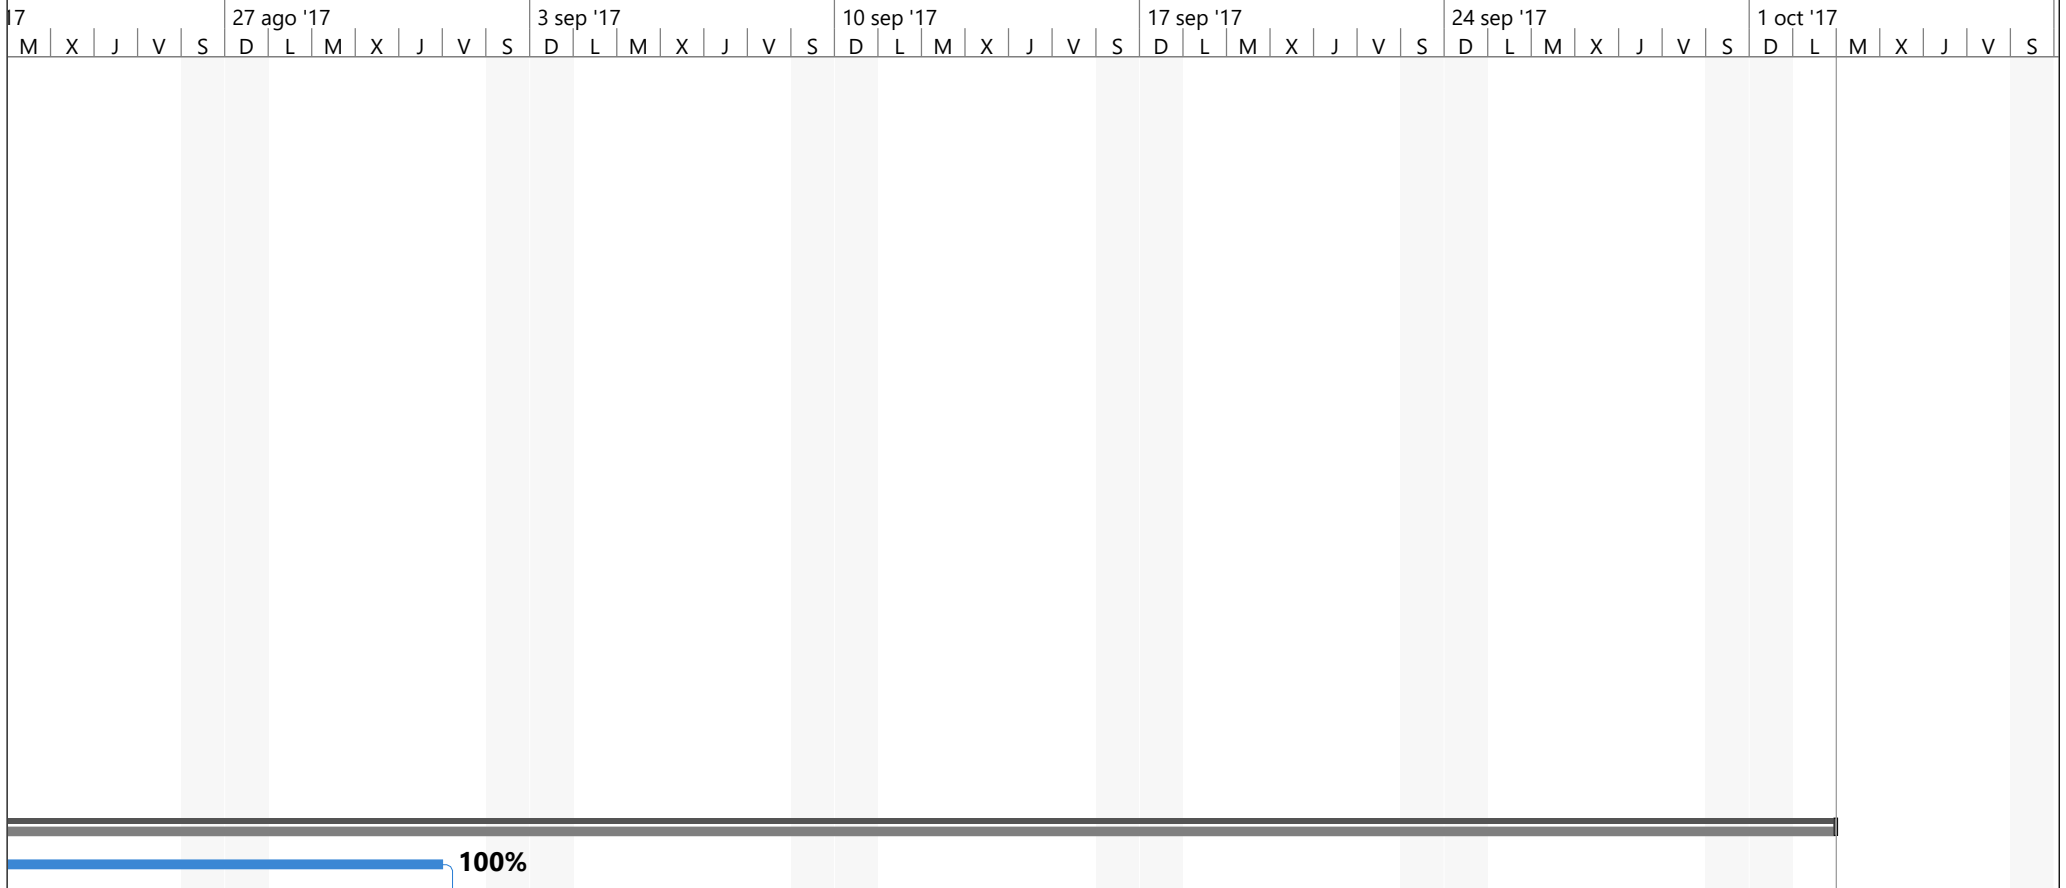

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Calendario de ejecucion NIBA112 Agosto 2018



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
