

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	2 abr '18							9 abr '18					
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
1		Rehabilitación de Redes CHIVO105	272.5 días	jue 15/11/18	jue 31/10/19															
2		Adjudicación	0 días	lun 1/10/18	lun 1/10/18															
3		Periodo de Adquisiciones	80 días	jue 15/11/18	jue 28/2/19	2														
28		Ejecución	242.5 días	lun 10/12/18	vie 18/10/19	2														
29		Polígono 1	145.88 días	lun 10/12/18	mar 18/6/19	2														
30		Instalación	135 días	lun 10/12/18	mié 5/6/19															
31		Izado de postes	14 días	lun 10/12/18	vie 28/12/18	3CC+1 ms	Grua 1;Grua 2;Grua 3;C													
32		Cimentaciones	12 días	mié 12/12/18	vie 28/12/18	31CC+2 días	Brigada Cimentacion Re													
33		Retenidas	6 días	jue 28/2/19	vie 29/3/19	27	Brigada Ligera Redes 1;													
34		Armados de Media y Baja Tensión	17 días	jue 28/2/19	jue 21/3/19	27	Canasto Redes 1;Canasto Redes													
35		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	22 días	lun 4/3/19	mar 2/4/19	34CC+2 días	Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes													
36		Elementos de Protección y Maniobra	10 días	jue 7/3/19	mié 5/6/19	35CC+4 días	Canasto Redes 1;Canasto Redes 2													

Proyecto: Cronograma NAGU10
Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	2 abr '18							9 abr '18			
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
49		Polígono 2	175.5 días	vie 28/12/18	mar 13/8/19													
50		Instalación	175.5 días	vie 28/12/18	mar 13/8/19													
51		lizado de postes	20 días	vie 28/12/18	jue 24/1/19	31	Grua 1;Grua 2;Grua 3;C											
52		Cimentaciones	19 días	mié 2/1/19	vie 25/1/19	32;51CC+2 días	Brigada Cimentacion Re											
53		Retenidas	9 días	vie 29/3/19	mié 10/4/19	33	Brigada Ligera Redes 1;											
54		Armados de Media y Baja Tensión	18 días	jue 21/3/19	vie 12/4/19	27;34;51CC+5 días	Canasto Redes 7;Canasto Redes											
55		Tendido de Conductor Media y Baja Tensión	11 días	vie 29/3/19	vie 12/4/19	54CC+7 días	Canasto Redes 7;Canasto Redes											
56		Elementos de Protección y Maniobra	14.75 días	mié 17/4/19	mié 5/6/19	55CC+5 días;39	Canasto Redes 4;Canasto Redes 5											
57		Conexiones y Jumpers	11 días	lun 22/4/19	vie 24/5/19	55CC+5 días	Canasto Redes 6;Canas											
58		Transformadores	13 días	mar 2/4/19	jue 18/4/19	55CC+2 días	Grua TR1;Grua TR2											
59		Alumbrado Publico	16 días	lun 13/5/19	lun 10/6/19	58CC	Canasto Redes 5;Canas											
60		Normalización Suministros	70 días	jue 16/5/19	mar 13/8/19	40;59CC+4 días	Canasto Normalización 1;Canasto											

Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	2 abr '18							9 abr '18				
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	
61		Remoción	71.63 días	lun 15/4/19	mié 17/7/19														
62		Tendido de Conductor Media Tensión	6 días	lun 15/4/19	mar 23/4/19	55CC+10 días	Canasto Redes 1;Canasto Redes												
63		Tendido de Conductor Baja Tensión	13 días	mar 4/6/19	vie 21/6/19	60CC+15 días	Brigada Ligera Redes 1;Brigada Ligera Redes												
64		Armados de Media Tensión	12 días	vie 21/6/19	lun 8/7/19	62CC+3 días	Canasto Redes 1;Canasto Redes 2												
65		Armados de Baja Tensión	8 días	mié 19/6/19	lun 1/7/19	63CC+12 días	Canasto Redes 2;Canasto Redes 8												
66		Transformadores	5 días	jue 4/7/19	mié 10/7/19	63CC+23 días	Grua TR1;Grua TR2;Car												
67		Izado de postes	13 días	lun 1/7/19	mié 17/7/19	66CC-3 días	Grua 1;Grua 2;Grua 3												
68		Cierre de Polígono 2	0 días	mié 17/7/19	mié 17/7/19	67													
69		Polígono 3	208.5 días	jue 24/1/19	vie 18/10/19														
70		Instalación	198.5 días	jue 24/1/19	lun 7/10/19														
71		Izado de postes	14 días	jue 24/1/19	mar 12/2/19	51	Grua 1;Grua 2;Grua 3;C												
72		Cimentaciones	10 días	jue 7/2/19	mié 20/2/19	52;71CC+10 días	Brigada Cimentacion Re												
73		Retenidas	7 días	mié 10/4/19	jue 18/4/19	53	Brigada Ligera Redes 1;												

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	2 abr '18							9 abr '18					
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
86		Transformadores	9 días	jue 26/9/19	lun 7/10/19	83CC+11 días	Grua TR1;Grua TR2;Car													
87		Izado de postes	14 días	mié 2/10/19	vie 18/10/19	86CC+5 días	Grua 1;Grua 2;Grua 3													
88		Cierre de Polígono 3	0 días	vie 18/10/19	vie 18/10/19	87														
89		Cierre de Obras	20 días	mar 8/10/19	jue 31/10/19	70														

Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

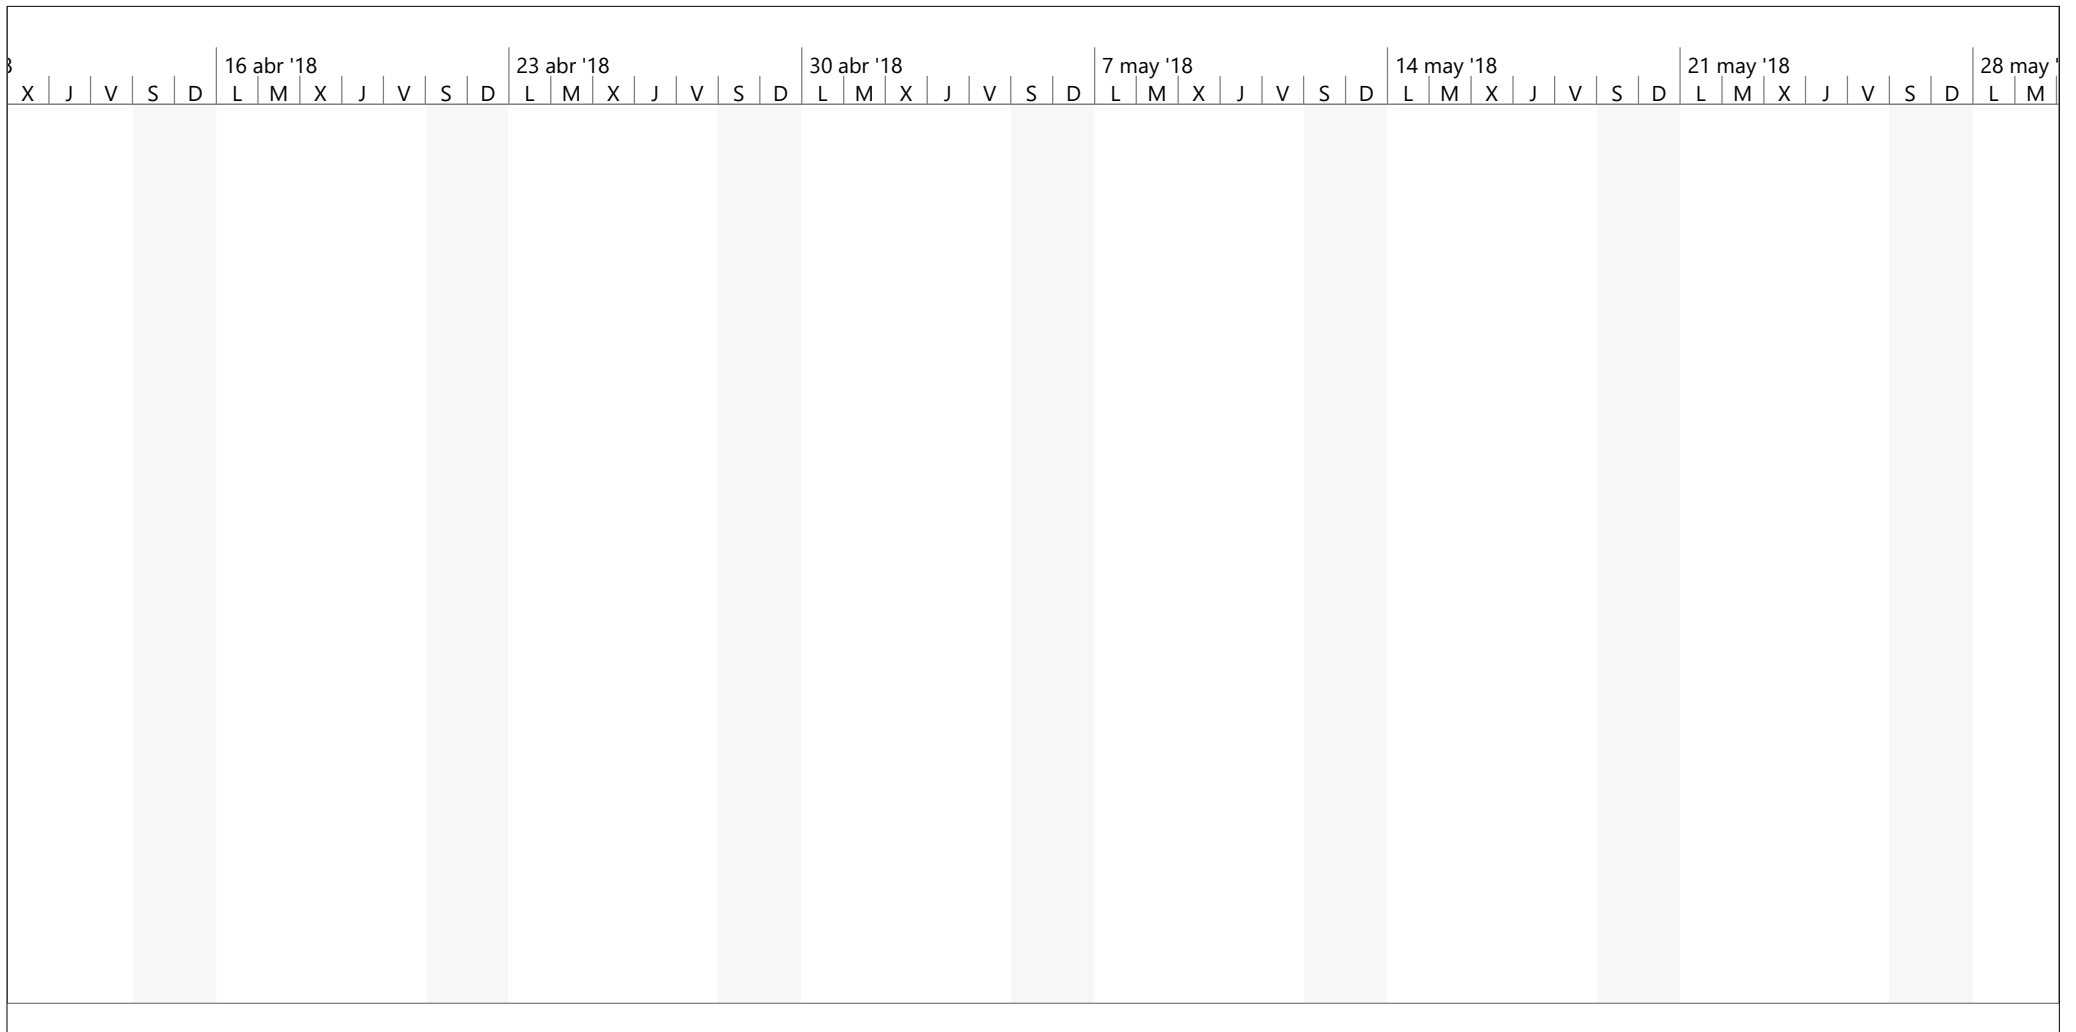


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

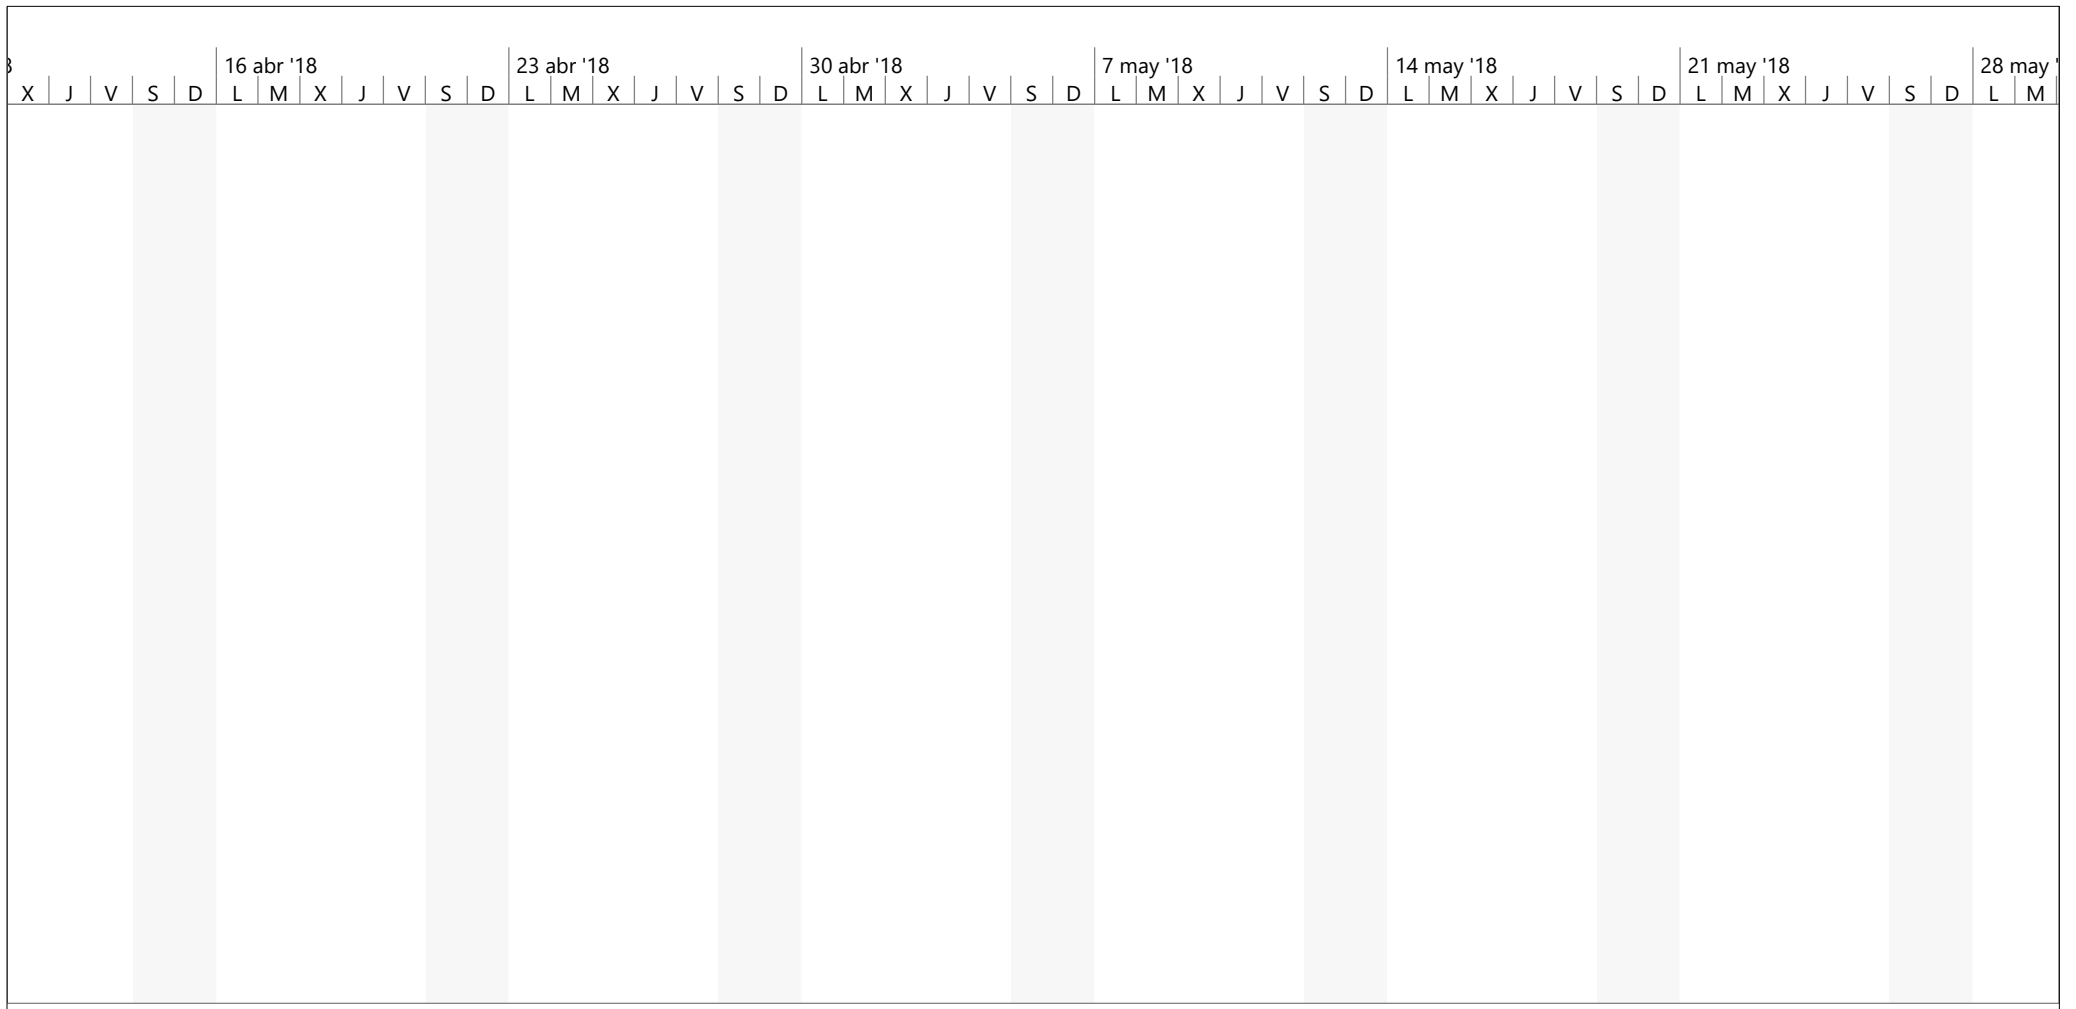

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

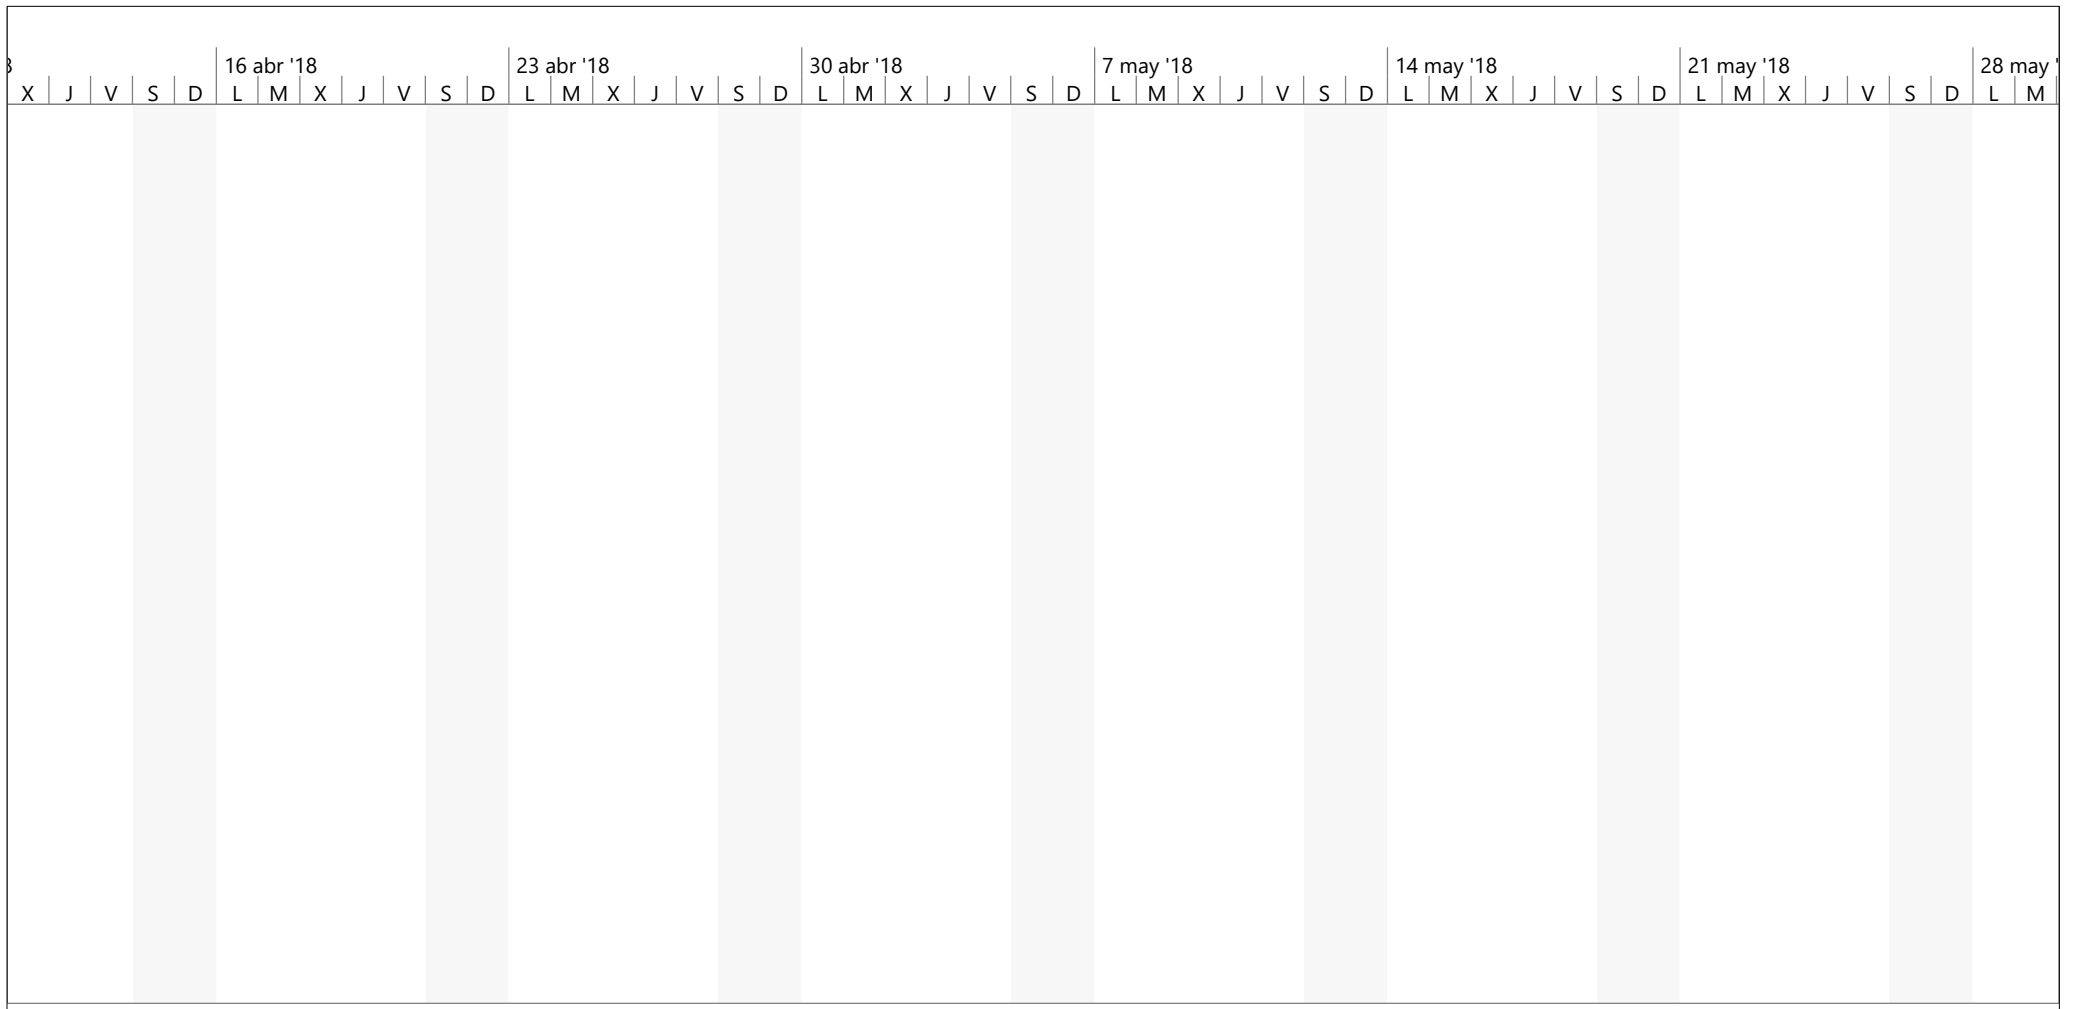


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

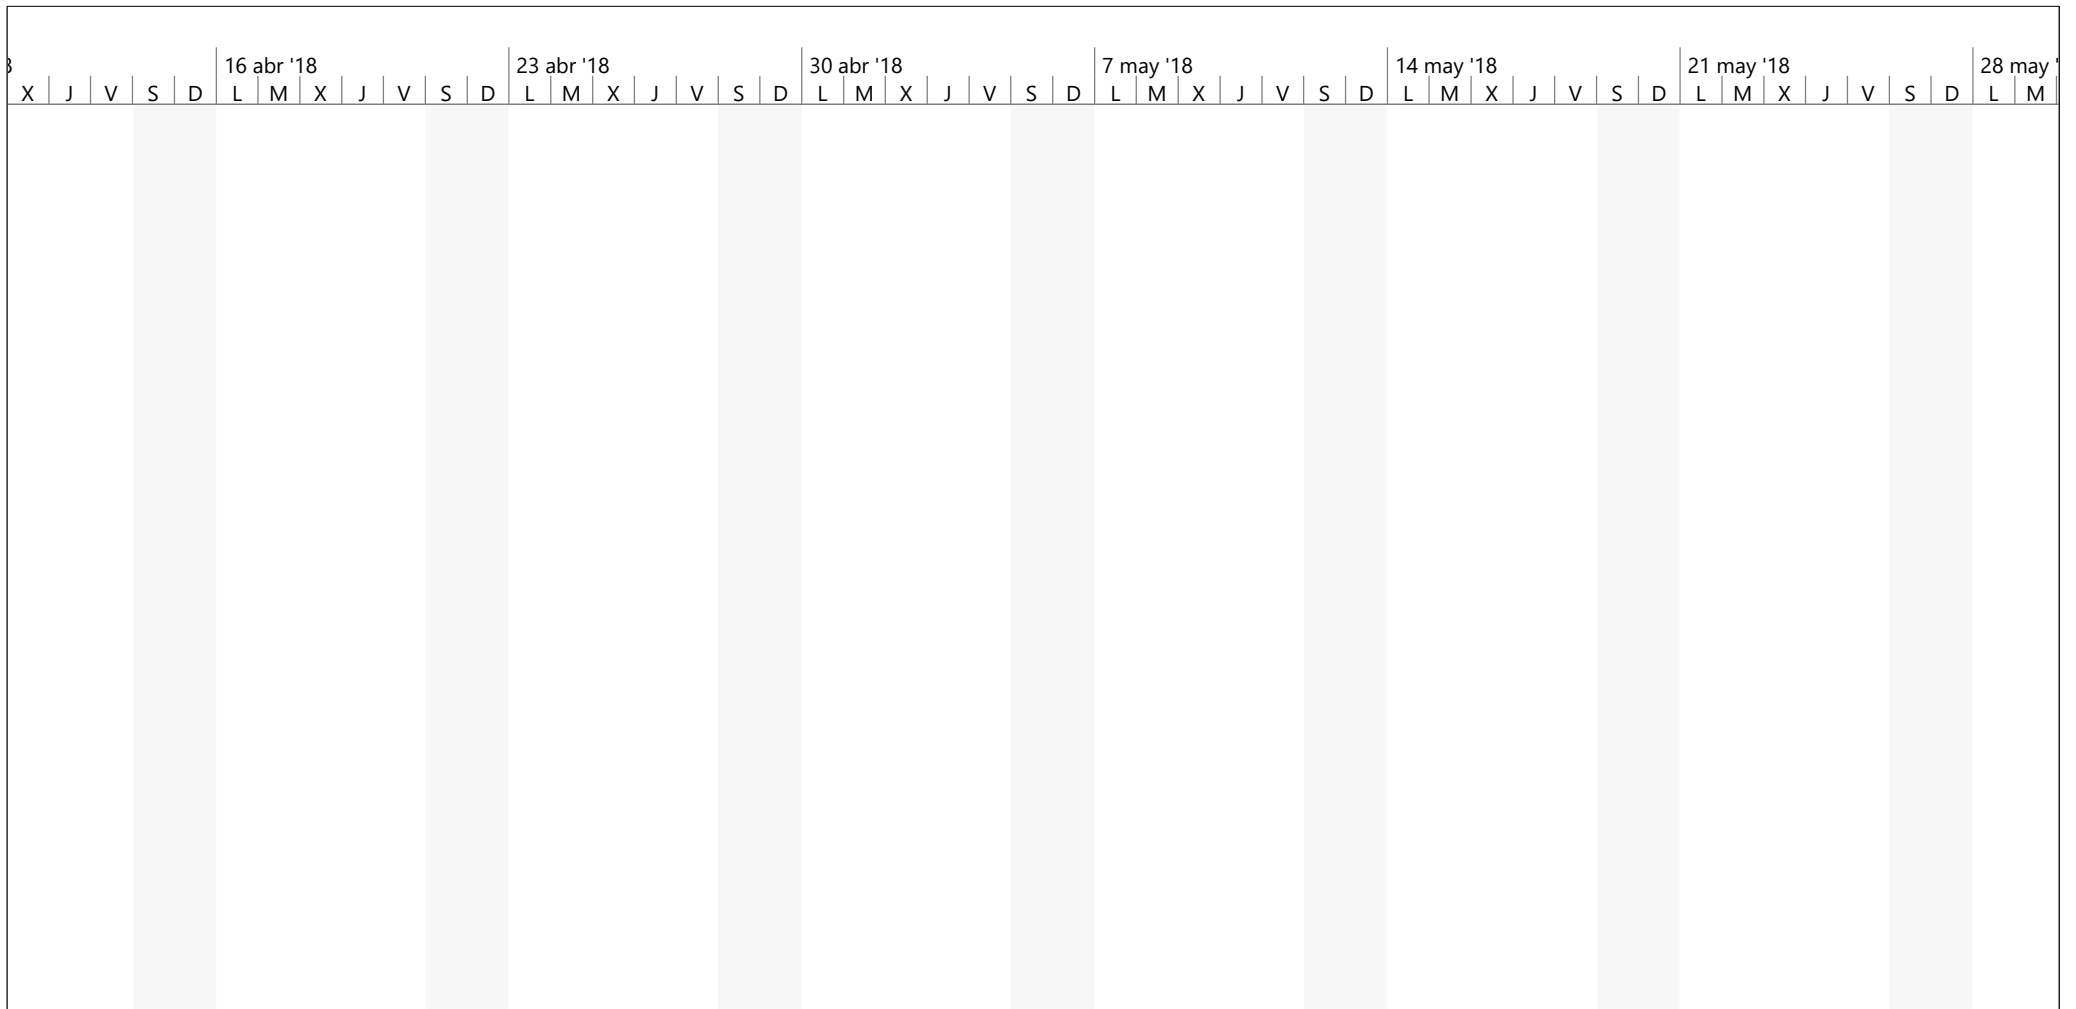


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

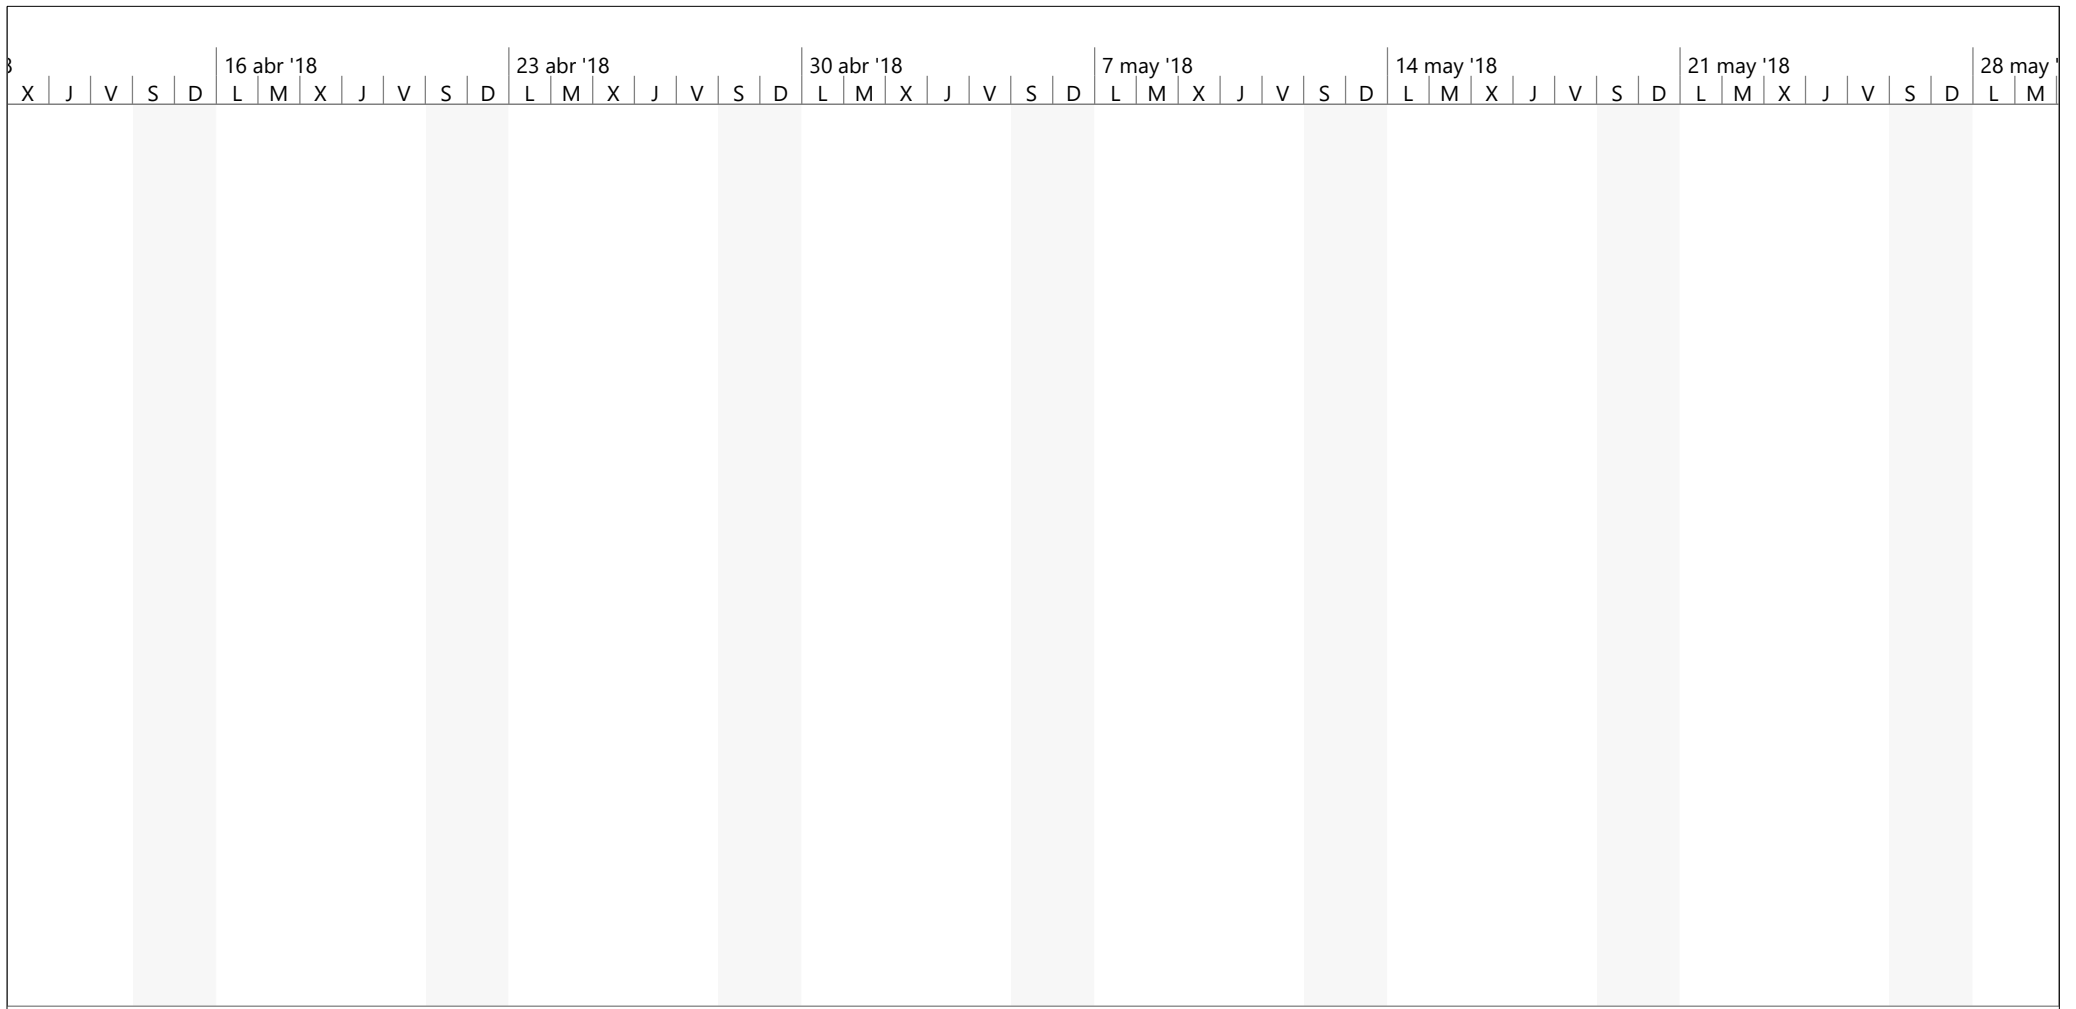


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

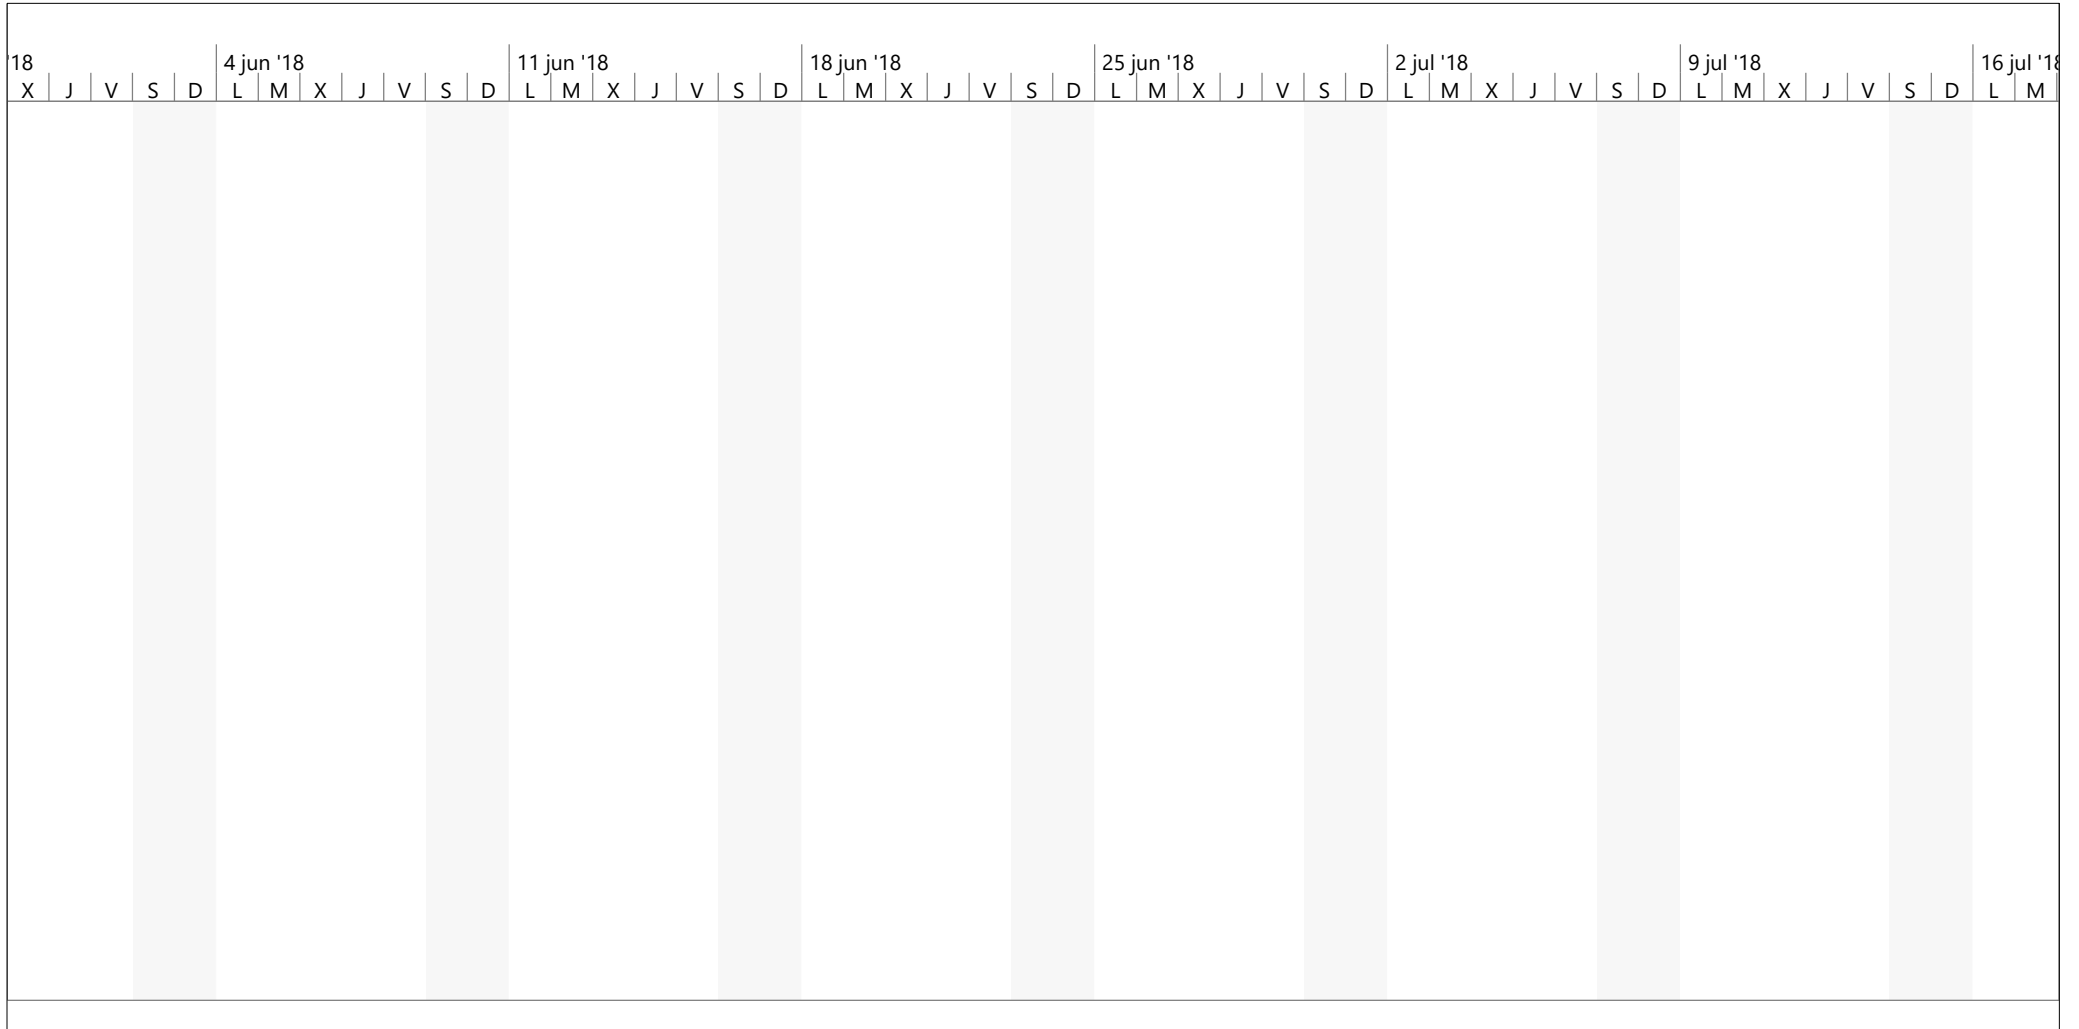


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

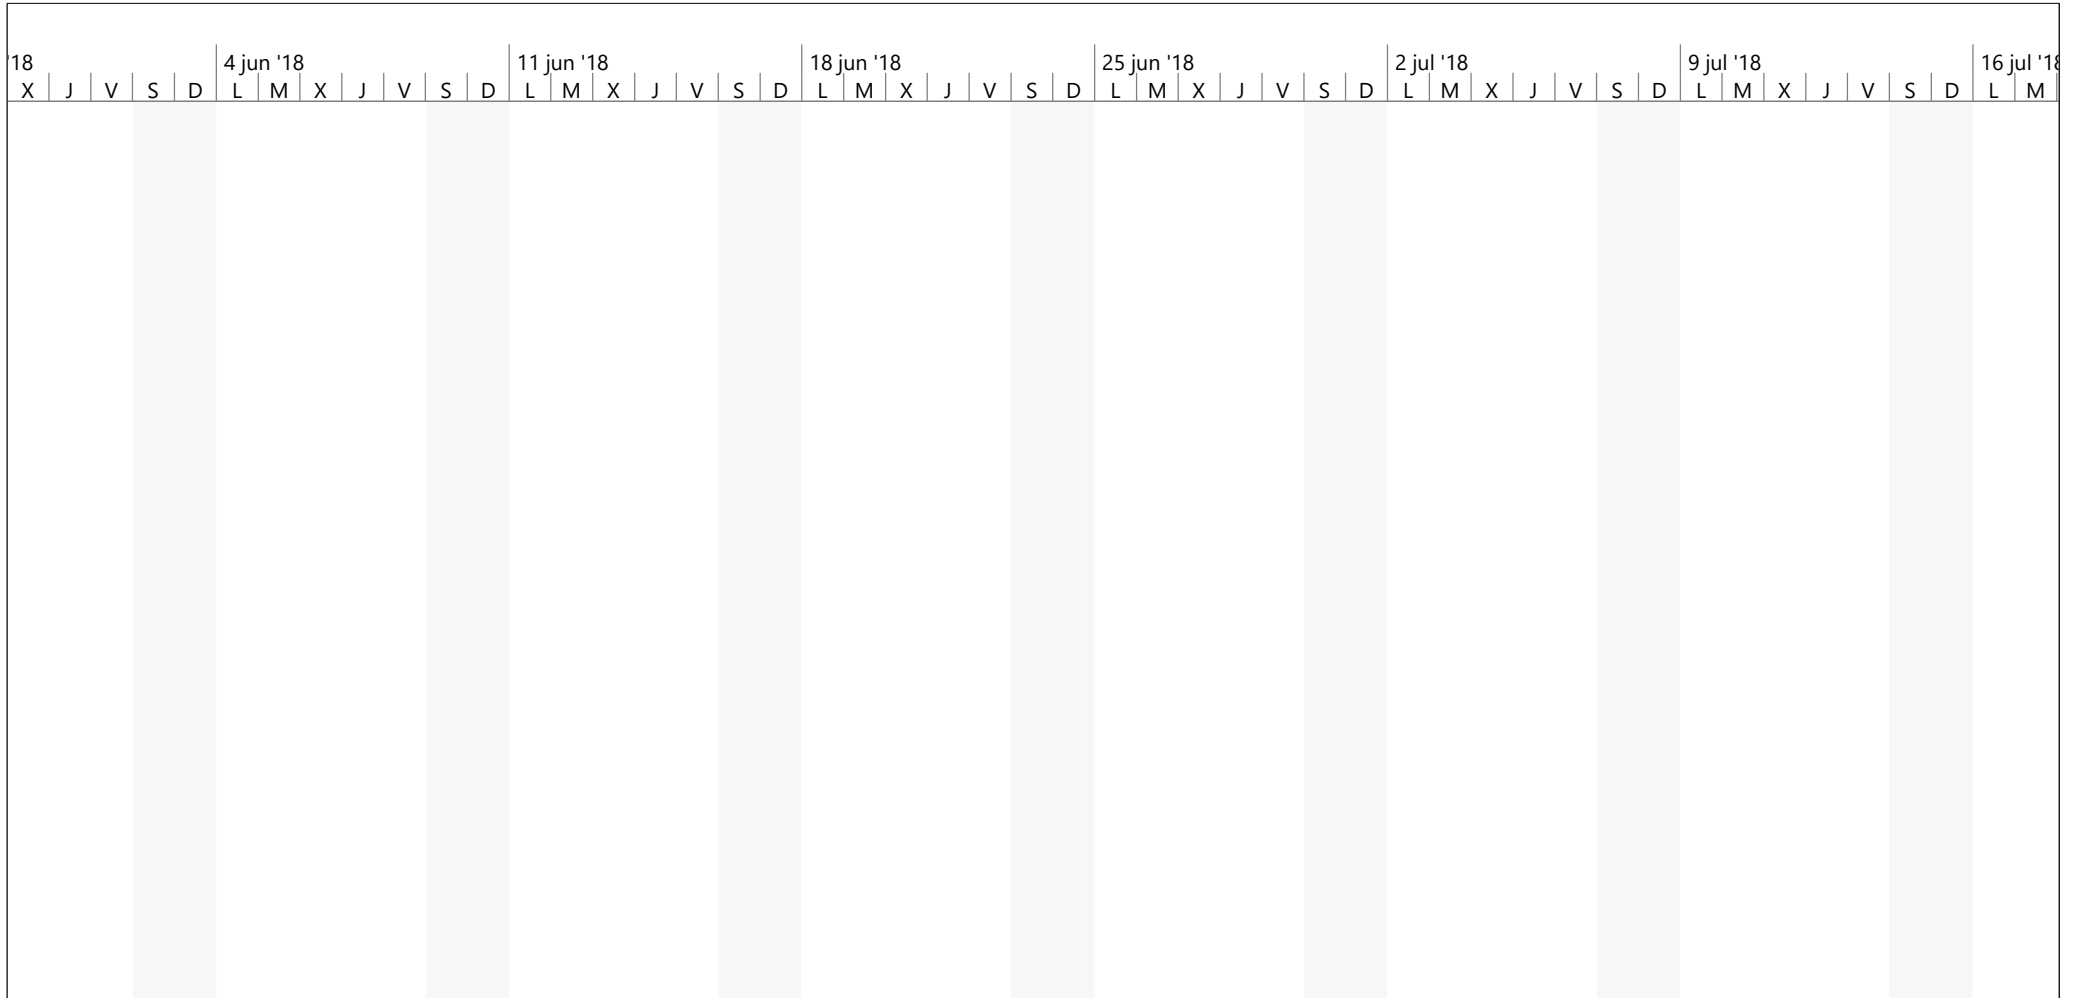


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

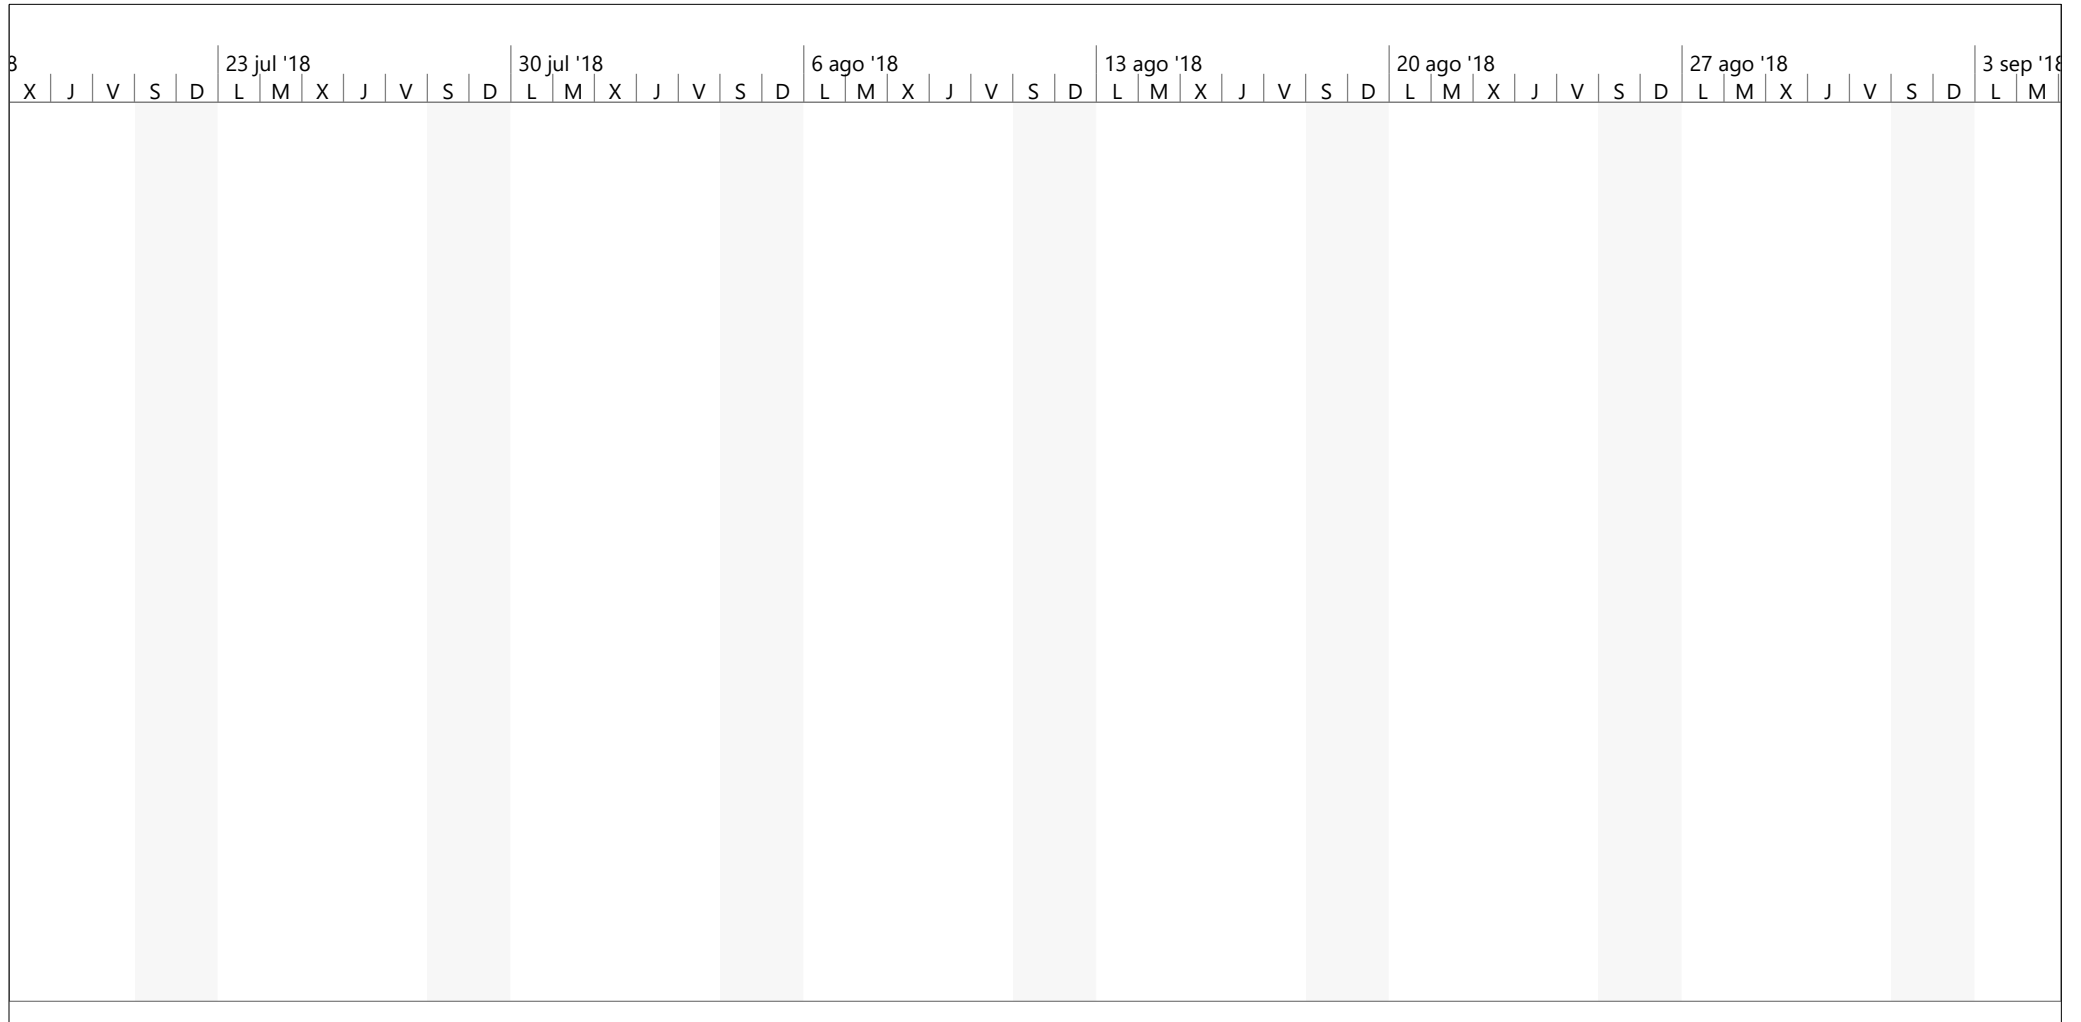

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

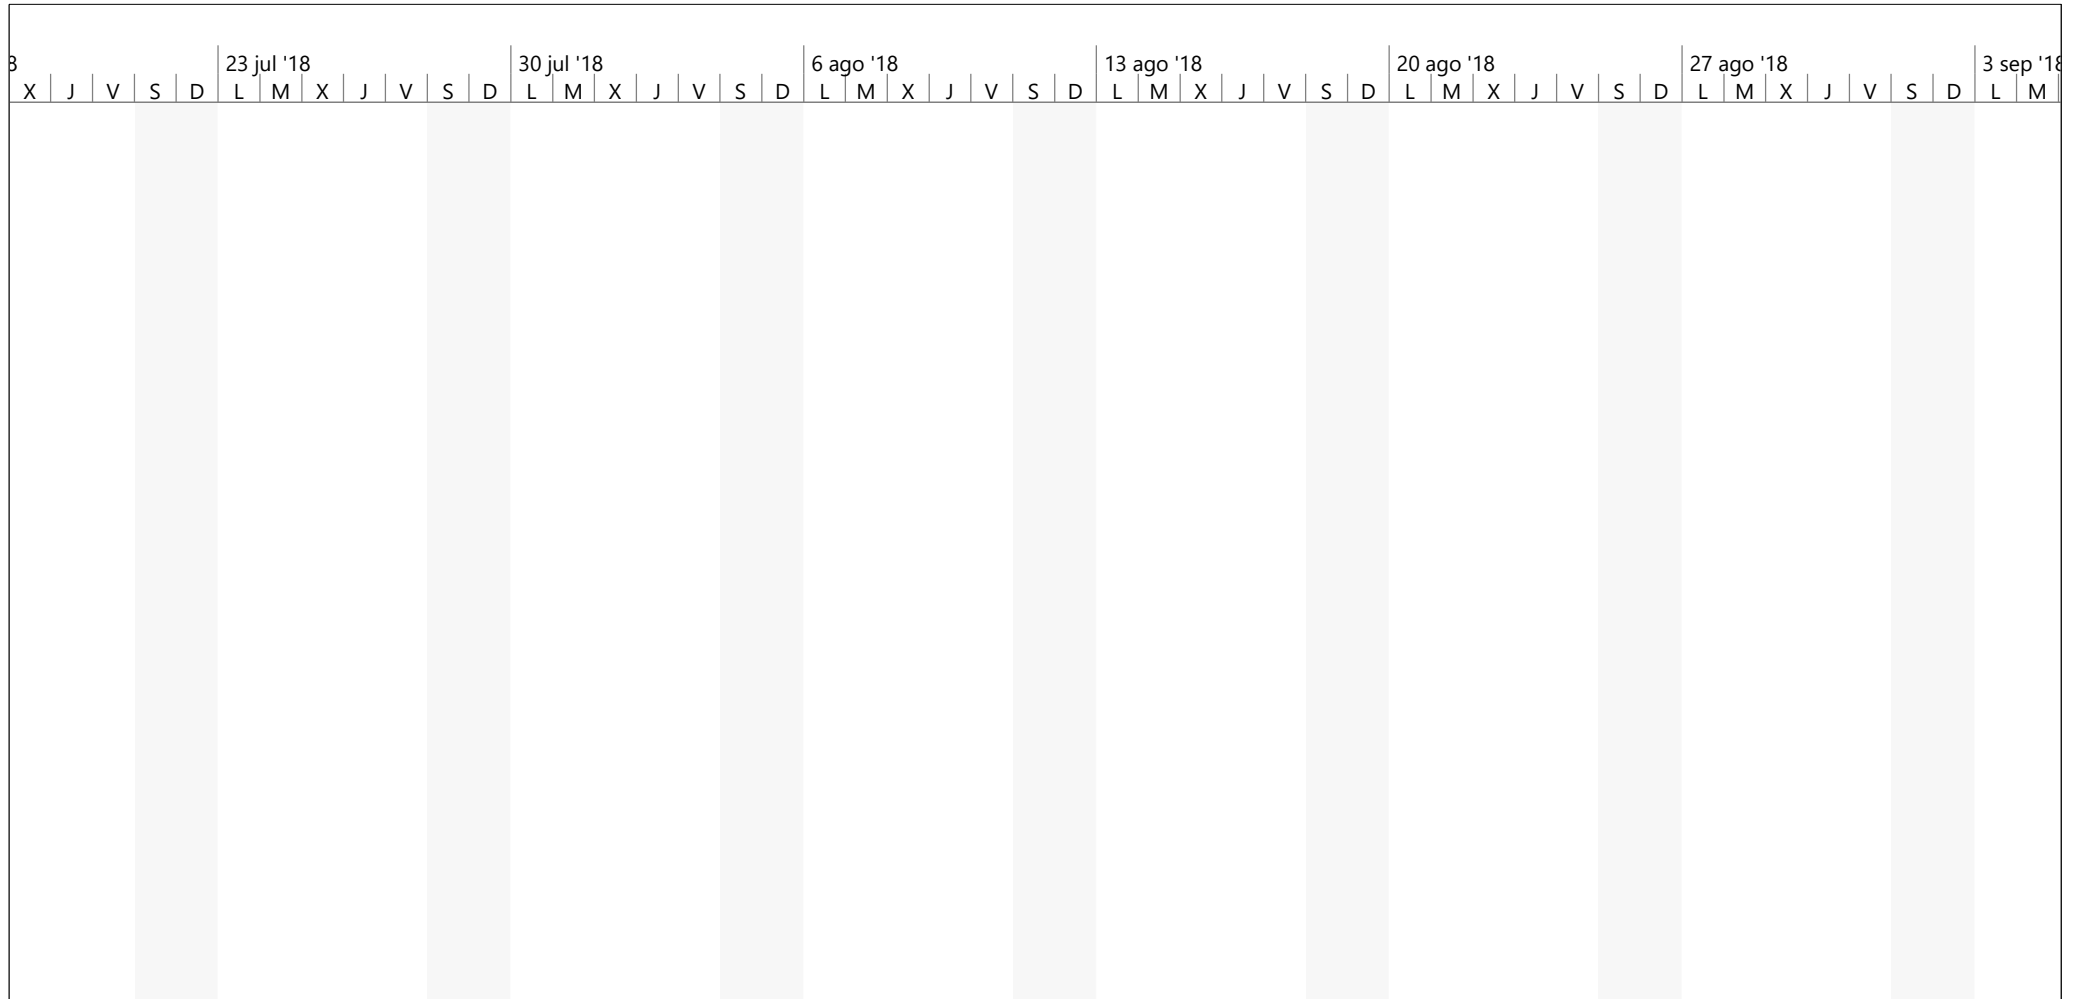


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

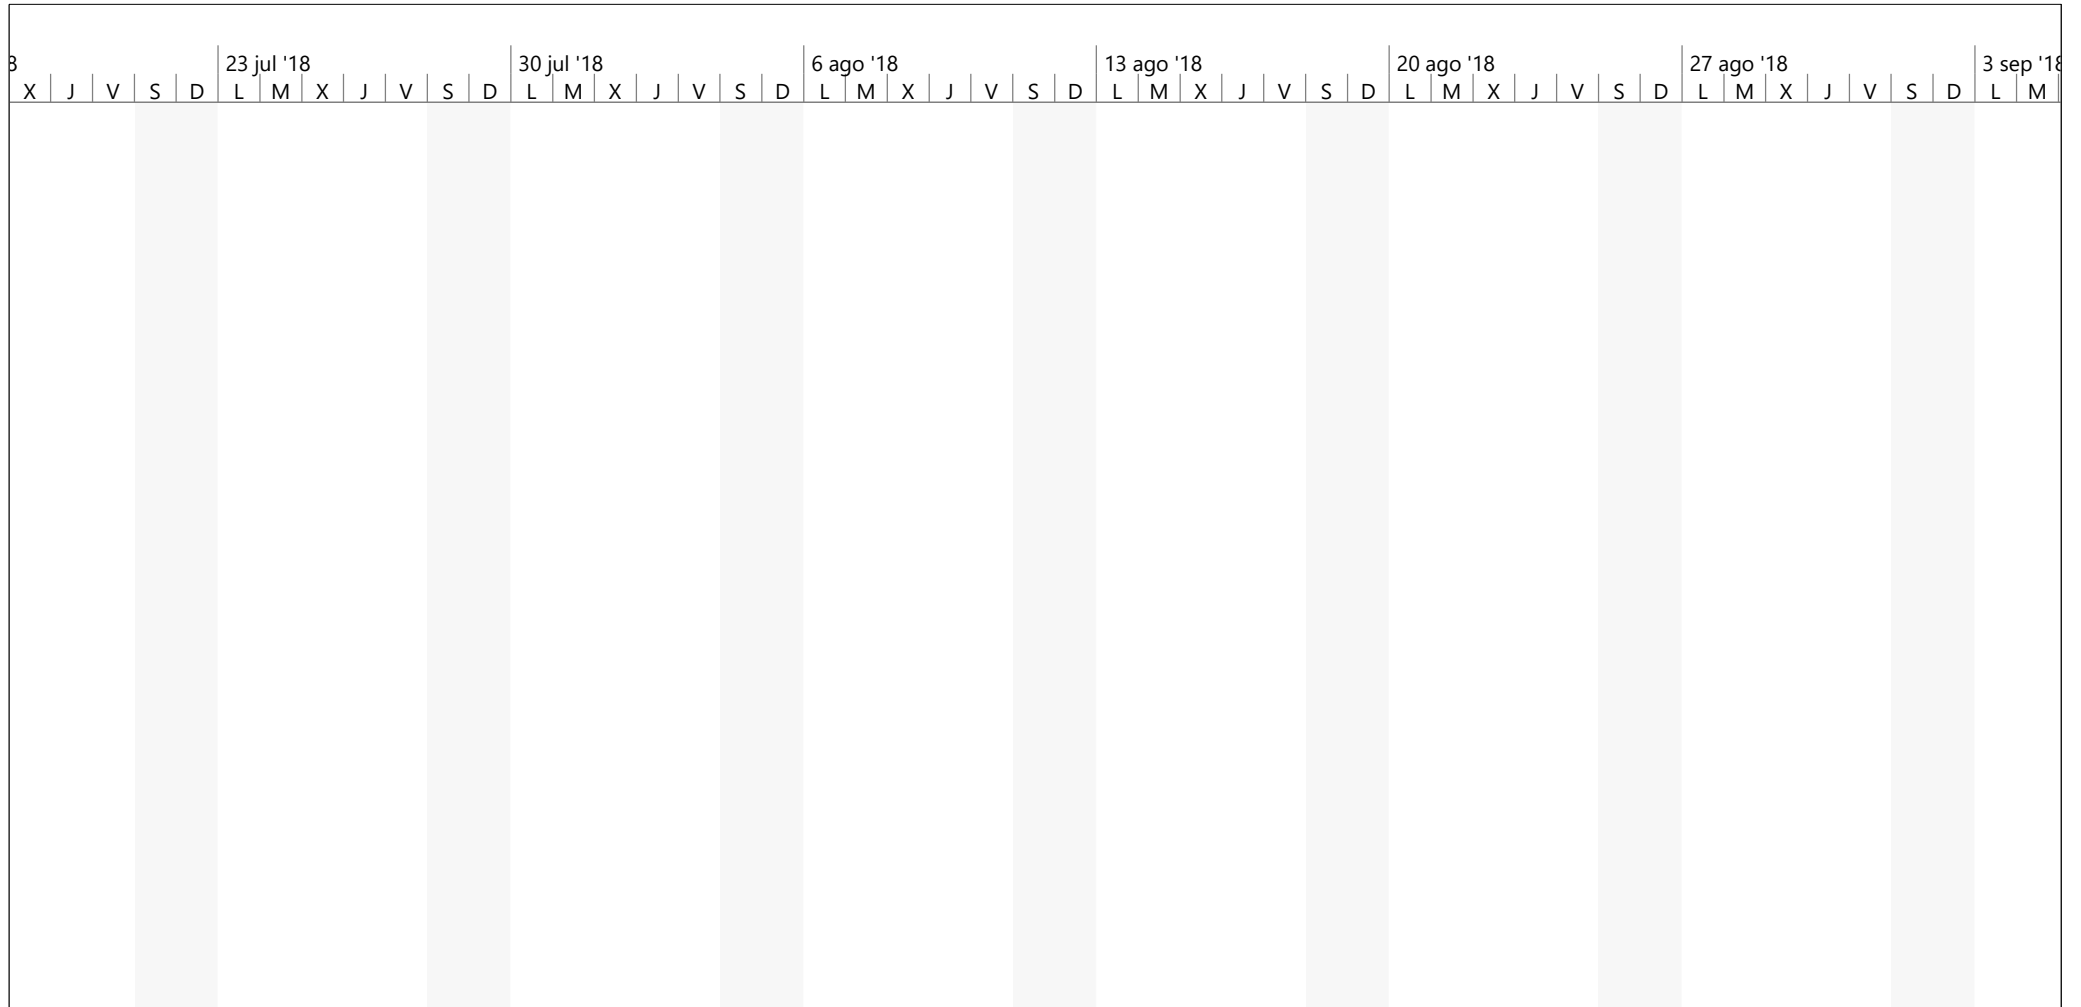


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

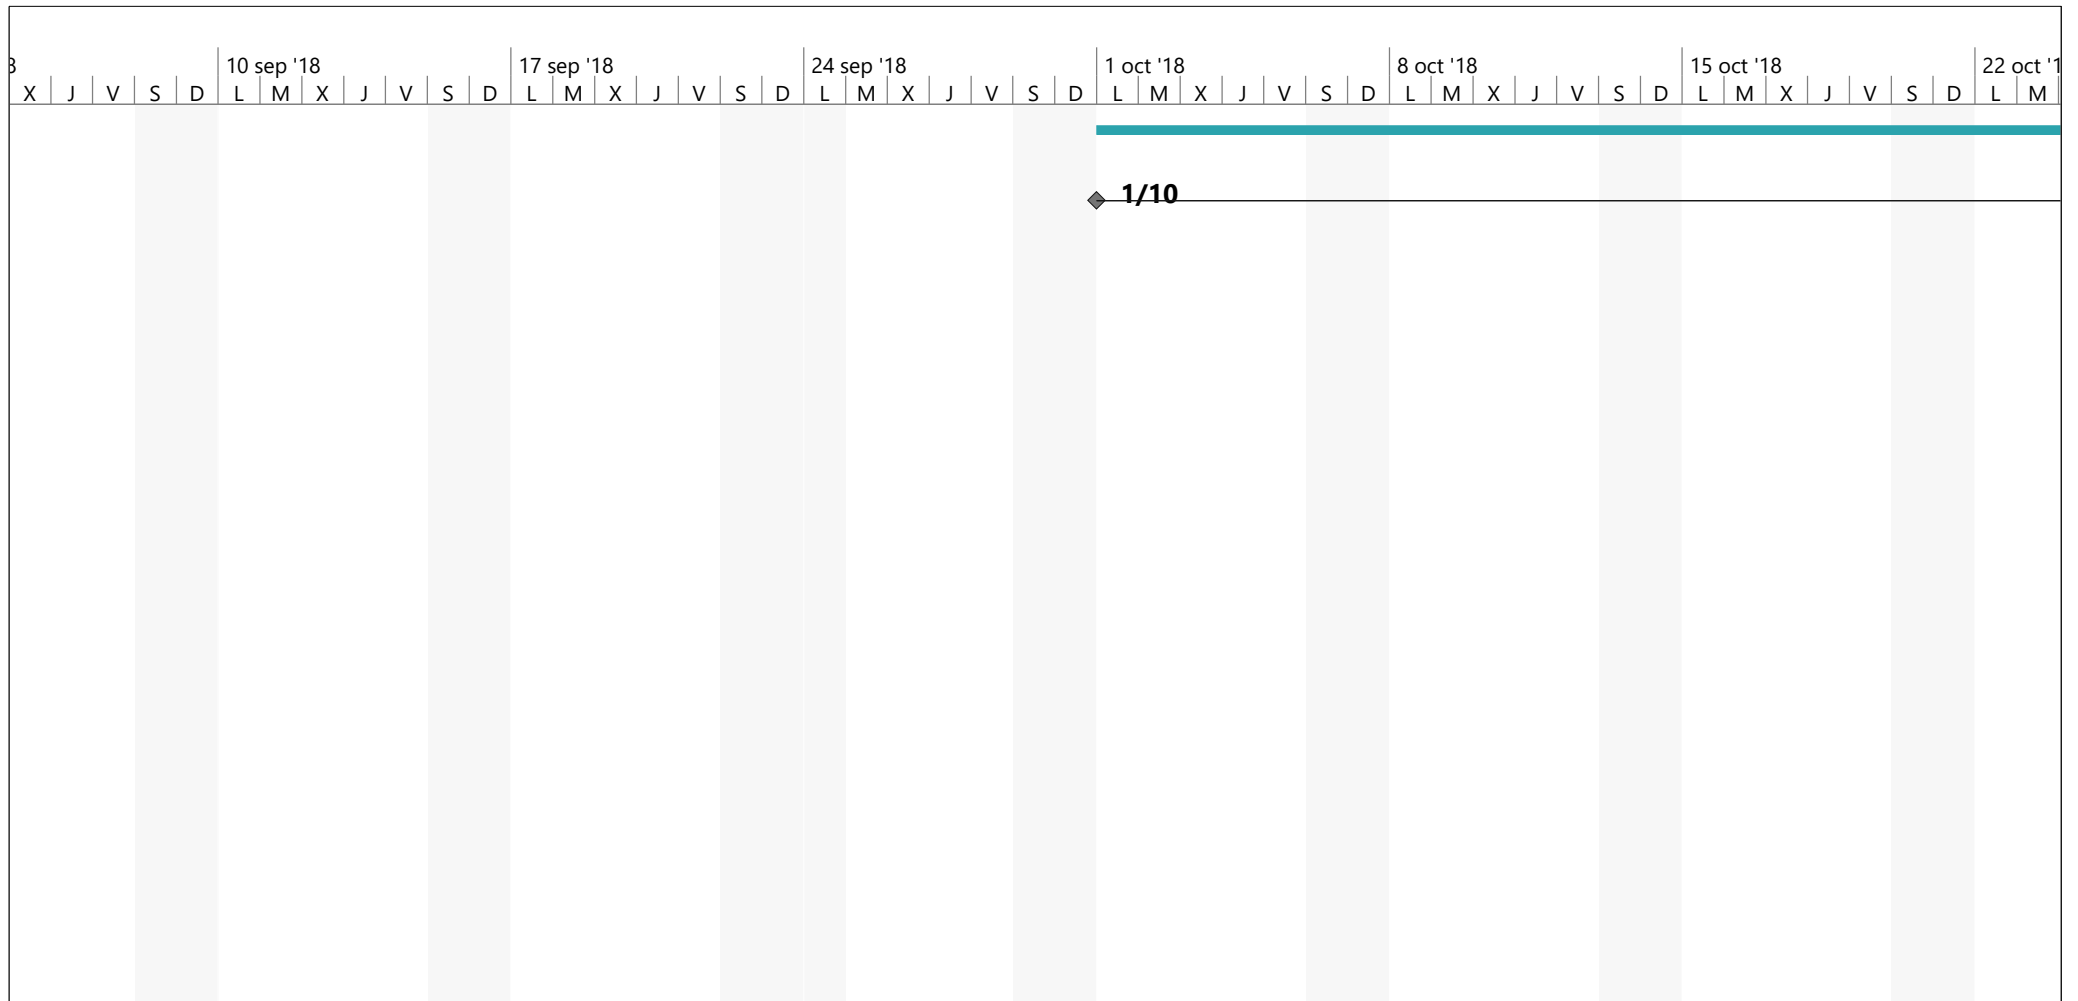

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

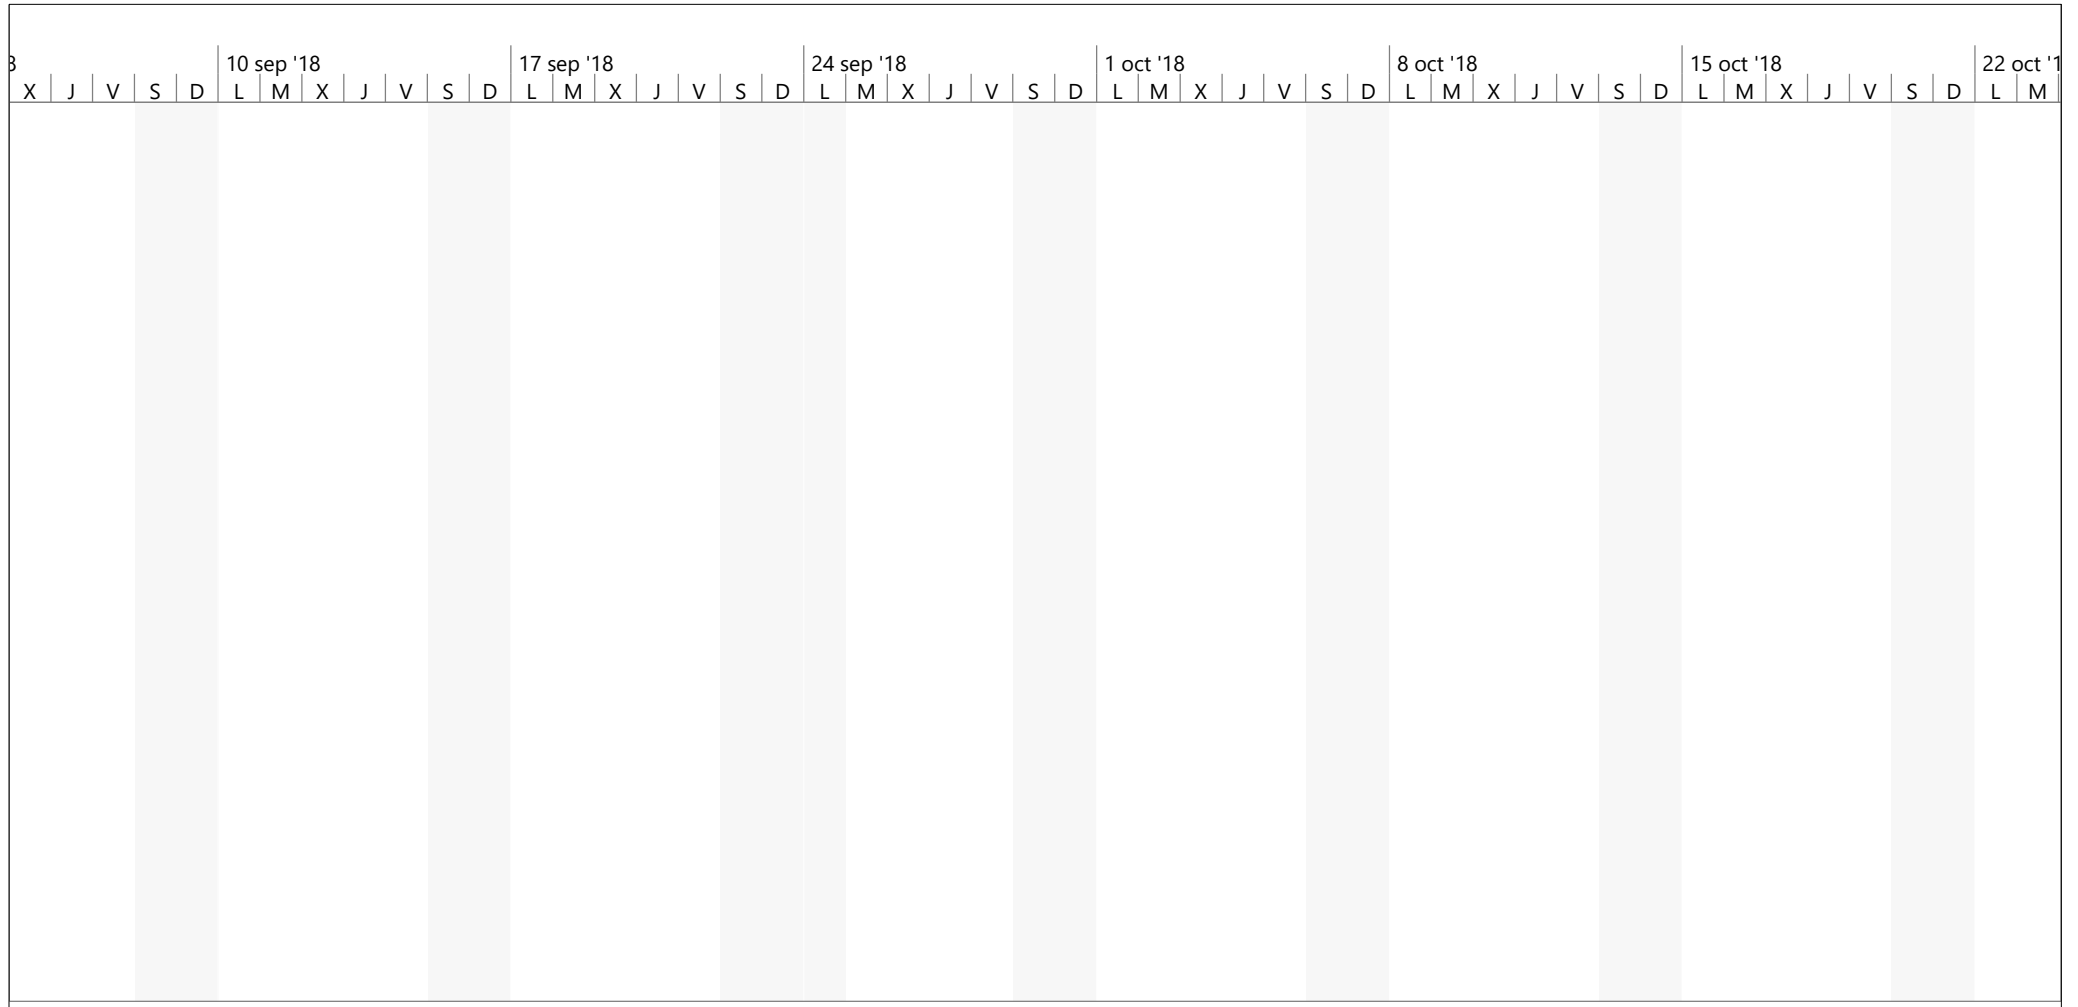


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

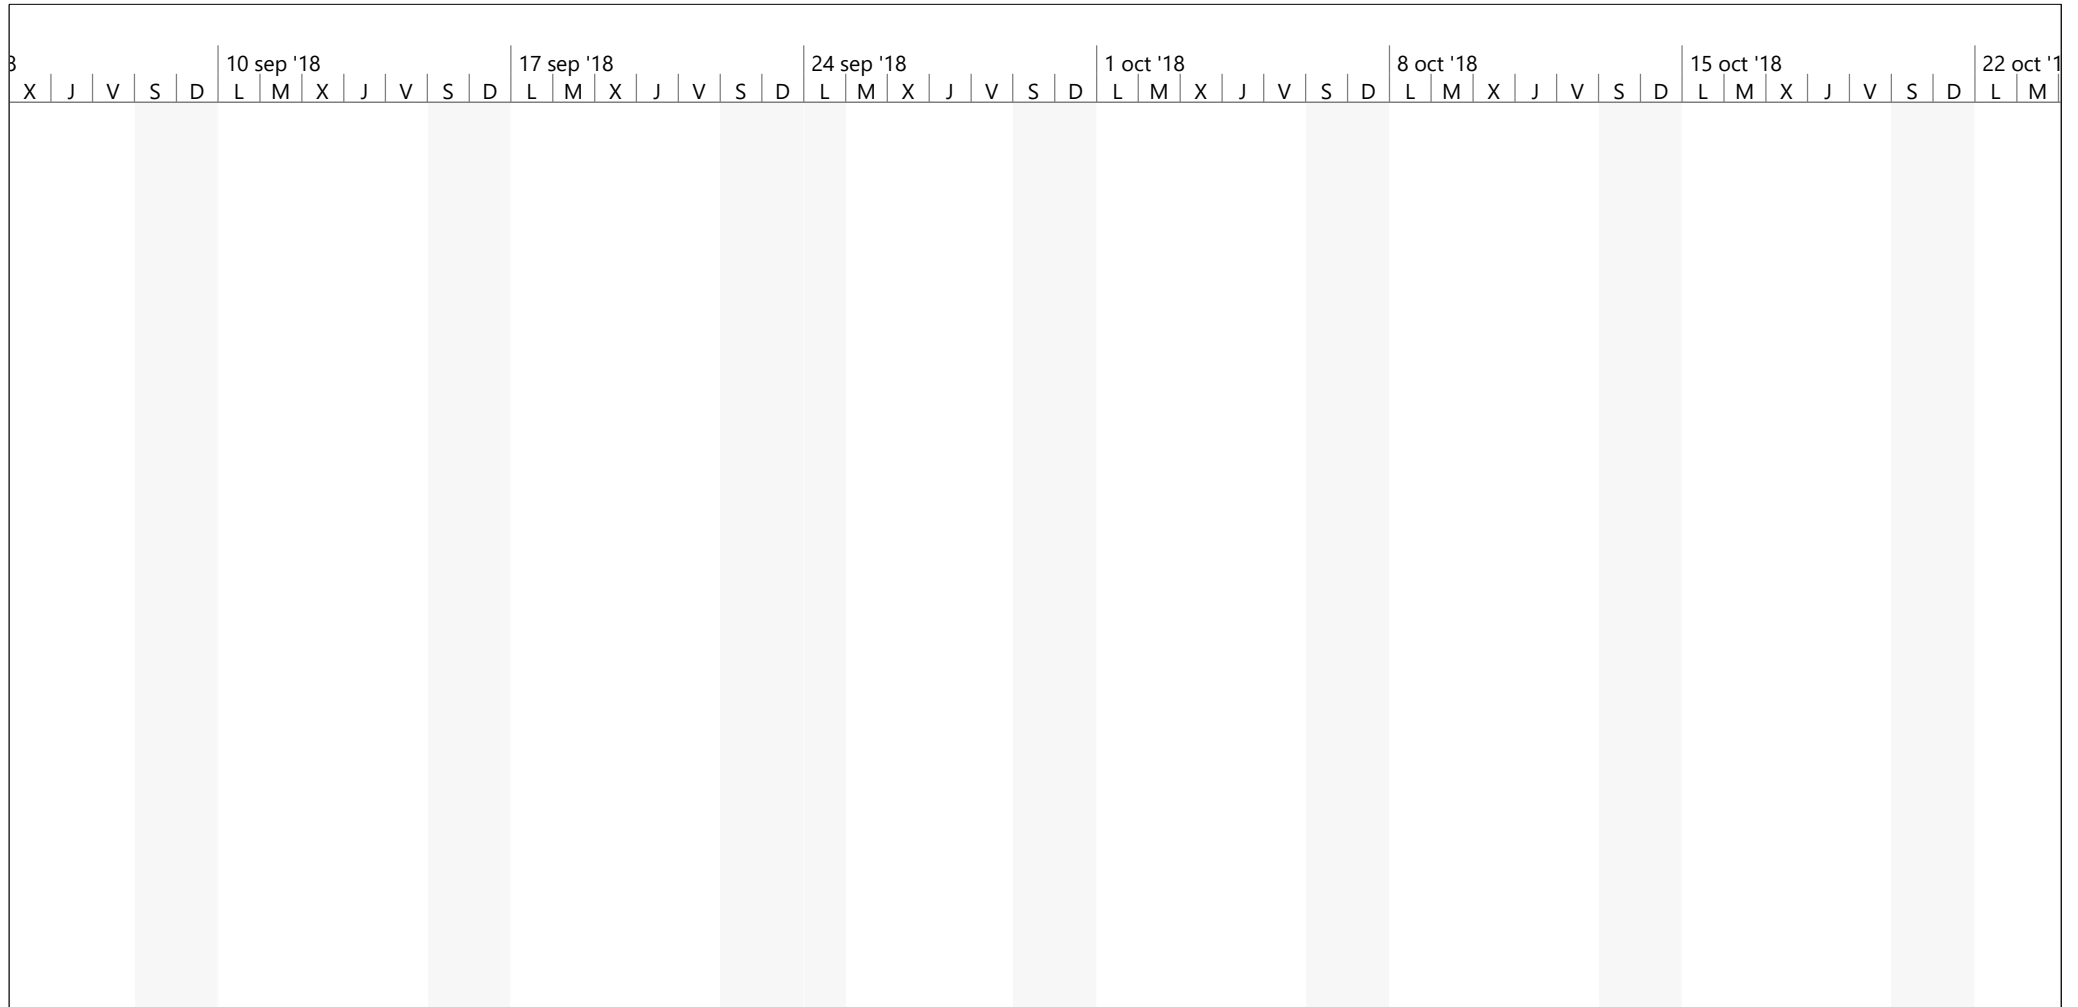


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

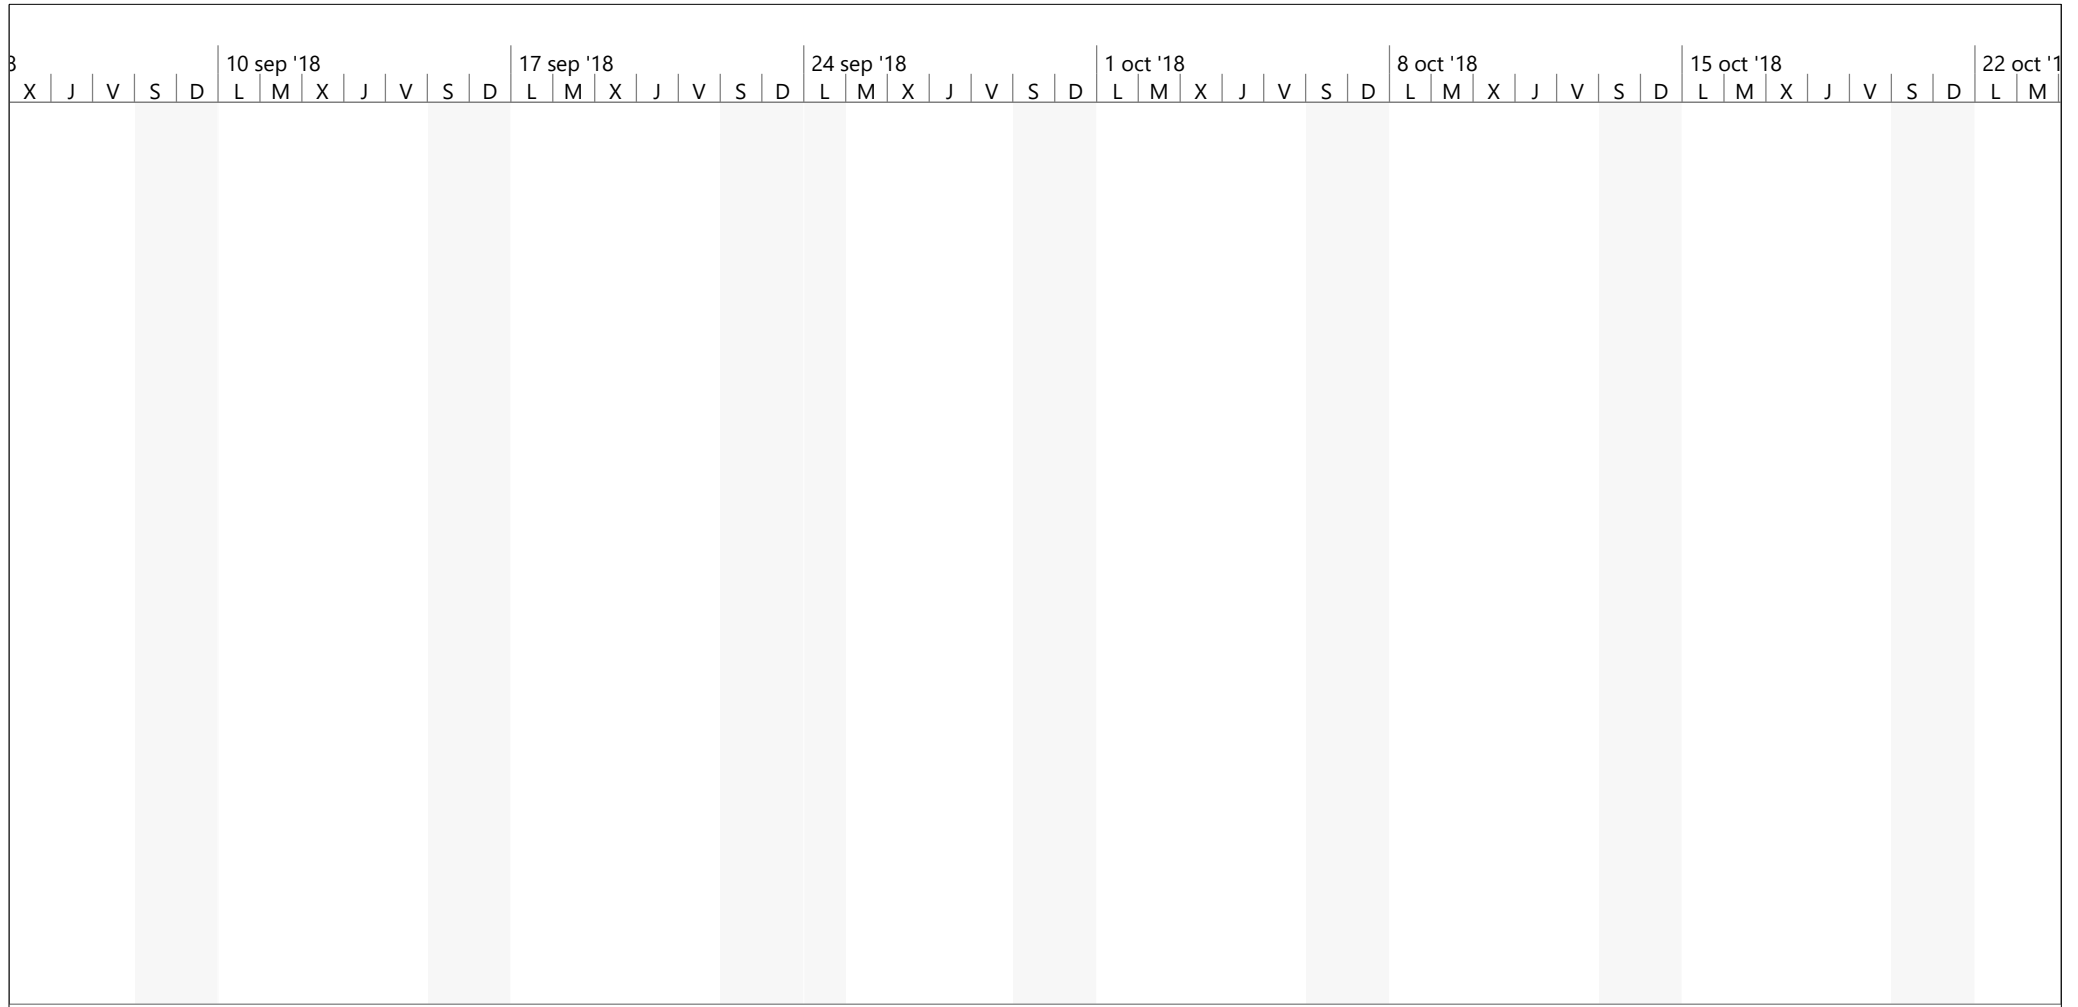


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

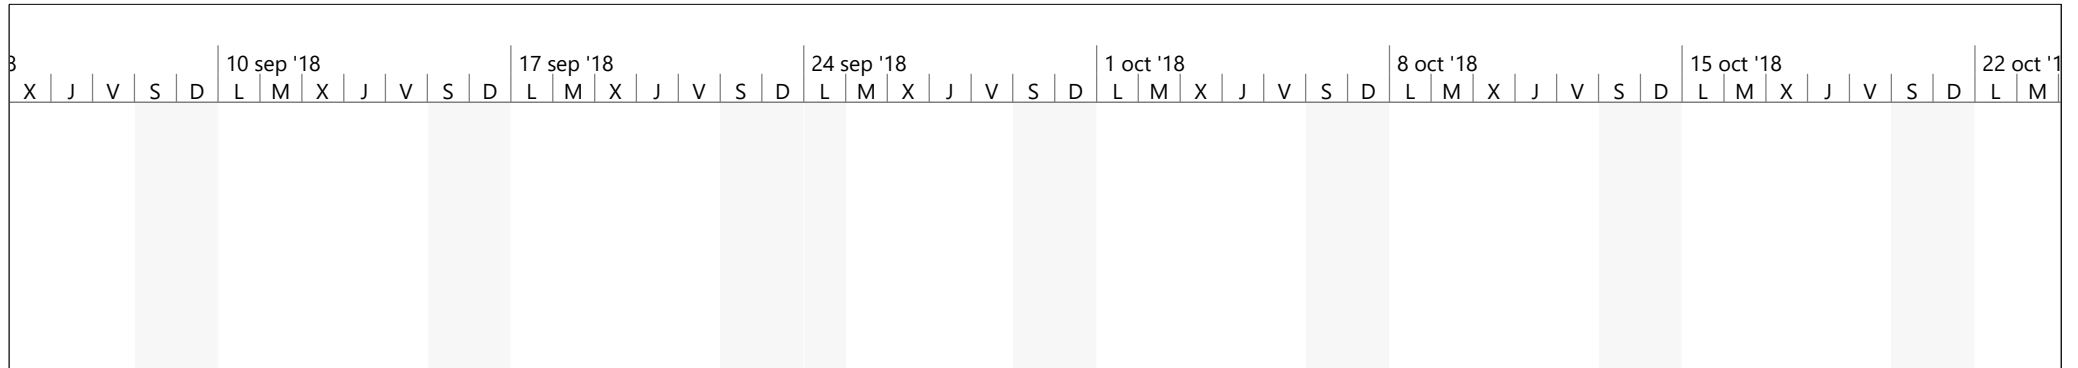


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

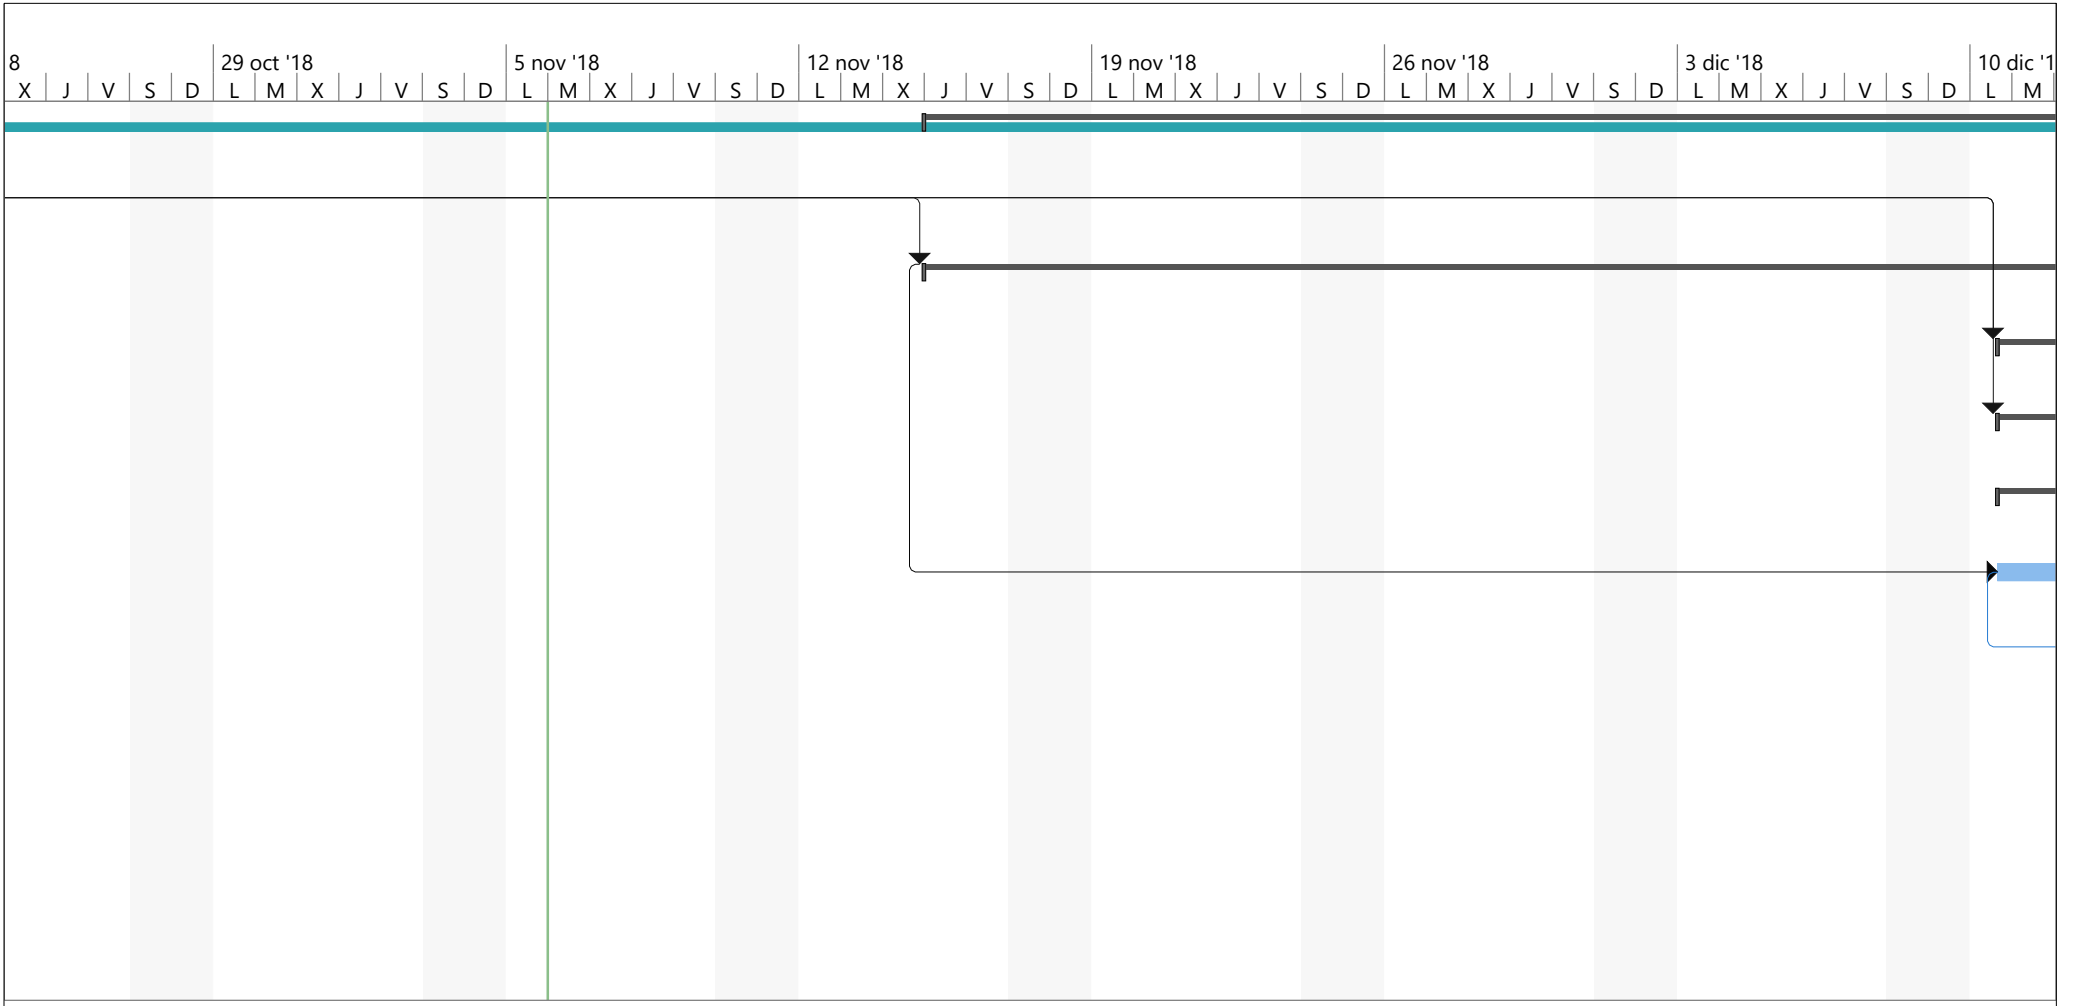


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

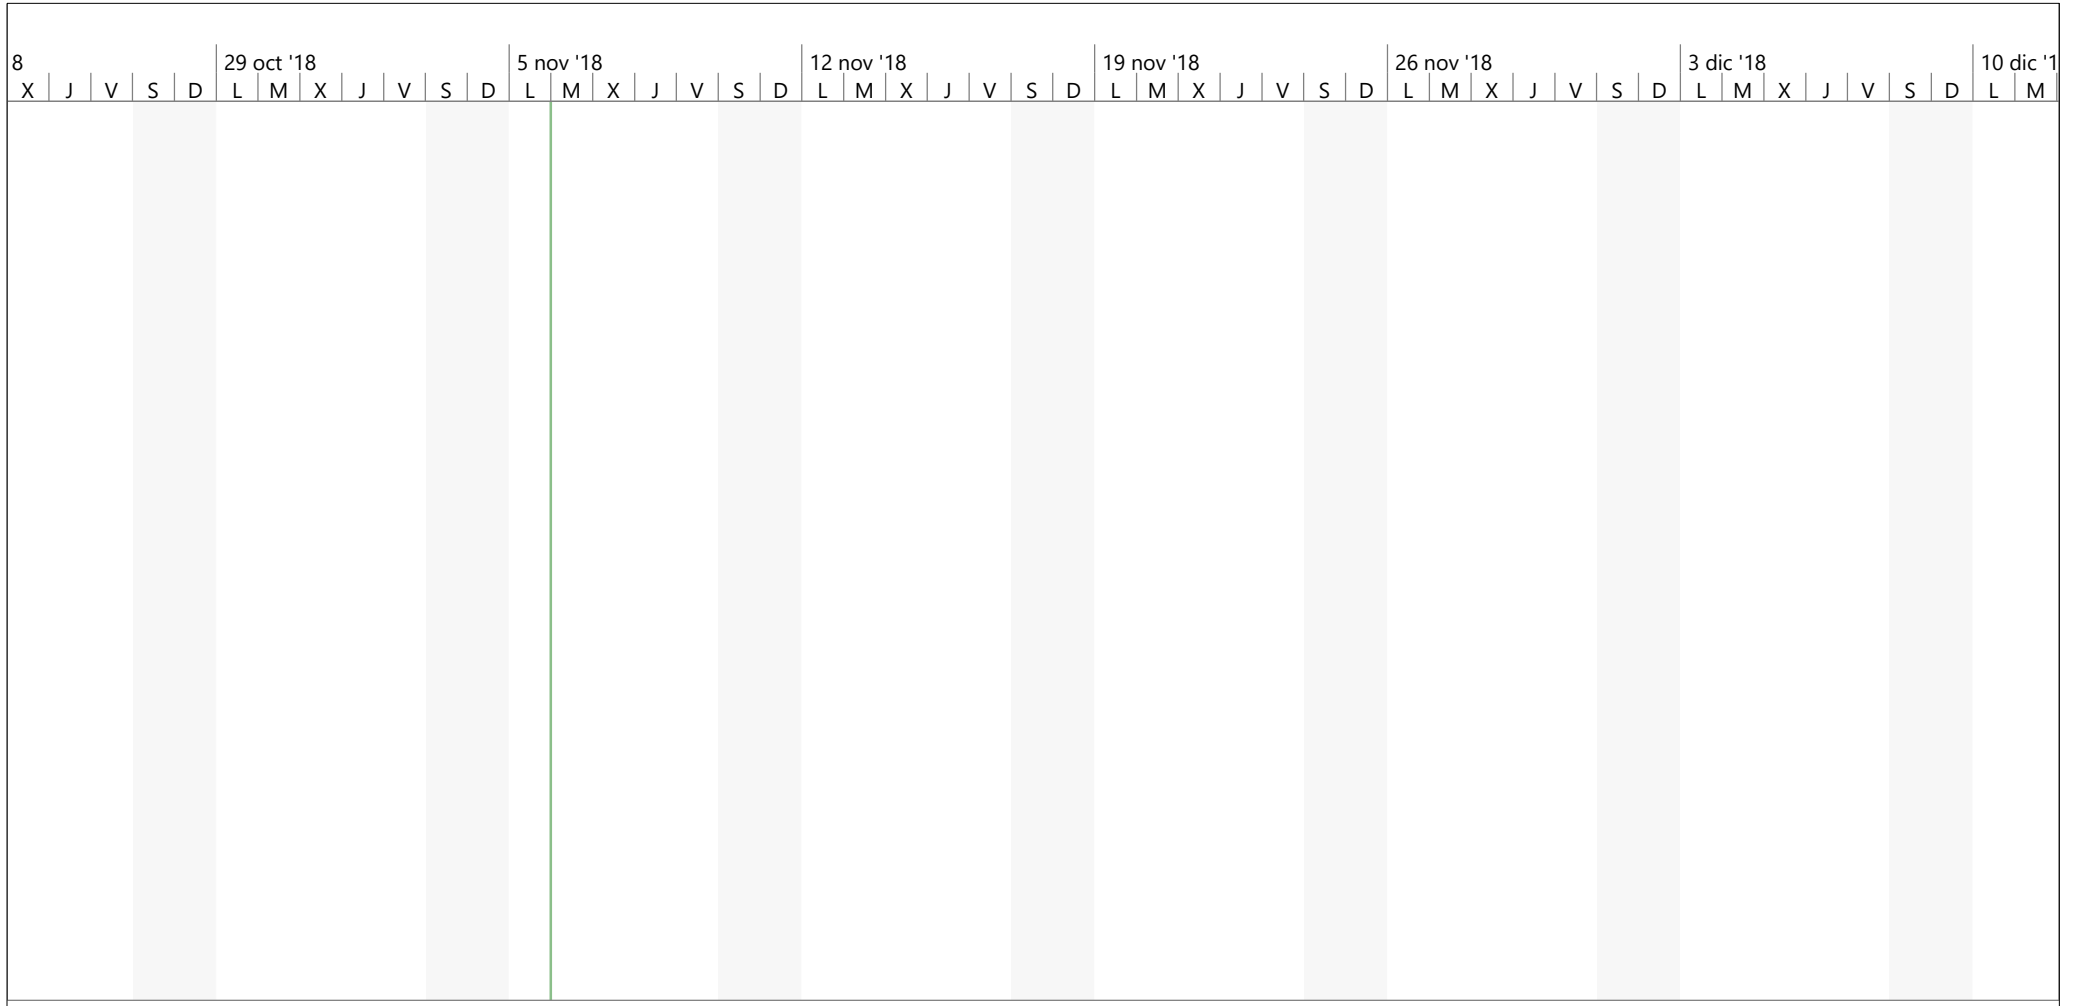

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

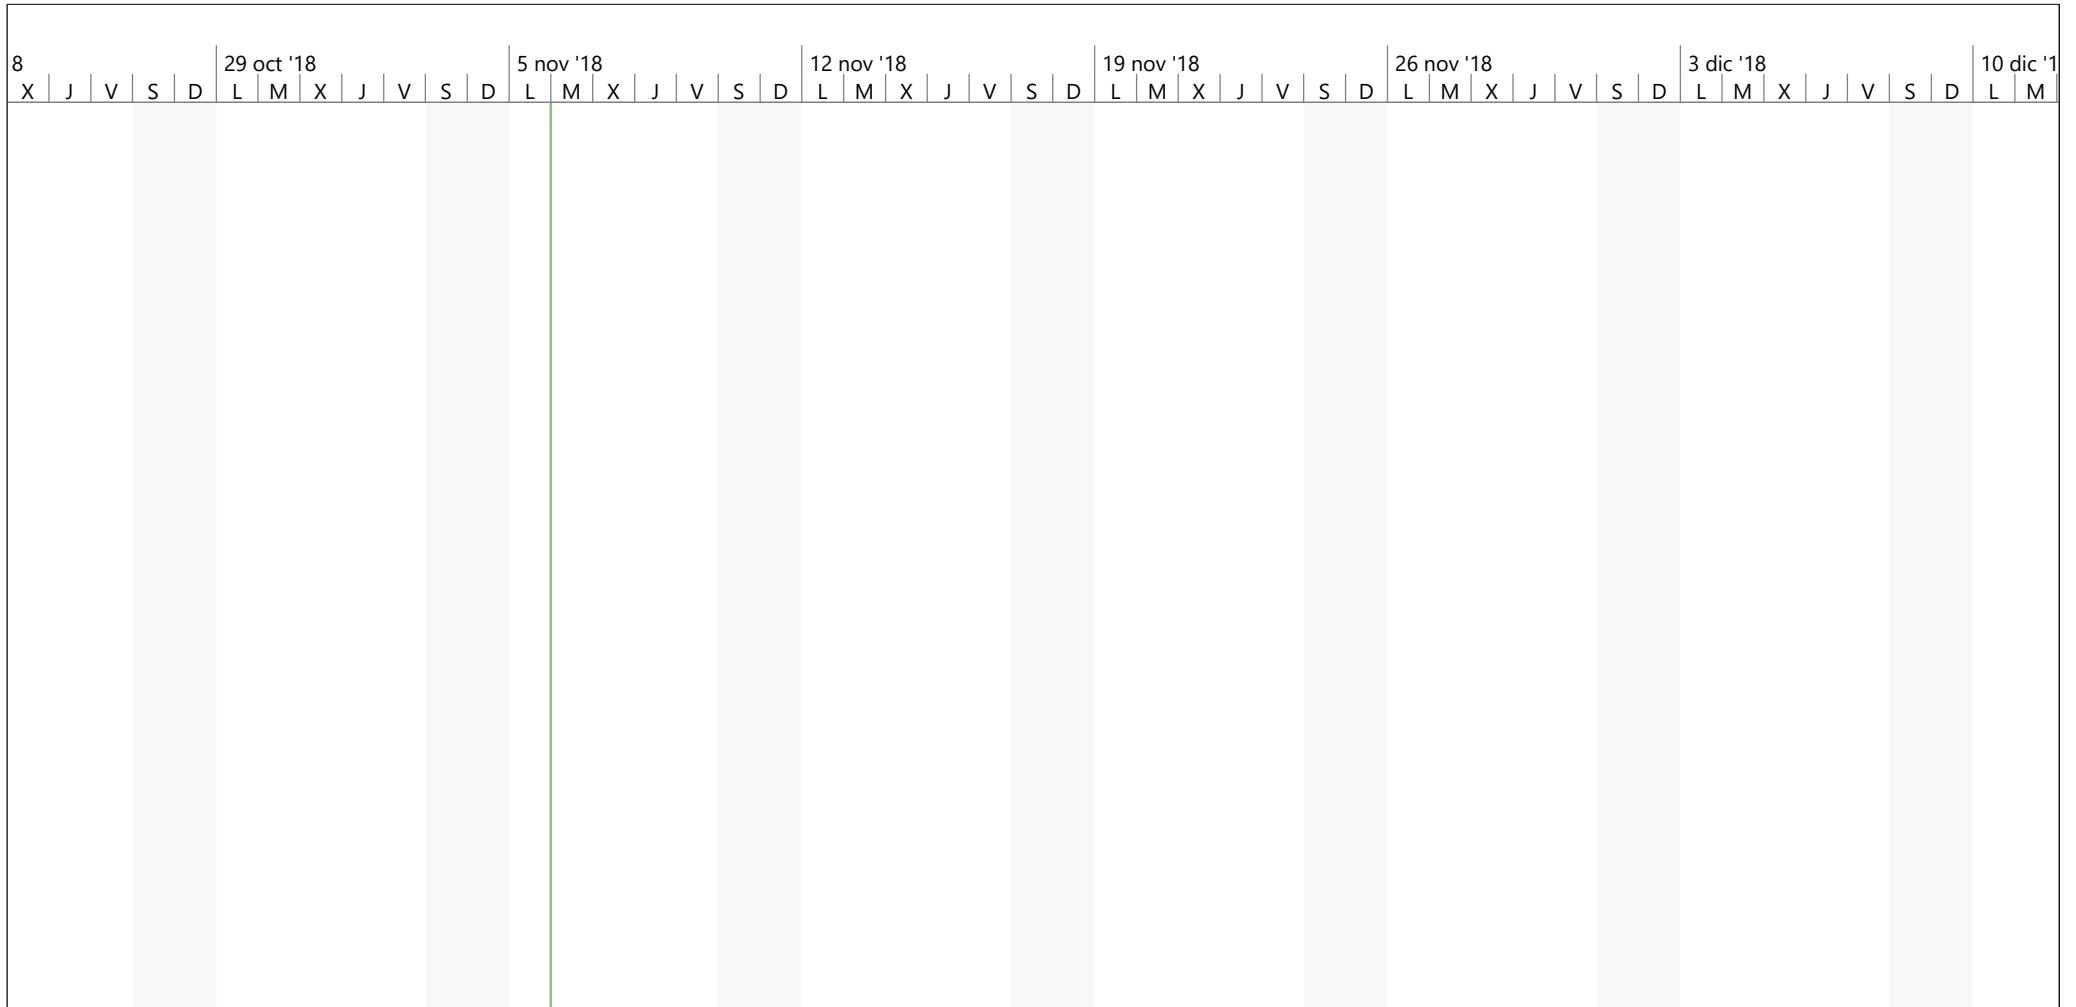


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

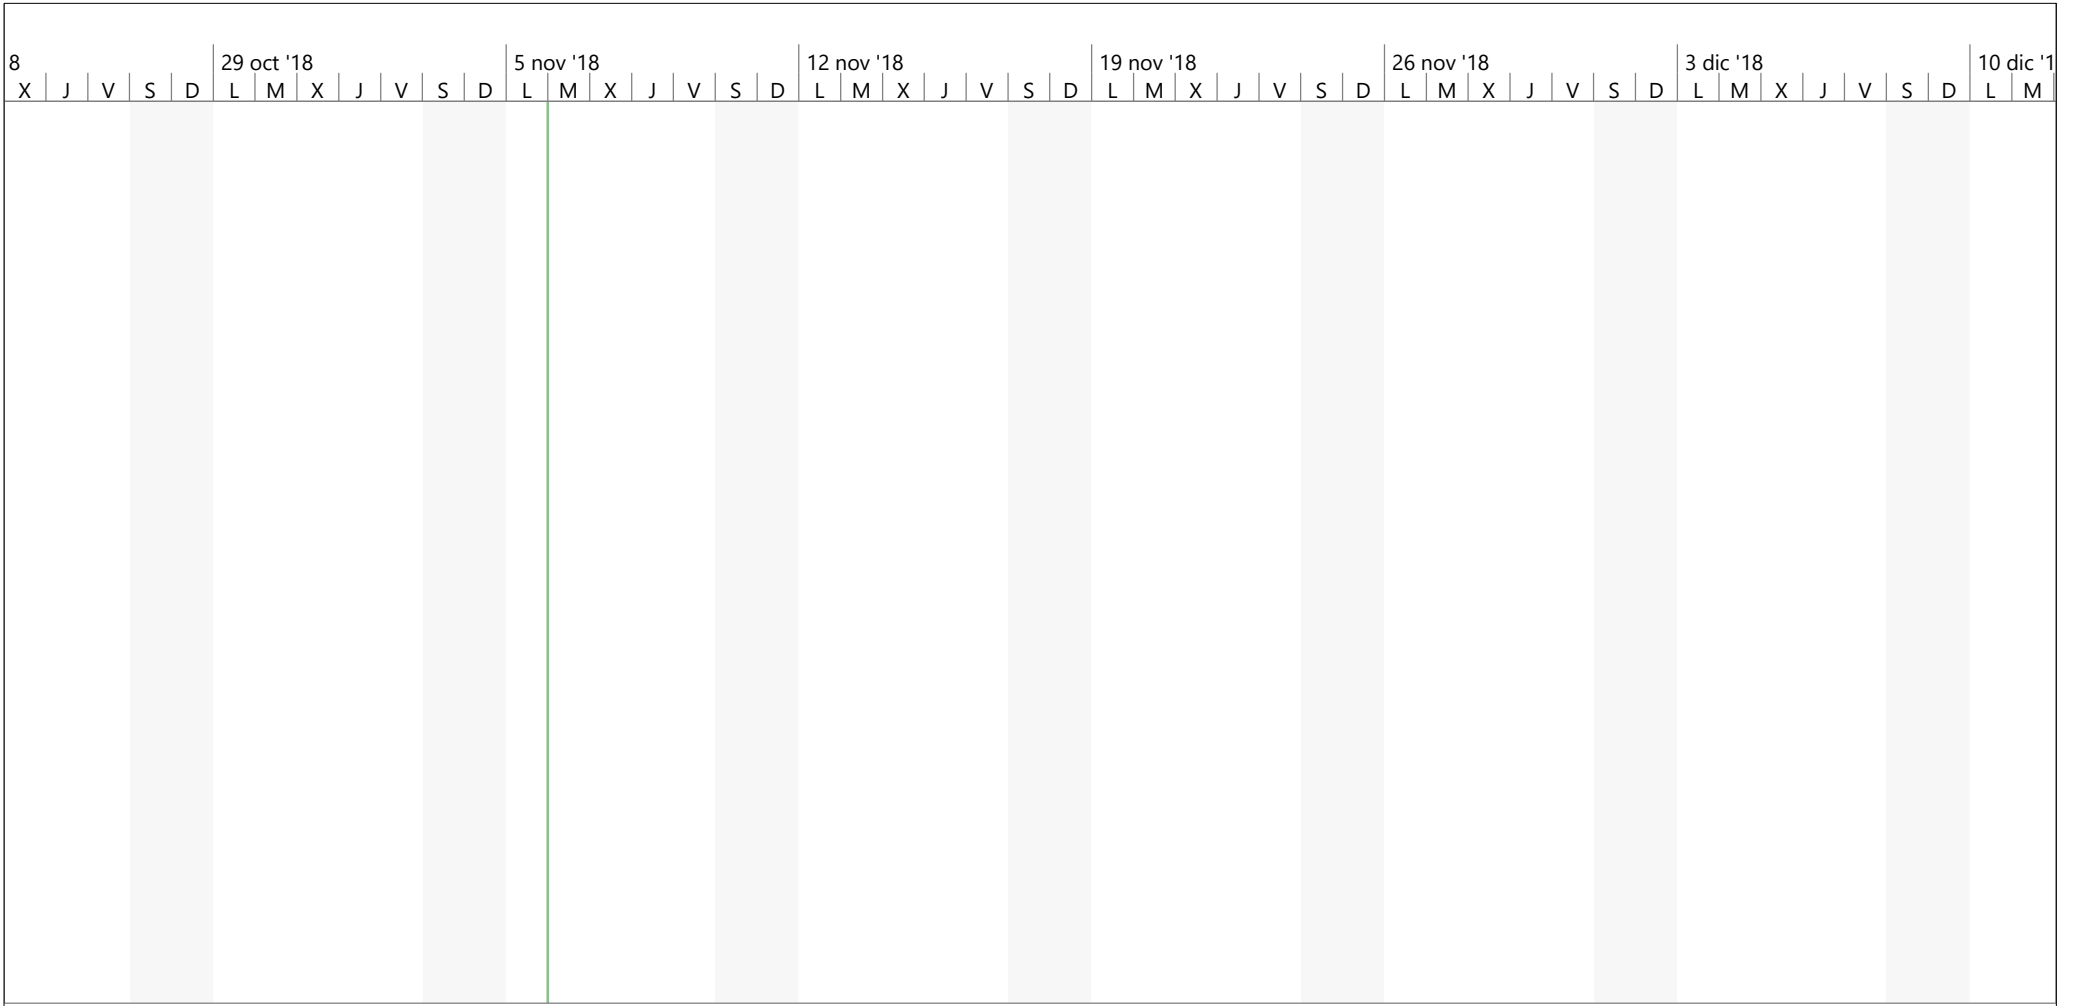


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

8 X J V S D 17 dic '18 L M X J V S D 24 dic '18 L M X J V S D 31 dic '18 L M X J V S D 7 ene '19 L M X J V S D 14 ene '19 L M X J V S D 21 ene '19 L M X J V S D 28 ene '19

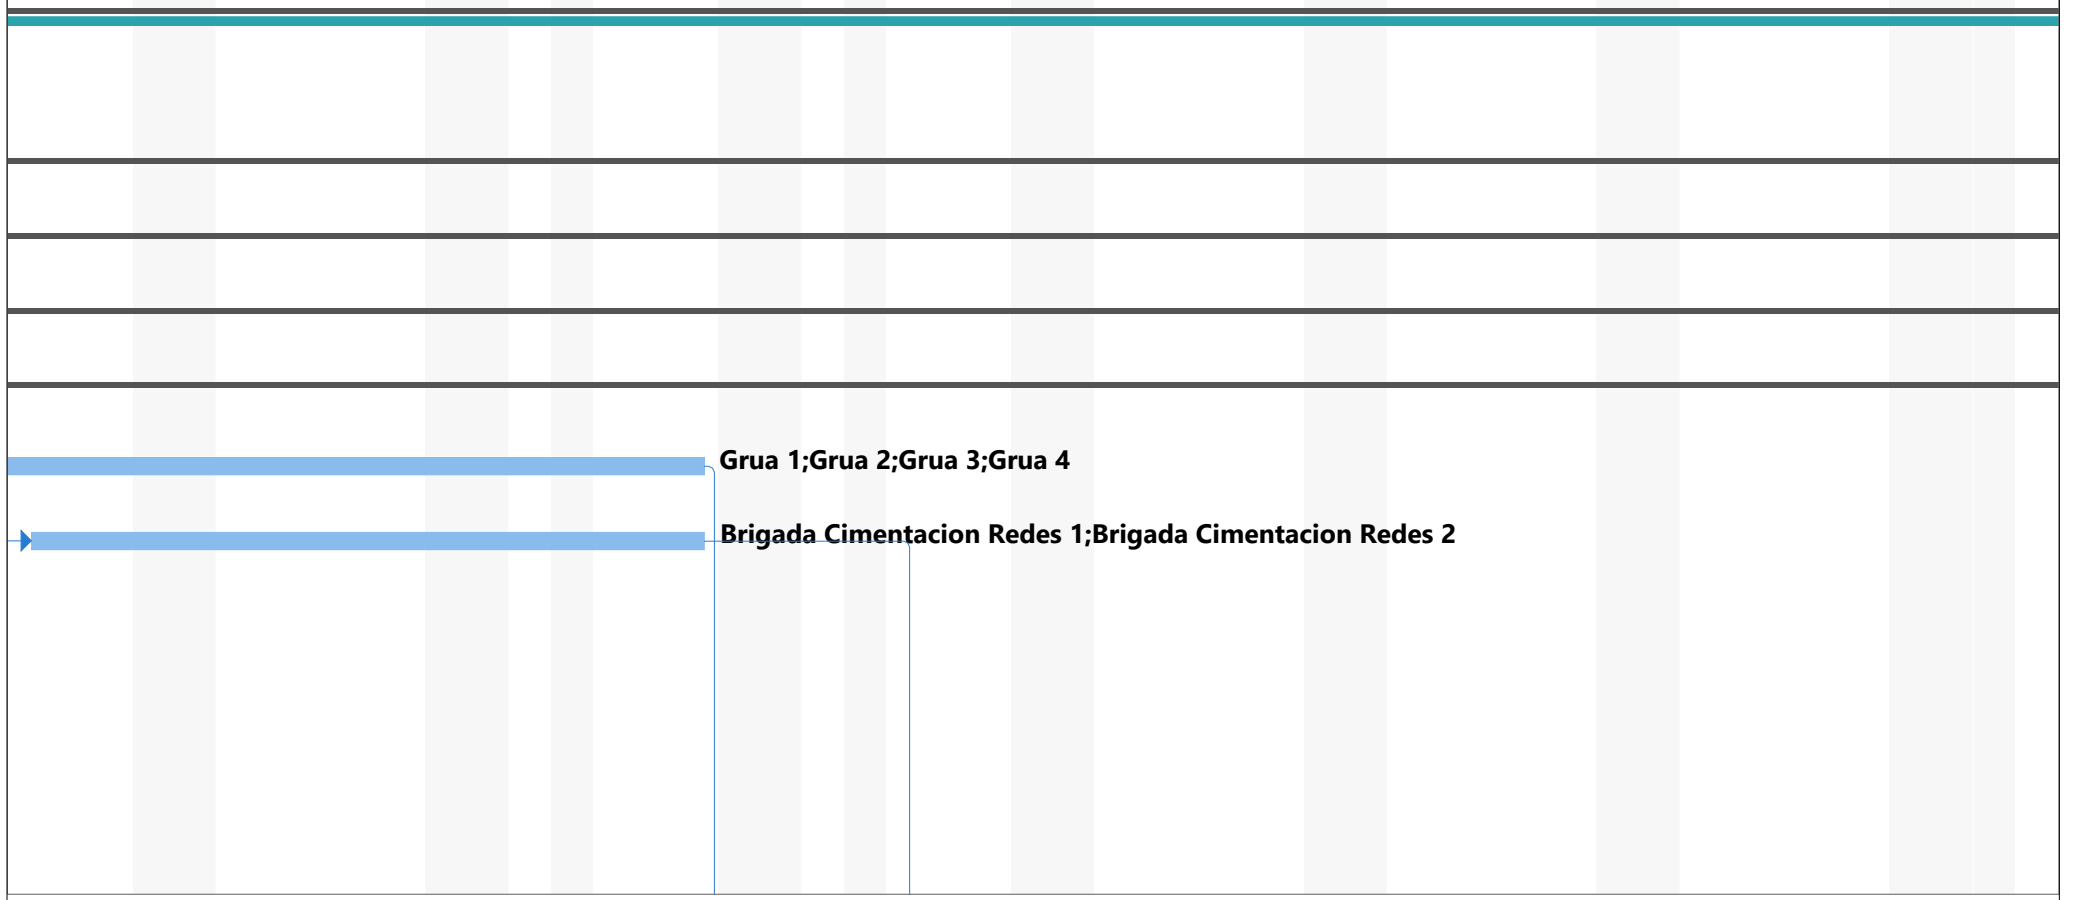


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

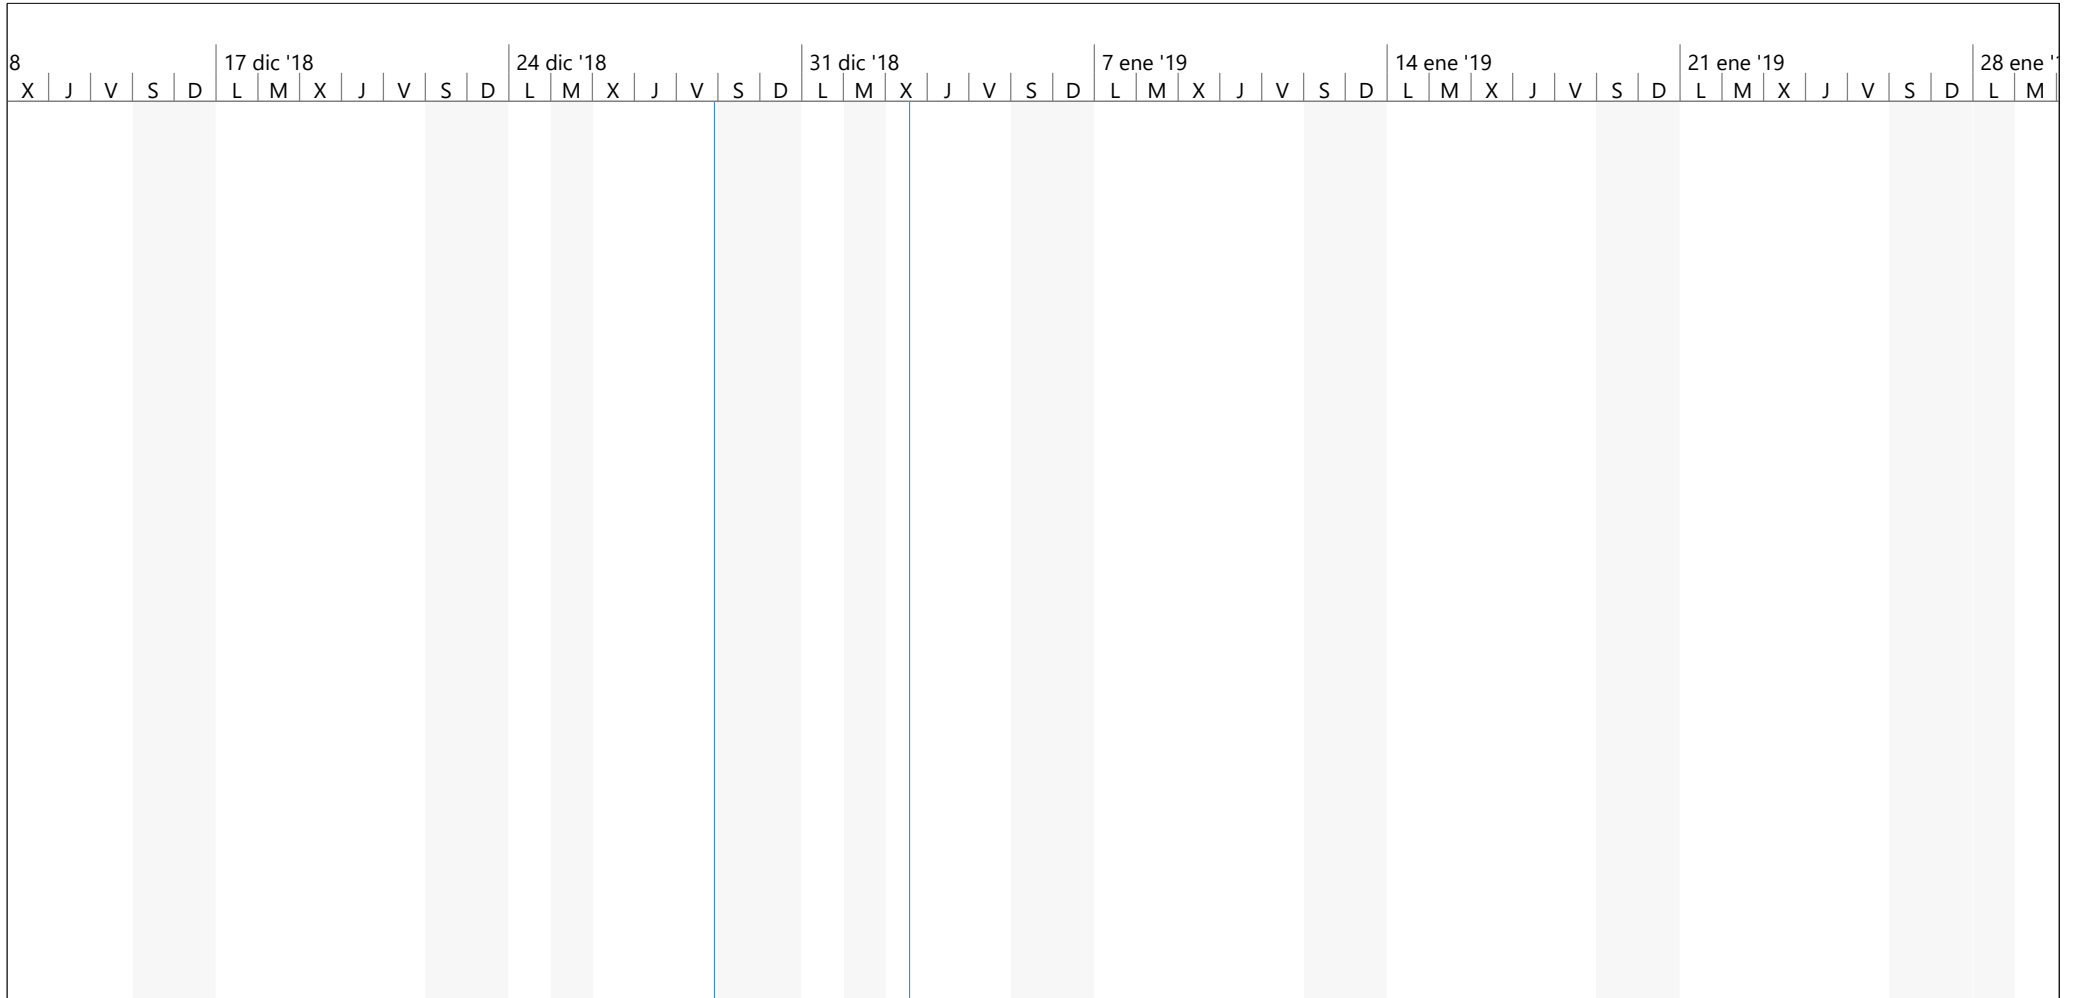


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

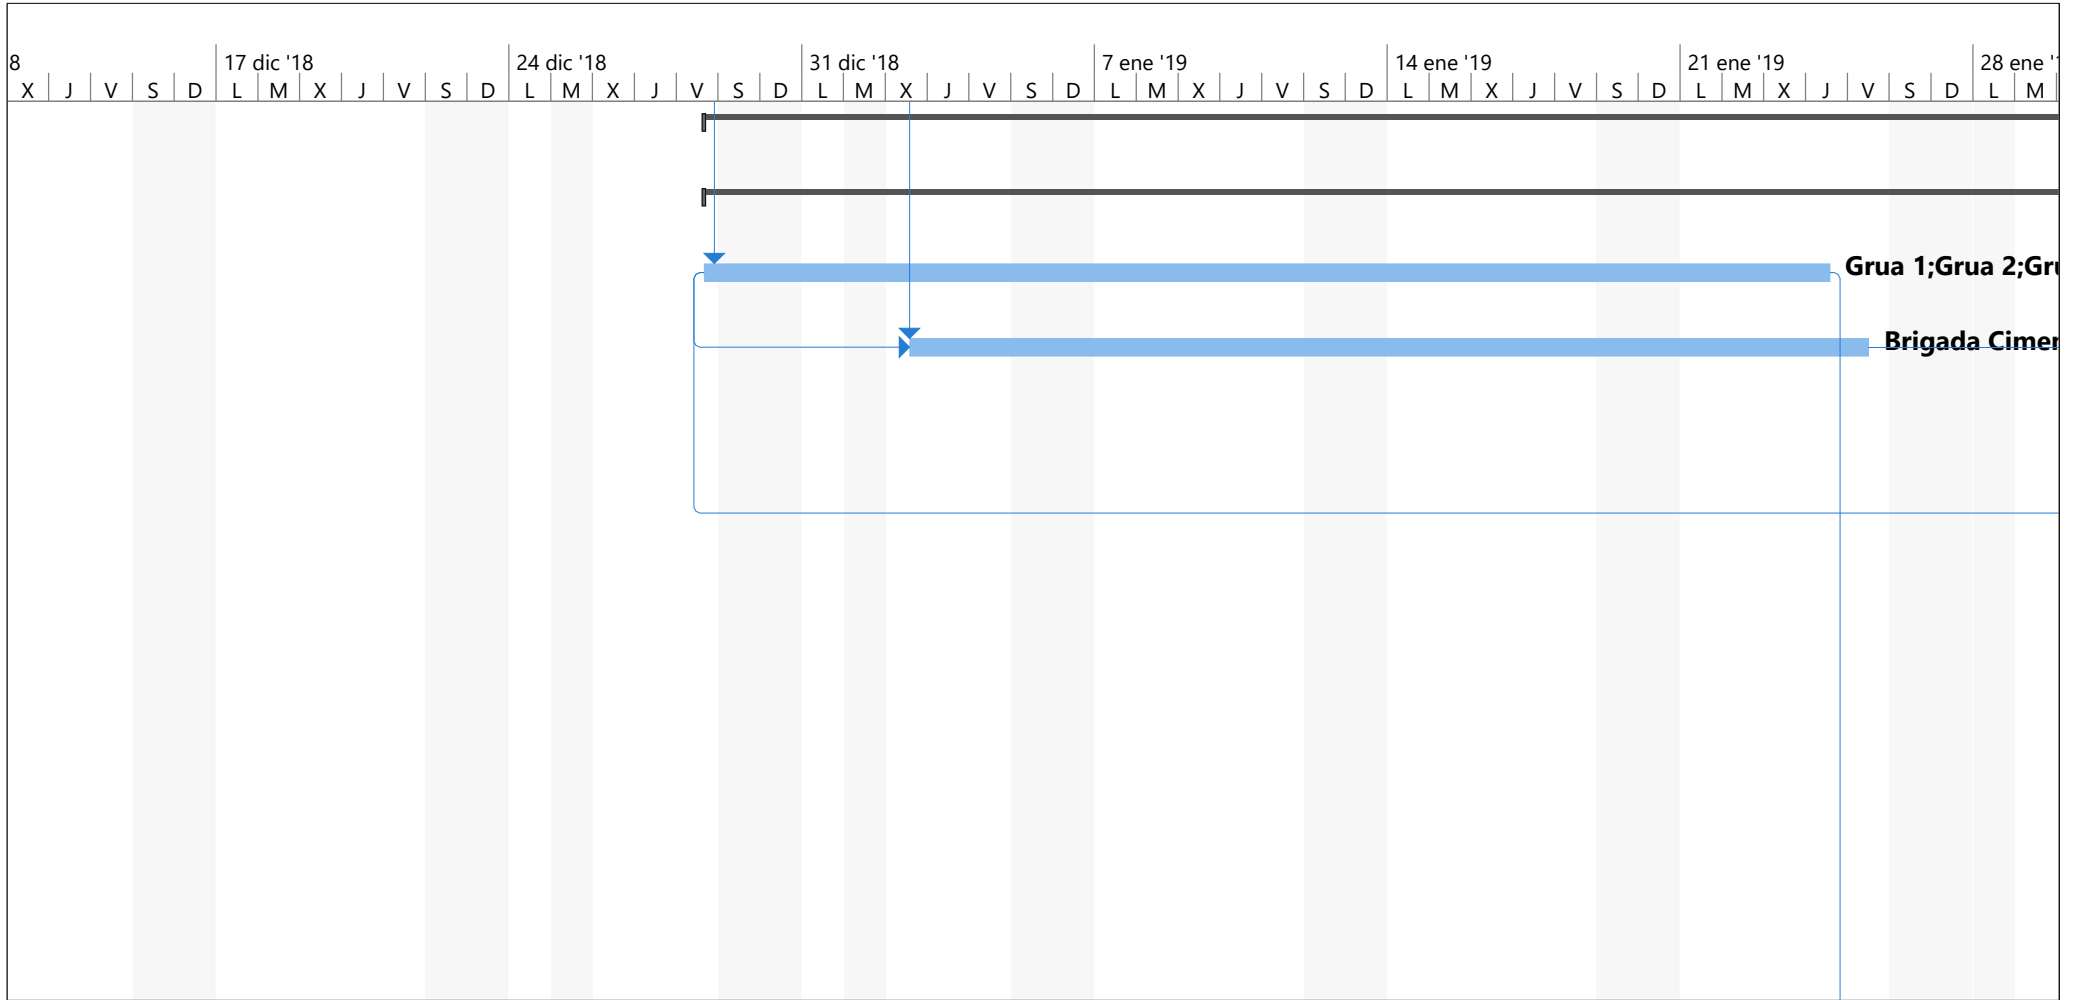


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

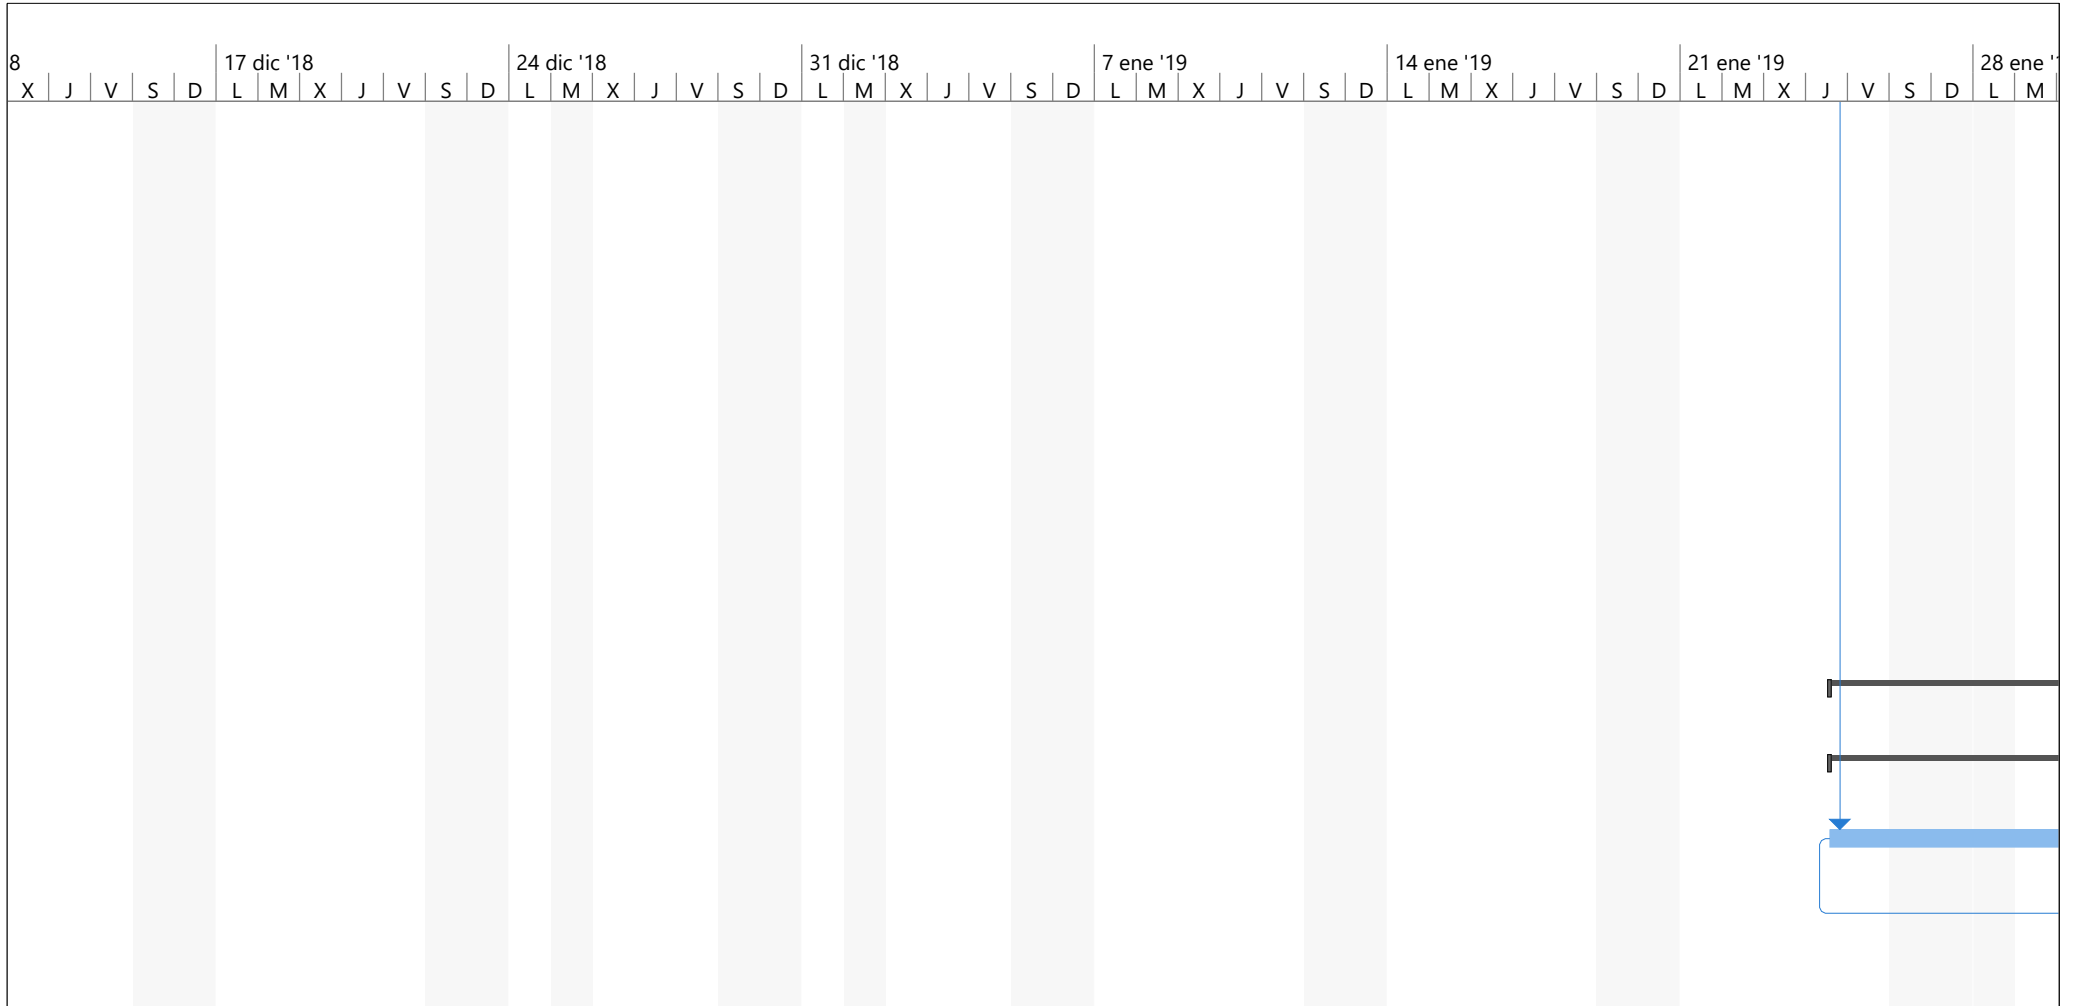


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

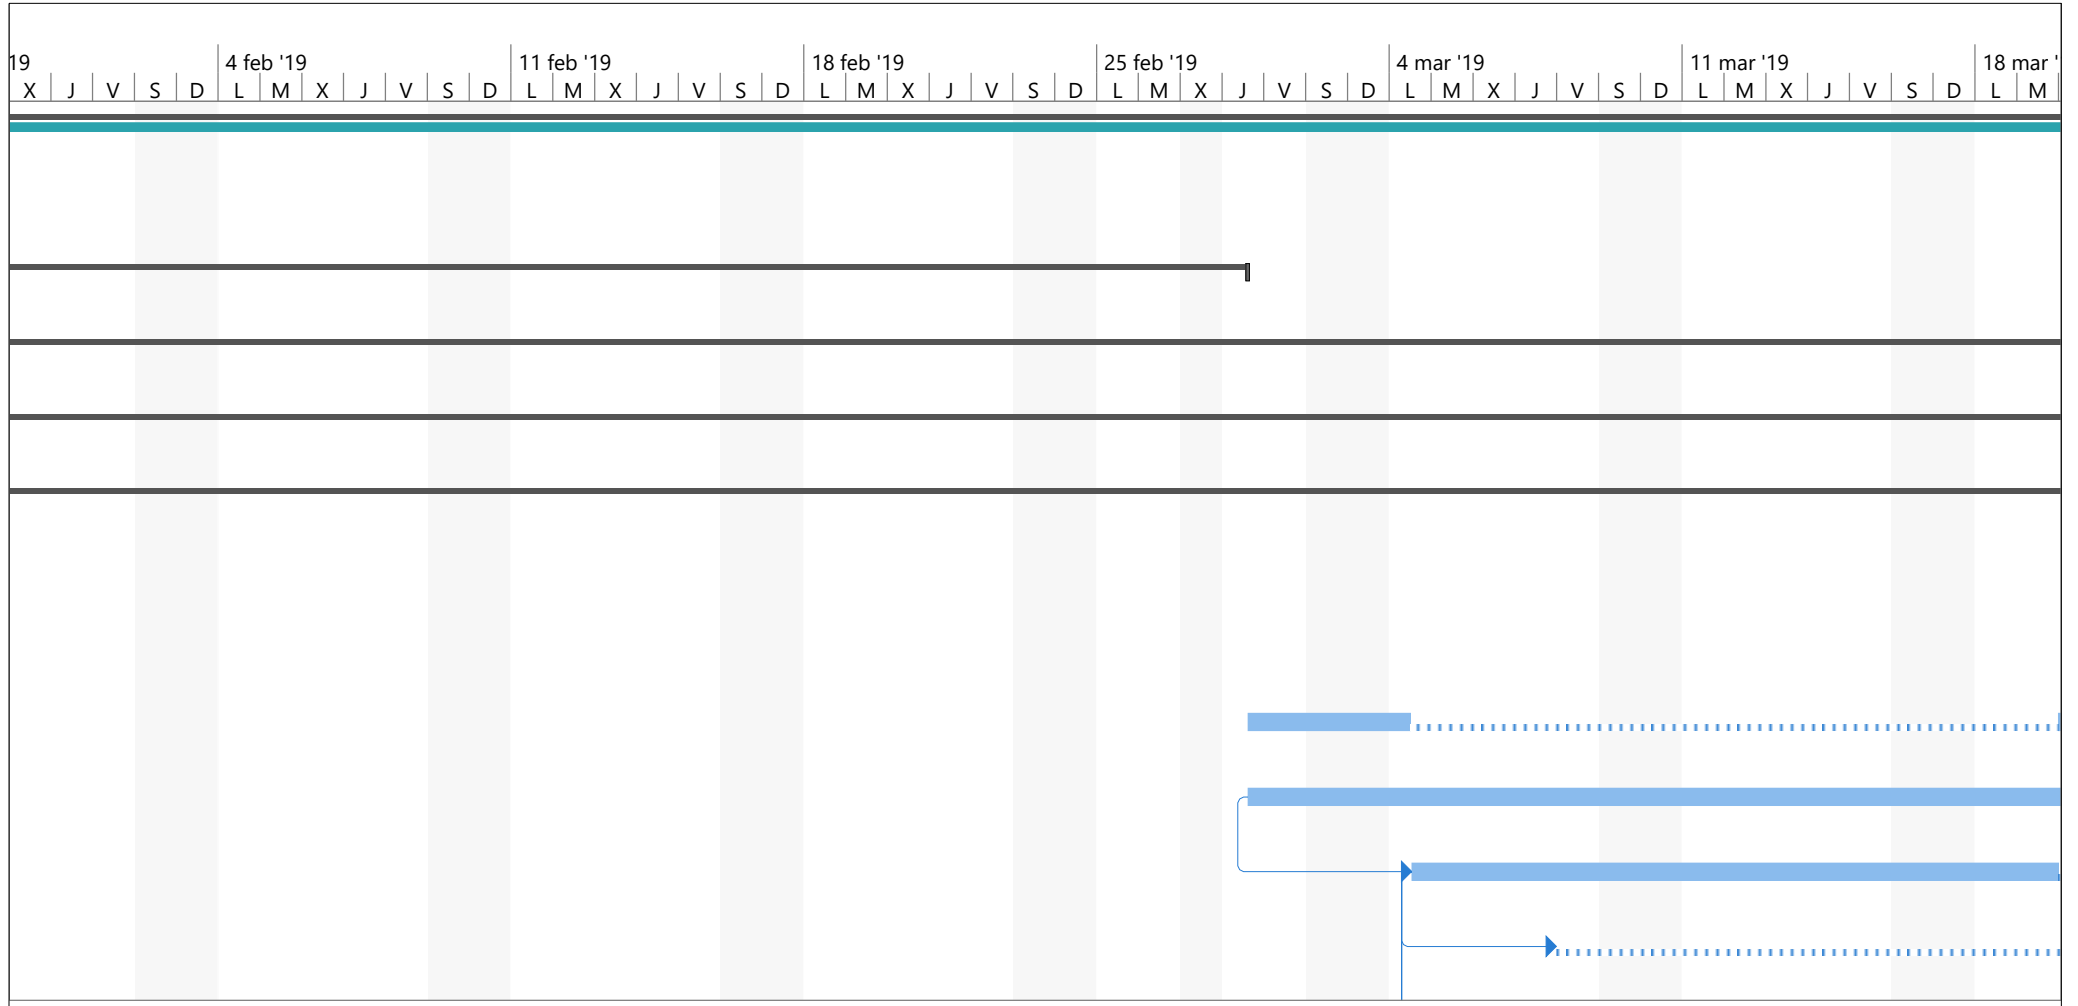

Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

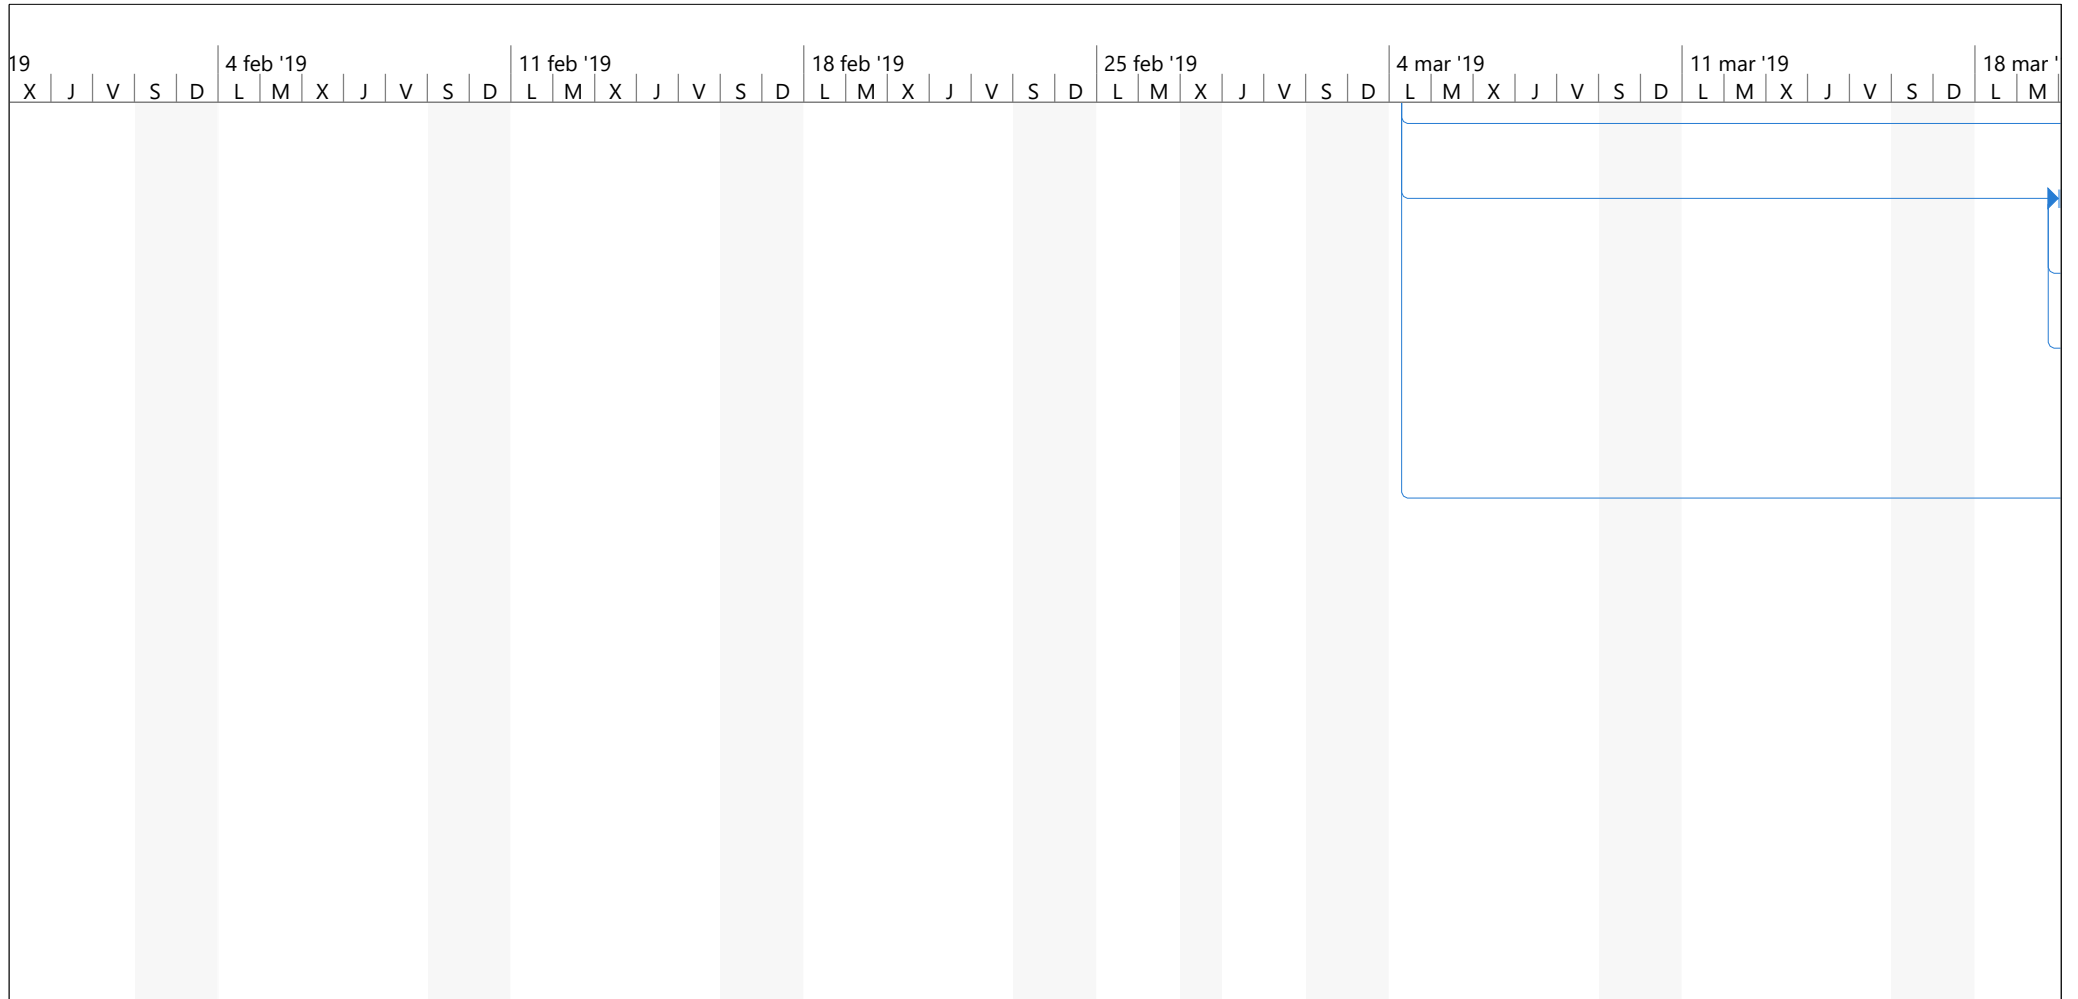

Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18




















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


19 | X | J | V | S | D | 4 feb '19 | L | M | X | J | V | S | D | 11 feb '19 | L | M | X | J | V | S | D | 18 feb '19 | L | M | X | J | V | S | D | 25 feb '19 | L | M | X | J | V | S | D | 4 mar '19 | L | M | X | J | V | S | D | 11 mar '19 | L | M | X | J | V | S | D | 18 mar '19 | L | M | X | J | V | S | D | 25 mar '19 | L | M | X | J | V | S | D |

rua 3;Grua 4

entacion Redes 1;Brigada Cimentacion Redes 2


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

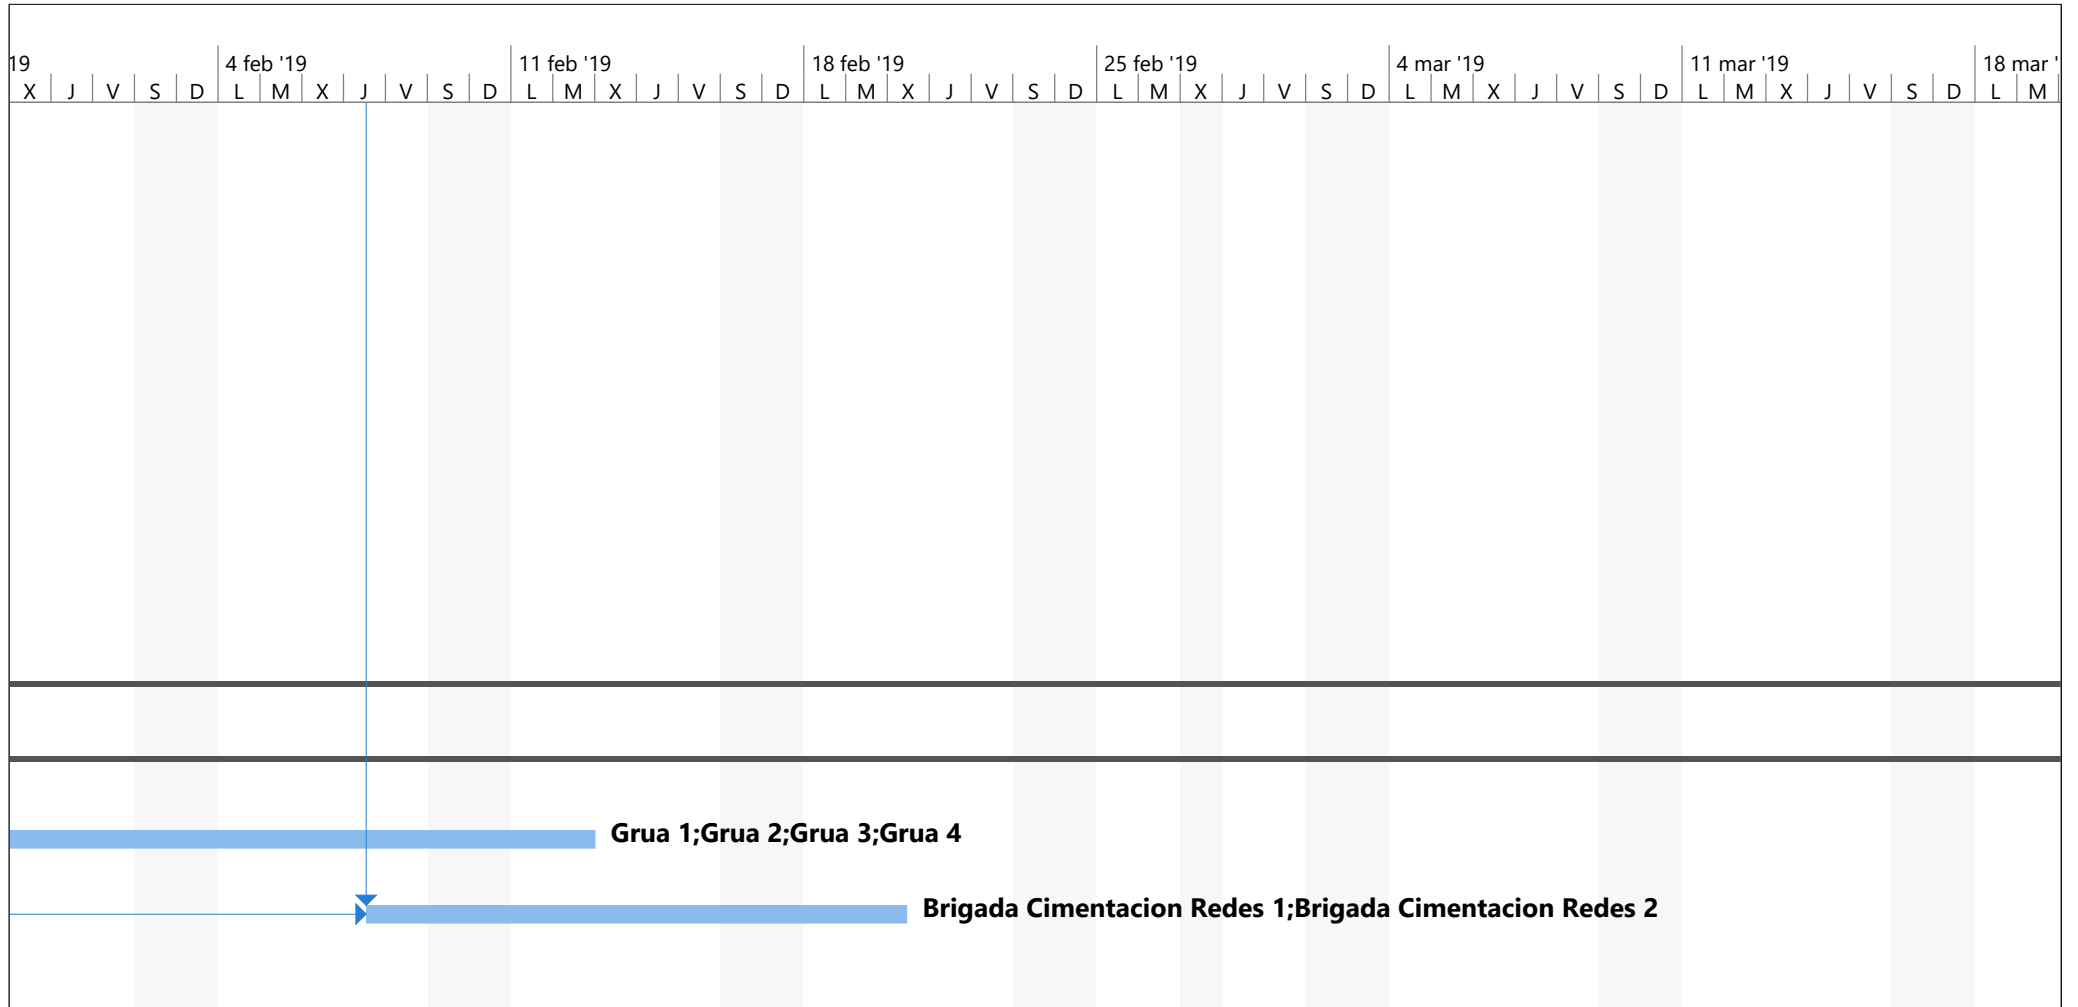


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

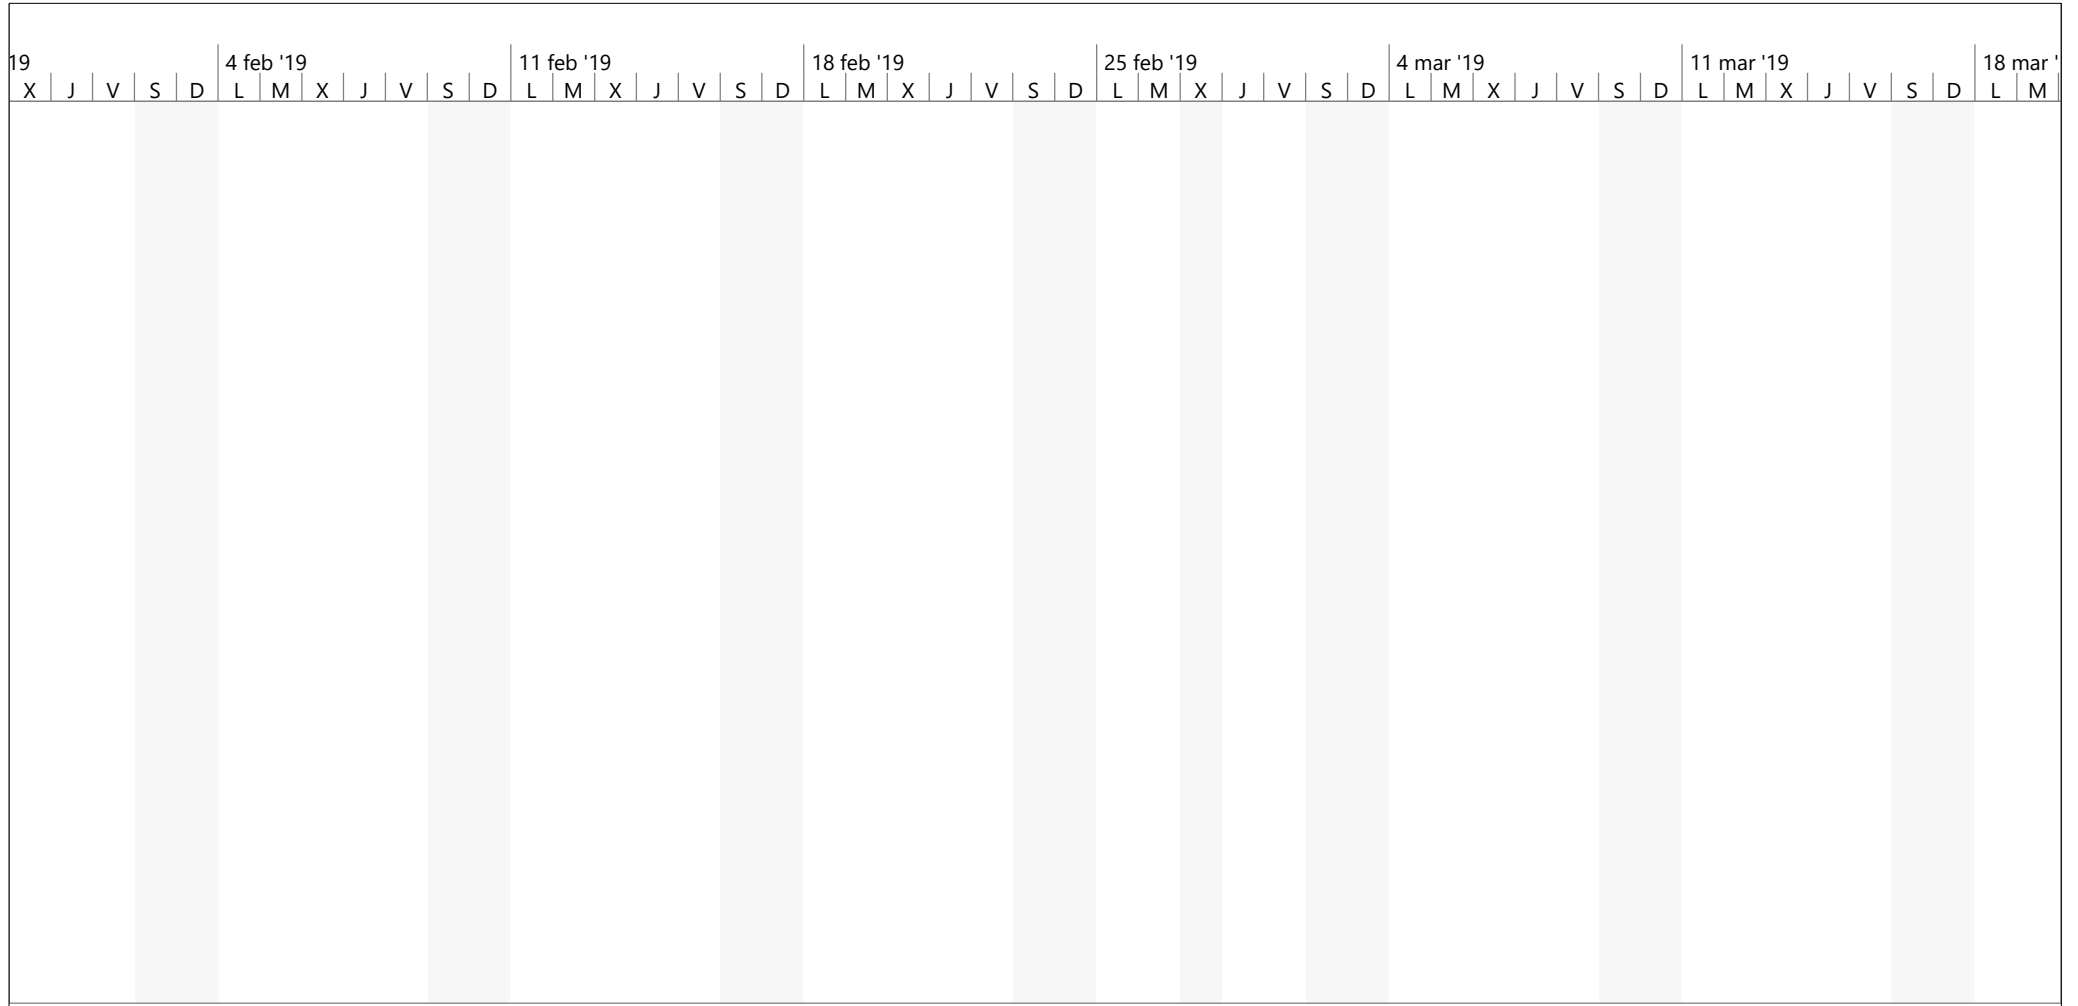


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

19 | 25 mar '19 | 1 abr '19 | 8 abr '19 | 15 abr '19 | 22 abr '19 | 29 abr '19 | 6 may '19
 X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M


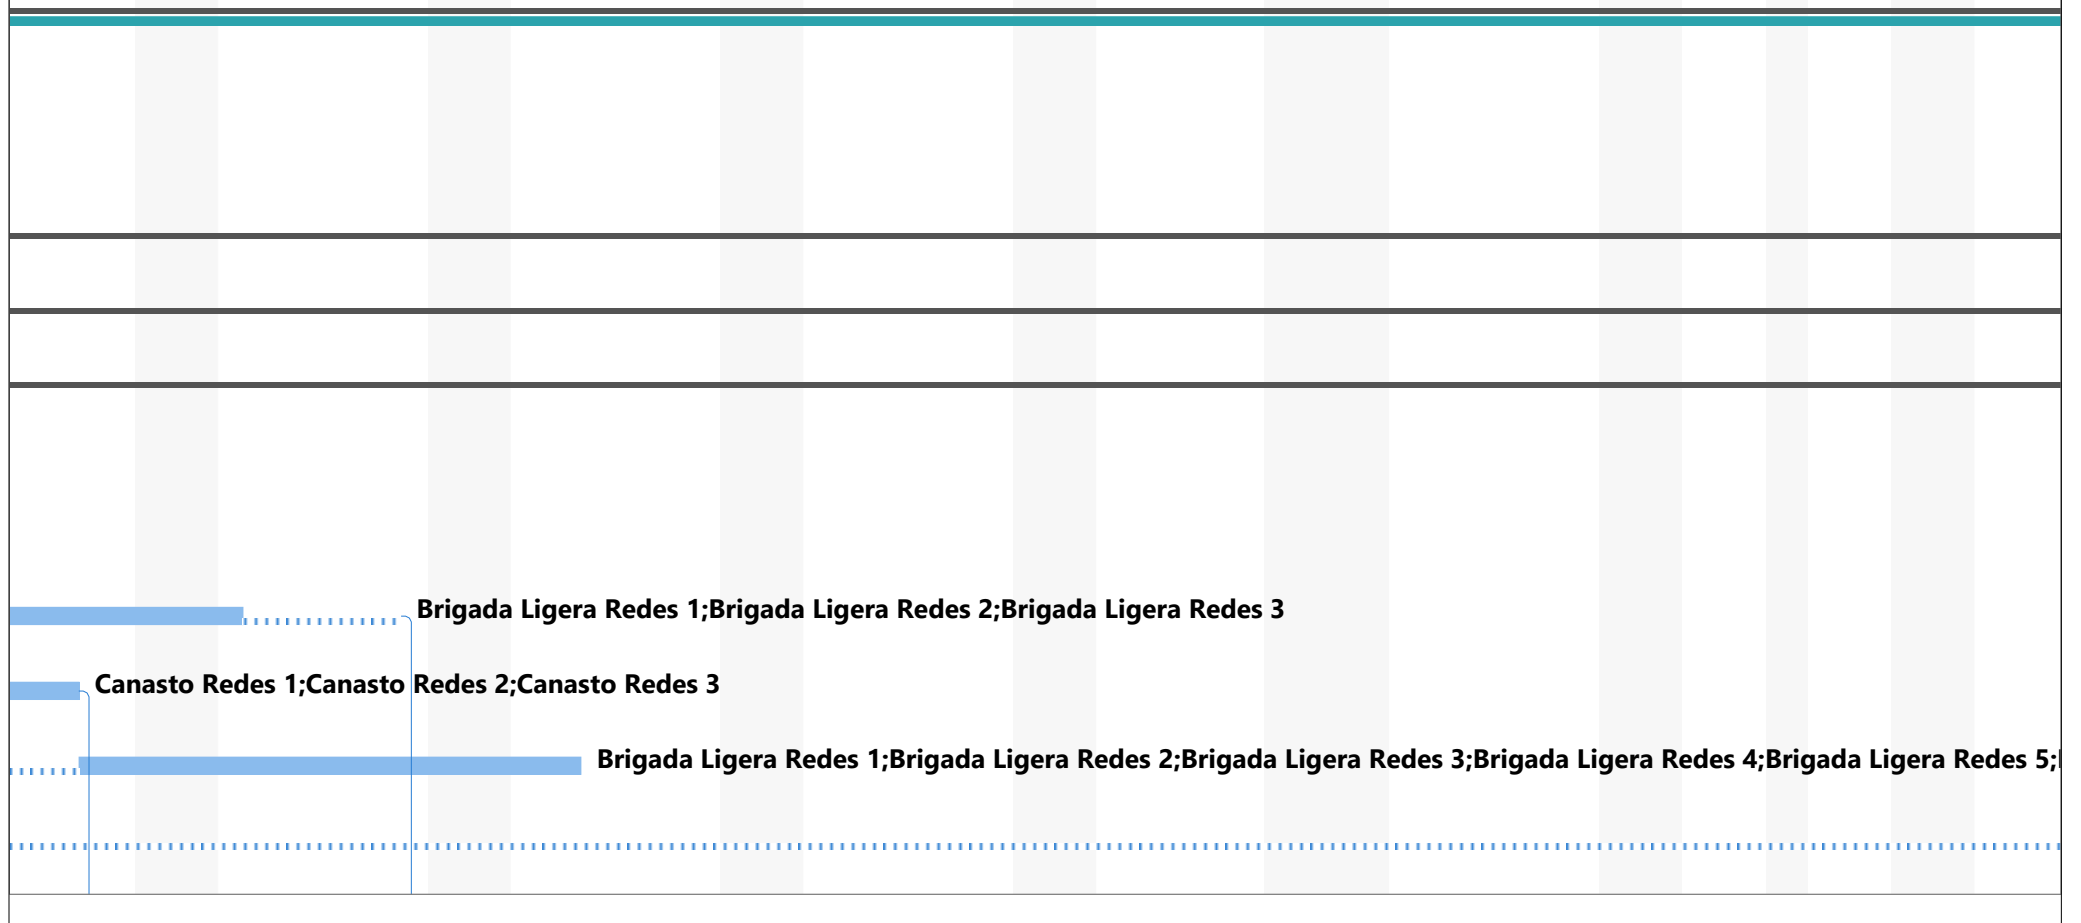


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

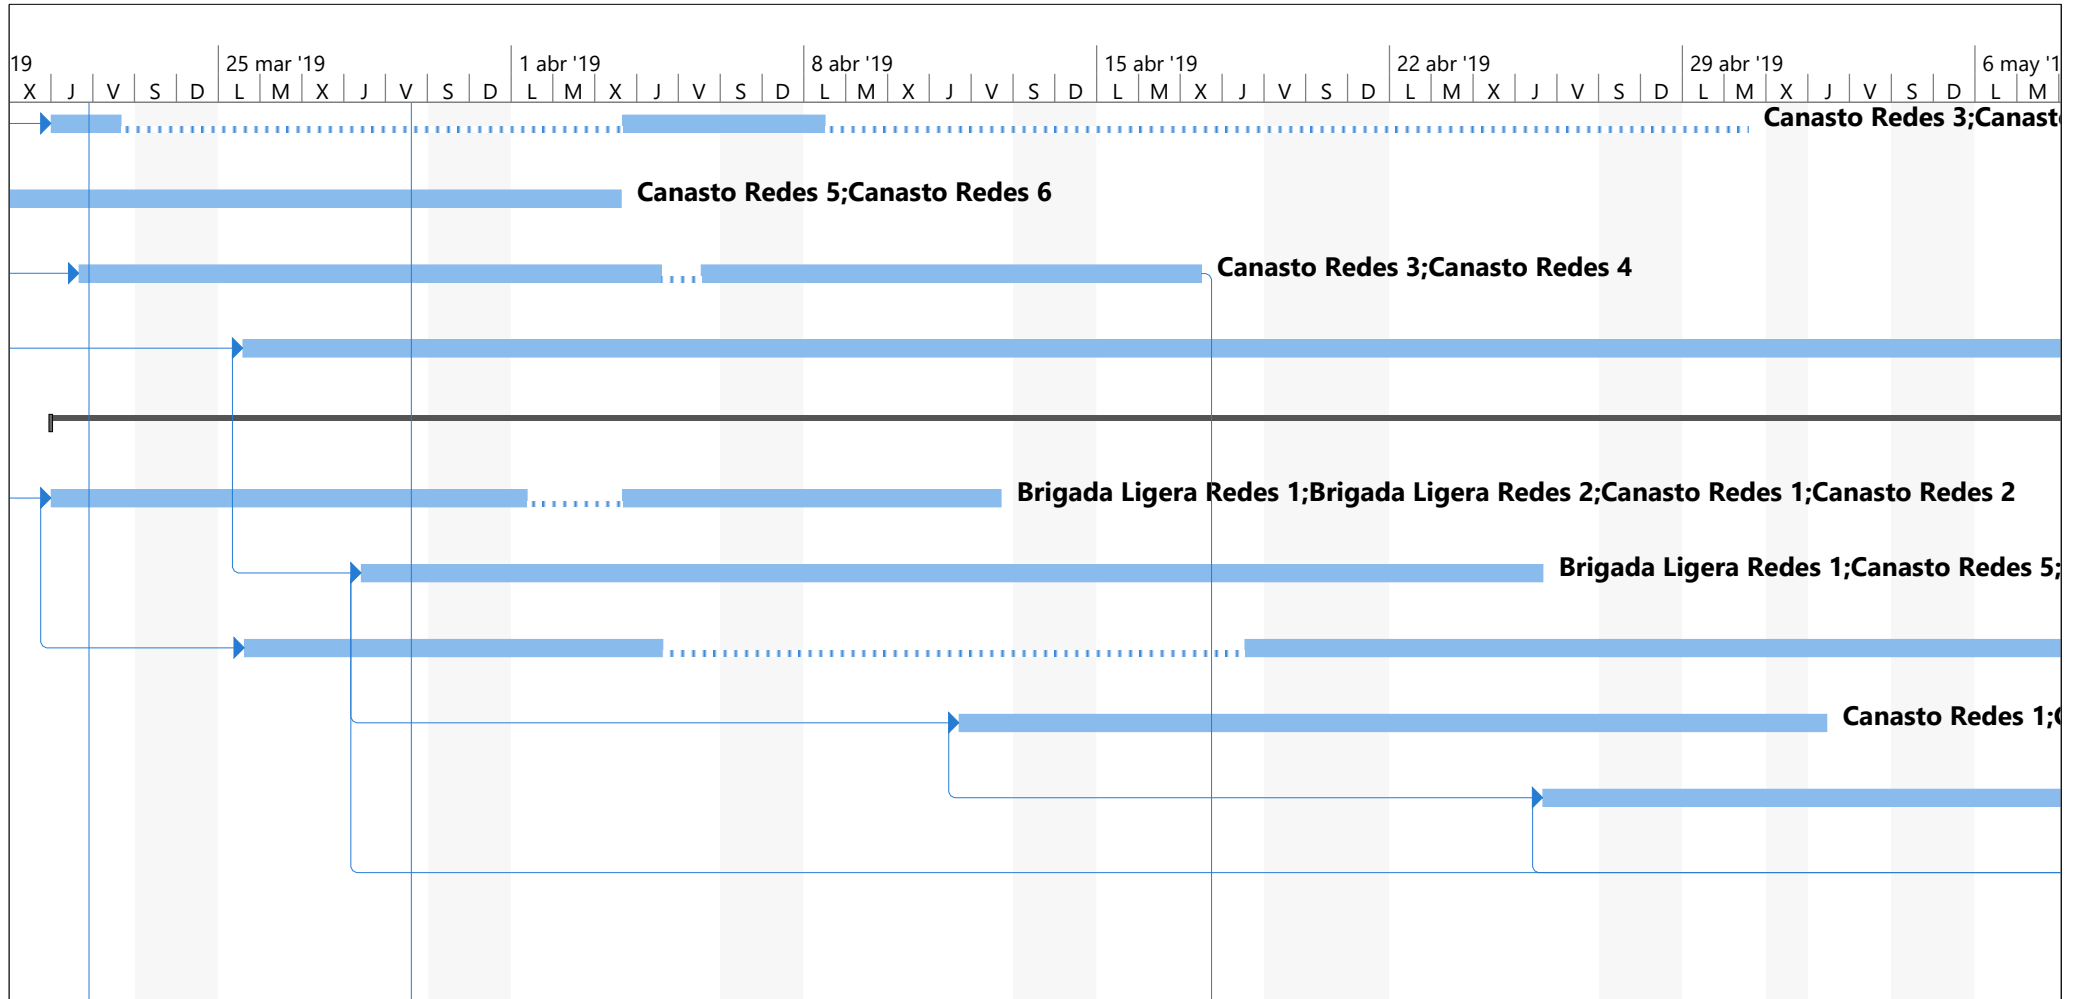


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

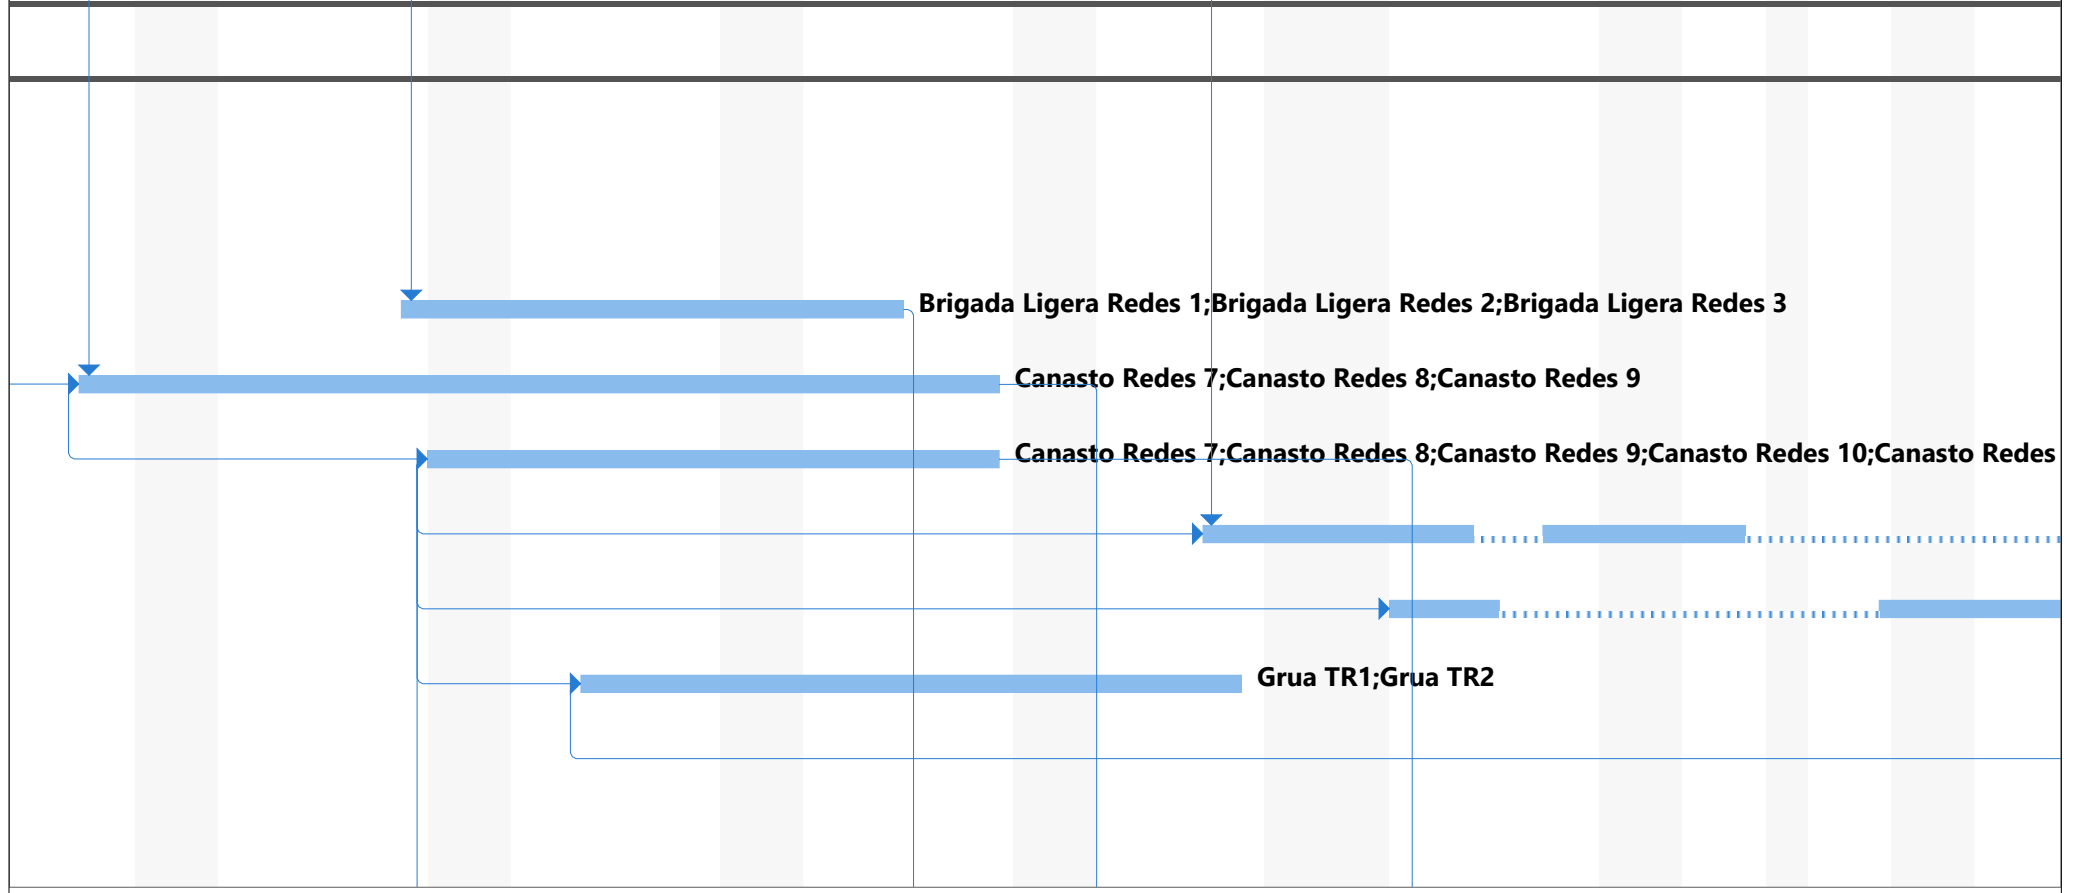


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

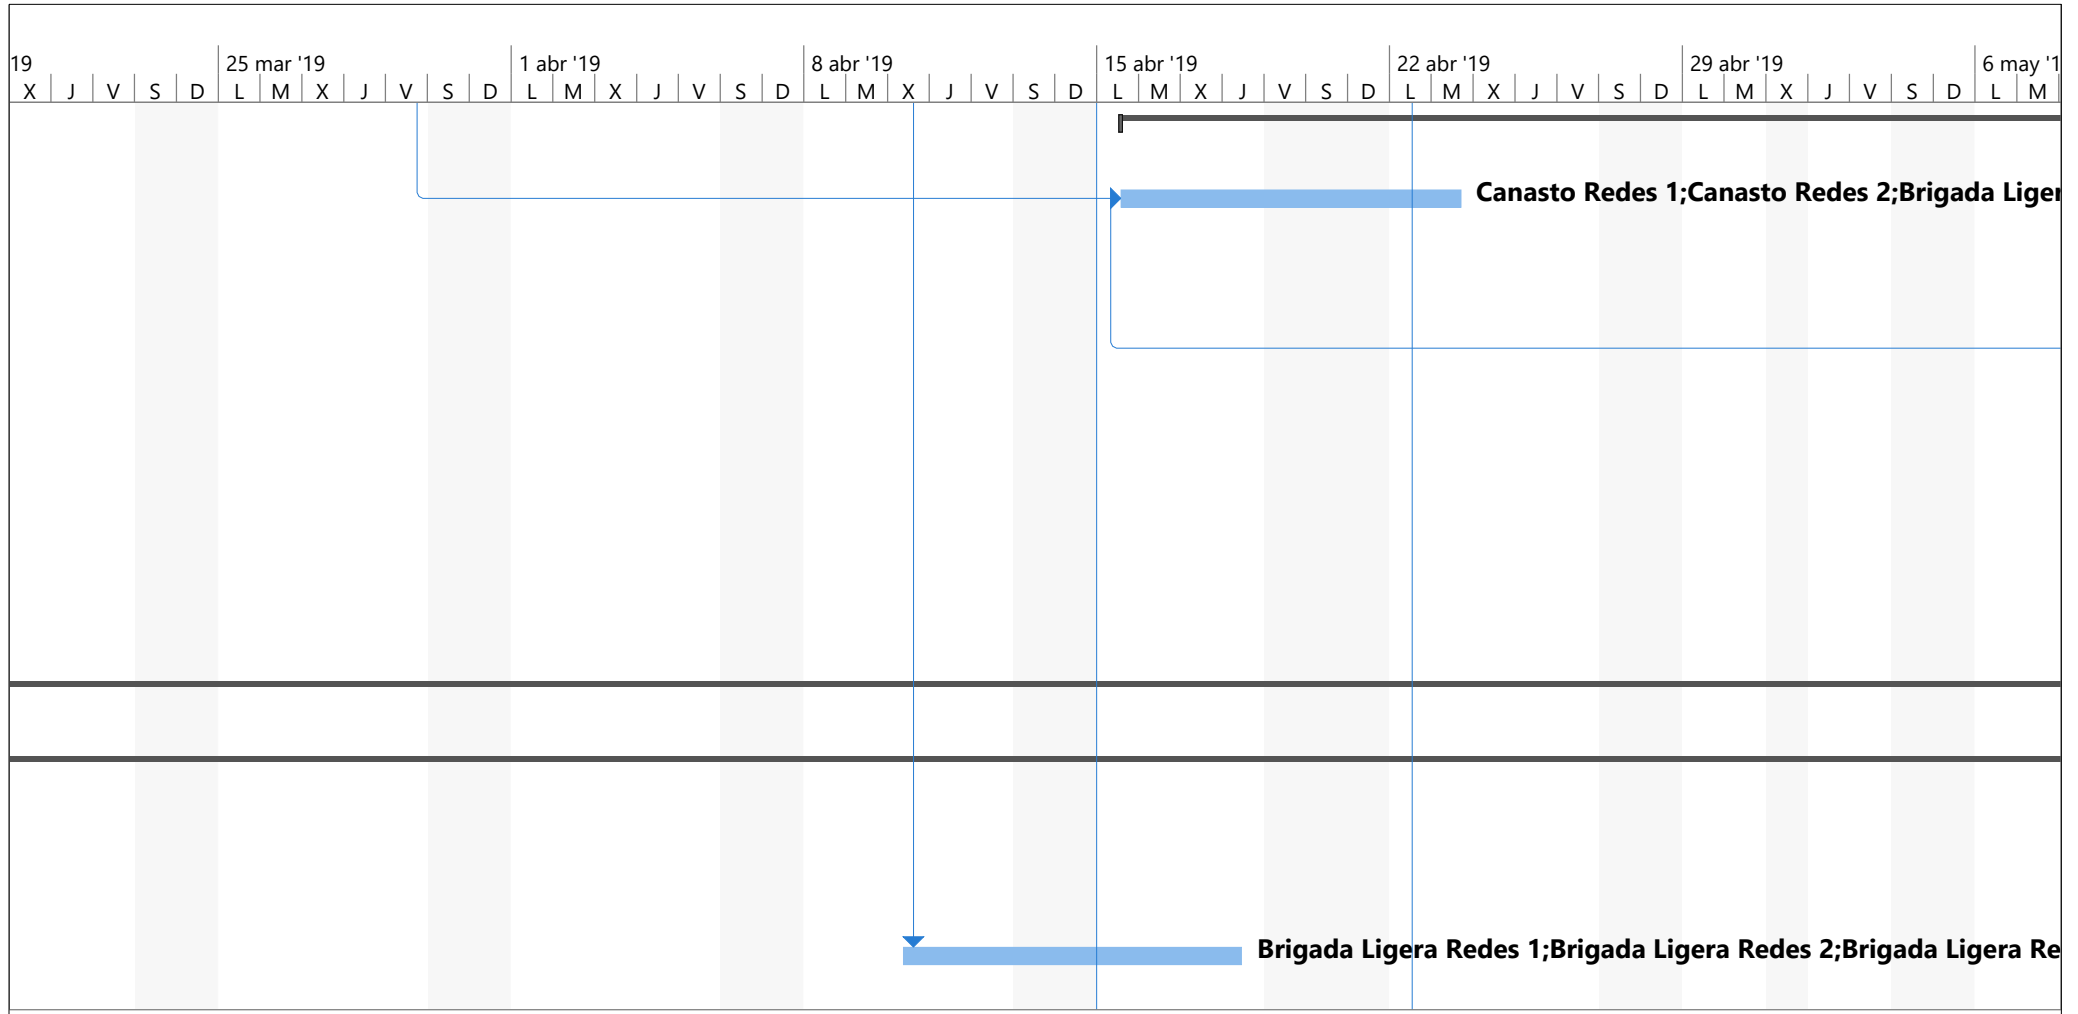


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

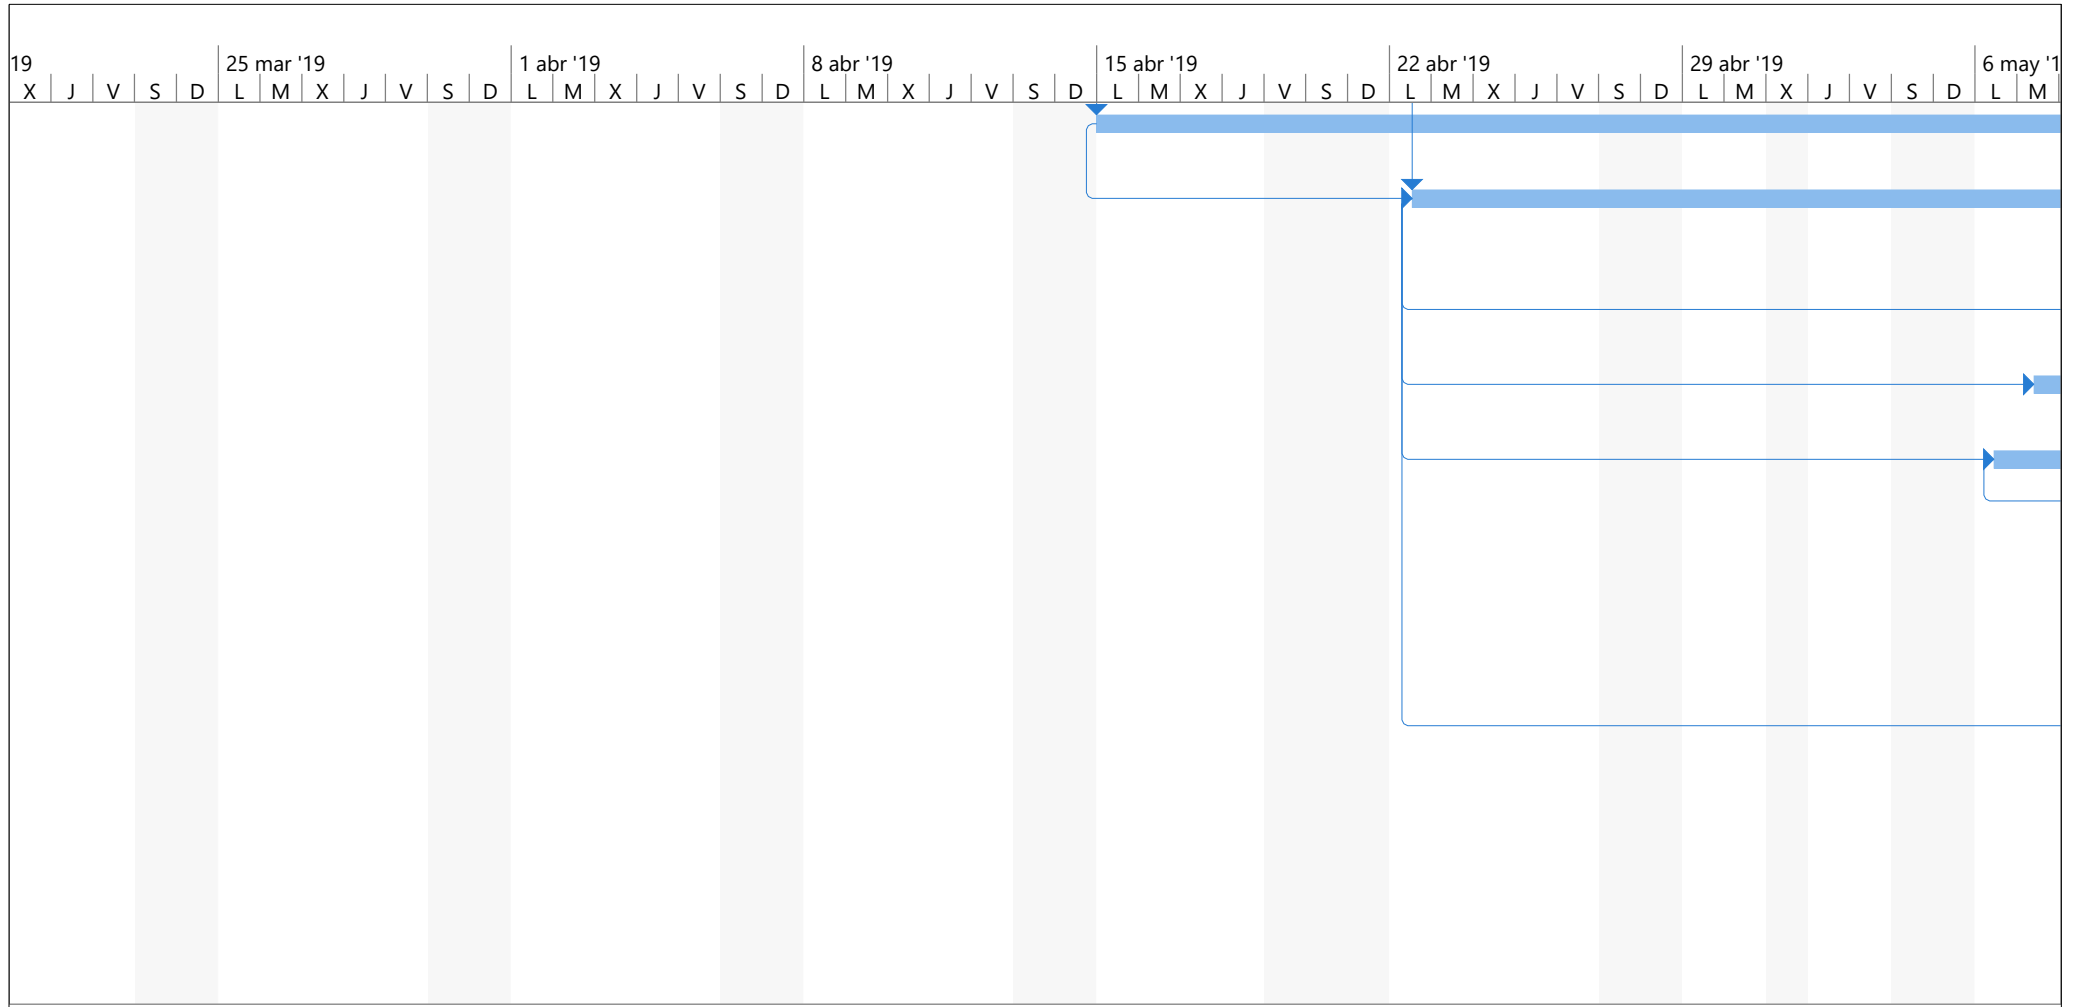


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

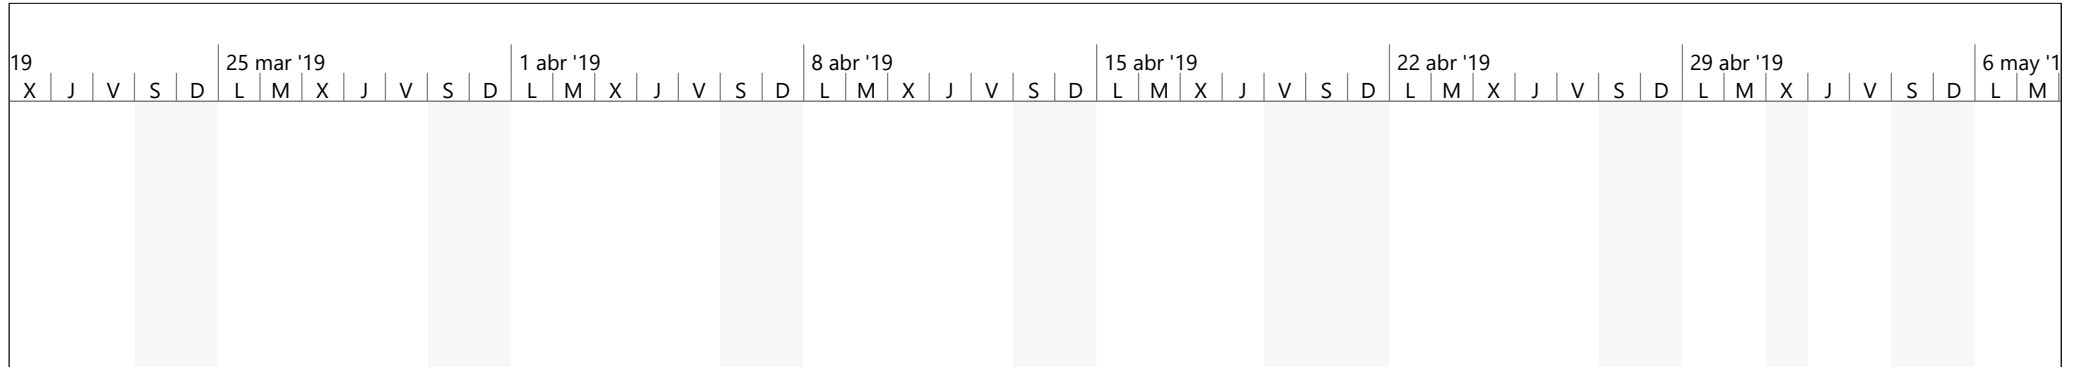

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

9 | X | J | V | S | D | 13 may '19 | L | M | X | J | V | S | D | 20 may '19 | L | M | X | J | V | S | D | 27 may '19 | L | M | X | J | V | S | D | 3 jun '19 | L | M | X | J | V | S | D | 10 jun '19 | L | M | X | J | V | S | D | 17 jun '19 | L | M | X | J | V | S | D | 24 jun '19 | L | M

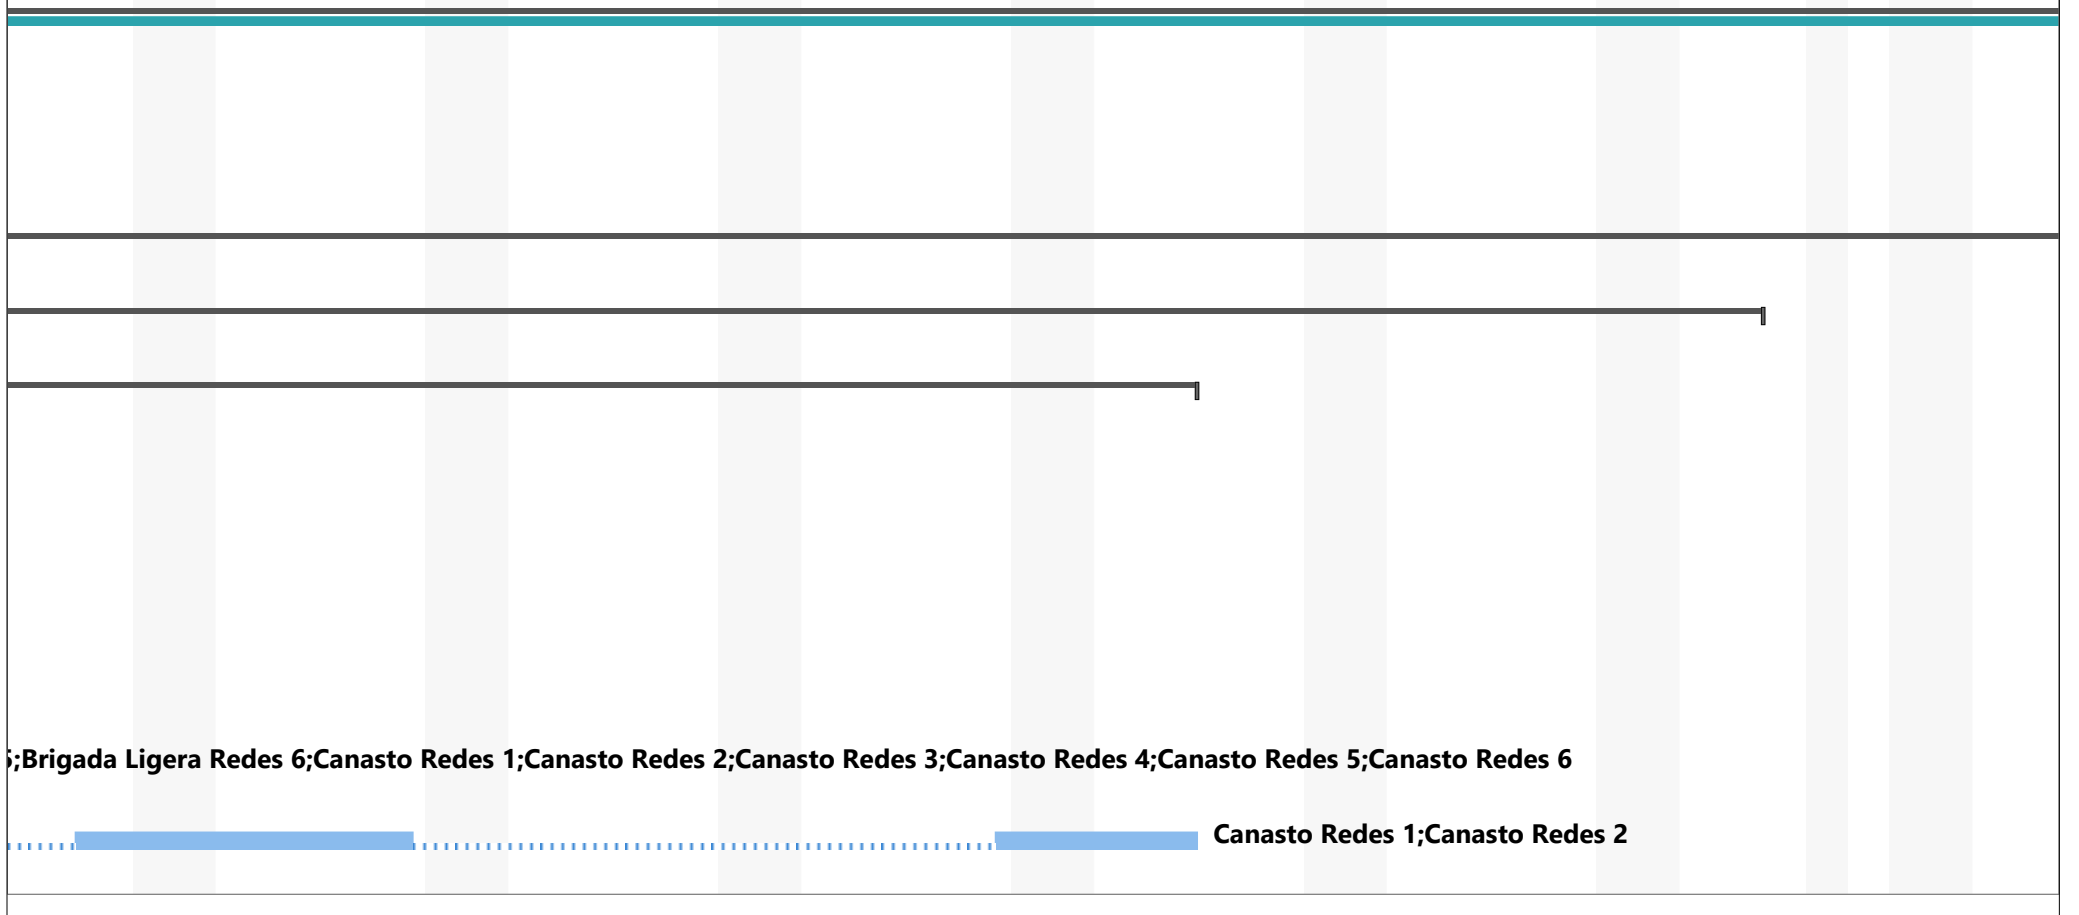


;Brigada Ligera Redes 6;Canasto Redes 1;Canasto Redes 2;Canasto Redes 3;Canasto Redes 4;Canasto Redes 5;Canasto Redes 6

Canasto Redes 1;Canasto Redes 2

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				


9 X J V S D 13 may '19 L M X J V S D 20 may '19 L M X J V S D 27 may '19 L M X J V S D 3 jun '19 L M X J V S D 10 jun '19 L M X J V S D 17 jun '19 L M X J V S D 24 jun '19 L M

s 11;Canasto Redes 12

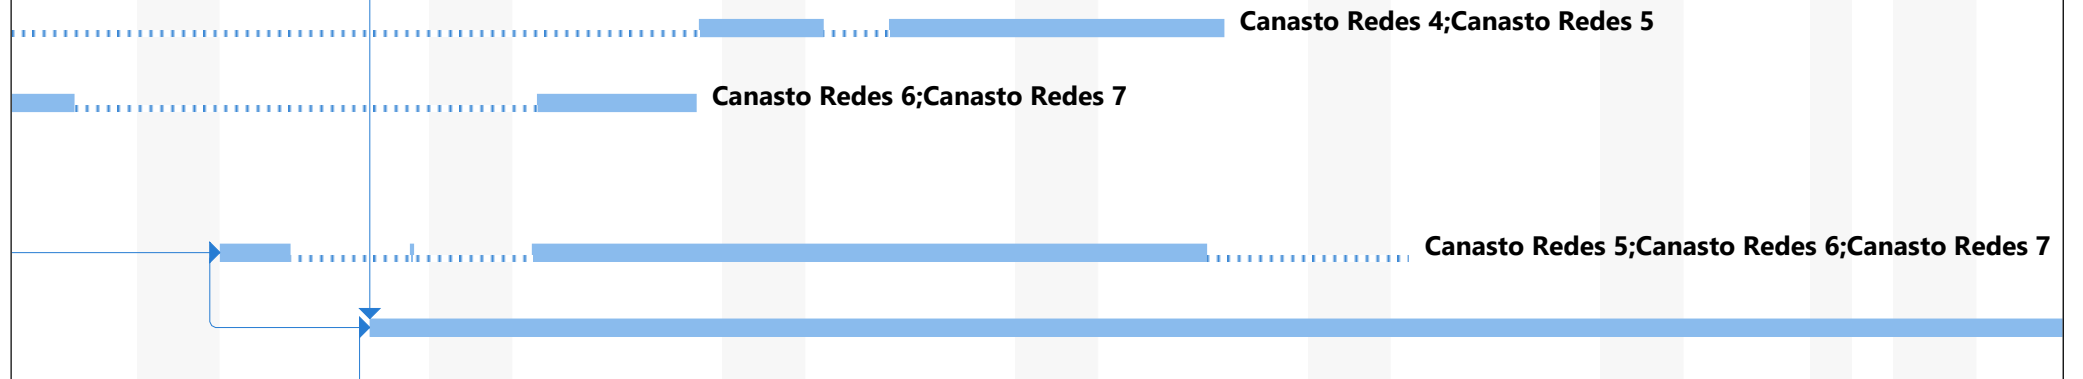

Proyecto: Cronograma NAGU10
Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




era Redes 1;Brigada Ligera Redes 2

Brigada Ligera


Redes 3

Proyecto: Cronograma NAGU10
Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

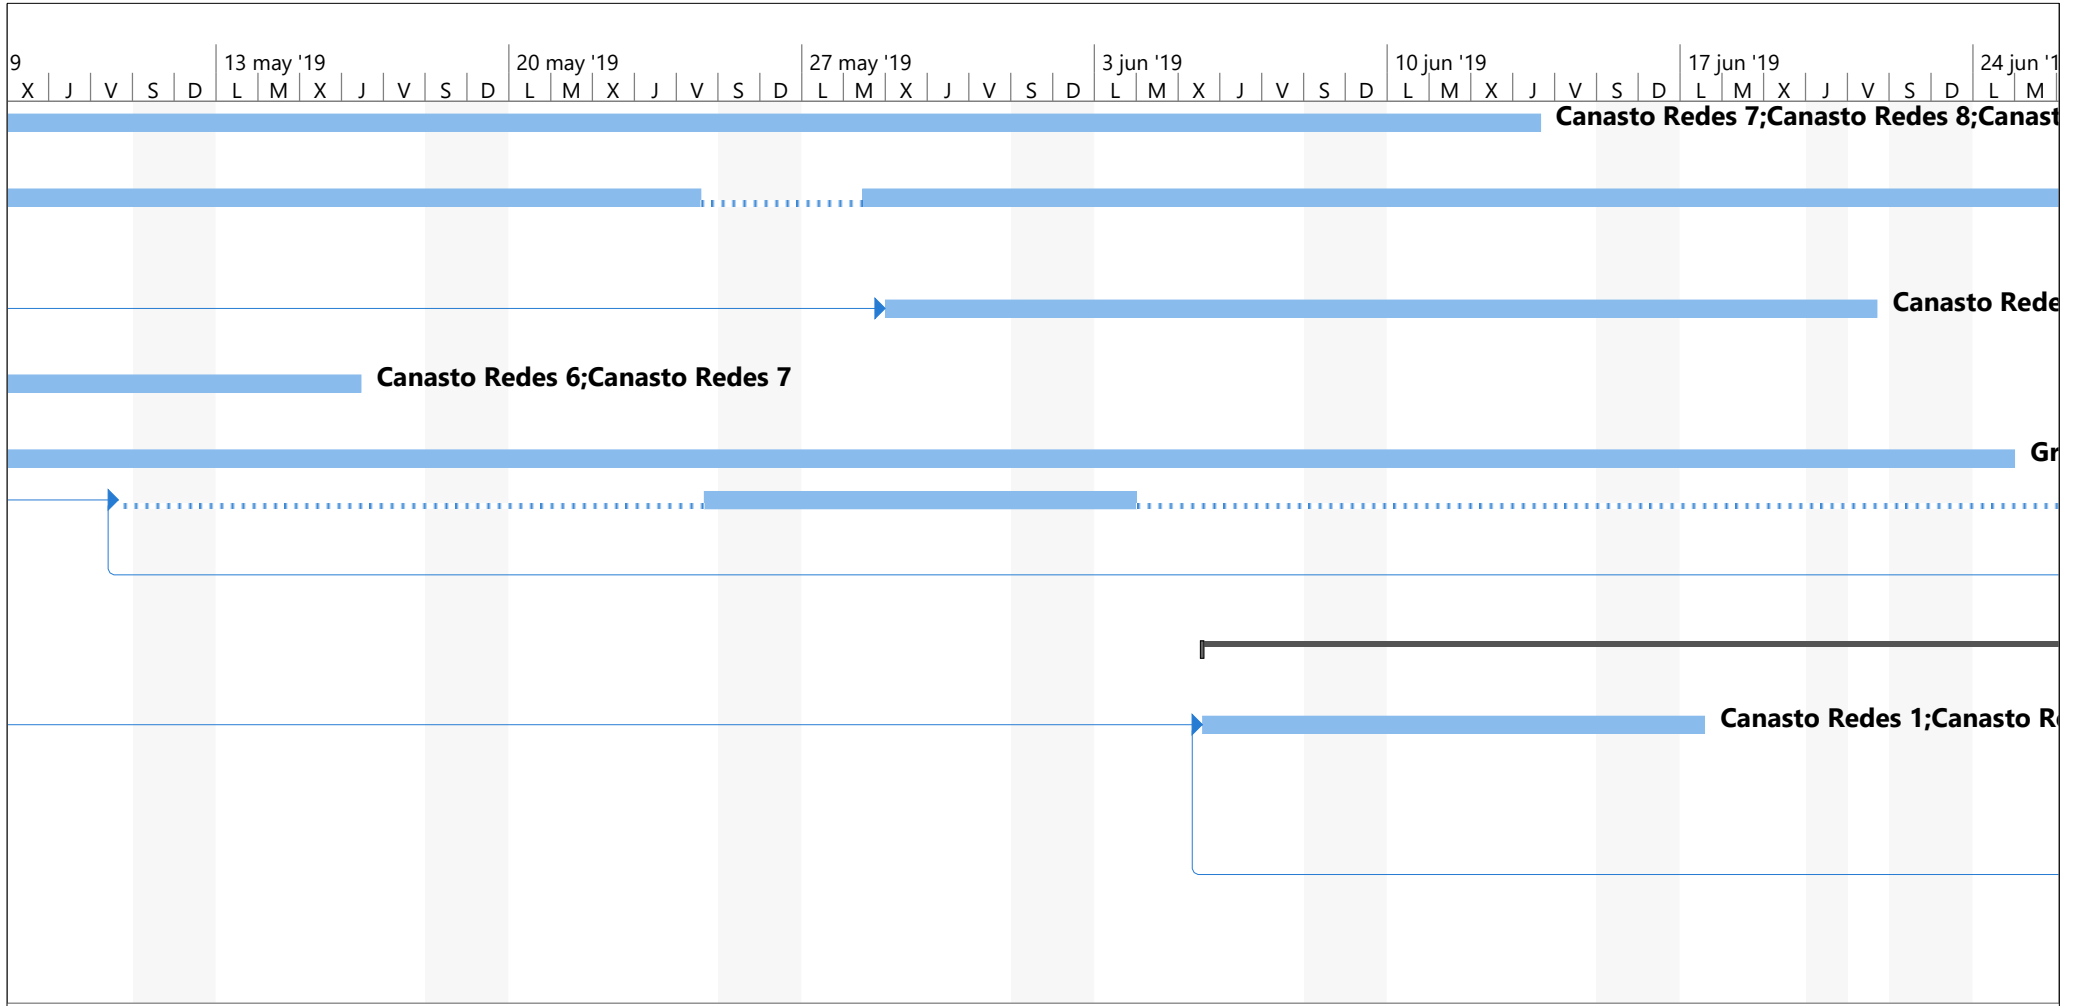


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

9 | X | J | V | S | D | 1 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 8 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 15 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 22 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 29 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 5 ago '19 | L | M | X | J | V | S | D | 12 ago '19 | L | M

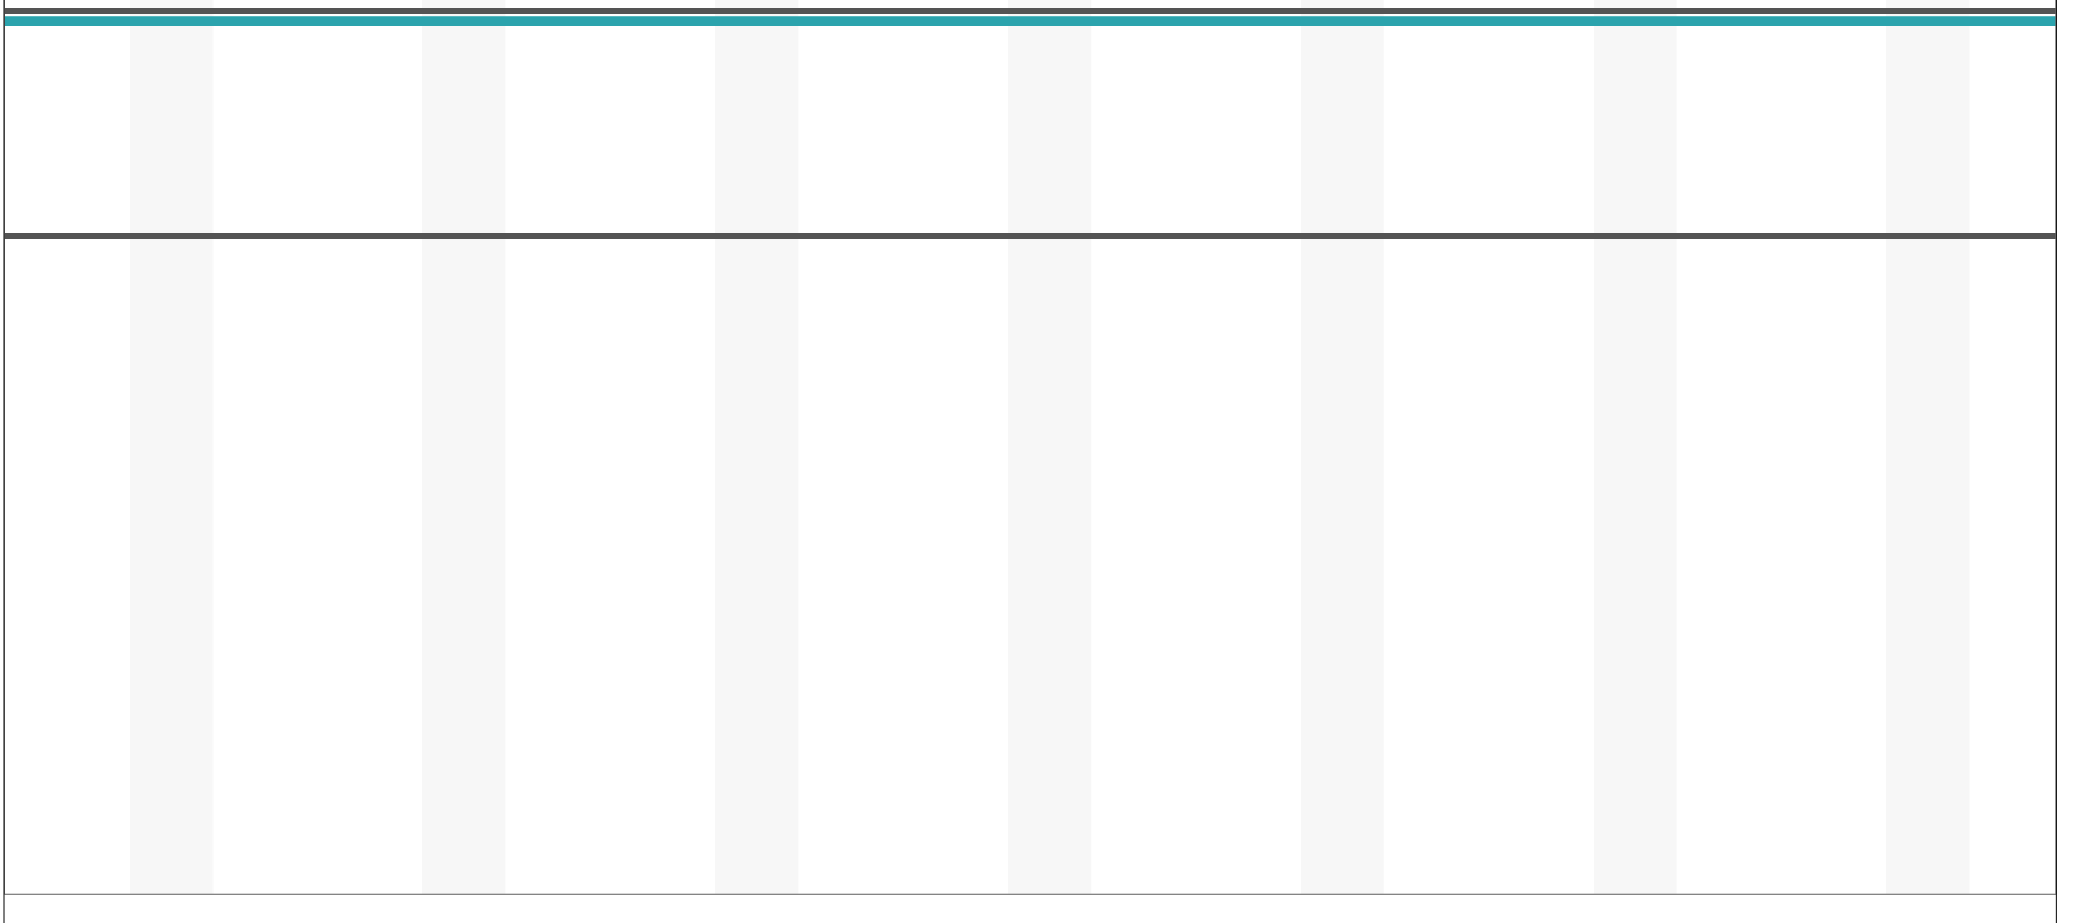


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

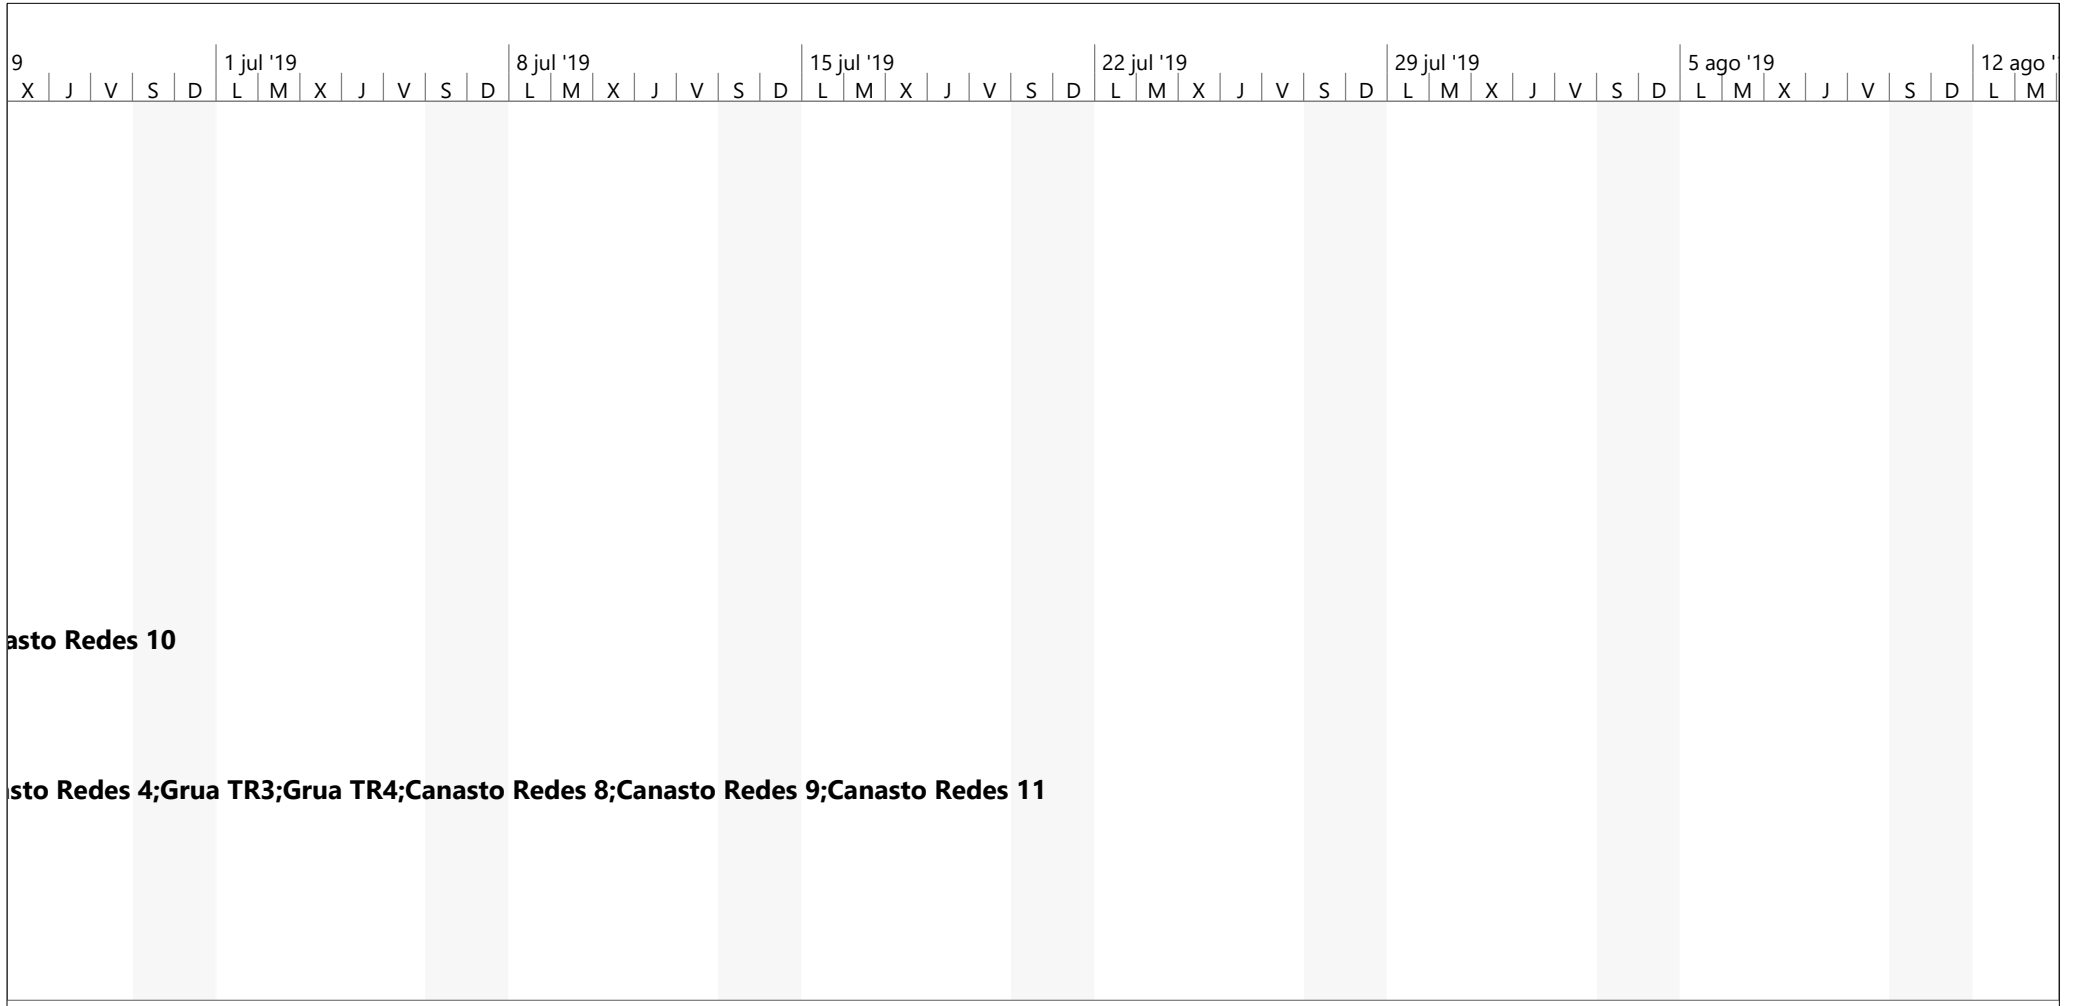

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

9 X J V S D 1 jul '19 L M X J V S D 8 jul '19 L M X J V S D 15 jul '19 L M X J V S D 22 jul '19 L M X J V S D 29 jul '19 L M X J V S D 5 ago '19 L M X J V S D 12 ago '19 L M

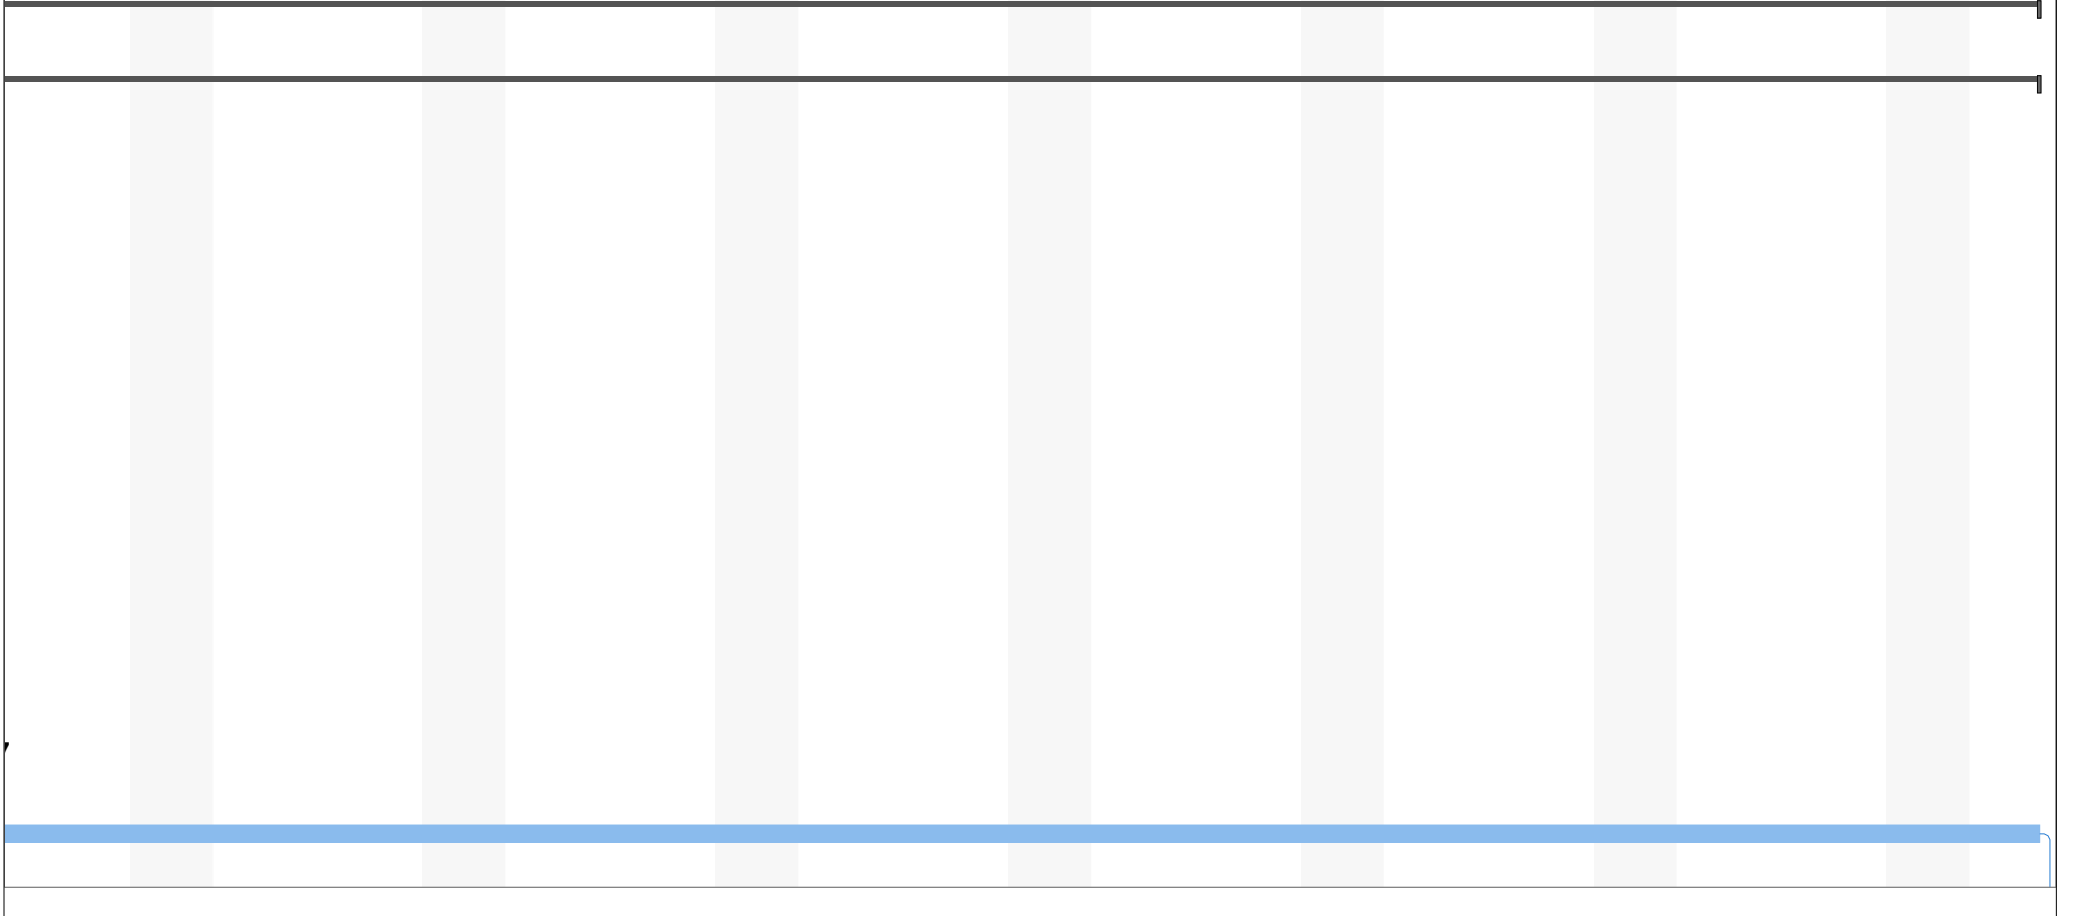

Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

9 | X | J | V | S | D | 1 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 8 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 15 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 22 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 29 jul '19 | L | M | X | J | V | S | D | 5 ago '19 | L | M | X | J | V | S | D | 12 ago '19 | L | M

ra Redes 1;Brigada Ligera Redes 2;Canasto Redes 1;Canasto Redes 3

Canasto Redes 1;Canasto Redes 2

Canasto Redes 2;Canasto Redes 8



Grua TR1;Grua TR2;Canasto Redes 1;Canasto Redes 2

Grua 1;Grua 2;Grua 3


17/7

Proyecto: Cronograma NAGU10
Fecha: mar 6/11/18


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

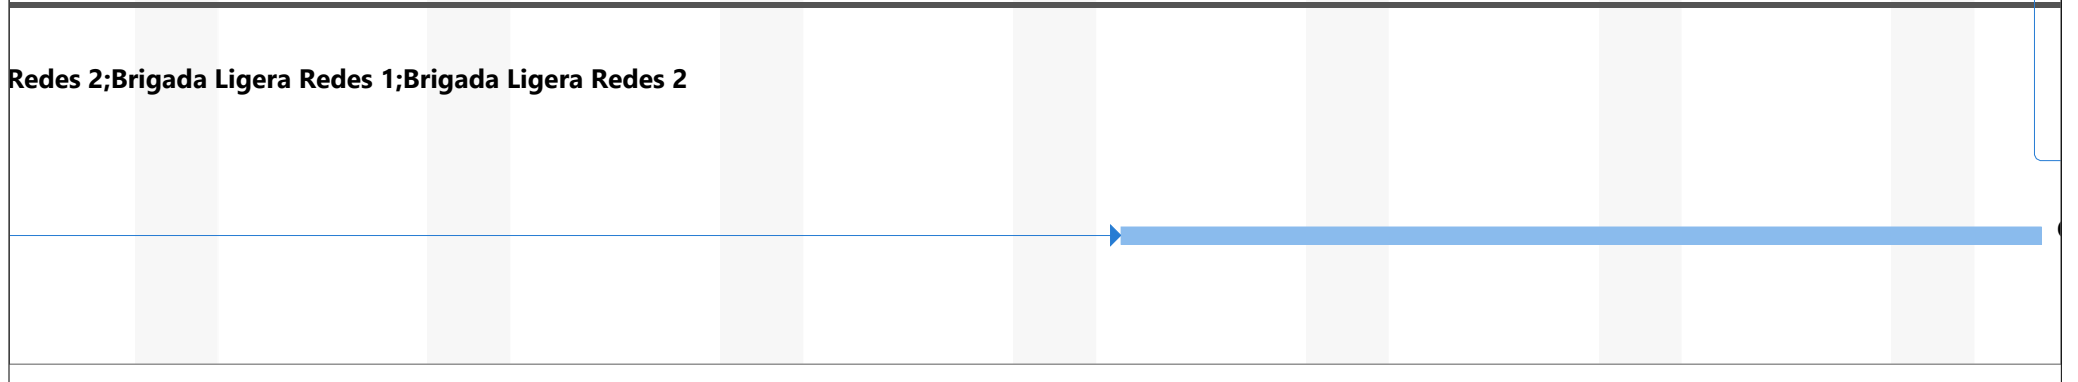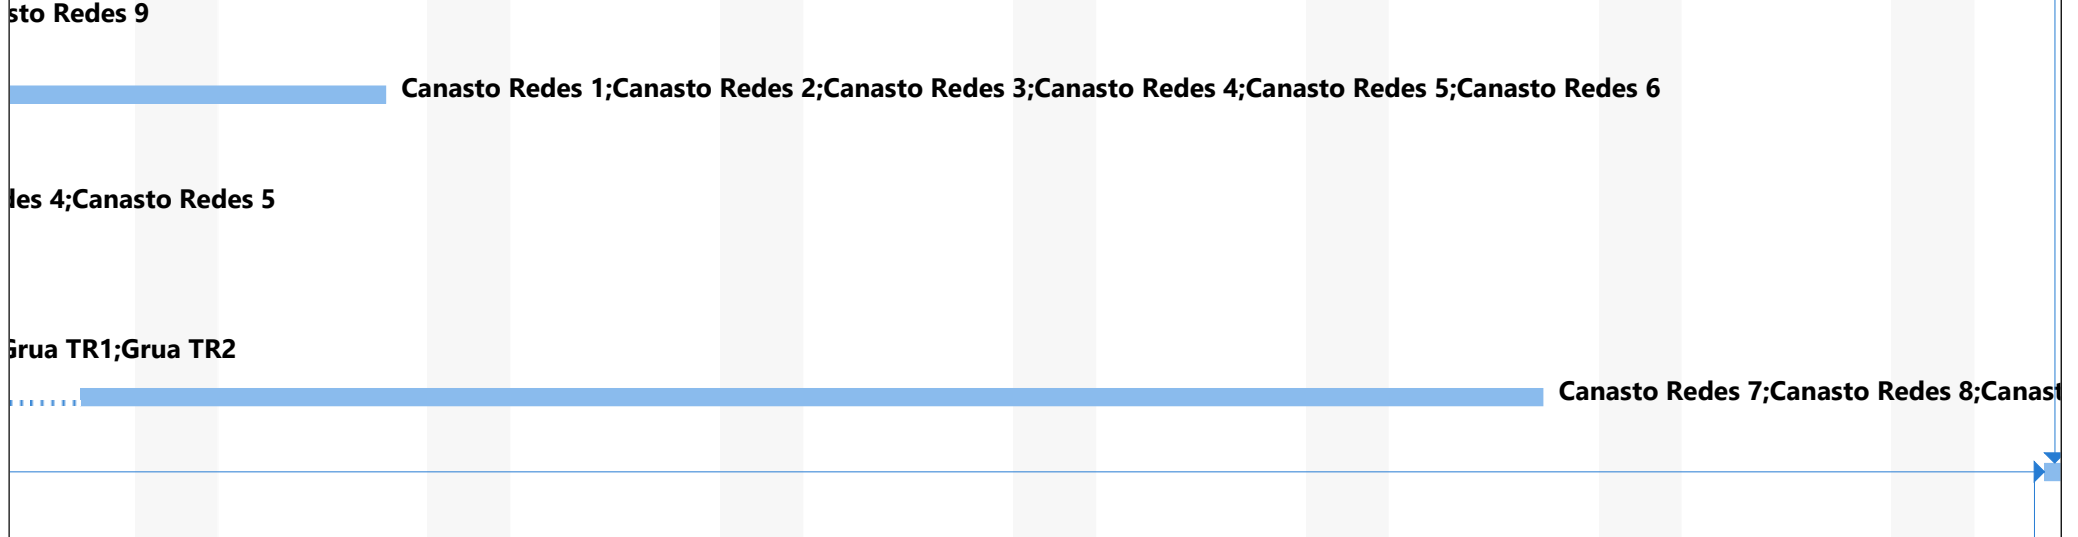


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

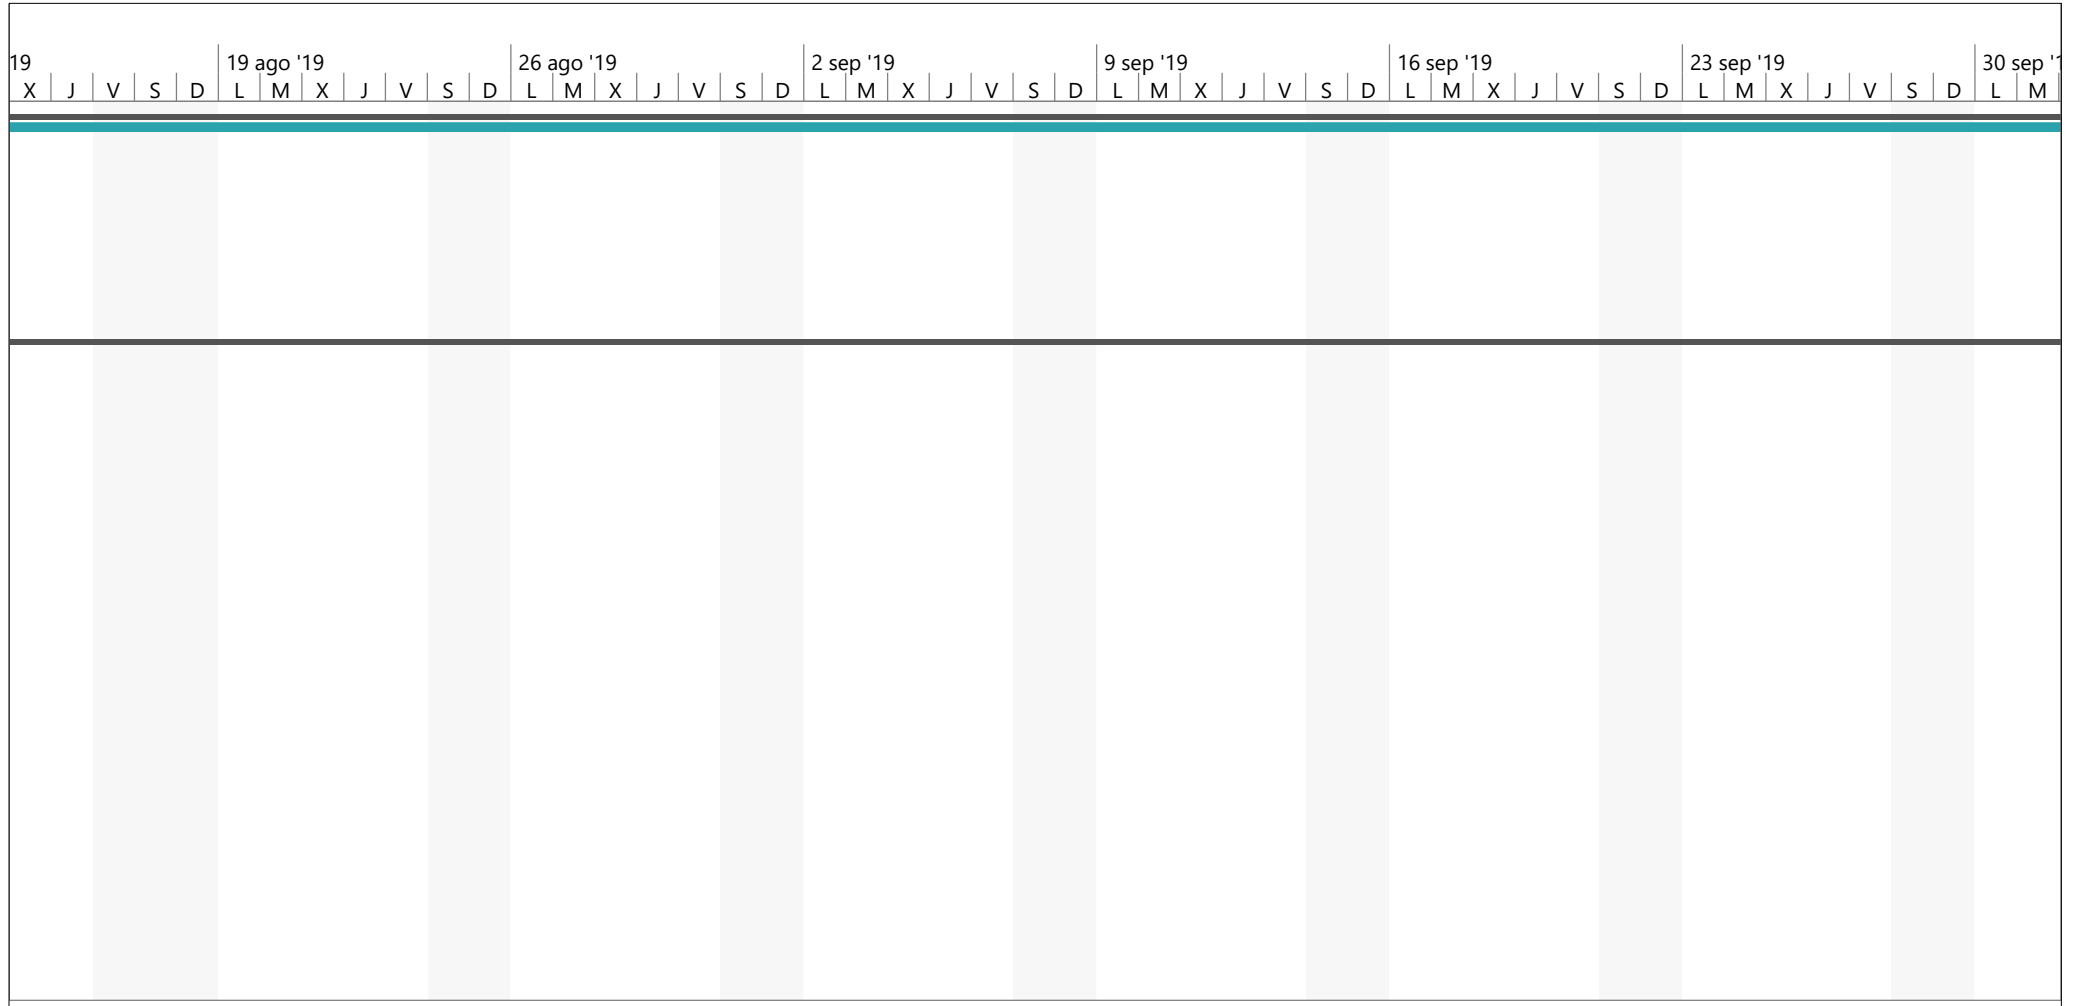


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

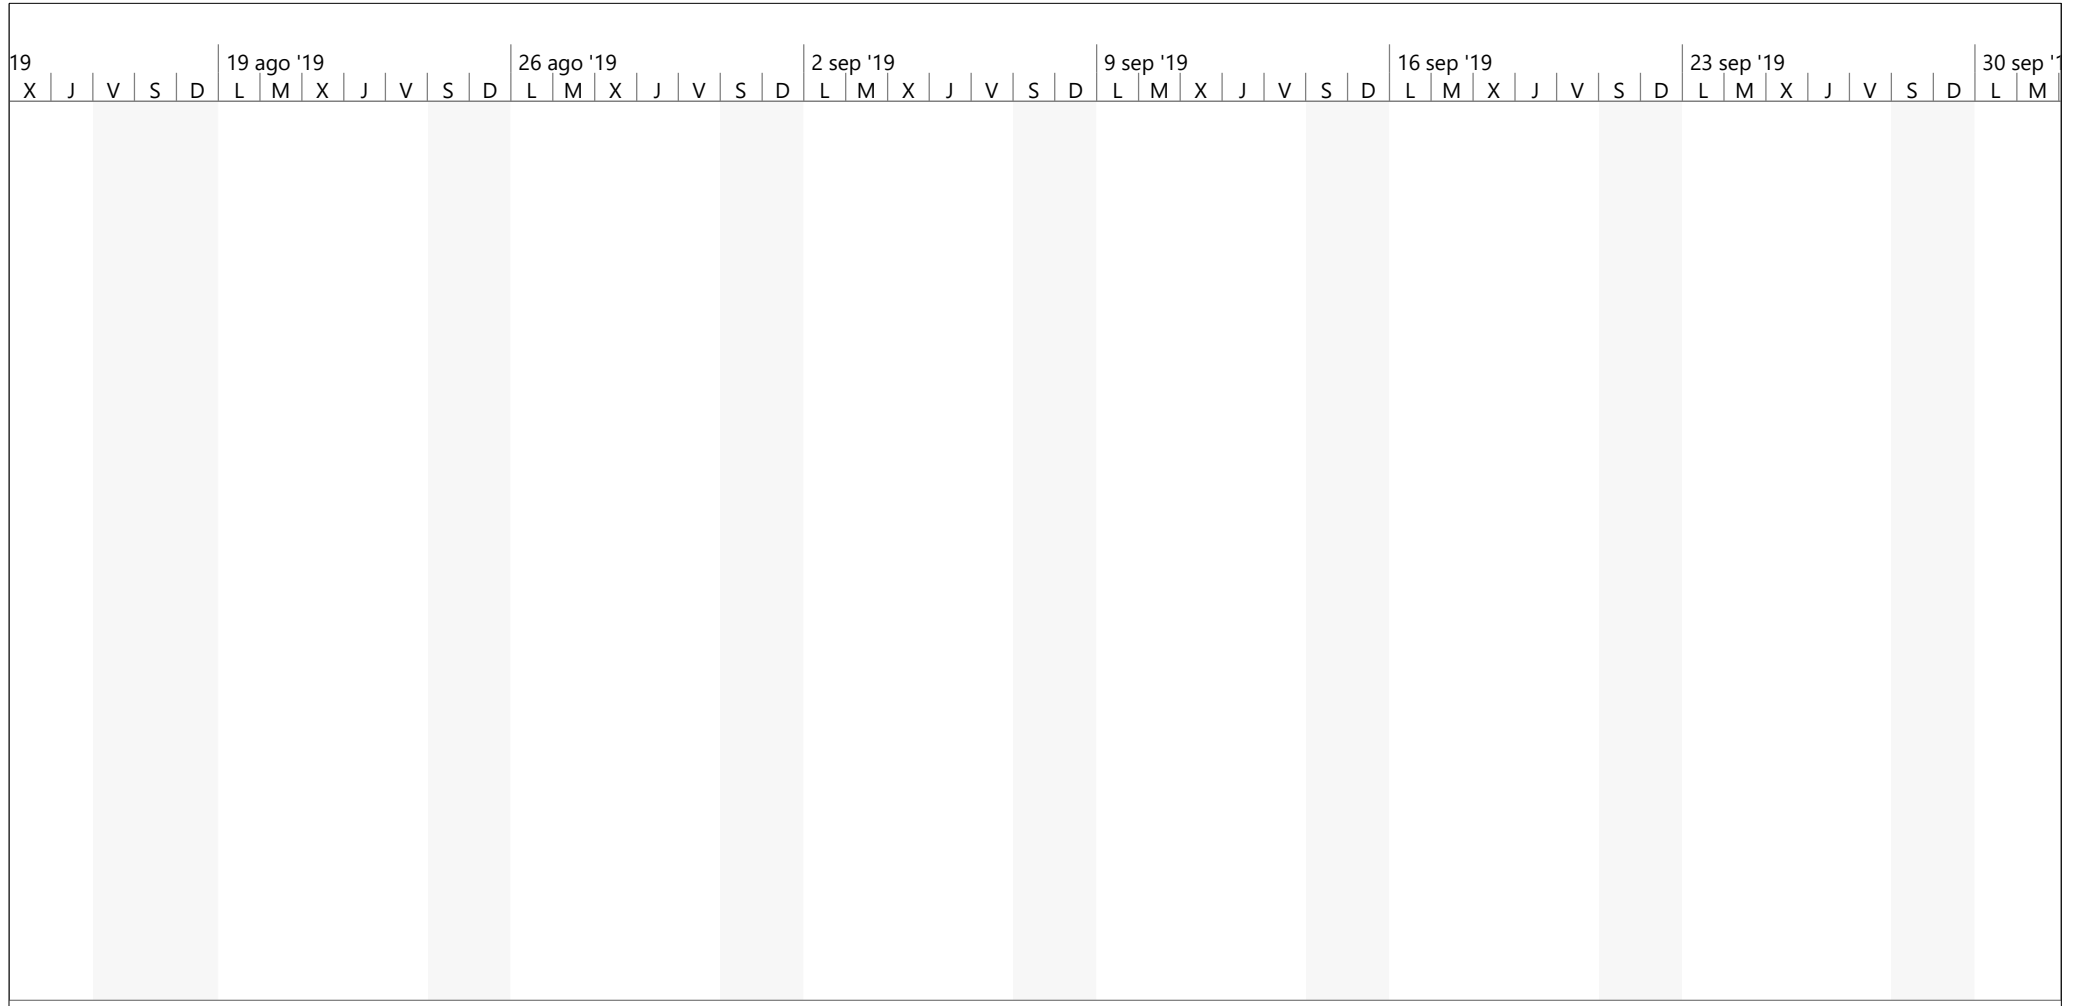

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

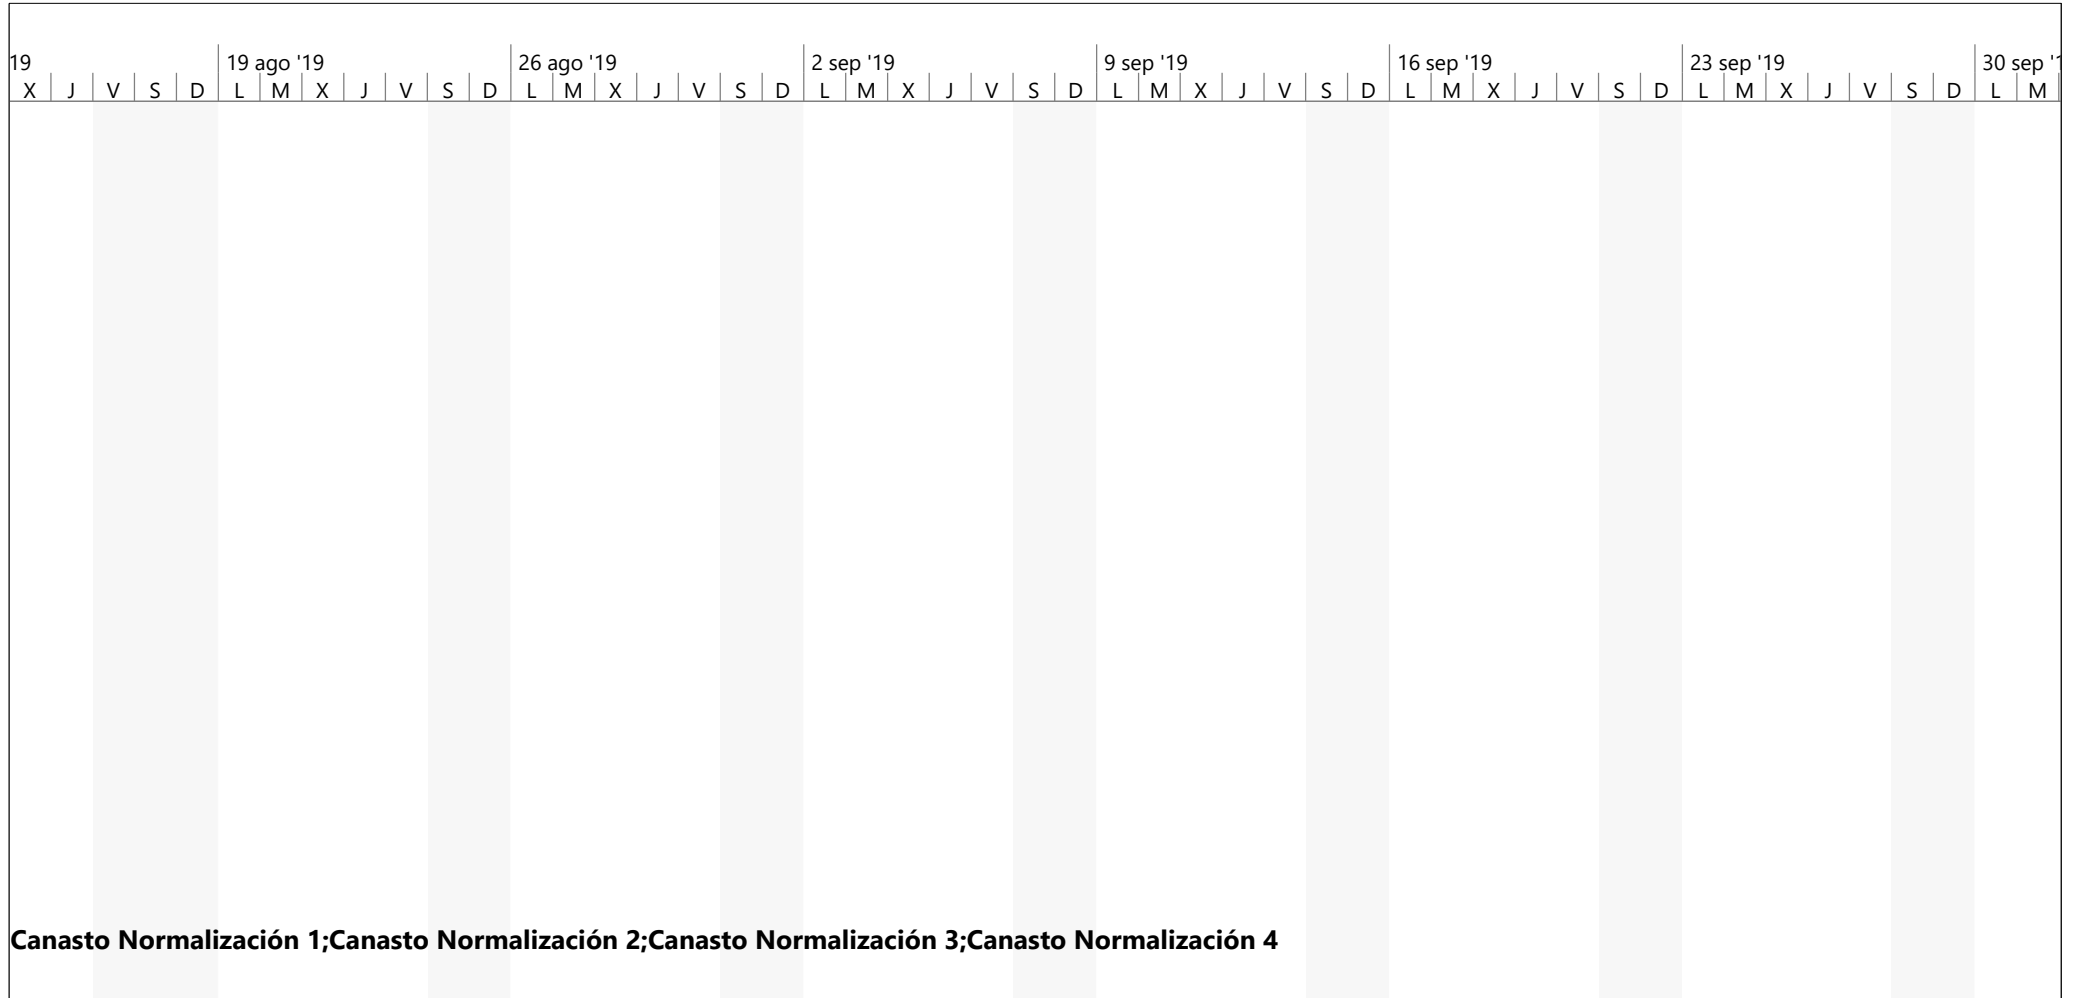


Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

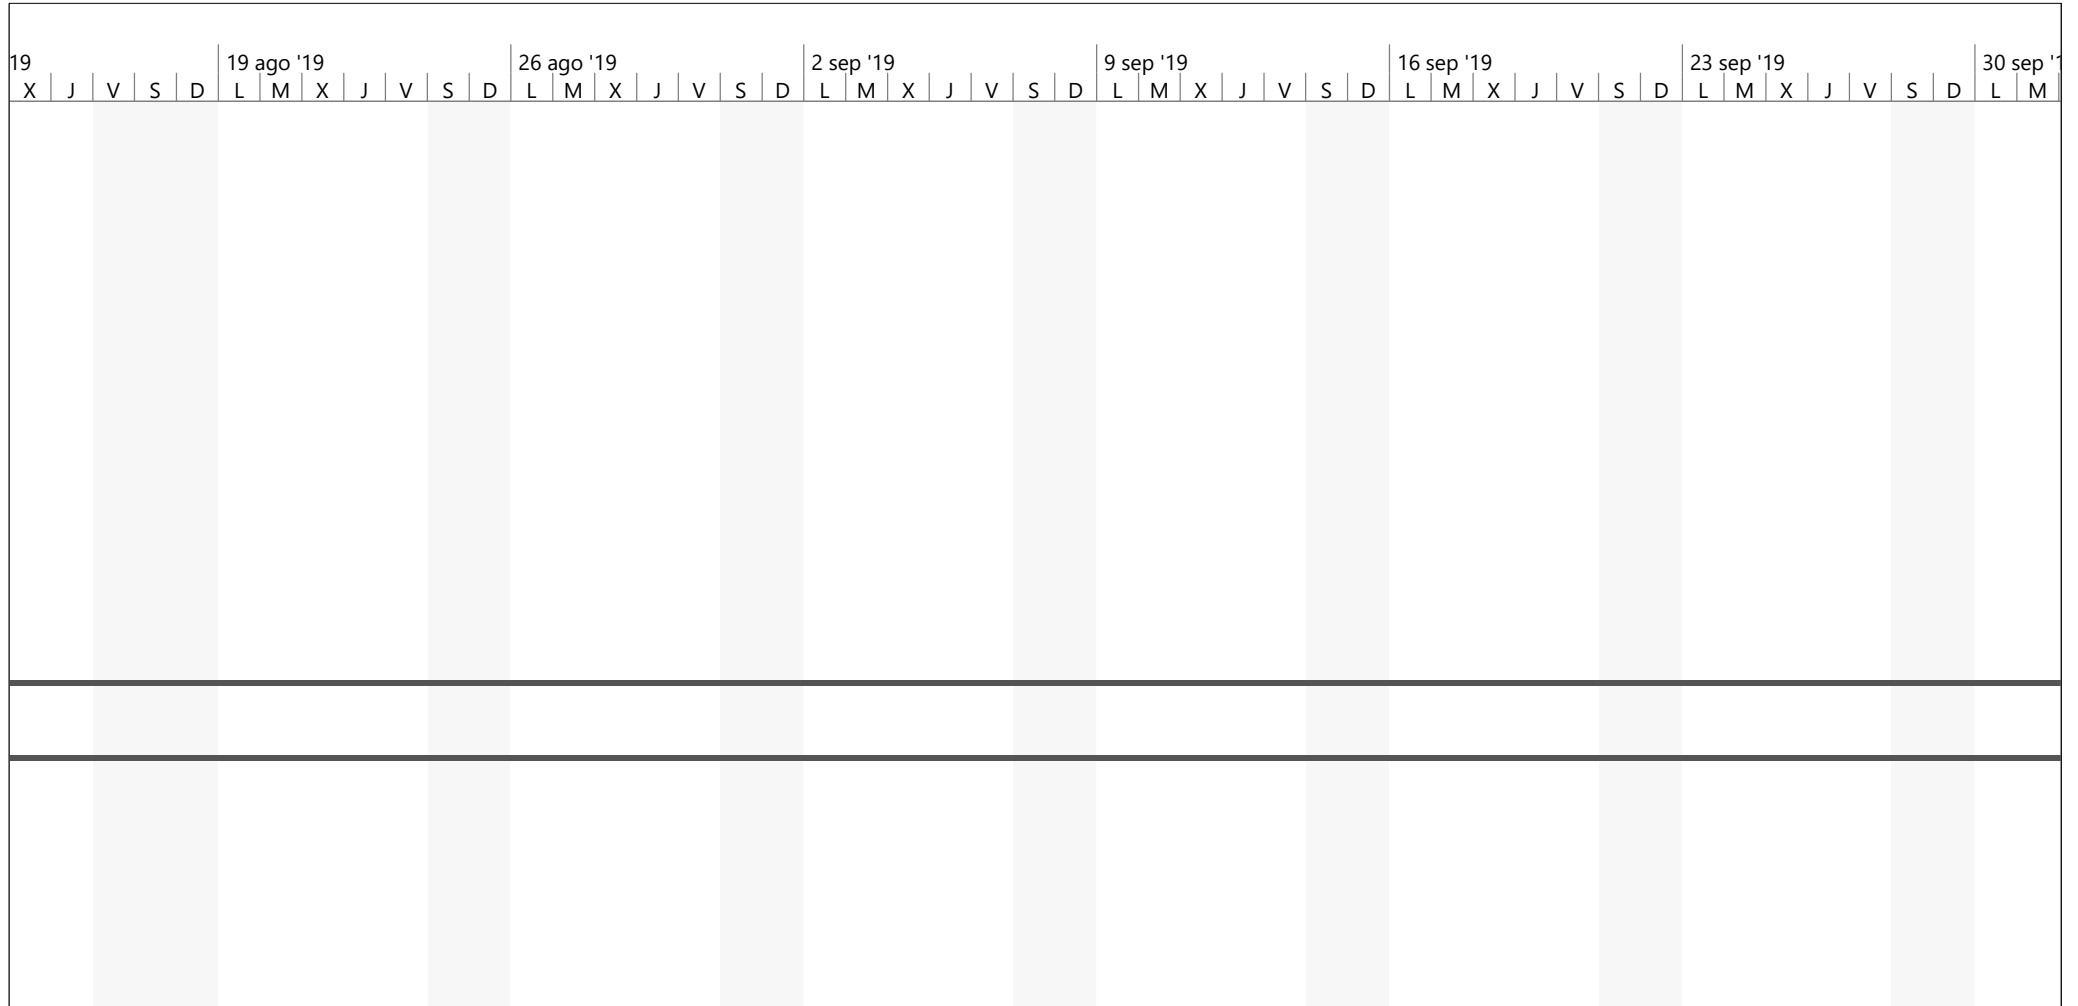


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

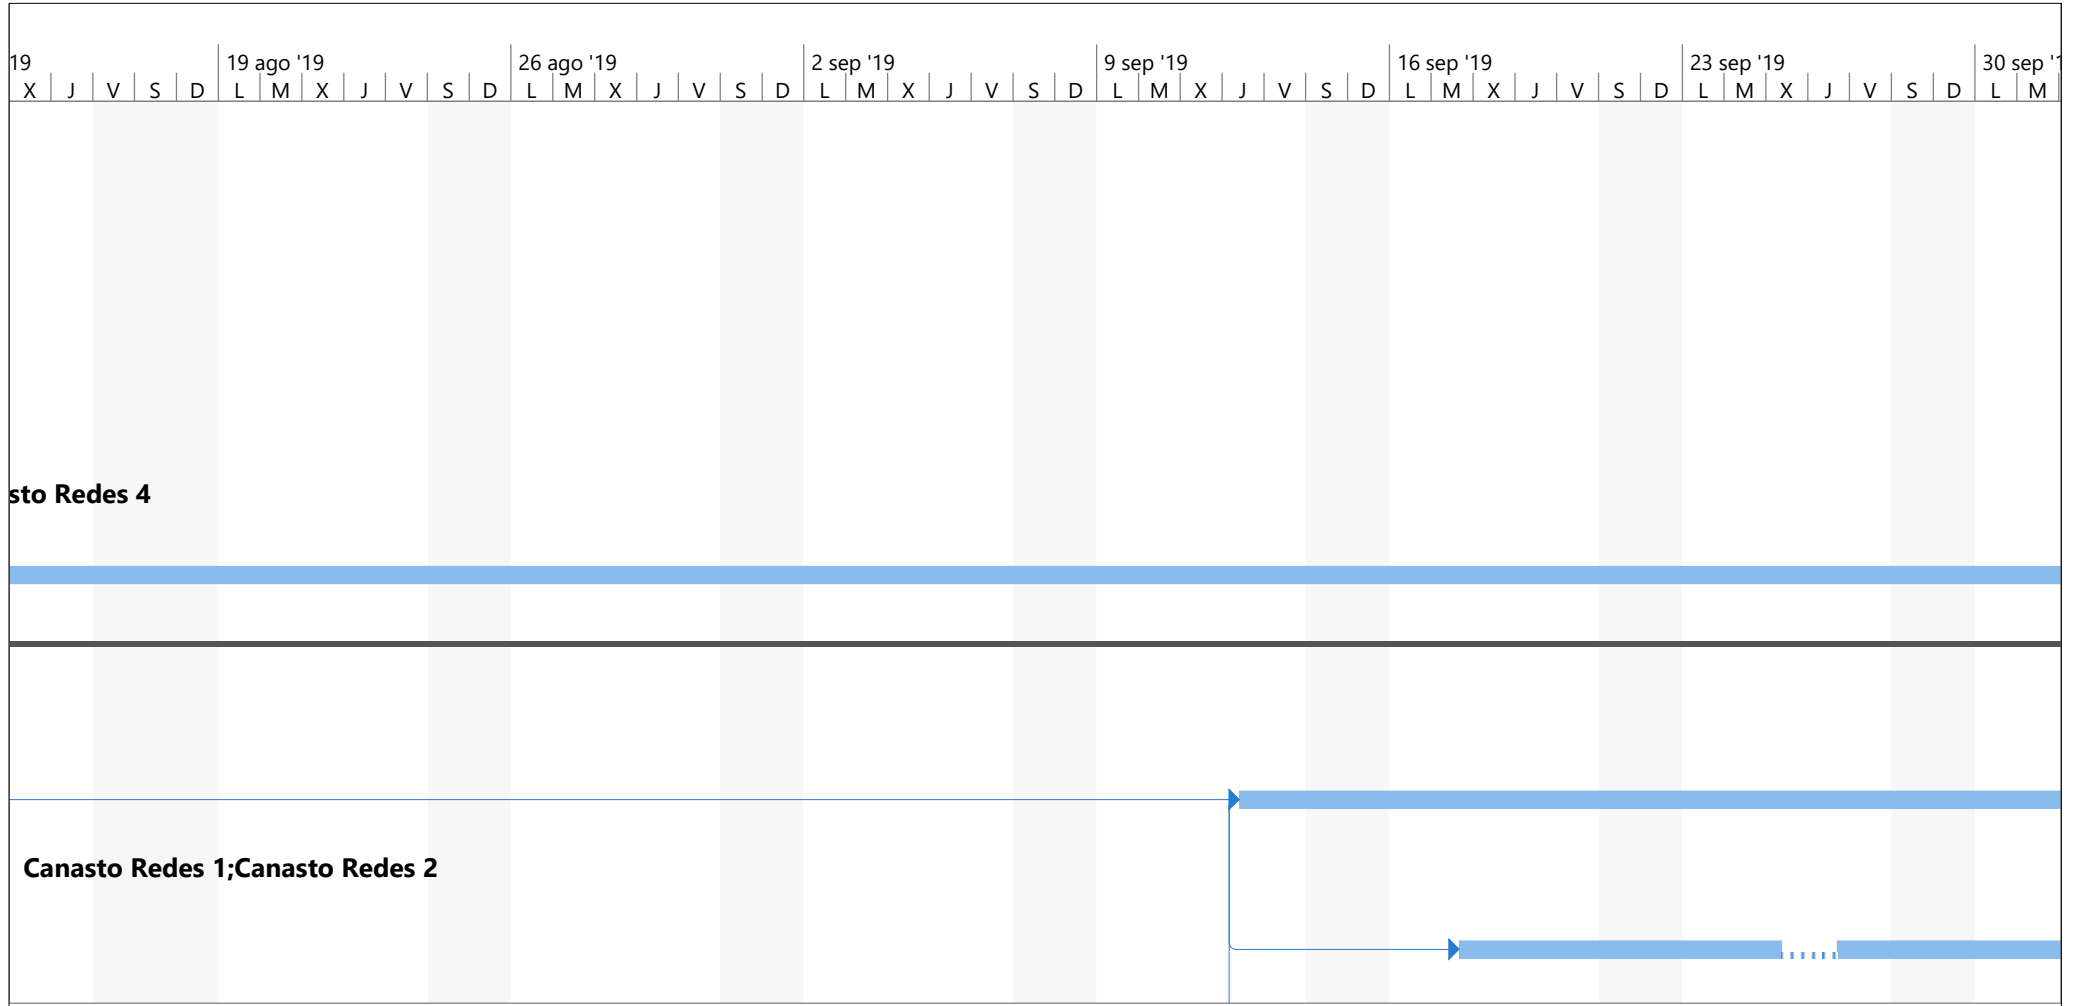


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

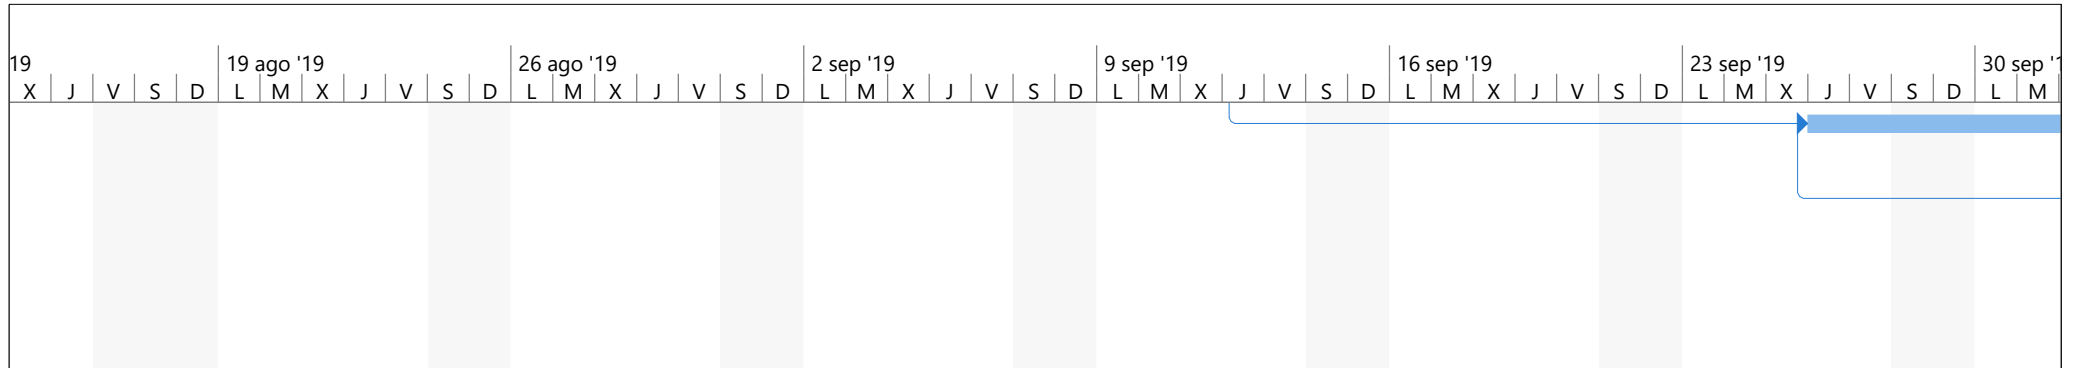


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

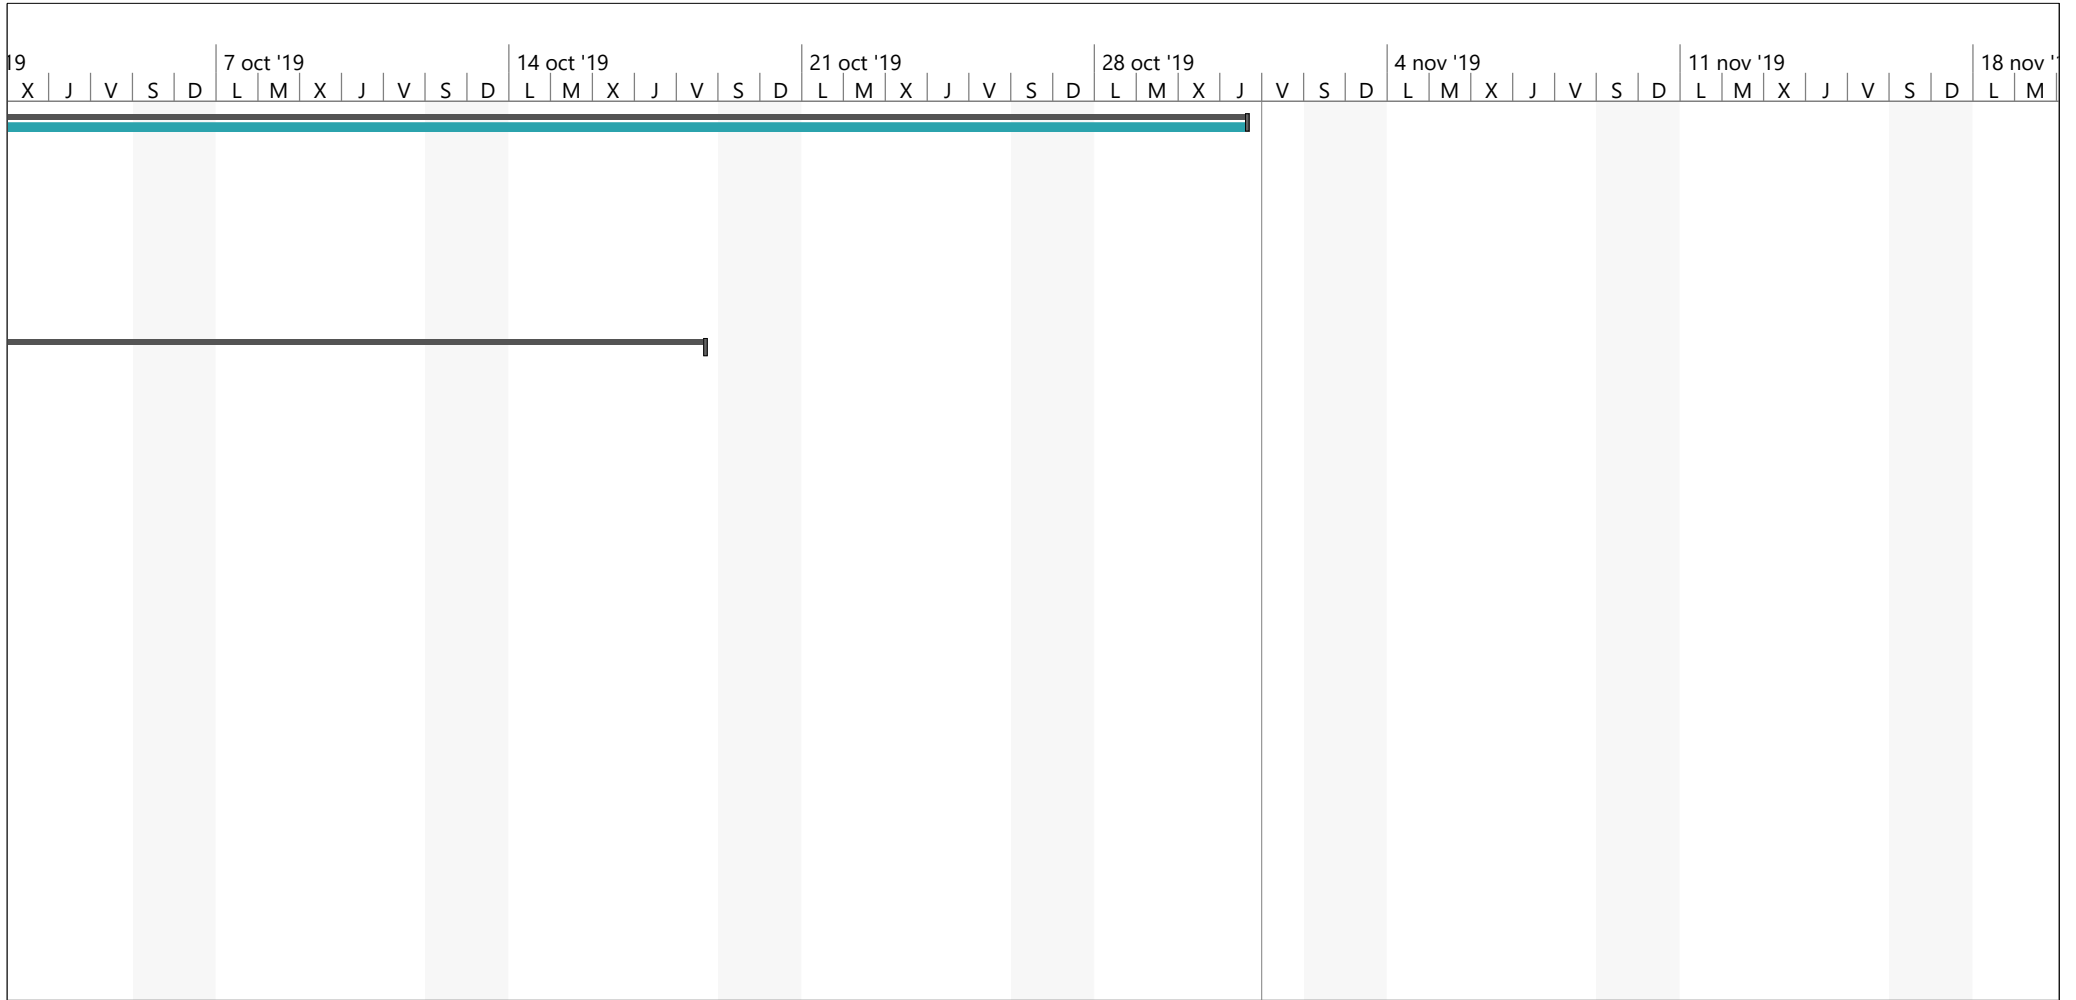


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

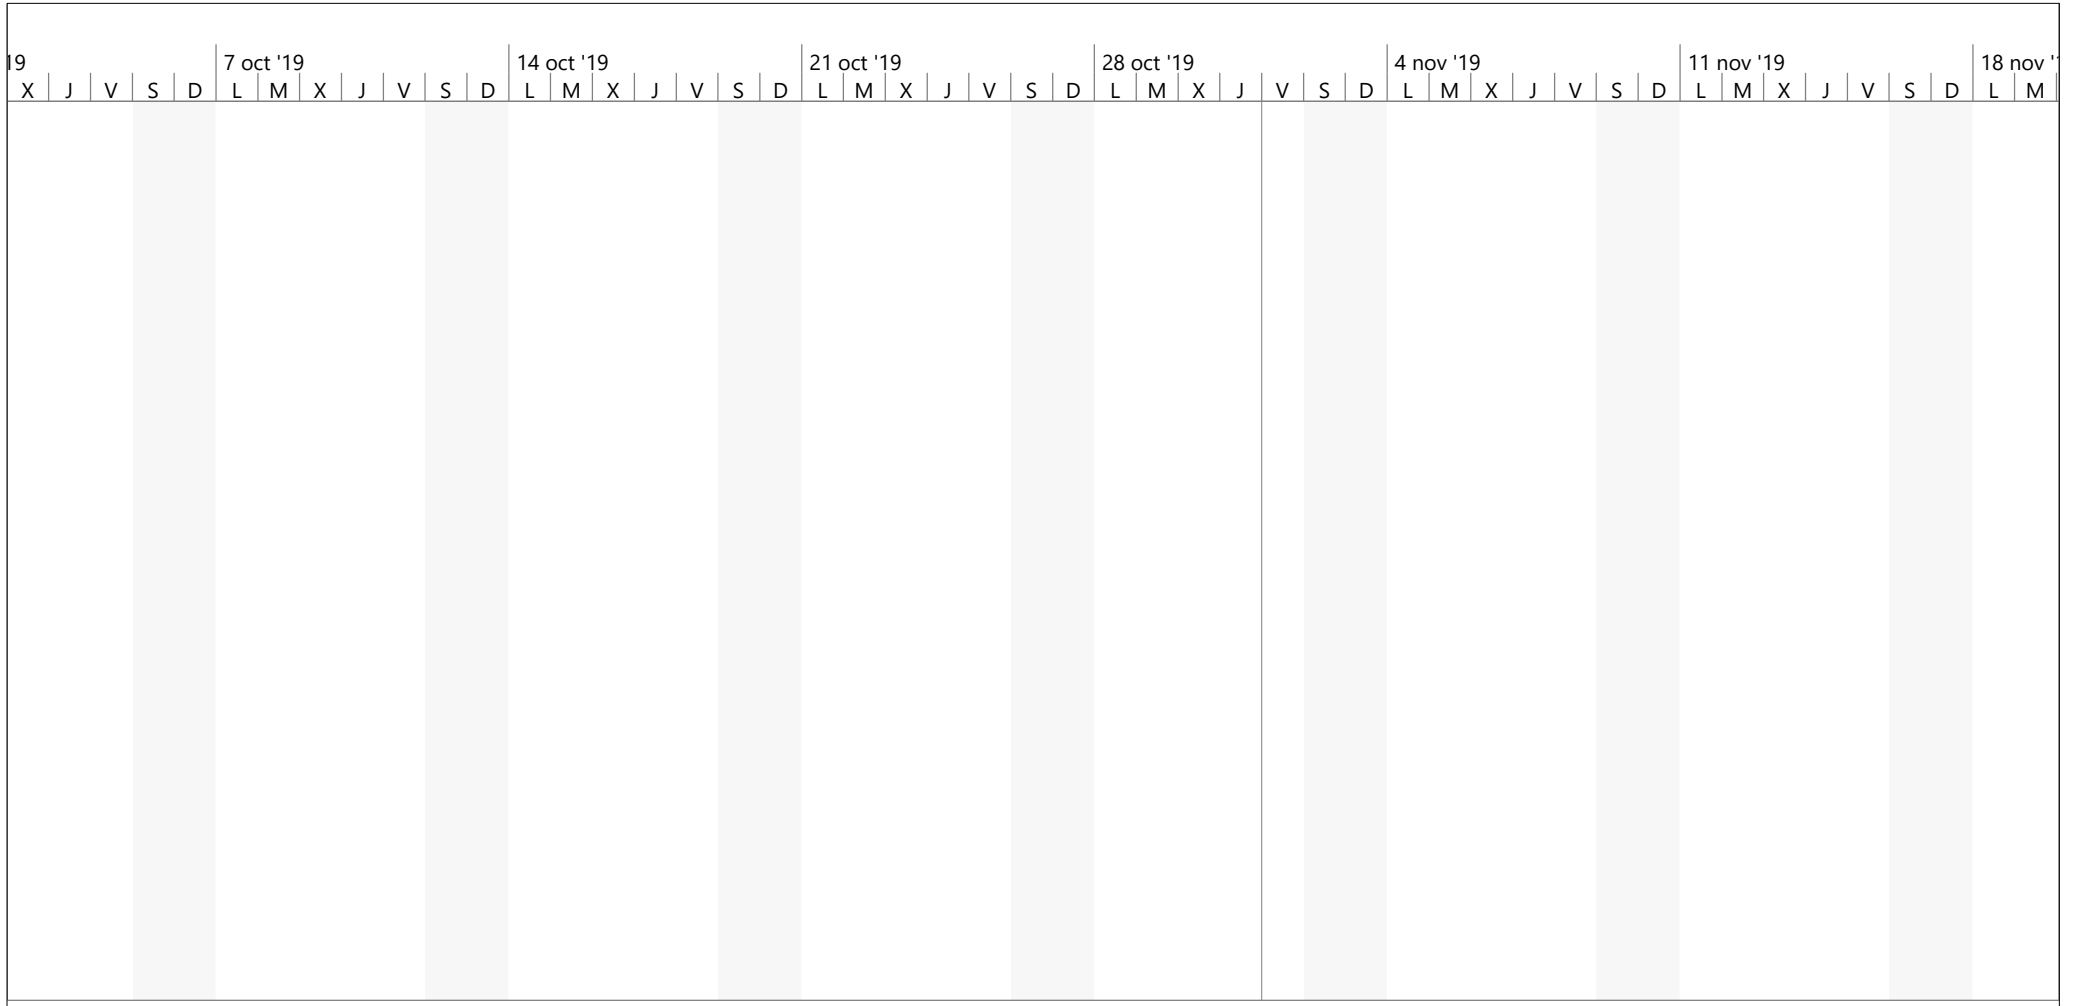


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

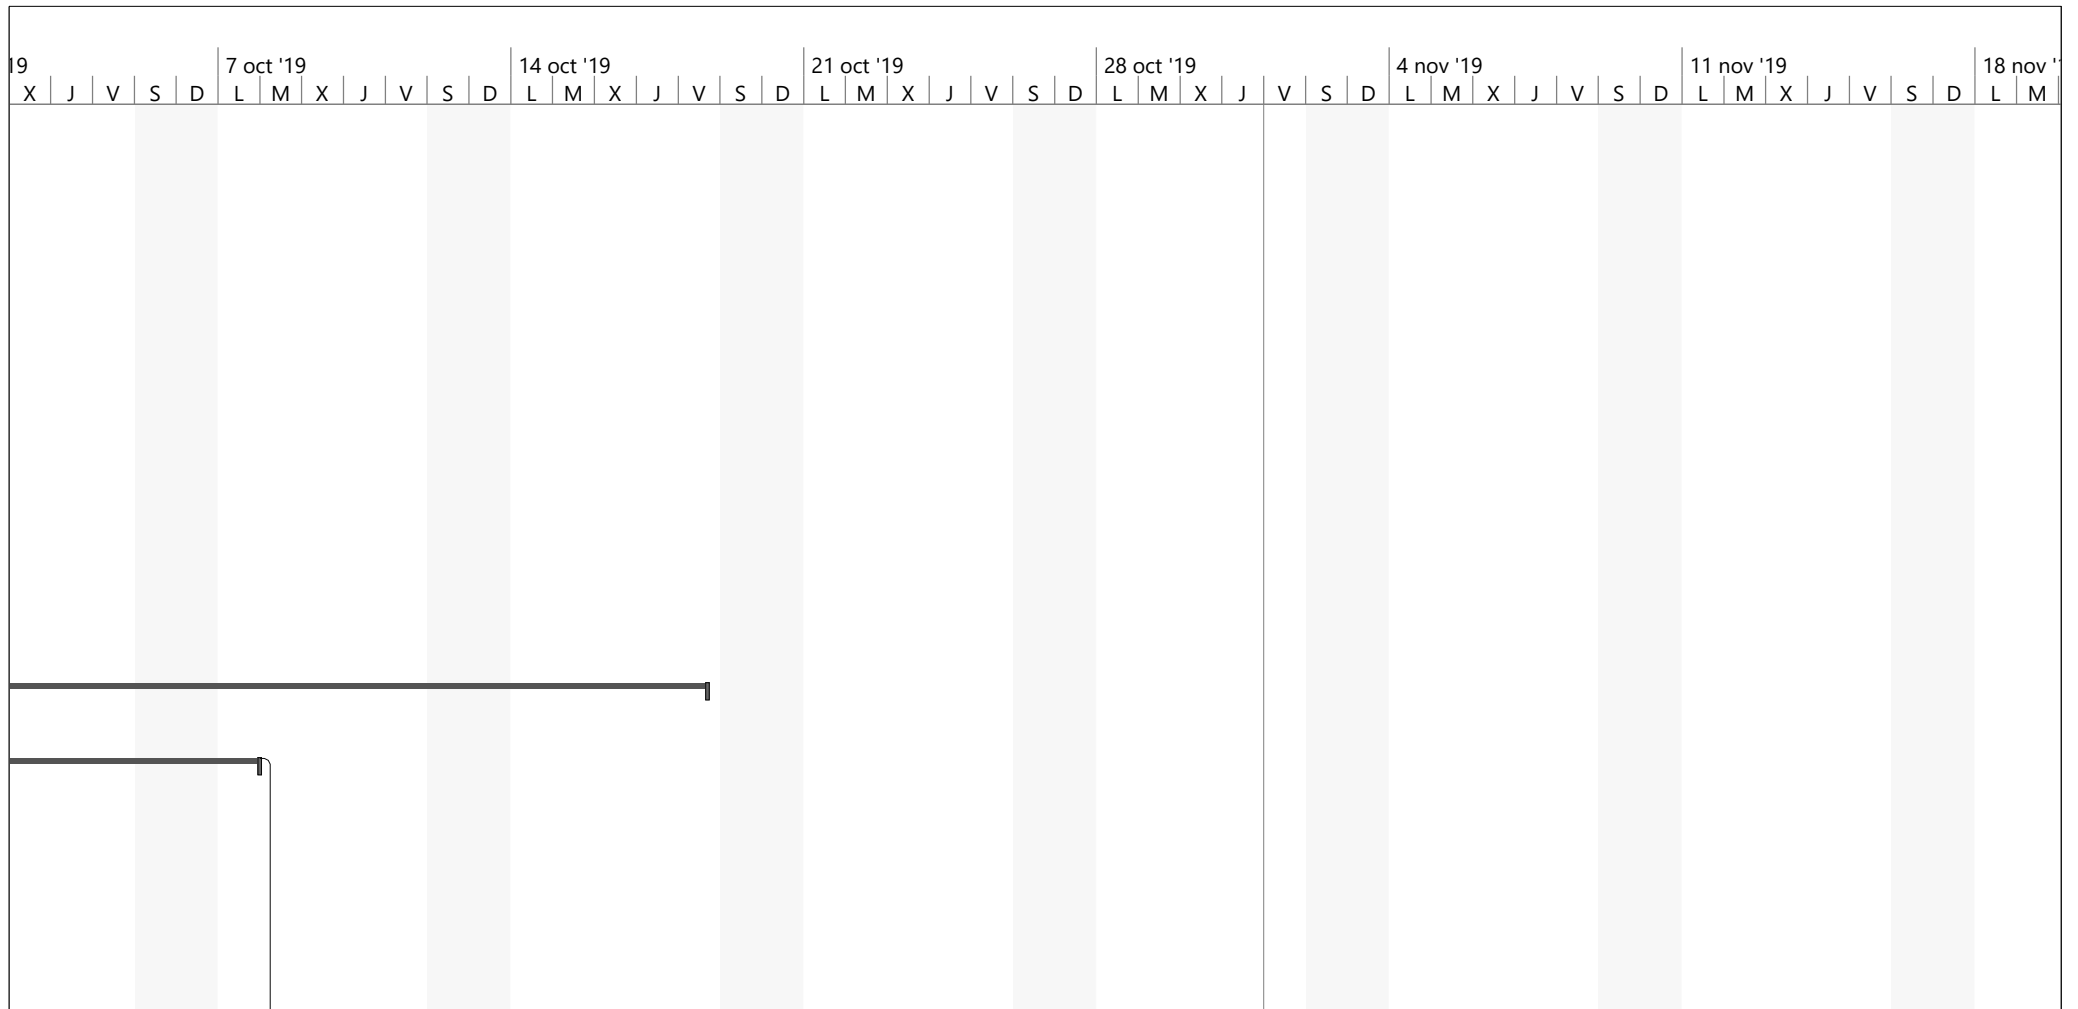


Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

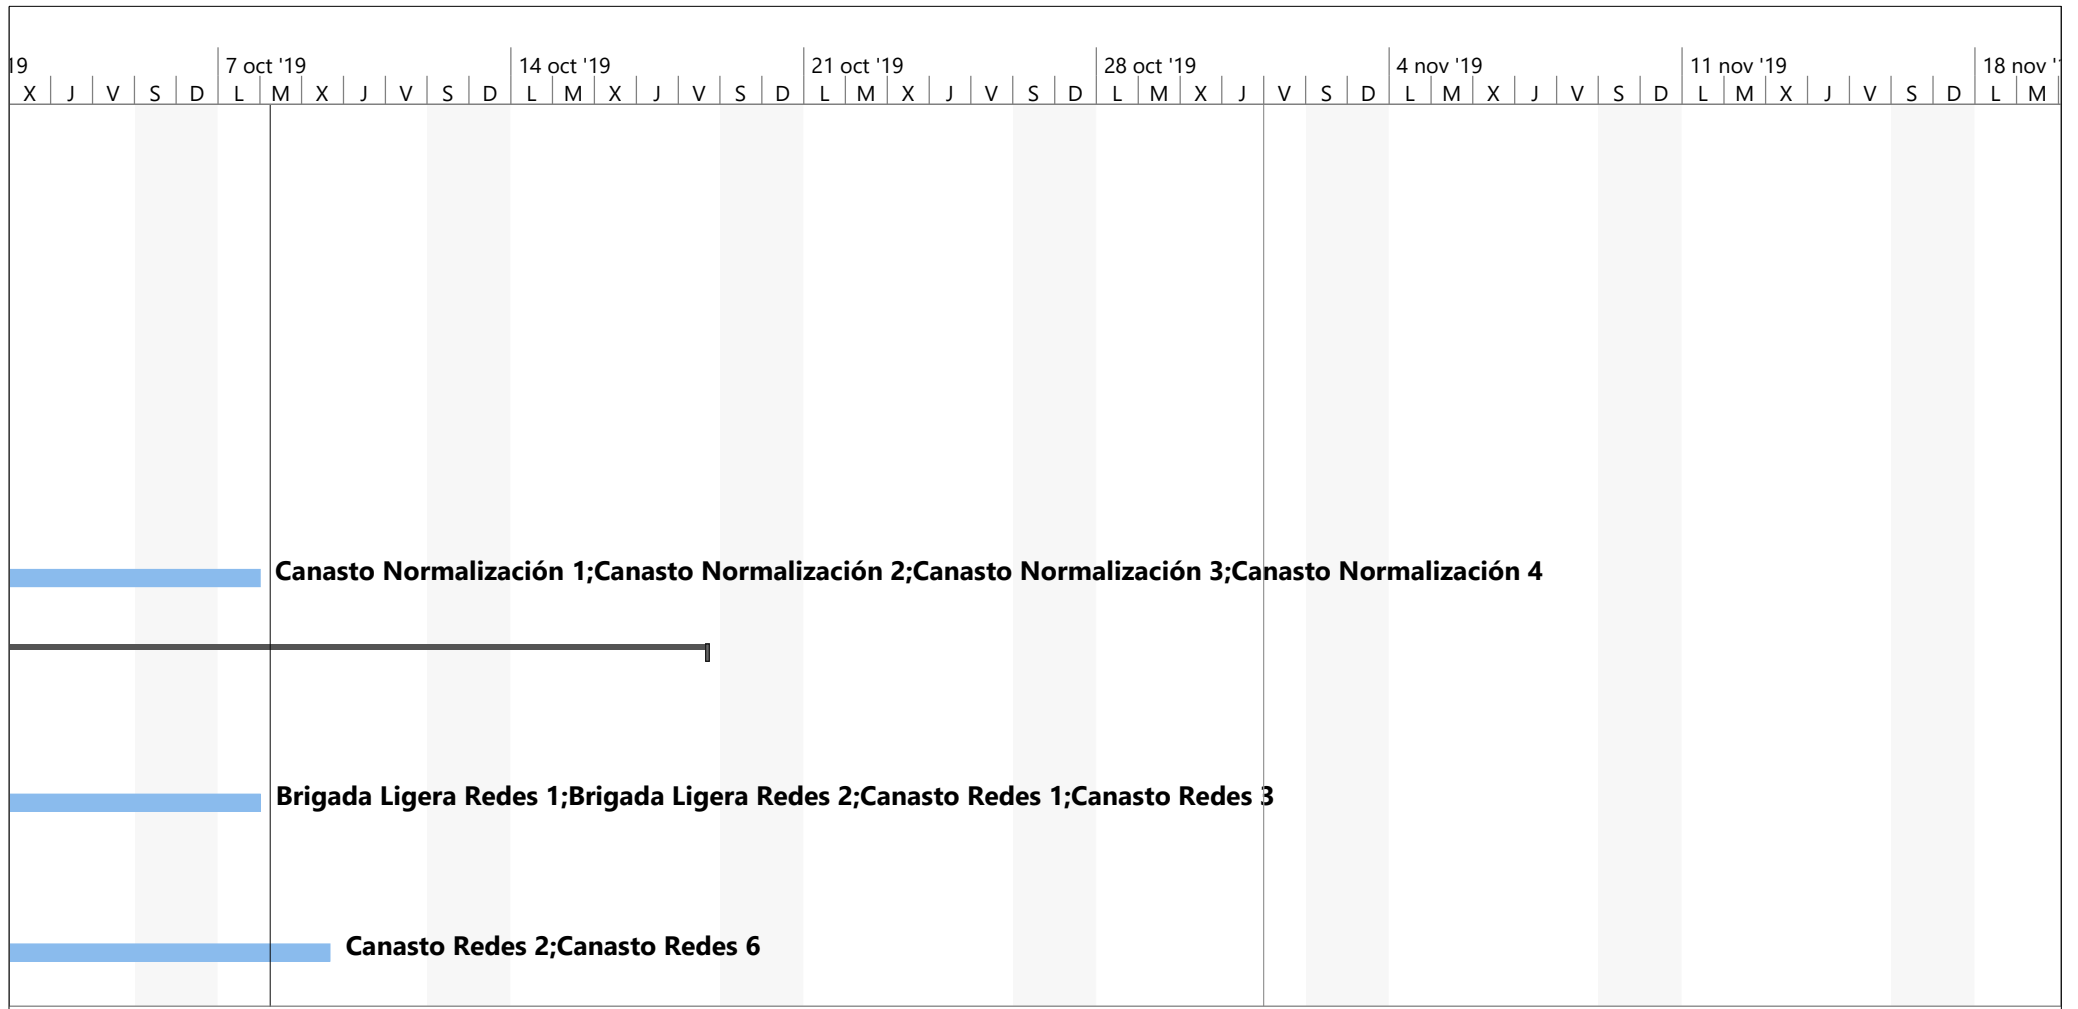

Proyecto: Cronograma NAGU10 Fecha: mar 6/11/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

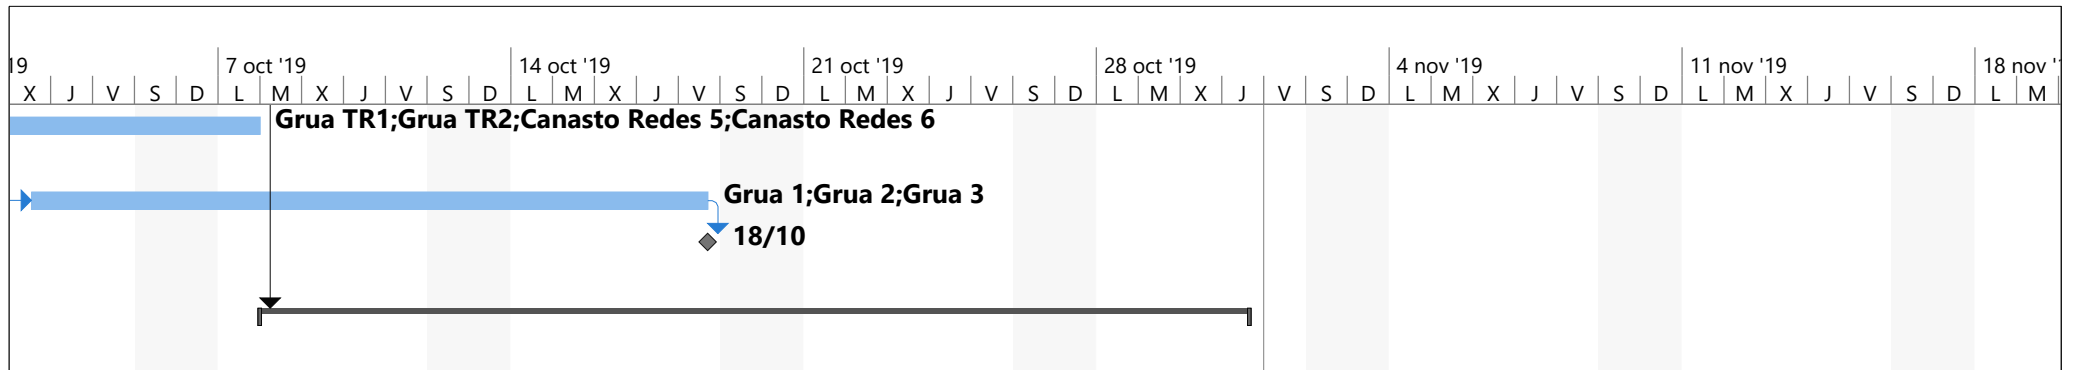

Ing. Deivy Rodriguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



Proyecto: Cronograma NAGU10
 Fecha: mar 6/11/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
