

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | | |
|----|---------------|---|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 1 | | Rehabilitación de Redes CHIVO105 | 272.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Adjudicación | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Periodo de Adquisiciones | 80 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Ejecución | 242.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Polígono 1 | 145.88 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Instalación | 135 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Cimentaciones | 12 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Retenidas | 6 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Armados de Media y Baja | 17 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Tendido de Conductor Me | 22 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Elementos de Protección y | 10 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Conexiones y Jumpers | 5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Transformadores | 12 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Alumbrado Publico | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Normalización Suministros | 34 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Remoción | 69.75 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Tendido de Conductor Me | 16 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Tendido de Conductor Baj | 22 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Armados de Media Tensió | 44 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | | |
|----|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 45 | | Armados de Baja Tensión | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Transformadores | 25.25 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Cierre de Polígono 1 | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Polígono 2 | 175.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Instalación | 175.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Izado de postes | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | Cimentaciones | 19 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Retenidas | 9 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Armados de Media y Baja | 18 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Tendido de Conductor Me | 11 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Elementos de Protección | 14.75 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Conexiones y Jumpers | 11 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | Transformadores | 13 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Alumbrado Publico | 16 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Normalización Suministro | 70 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Remoción | 71.63 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Tendido de Conductor Me | 6 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Tendido de Conductor Baj | 13 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | Armados de Media Tensió | 12 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

























Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | | | | | |
| 65 | | Armados de Baja Tensión | 8 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Transformadores | 5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Izado de postes | 13 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Cierre de Polígono 2 | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | Polígono 3 | 208.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | Instalación | 198.5 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Cimentaciones | 10 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | Retenidas | 7 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | Armados de Media y Baja | 47 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | Tendido de Conductor M | 56 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | Elementos de Protección | 19 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | Conexiones y Jumpers | 8 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | Transformadores | 39 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | Alumbrado Publico | 35 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | Normalización Suministr | 43 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | Remoción | 107.25 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | Tendido de Conductor Me | 9 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Tendido de Conductor Baj | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | Armados de Media Tensió | 18 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Calendario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| | | | | 2 abr '18 | | | | | | | 9 abr '18 | | | | | | | 16 abr '18 | | | | | | | 23 abr '18 | | | | | | | 30 abr '18 | | |
| | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 85 |  | Armados de Baja Tensión | 16 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | Transformadores | 9 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | Izado de postes | 14 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | Cierre de Polígono 3 | 0 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | Cierre de Obras | 20 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Tareas críticas |  | solo fin |  | Resumen manual |  |
| División crítica |  | solo duración |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base |  | Tareas externas |  |
| Tarea |  | División de la línea base |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito de línea base |  | Tarea inactiva |  |
| Progreso de tarea |  | Hito |  | Hito inactivo |  |
| Tarea manual |  | Progreso del resumen |  | Resumen inactivo |  |
| solo el comienzo |  | Resumen |  | Fecha límite |  |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

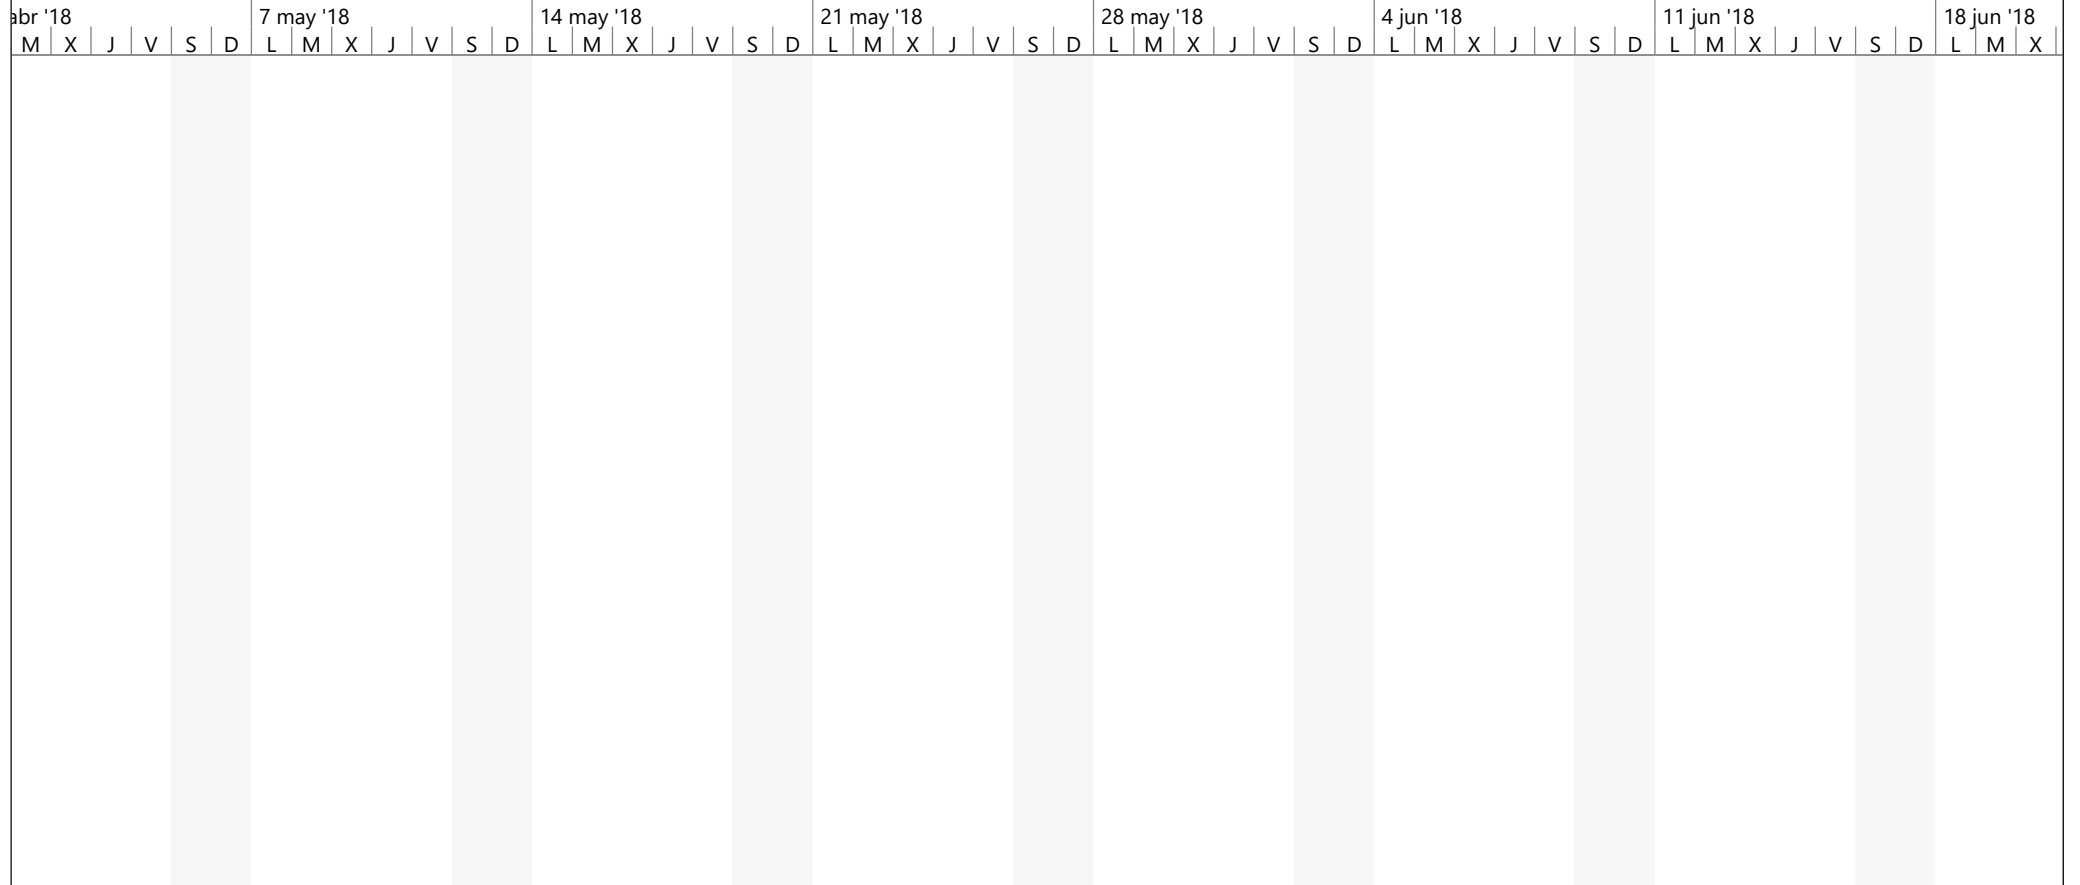


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

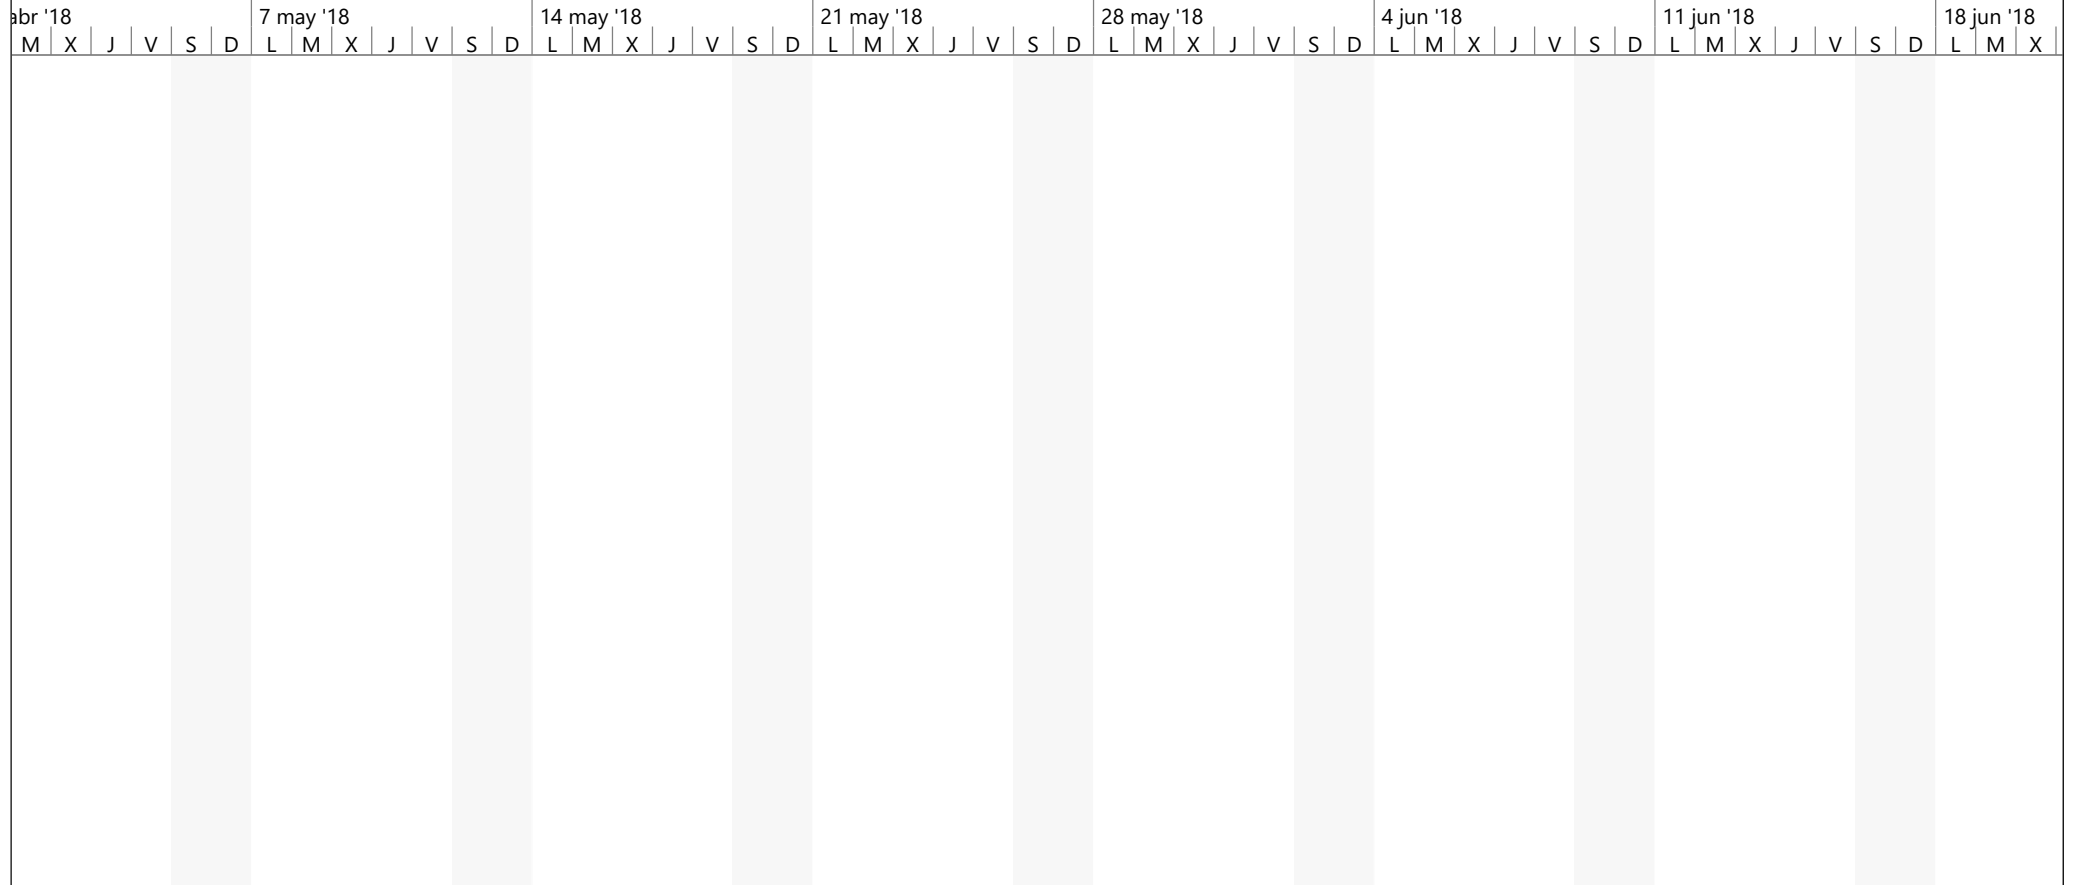


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

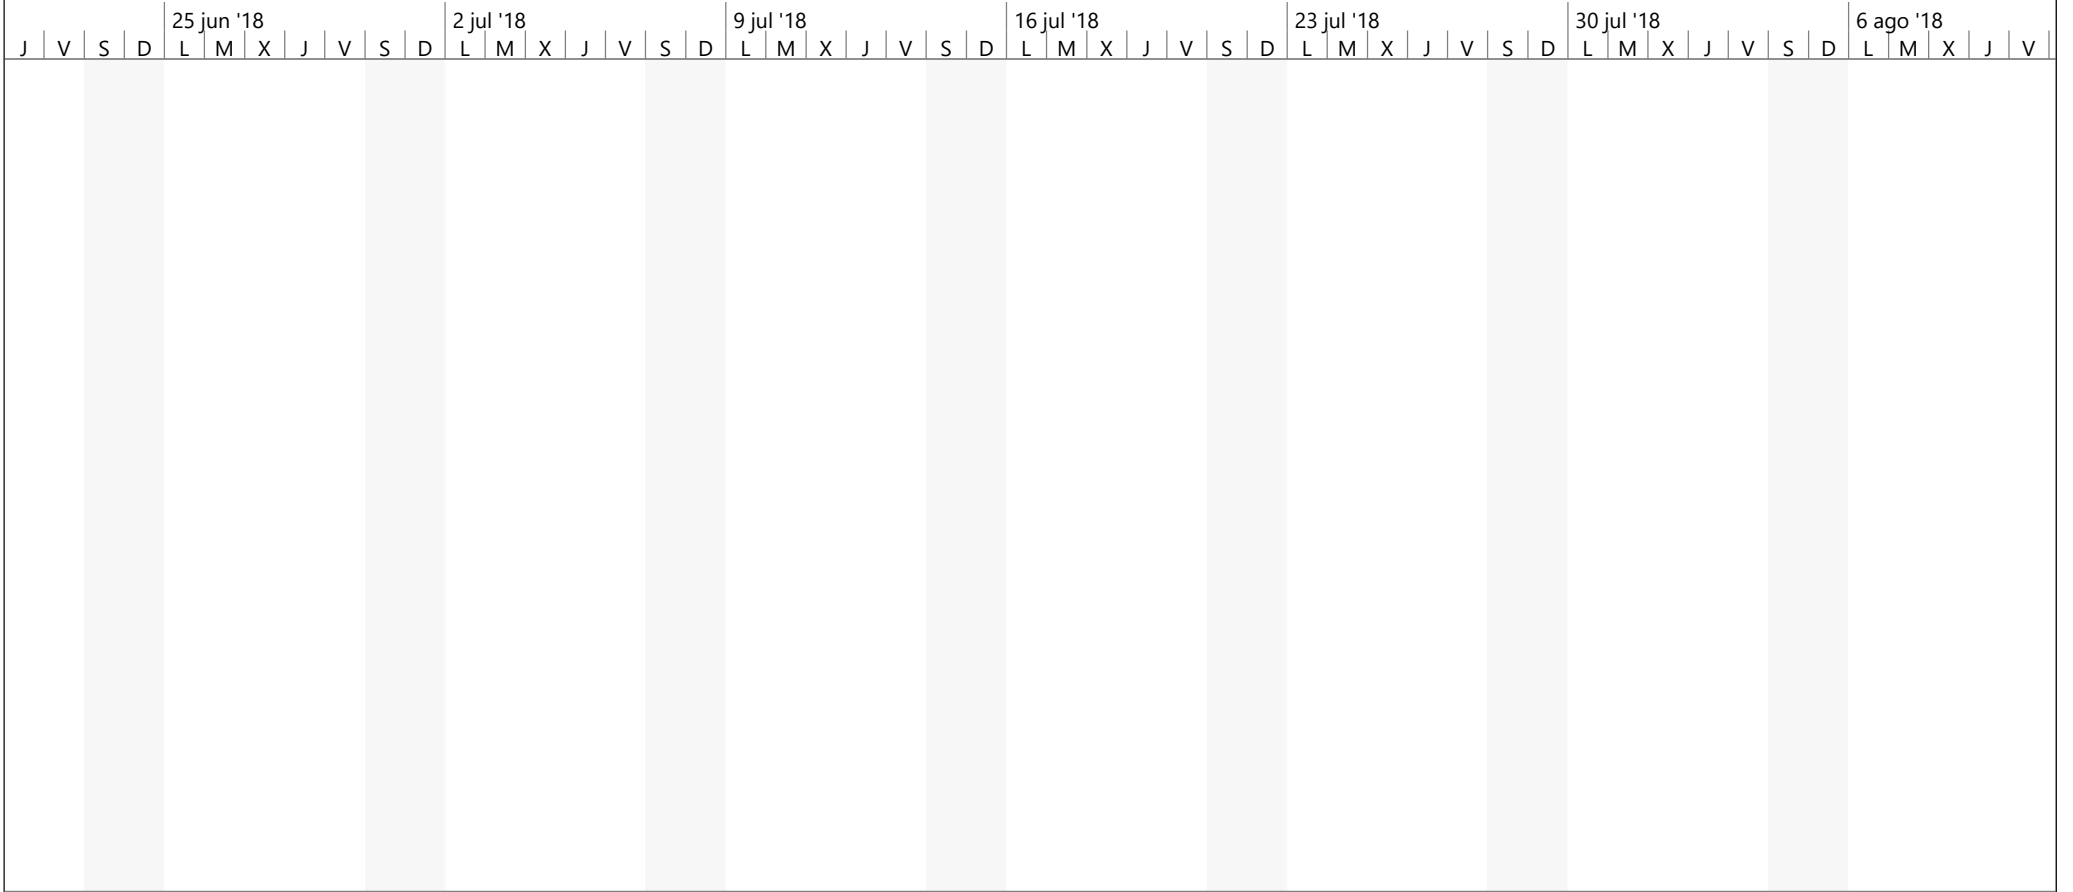


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

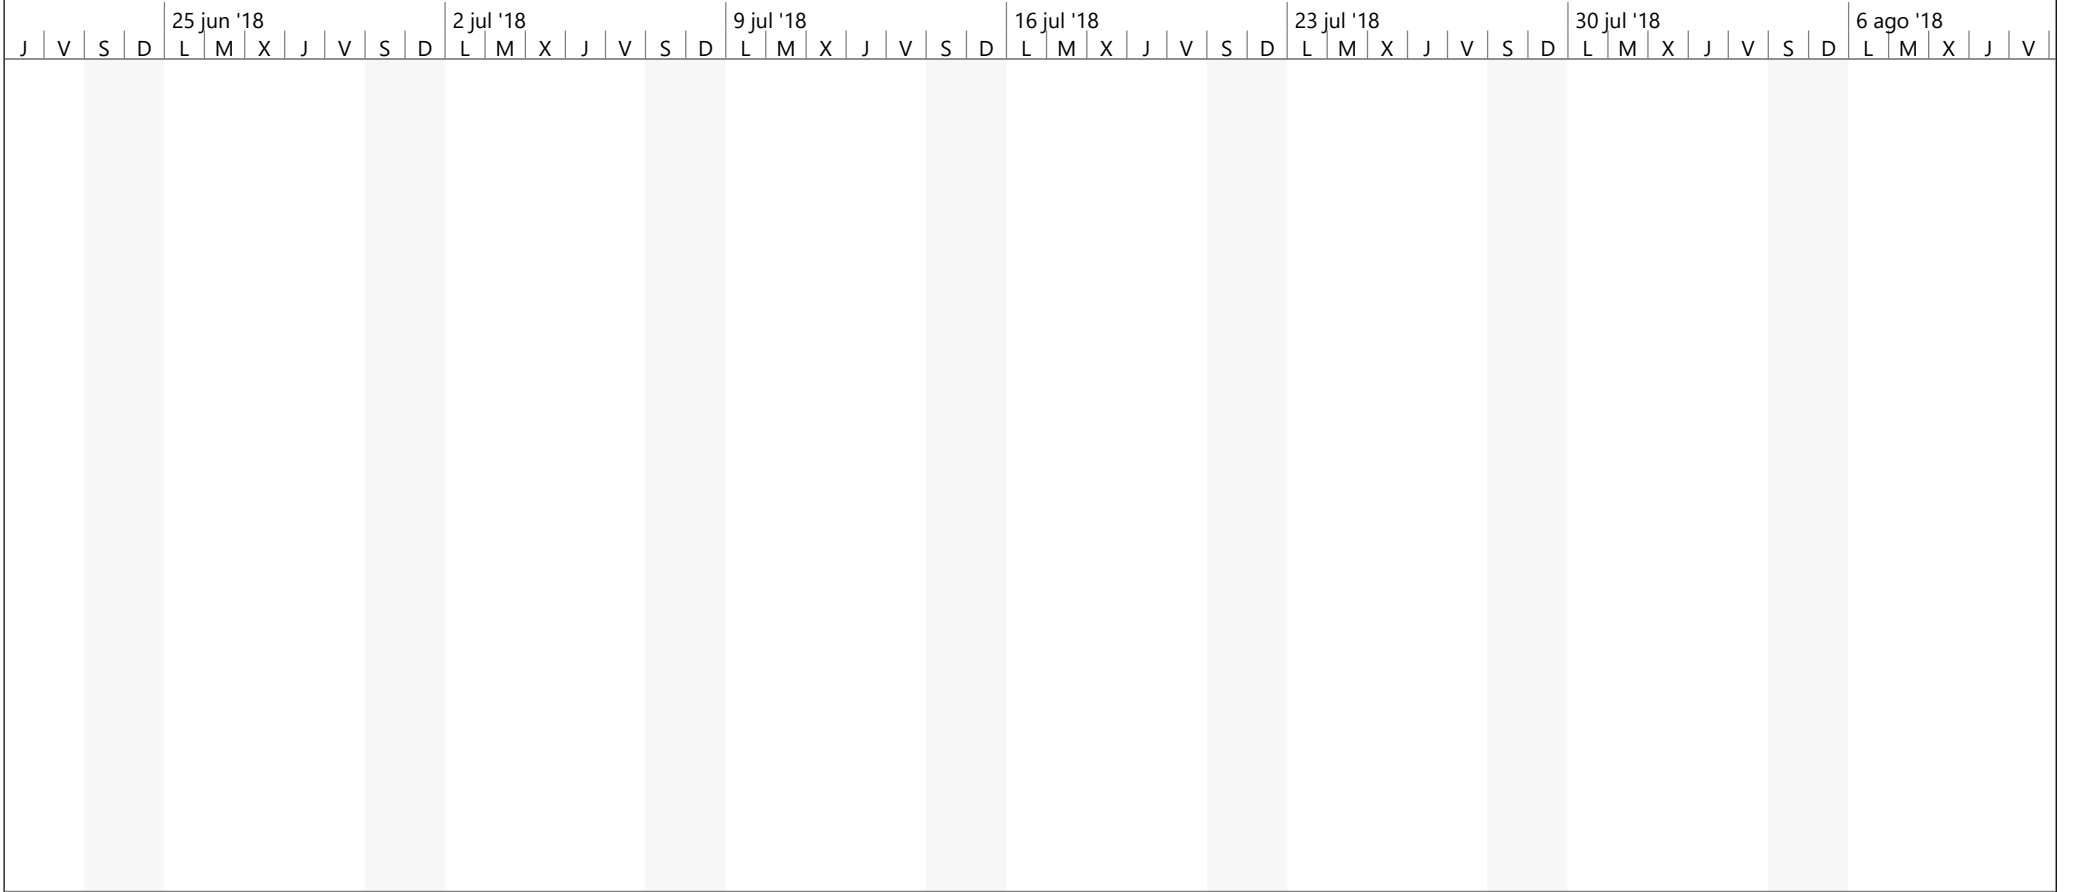


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

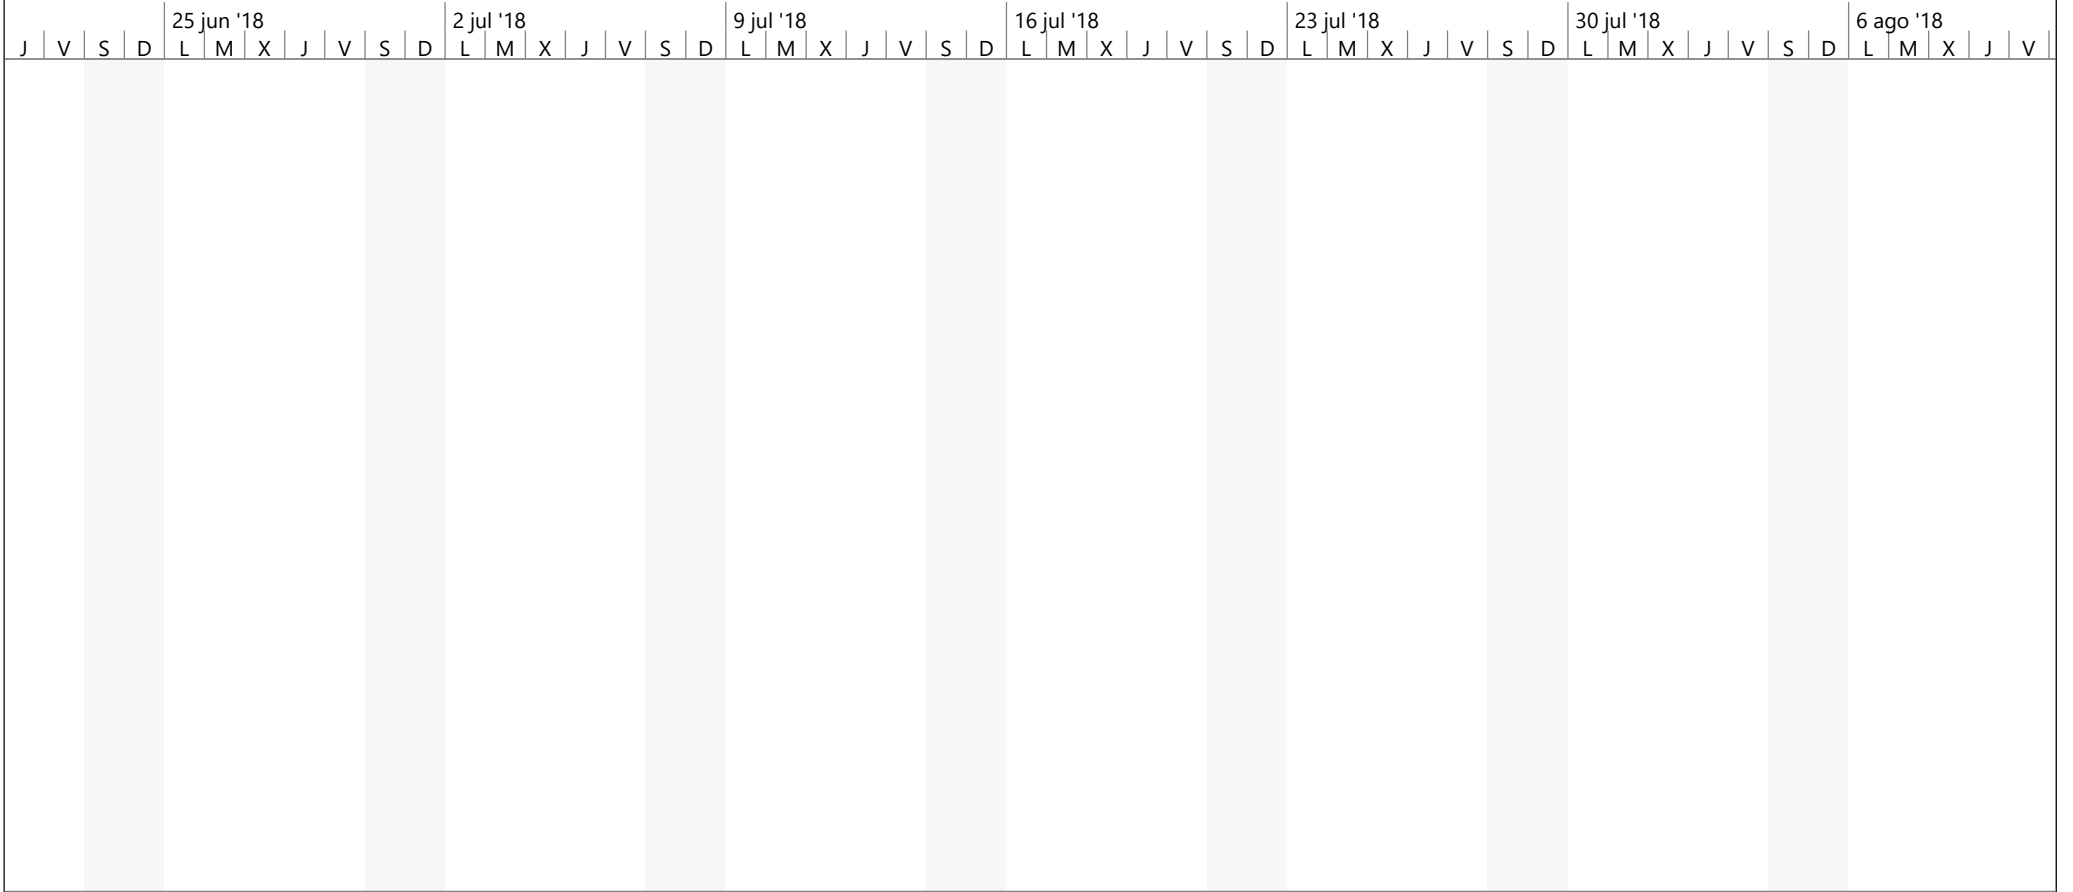


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

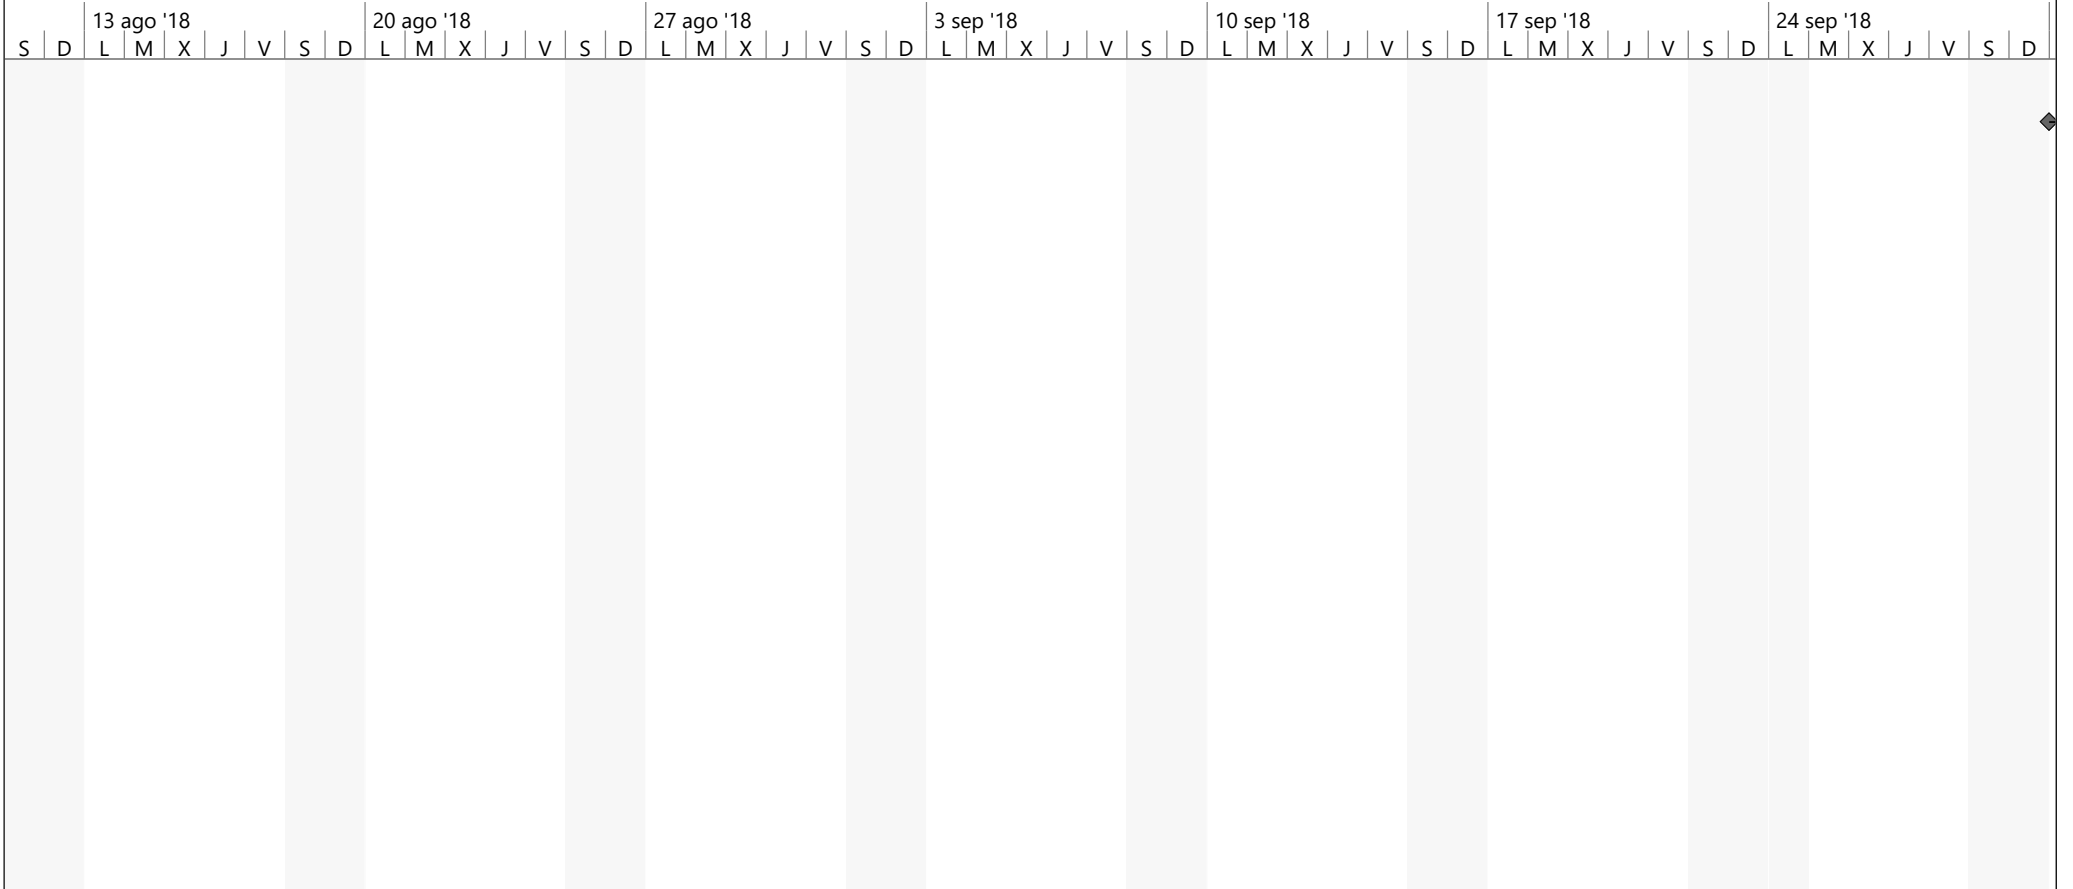

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

1 oct '18 L M X J V S D 8 oct '18 L M X J V S D 15 oct '18 L M X J V S D 22 oct '18 L M X J V S D 29 oct '18 L M X J V S D 5 nov '18 L M X J V S D 12 nov '18 L M X J V S D 19 nov '18 L M X J V S D

1/10

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019


1 oct '18 8 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 5 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

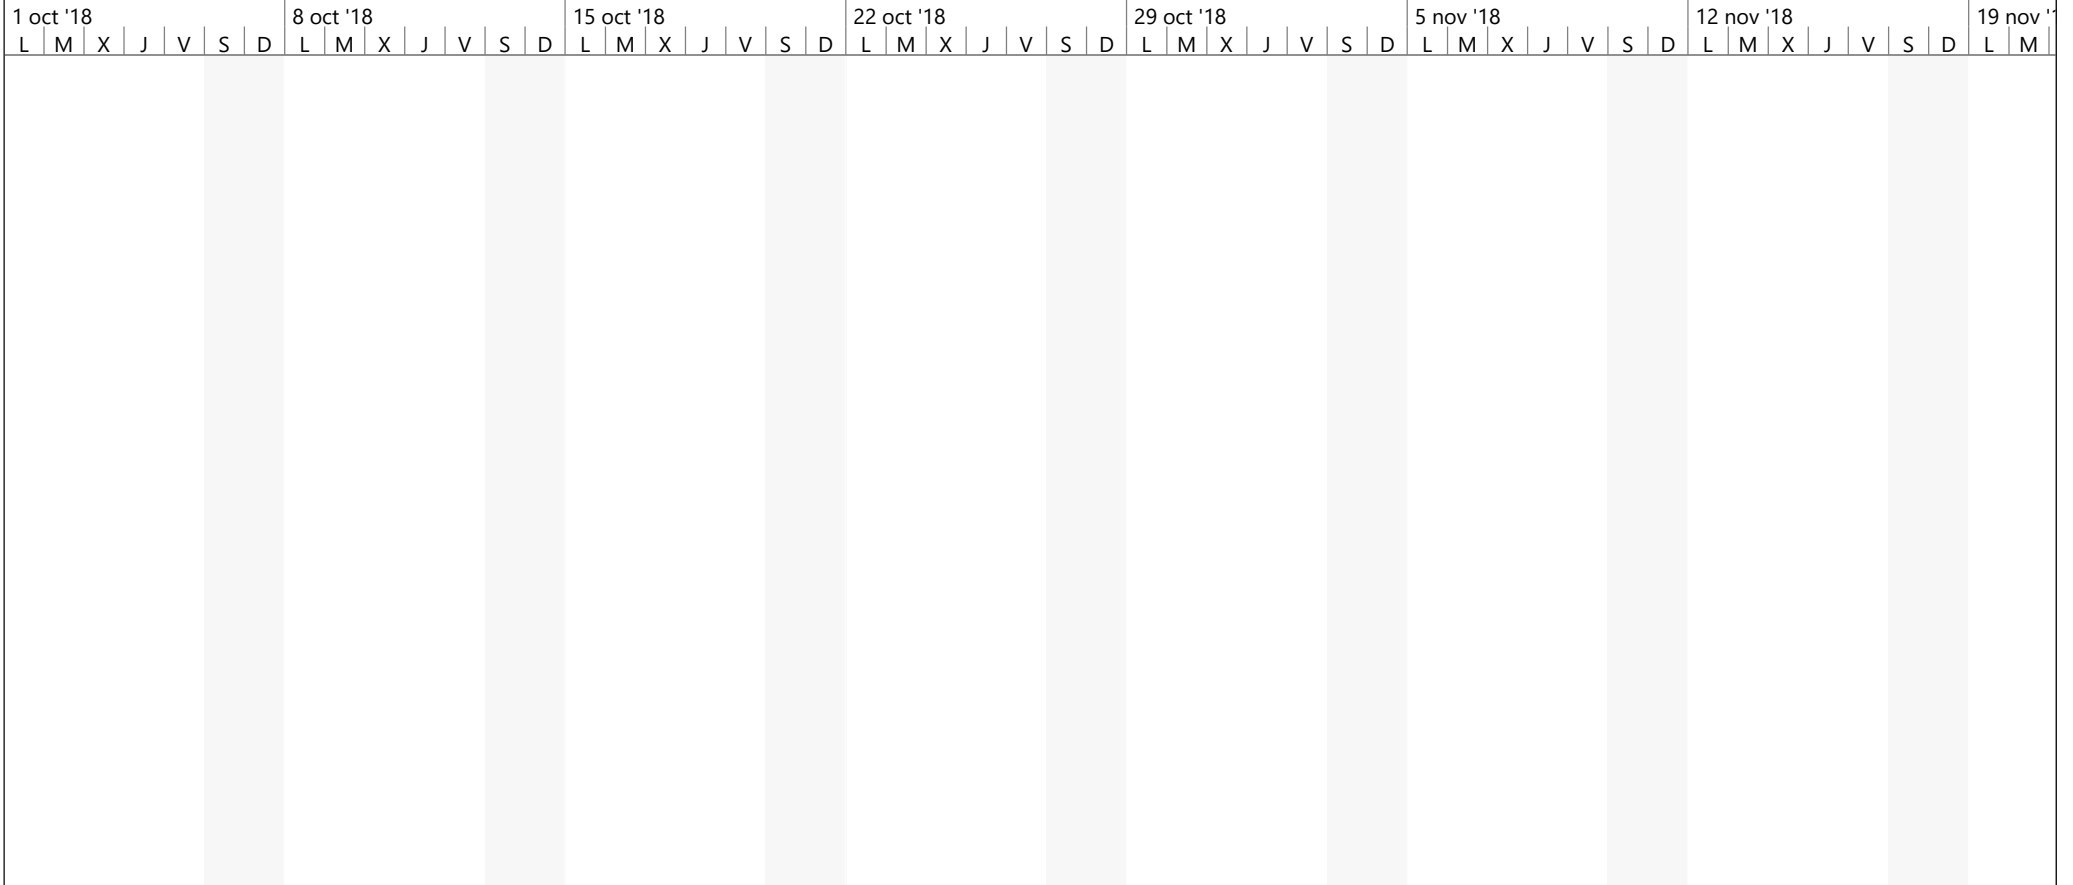

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

18 | X | J | V | S | D | 26 nov '18 | L | M | X | J | V | S | D | 3 dic '18 | L | M | X | J | V | S | D | 10 dic '18 | L | M | X | J | V | S | D | 17 dic '18 | L | M | X | J | V | S | D | 24 dic '18 | L | M | X | J | V | S | D | 31 dic '18 | L | M | X | J | V | S | D | 7 ene '19 | L | M | X | J |

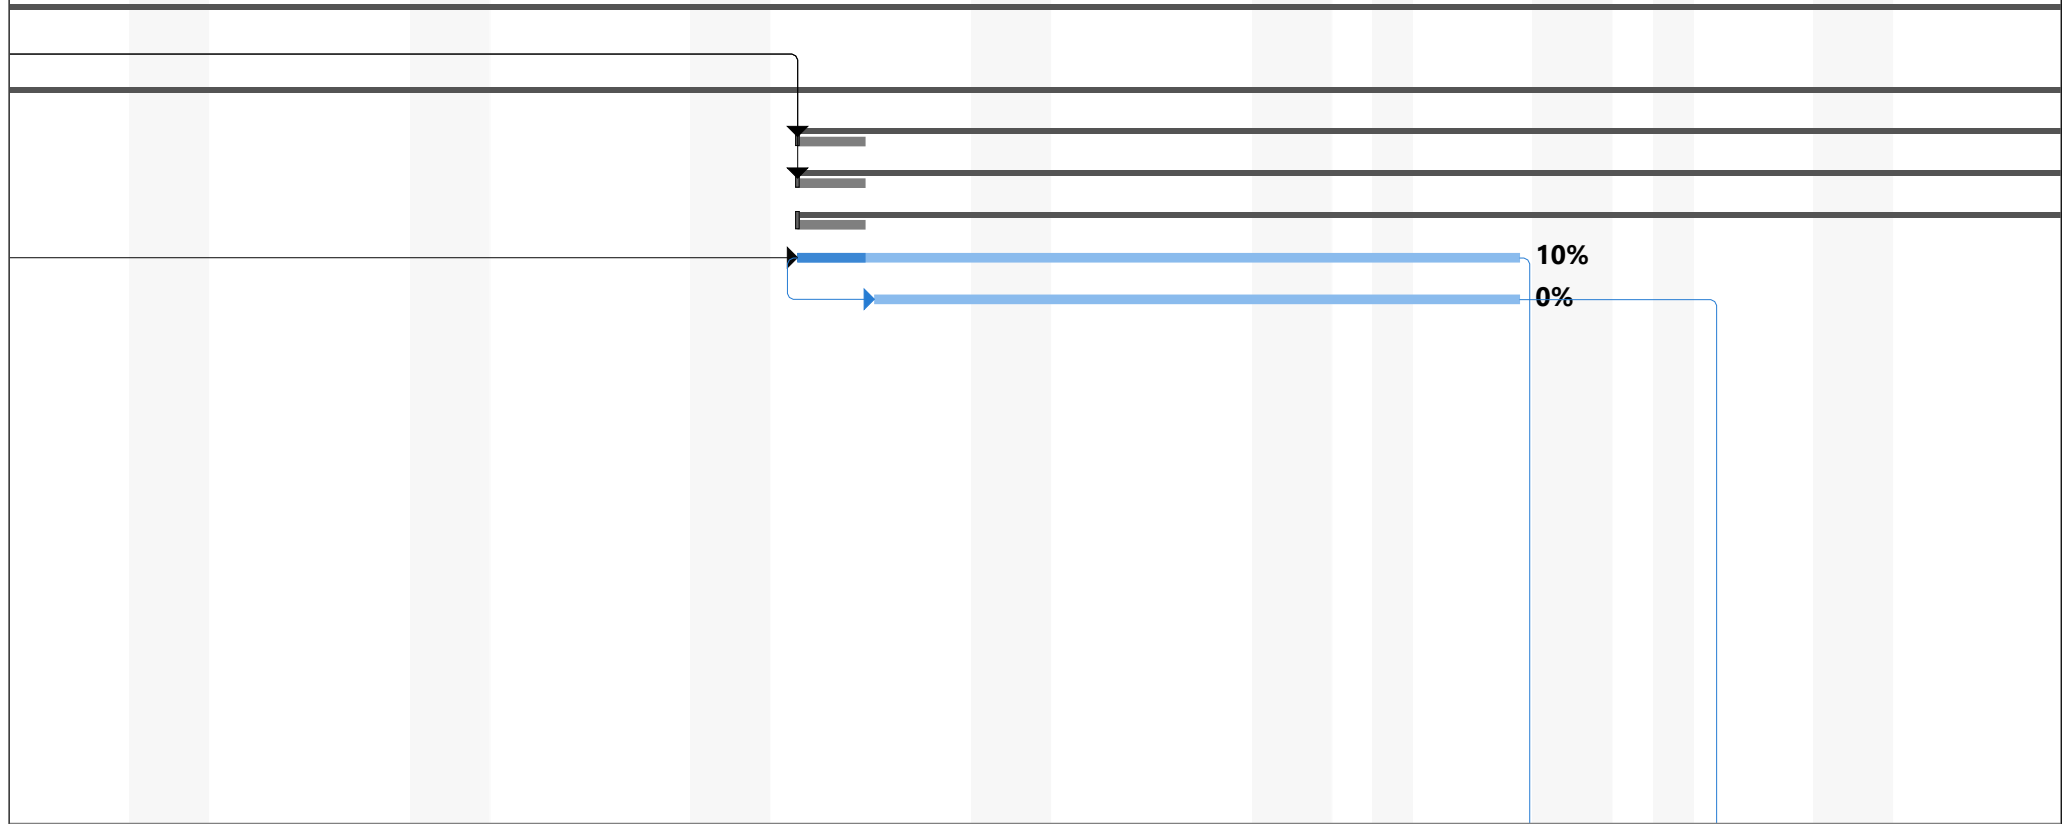


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

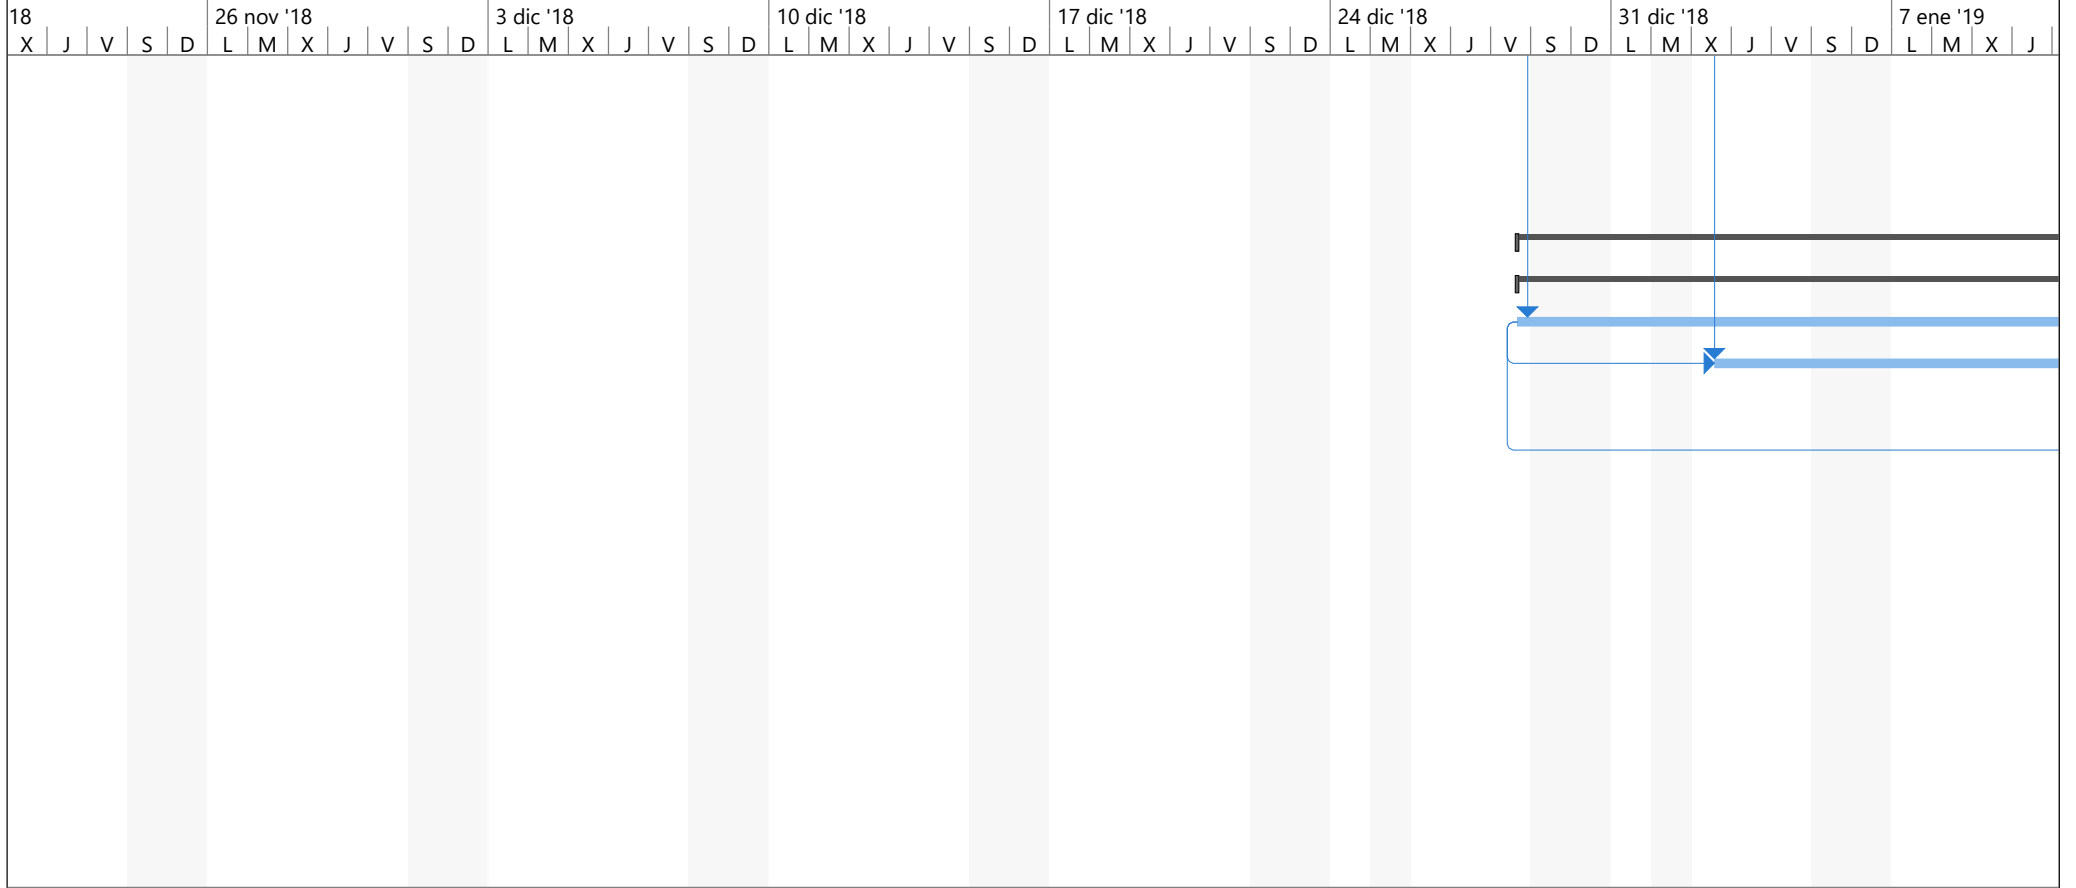


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

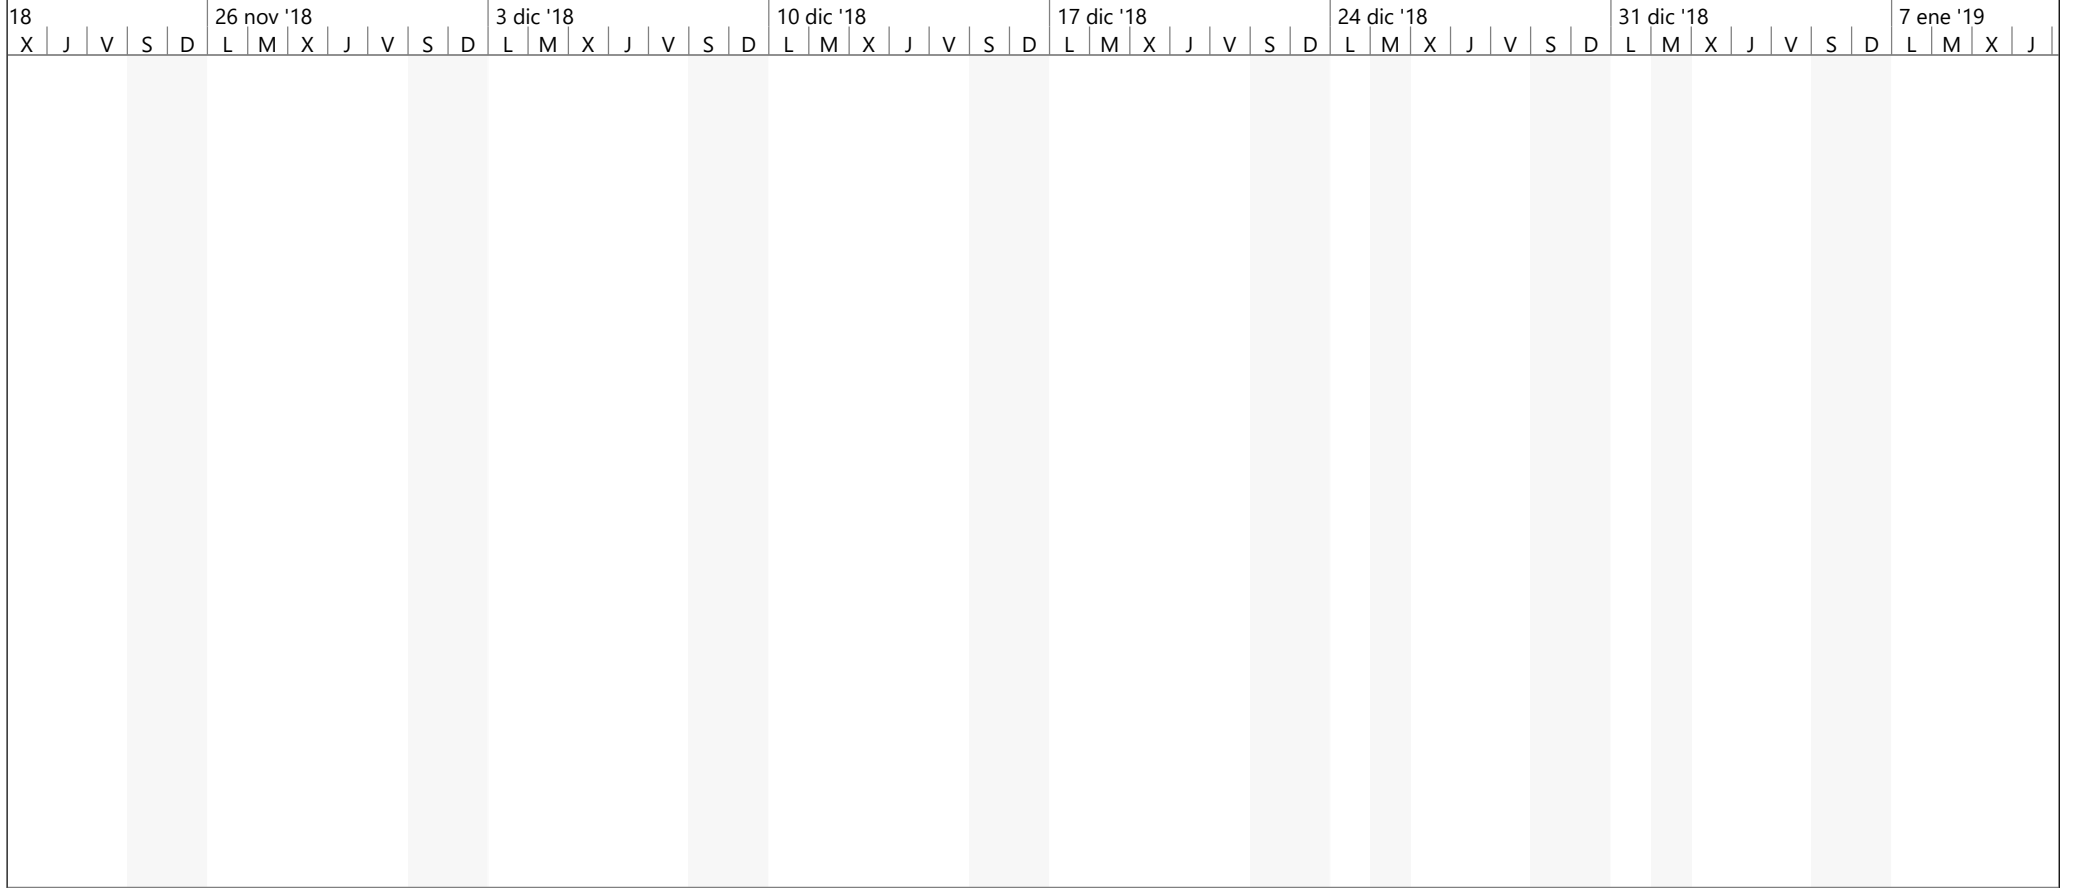


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

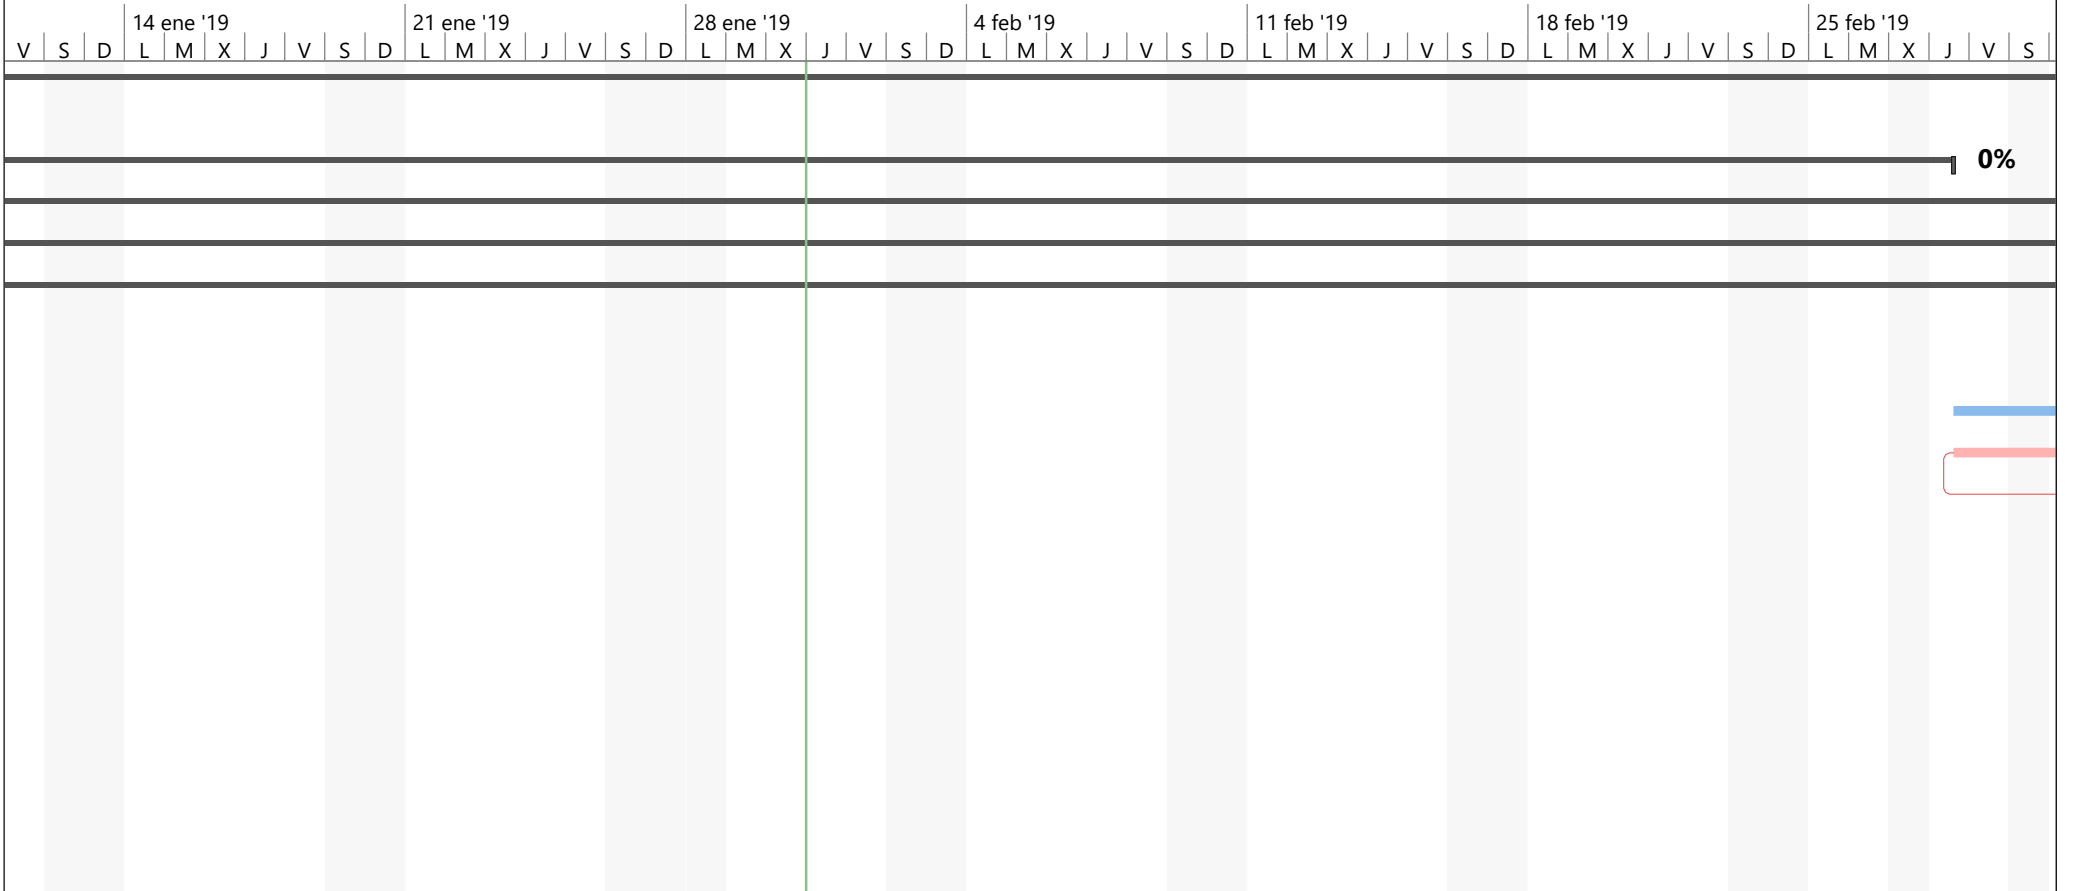


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

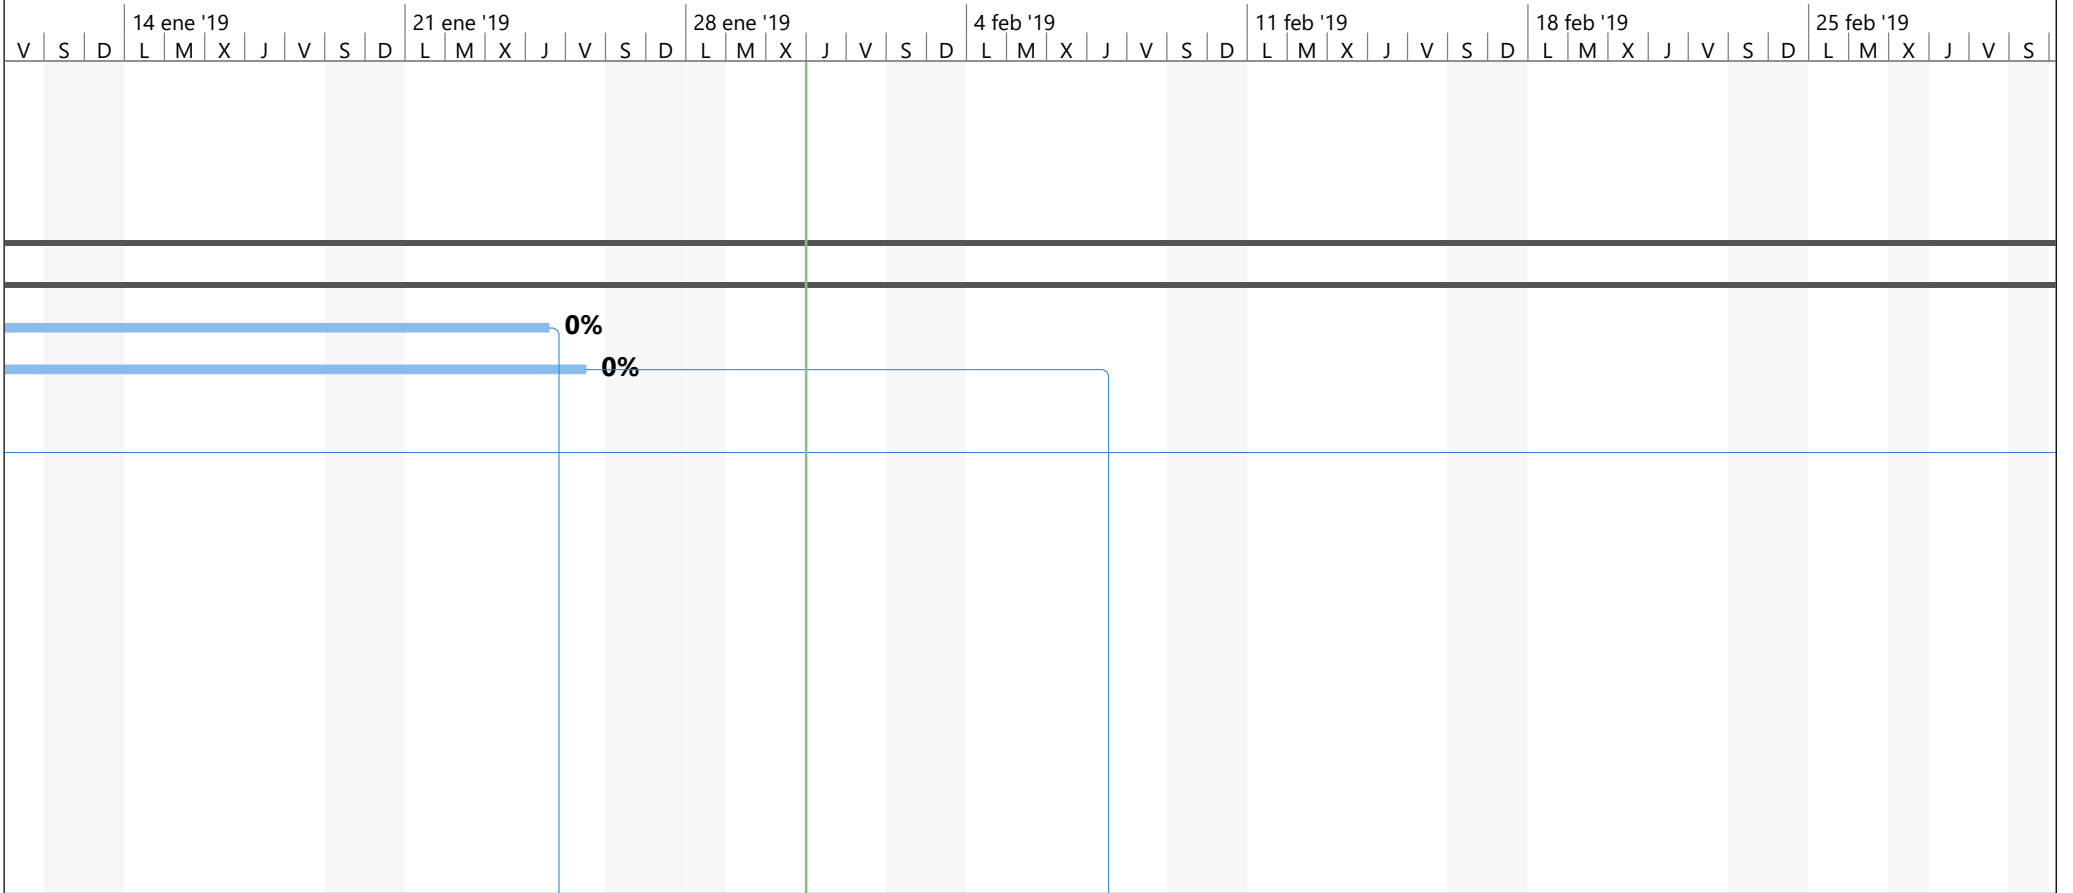


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

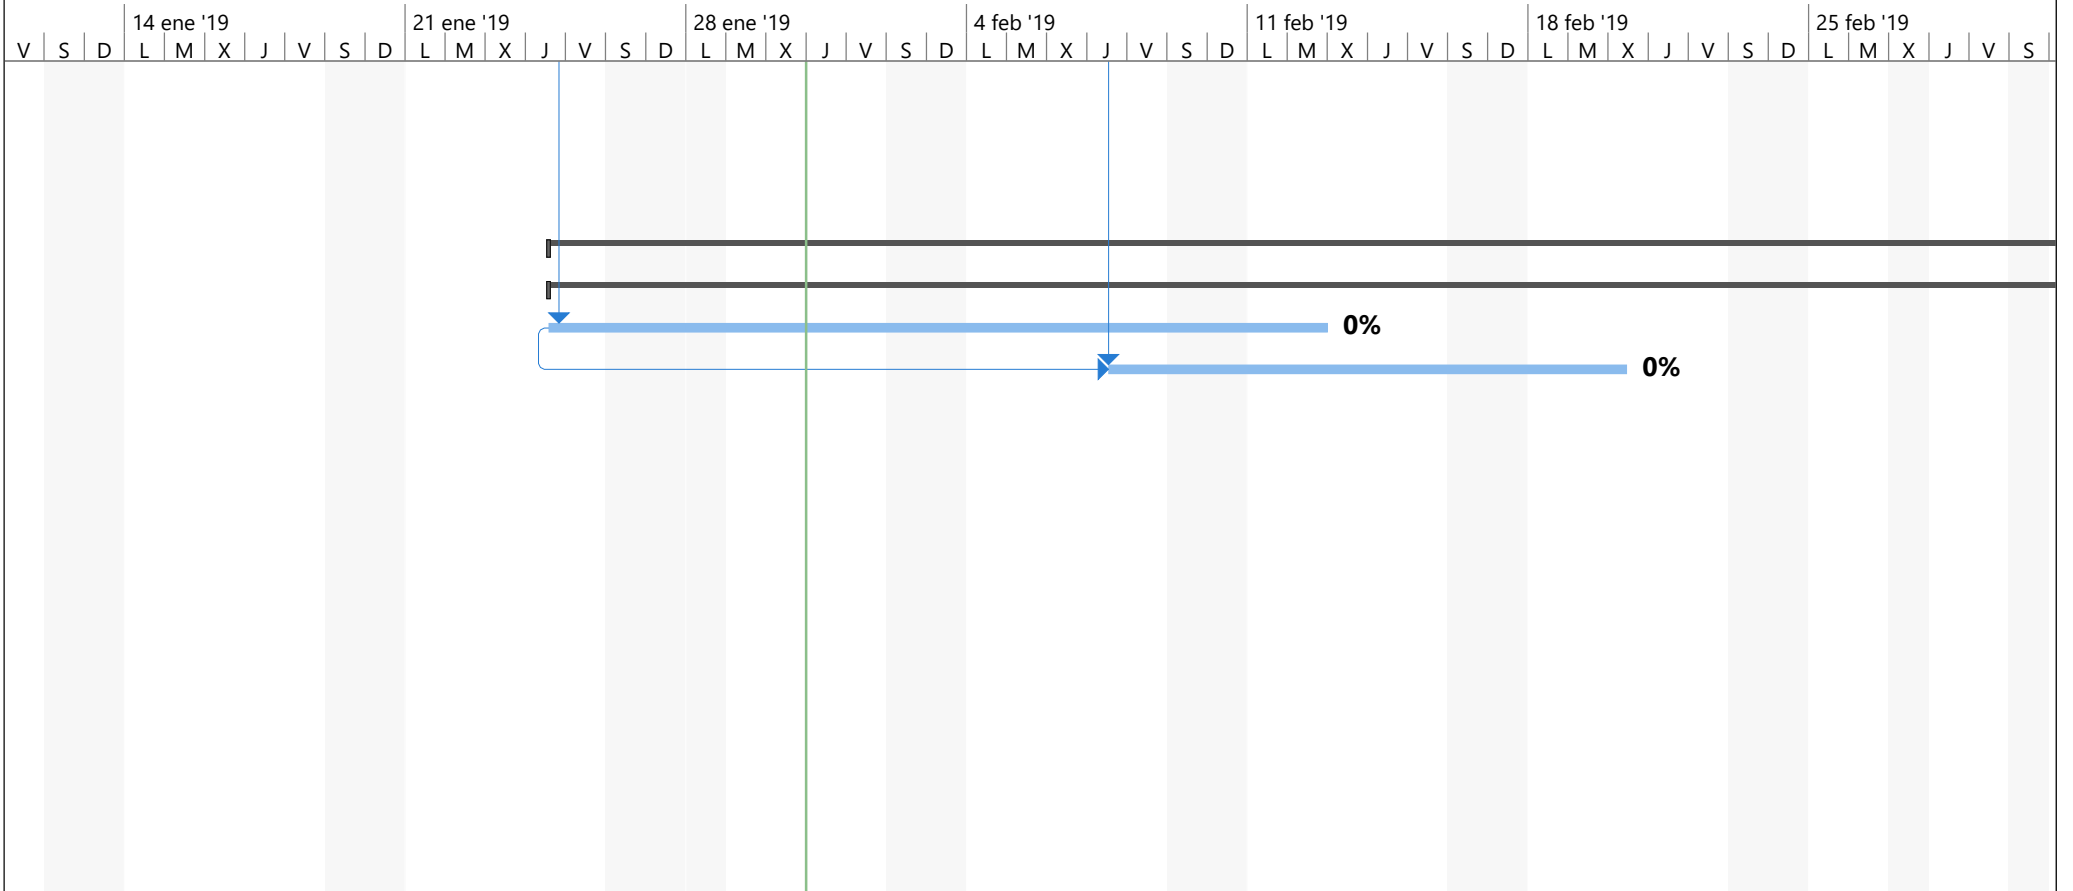

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019


4 mar '19 11 mar '19 18 mar '19 25 mar '19 1 abr '19 8 abr '19 15 abr '19 22 a

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

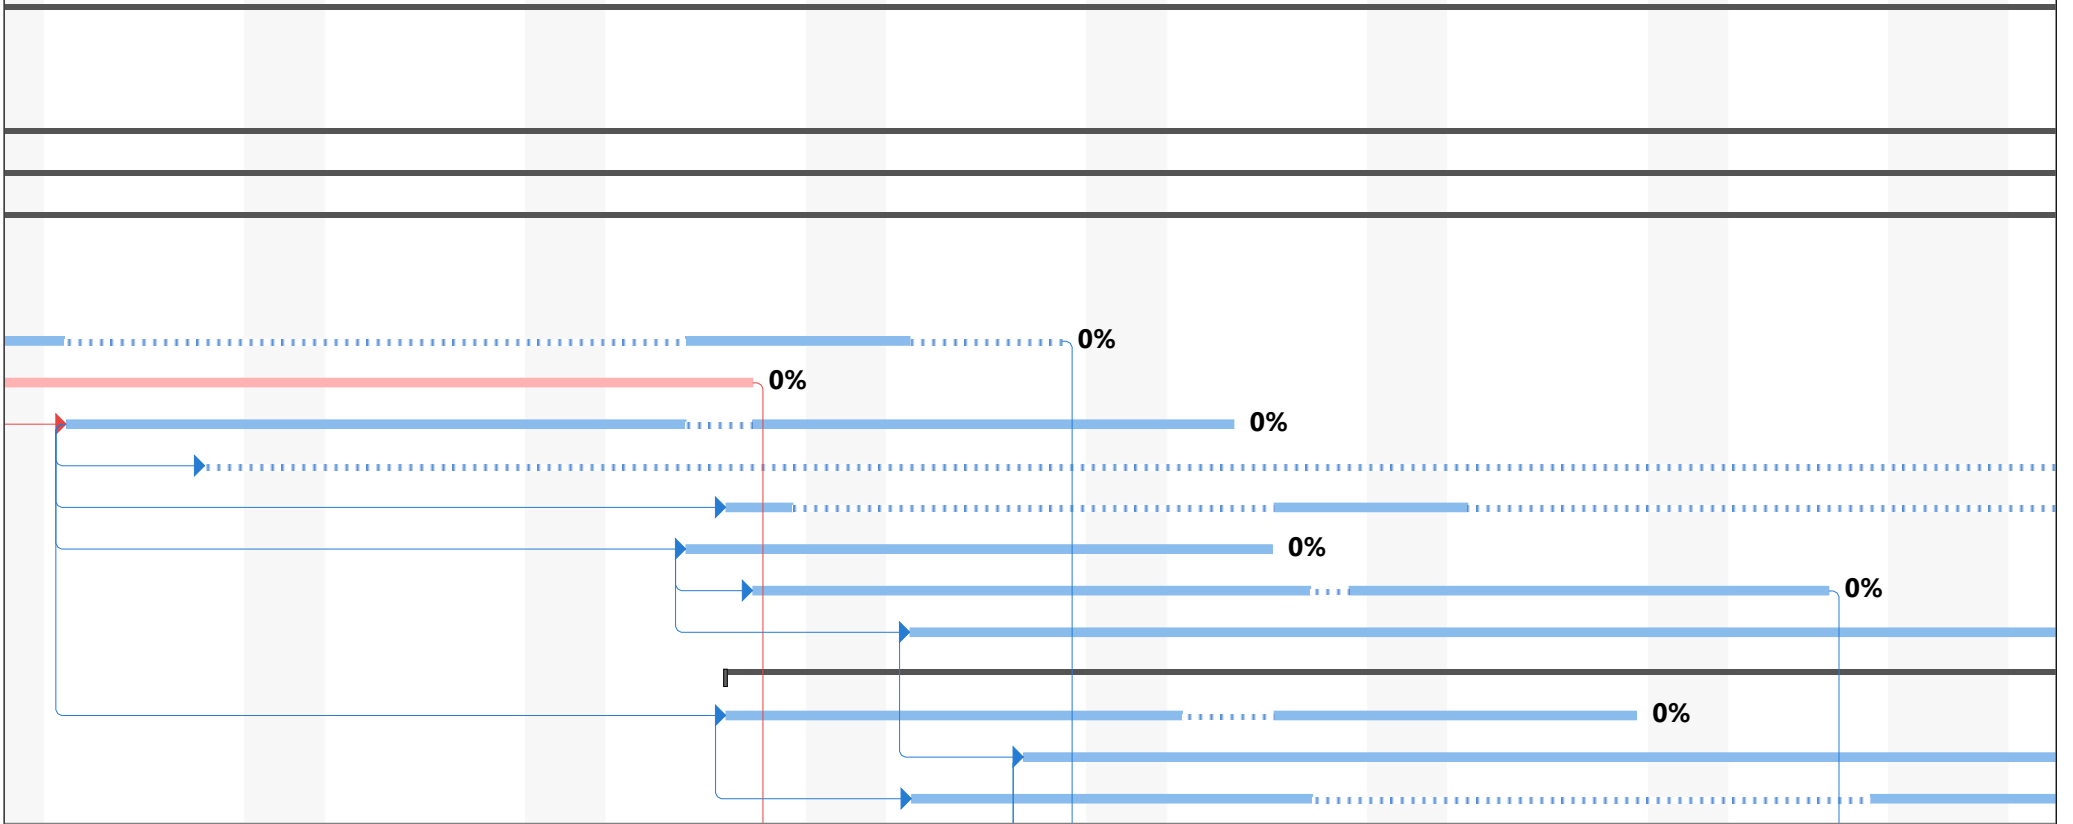


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

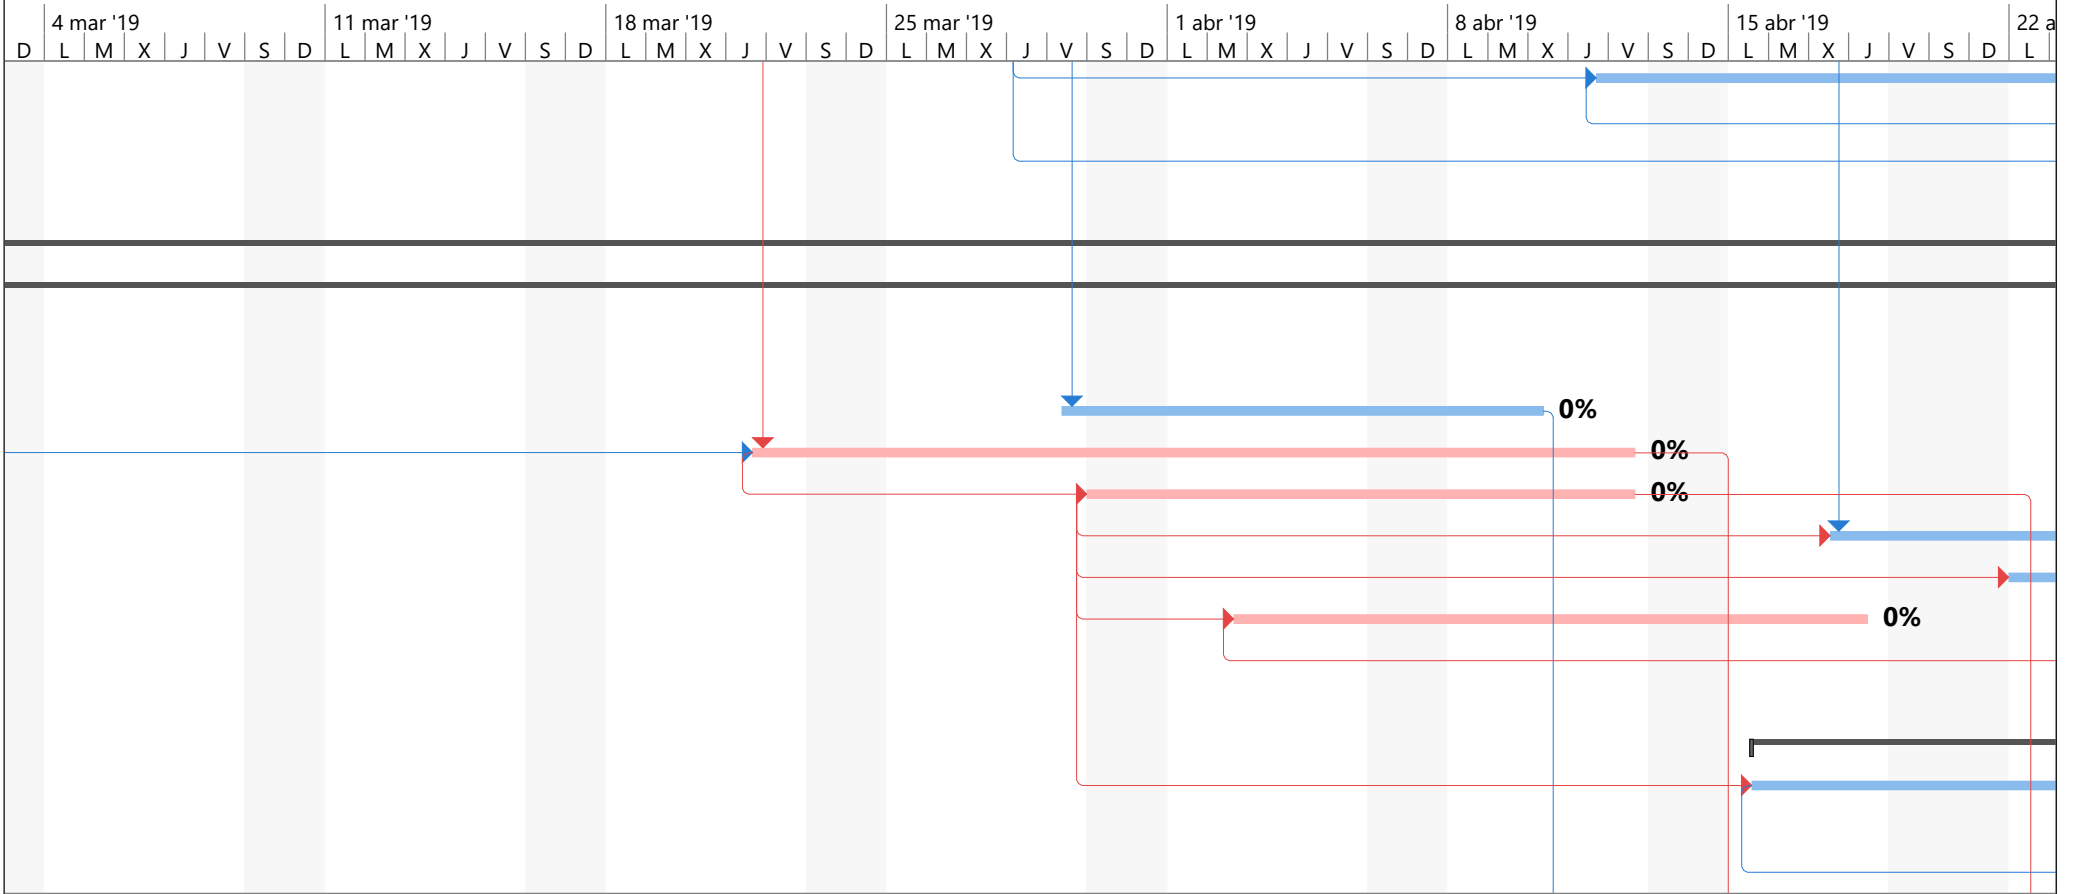


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

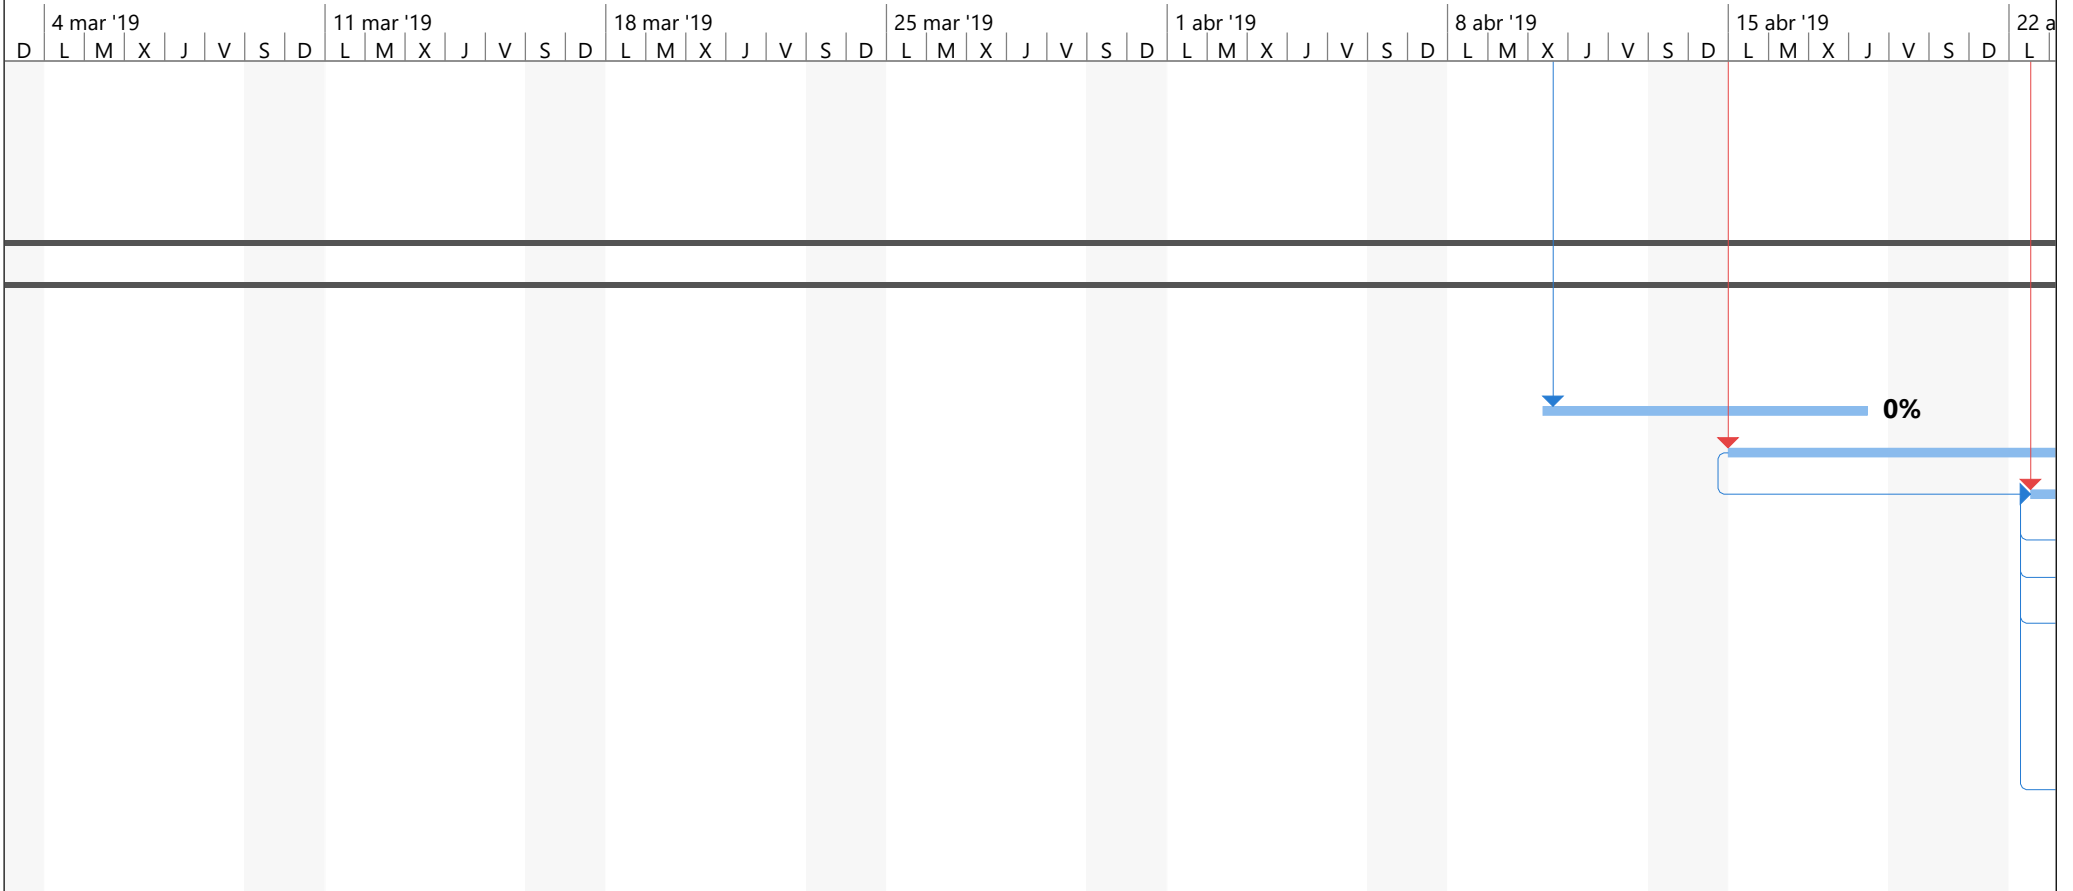

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

abr '19 | 29 abr '19 | 6 may '19 | 13 may '19 | 20 may '19 | 27 may '19 | 3 jun '19 | 10 jun '19
M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X

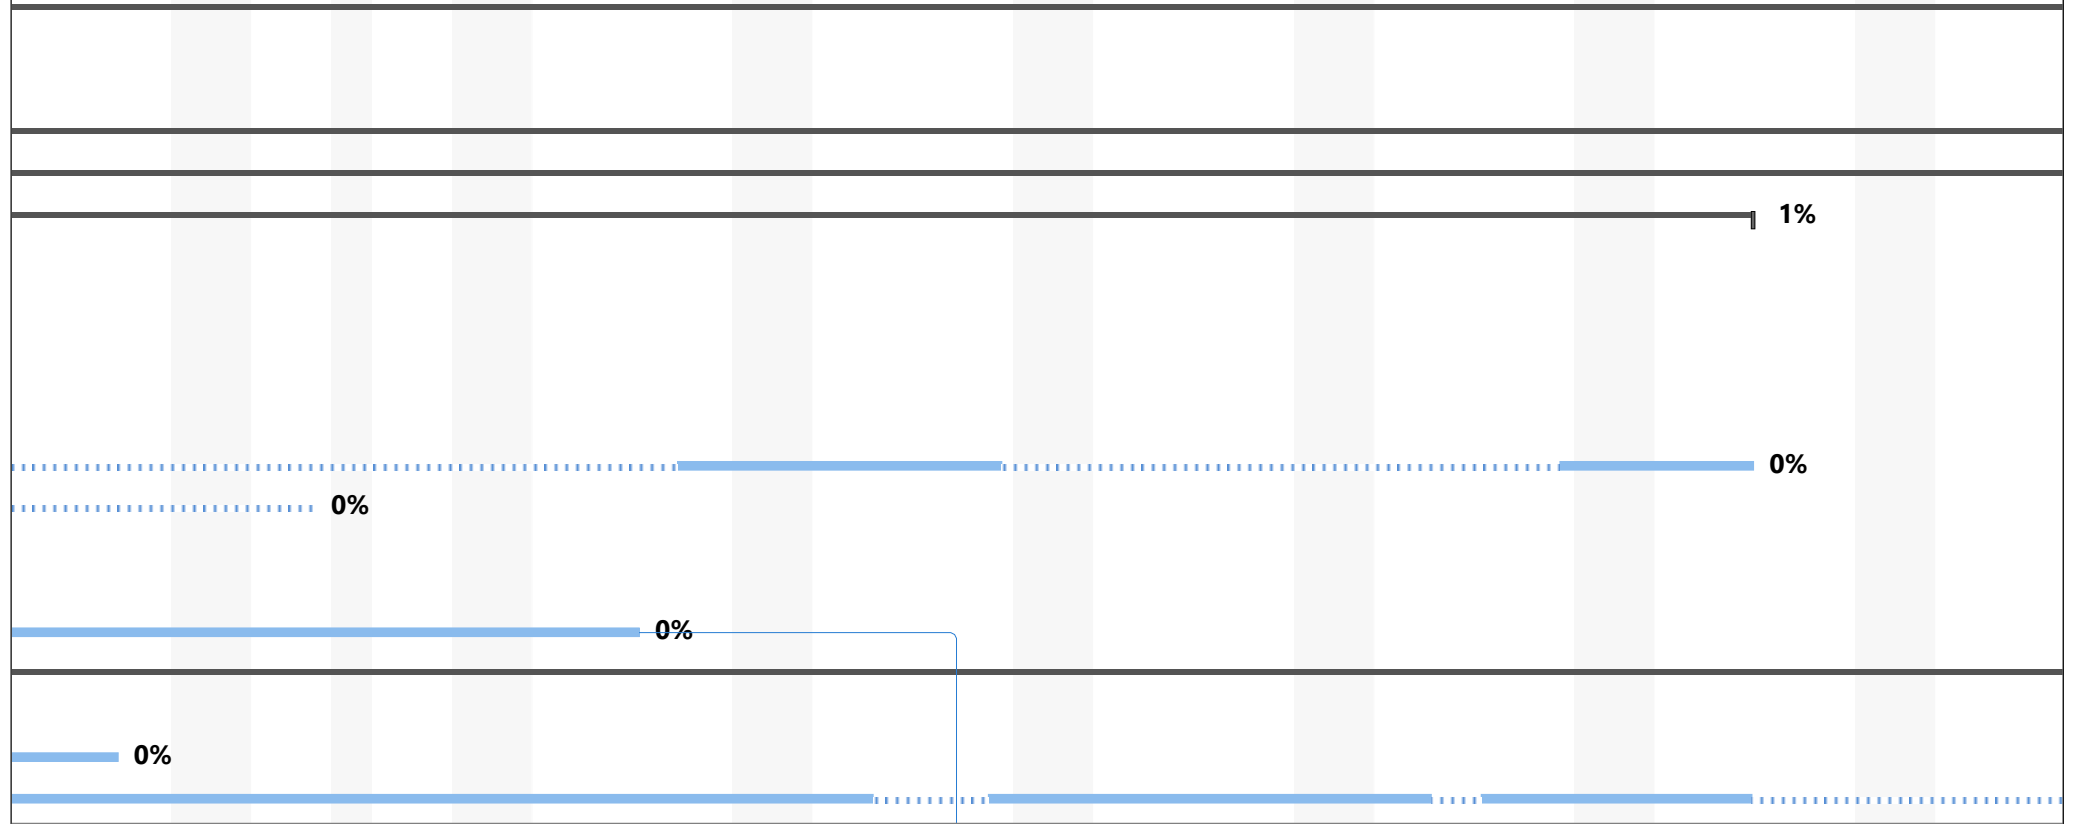


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

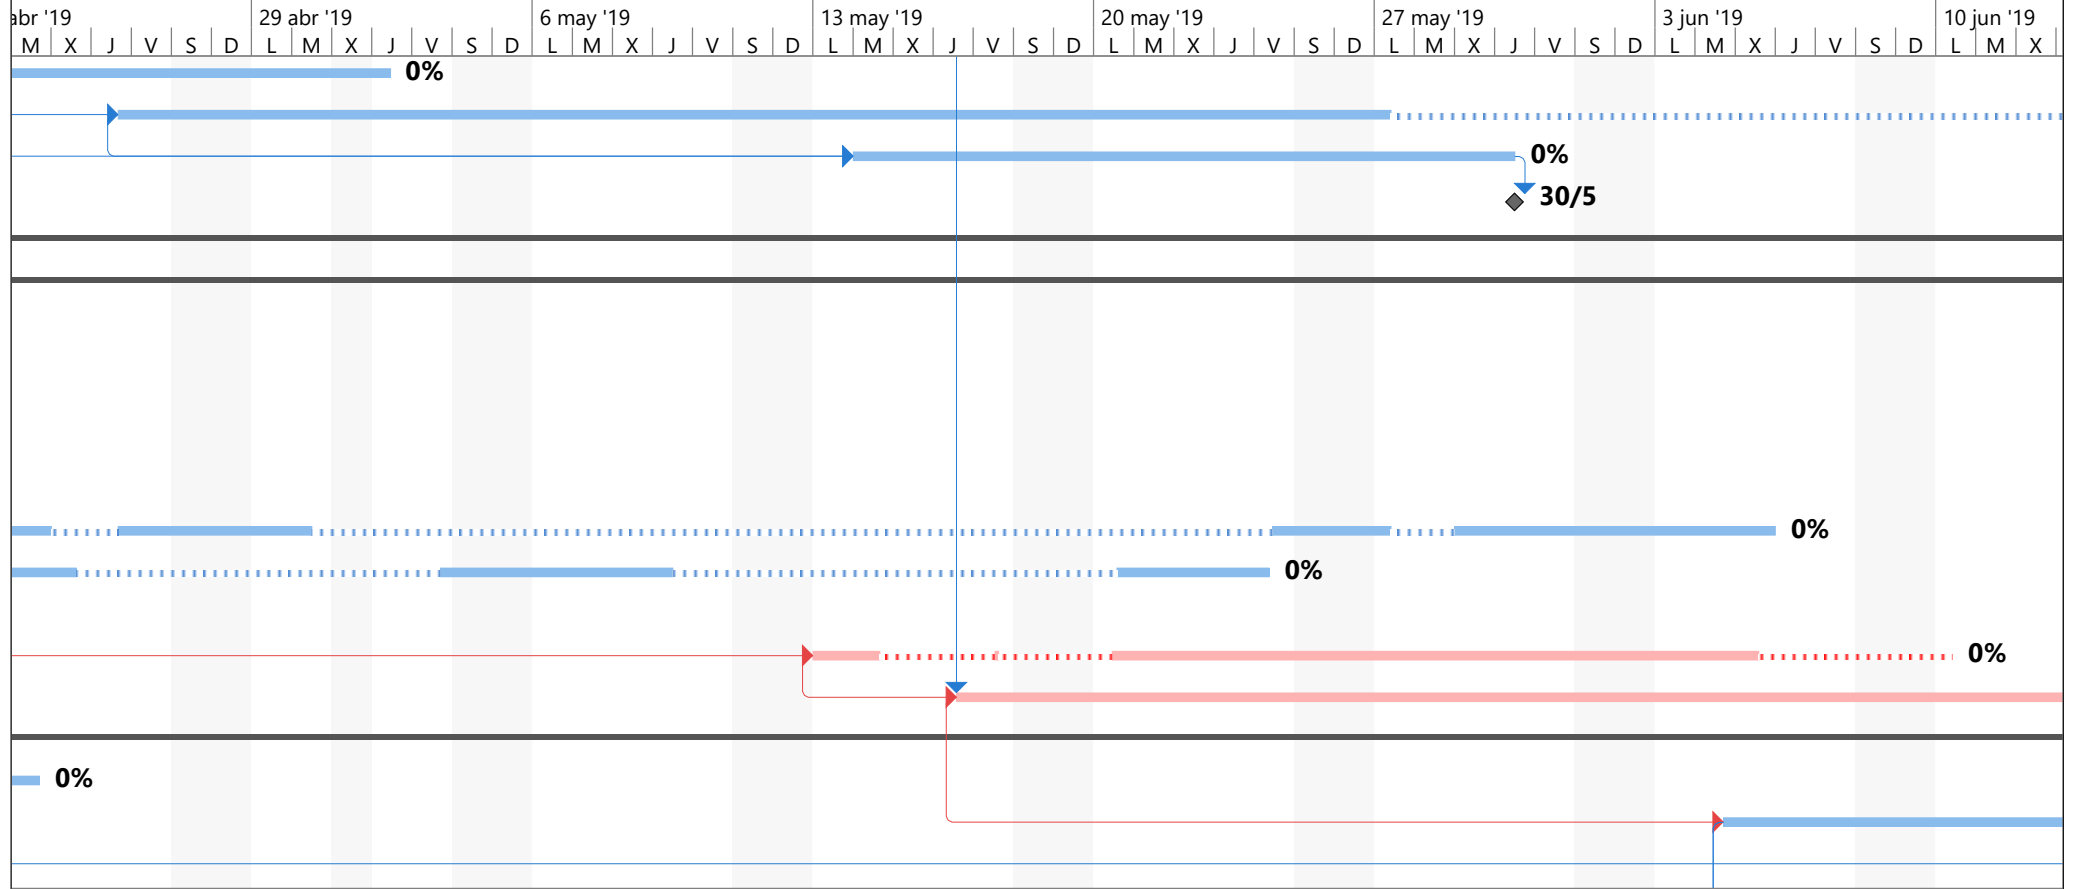


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

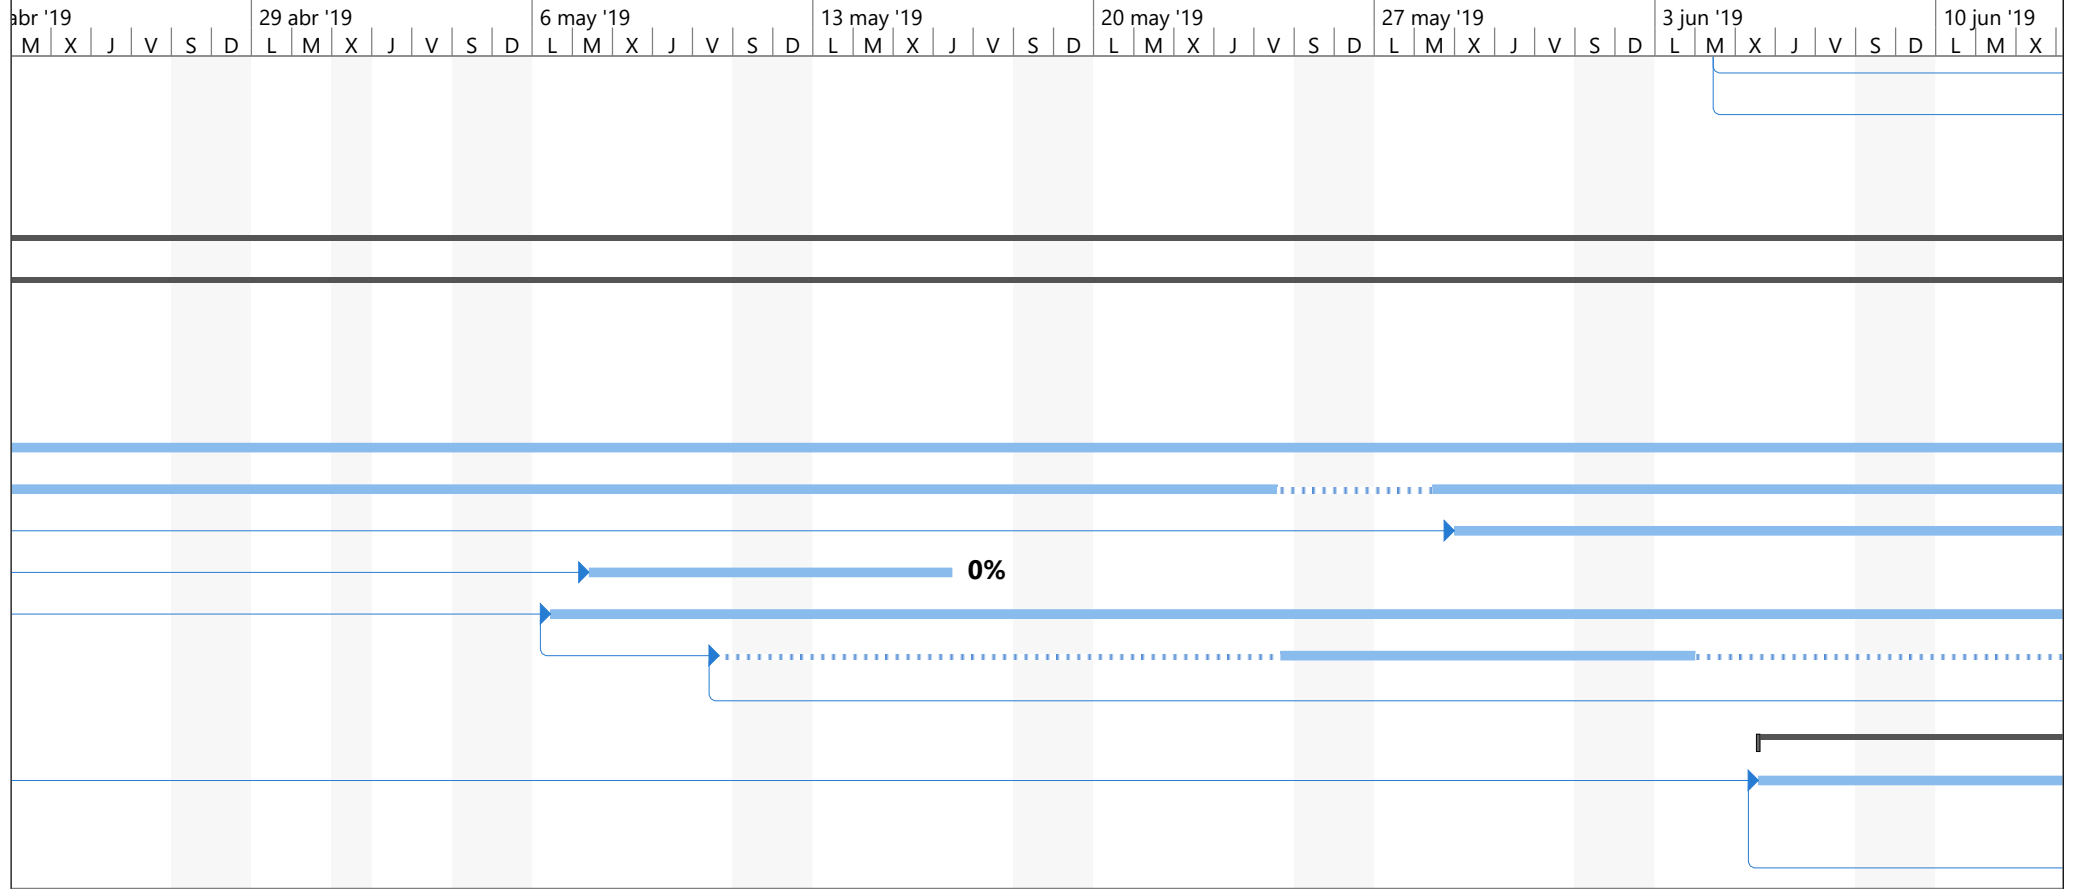


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

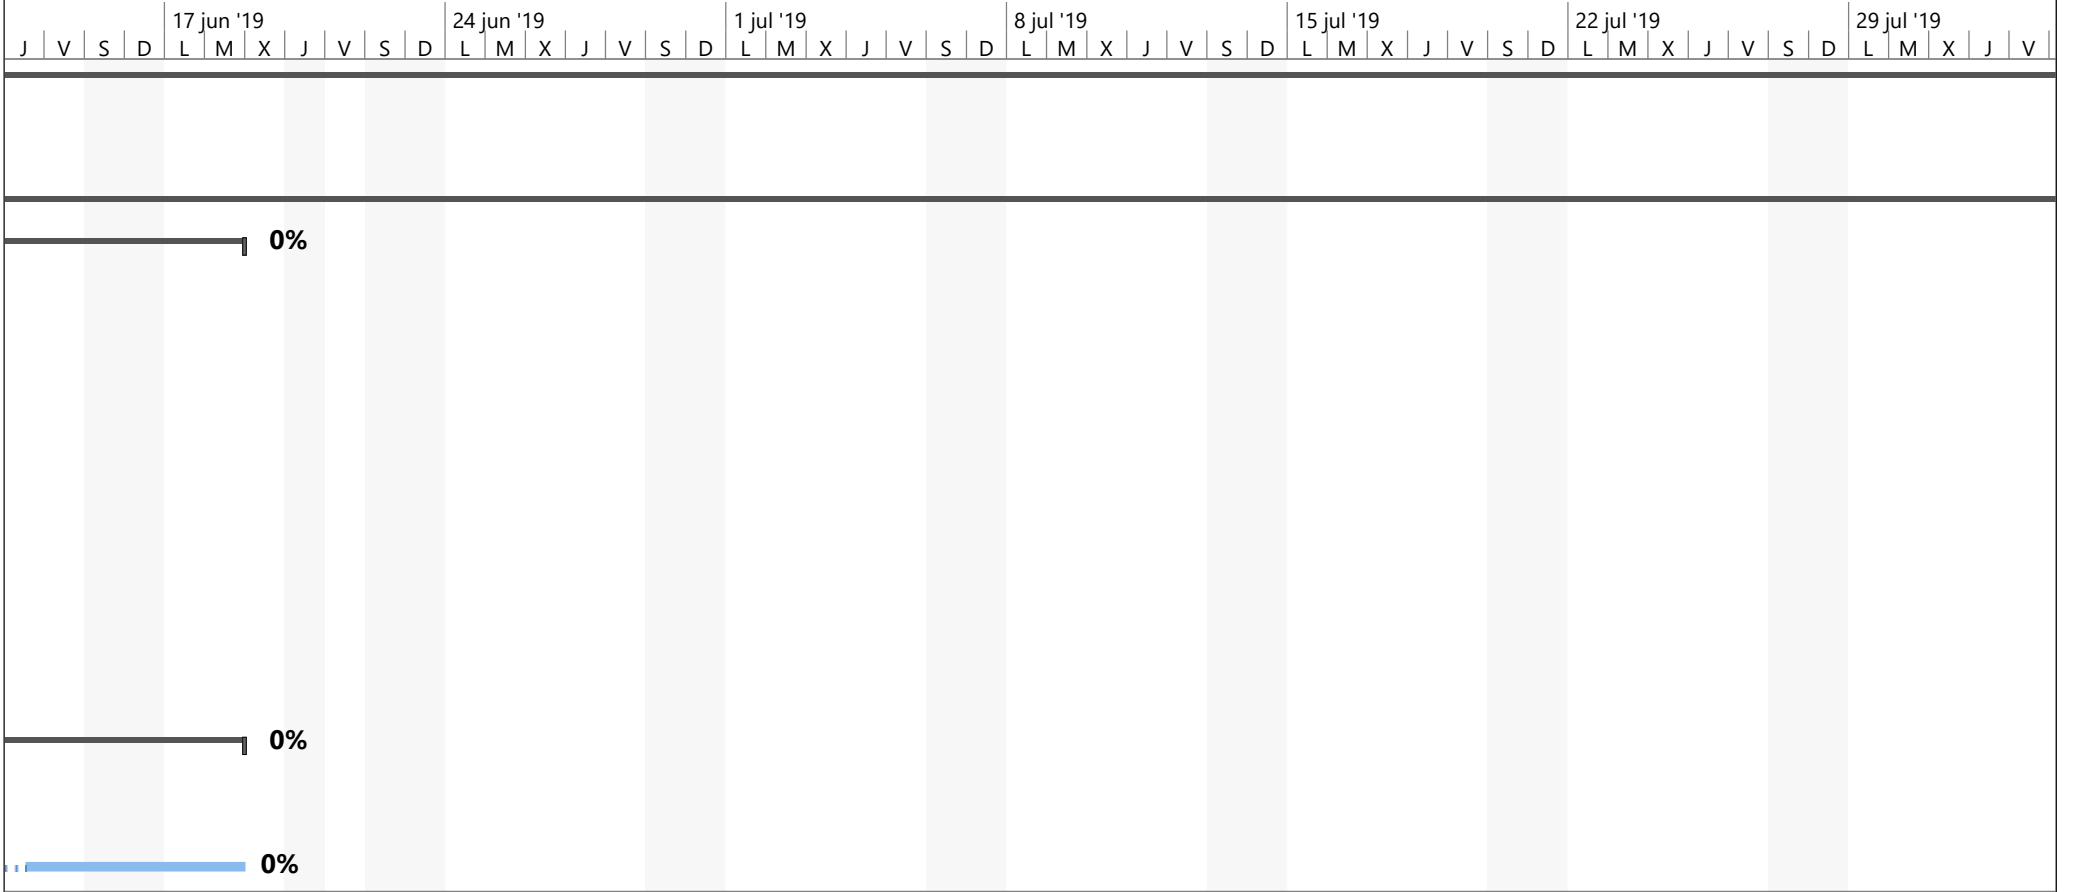

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

J V S D | 17 jun '19 | L M X J V S D | 24 jun '19 | L M X J V S D | 1 jul '19 | L M X J V S D | 8 jul '19 | L M X J V S D | 15 jul '19 | L M X J V S D | 22 jul '19 | L M X J V S D | 29 jul '19 | L M X J V

0%


0%

0%

0%


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

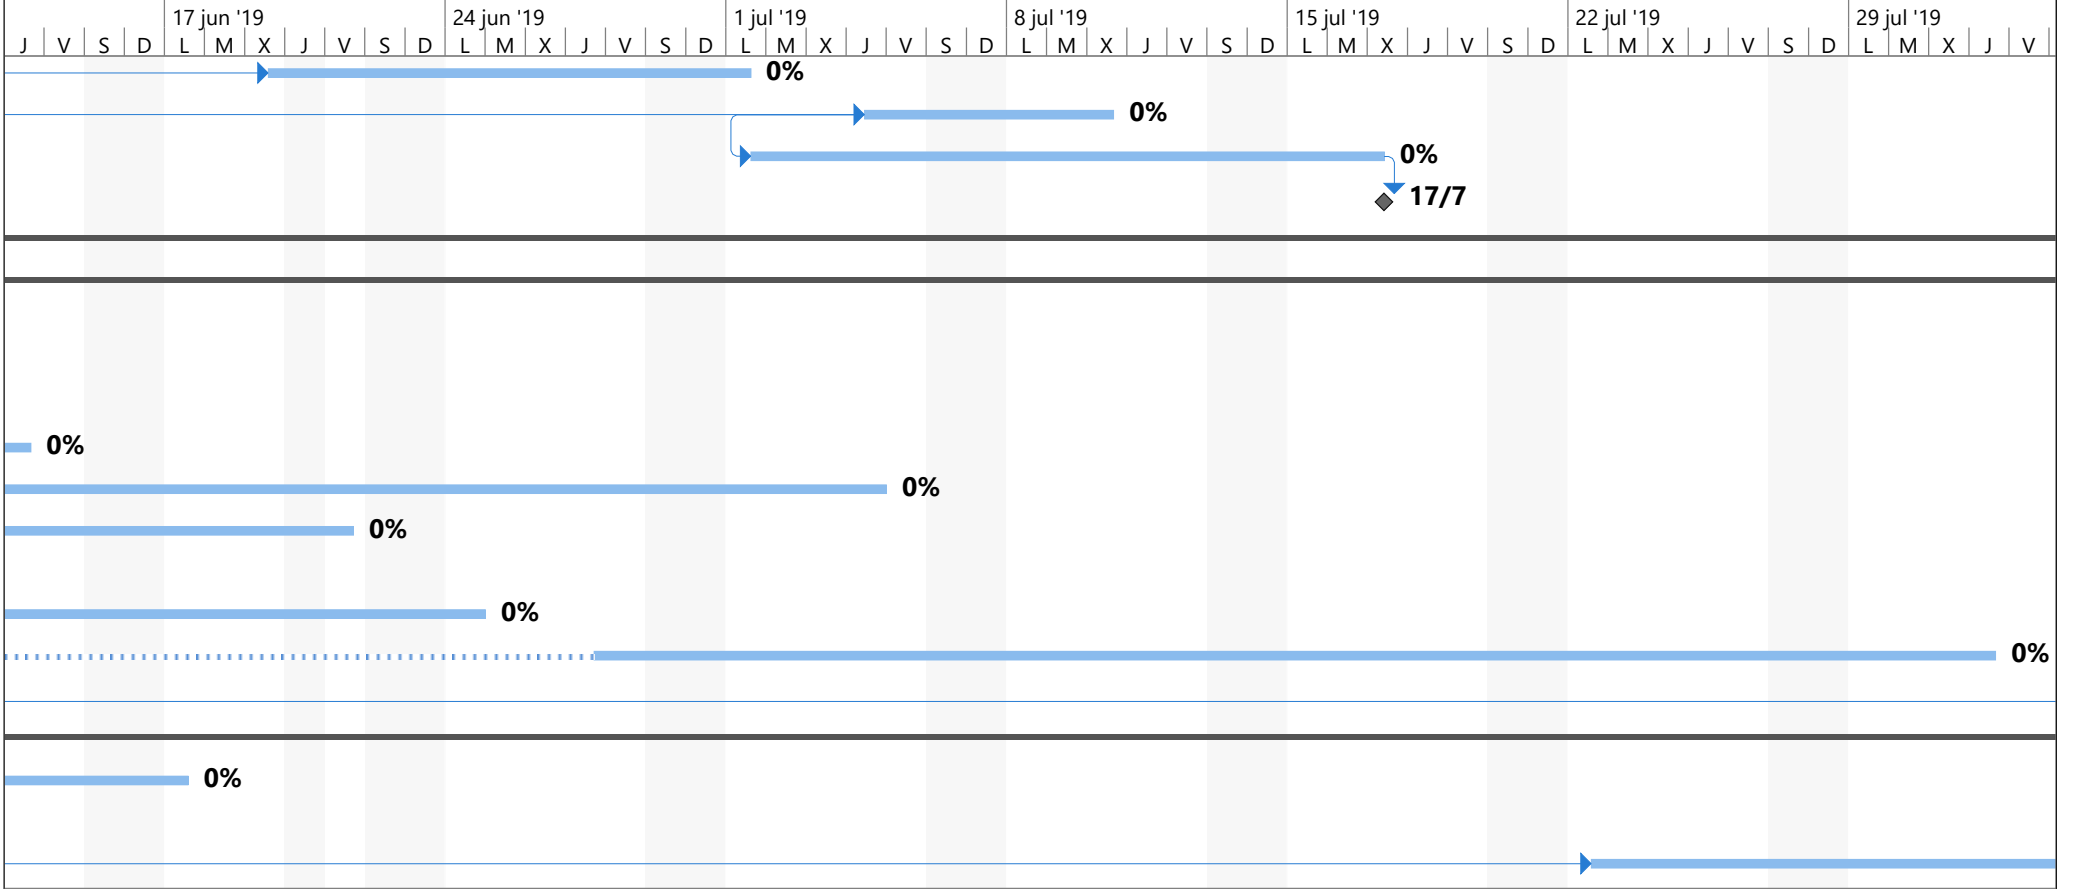

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |


Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

5 ago '19
12 ago '19
19 ago '19
26 ago '19
2 sep '19
9 sep '19
16 sep '19

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

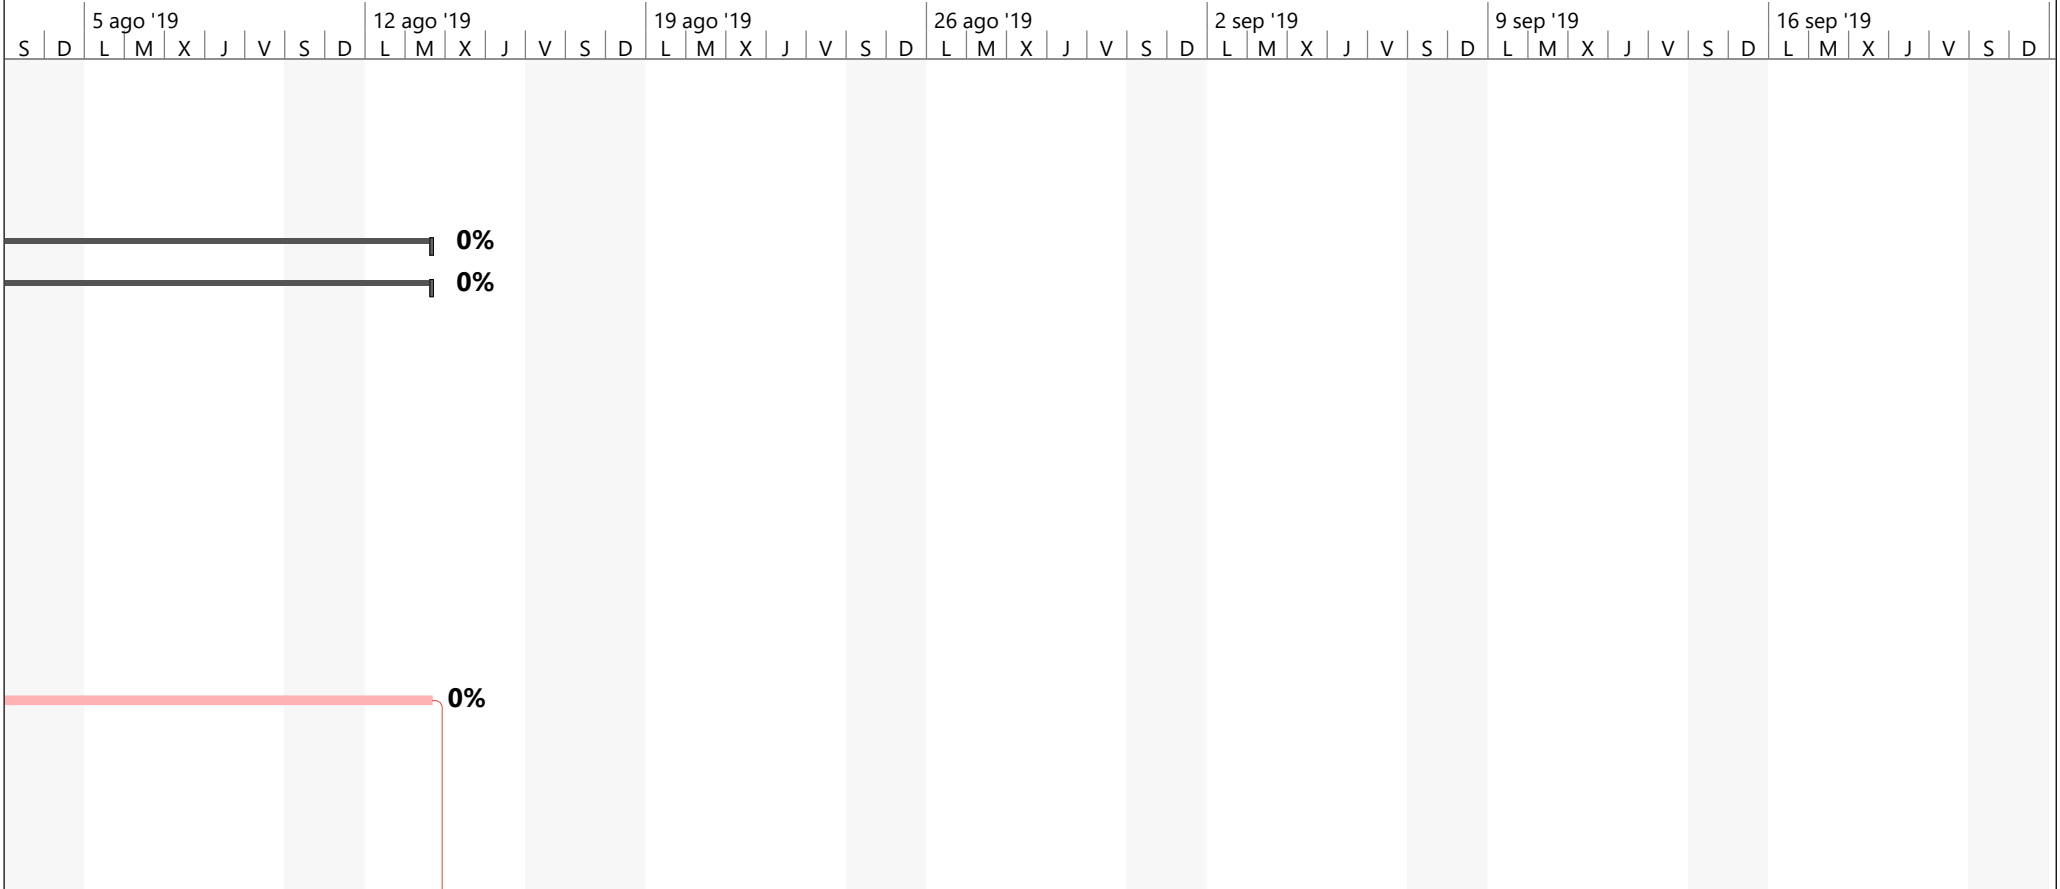


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

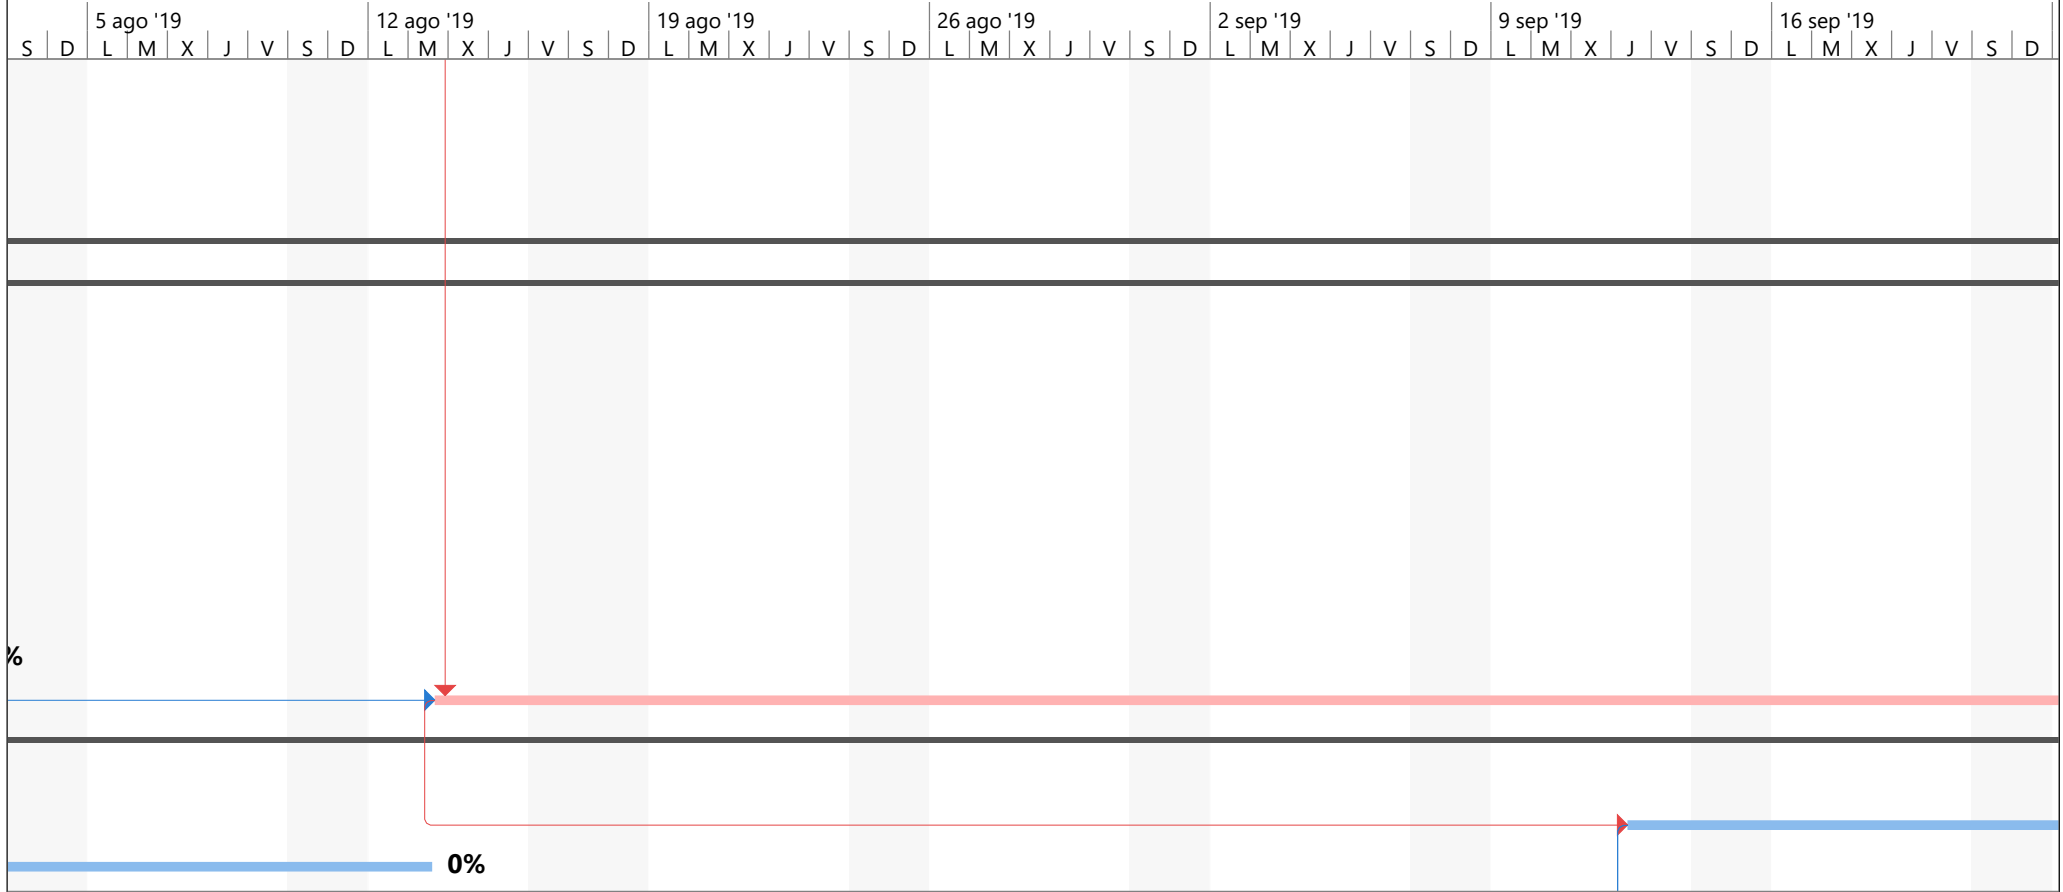


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

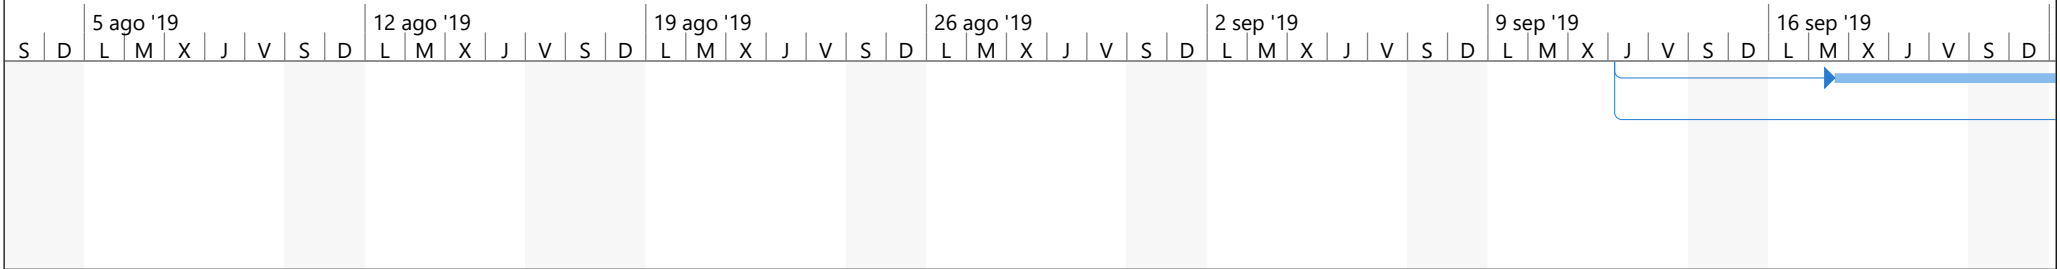


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

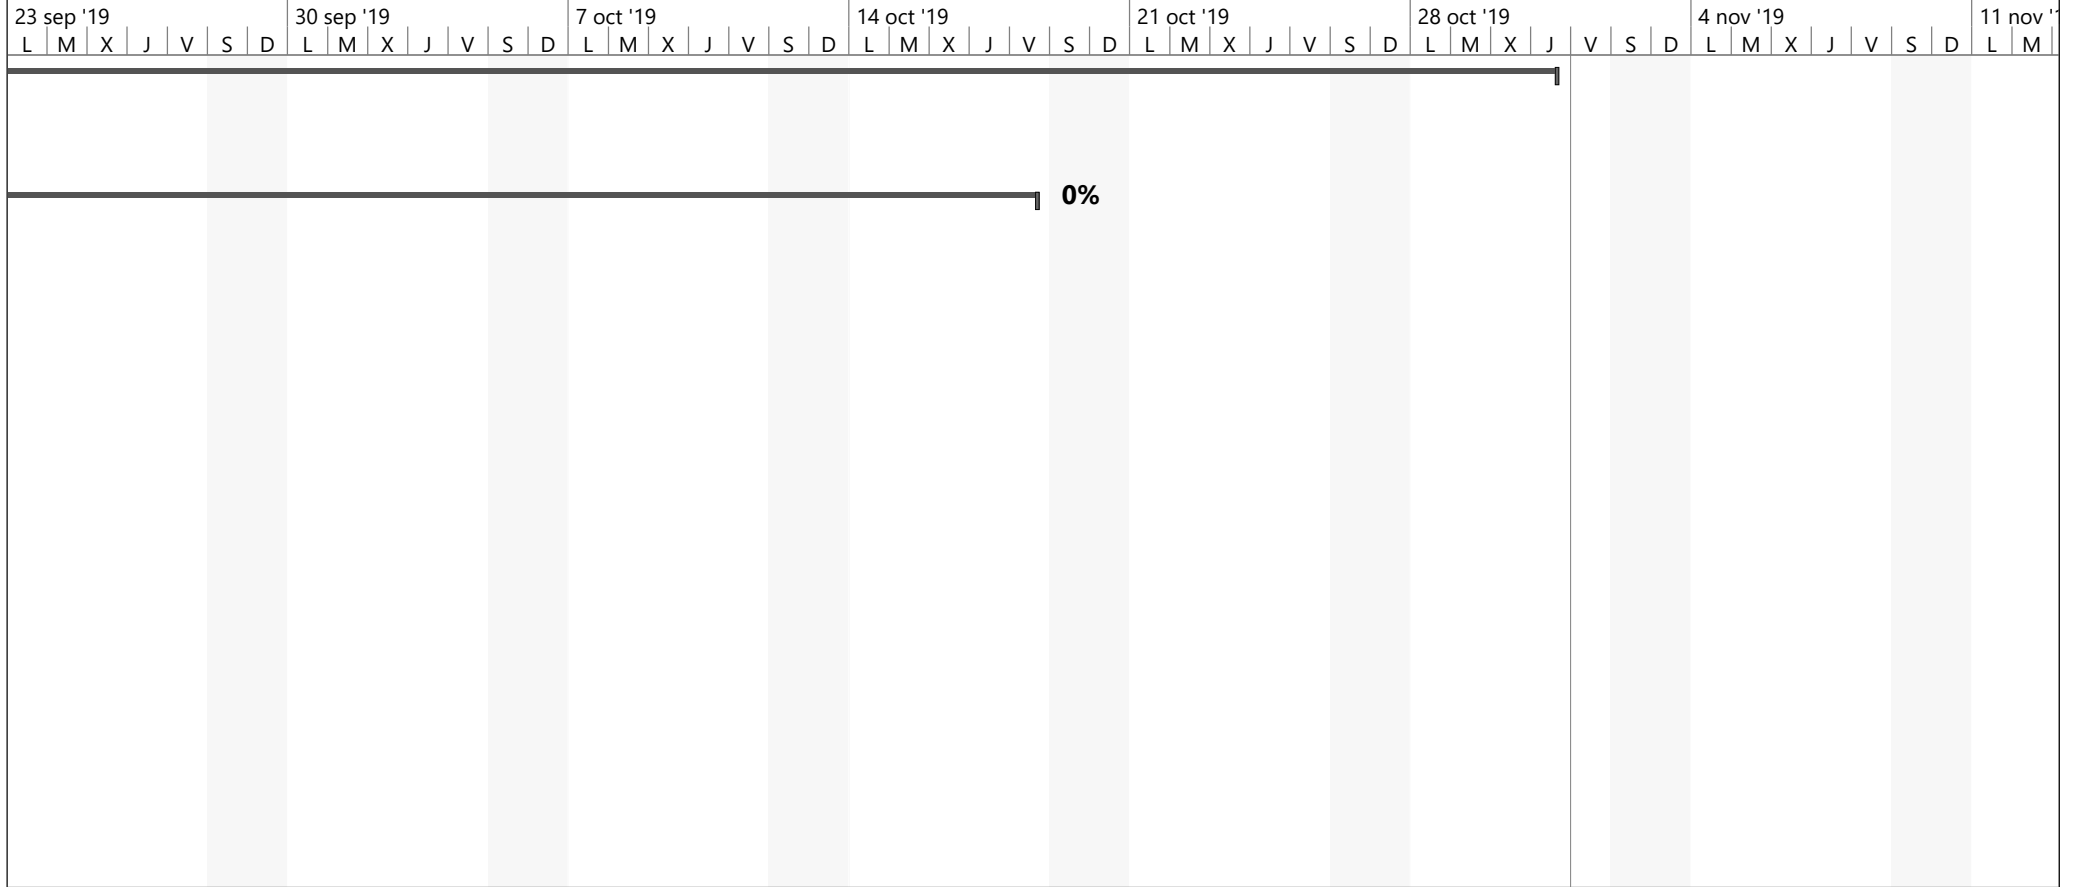


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

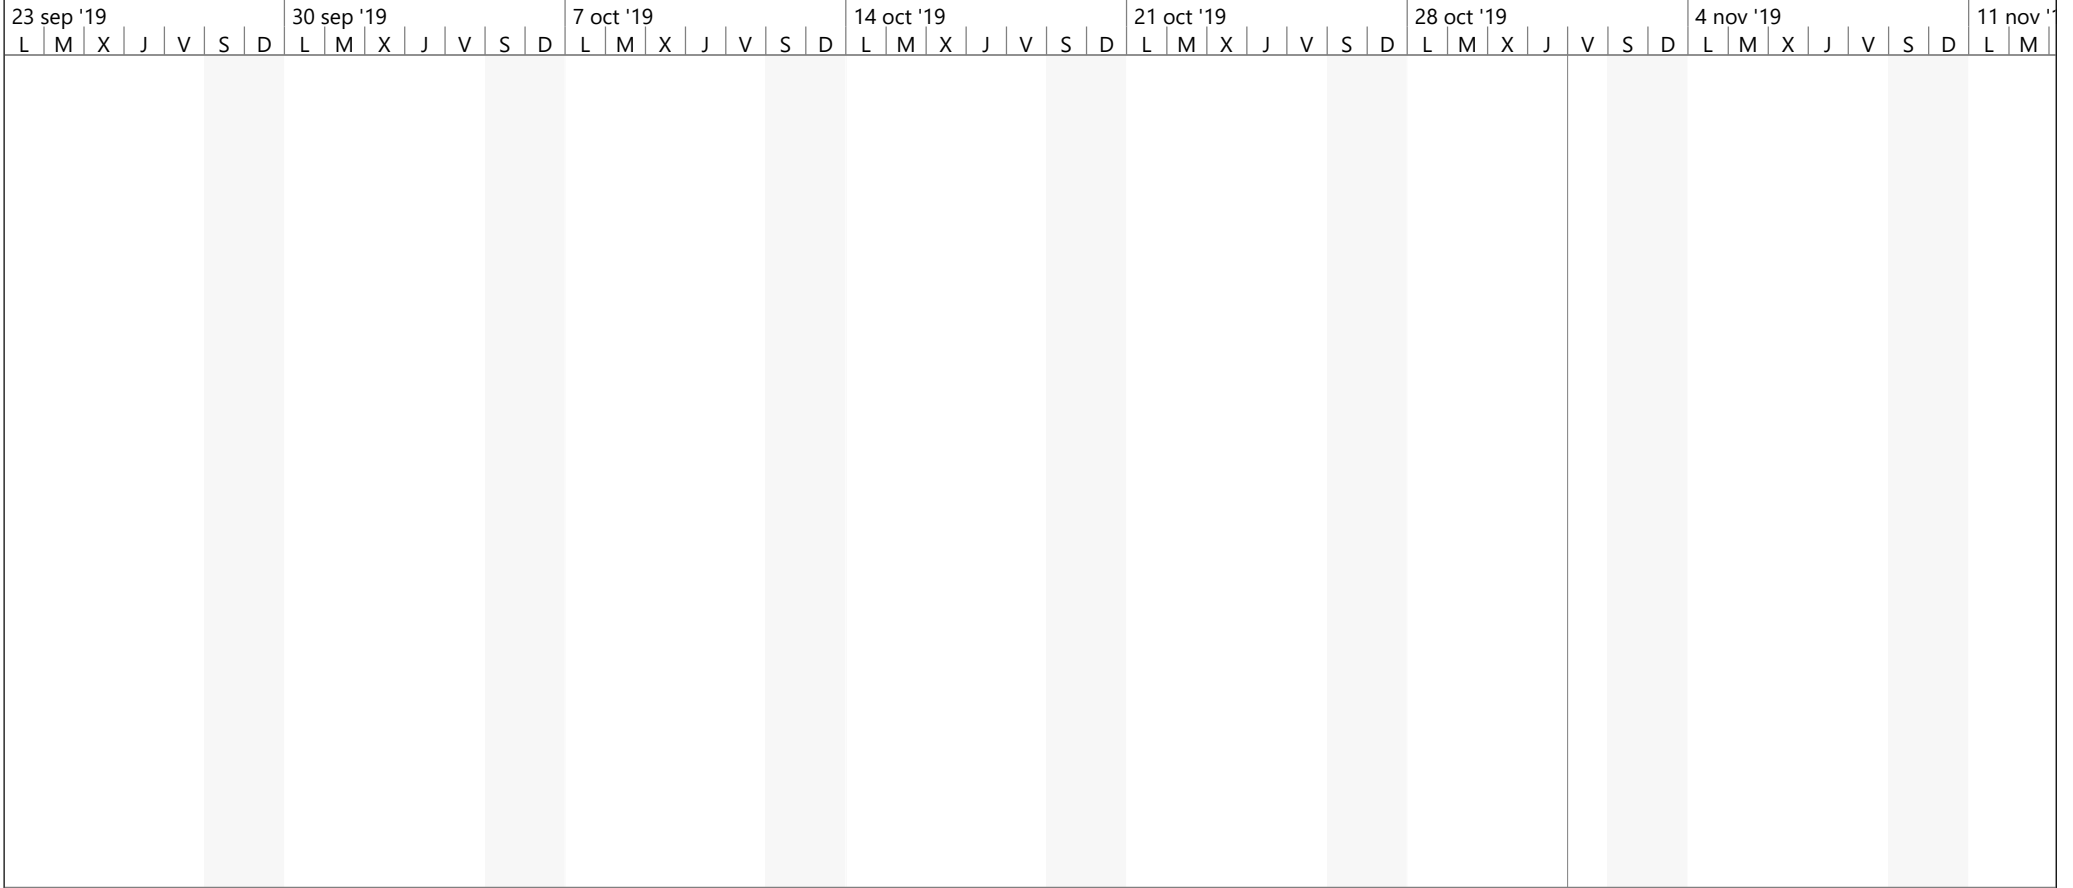


| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

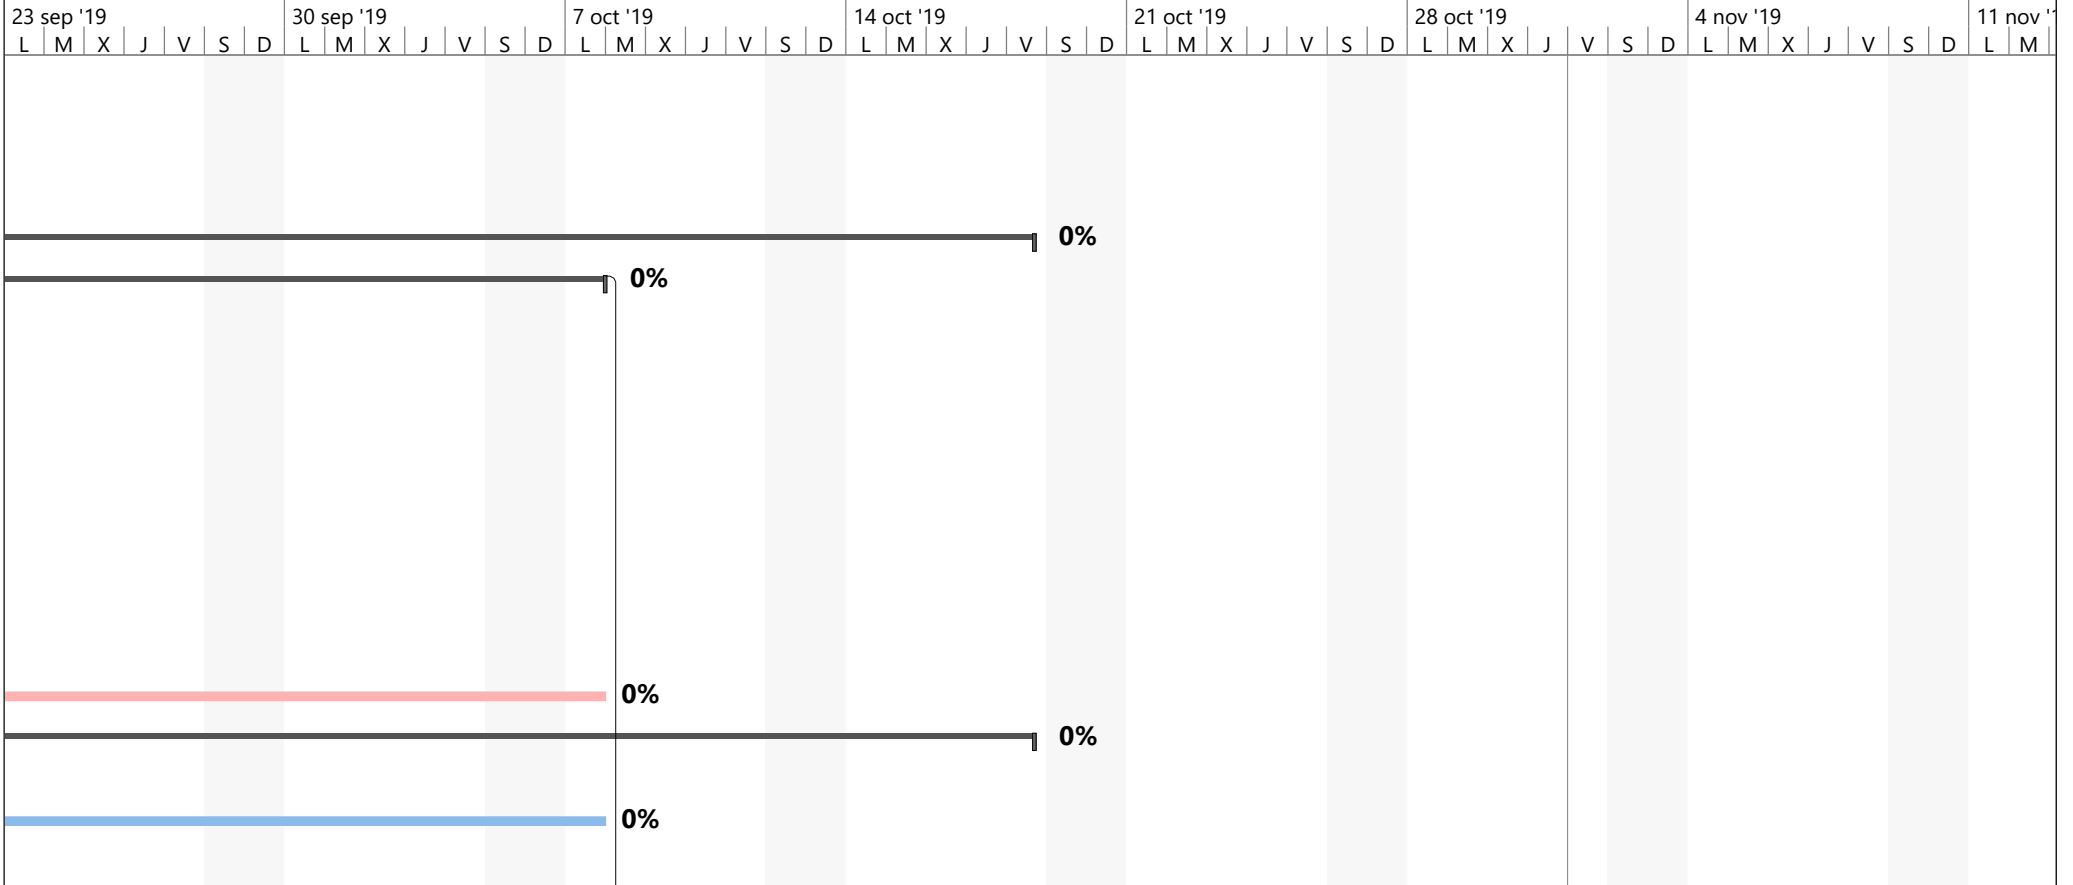

Calendario de Ejecución CHIV105 Ene. 2019

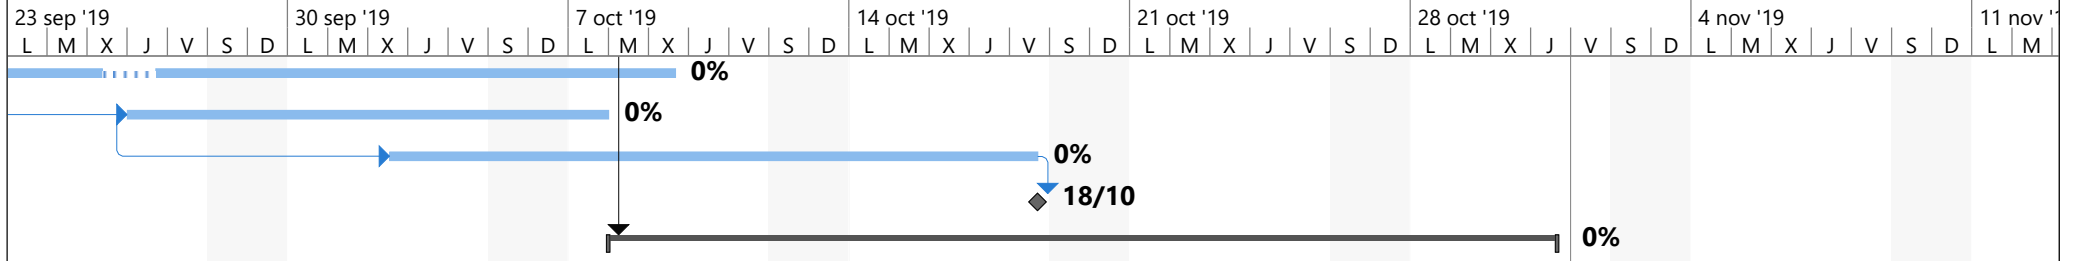

Ing. Deivy Rodriguez

Coordinación de Planificación y Control de Gestión
 Dirección de Proyectos Financiados
 Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas
 Edenorte Dominicana

F: 809-747-9346

E: drodriguez@edenorte.com.do P: www.edenorte.com.do

Síguenos en:



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | solo fin | | Resumen manual | |
| División crítica | | solo duración | | Resumen del proyecto | |
| Progreso de tarea crítica | | Línea base | | Tareas externas | |
| Tarea | | División de la línea base | | Hito externo | |
| División | | Hito de línea base | | Tarea inactiva | |
| Progreso de tarea | | Hito | | Hito inactivo | |
| Tarea manual | | Progreso del resumen | | Resumen inactivo | |
| solo el comienzo | | Resumen | | Fecha límite | |
